



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Agosto/2019 (Rev 00)

Sumário

Apresentação	4
Sumário Executivo	5
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	11
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	21
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas.....	28
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais.....	38
PG005 Programa de Proteção Social	47
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	57
PG007 Programa de Assistência aos Animais.....	92
PG008 Reconstrução de Vilas.....	108
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	125
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	135
PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	145
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística.....	151
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.	158

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.....	162
PG015 Promoção da Inovação	174
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	180
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	187
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	202
PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	210
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	227
PG022 Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos.....	234
PG023 Manejo de Rejeitos	235
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	248
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas.....	259
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	272
PG028 Conservação da Biodiversidade.....	284
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	291
PG030 Fauna e Flora terrestre	297
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	305
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.....	315

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	325
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	333
PG035 Programa de Informação para a População	349
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	356
PG037 Gestão de Riscos Ambientais	361
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	363
PG039 Unidades de Conservação	373
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	380
PG041 Gerenciamento dos Programas Socioambientais.....	387
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	389
Glossário	395

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Sumário Executivo

Neste *Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova* apresentam-se ações ocorridas em agosto de 2019. São centenas de iniciativas relacionadas a 42 programas. Todas elas voltadas ao cumprimento das cláusulas do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e com foco em reparar, compensar ou mitigar os impactos resultantes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

Adiante, estão destacadas algumas das principais realizações do período, distribuídas em uma lógica de três grandes eixos de atuação (Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura), que se combinam para viabilizar os compromissos da Fundação Renova.

Eixo Terra e Água

Tiveram impulso no período a manutenção de acessos em municípios do Alto Rio Doce e novas vistorias em casas de Barra Longa, a fim de avaliar eventuais danos causados pela passagem de caminhões e máquinas de obras da Fundação Renova, são iniciativas do programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (PG 10 - pág. 137). Duzentas vistorias foram realizadas até agosto.

Estão intensificadas também em Barra Longa as ações voltadas à Retomada das Atividades Agropecuárias (PG 17 - pág. 194). Segue a construção de barraginhas, que ajudam a conter os processos erosivos e a canalizar as águas de chuvas para os lençóis freáticos.

Há grande atividade da área também em Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal e Fernandes Tourinho, com realização de diferentes capacitações pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). Treinamentos em Índice de Sustentabilidade Agrícola (ISA) e Plano de Adequação Socioeconômico e Ambiental (Pasea), manejo sanitário de bovinos, avicultura e criação e manejo de horta comunitária foram temas de cursos. Ainda visando o aprimoramento das práticas

econômicas nos territórios atingidos, aconteceu uma capacitação para seleção de áreas e instalação de tanques no contexto do projeto Cultivando para Pescar, ligado ao programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG 16 - pág. 185).

O Manejo de Rejeito (PG 23 - pág. 243), que tem a missão de garantir o melhor tratamento para os sedimentos acumulados em margens e leitos de rios, diminuindo ao máximo seus impactos, teve mais dois trechos de seu plano validados - os trechos 10 e 11, justamente em Barra Longa. O plano divide o território impactado em trechos, desde Fundão, em Mariana, até o mar, no Espírito Santo, e as ações de recuperação somente têm início após validação pelo CIF.

O programa 25, de Recuperação da Área Ambiental 1 (pág. 248), é um que tem influência direta das ações de manejo de rejeito. Por Área Ambiental 1, entende-se o território diretamente atingido pela lama que vazou da barragem de Fundão no rompimento. No estágio atual, as áreas de APP destinadas a restauração nesses trechos estão sendo cercadas, enquanto seguem os diagnósticos técnicos para elaboração de projetos, preparo de solo e irrigação de áreas já plantadas.

Uma iniciativa promissora para a revegetação da Bacia do Rio Doce foi apresentada em workshop conjunto da Fundação Renova e da Universidade Federal de Viçosa. Trata-se da produção de mudas de espécies florestais nativas inoculadas com microrganismos benéficos ao seu desenvolvimento. A restauração florestal motiva também a parceria formalizada em agosto com o World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil), uma das mais importantes organizações ambientais do mundo, para criação de unidades de acompanhamento local nos territórios que receberão restauro florestal por meio do programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (PG 26, pág. 265).

A Conservação da Biodiversidade (PG 28, pág. 289) registrou avanços com a contratação da Fase 2 da “Avaliação do estado de conservação de peixes e invertebrados aquáticos nativos do rio Doce na Área Ambiental 1”. O objetivo é identificar o estado de conservação de invertebrados e da ictiofauna ameaçados de extinção em função do rompimento, quando a falta de oxigênio na água dizimou muitos exemplares.

Desde então, o progresso consistente nos resultados dos monitoramentos de qualidade da água do rio Doce tem feito avançar o programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (*PG 32, pág. 315*). Em agosto, no estado de Minas Gerais, alinharam-se realizações como a conclusão dos projetos detalhados dos sistemas individuais de abastecimento do distrito de Ipaba, em Santana do Paraíso; a conclusão das obras e início da captação no córrego Barroso, que permitirá reduzir a dependência de fornecimento por caminhão-pipa para a cidade de Resplendor; a montagem e instalação das balsas de captação em Galileia; e a escavação do trecho sob a BR-381 para passagem da adutora de captação no rio Corrente Grande, em Governador Valadares. No Espírito Santo, está em andamento a regularização fundiária da área utilizada para instalação da adutora e da estação elevatória para captação no rio Pancas, em Colatina.

Eixo Pessoas e Comunidades

O Ressarcimento e Indenização dos Impactados (*PG 2, pág. 25*) avançou no pagamento de 213 indenizações das campanhas 1, 2 e 3 do Cadastro (*PG 1, pág. 16*), que já enviou ao CIF 32.710 cadastros processados desde o início do programa. Em Mariana, o cadastramento e as vistorias de propriedades são realizados pela Cáritas, assessoria técnica do Ministério Público, contou com 1.177 entrevistas e 641 vistoria, todas correspondentes à fase 1 do cadastramento, encerrada em agosto do ano passado. Apesar desse atraso, o mês fechou com 55 acordos negociados no município (*PG 2, pág. 25*). O Auxílio Financeiro Emergencial, previsto no Programa 21 (*pág. 230*), é outro diretamente ligado ao avanço nos cadastramentos. Hoje, há 13.673 auxílios ativos, com 31.184 pessoas assistidas, entre titulares e dependentes. Apenas em agosto, 59 novos auxílios foram incluídos.

Para as comunidades indígenas e tradicionais afetadas pelo rompimento (*PGs 3 e 4, págs. 35 e 44*), os pagamentos de auxílio financeiro seguem regras próprias e hoje somam 130 famílias na Terra Indígena Krenak, em Resplendor (MG). No Espírito Santo, são 192 famílias Tupiniquim na Terra Indígena de Comboios; 1.122 famílias na Terra Indígena Tupiniquim-Guarani; e 179 titulares na Comunidade Quilombola de Degredo, cuja inclusão foi efetivada em agosto (*PG 4, pág. 44*).

Investindo no bem-estar social, físico e psíquico da população atingida, a Fundação Renova contratou dez equipes, compostas por assistente social, enfermeiro, psicólogo e, quando necessário, um especialista em comunidades indígenas, para atuar ao longo do território impactado, identificando desvios que mereçam acompanhamento mais próximo e especializado. A iniciativa serve conjuntamente aos programas 5 e 14, de Proteção Social (*pág. 47*) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (*pág. 162*). No que diz respeito à saúde, os municípios de Mariana e de Barra Longa têm direito também a suplementação, que se viabiliza pelo repasse de verbas ao município para pagamento de equipa médica adicional, ambulâncias e instalações para atendimento. Em Mariana, a suplementação já acontece e, em Barra Longa, ela esbarra no fato de que o município encontra-se no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que gerou consulta ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. O parecer do órgão será importante para balizar a eventual replicação da medida em outras localidades.

Um importante fator de bem-estar social, na visão da Fundação Renova, é o desenvolvimento econômico consistente, capaz de promover a inovação e a criatividade coletiva e individual. É o que provam várias das iniciativas do mês. O programa de Inovação da Economia (*PG 15, pag. 178*), por exemplo, mostra avanços em dois projetos de pesquisa: Skyvídeo, que viabiliza a utilização de um drone para coleta de amostras de água e análise ambiental com sonda; e Uso do Rejeito, que busca viabilizar tecnicamente a aplicação de rejeito na produção de blocos ecológicos de construção.

Há também coleta de novos projetos para promoção de negócios coletivos sociais, uma parceria da Fundação Renova com a BrazilFoundation, A primeira chamada resultou em 13 projetos aprovados, cuja implementação contará com capacitação específica. Nessa segunda chamada, patrocinada pelo programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica (*PG 18, pag. 207*).

A participação em feiras e eventos tem sido eficaz para promover a economia local, especialmente visando a Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (*PG 19, pag. 215*). Empreendedores de Mariana e Barra Longa, por exemplo, tiveram vitrine para seus produtos em feiras e eventos organizados pela Fundação Renova e seus parceiros, com negociações diretas da ordem de R\$ 12 mil em agosto.

Finalmente, a aceleração das obras tem alavancado interesse pelos cursos profissionalizantes promovidos em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai) de Minas Gerais. Em agosto, com 30 alunos inscritos, começou o curso de qualificação em pedreiro de infraestrutura no município de Rio Doce, e foram finalizados os cursos de eletricista instalador predial de baixa tensão e de serralheiro em materiais ferrosos, em Mariana e contaram, respectivamente, com 30 e 20 participantes. A iniciativa está no bojo do programa de Estímulo à Contratação Local (*PG 20, pág. 222*).

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Os preparativos para o próximo período chuvoso, entre outubro e março, estão no centro das ações na Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, Candonga, cuja Recuperação do Reservatório é o foco do *Programa 9 (pág. 128)*. Verificação e manutenção dos instrumentos de monitoramento da obra; drenagem das bacias 1 e 2, criadas para depositar transitoriamente o rejeito dragado; manutenção e ajustes nas vedações das comportas são alguns dos cuidados destinados a impedir que o rejeito que permanece ali depositado migre para os cursos d'água, levado pelas chuvas, aumentando a turbidez.

Essas obras são renovadas anualmente e passam pelo crivo da assessoria técnica Aecon, uma das mais renomadas do mundo. Em 2018, foram classificadas como de alta qualidade e eficiência. Neste ano, um fator de preocupação tem sido as manifestações de comunidades dos municípios de Rio Doce e de Santa Cruz do Escalvado, que impedem o acesso à Usina. As questões que mobilizam os protestos vêm sendo negociadas pela Fundação Renova com as respectivas comunidades, mas há grande preocupação de que os preparativos para a chuva sofram atrasos em função delas, com potencial prejuízo para todo o território da Bacia do Rio Doce.

Os reassentamentos - objeto do programa Reconstrução de Vilas (*PG 8, pág. 108*) é outra frente que registrou avanços significativos no mês. Confira, caso a caso.

Bento Rodrigues. A HTB iniciou a construção das 17 casas mais a escola, que constituem o pacote inicial de construção. As obras estão em estágio de fundação, e o objetivo é concluir as fundações antes do período chuvoso, pois isso permitiria dar continuidade às demais

etapas de erguimento, trabalhando sob toldos. Além disso, o reassentamento já tem uma primeira rua pavimentada e com meio-fio. O revestimento, feito de blocos de concreto intertravados, é o mesmo que será adotado em todas as vias da nova Bento. Começou também o asfaltamento e a colocação de postes da rede elétrica no acesso principal, a ser finalizado até outubro.

Paracatu de Baixo. A supressão vegetal foi concluída da área 1, e a Andrade Gutierrez, empreiteira responsável pela obra, começou a terraplenagem do acesso principal, assim como a construção de bueiros e passagens hidráulicas. Também foi iniciado, junto à prefeitura de Mariana, o processo para emissão do registro do loteamento.

Gesteira. Enquanto continuam as discussões com a comunidade das diretrizes para o reassentamento, avançam os trabalhos de sondagem que vão subsidiar o desenvolvimento do projeto.

As páginas a seguir contêm o detalhamento dessas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.


Cláusulas do TTAC: 19 – Reprogramada; 20, 22, 25, 26 e 28 - Em andamento


Deliberações que impactam escopo e prazo: 251 – Concluída internamente; 277 – Reprogramada

Marcos do Programa

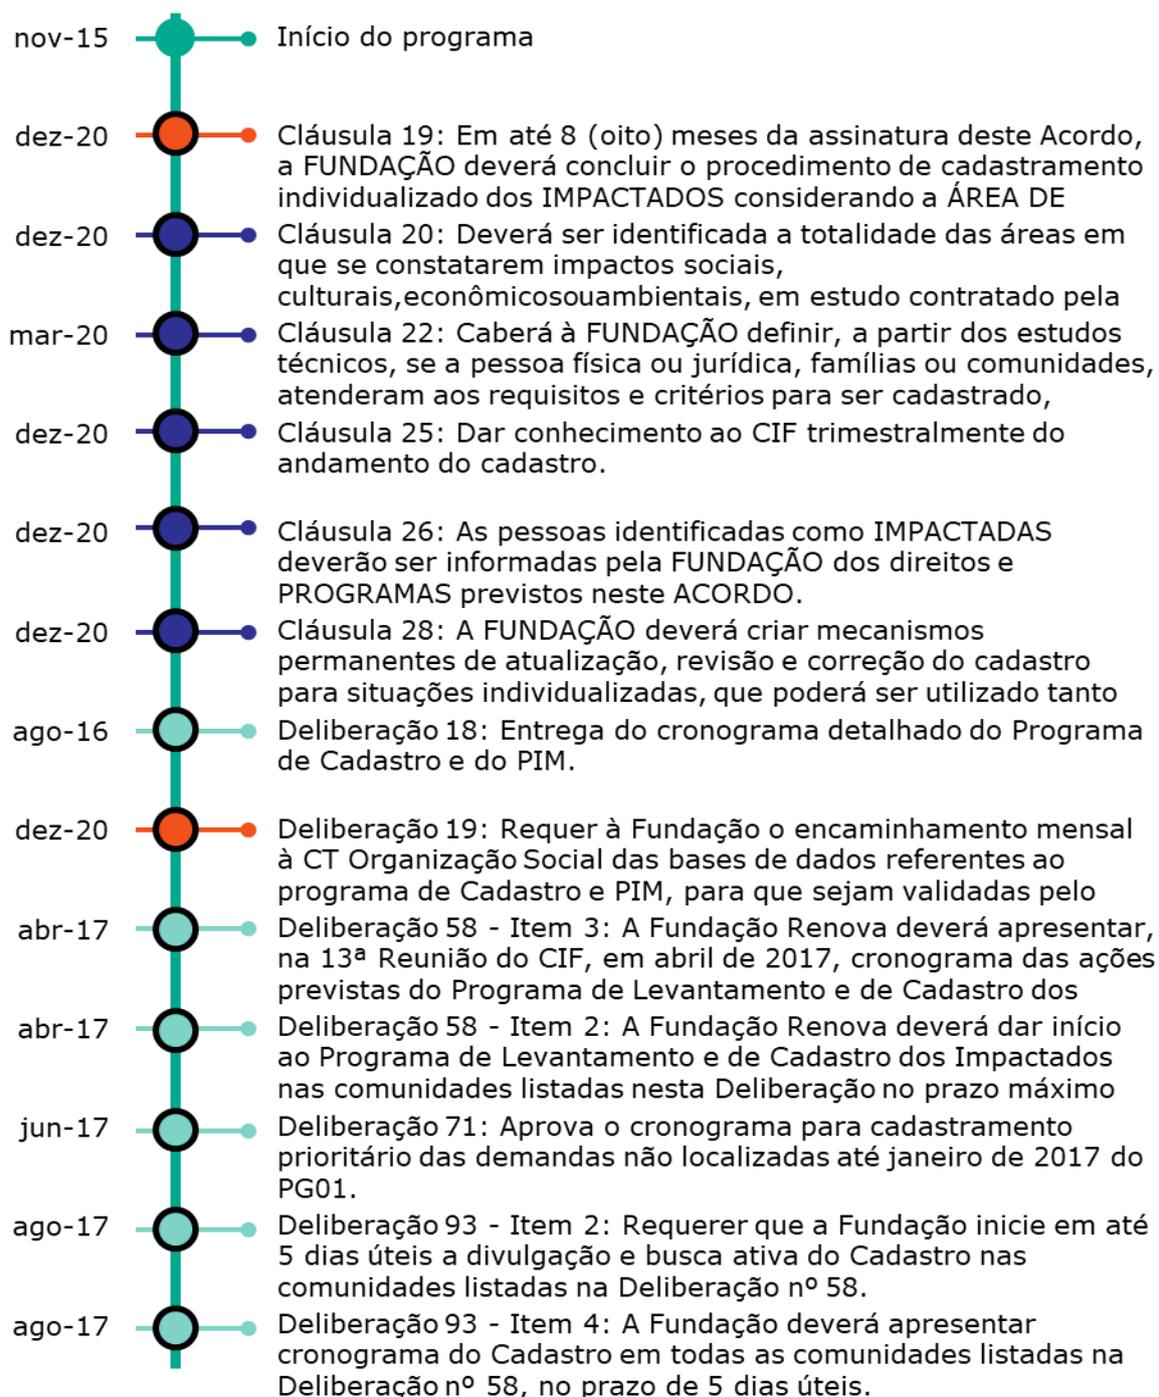

- ago-17 ● Deliberação 93 - Item 6: - Deverão ser apresentados à CTOS, no prazo de 10 dias úteis, os documentos comprobatórios do início da execução das ações requeridas nesta Deliberação.
- set-17 ● Deliberação 93 - Item 3: A Fundação deverá realizar o cadastramento em até 30 dias das demandas registradas até 13/07/17 no serviço 0800 da Fundação por moradores das
- dez-17 ● Deliberação 127 - Item 1.3: Verificar no Cadastro Integrado se existem casos de pessoas ou famílias cadastradas que deveriam ser incluídas no diagnóstico do PG010 e fornecer os resultados ao
- mar-20 ● Deliberação 127 - Item 1.2 e 2: Realizar o cadastro dos impactados não encontrados no Cadastro Integrado durante a 3ª campanha do cadastramento. Que a Fundação Renova faça a
- jan-18 ● Deliberação 141 - Item 2: A Fundação Renova deverá enviar aos solicitantes de Cadastro Integrado, das comunidades abrangidas pela Deliberação CIF nº 58, documento por carta registrada em
- jan-18 ● Deliberação 141 - Item 3: A Fundação Renova deverá iniciar o pagamento efetivo do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), com o devido pagamento dos retroativos, a todos os impactados já
- jan-18 ● Deliberação 141 - Item 4: Conforme determinado no item 2 da Deliberação CIF nº 58, a Fundação Renova deverá promover o direcionamento das comunidades impactadas (listadas no item 1
- jan-18 ● Deliberação 141 - Item 5: A Fundação Renova deverá informar ao CIF e à Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CTOS sobre as providências adotadas para o
- jan-18 ● Deliberação 141 - Item 1: Ratificar o conteúdo da Deliberação CIF nº 58 e da Deliberação CIF nº 93, concluindo pelo não atendimento da Notificação nº 03/2017-13CI/GABIN, com
- jun-18 ● Deliberação 167 - Item 1: Deverá ser apresentado à CTOS um plano de ação até o dia 06/06/18, sem prejuízo do início imediato das ações.
- mar-20 ● Deliberação 167 - Item 3: A Fundação Renova deverá realizar o Cadastro Integrado dos demais impactados, bem como a inserção nos programas socioeconômicos pertinentes, no prazo
- jul-18 ● Deliberação 167 - Item 2: A Fundação Renova deverá incluir nos programas socioeconômicos pertinentes os impactados que já foram inseridos no Programa de Cadastro, no prazo de 45 dias
- fev-19 ● Deliberação 234 - Item 3: Determina que a Fundação Renova realize o cadastramento dos artesãos, artesãs e associações de artesanato, no prazo de 90 dias corridos, com a devida
- mar-19 ● Deliberação 234 - Item 4: Determina que a Fundação Renova apresente o planejamento de atividades com cronograma referente às ações estruturantes necessárias para inclusão de

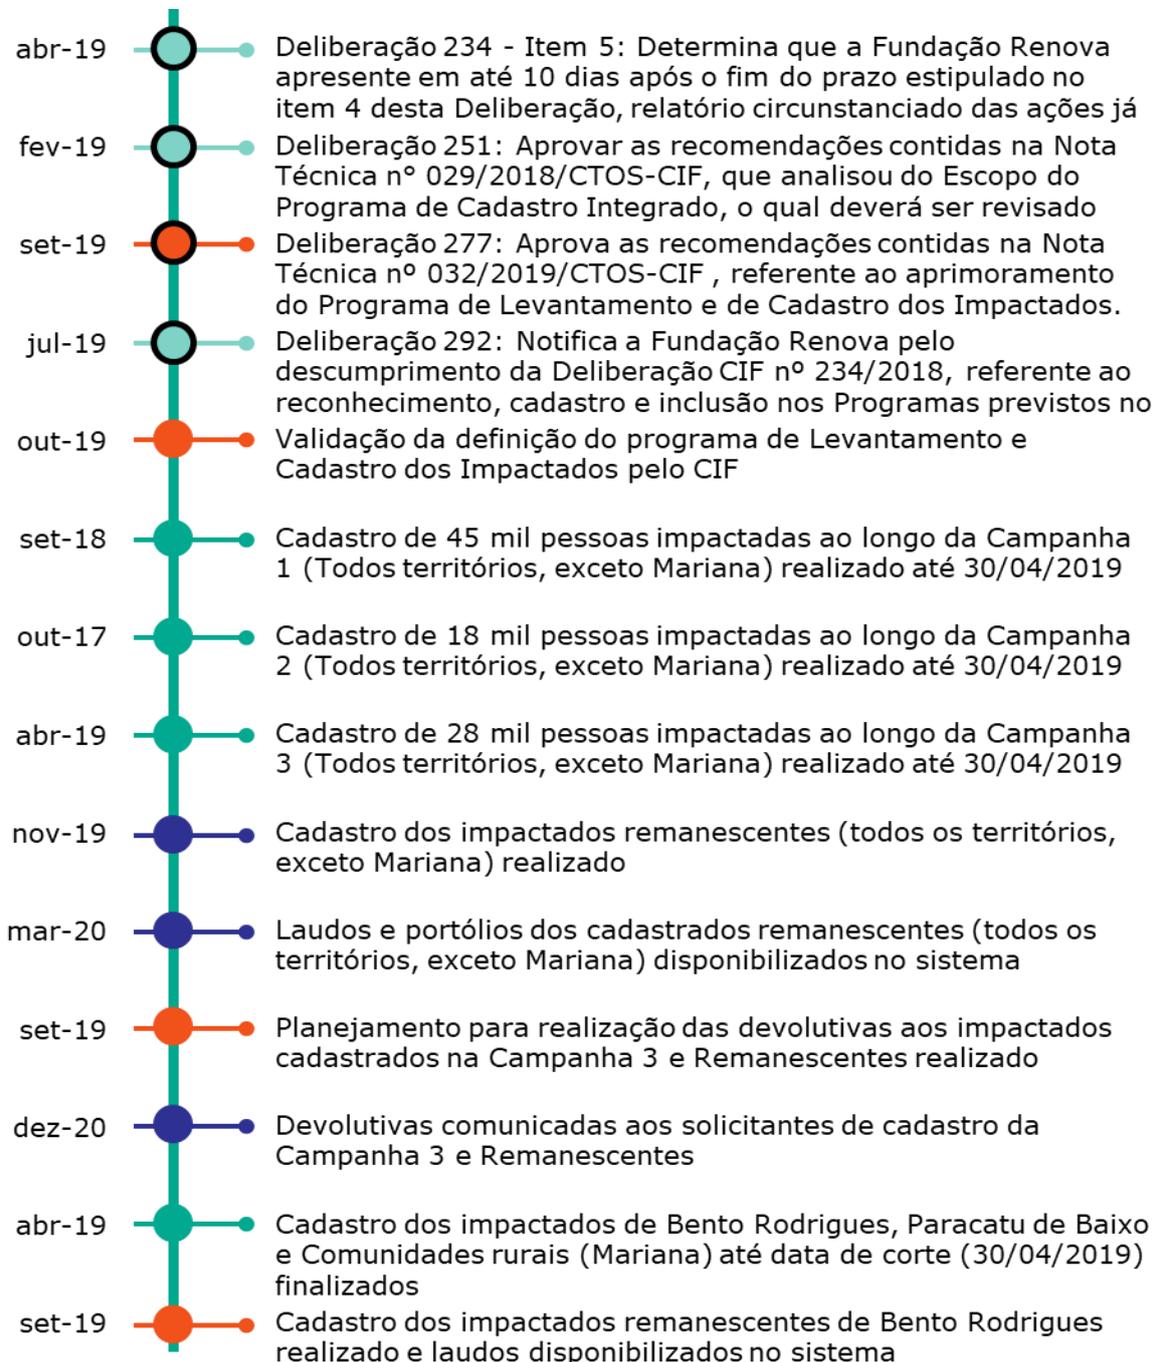

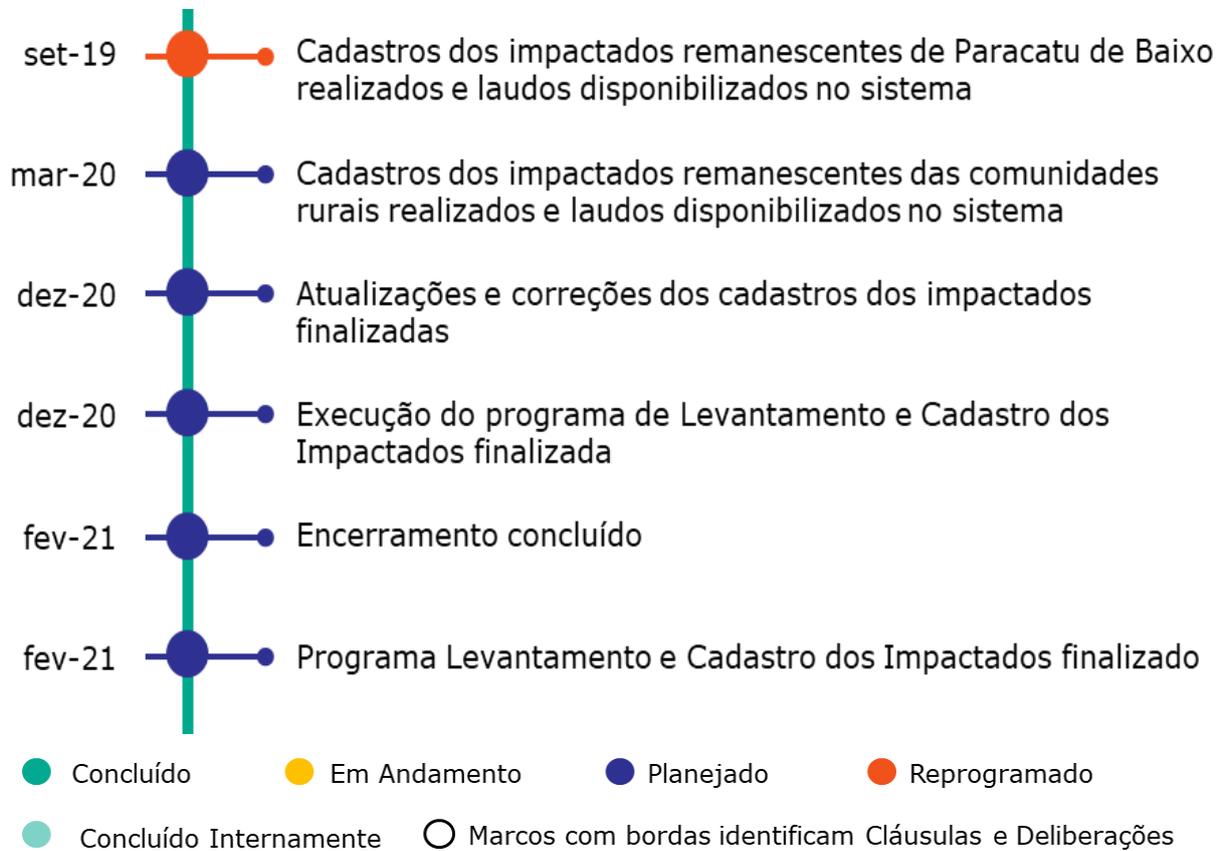

Entregas e fatos relevantes do mês

- No cadastramento de Mariana, foram realizadas 1.177 entrevistas superando a estimativa inicial de 1.175 correspondentes à Fase 1 – aplicação do formulário de cadastro até 31/08/2019. (Fonte: bd_cadastro_mariana_m1_e_2019_08_31).
- O número de vistorias realizadas permaneceu em 641 vistorias (83%) do total estimado de 770 propriedades. O resultado está abaixo da meta para o período em virtude de uma menor mobilização de famílias em relação à capacidade instalada. Ressalta-se que a mobilização é realizada pela Assessoria Técnica da Comissão de Atingidos de Mariana. (Fonte: Controle de Vistoria).
- Foram enviados ao CIF 32.710 cadastros de propriedades referentes às campanhas 1, 2 e 3 (acumulado desde o início do programa até agosto/19), dos quais, 31.807 já estão disponíveis no SGS (Fonte: Lotes CIF e SGS Filtro 572).

Próximas entregas

- Finalizar os cadastros de remanescentes na localidade de Bento Rodrigues. Esta entrega refere-se ao Marco Cadastro dos impactados remanescentes de Bento Rodrigues realizado e laudos disponibilizados no sistema.
- Finalizar os cadastros de remanescentes na localidade de Paracatu de Baixo. Esta entrega refere-se ao Marco Cadastro dos impactados remanescentes de Paracatu de Baixo realizado e laudos disponibilizados no sistema.
- Entregar novo lote de cadastros remanescentes ao CIF, ao longo do mês de Set/19. Esta entrega refere-se ao Marco Cadastro dos impactados remanescentes realizados.

Desafios

- Finalizar a etapa de vistorias e emissão de Laudos, em Mariana;
- Tratar o número de manifestantes “Não Localizados”;
- Aprimorar o processo de cadastramento e de avaliação de impactos;
- Obter aprovação da definição do programa na Câmara Técnica e CIF.

Indicadores/Grandes Números

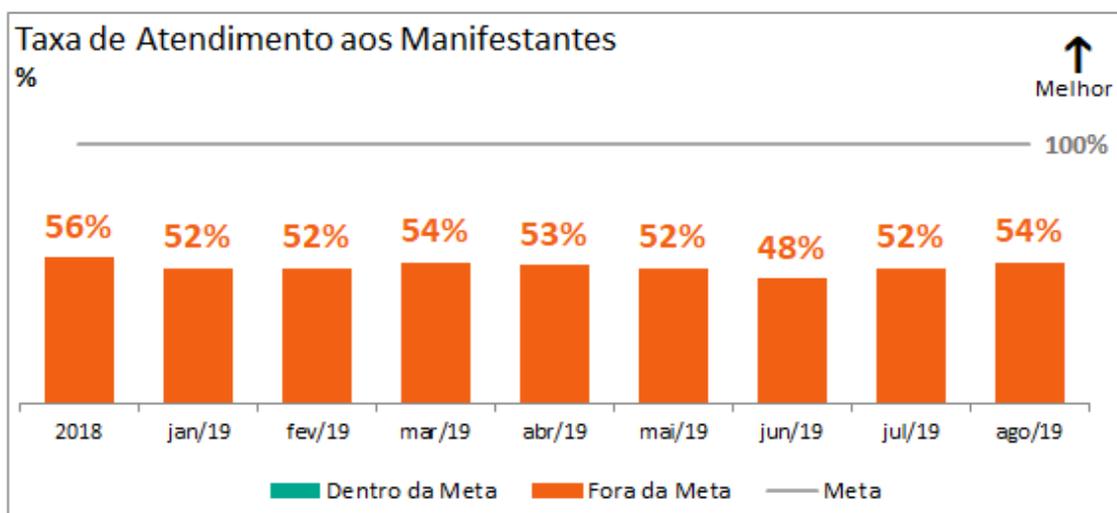


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Fonte: Indicadores CTOS-Agosto-19.

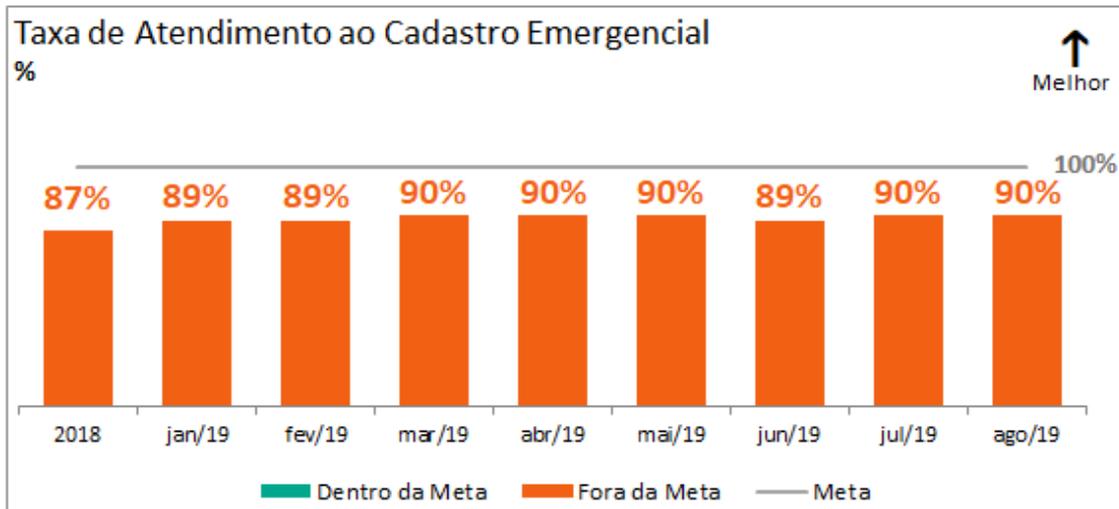


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao Cadastro Emergencial. Fonte: Indicadores CTOS-Agosto-19.

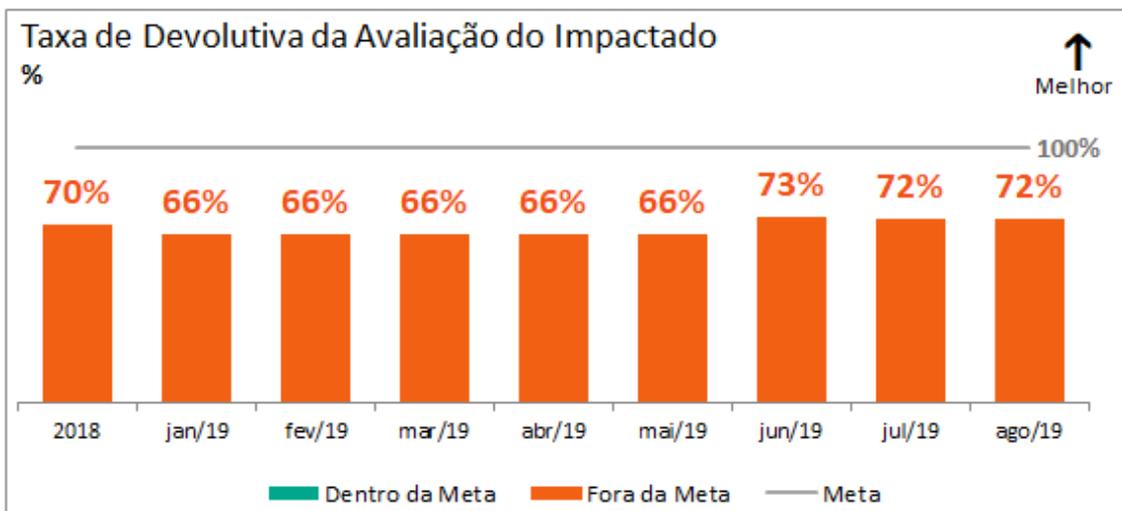


Gráfico 3. Taxa de Devolutiva aos Impactados. Fonte: Indicadores CTOS-Agosto-19.

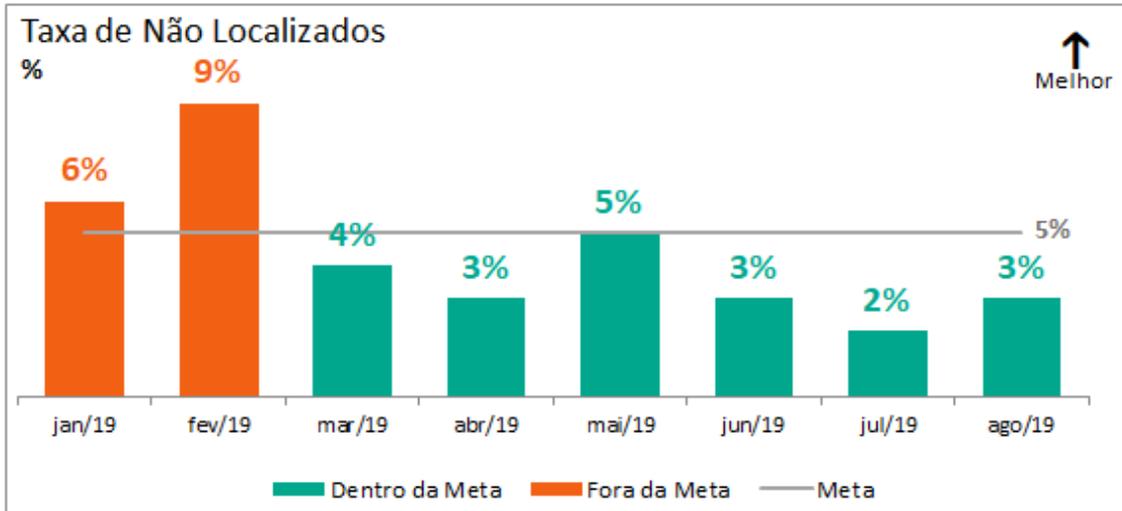


Gráfico 4. Taxa de Não Localizados. Fonte: Indicadores CTOS-Agosto-19.

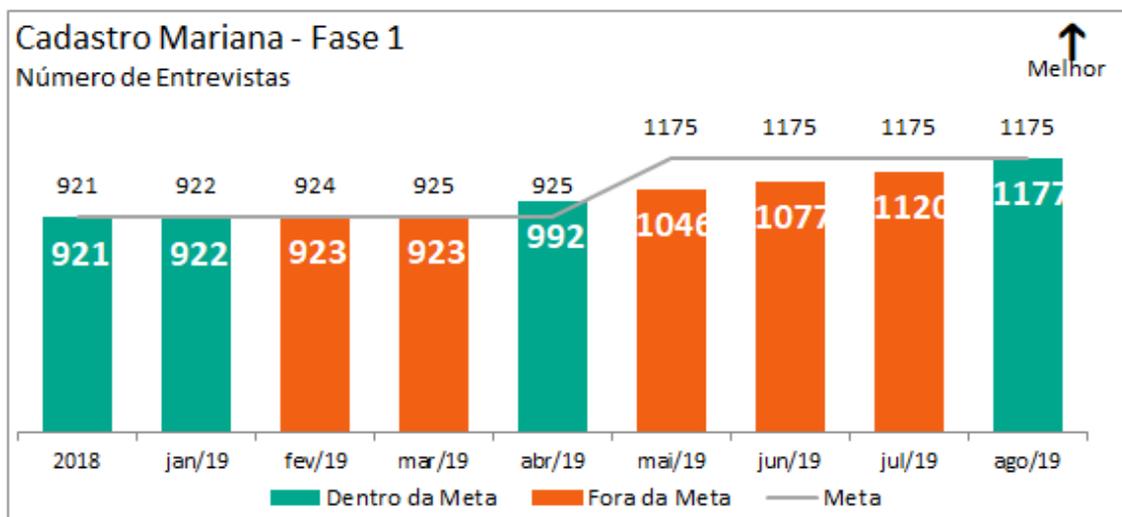


Gráfico 5. Cadastro Mariana - Fase 1. Fonte: bd_cadastro_mariana_m1_e_2019_08_31.

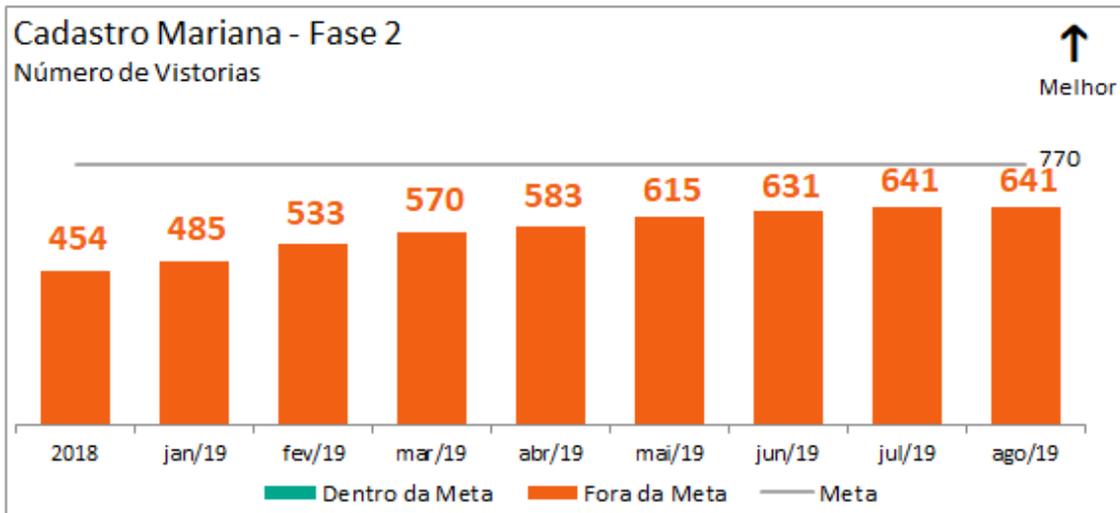


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Fonte: Controle de Vistoria.

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.


Cláusulas do TTAC: 33 – concluída internamente; 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 – reprogramadas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 18, 35, 119, 141, 167, 211, 298 – concluídas internamente; 167, 181, 292 – reprogramadas; 118, 181, 182 – planejadas.

Marcos do Programa

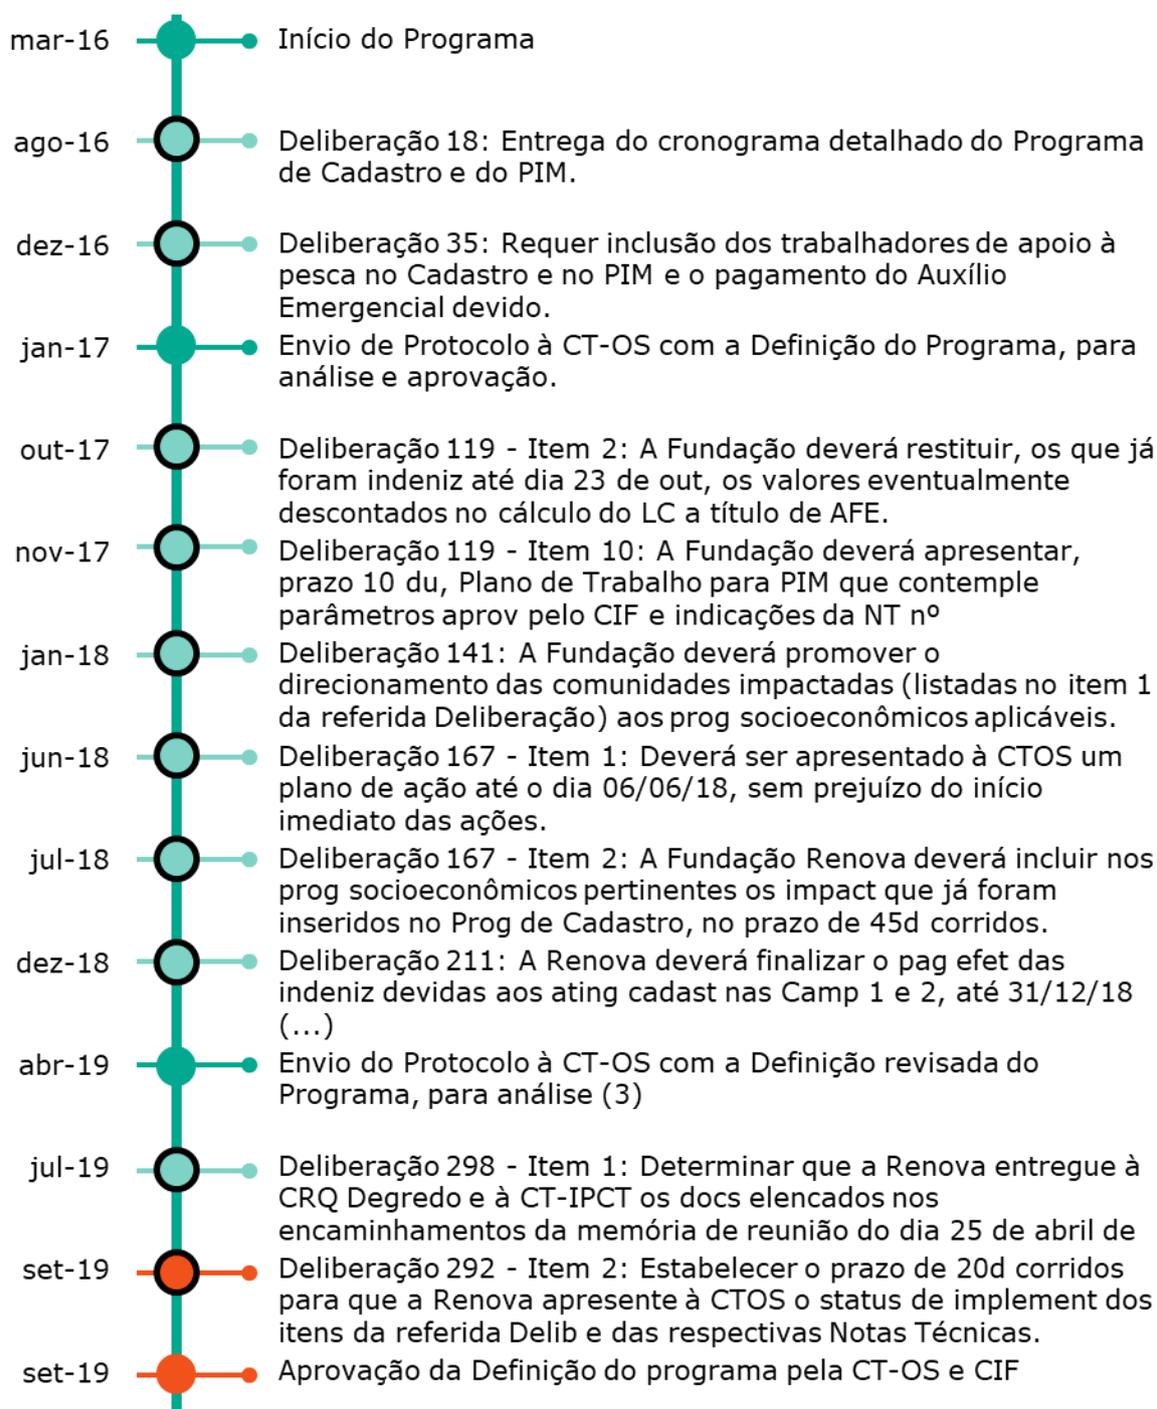

- set-19 ● Deliberação 167 - item 3: A Fundação Renova deverá realizar o Cad Integrado dos demais impactados, bem como a inserção nos prog socioeconômicos pertinentes, no prazo de 90d corridos.
- set-19 ● Deliberação 181 - Item 6: Determina que a Fundação implemente, em até 30d, camp informativa, a fim de que as pessoas que celebraram acordos anteriores (...)
- set-19 ● Deliberação 181 - Item 7: Estabelece que a Fundação apresente à CTOS a lista nominal dos atingidos que alegavam duplo ou múltiplo impacto e assinaram "Termo de Renúncia" (...)
- out-19 ● Finalização das pendências de pagamento de lucro cessante 2018
- dez-19 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas - Escritório Mariana
- mar-20 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas em todos os escritórios exceto Mariana (Campanhas 1 e 2)
- mar-20 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas em todos os escritórios exceto Mariana (Campanha 3)
- jul-20 ● Finalização dos atendimentos e Indenizações pendentes de Dano Água
- jan-21 ● Deliberação 111 - Item 6: Delibera sobre o pagamento das indenizações referentes a danos morais e materiais do PIM e aprova a solicitação de dilação de prazo desse programa. A
- jan-21 ● Deliberação 181 - Item 5: Determina à Fundação que divulgue TERMO DE ACORDO padrão, nos Escritórios do PIM e no site da Fundação, além de sua apresent diretamente nos territórios.
- jan-21 ● Deliberação 181 - Item 8: Deve ser assegurada, no menor espaço de tempo possível, a implement da assess jurídica grat, com independ e equidade, nos termos da Cláusula 37 do TTAC.
- jan-21 ● Deliberação 182 - Item 3: Determina a revisão dos valores das indeniz já pagas a pescadores que declararam no Cadastro Integrado o ofício de pescador(a) profissional.
- jan-21 ● Deliberação 118 - Item 2: Requerer que a Fundação ajuste a red do Termo de Conciliação do PIM, de modo a esclarecer que o pag das indeniz ref aos danos morais e materiais (...)
- jan-21 ● Cláusula 38 - Caput 1: O PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA deverá ser concluído no prazo máximo de 12 (doze) meses da assinatura deste Acordo (...)



- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Pagamento de 213 (duzentas e treze) indenizações das campanhas 1, 2 e 3 (Fonte: P02-BDD-010-00_FluxoIndenizatorio_190902.xlsx);
- Foram realizados 55 (cinquenta e cinco) acordos em Mariana/MG. Os acordos podem ser propostas aceitas ou propostas recusadas. (Fonte: P02-BDD-011-00_Mariana_190830.xlsx);

Próximas entregas

- Continuidade de tratamento dos cadastros das Campanhas 1, 2 e 3. Esta entrega refere-se ao Marco "Atendimentos e pagamentos dos cadastros elegíveis finalizados em todos os escritórios (Campanhas 1, 2 e 3)".
- Continuidade de tratamento dos cadastros em Mariana. Esta entrega refere-se ao Marco "Atendimentos e pagamentos dos cadastros elegíveis do Escritório Mariana finalizados".

Desafios

- Definir as Políticas Indenizatórias pendentes;
- Receber os dossiês da Cáritas para realizar as tratativas em Mariana/MG.

Indicadores/Grandes Números

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO
I02	Cadastros indenizados / Total de cadastros elegíveis ao programa
I04	Total de cadastros que aceitaram proposta / Total de cadastro com proposta apresentada
I06	Cadastros indenizados / Total de cadastros elegíveis à indenização que aceitaram as propostas

Tabela 1. Indicadores. Fonte (Definição do Programa).

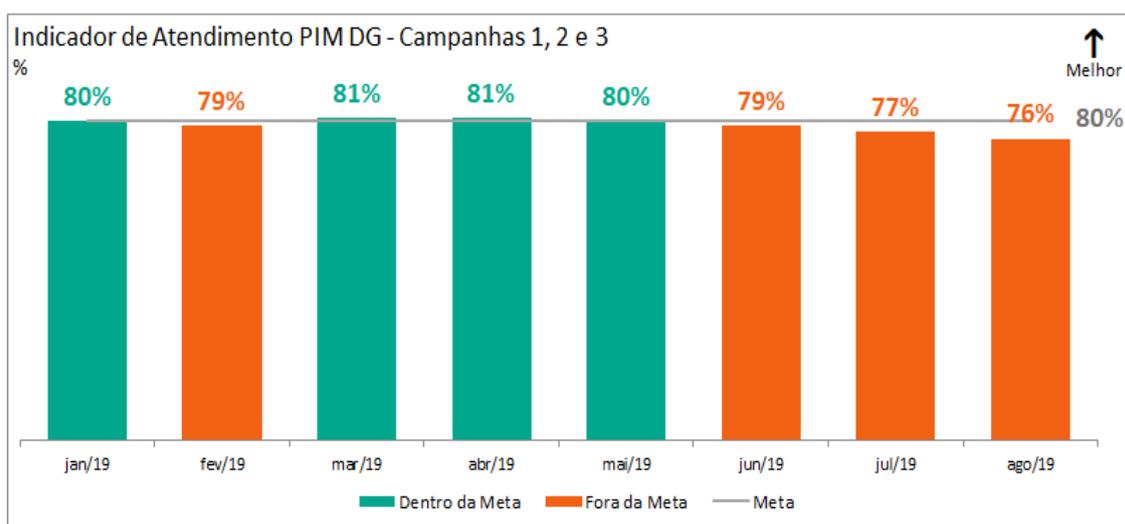


Gráfico 2. Taxa de Atendimento PIM DG (Campanhas 1, 2 e 3). Fonte: P02-BDD-010-00_FluxoIndenizatorio_190902.xlsx.

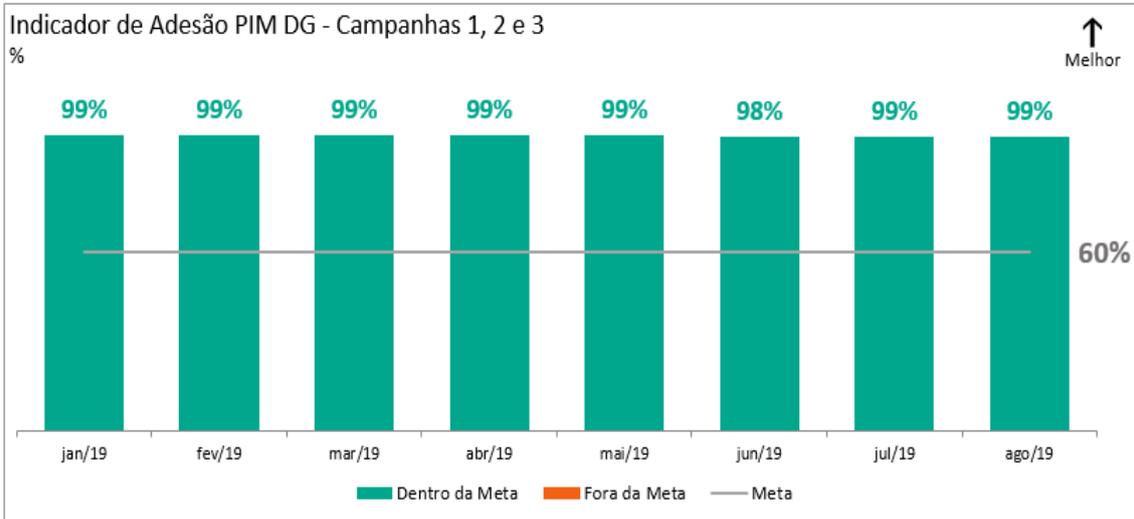


Gráfico 3. Taxa de Adesão PIM DG Mensal (Campanhas 1, 2 e 3).
Fonte: P02-BDD-010-00_FluxoIndenizatorio_190902.xlsx.

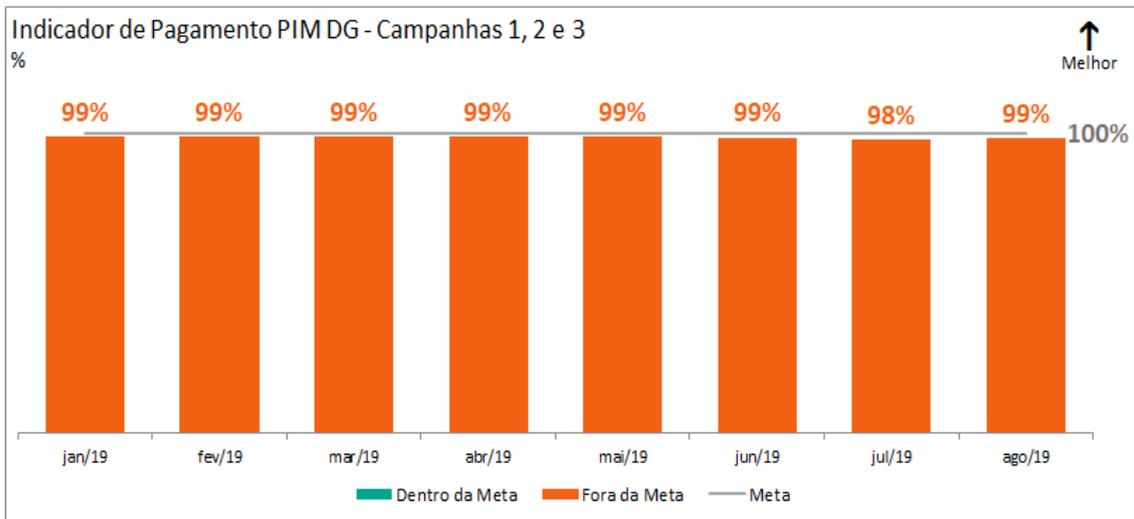


Gráfico 3. Taxa de Pagamento PIM DG Mensal (Campanhas 1, 2 e 3).
Fonte: P02-BDD-010-00_FluxoIndenizatorio_190902.xlsx.

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusulas do TTAC: Cláusulas 39, 43, 44 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberações 169, 201 – Concluída; Deliberações 187, 205, 227 – Concluída internamente; Deliberações 200, 206, 299 – Em andamento.

Marcos do Programa

- mar-16 ● Programa iniciado / Assinatura do TTAC.
- mar-16 ● Cláusula 43: As medidas previstas nos incisos I e II, caso não tenham sido iniciadas, deverão ter início no prazo de até 10 (dez) dias da assinatura do TTAC.
- mar-16 ● Cláusula 44: Serão implementadas medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades e Funai, como previsto nas CLÁUSULAS 40. 41 e 42.
- jun-16 ● Cláusula 43 - Inciso III: Contratar consultoria independente a partir do Termo de Referência a ser apresentado pela Funai, para elaboração de estudo dos impactos sobre os Krenak.
- jun-16 ● Cláusula 44 - Inciso I: Caso seja identificada necessidade, implementar medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a participação da Funai.
- jun-16 ● Cláusula 44 - Inciso III: Contratação de consultoria independente, para elaboração de estudo dos impactos socioambientais e socioeconômicos sobre os TUPINIQUIM.
- jun-18 ● Realização de sondagem referente aos projetos de melhoria de acesso das estradas dos Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- ago-18 ● Deliberação 187 - Item 1: A Fundação Renova deverá apresentar versão reestruturada do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos indígenas.
- ago-18 ● Deliberação 187 - Item 2: O documento elaborado pela Fundação Renova deverá ser entregue à CT-IPCT para nova avaliação, juntamente com o Plano de Comunicação ao público alvo.
- ago-18 ● Deliberação 169: Aprovar a inclusão, a partir de julho de 2018, das famílias indígenas de RESPLENDOR referenciadas na Nota Técnica 008/2018/CT-IPCT/CIF.
- out-18 ● Deliberação 205 - Item 3: A Fundação Renova deverá apresentar o Plano de Contingência para Cheias referente a todas as terras indígenas atingidas até 15 de outubro de 2018.
- nov-18 ● Deliberação 205 - Item 2: Determina a reapresentação do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos indígenas, pela Fundação Renova.
- dez-18 ● Deliberação 231 - Item 1: A Renova deverá realizar reuniões com as Comunidades em até 30 dias e enviar o que foi discutido nas reuniões, com a cópia da lista de presença, para a CT-IPCT.
- dez-18 ● Deliberação 227 - Item 1: Orienta que o tratamento às aldeias das Terras Indígenas Tupiniquim e Guarani seja isonômico e determina início imediato das ações estruturantes.

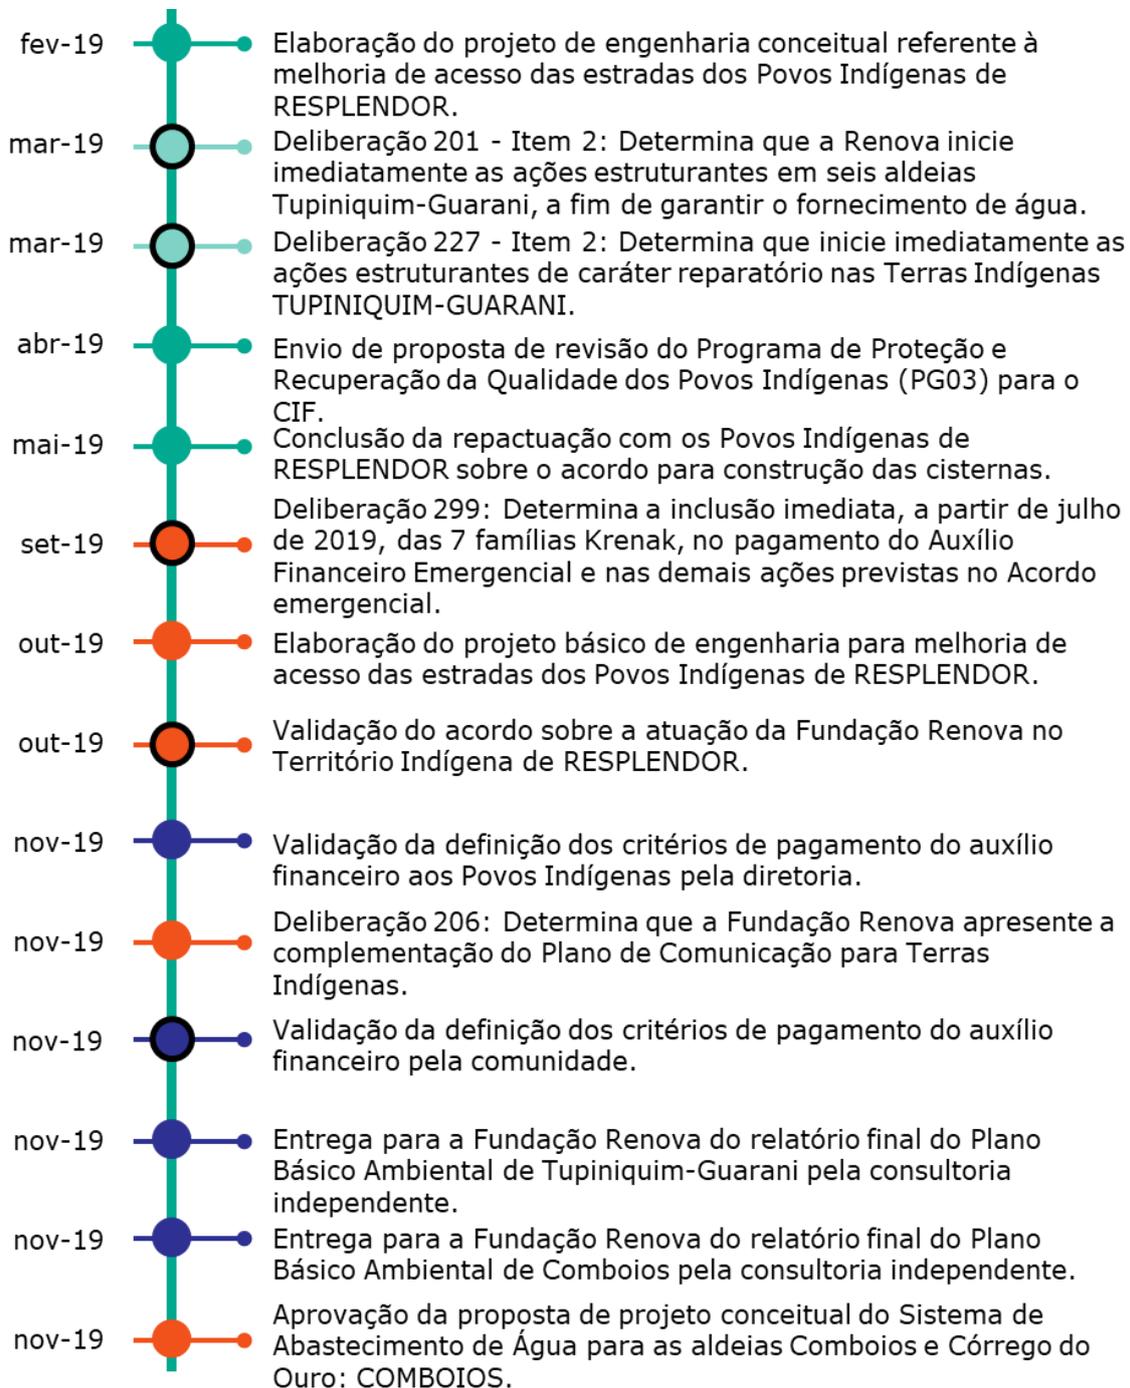

- nov-19  Aprovação da proposta de projeto conceitual do Sistema de Abastecimento de Água para as aldeias Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos D'Água: TUPINIQUIM-GUARANI.
- dez-19  Consolidação das diretrizes para indenização de Povos Indígenas.
- dez-19  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos Indígenas à diretoria da Fundação Renova (Resplendor).
- dez-19  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos Indígenas à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim-Guarani).
- dez-19  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos Indígenas à diretoria da Fundação Renova (Comboios).
- dez-19  Validação com a comunidade dos Povos Indígenas de Resplendor da proposta técnica do sistema convencional de abastecimento de água.
- mar-20  Cláusula 43 - Inciso IV: Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo previsto no inciso III da mesma cláusula.
- abr-20  Cláusula 44 - Inciso IV: Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso III da mesma cláusula.
- abr-20  Cláusula 44 - Inciso V: Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso III da mesma cláusula.
- abr-20  Aprovação pelo CIF do Estudo do Componente Indígena (ECI) e Plano Básico Ambiental (PBA) de TUPINIQUIM-GUARANI.
- abr-20  Aprovação pelo CIF do Estudo do Componente Indígena (ECI) de Comboios.
- mai-20  Elaboração do projeto detalhado de engenharia para melhoria de acesso das estradas dos Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- jul-20  Aprovação dos projetos conceituais do Sistema de Abastecimento de Água para as aldeias Comboios e Córrego do Ouro: COMBOIOS.
- jul-20  Aprovação dos projetos conceituais do Sistema de Abastecimento de Água para as aldeias Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos D'Água: TUPINIQUIM-GUARANI.

- jul-20  Validação da revisão do programa pela Câmara Técnica, CIF e Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- set-20  Definição do processo de indenização para Comunidades do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos Indígenas.
- out-20  Finalização do projeto de engenharia do Sistema de Abastecimento de Água complementar dos Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- dez-20  Realização de acordo sobre 2ª contratação de distribuição de água bruta, potável e mineral com os Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- dez-20  Entrega das obras do Sistema de Abastecimento de Água convencional dos Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- dez-20  Aprovação, pela câmara técnica e sistema CIF, do Estudo do Componente Indígena (ECI) dos Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- dez-20  Cláusula 44 - Inciso II: Execução e monitoramento contínuo das medidas de apoio emergencial, caso cabíveis nos termos do inciso I.
- jan-21  Conclusão do plano de indenização dos Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- jan-21  Conclusão do plano de indenização dos TUPINIQUIM-GUARANI.
- jan-21  Encerramento das ações transitórias (pagamento de indenizações e elaboração de estudos)/ pactuação dos TUPINIQUIM-GUARANI.
- jan-21  Conclusão do plano de indenização dos COMBOIOS.
- fev-21  Realização das manutenções das estradas dos Povos Indígenas de RESPLENDOR.
- fev-21  Aprovação do Sistema de Abastecimento de Água Convencional Povos Indígenas de RESPLENDOR pela FUNAI, indígenas e DSEI.
- mar-21  Cláusula 43 - Inciso V: Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano Básico Ambiental.





Entregas e fatos relevantes do mês

- Pagamento do Auxílio Financeiro às famílias atendidas - 130 famílias na Terra Indígena de Resplendor ; 192 famílias na Terra Indígena de Comboios; 1.122 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani (Fonte: P03-CPR-000-00_AFE__Pagamento_Krenak_Agosto19 e P03-CPR-000-00_AFE Comboios e Tupiniquim-Guarani_Agosto19);
- Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – 5 litros por pessoa por dia de Água Mineral; média de, aproximadamente, 1.000 litros por dia, em 142 pontos de abastecimento, de água potável; média de, aproximadamente, 1.000 litros por dia, em 103 pontos de abastecimento, de água bruta (Fonte: 03_SUP-RLA-4800005402-190721_A_190820; P03-CPR-000-00_AbastecimentoÁgua_Agosto 19):
- Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias (Fonte: 03_SUP-RLA-4800005402-190721_A_190820);
- Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25kg para 100 famílias (Fonte: 03_SUP-RLA-4800005402-190721_A_190820);
- Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias (Fonte: 03_SUP-RLA-4800005402-190721_A_190820);
- Elaboração de análises laboratoriais das coletas de água, sedimentos e organismos aquáticos (ictofauna e invertebrados) dos Povos Indígenas Tupiniquim-Guarani (Fonte: P03-CPR-000-00_2ªcoletaPolifônicas_Agosto19);

- Elaboração de análises laboratoriais das coletas de água, sedimentos e organismos aquáticos (ictofauna e invertebrados) dos Povos Indígenas Comboios (Fonte: P03-CPR-000-00_2ªcoletaPolifônicas_Agosto19);
- O atendimento da deliberação 299, que determina a inclusão de 7 famílias Krenak no pagamento do auxílio financeiro emergencial, não foi concluído. Para que o pagamento seja executado, as associações precisam atender às recomendações e condições de elegibilidade que estão em andamento, conforme solicitado pelo Conselho curador;
- As alternativas de projetos dos Sistemas de Abastecimento de Água de Tupiniquim-Guarani não foram concluídas e estão planejadas para serem finalizadas em setembro de 2019.

Próximas entregas

- Definir as alternativas conceituais do Sistema de Abastecimento de Água de Tupiniquim-Guarani e Comboios. Essa entrega refere-se ao marco “Aprovação da proposta de projeto conceitual do SAA para as aldeias Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos D’Água: TUPINIQUIM-GUARANI”;
- Realizar acordo sobre Processo Transitório da Fundação Renova no Território Indígena de RESPLENDOR. Essa entrega refere-se ao marco “Validação do acordo sobre a atuação da Fundação Renova no Território Indígena de RESPLENDOR”;
- Preparar apontamentos com as áreas internas para reunião com a consultoria independente Polifônicas sobre o Estudo de Componente Indígena TUPINIQUIM-

GUARANI e COMBOIOS. Essa entrega refere-se ao marco “Relatório primeira atividade de Campo do PBA recebido: TUPINIQUIM-GUARANI”;

- Realizar reunião com a consultoria independente Polifônicas para esclarecimentos e apontamentos técnicos sobre o Estudo de Componente Indígena TUPINIQUIM-GUARANI e COMBOIOS. Essa entrega refere-se ao marco “Relatório primeira atividade de Campo do PBA recebido: TUPINIQUIM-GUARANI”;

Desafios

- Realizar acordo sobre Processo Transitório da Fundação Renova na Terra Indígena Resplendor.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusulas do TTAC: Cláusula 46 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo:


Deliberação 154, 161, 203, 204, 255, 256 e 300 – Concluída internamente; Deliberação 155, 202, 232, 233, 281 e 298 – Em andamento; Deliberação 280 – Em andamento.


Marcos do Programa

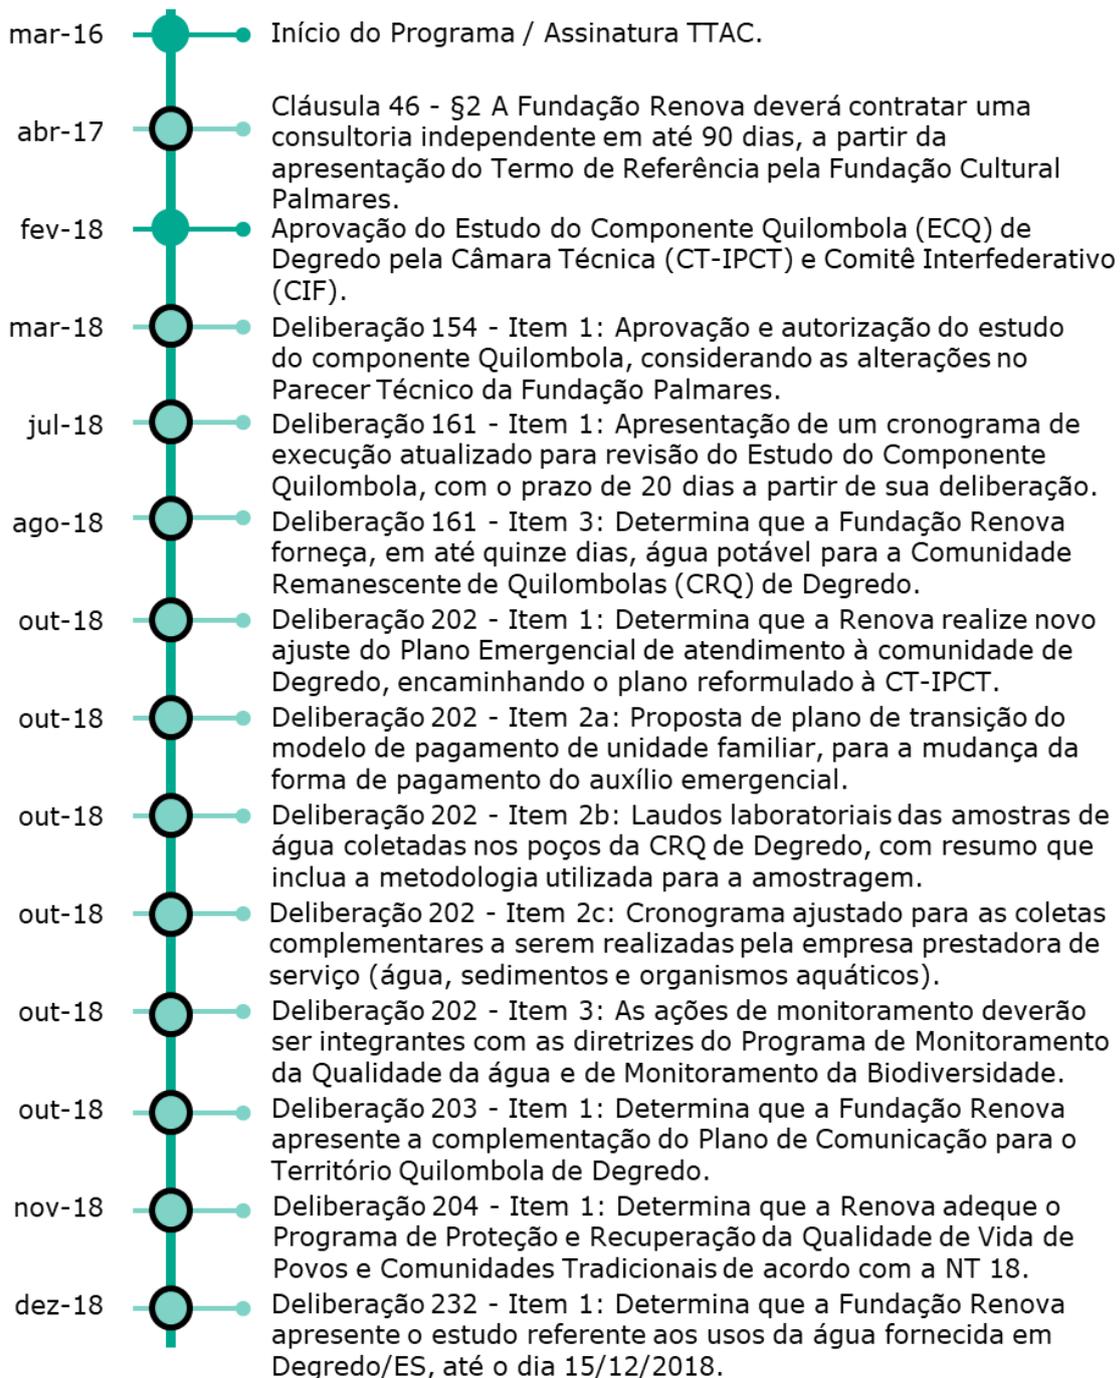

- dez-18 ● Aprovação do plano de comunicação para a Comunidade de Degredo.
- fev-19 ● Deliberação 256 - Item 3: A Renova deverá apresentar a CT-IPCT e as Câmaras Técnicas interessadas, um relatório dos encaminhamentos e pactuações realizados junto a Prefeitura de Linhares.
- fev-19 ● Deliberação 255 - Item 5: Define diretrizes para os estudos de avaliação de risco ambiental e de avaliação de risco à saúde humana nos povos indígenas e comunidades tradicionais.
- fev-19 ● Deliberação 256 - Item 1: Aprova o Relatório Intercâmaras nº001/2018/CT-IPCT/CT-SHQA/CT-BIO/CT-GRSA/CT-Saúde e da NT 14/2018 com ações previstas para a CRQ Degredo.
- fev-19 ● Deliberação 256 - Item 2: A Fundação Renova deverá apresentar cronograma de novas campanhas de coletas de água, solo, sedimentos e organismos aquáticos em Degredo.
- mar-19 ● Validação do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) pela Comunidade Remanescente de Quilombolas (CRQ) de Degredo.
- jun-19 ● Deliberação 280 - Item 4: A Fundação Renova deverá apresentar em até 15 (quinze) dias o cronograma para execução dos Estudos Ambientais Complementares.
- jun-19 ● Deliberação 280 - Item 1: A Renova deverá apresentar a versão final do Estudo do Componente Quilombola (ECQ) para o Comitê Interfederativo, para a CT-IPCT e para a CRQ de Degredo.
- jun-19 ● Deliberação 281 - Item 1: O Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) deverá ser remetido à CT-IPCT e as cópias da versão final deverão ser entregues à Comissão Local de Atingidos.
- jul-19 ● Deliberação 298 - Item 1: Determina que a Renova entregue à CRQ de Degredo e à CT-IPCT os documentos de memória da reunião do dia 25 de abril de 2019, no prazo de 10 (dez) dias.
- jul-19 ● Deliberação 202 - Item 4: Alteração do item 2 da Deliberação CIF 188, a fim de o fornecimento de água potável ser de 15 litros de água por pessoa por dia em Degredo.
- jul-19 ● Implementação do aumento do fornecimento de água (15L por pessoa por dia) para Comunidade de Degredo.
- ago-19 ● Deliberação 161 - Item 2: Determina que a Renova efetive o pagamento do retroativo do auxílio emergencial em parcela única às famílias beneficiárias da CRQ de Degredo, a ser efetivada no mês de julho de 2018.
- ago-19 ● Regularização dos pagamentos retroativos de Degredo.



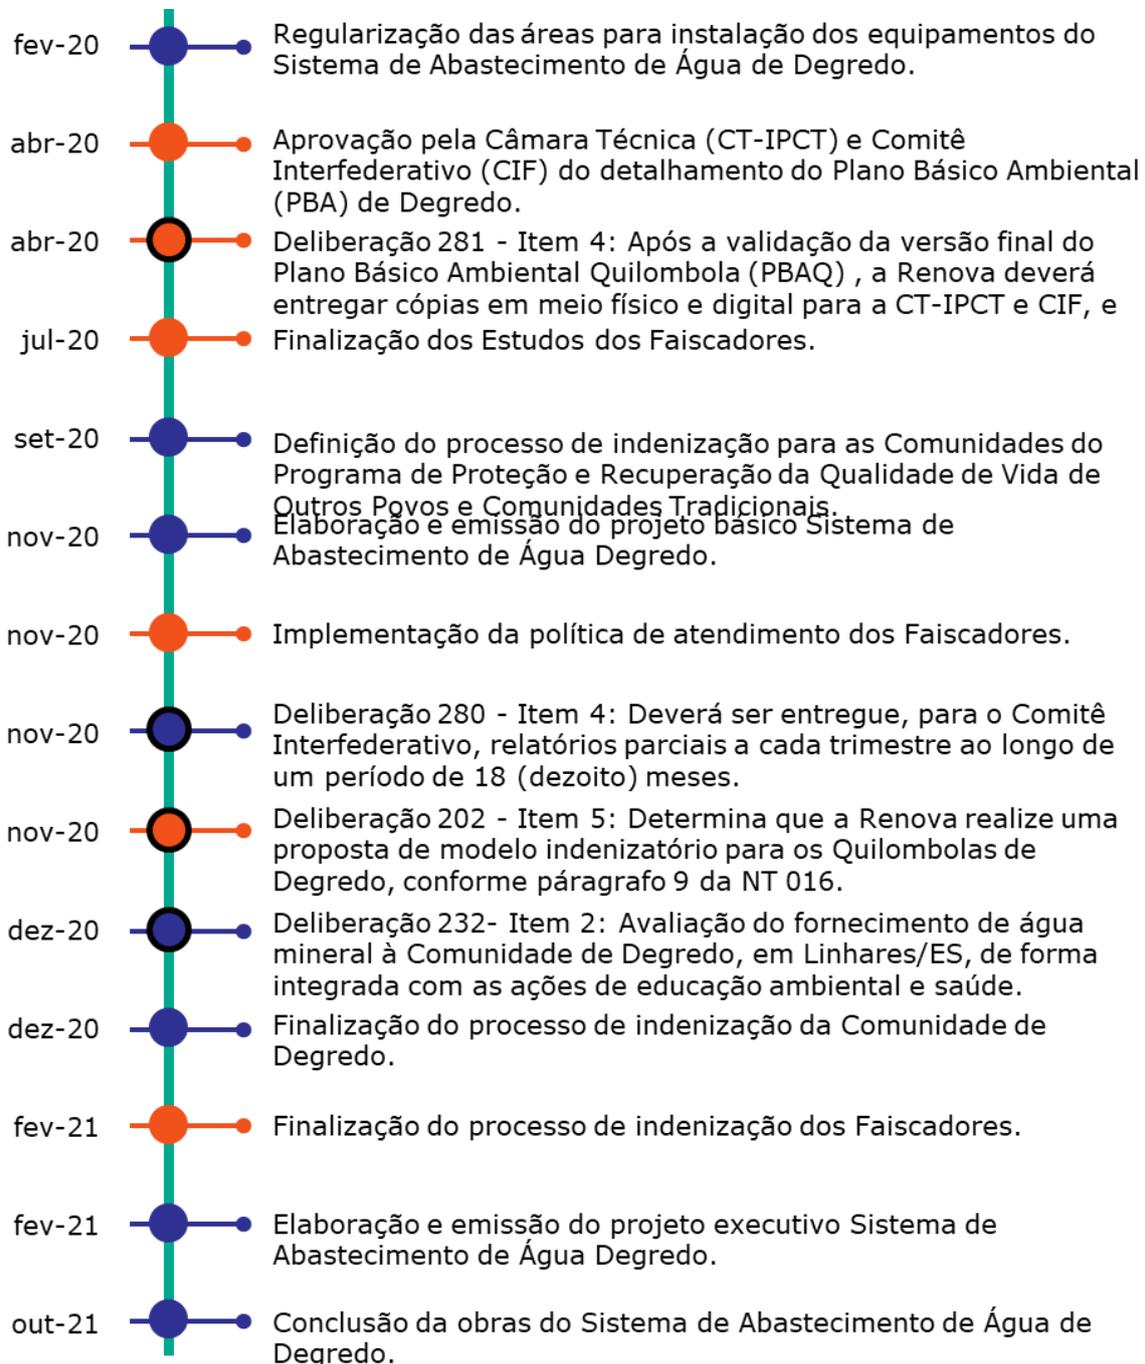

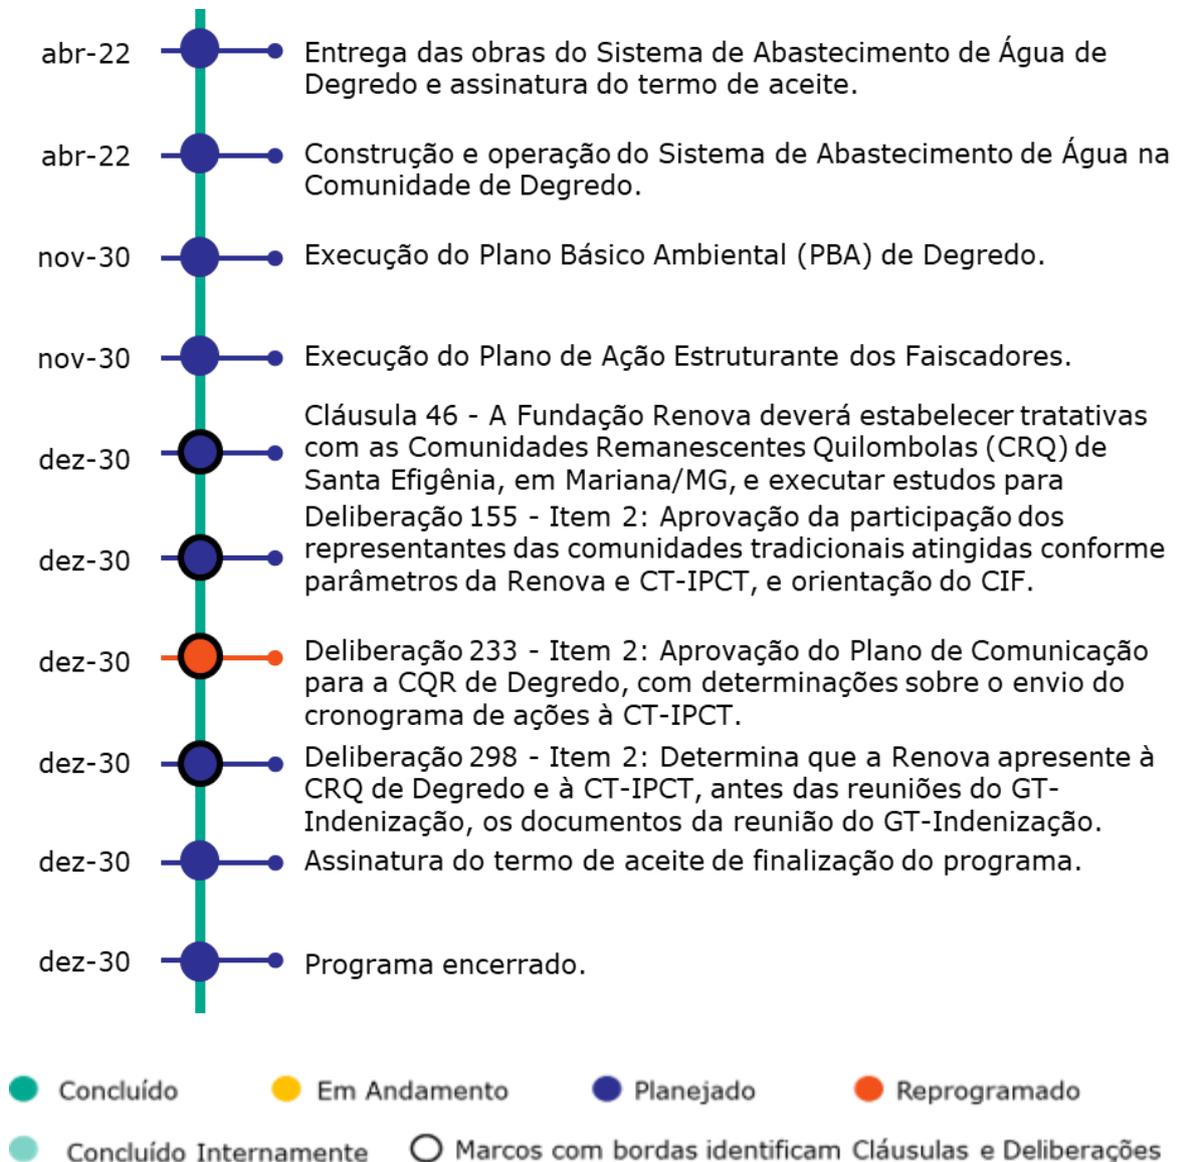

Entregas e fatos relevantes do mês

- Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos titulares das famílias elegíveis de Degredo - 179 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo (Fonte: P04-AFE-000-00_Evidência AFE_Agosto19);
- Atendimento da deliberação 161 – Item 2: “Determinar que a Fundação Renova efetive o pagamento do retroativo do auxílio emergencial em parcela única a todas as famílias beneficiárias do auxílio emergencial na CRQ-Degredo, a ser efetivada no mês de julho de 2018” (Fonte: P04-CPR-000-00_PagamentoRetroativoAuxílioFinanceiro_Agosto2019);
- Emissão do relatório do terceiro ciclo de atividades do Estudo de Mapeamento de Outras Comunidades Tradicionais (Fonte: P04-CPR-000-00_3ºRelatorioMapeamento_Agosto19);
- Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 15 litros por pessoa por dia (Fonte: P04-CPR-000-00_DistribuiçãoÁguaDegredo_Agosto19);
- Aprovação do aditivo para realização do detalhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) para Comunidade de Degredo (Fonte: P04-CPR-000-00_PedidoH&P_Agosto19);
- Emissão do projeto conceitual do sistema de abastecimento de água de Degredo (Fonte: P04-CPR-000-00_Projeto_Conceitual_Degredo_Agosto19);
- Reunião com instituições públicas e Comissão de Moradores de Degredo para apresentação e aprovação do projeto conceitual do sistema de abastecimento de água (Fonte: P04-CPR-000-00_FotosReuniãoDegredo_Agosto19);

- Continuidade dos registros dos pontos de coleta de água para o estudo hidro geológico da Bacia do Rio Doce e zona costeira de Degredo (Fonte: P03-CPR-000-00_RDOContinuidadeRegistroPonto_Agosto19);
- A etapa de Levantamento de Campo (cadastro de pontos de coleta e coleta de amostras de água) do Estudo Hidro geológico não foi concluída. A empresa MDGEO, junto com representantes da Renova, optou por realizar a coleta de amostras de água com apenas uma equipe para minimizar os impactos na Comunidade de Degredo.

Próximas entregas

- Atualizar o prazo da deliberação 281 – Item 3. Essa entrega refere-se ao marco “O cronograma de execução deverá ser encaminhado à CT-IPCT em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento desta deliberação, já devidamente acompanhado dos Planos de Ação e de Negócios e da versão final do PBAQ.”;
- Concluir etapa de Levantamento de Campo do Estudo Hidro geológico da Bacia do Rio Doce e zona costeira relacionado à avaliação da qualidade da água na Comunidade de Degredo. Essa entrega refere-se ao marco Levantamento de Campo de Degredo finalizado.

Desafios

- Definir plano de trabalho para definição do processo de indenização de outros povos e Comunidades Tradicionais em conjunto com a área de Políticas de indenização e Curadoria de Impactos;
- Realização, pela Fundação Renova, das validações internas da proposta de revisão do programa acordada com a Comunidade de Degredo;
- Finalizar a etapa de Levantamento de Campo do Estudo Hidro geológico da Bacia do Rio Doce e zona costeira relacionado à avaliação da qualidade da água na Comunidade de Degredo.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com deslocamento físico.

Cláusulas do TTAC: Cláusula 58 concluída internamente e 54 em andamento.


Deliberações que impactam em escopo e prazo: Deliberação 141, 167, 180, 192 e 278 concluídas internamente. Deliberação 111 em andamento.

Marcos do Programa

- abr-16 ● Início do Programa de Proteção Social.
- abr-16 ○ Cláusula 58: Iniciar o Programa em até 30 (trinta) dias da assinatura deste acordo e terá duração de 36 meses, a contar do seu início.
- ago-17 ● Mobilização de equipe suplementar de Barra Longa (contrato atual).
- jan-18 ○ Deliberação 141 - Item 4: Promover o direcionamento das comunidades impactadas aos programas socioeconômicos aplicáveis.
- jun-18 ○ Deliberação 167 - Item 1: Apresentar à CTOS (Câmara Técnica de Organização Social) um plano de ação até o dia 06/06/18, sem prejuízo do início imediato das ações.
- jul-18 ● Elaboração dos planos de reparação em Proteção Social para apoio às políticas públicas e assistência social.
- jul-18 ○ Deliberação 167 - Item 2: Incluir nos programas socioeconômicos pertinentes os impactados que já foram inseridos no Programa de Cadastro, no prazo de 45 dias.
- ago-18 ○ Deliberação 167 - Item 3: Realizar o Cadastro Integrado dos demais impactados, bem como a inserção nos programas socioeconômicos pertinentes, no prazo de 90 dias.
- ago-18 ○ Deliberação 180 - Item 1: Assumir, em 30 dias, o pagamento de aluguel para as famílias identificadas pela Defesa Civil (Linhares e Sooretama) e atingidas pelo alagamento da lagoa Juparanã.
- out-18 ○ Deliberação 192 - Item 2: Revisar, em até 30 dias, o documento de Definição do Programa de Proteção Social.
- abr-19 ● Entrega do imóvel para funcionamento do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) para o município de Mariana.
- mai-19 ○ Deliberação 278 - Item 1.2: Implementar as medidas para a suplementação das equipes técnicas, conforme descrição e acordo nos Planos Estaduais de Proteção Social e Municipais.
- mai-19 ● Aprovação da APRO para ações do Plano de Reparação em Proteção Social nos municípios da Calha do Rio Doce (Demais Municípios).
- mai-19 ● Aprovação da APRO para ações do Plano de Reparação em Proteção Social nos municípios da Calha do Rio Doce (Planos Estaduais com ações nos Municípios).

- mai-19 ● Entrega do Mobiliário/equipamentos para CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de Mariana.
- mai-19 ● Homologação com o Município de Mariana dos Planos de reparação em Proteção Social.
- mai-19 ● Entrega do Mobiliário/equipamentos para Unidade de Acolhimento à Mulher e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.
- mai-19 ● Deliberação 278 - Item 1.3: Apresentar em 30 (trinta) dias, em caráter definitivo, o escopo do Programa de Proteção Social.
- mai-19 ● Deliberação 278 - Item 1.1: Iniciar a execução das ações necessárias para viabilizar os insumos necessários, conforme previsto nos Planos Municipais de Reparação em Proteção Social.
- mai-19 ● Conclusão do 1o Repasse de verba para suplementação de mão de obra para Mariana.
- jul-19 ● Definição do Programa de Proteção Social apresentada na reunião mensal da CTOS (Câmara Técnica de Organização Social).
- jul-19 ● Conclusão do processo de suprimentos para implementação de brinquedoteca em Barra Longa.
- ago-19 ● Entrega das Brinquedotecas para o município de Mariana.
- ago-19 ● Conclusão do processo de Suprimentos para contratação da Equipe Territorial - Equipe de apoio para execução das medidas mitigatórias.
- set-19 ● Assinatura do termo de parceria pela Fundação Renova e município de Barra Longa.
- set-19 ● Elaboração dos planos de ação integrados entre o Programa de Proteção Social e os programas de Cadastro, Pesca, Agroflorestal e Economia e Inovação.
- set-19 ● Envio da definição do Programa de Proteção Social para o CIF pela CTOS (Câmara Técnica de Organização Social) ou Fundação Renova.
- set-19 ● Entrega dos veículos locados para atender Mariana ao Município.

- out-19 ● Entrega dos veículos locados para atendimento aos municípios da Calha do Rio Doce.
- out-19 ● Visita aos Municípios, adequação dos planos de reparação em Proteção Social e assinatura dos termos de parceria com os municípios da Calha do Rio Doce (Demais Municípios).
- out-19 ● Entrega da Brinquedoteca para o município de Barra Longa.
- out-19 ● Entrega de Mobiliários e equipamentos para CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de Barra Longa.
- out-19 ● Aprovação do Plano de reparação em Proteção Social de MG pelo Sistema CIF (Planos Estaduais com ações nos Municípios).
- out-19 ● Aprovação do Plano de Reparação em Proteção Social do ES pelo Sistema CIF (Planos Estaduais com ações nos Municípios).
- out-19 ● Elaboração dos Planos de Reparação em Proteção Social dos municípios da Calha do Rio Doce e aprovação pelo CIF (Planos Estaduais com ações nos Municípios).
- nov-19 ● Conclusão das oficinas de educação financeira no ES.
- nov-19 ● Capacitação dos operadores da Proteção Social em Mariana.
- dez-19 ● Capacitação de operadores da Proteção Social em Barra Longa.
- dez-19 ● Conclusão das oficinas de educação financeira em MG.
- dez-19 ● Mobilização de equipe suplementar de Mariana para atendimento a população e população atendida (contrato atual).
- mar-20 ● Conclusão das oficinas de capacitação da Proteção Social da Calha do Rio Doce (Demais Municípios).
- abr-20 ● Entrega do Mobiliário/Equipamentos para equipes suplementares à Calha do Rio Doce (Demais Municípios).

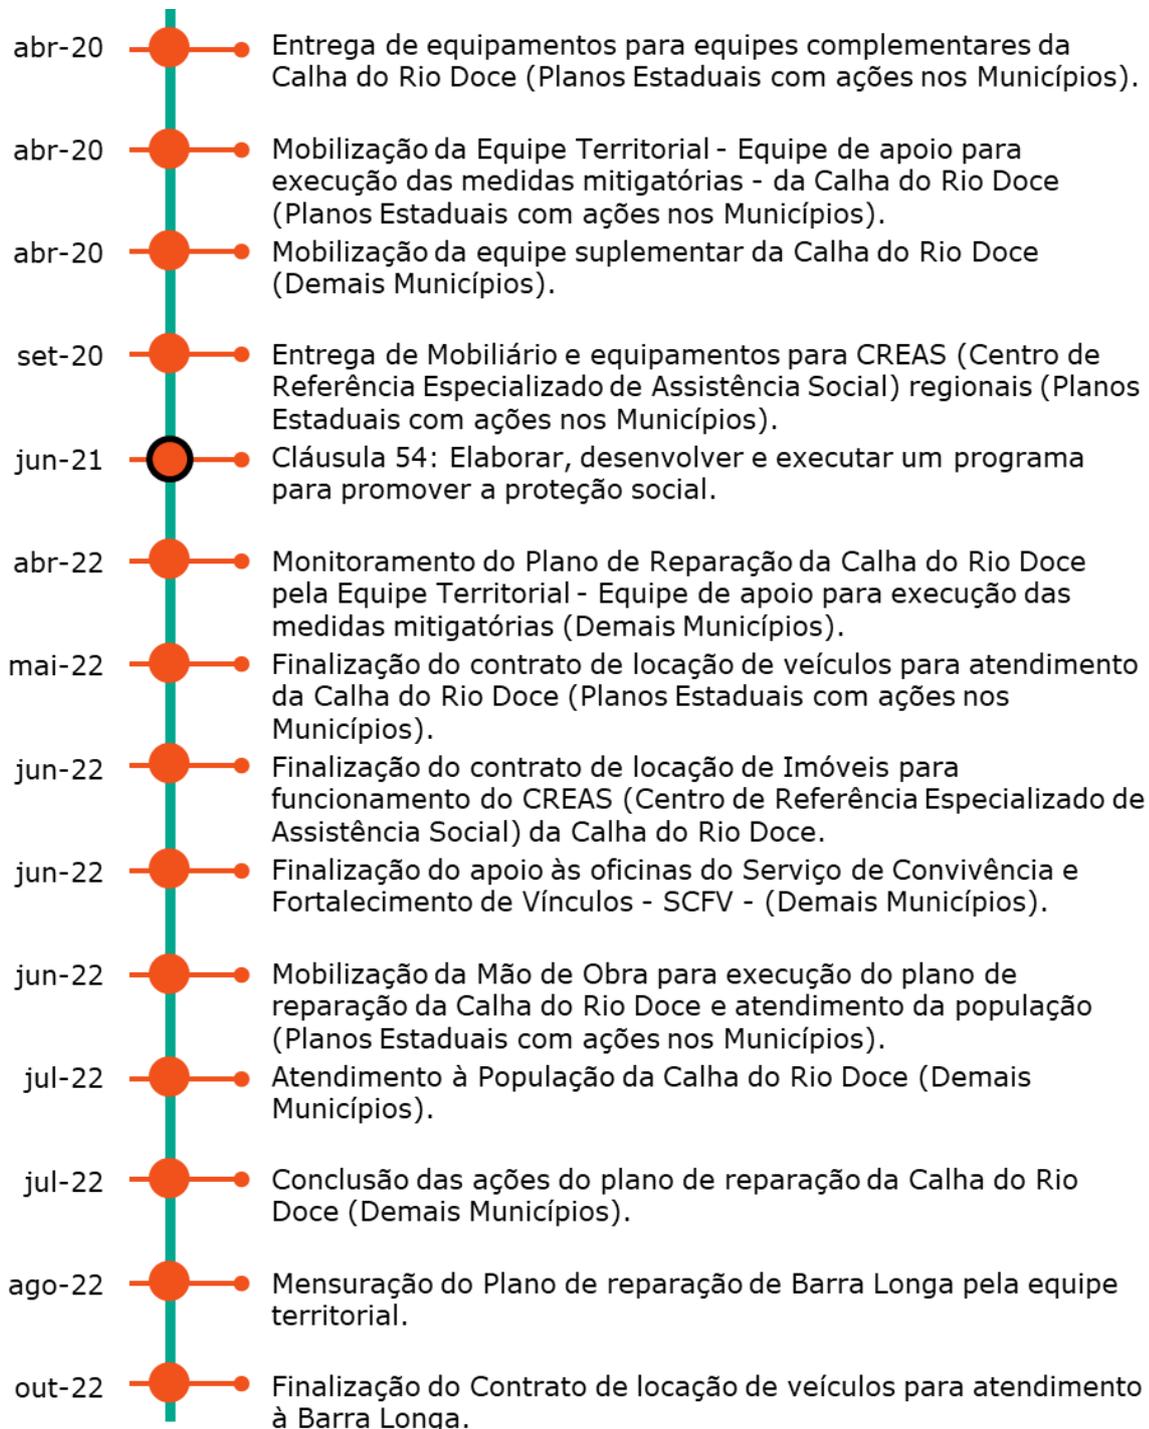



- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Brinquedotecas implementadas e entregues para o município de Mariana. (Fonte: P05-RMS-001-01-Termos de entrega assinado_190802.pdf);
- Concluída a contratação das equipes de território que atuarão apoiando na execução das medidas mitigatórias (apoio a Proteção Social e Saúde) junto aos municípios atingidos. (Fonte: SUP-PC-000-01_4900000054_190827.pdf);
- Atraso na validação do documento da Definição do Programa Proteção Social pela CTOS (e consequente encaminhamento para o CIF). A manifestação oficial da CTOS com as recomendações referentes à proposta encaminhada em 23/05/2019 foi recebida pela Fundação Renova em 23/08/2019 (Fonte: P05-RMS-004-01-Nota_Tecnica_38_2019_CT_OS PPS_190823.pdf);
- Atraso na realização da 3ª Oficina de capacitação de operadores da Proteção Social em Mariana. O município solicitou a postergação da oficina para aguardar a conclusão do processo seletivo dos novos operadores. (Fonte: P05-RMS-002-01-Email Capacitação_190606.pdf; P05-RMS-003-01-Email Capacitação_190826.pdf);
- Atraso no início do repasse de verba para suplementação de mão de obra em Barra Longa. O município alega estar no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo receber recursos para contratação direta ou indireta de profissionais. O modelo a ser utilizado para a suplementação de mão de obra está sendo reavaliado junto a CTOS e o município para que o processo seja iniciado;
- Atraso na finalização dos planos de ação integrados do Programa de Proteção Social juntos aos Programas de Cadastro, Pesca, Agroflorestal, Economia e

Inovação, devido a replanejamento da agenda dos gestores. A nova previsão de término será setembro de 2019.

Próximas entregas

- Receber validação do documento da Definição do Programa Proteção Social pela CTOS e encaminhamento para o CIF. Esta entrega refere-se ao Marco Envio da Definição do Programa de Proteção Social para o CIF pela CTOS ou Fundação Renova;
- Aprovar e assinar o termo de parceria junto ao município de Barra Longa. Esta entrega refere-se ao Marco Assinatura do Termo de parceria pela Fundação Renova e município de Barra Longa;
- Concluir o processo de suprimentos para locação de veículos (novo processo concorrencial) e disponibilizar veículos para o município de Mariana. Esta entrega refere-se ao Marco Entrega dos veículos locados para atender ao município de Mariana;
- Finalizar oficinas de trabalho para definição de atividades dos planos de ação integrados juntos aos programas de Cadastro, Pesca, Agroflorestal e Economia e Inovação (2ª Oficina). Esta entrega refere-se ao Marco Elaboração dos planos de ação integrados entre o Programa de Proteção Social e os programas de Cadastro, Pesca, Agroflorestal e Economia e Inovação.

Desafios

- Alinhamento entre Fundação Renova e Poder Público para entendimento por parte das equipes municipais sobre quais ações são de responsabilidade do Programa de Proteção Social e quais são as de responsabilidade do Poder Público;
- Definição, por parte do município de Barra Longa, do modelo de contratação de RH a ser seguido, para que o termo de Parceria do Programa de Proteção Social com o município seja assinado;
- Alinhamento das ações dos Planos Estaduais de Proteção Social com as Secretarias de Estado de Minas Gerais e Espírito Santo;
- Otimizar estratégias que visem garantir a priorização da atenção aos atingidos vulneráveis junto aos demais programas da Fundação Renova. Tais ações devem primar, essencialmente, para que os efeitos e ações dos demais programas da Fundação Renova e do poder público se tornem tangíveis, prioritariamente às famílias impactadas em situação de vulnerabilidade social;
- Avaliação e aprovação do documento de “Definição do Programa” da Proteção Social junto a CTOS e posterior encaminhamento para aprovação do CIF.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores foram redefinidos e o plano de implementação para início do controle está em andamento.

Fotos



Foto relacionada à: Brinquedoteca do CRAS Colina - Mariana - agosto/2019.



Foto relacionada à: Brinquedoteca do CRAS Cabanas - Mariana - agosto/2019.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos


(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Apoiar os demais programas da Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC. Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva territorial.

Cláusulas do TTAC: 59 - Em andamento, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 – Concluídas internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 105 – Concluída internamente.

Marcos do Programa

- nov-15 ● Programa Iniciado
- jun-17 ● Cláusula 65 - Desenvolvimento de plataforma interativa
- jun-17 ● Cláusula 66 - Criação de equipe de comunicação e participação multidisciplinar
- jun-17 ● Cláusula 67 - a) Criação de um manual de "perguntas e respostas"
- jun-17 ● Cláusula 67 - b) Divulgação em redes sociais sobre iniciativas, esclarecimento de dúvidas, entre outro
- jun-17 ● Cláusula 67 - c) Relacionamento com a imprensa e disponibilização de release aos veículos de comunicação
- jun-17 ● Cláusula 68 - Deverá ser criada uma Ouvidoria, com a indicação de um Ouvidor, cujo nome e dados para contato devem ser amplamente divulgados nos canais institucionais
- jun-17 ● Cláusula 69 - Todos os relatórios de acompanhamento dos programas socioeconomicos devem estar disponíveis para a consulta pública
- jun-17 ● Cláusula 70 - Deverão ser garantidos canais de atendimento adequados aos grupos vulneráveis
- jun-17 ● Cláusula 71 - Os canais de diálogo devem estar em funcionamento em até 90 (noventa) dias da assinatura do Acordo e deverão funcionar enquanto o Acordo estiver em vigor
- jan-18 ● Deliberação 105 - 1.1) Estabelece uma série de requisitos a partir dos quais a Fundação deverá aprimorar os seus canais de atendimento, dentre eles: criação de novos escritórios nas
- jan-18 ● Deliberação 105 - 1.2) O Cadastro Integrado deverá fornecer ao atingido uma visão integrada dos programas socioeconômicos, de modo que ele compreenda a sua real situação na sistemática
- jan-18 ● Deliberação 105 - 1.3) A Fundação deverá privilegiar fluxo específico de resposta às solicitações quando requeridas por associações formalmente constituídas.
- jan-18 ● Deliberação 105 - 1.4) A Fundação deverá disponibilizar às instituições públicas canal de acesso específico às informações, de modo a possibilitar consulta rápida ao status do atingido, aos



DIÁLOGO

Marcos do Programa



Entregas e fatos relevantes do mês

Mariana:

- Em Paracatu de Baixo foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para definição de critérios para ocupação das áreas disponíveis do reassentamento; apresentação da metodologia de Rodas de Conversa para discussão sobre os equipamentos coletivos e definição do local para implantação do Centro Comunitário no reassentamento. Houve, ainda, reuniões com o Secretário de Saúde e Secretário de Educação de Mariana para apresentação das propostas de implantação de equipamentos de Educação e Saúde no reassentamento da comunidade. Destaque também para a mobilização e apoio à realização de visita de moradores de Paracatu de Baixo às obras do reassentamento coletivo para atualização sobre o andamento das obras.
- Em Bento Rodrigues, foi realizada reunião com a comunidade para apresentação de possibilidades de reparação das atividades econômicas no reassentamento coletivo e visita com representantes da Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica Cáritas ao terreno anfitrião do reassentamento coletivo da comunidade para atualização sobre o andamento das obras. Ainda no período, foi realizada reunião com representantes do time de futebol Unidos de Bento Rodrigues Futebol Clube para apresentação da proposta de alocação do campo de futebol, ginásio e sede da associação de moradores nos terrenos disponíveis no reassentamento coletivo.
- Foi realizada reunião na comunidade de Monsenhor Horta para tratar da mitigação dos impactos do processo de reparação na localidade. Em Ponte do Gama, foi realizada a apresentação da proposta locacional para reconstrução da arena de cavalgada e campo de futebol. Destaque também para reunião com a Comissão

de Atingidos pela Barragem de Fundão para esclarecimento sobre fluxo de contratação de atingidos para as obras dos reassentamentos coletivos em curso.

- Continuidade das visitas de acompanhamento para o desenho participativo das casas individuais junto às famílias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Destaque também para a realização de GT Extraordinário para compartilhamentos de informações e esclarecimentos sobre o processo de elaboração dos projetos das casas.

Alto Rio Doce:

- Em Barra Longa foi realizada assembleia com atingidos de Gesteira, Comissão de Atingidos, Assessoria Técnica e poder público para discussão sobre as diretrizes do reassentamento da comunidade.
- Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, foi realizada reunião com a Associação de Pescadores de Rio Doce e equipe da área de Economia e Inovação para tratativas sobre o projeto de piscicultura; e visita técnica com a participação das Comissões de Atingidos dos municípios e Assessoria Técnica Rosa Fortini ao reservatório de Candonga para apresentação e detalhamento do plano de amostragem para caracterização do rejeito. Ainda no período, foi realizada reunião com o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) da comunidade de Merengo e Defesa Civil sobre combate a incêndios; acompanhamento da oficina do Projeto de Educação Financeira itinerante para capacitação de professores da rede pública sobre Educação Financeira nas escolas e acompanhamento do projeto de conscientização sobre o suicídio idealizado por jovens do programa "O Futuro do Rio Doce é você".

Calha do Rio Doce:

- Em São José do Goiabal, foi realizada reunião com moradores para devolutivas relacionadas a Política de Indenização para a pesca de subsistência, concessão de AFE para mais de um membro do núcleo familiar e planejamento para apresentação dos resultados sobre qualidade da água no município. Sobre o último tema, foi realizada reunião com moradores de Córrego Fundo (*Sem-Peixe*) para escuta sobre a qualidade da água de poços artesianos da localidade.
- Em Revés do Belém (*Bom Jesus do Galho*) foi realizada reunião para apresentação dos programas da Fundação Renova atuantes na localidade e apresentação da 2º Chamada de Projetos de Empreendedorismo Econômico para o Leste Mineiro, promovido pela Brazil Foundation.
- Em Rio Casca, a equipe de Diálogo acompanhou a abertura do Curso de Avicultura com produtores rurais da localidade.

Médio Rio Doce:

- Em Naque e Cachoeira Escura (*Belo Oriente*) foram realizadas reuniões para apresentação e discussão das ações em curso para monitoramento da água tratada e bruta do Rio Doce.
- Em Baguari (*Governador Valadares*) foram realizadas reuniões para esclarecimentos relacionados aos programas de Auxílio Financeiro Emergencial, Cadastro Integrado, Retomada das Atividades Agropecuárias e Proteção Social,

além da discussão sobre a metodologia de atendimento aos atingidos da localidade por meio de visitas familiares, plantão social e CIA Móvel. Em Pedra Corrida (*Periquito*) foi realizada reunião para apresentação do panorama de atendimento dos programas de Auxílio Financeiro Emergencial, Cadastro Integrado e Indenização Mediada, bem como avaliação do curso de Avicultura Familiar promovido pela EMATER em parceria com a Fundação Renova.

- Em Tumiritinga, foi realizada reunião com a Associação de Laticínio do Assentamento Cachoeirinha para discussão sobre as ações desenvolvidas no âmbito da 2º Chamada de Projetos de Empreendedorismo Econômico do Leste Mineiro.

Baixo Rio Doce:

- Em Baixo Guandu e Aimorés foram realizadas reuniões para apresentação do Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS); ações do Programa de Manejo de Rejeitos; e ações de recuperação de Áreas de Preservação Permanente na Bacia hidrográfica do rio Manhuaçu.
- Em Itueta, Aimorés e Resplendor foram realizadas reuniões para apresentação e esclarecimentos sobre a 2º Chamada de Projetos de Empreendedorismo Econômico do Leste Mineiro, promovido em parceria com a BrazilFoundation.
- Em Baixo Guandu, foram realizadas reuniões com grupo de mulheres artesãs e moradores da comunidade de Mascarenhas sobre a temática de Direitos Humanos e Participação Social em contexto de desastres ambientais e ações do Programa de Saúde Física e Mental e da área de Economia e Inovação.

- Em Aimorés foram realizadas reuniões com representantes da Associação de Pescadores do Rio Doce – ASPERD e demais pescadores do município para acolhimento de demandas relacionadas aos programas de Cadastro Integrado, Auxílio Financeiro Emergencial, Proteção Social e a área de Economia e Inovação.
- Destaque ainda para visita a produtores rurais de Itueta e Resplendor para apresentação e proposta de adesão ao projeto “ATER Sustentabilidade”.

Foz Rio Doce/Litoral ES:

- Foram realizadas reuniões com moradores da rua Beira Rio, em Linhares, para devolutivas de pleitos e apresentação dos estudos sobre a estabilidade do Barramento Rio Pequeno. Ainda no período, foi realizada reunião com integrantes do time de futebol Botafogo da Lagoa e Prefeitura de Sooretama (ES) para discussão de ações de promoção do esporte na comunidade de Patrimônio da Lagoa.
- Em Linhares, foi realizada a Oficina Participativa do Centro de Informações Técnicas (CIT) com a participação de representantes das comunidades de Regência, Povoação, Entre Rios, Areal, Barra do Riacho e Patrimônio da Lagoa (*Sooretama*) para discussão de temas prioritários para realização de oficinas e capacitações no espaço.
- Foi realizada reunião com pescadores de Linhares, Conselheiro Pena, Aracruz, Baixo Guandu e Aimorés e representantes de órgãos públicos federais e estaduais para devolutivas relacionadas a política indenizatória dos “pescadores de fato”, atendimento aos pescadores protocolados e acolhimento de novos pleitos.

- Foram realizadas reuniões com as comunidades de Urussuquara (*São Mateus*), Povoação e Regência (*Linhares*) para acolhimento de demandas e realização de devolutiva sobre o programa de Cadastro Integrado.

Próximas entregas

Mariana:

- Dar continuidade nas reuniões dos Grupos de Trabalho de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, para discussão de pautas relacionadas aos reassentamentos coletivos; Dar continuidade nas visitas aos terrenos e construção participativa dos projetos das edificações residenciais dos reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; Realizar Encontro de Sensibilização com as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo para apresentação do projeto Renovando Futuros; Reunir com a comunidade de Monsenhor Horta para tratar da mitigação dos impactos causados pelo processo de reparação na localidade; Reunir com o Secretário de Educação e Secretário de Saúde de Mariana para apresentação do projeto conceitual dos equipamentos coletivos de Educação e Saúde no reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo.

Alto Rio Doce:

- Reunir com grupo de pescadores de Florestinha para apresentação das ações da área de Economia e Inovação e análise de atividade econômica alternativa para os pescadores; Realizar mutirão de plantio do projeto Plantar e Cuidar na comunidade de Merengo (*Santa Cruz do Escalvado*).

Calha do Rio Doce:

- Realizar reuniões com moradores de Rochedo e Córrego Preto (*Rio Casca*) para apresentação do escopo do estudo sobre dinâmica da Água Subterrânea e Risco à Saúde Humana e Ecológica.

Médio Rio Doce:

- Realizar Oficina Temática com moradores de Naque sobre recuperação de nascentes e recuperação de Áreas de Preservação Permanente; Realizar Oficina Temática de Cachoeira Escura (*Belo Oriente*) para apresentação do projeto "O Futuro do Rio Doce é você"; Reunir com produtores rurais de Conselheiro Pena e Tumiritinga para apresentação das ações do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias e esclarecimentos sobre o TAC Governança; Reunir com carroceiros e areeiros de Conselheiro Pena e Barra do Cuieté (*Conselheiro Pena*) para esclarecimentos sobre a política indenizatória da categoria e apresentação das ações do Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica em curso na localidade.

Baixo Rio Doce:

- Reunir com a Associação de Pescadores Renovo do Vale para acolhimento de pleitos; Reunir com moradores de Resplendor e Itueta sobre ações dos Programas de Monitoramento da Bacia do Rio Doce e Manejo de Rejeito.

Foz/Litoral do Espírito Santo:

- Reunir com comerciantes de Povoação para apoio ao projeto comunitário “Feira Local”.

Desafios

- Garantir o acesso à informação e promover o engajamento dos diferentes públicos de interesse no trabalho de reparação e compensação da Fundação Renova, nas novas áreas estuarinas, costeiras e marinhas, no Espírito Santo, bem como nas proximidades da Lagoa Juparanã, em Linhares e Sooretama (ES).
- Fortalecer a presença da Equipe de Participação e Diálogo Social nos territórios em apoio aos programas e promover a integração entre as diferentes iniciativas da Fundação Renova, consolidando o diálogo como forma de articulação das partes interessadas.
- Sustentar as práticas colaborativas de relacionamento entre os públicos participantes do processo de reparação, criando condições para que protestos radicais (especialmente as paralisações de linha férrea) não sejam utilizados como recurso pelas comunidades impactadas.
- Estruturar as práticas de diálogo, participação e controle social envolvendo as novas comissões locais e assessorias técnicas atuantes ou em formação nos territórios impactados, conforme previsto no TAC Governança.

Indicadores/Grandes Números

INDICADOR	Julho/19	Agosto/19	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	38	36	2.949
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	25	19	775
Reuniões Realizadas – Outras Localidades	0	0	10
Total de Participantes em Reuniões	-	-	103.988

Tabela 2. Grandes Números. Fonte: Módulo SGS Agendas de Diálogo.

OUVIDORIA

Marcos do Programa



Entregas e fatos relevantes do mês

- Processo de gestão das manifestações (assegurando o devido registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias relativas aos processos de reparação e remediação), bem como realização das seguintes atividades (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831)
 - Consolidação do novo modelo de atendimento, com célula exclusiva de recebimento de manifestações, para aprimoramento dos processos de atendimento da Ouvidoria;
 - Melhorias nos processos de respostas das manifestações;
 - Continuidade da apuração das denúncias de concessão indevida de auxílio financeiro e possíveis irregularidades nos processos de indenização, revisão dos casos junto aos programas e apoio jurídico no encaminhamento;
 - Conclusão da revisão do banco de dados da Ouvidoria relacionados a adequação da criticidade e tipologia das manifestações;
 - Participação e apresentação da Ouvidoria na Câmara Técnica de Comunicação;
 - Atualização da matriz de impacto, tipologia e criticidade;
 - Atualização do procedimento de identificação de manifestações por e-mail (anonimato de denúncias/reclamações).
 - Inclusão de informações sobre o não fornecimento de detalhes da apuração de denúncias no site, e-mail e roteiro de atendimento por telefone.
- Foram abertas 139 manifestações na Ouvidoria. A variação do número de manifestações em relação ao mês de julho é pouco relevante e ainda inferior à

média de 2019. As manifestações recebidas em 2019, correspondem a 21% do acumulado. (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831).

- 78% das manifestações registradas na Ouvidoria foram realizadas de maneira identificada, sendo que 47% das manifestações foram registradas pelo atendente do 0800 da Ouvidoria, 19% pelo site e 24% foram reclamações encaminhadas pelos canais de relacionamento – indicando o acolhimento das reclamações recebidas pelos canais nos casos de situação de vulnerabilidade social e/ou possível negligência no atendimento pela Fundação Renova. (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831).
- Na tipologia consolidada, 69% das manifestações abertas em julho referem-se a reclamações relativas aos processos e prazos de atendimento da Fundação Renova. Falta de previsibilidade e transparência, morosidade, discordância com procedimentos e baixa acessibilidade são os principais motivos de queixas. Em seguida, os principais motivos das denúncias são alegações de concessão indevida de auxílio financeiro, irregularidades no processo de indenização e relatos de má intenção/ato ilícito. (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831).
- No total acumulado, a Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes 79% das reclamações e denúncias. (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831).
- 34 manifestações tiveram a apuração concluída (38% procedentes e 24% não procedentes), sendo que 24% das manifestações não foram qualificadas para apuração (dados insuficientes ou fora do escopo) e 15% não conclusivas. (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831)
- Das manifestações finalizadas como procedentes, 85% são relacionadas a reclamações em relação aos processos e prazos de atendimento e 8% são

relacionadas a concessão indevida de indenização. (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831)

- Ao final do mês de agosto, 1.421 manifestações estavam em aberto na Ouvidoria. (Fonte: P06-APR-000-00_Ouvidoria Agosto_190831).

Próximas entregas

- Realizar a manutenção do plano de divulgação, que tem como objetivo a expansão do propósito da Ouvidoria, objetivando a acessibilidade completa e irrestrita de todos atingidos ao Canal. Esta entrega refere-se ao marco 3.2.5.3.

Desafios

- Aderência ao prazo de resposta de 20 dias.

Indicadores/Grandes Números

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS – ACUMULADO (2015 a 2018)	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS – MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2018)
5515	145

Tabela 3. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2018). Fonte: ICTS Management (setembro, 2019).

MÊS DE REFERÊNCIA	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
Janeiro/2019	170	184
Fevereiro/2019	234	
Março/2019	299	
Abril/2019	193	
Maiio/2019	184	
Junho/2019	112	
Julho/2019	142	
Agosto/2019	139	

Tabela 4. Manifestações recebidas (setembro/2019). Fonte: ICTS Management (agosto, 2019).

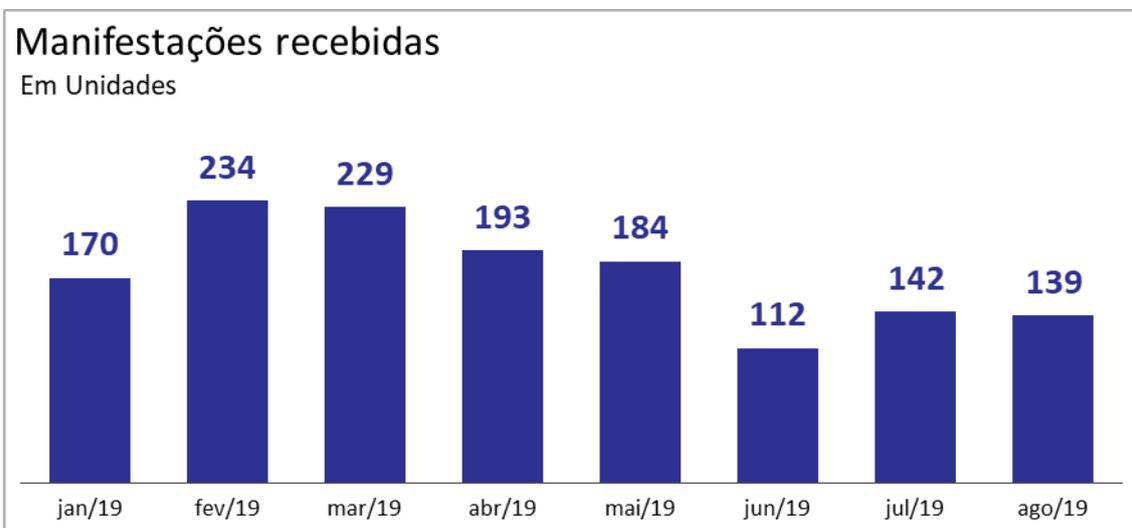


Gráfico 4. Manifestações recebidas em 2019 Fonte: ICTS Management (agosto, 2019)

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Marcos do Programa



Entregas e fatos relevantes do último mês

- Análise e revisão de manifestações em tratamento para as temáticas que envolvem programas para além de Cadastro, Indenização e Auxílio Financeiro (demais programas socioambientais e socioeconômicos). (Fonte: SGS)
- Ação de devolutiva final qualificada para os casos de inexistência de impacto identificados pelo cadastro integrado. (Fonte: SGS)
- Realização de ações de apoio às equipes de Moradia Temporária e Infraestrutura com foco na tratativa das manifestações de Mariana e Alto Rio Doce. (Fonte: SGS)
- Mobilização de produtores rurais e realização de plantão nos CIAs do Baixo e Foz do Rio Doce para ingresso nos programas de Uso Sustentável dos Solos e Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). (Fonte: SGS)
- Realização de oficinas temáticas, no dia 13 de agosto, nos CIAs de Naque e Belo Oriente, para tratar do monitoramento da água (bruta e tratada). (Fonte: P06-FOT-000-00_Oficina Naque e Belo Oriente_1909105.jpeg)
- Realização de ação de CIA Móvel, no dia 13 de agosto em Rosário I, no espaço Tetê Artes. Foram atendidas 26 pessoas, em sua maioria artesãs de Baixo Guandu, o que desdobrou em 31 atendimentos (protocolos). (Fonte: SGS)
- No dia 15 de agosto, o CIA Móvel esteve presente na Universidade Aberta do Brasil, em Linhares, após a reunião de devolutiva das manifestações em Colatina. Foram registrados 38 atendimentos (protocolos). (Fonte: SGS)
- Realização de treinamento das equipes de atendimento da Fase II do Cadastro Integrado. (Fonte: P06-FOT-000-00_Treinamento Fase 2 Cadastro_1909105.jpeg)

- Mobilização dos atingidos para reunião de devolutiva do projeto piloto do Pescador de Fato de Regência e Povoação. (Fonte: SGS)
- Realização de reunião com a comunidade de Baguari para falar sobre o fechamento do CIA fixo e informar sobre os atendimentos dos CIAs móveis. (Fonte: P06-RLD-000-00_Atata Reunião GV, Baguari, Ilha Brava_190705.doc).

Próximas Entregas

- Apoiar na tratativa de manifestações da Fase 2 de Cadastro. Esta entrega refere-se ao Marco “Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento finalizado”.
- Avançar nas ações de apoio às equipes de Moradia Temporária e Infraestrutura com foco na tratativa das manifestações de Mariana e Alto Rio Doce.
- Avançar a análise e tratativa de casos críticos, recorrentes e de alta vulnerabilidade social, com envolvimento de Programas e demais áreas pertinentes a cada caso. Esta entrega refere-se ao Marco “Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento finalizado”.
- Avançar na execução da estratégia do plano de ação junto ao programa de Proteção Social e atuar no projeto piloto com as famílias vulneráveis.
- Realizar ações de monitoramento de qualidade de manifestações em tratamento. Esta entrega refere-se ao Marco “Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento finalizado”.

Desafios

- Buscar, junto aos Programas da Fundação Renova, respostas mais qualificadas e assertivas para os questionamentos das pessoas atingidas.
- Reduzir o percentual de manifestações respondidas fora do prazo previsto na Deliberação 105.
- Aumentar o percentual de manifestações respondidas no ato do atendimento.
- Incentivar pontos focais dos programas na utilização SGS, ferramenta base para gestão e tratamento de manifestações.
- Avançar com as ações de reposicionamento estratégico dos CIAs, visando torná-los espaços de aproximação com as comunidades e de atendimento aos atingidos de forma acolhedora, humanizada e transparente, bem como promover diálogo qualificado capaz de traduzir dúvidas, anseios e demandas para os programas e áreas da Fundação Renova.
- Viabilizar, nos espaços dos CIAs, informações sobre os processos reparatórios para os atingidos por meio de comunicação visual.
- Aumentar a sinergia entre os processos dos CIAs e das equipes de diálogo em campo, do planejamento à execução dos espaços dialogais.

Indicadores/Grandes Números

INDICADOR (Valores Acumulados)*	JULHO 2019	AGOSTO 2019
Total de manifestações	584.100	588.768

Manifestações em tratamento	62.296	61.244
Manifestações respondidas	521.804	527.524
Manifestações registradas pelo 0800	470.931	475.194
Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	96.199	99.645
Manifestações registradas pelo Fale Conosco	10.270	12.321
Manifestações registradas pelo Portal do Usuário	1.439	1.608
Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	136.457	137.925
Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	27	29

Tabela 5. Indicadores (agosto/2019). Fonte: P06-APR-000-00_Relatorio_Canais_BI_190902.pptx.

Os Indicadores relativos ao total de manifestações do Fale Conosco e do Portal do Usuário podem sofrer alterações, na comparação com relatórios passados, em função de ações de revisão da base, de forma a corrigir duplicidades de protocolos.




Gráfico 5. Pesquisas de Satisfação CIAs – Q1 (agosto/2019). Fonte: P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa CIAs 190903

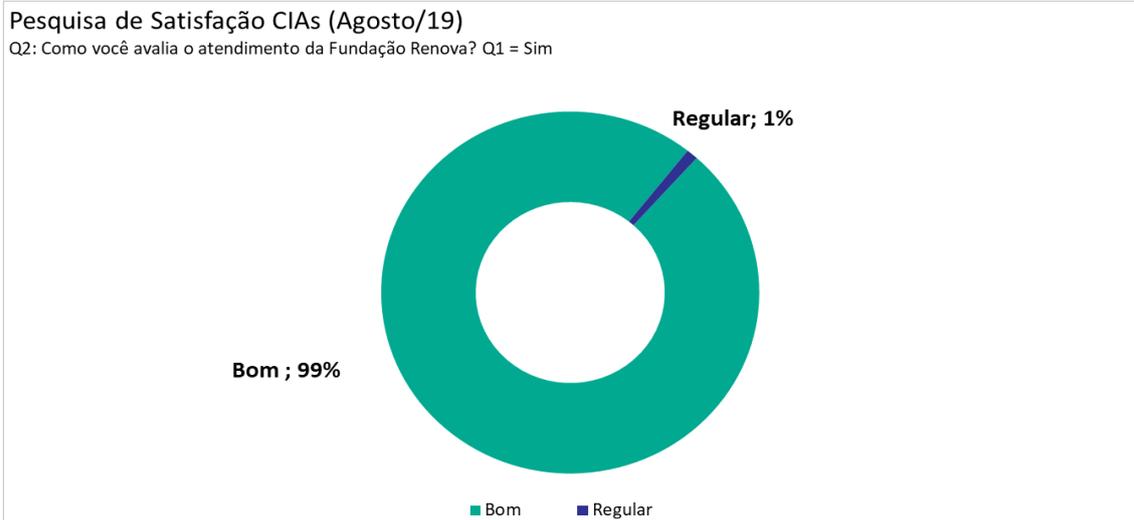


Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação CIAs – Q2, Q1=SIM (agosto/2019). Fonte: P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa CIAs 190903




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação CIAs – Q2, Q1=NÃO (agosto/2019). Fonte: P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa CIAs 190903




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1 (julho/2019). Fonte: P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa 0800_190902




Gráfico 5. Pesquisas de Satisfação 0800: Q2, Q1=SIM (julho/2019). Fonte: P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa 0800_190902

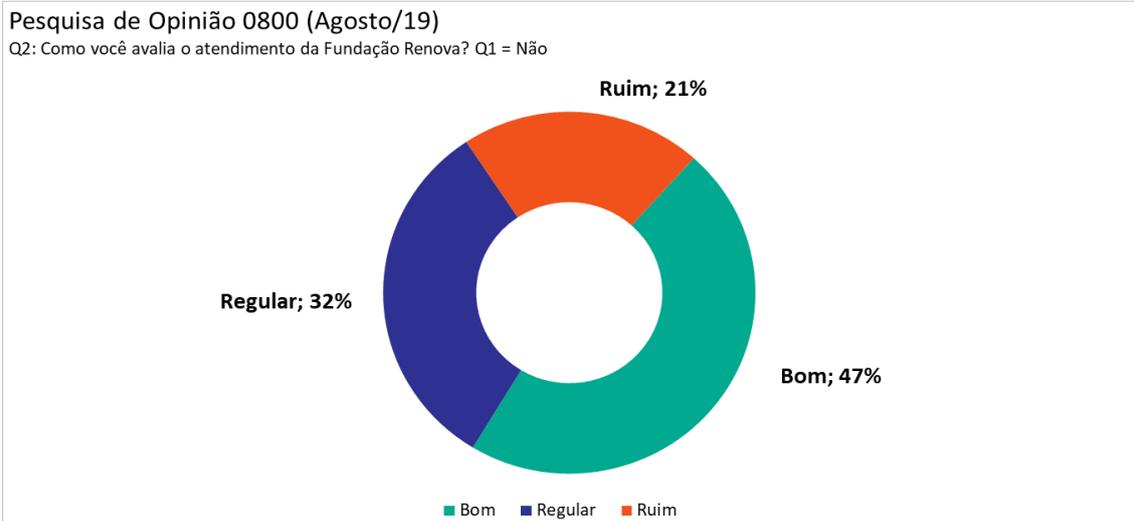


Gráfico 6. Pesquisas de Satisfação 0800: Q2, Q1=NÃO (julho/2019). Fonte: P06-RLD-000-00_Relatório Pesquisa 0800_190902

Comunicação

Marcos do Programa



Entregas e fatos relevantes do mês

Comunicação com territórios:

- Foi lançada a primeira edição acessível do informativo Boletim Jornada da Foz. Por meio de um QR Code, as pessoas com algum tipo de deficiência visual podem acessar e ler o conteúdo do Jornada no site da Renova. Foram distribuídos 5 mil exemplares na cidade de Linhares e na Foz do Rio Doce (Regência, Povoação, Degredo, Areal e Entre Rios). Em Linhares, o jornal foi distribuído em pontos estratégicos de grande circulação de pessoas, como por exemplo: pontos de ônibus, semáforos, comércio, etc. Além disso, foram fixadas versões em A3 nos ônibus municipais e em diversos estabelecimentos. Na Foz, o jornal foi distribuído de casa em casa e também disponibilizado em alguns pontos estratégicos, tais como unidades de saúde, escolas e Centro de Informações e Atendimento Renova. (Fonte: P06-FOT-000-00_Boletim Jornada da Foz_1909105.png).
- Na programação semanal da Rádio Renova foram vinculados nove diferentes programas para cada território (Mariana/ Governador Valadares/ Foz), totalizando 27 programas, com 81 inserções em rádios de vários municípios de Mariana e Regência . (Fonte: <https://www.fundacaorenova.org/radio-renova/>).
- No território Médio Rio Doce, uma pílula de WhatsApp informou aos moradores da comunidade de Baguari, em Governador Valadares, sobre a realização de uma reunião para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre os programas da Renova. (Fonte: P06-FOT-000-00_Pílula Whatsapp Reunião Baguari_1909105.jpg).
- No território Médio Rio Doce, houve divulgação sobre as mudanças nos escritórios dos CIAs para atendimento de moradores das comunidades de Baguari e Ilha

Brava, em Governador Valadares. O material informou sobre o novo endereço e também tratou sobre o CIA Móvel que acontecerá semanalmente no distrito de Baguari. (Fonte: P06-FOT-000-00_Divulgação Mudança Escritório CIA_1909105.jpg).

- Na Calha do Rio Doce, foi elaborada uma pílula de WhatsApp comunicando sobre a palestra “Um Olhar para o Futuro”, realizada na comunidade de Ipaba do Paraíso, em Santana do Paraíso. Nesta palestra, participaram 150 estudantes da Escola Estadual José Rosa Damasceno. O encontro tratou sobre autoconhecimento, escolha da carreira, valorização dos talentos pessoais e mercado de trabalho. (Fonte: P06-FOT-000-00_Pílula Whatsapp Palestra Um olhar para o futuro_1909105.jpg).

PG08 - Reconstrução de vilas (Bento Rodrigues):

- Elaboração e execução do plano de comunicação para contratação de mão de obra local para atuar nos reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Desdobramento do plano de comunicação em plano de mídia, apresentação para as comissões de atingidos, pílula de WhatsApp e cartaz sobre as vagas. (Fonte: P06-FOT-000-00_Cartaz contratação MO local para reassentamentos_1909105.jpg).
- Distribuição de vídeo 3D com o projeto futuro do reassentamento de Bento Rodrigues para as famílias da comunidade.
- Elaboração e divulgação do Informe de Obras, informativo digital quinzenal para as famílias do reassentamento de Bento Rodrigues. (Fonte: P06-RLD-000-00_Boas práticas produção_190805.pdf).

PG08 - Reconstrução de vilas (Paracatu de Baixo):

- Elaboração e divulgação do Informe de Obras, informativo digital quinzenal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo. (Fonte:P06-RLD-000-00_Informe de obras Paracatu_190805)
- Elaboração de Pílula de WhatsApp com informações sobre inserção dos nomes de atingidos na lista de interesse para recebimento de madeira do reassentamento de Paracatu de Baixo (Fonte: P06-FOT-000-00_Pílula Whatsapp Lista interesse recebimento madeira_1909105.jpg).

Divulgação de spot, por meio de carro de som, para comunicar a ação do Sine Itinerante nas seguintes comunidades: Monsenhor Horta, Águas Claras, Santa Rita Durão e Furquim.

PG17 - Retomada das atividades agropecuárias:

- Divulgação dos cursos de capacitação para produtores rurais de Naque, Belo Oriente, Periquito, Sem-Peixe e Rio Casca, iniciativa realizada em parceria com a Emater. Foram produzidos cartilha/Apostila, certificado, banner, pílula de WhatsApp, cartaz, spot para som volante e cobertura dos cursos (conteúdo, foto, rádio, vídeo e imprensa).(Fonte: P06-FOT-000-00_Divulgação capacitação produtores rurais_1909105.jpg).

PG 35 - Informação para a população:

- Suporte logístico e de mobilização para a primeira oficina participativa do Centro de Informações Técnicas de Regência, realizada no dia 21 de agosto. A Comunicação foi responsável pela organização do espaço, alimentação e transporte dos participantes, confirmação de todos os convidados, registo e relatoria do evento.

PG 38 – Monitoramento da Bacia do Rio Doce:

- Produção de cartazes e pílulas de WhatsApp para divulgar as Oficinas Temáticas sobre monitoramento da água bruta e tratada do rio Doce. Os encontros foram realizados no dia 13/08, em Naque e na comunidade de Cachoeira Escura, em Belo Oriente. (Fonte: P06-FOT-000-00_Divulgação oficina temática monitoramento água bruta e tratada_1909105.jpg).

Comunicação com a imprensa:

- Press-kits e produção de conteúdos diversos (releases, posicionamentos);
- A segunda fase do projeto de incentivo ao desenvolvimento econômico em parceria com a Brazil Foundation foi veiculada;
- Divulgação O processo de renaturalização do rio Gualaxo do Norte foi outro ponto de destaque;

- Principais divulgações proativas: Festival Gastronômico de Povoação; Capacitação de produtores rurais em Barra Longa; Feira de adoção de animais resgatados; Reflorestamento; Cursos e demais ações de reparação.
- Principais posicionamentos reativos: prosseguimento dos assentamentos; Indenizações; Saúde.

Próximas Entregas

- Dar continuidade nas ações da Fundação Renova em Setembro;
- Sinalizar para o Centro de Apoio às Famílias de Paracatu de Baixo;
- Realizar o lançamento do tour virtual do reassentamento de Bento Rodrigues;
- Divulgar o Edital Doce MG, incluindo a realização dos encontros para esclarecer dúvidas sobre elaboração de projetos.

Desafios

- Comunicar as ações com transparência, de forma participativa, empática e plural, a fim de informar e engajar os diversos públicos, contribuindo para viabilizar o processo de reparação.
- Garantir a prestação de serviços e presença eficaz nos meios adequados.

- Transcender o papel informativo e estabelecer como catalizadora das iniciativas de todas as frentes de trabalho da Renova, contribuindo com a perspectiva reparatória e compensatória.

PG007 Programa de Assistência aos Animais


Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.


Cláusulas do TTAC: 73, 74 – Item a, 74 – Item b – Concluídas internamente; 74 – Item c, 74 – Item d, 74 – Item e, 74 – Item f, 74 – Item g – Em andamento.

Marcos do Programa

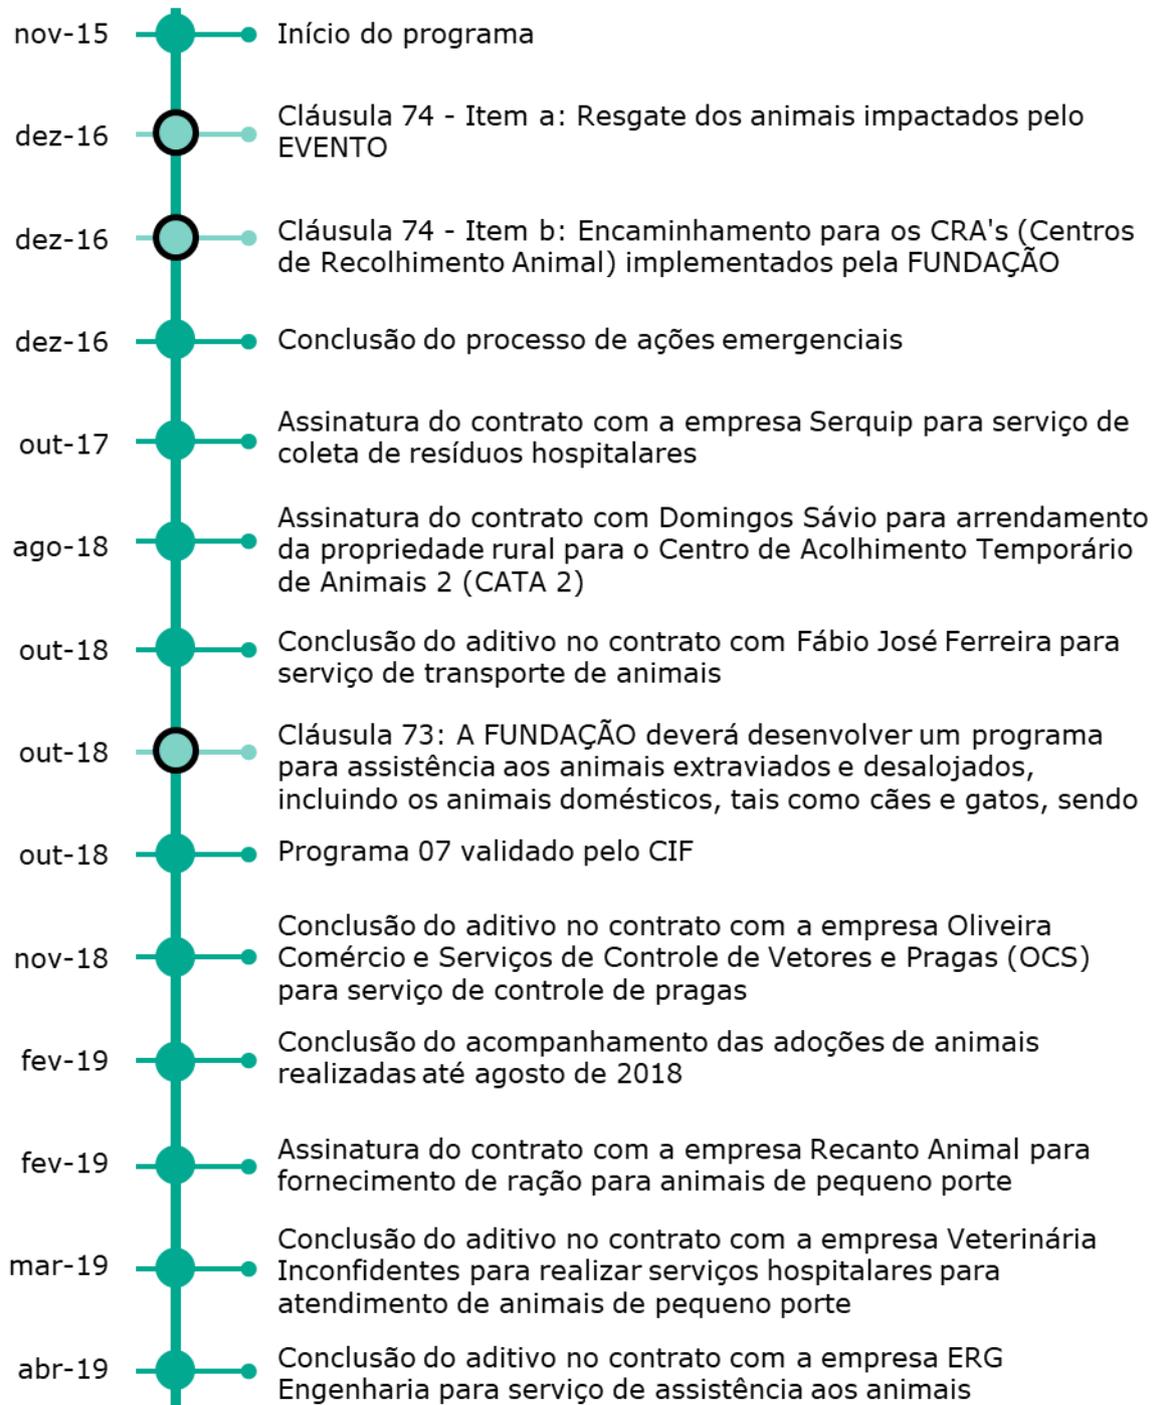

- abr-19 ● Conclusão do aditivo de prazo e valor no contrato com a empresa Vetcheck para realizar serviços hospitalares para atendimento de animais de grande porte
- mai-19 ● Conclusão do aditivo no contrato com a empresa Recanto do Fazendeiro para o fornecimento de maravalha
- mai-19 ● Assinatura do contrato com a empresa Loja do Fazendeiro para fornecimento de ração para animais de produção (em substituição ao Recanto Verde)
- jun-19 ● Assinatura do contrato com a empresa Vetcheck para realizar serviços hospitalares para atendimento de animais de grande porte
- jul-19 ● Conclusão do novo aditivo no contrato com Fábio José Ferreira para serviço de transporte de animais
- jul-19 ● Conclusão do serviço de transporte de animais pelo aditivo contratual com Fábio José Ferreira
- jul-19 ● Conclusão do novo aditivo no contrato com a empresa Veterinária Inconfidentes para realizar serviços hospitalares para atendimento de animais de pequeno porte
- jul-19 ● Conclusão do serviço de atendimento hospitalar para animais de pequeno porte pelo aditivo contratual com a empresa Veterinária Inconfidentes
- jul-19 ● Conclusão do serviço de controle de pragas pelo aditivo contratual com a empresa Oliveira Comércio e Serviços de Controle de Vetores e Pragas (OCS)
- jul-19 ● Conclusão do novo aditivo no contrato com a empresa Oliveira Comércio e Serviços de Controle de Vetores e Pragas (OCS) para serviço de controle de pragas
- jul-19 ● Conclusão do serviço de atendimento hospitalar para animais de grande porte pelo aditivo contratual de prazo e valor com a empresa Vetcheck
- ago-19 ● Conclusão do aditivo no contrato com Domingos Sávio para arrendamento da propriedade rural para o Centro de Acolhimento Temporário de Animais 2 (CATA 2)
- ago-19 ● Assinatura do contrato com a empresa (a definir) para prestação de serviço de assistência aos animais
- ago-19 ● Conclusão do novo aditivo de valor e prazo no contrato com a empresa ERG Engenharia para serviço de assistência aos animais



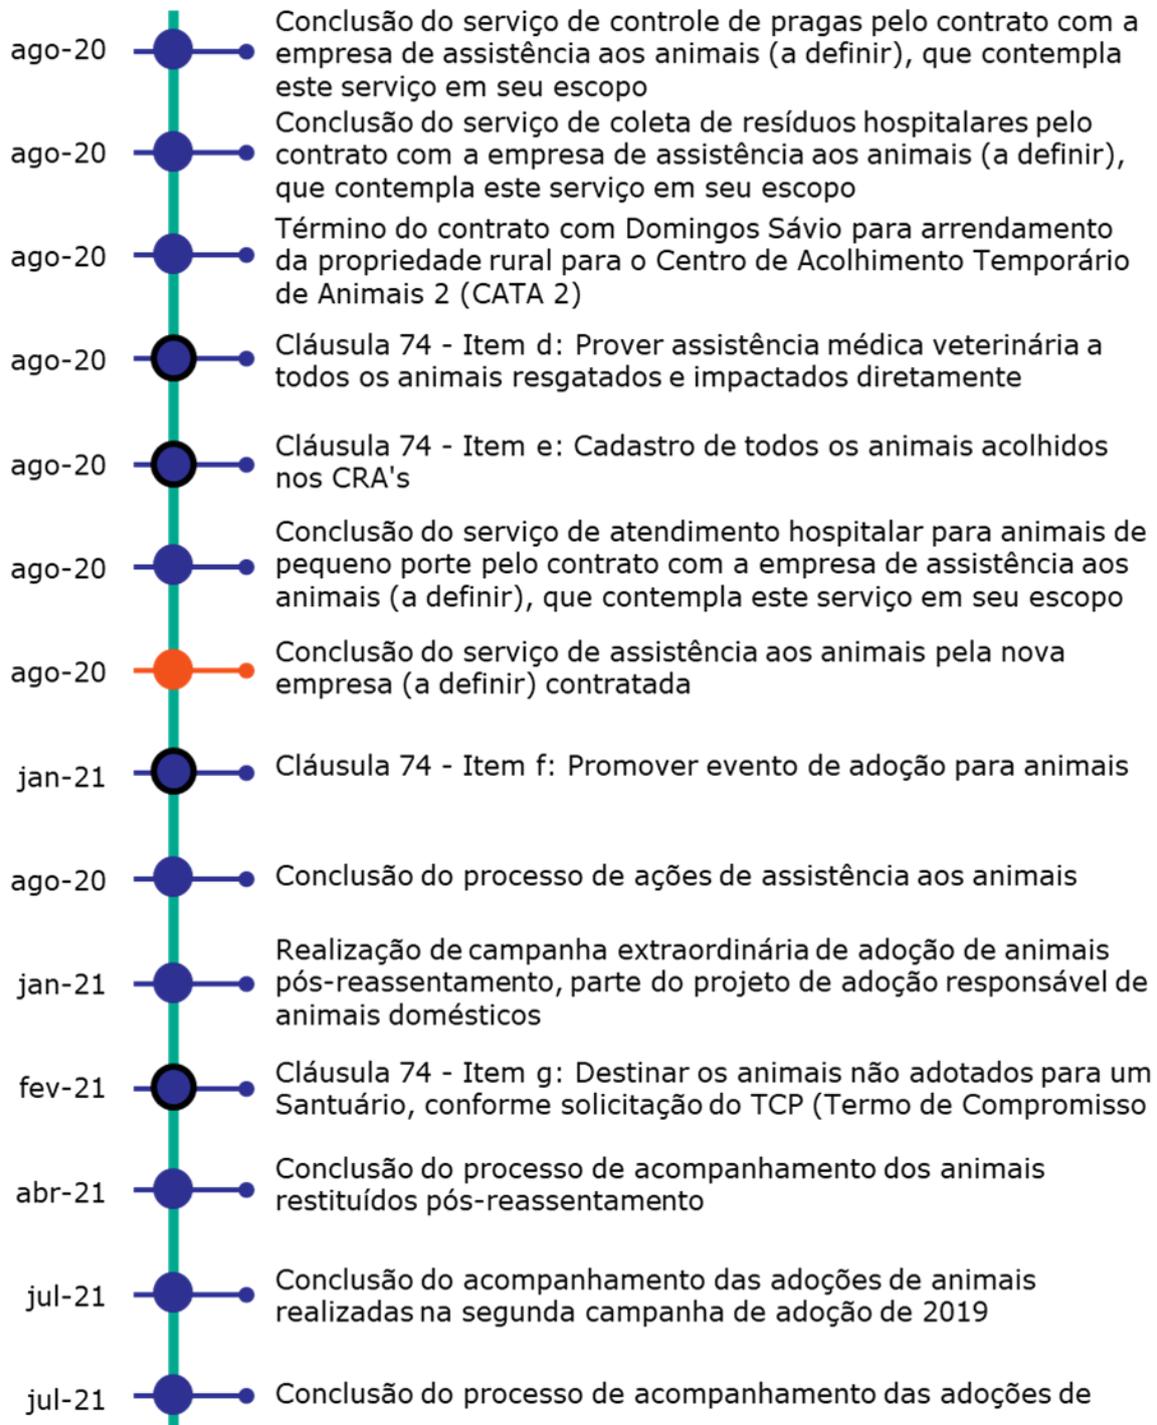

ago-21  Encerramento concluído

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Planejado
-  Reprogramado
-  Concluído Internamente
-  Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Conclusão do processo de aditivo de valor e prazo no contrato com a empresa ERG Engenharia para serviço de assistência aos animais. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do novo aditivo de valor e prazo no contrato com a empresa ERG Engenharia para serviço de assistência aos animais”;
- Assinatura do contrato com a nova empresa contratada para assistência aos animais. Esta entrega refere-se ao Marco “Assinatura do contrato com a empresa (a definir) para prestação de serviço de assistência aos animais”;
- Conclusão do aditivo no contrato para arrendamento da propriedade rural do Centro de Acolhimento Temporário de Animais 2 (CATA 2). Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do aditivo no contrato com Domingos Sávio para arrendamento da propriedade rural para o Centro de Acolhimento Temporário de Animais 2 (CATA 2)”;
- 5ª campanha de aplicação do Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal (PPBEA) e de efetividade de processos adotivos.

Próximas entregas

- Concluir prestação de serviço de atendimento em hospital para animais de pequeno porte pelo aditivo no contrato vigente. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do serviço de atendimento hospitalar para animais de pequeno porte pelo novo aditivo contratual com a empresa Veterinária Inconfidentes”. Não há impacto na prestação deste serviço, uma vez que este escopo será incorporado pelo contrato com a nova empresa de assistência aos animais;

- Concluir prestação de serviço de assistência aos animais pelo aditivo no contrato vigente. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do serviço de assistência aos animais pelo aditivo contratual com a ERG Engenharia”. Não há impacto na prestação deste serviço, uma vez que este escopo será incorporado pelo contrato com a nova empresa de assistência aos animais;
- Concluir prestação de serviço de transporte dos animais por meio do aditivo contratual vigente. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do serviço de transporte de animais pelo novo aditivo contratual com Fábio José Ferreira”. Não há impacto na prestação deste serviço, uma vez que este escopo será incorporado pelo contrato com a nova empresa de assistência aos animais;
- Concluir controle de pragas por meio do aditivo contratual vigente. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do serviço de controle de pragas pelo novo aditivo contratual com a empresa Oliveira Comércio e Serviços de Controle de Vetores e Pragas (OCS)”. Não há impacto na prestação deste serviço, uma vez que este escopo será incorporado pelo contrato com a nova empresa de assistência aos animais;
- Concluir serviço de coleta de resíduos hospitalares por meio do contrato atual. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do serviço de coleta de resíduos hospitalares pelo contrato com a empresa Serquip”. Não há impacto na prestação deste serviço, uma vez que este escopo será incorporado pelo contrato com a nova empresa de assistência aos animais;
- Realizar a primeira campanha de adoção de animais do ano de 2019, referente ao projeto de adoção responsável de animais domésticos. Esta entrega refere-se ao Marco “Realização da primeira campanha de adoção de animais de 2019, parte do projeto de adoção responsável de animais domésticos”;

- Realizar reunião de kickoff e iniciar período de mobilização do novo contrato de assistência aos animais. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do processo de ações de assistência aos animais”.

Desafios

- Prolongamento do cronograma do Programa conforme prazo estabelecido no TTAC devido à redefinição de entregas do reassentamento que impactam a restituição final dos animais.

Indicadores/Grandes Números

Os resultados para os indicadores Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) e Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados têm reporte bimestral, e os gráficos abaixo expõem os resultados dos períodos avaliados até a presente data, com a respectiva comparação em função da meta estipulada.

Um novo reporte está previsto para o relatório de outubro de 2019, referente à 6ª campanha de aplicação do Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal (PPBEA) e de efetividade de processos adotivos.

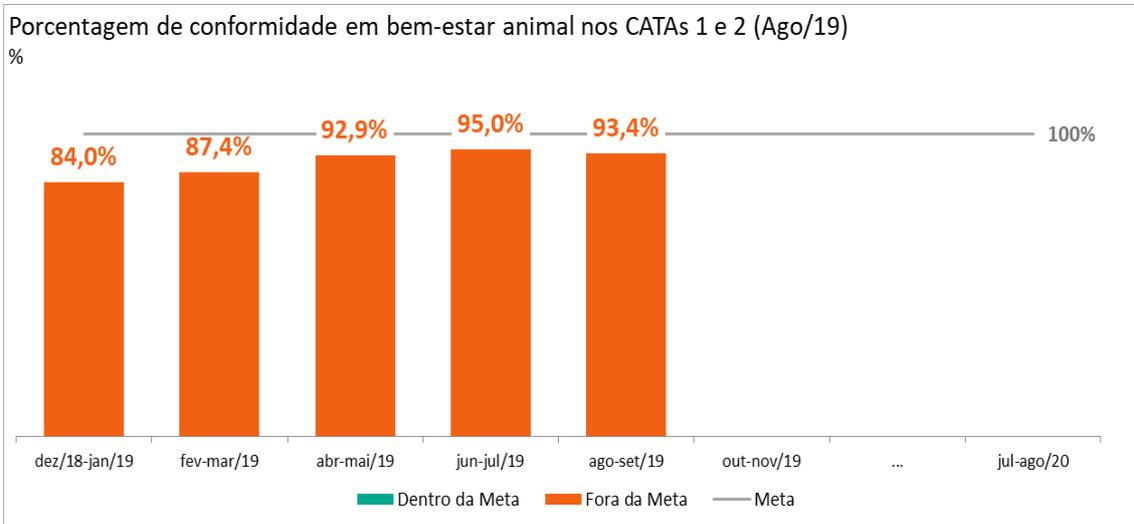


Gráfico 6. Porcentagem de conformidade em bem estar animal (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx.

Os resultados por espécie, e justificativas de desvios para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2), estão descritos a seguir:

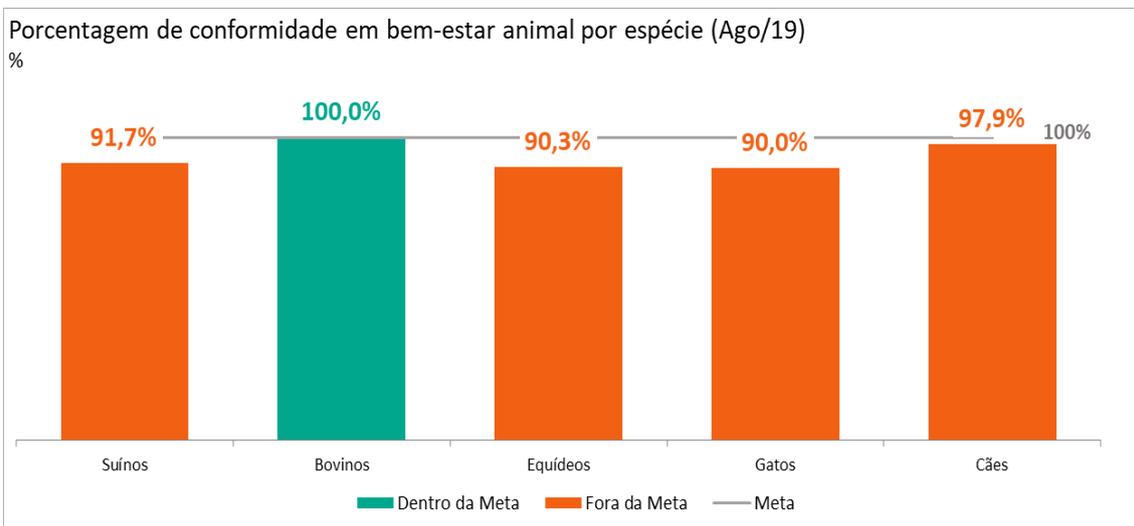


Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem estar animal por espécie (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx.

- **Suíños: Causa:** Dentre os 19 animais avaliados, foram identificados quatro casos correspondentes com Escore de Condição Corporal (ECC) acima do desejado. Um dos animais avaliados nos processos anteriores atingiu a meta de ECC, e não se encontra mais em monitoramento. Para estas avaliações, o quesito de condições nutricionais é, então, classificado como regular. **Contramedida:** Fornecer alimentação orientada com objetivo de melhorar o ECC, bem como monitorar os casos identificados até 30/09/2019.
- **Equídeos: Causa:** Dentre os 37 animais avaliados, foram identificados 14 casos correspondentes com Escore de Condição Corporal (ECC) acima do desejado. Para estas avaliações, o quesito de condições nutricionais é, então, classificado como regular. **Contramedida:** Fornecer alimentação orientada com objetivo de melhorar o ECC, bem como monitorar os casos identificados até 30/09/2019.
- **Gatos: Causa:** Dentre os dois animais avaliados, foi identificado um caso com Escore de Condição Corporal (ECC) acima do desejado. Para estas avaliações, o quesito de condições nutricionais é, então, classificado como regular. **Contramedida:** Fornecer alimentação orientada com objetivo de melhorar o ECC, bem como monitorar os casos identificados até 30/09/2019.
- **Cães: Causa:** Dentre os 30 animais avaliados, foram identificados dois casos correspondentes com Escore de Condição Corporal (ECC) acima do desejado. Para estas avaliações, o quesito de condições nutricionais é, então, classificado como regular. **Contramedida:** Fornecer alimentação orientada com objetivo de melhorar o ECC, bem como monitorar os casos identificados até 30/09/2019.




Gráfico 3. Porcentagem de processos adotivos finalizados (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx.

O indicador Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados sofreu alteração no período corrente em função de renúncia de tutela por parte de um núcleo familiar atingido, que possuía dois animais que se encontram temporariamente sob a guarda da Fundação Renova. Atualmente, 23 animais se encontram disponíveis para adoção, contabilizando um total de 139 adoções em 162 possíveis. Por fim, a meta do indicador é atingir 100% de adoção até o final do programa, porém a meta não está escalonada período a período.

Não existem processos adotivos em acompanhamento e um novo evento de adoção está programado para acontecer de 5 a 8 de setembro na cidade de Belo Horizonte.

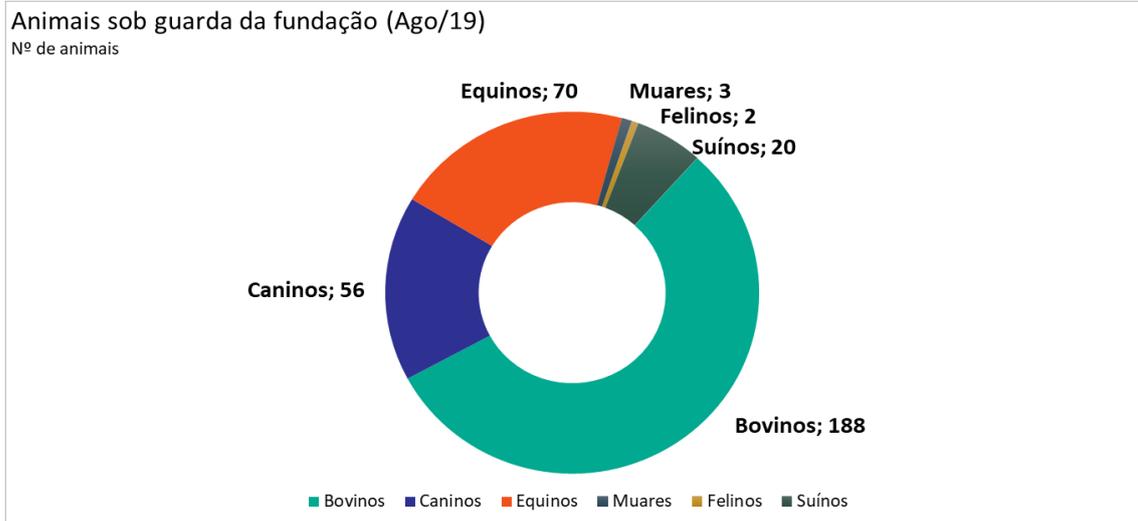


Gráfico 4. Total de animais sob a guarda da Fundação Renova (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx.

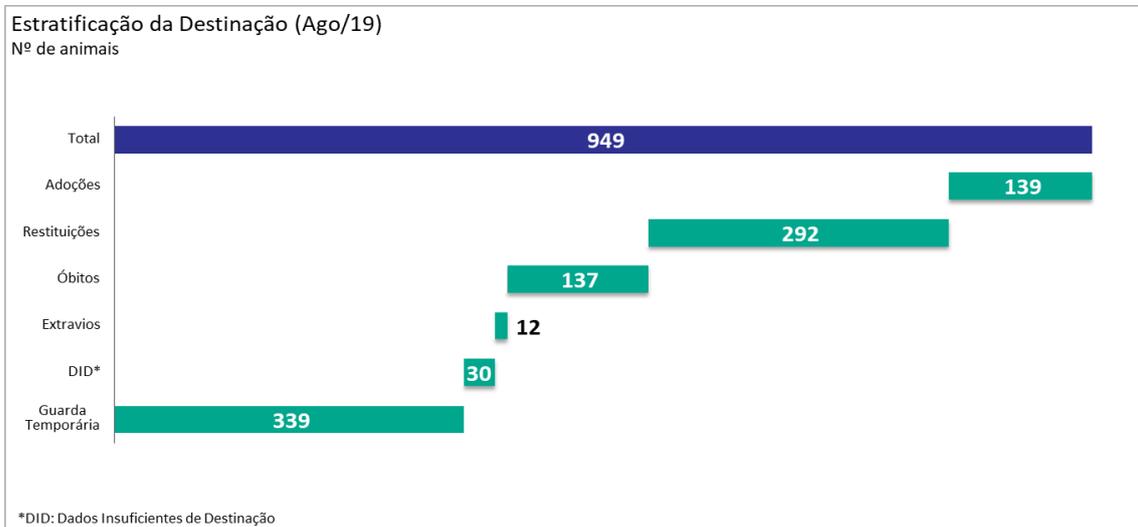


Gráfico 5. Estratificação da destinação (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx.

Fotos



Foto relacionada à: Procedimento anestesiológico pré-cirúrgico em animal residente do CATA 1 – agosto/2019




Foto relacionada à: Animal residente do CATA 1 encaminhado para fisioterapia (reabilitação pós-cirúrgica) – agosto/2019



Foto relacionada à: Atendimento veterinário externo para animais de pequeno porte - agosto/2019



Foto relacionada à: Aplicação de carrapaticida em rebanho bovino no CATA 2 - agosto/2019



Foto relacionada à: Atendimento veterinário externo para animais de grande porte – agosto/2019



Foto relacionada à: Divulgação da primeira campanha de adoção de animais domésticos do ano de 2019, que será realizada entre os dias 05 a 08 de setembro na cidade de Belo Horizonte – agosto/2019

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusulas do TTAC: 76 – Atrasada; Cláusula 77 – Em andamento; Cláusula 78 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 96 e 257 – Concluídas internamente.

Marcos do Programa

Em processo de repactuação.

Entregas e fatos relevantes do mês

Bento Rodrigues:

- Em 01/08, foram iniciadas as fundações dos postos de serviço e saúde (Quadra C1).
- Em 01/08, foram assinadas 16 adesões ao reassentamento de Bento, dos 17 alvarás já emitidos, os quais liberam a construção das residências.
- Em 03/08, foi iniciada a cravação de estacas-prancha da contenção 2 do acesso principal.
- Em 07/08, foi mobilizada empresa responsável pela construção do oratório na estrada do antigo Bento, com previsão de término no dia 10/09.
- Em 12/08, foram iniciadas as obras de calçamento das ruas do distrito de Camargos.
- Em 13/08, iniciou-se a execução do pavimento intertravado da rua Nova da área 2.
- Em 19/08, foi iniciada a execução da infraestrutura do platô 921 do Aterro Sanitário.
- Em 19/08, foi liberado o alvará ID 79 em nome da Sra. Efigênia da Silva Felipe.
- Em 22/08, foi iniciada a imprimação do pavimento do acesso principal entre as estacas 14 e 24.

- Em 22/08, a projetista Pótamos apresentou o plano de trabalho do acesso a Camargos para avaliação da Fundação.
- Em 23/08, o Termo de Adesão ao Coletivo de Bento Rodrigues foi assinado pela Sra. Efigênia da Silva Felipe.
- Em 26/08, foi iniciada pela empresa Tecnosonda a terraplenagem da Viela 19, na área 1.
- Em 28/08, foi iniciada a instalação de postes da rede de alimentação elétrica no acesso principal de Bento, referente ao Dossiê 4.
- Até 29/08, foram executadas, na Quadra F, 151 de 208 estacas de contenções e 331 de 384 m³ de concreto de muro de arrimo.
- Até 29/08, foram executadas, na Quadra F, 119 de 407 estacas de fundações e, na Escola, 319 de 435 estacas de fundações.
- Até 29/08, foram cravadas 158 de 171 estacas-pranchas da contenção 2 do acesso principal.

Paracatu de Baixo:

- Em 01/08, realizou-se uma reunião entre as mantenedoras e a contratada Andrade Gutierrez para apresentação do planejamento das obras.
- Em 07/08, foi concluída a supressão vegetal da área 1.
- Em 08/08, foram protocolados na Prefeitura de Mariana os memoriais descritivos dos lotes, dando início ao processo de emissão do registro do loteamento.

- Em 08/08, foi iniciada a execução do aterro do acesso principal.
- Em 12/08, foi iniciada a execução dos bueiros do acesso principal.
- Em 13/08, foi realizada a reunião de formalização do início dos trabalhos das Andrade Gutierrez.
- Em 14/08, foi iniciada a montagem da torre provisória de comunicação da empresa VIVO.
- Em 14/08, a Comissão de Atingidos e a Assessoria Técnica visitaram as obras do reassentamento coletivo.
- Em 15/08, foi realizado em Mariana/MG um Grupo de Trabalho com a Comunidade de Paracatu de Baixo, tendo como pauta a avaliação de áreas disponíveis no Projeto Urbanístico.
- Em 22/08, foram iniciados os serviços preliminares na área 1.
- Em 22/08, foram emitidas 3 Ordens de Serviço Preliminar (OSP) para a Andrade Gutierrez:
 - OSP #001 – Instalação canteiro de obras provisório e definitivo;
 - OSP #002 – Equipe indireta para toda a obra e equipamentos para manutenção de caminhos de serviços;
 - OSP #003 – Elaboração de projetos do acesso principal, execução do acesso principal, da passagem molhada e da área 1.
- Em 22/08, foi validada a metodologia das rodas de conversas para apresentação dos projetos conceituais dos equipamentos coletivos à comunidade de Paracatu de Baixo.
- Em 27/08, as mantenedoras realizaram visita às obras.

- Até 30/08, 43 equipamentos e 262 funcionários já haviam sido mobilizados pela empresa Andrade Gutierrez.

Gesteira:

- Em 02/08, foi concluída a coleta de autorização dos proprietários para início das vistorias de campo, a fim de levantar informações para a elaboração do projeto da rede de alimentação externa.
- Em 07/08, concluiu-se a campanha de sondagens com instrumentação
- Em 08/08, realizou-se uma assembleia geral com a comunidade.
- Em 12/08, foram realizadas as vistorias de campo pela Ultra, a fim de se levantar informações para a elaboração do projeto da rede de alimentação externa.
- Em 12/08, foi realizada a entrega do projeto e do memorial descritivo do canteiro de obras para início da solicitação da dispensa ao licenciamento.
- Em 12/08, foi enviado o projeto detalhado de sinalização da rodovia MG326 para análise do DEER.
- Em 22/08, a empresa Ernst Young realizou visita a área para realização de auditoria.

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):

- Em 06/08, foi realizada audiência referente à Ação Civil Pública em Mariana/MG.

- Em 23/08, foi iniciada a elaboração dos 13 primeiros Relatórios de Potencial de Vulnerabilidade das famílias que pleitearam a reparação via pecúnia.
- Em 27/08, o plano de trabalho preliminar, contendo 8 casas urbanas, foi apresentado pela HTB.
- Em 27/08, foi formalizada pela construtora Geraes a desistência da continuidade da reconstrução do imóvel da Sra. Maria Auxiliadora, por motivo de desequilíbrio financeiro, até 30/09/2019, caso não ocorra entendimento comercial.
- Em 29/08, foram enviados à HTB os projetos conceituais e básicos para continuidade dos estudos para construção de 05 propriedades rurais (4 reconstruções e 1 reassentamento familiar).
- Em 29/08, foram finalizadas as negociações para aquisição de imóvel da Sra. Marimeire, optante do Reassentamento Familiar.

Próximas entregas

Bento Rodrigues:

- Iniciar a aplicação de CBUQ no acesso principal (set/19)
- Início das visitas às obras do Grupo de Interesse - famílias (set/19)
- Concluir a execução da terraplanagem das vias (nov/19)

Paracatu de Baixo:

- Concluir as atividades de supressão vegetal (set/19).

- Iniciar a execução de contenções do acesso (set/19)
- Submeter projetos conceituais da escola, do posto de saúde e do posto de serviço à aprovação da comunidade (set/19)
- Promover início das visitas das famílias aos lotes (set/19)
- Iniciar a execução da drenagem (out/19). Marco estava previsto para set/19, entretanto foi reprogramado para out/19.

Gesteira:

- Obter definição sobre parcelamento do solo junto à Associação (set/19). Marco estava previsto para mai/19, entretanto foi reprogramado para set/19.

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):

- Finalizar aditivo da empresa Dinâmica para atendimento aos serviços de manutenção às moradias temporárias e início de 10 reformas do reassentamento familiar (set/19).
- Contratar (ou firmar aditivo com empresa Geraes) para obras de reconstrução de 4 casas rurais e demais casas do RF (out/19).
- Contratar projetista para elaboração dos projetos do reassentamento familiar (out/19).

Desafios

Bento Rodrigues:

- Obter posicionamento das famílias que não iniciaram e/ou interromperam o desenvolvimento dos projetos.
- Obter alvarás de construção no prazo previsto.
- Obter assinatura dos termos de adesão ao reassentamento coletivo pelos atingidos.
- Obter licenças e autorizações ambientais para a construção da ETE.

Paracatu de Baixo:

- Mobilizar mão de obra e equipamentos para execução da infraestrutura.
- Garantir a elaboração dos projetos das casas, equipamentos coletivos e contenções de vias.

Gesteira:

- Obter definição sobre o parcelamento do solo. Não há uma legislação definida para parcelamento de solo rural com fração abaixo do permitido;

- Avançar nas tratativas com proprietários sobre a faixa de servidão elétrica e/ou obter novas alternativas junto à Engenharia.

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):

- Estabelecer consenso junto aos atingidos, Cáritas e MP sobre: novos núcleos, cedidos, marco temporal e compensação.
- Definir sobre os atendimentos para aquisição de imóveis.
- Validar Termos de Visita ao imóvel e Termo de desistência da visita junto ao Ministério Público.
- Definir junto ao IPHAN quanto ao profissional dedicado para análise/aprovação de projetos na região de Mariana.

Indicadores/Grandes Números

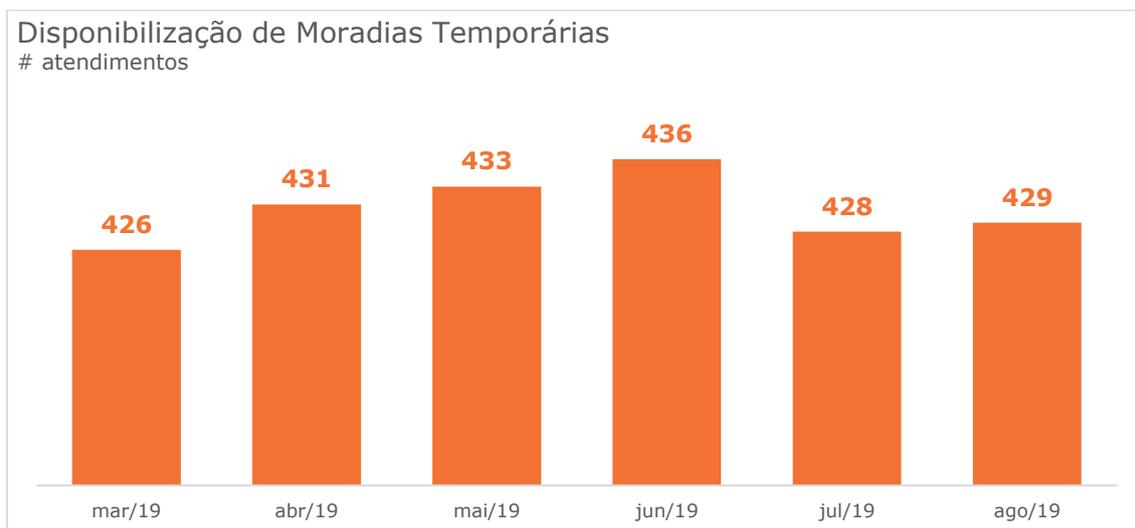


Gráfico 7. Disponibilização de moradias temporárias (agosto/2019). Fonte: Planilha de Controle de Moradia Transitória - Reassentamento Familiar.xlsx (atualizada em 31/07/2019).

Fotos

Bento Rodrigues:



Foto relacionada ao: Corte de plataforma na cota 921 – Aterro Sanitário - agosto/2019.



Foto relacionada a: Tratamento de solo – Rua Dona Olinda – agosto/2019.



Foto relacionada a: Execução de fundação – Escola – agosto/2019.



Foto relacionada a: Execução de fundação – Posto de Saúde – agosto/2019.



Foto relacionada a: Instalação de tirantes de contenção – Acesso Principal – agosto/2019.



Foto relacionada a: Execução de DPS – Acesso Principal – agosto/2019.

Paracatu de Baixo:



Foto relacionada a: Escavação de trincheira – Acesso Principal – agosto/2019.



Foto relacionada a: Execução de aterro (estaca 30 a 48) – Trecho B – Acesso Principal – agosto/2019



Foto relacionada a: Bueiro estaca 38 – Trecho B – Acesso Principal – agosto/2019



Foto relacionada à: Remoção de top soil – Área 1 – agosto/2019

Gesteira:



Foto relacionada a: Cercamento da poligonal – agosto/2019.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo


Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusulas do TTAC: 79, 80, 81 e 150 em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 225 e 286 – Em andamento; 30 e 80 – Concluídas internamente.

Marcos do Programa

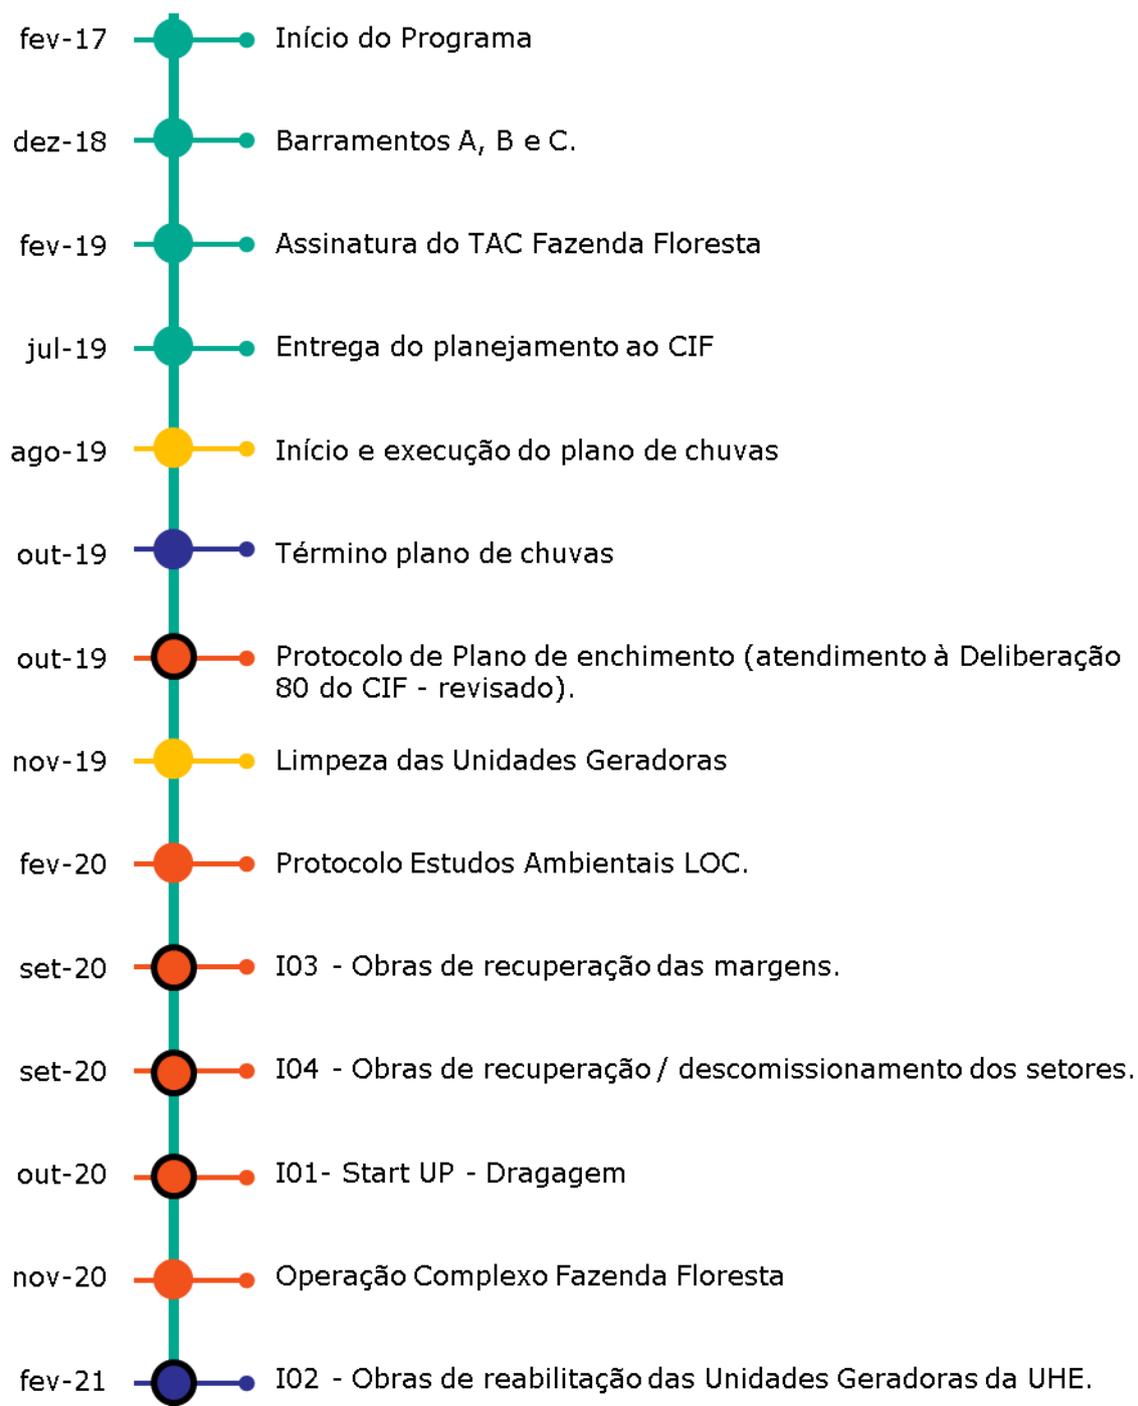

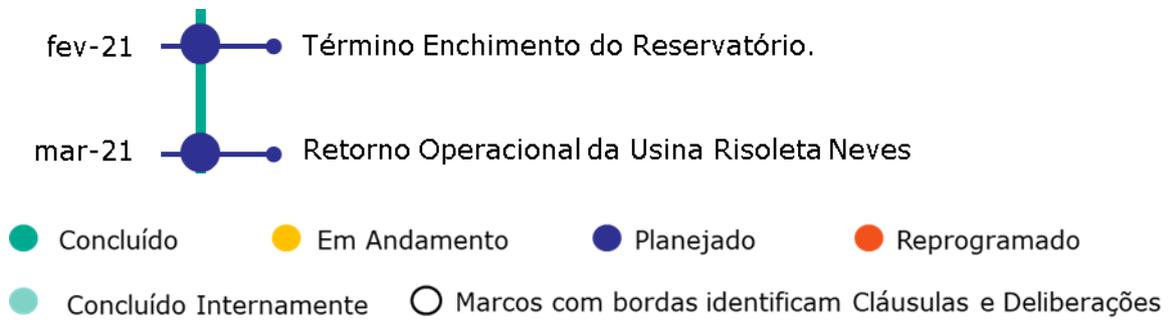

Entregas e fatos relevantes do mês

- Injeção de calda de cimento na ombreira direita – Barramento C (Empresa Piacentini);
- Finalização do levantamento topográfico da ADME 02 (área de depósito de material excedente);
- Conclusão das obras de recuperação de margem no ponto 115;
- Início das atividades referentes ao período chuvoso: limpeza de drenagens, roçada, capina e manutenção dos setores – Empresas Mayrink Neto / Piacentini;
- Verificação e manutenção dos instrumentos de monitoramento em toda obra;
- Continuação do levantamento planialtimétrico do distrito de Taperá;
- Emissão de ordem de serviço (O.S) para execução dos pontos de recuperação das margens 119, 120, 147 e 148;
- Início da drenagem das bacias 1 e 2 em preparação ao período de chuva;
- Verticalização das comportas da tomada d`água e ajustes finais das vedações, sendo que ficou a cargo da Usina de Candonga a descida das comportas nas tomadas d`água;
- Conclusão da retirada do corte da ranhura da guia do Stop Log L02. A concretagem será feita após a empresa Spec elaborar a especificação de concretagem submersa;
- Continuação da limpeza do tubo de sucção da UG-02 (Limpeza interna);

- Concluída a drenagem da UG-03, constando o bom o funcionamento das vedações das comportas à jusante;
- Finalização das sondagens do lava rodas e continuação da retirada de amostras embarcadas nos 400m da Usina Risoleta Neves;
- Implantação de redutores de velocidade e sinalização de advertência no segmento de 800m do início do trecho do entroncamento com MG-120 até o lava rodas;
- Manifestações da comunidade impediram o acesso da equipe à obra nos dias 29, 30 e 31 de agosto.

Próximas entregas

- Concluir manutenção e limpeza geral do canal extravasor provisório, até setembro/2019;
- Executar plano de chuva (limpeza, manutenções e adequações de drenagens superficiais), até outubro/2019;
- Concluir limpeza das Unidades Geradoras (UG1, UG2, UG3), até novembro/2019;
- Entregar ambulância de grande porte, referente às obras compensatórias em Rio Doce/MG, até dezembro/2019.

Desafios

- Realizar alinhamento interno (Diretoria) e externo (Prefeitura Municipal de Rio Doce e Comissões) sobre possibilidade de recuperação das 6 casas de Santana do Deserto;
- Descomissionar os setores 01 e 05;
- Descomissionar a pedreira Corsini;
- Revisar adendo básico e plano de enchimento;
- Recuperar 46 pontos pendentes (33 pontos entregues dos 79 previstos) das margens do reservatório, até dezembro/2020;
- Protocolar EIA/RIMA, até fevereiro/2020

Indicadores

I01 - Avanço físico do processo de dragagem.

I02 - Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE.

I03 - Avanço físico das obras de recuperação das margens.

I04 - Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores.

*** Os indicadores do programa estão em revisão.**

Fotos



Foto relacionada à: Verticalização das comportas - agosto/19.

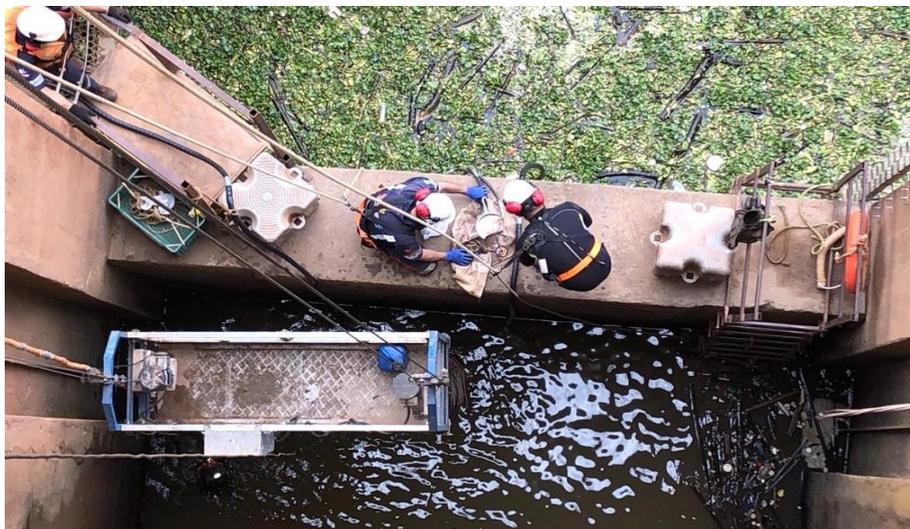


Foto relacionada ao: Reparo da ranhura da guia do Stop Log 02 - agosto/19.



Foto relacionada à: Manutenção do acesso secundário para acesso aos pontos 119, 120, 147 e 148 - agosto/19.



Foto relacionada à: Injeção de calda de cimento na ombreira direita - Barramento C - agosto/19.



Foto relacionada à: Conformação do talude da ombreira direita – Barramento A - agosto/19.



Foto relacionada à: Drenagem da Bacia 2A - agosto/19.



Foto relacionada à: Limpeza de drenagens para o período de chuva - agosto/19.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusulas do TTAC: Cláusulas 82 a 88 - Em andamento fora do prazo.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 127, 191 – Concluídas internamente; 190, 207, 217 – Em andamento.

Marcos do Programa



Entregas e fatos relevantes do mês

- Reforma de 01 edificação (A.S.V.) (Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx);
- Manutenção de Edificações: G.J.F., J.V.M. e Z.M.C. (Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx);
- Manutenção de Acessos Pavimentados: Rua Raimundo Xavier Alves, Avenida Pedro José Pimenta (2 intervenções), Rua Venâncio Lino Mol, Avenida Edmundo Costa Lana, Rua Getúlio Etrusco e Rua Matias Barbosa (Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx);
- Manutenção de Acessos Não Pavimentados: Trecho Morro da Mandioca, Trecho Borba, Trecho entre Paracatu e Ponte do Bucão, Trecho Pedras (Margem Esquerda) e Estrada da Usina (Bicas x Ponte do Gama) (Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx);
- Realizada reunião em 22/11/18, na cidade administrativa, com a CT, sobre a reparação das infraestruturas com danos (207 endereços) localizadas em Barra Longa, onde não houve o comparecimento da AEDAS. Nesta, o PG-010 apresentou o seu plano de recuperação para as moradias e ficou definido que a Infraestrutura irá iniciar as visitas nas residências definidas por ela como em situação de risco. 200 moradias já visitadas.

Próximas entregas

- Concluir a reforma de 01 edificação (C.S.). Esta entrega refere-se ao Marco "PF0032 - Reforma de Edificações";
- Concluir a manutenção de 05 edificações (M.A.F.X, V.S., Galpão de Silagem (J.F.S.), Salão Paroquial e Escola de Paracatu). Esta entrega refere-se ao Marco "PF8101 - Manutenção de Edificações";
- Concluir a reconstrução de 01 edificação (A.A.). Esta entrega refere-se ao Marco "PF0127 - Reconstrução de Edificações".

Desafios

- Definir critérios para atendimento aos casos de trincas nas construções por conta de impactos diretos e indiretos;
- Aprovar a revisão nº12 da Definição do Programa PG010 junto à Câmara Técnica;
- Adquirir terrenos para construção dos campos de futebol de Pedras e Ponte do Gama;
- Contratar serviços de reforma para as moradias com impacto incontroverso em Barra Longa;
- Contratar a empresa executora do Parque de Exposições de Barra Longa.

Indicadores

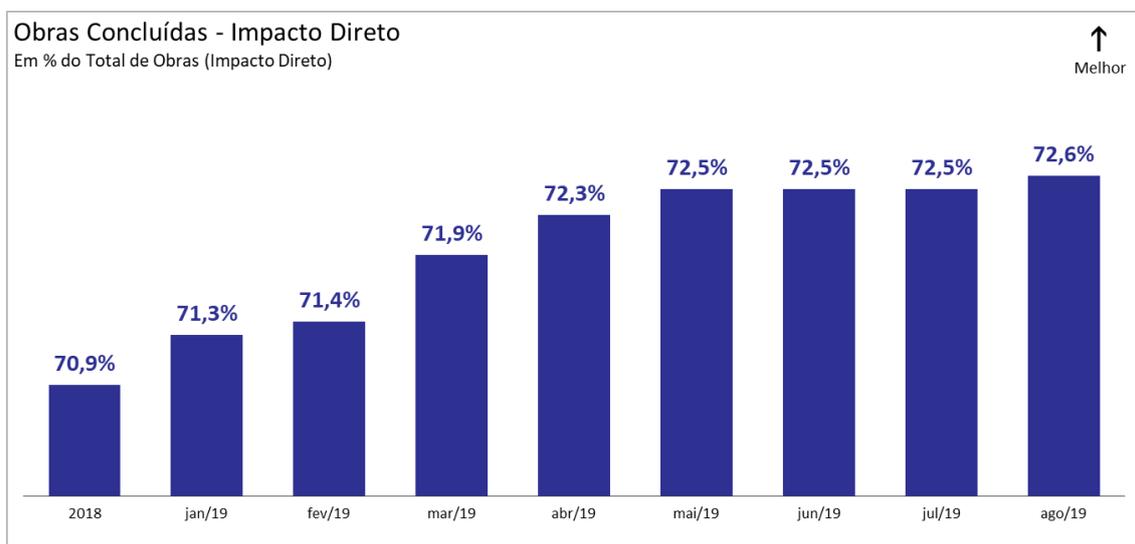


Gráfico 1 - Indicador I01 (rev.11) Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx

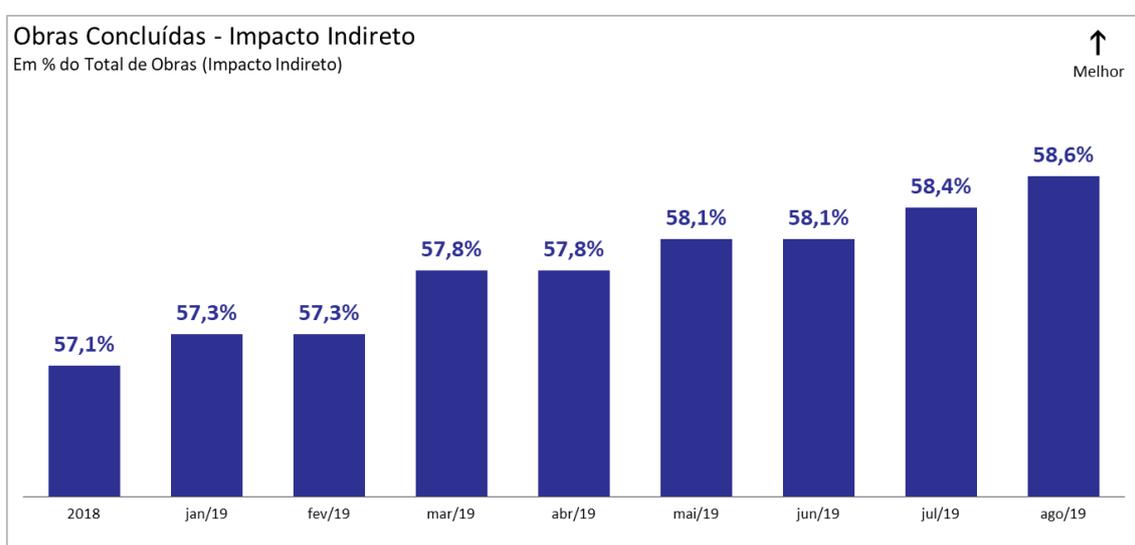


Gráfico 2 - Indicador I02 (rev.11) Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx

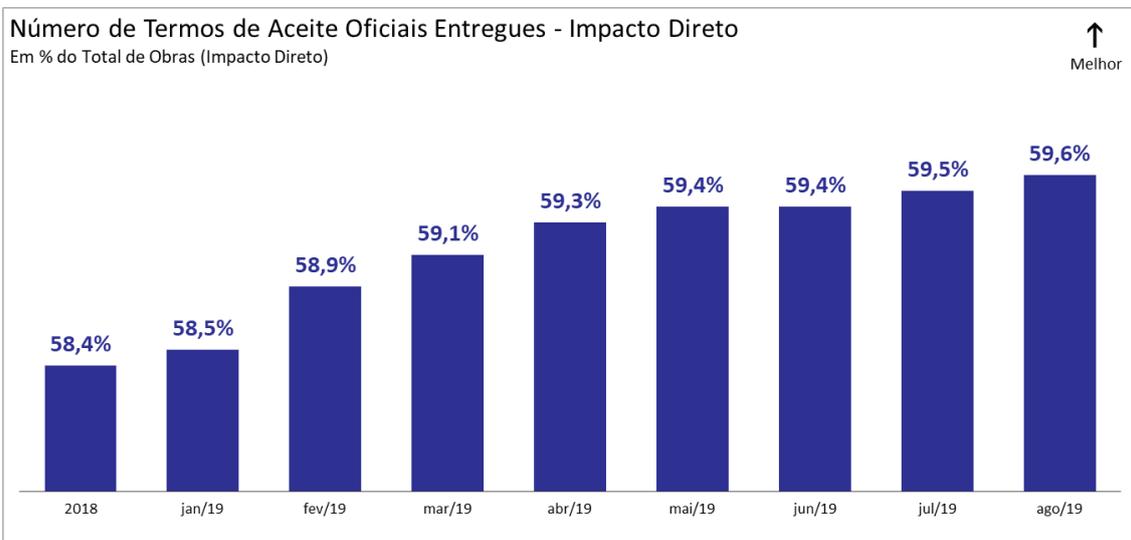


Gráfico 3 - Indicador I03 (rev.11) Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx

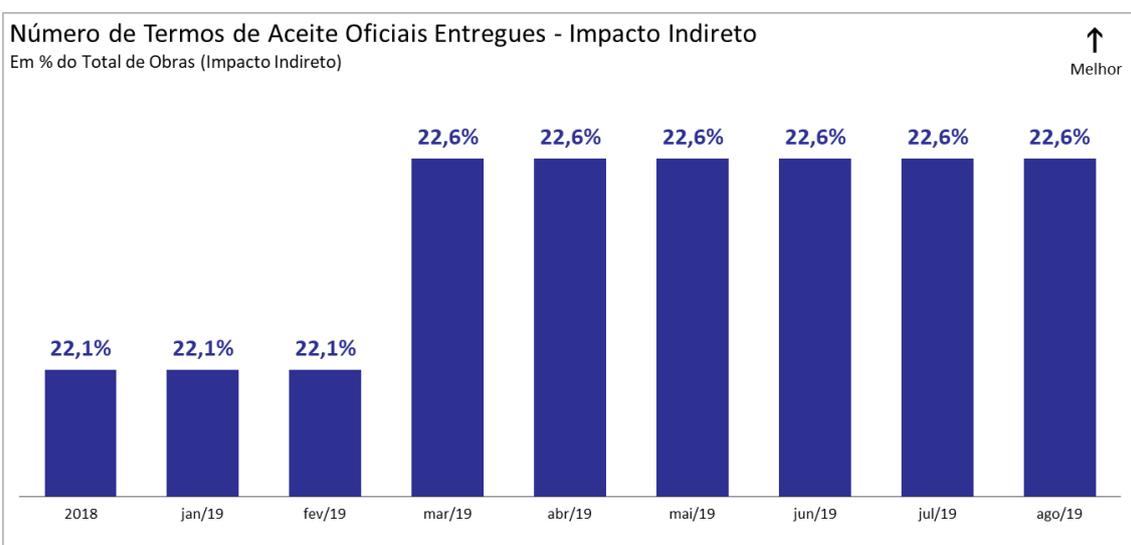


Gráfico 4 - Indicador I04 (rev.11) Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_30-08.xlsx

Fotos



Foto relacionada à: Reforma de Edificações – A.S.V
(Agosto/2019).



Foto relacionada à: Manutenção de Edificações – G.J.F.
(Agosto/2019).



Foto relacionada à: Manutenção de Edificações - J.V.M (Agosto/2019).



Foto relacionada à: Manutenção de Acessos Pavimentados - Rua Raimundo Xavier Alves (Agosto/2019).



Foto relacionada à: Manutenção de Acessos Pavimentados - Avenida Pedro José Pimenta (Agosto/2019).



Foto relacionada à: Manutenção de Acessos Pavimentados - Rua Venâncio Lino Mol (Agosto/2019).



Foto relacionada à: Manutenção de Acessos Não Pavimentados – Trecho Pedras (Margem Esquerda) (Agosto/2019).



Foto relacionada à: Manutenção de Acessos Não Pavimentados – Trecho Morro da Mandioca (Agosto/2019).

PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Proporcionar a reintegração de alunos e profissionais às rotinas escolares, observada a situação anterior ao rompimento da barragem de Fundão e fornecer acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e de psicologia educacional para alunos e profissionais das escolas impactadas de acordo com as determinações do TTAC e apoio pedagógico as escolas estaduais e municipais de Mariana e Barra Longa de acordo com as determinações do TTAC.


Cláusulas do TTAC: Cláusula 89, 90, 91, 92, 93 e 94 – Em andamento.

Deliberações: Deliberação 176 – Concluída e 238 – Em andamento.

Marcos do Programa

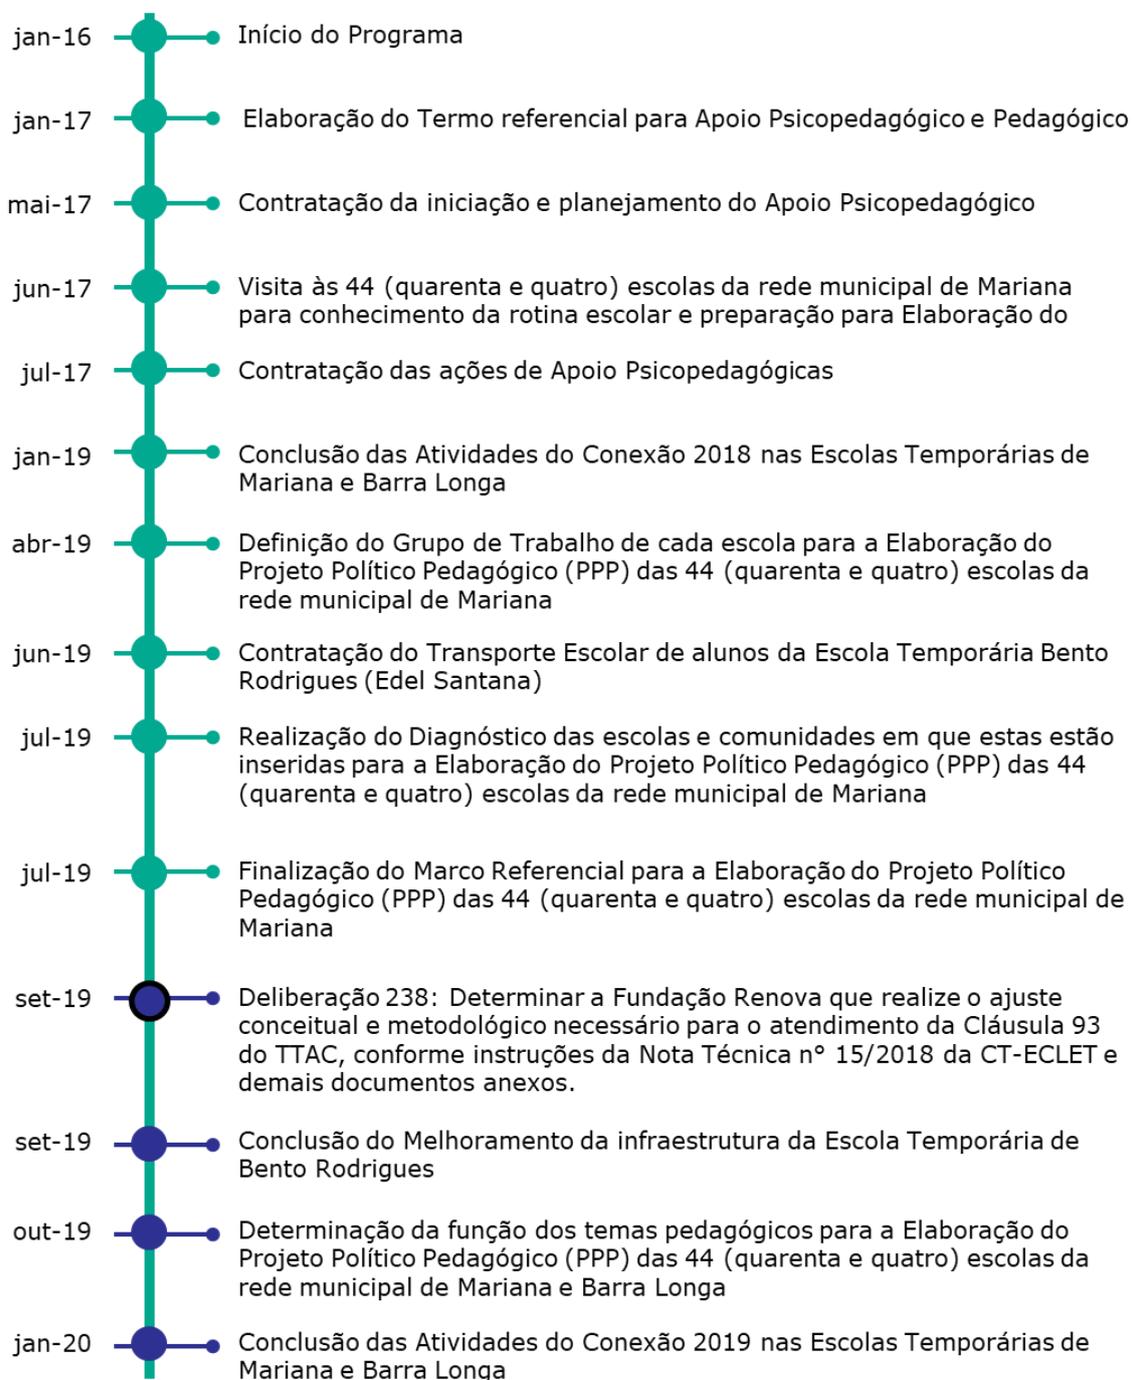

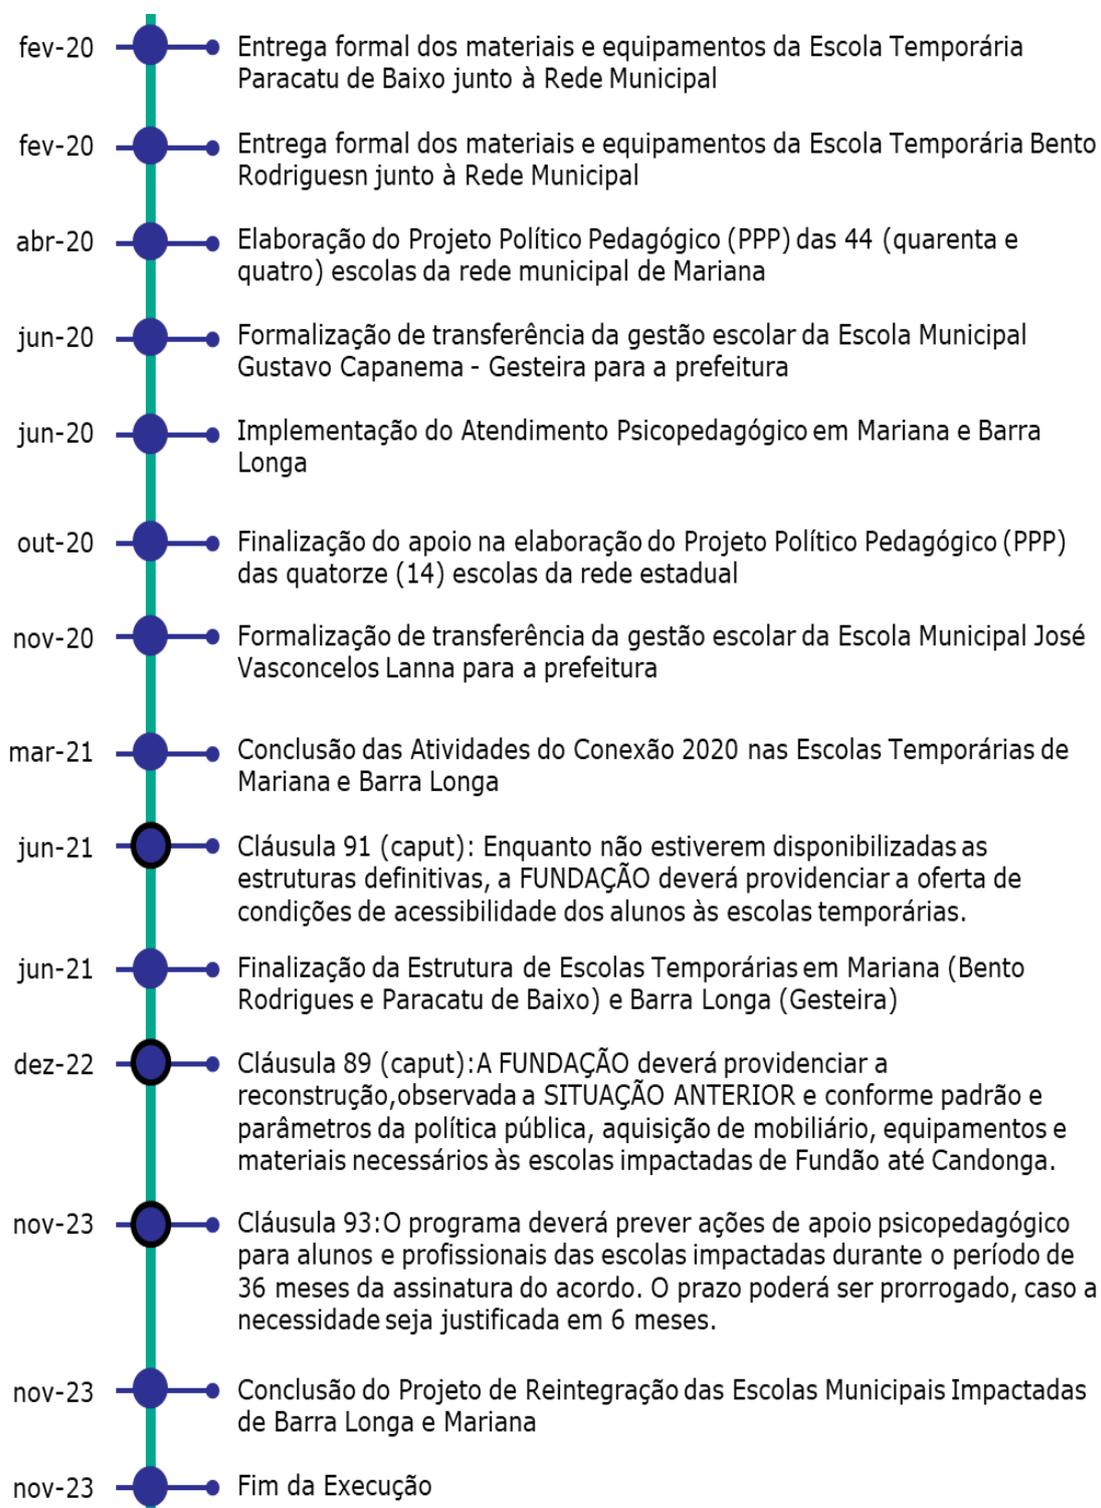

dez-23  Finalização do Programa 011

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Planejado
-  Reprogramado
-  Concluído Internamente
-  Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Não havia nenhuma entrega programada no Programa para o mês de Agosto/2019.
- Algumas atividades relacionadas ao Marco “Determinação da função dos temas pedagógicos para a Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das 44 (quarenta e quatro) escolas da rede municipal de Mariana” apresentaram atraso. Como contramedida a área está traçando estratégias com o fornecedor para realizar as atividades pendentes no mês de Setembro/2019 sem impactar o prazo da entrega em Outubro/2019.

Próximas entregas

Projeto de Escolas Temporárias de Mariana:

- Obter assinatura do Termo de Entrega das adequações solicitadas pela Vigilância Sanitária. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do Melhoramento da infraestrutura da Escola Temporária de Bento Rodrigues”.

Apoio Pedagógico às Escolas Municipais e Estaduais de Barra Longa e Mariana:

- Aprovar Plano de Trabalho junto à Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (Superintendências de Ouro Preto e de Ponte Nova) para alinhamento da metodologia de elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das Escolas Estaduais de Mariana e Barra Longa. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização do apoio na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das quatorze (14) escolas da rede estadual”.

- Finalizar a etapa “Determinar função dos temas pedagógicos” no processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) na Rede Municipal de Educação de Mariana e Barra Longa. Esta entrega refere-se ao Marco “Determinação da função dos temas pedagógicos para a Elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das 44 (quarenta e quatro) escolas da rede municipal de Mariana e Barra Longa”.

Desafios

- Reorientar e aprovar plano de trabalho do Projeto de Apoio Psicopedagógico de Mariana e Barra Longa que leve em consideração aspectos para o atendimento adequado das instituições escolares do ponto de vista da psicopedagogia institucional conforme solicitado na Deliberação 238.
- Aprovar junto à Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (Superintendências de Ouro Preto e Ponte Nova) o Plano de Trabalho para elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas da Rede Estadual.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística.

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

O objetivo geral é implantar medidas socioeducativas para preservação, manutenção e fortalecimento do Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico, na região impactada e em parceria com as comunidades e Poder Público. Conforme determinações das cláusulas 95 a 100 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 95,99 - Planejado.

Marcos do Programa



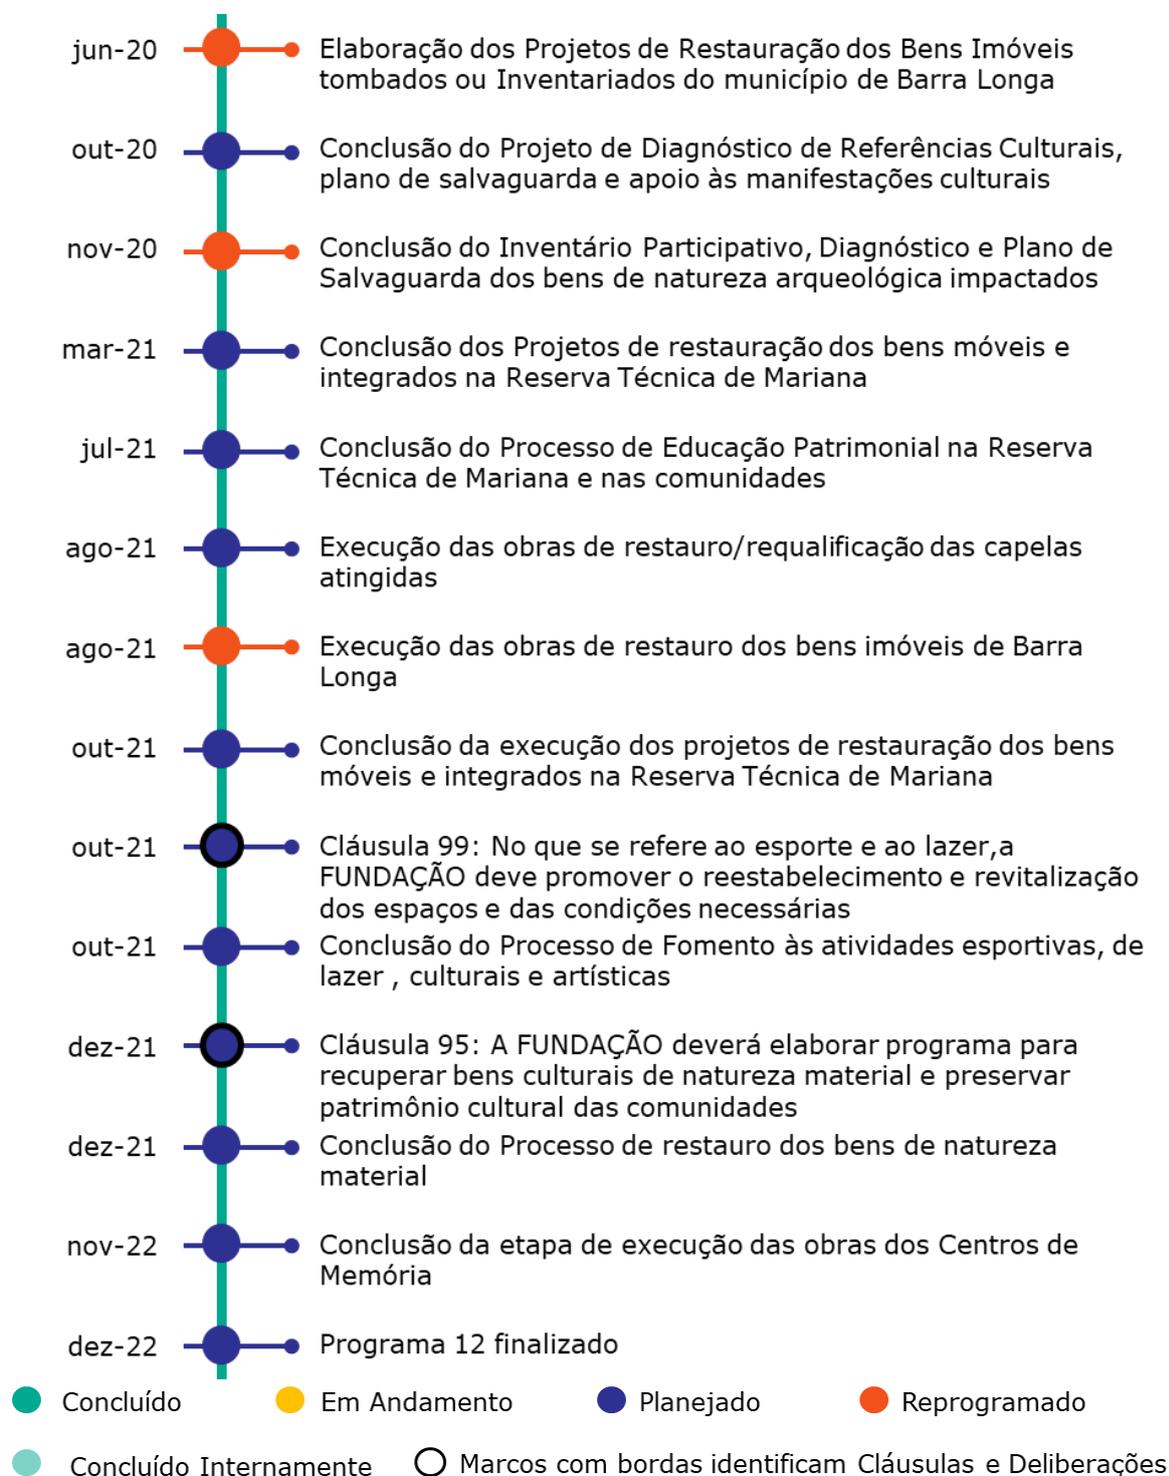

Entregas e fatos relevantes do mês

Projeto de Diagnóstico de Referências Culturais e Plano de salvaguarda:

- Em 16/08/19, término da etapa de aprofundamento do Diagnóstico de Referências Culturais. Após a conclusão do diagnóstico será definido o plano de salvaguarda a ser implementado nas comunidades. Esta entrega refere-se ao marco “Entrega dos produtos finais do diagnóstico de referências culturais – Etapa de aprofundamento”. (Fonte: 1802-RENOVA-RE-MST-IMA-M1419.pdf)

Processo dos bens de natureza material:

- Em 30/08/19, realização do procedimento de restauro em 6 peças na Reserva Técnica de Mariana, associadas às Capelas de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora da Conceição, São Bento e Santo Antônio. (Fonte: Execução dos Projetos de Restauro - Reserva Técnica)

Próximas entregas

Projeto de Diagnóstico de Referências Culturais e Plano de salvaguarda:

- Conclusão do Livro da Folia de Reis para a comunidade de Paracatu de Baixo. Referente à etapa de execução do plano de salvaguarda de Referências Culturais. Esta entrega refere-se ao marco “Projeto de Diagnóstico de Referências Culturais e Plano de Salvaguarda finalizado”;

Processo de Fomento às atividades esportivas, de lazer, culturais e artísticas:

- Apoio na realização da “Copa Barra Longa de Futebol”, junto ao Esporte Clube Barralenguense. Esta entrega refere-se ao Marco “Processo de fomento às atividades esportivas, de Lazer, culturais e artísticas finalizadas”.

Desafios

Projeto de Museu Território Centros de Memória:

- Possível atraso para o desenvolvimento do projeto Museu Território, pois a destinação final das áreas atingidas deve ser acordada entre comunidade atingida e Poder Público. A Fundação Renova terá papel exclusivo na etapa de execução;

Projeto de Diagnóstico de Referências Culturais e Plano de salvaguarda:

- Possível atraso ou inexecução dos diagnósticos de referências culturais na comunidade de Gesteira. Não houve ambiência até o momento para discussão junto à comunidade. Através destes diagnósticos, será possível construir um plano de salvaguarda das referências locais identificadas;

Processo dos bens de natureza material:

- Atraso na entrega dos projetos de restauro dos bens imóveis tombados / inventariados de Barra Longa devido ao desempenho abaixo do esperado de uma

das duas empresas contratadas. Assim, o escopo foi parcialmente transferido para segunda contratada.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

Fotos

Processo dos bens de natureza material:



Foto relacionada à: Procedimento de restauro na Reserva Técnica de Mariana – São José – Agosto/2019.



Foto relacionada à: Procedimento de restauro na Reserva Técnica de Mariana – Crucifixo em madeira- Agosto/2019.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


O objetivo geral desse programa é a partir de um diagnóstico de impacto do rompimento na área de abrangência socioeconômica, fomentar ações conjuntas para o fortalecimento das políticas públicas de gestão da Cultura, Turismo, Lazer e Esporte através de um apoio técnico e material das estruturas necessárias para um melhor desenvolvimento dessas atividades nas regiões impactadas, de acordo com o grau de severidade sofrido por cada localidade. Conforme determinação das cláusulas 101 a 105 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 101,103 e 104 - Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 239, 287, 321 – Em andamento.

Marcos do Programa

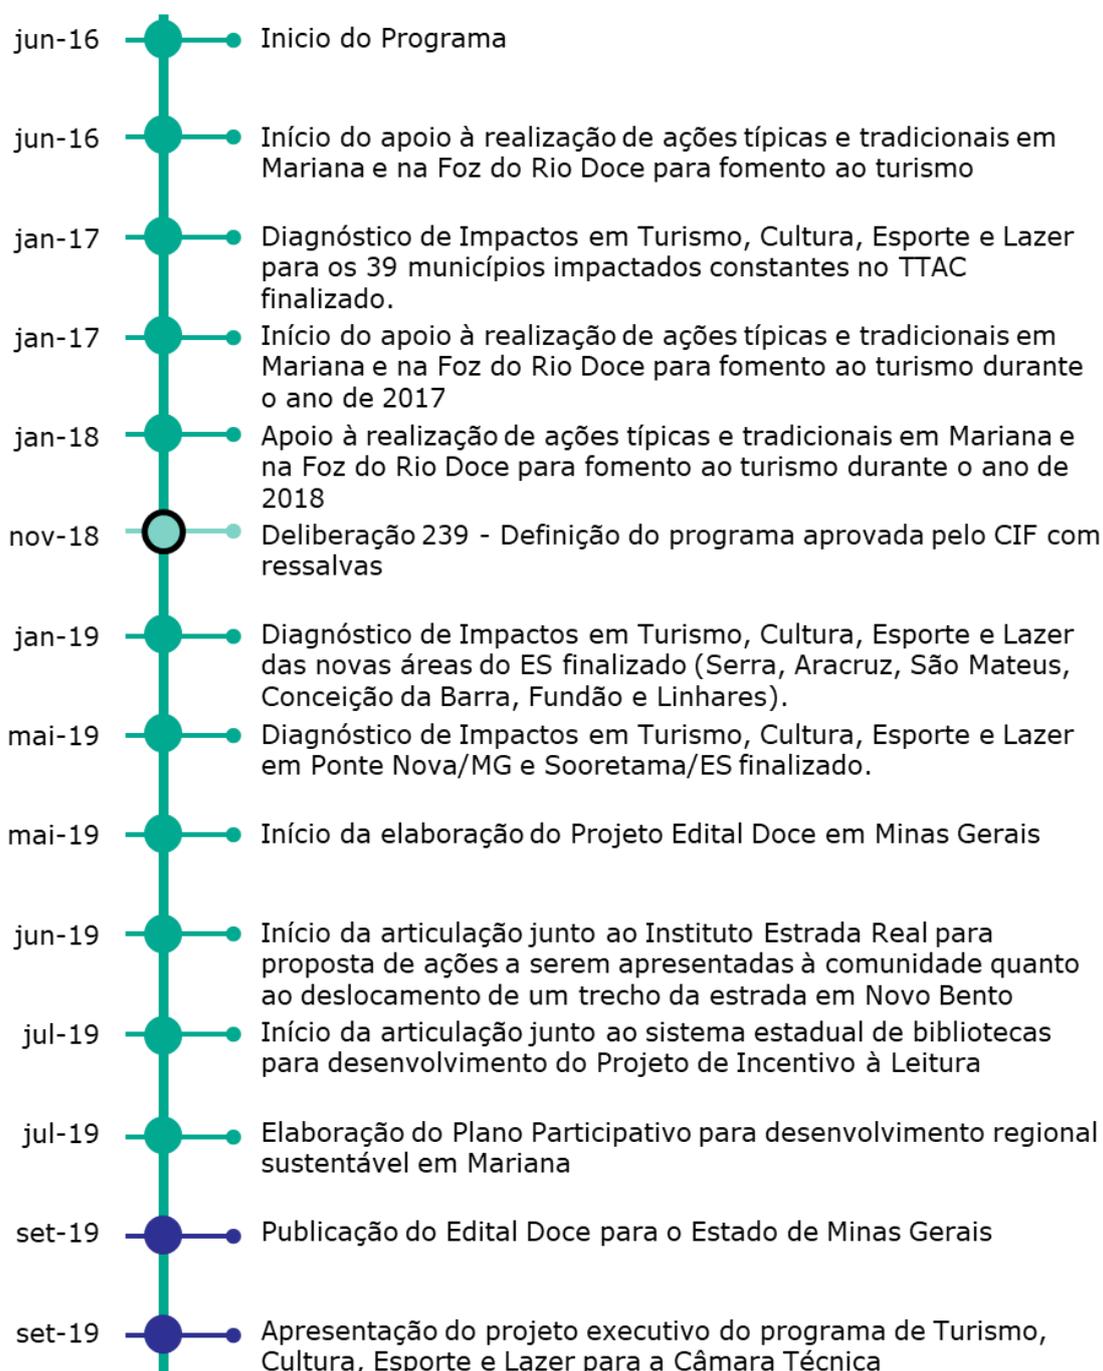



- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

Edital Doce – Espírito Santo:

- Início da elaboração da minuta do Projeto Edital Doce junto às secretarias de Governo do Estado do Espírito Santo.

Próximas entregas

Edital Doce – Minas Gerais:

- Publicação do Edital Doce para o Estado de Minas Gerais.

Desafios

Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer:

- Concluir o processo de validação, junto aos agentes envolvidos, da revisão da estratégia de execução do programa dentro do prazo previsto.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Identificar alterações no perfil de saúde da população atingida, em decorrência do rompimento. Com base em evidências de correlação, desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados.


Cláusulas do TTAC: Cláusulas 106, 107, 109, 111 e 112 em andamento.


Deliberações que impactam em escopo e prazo: Deliberações 106, 130, 189, 197, 198, 219, 220, 247, 252, 264, 265, 266 e 301 concluídas internamente.

Marcos do Programa

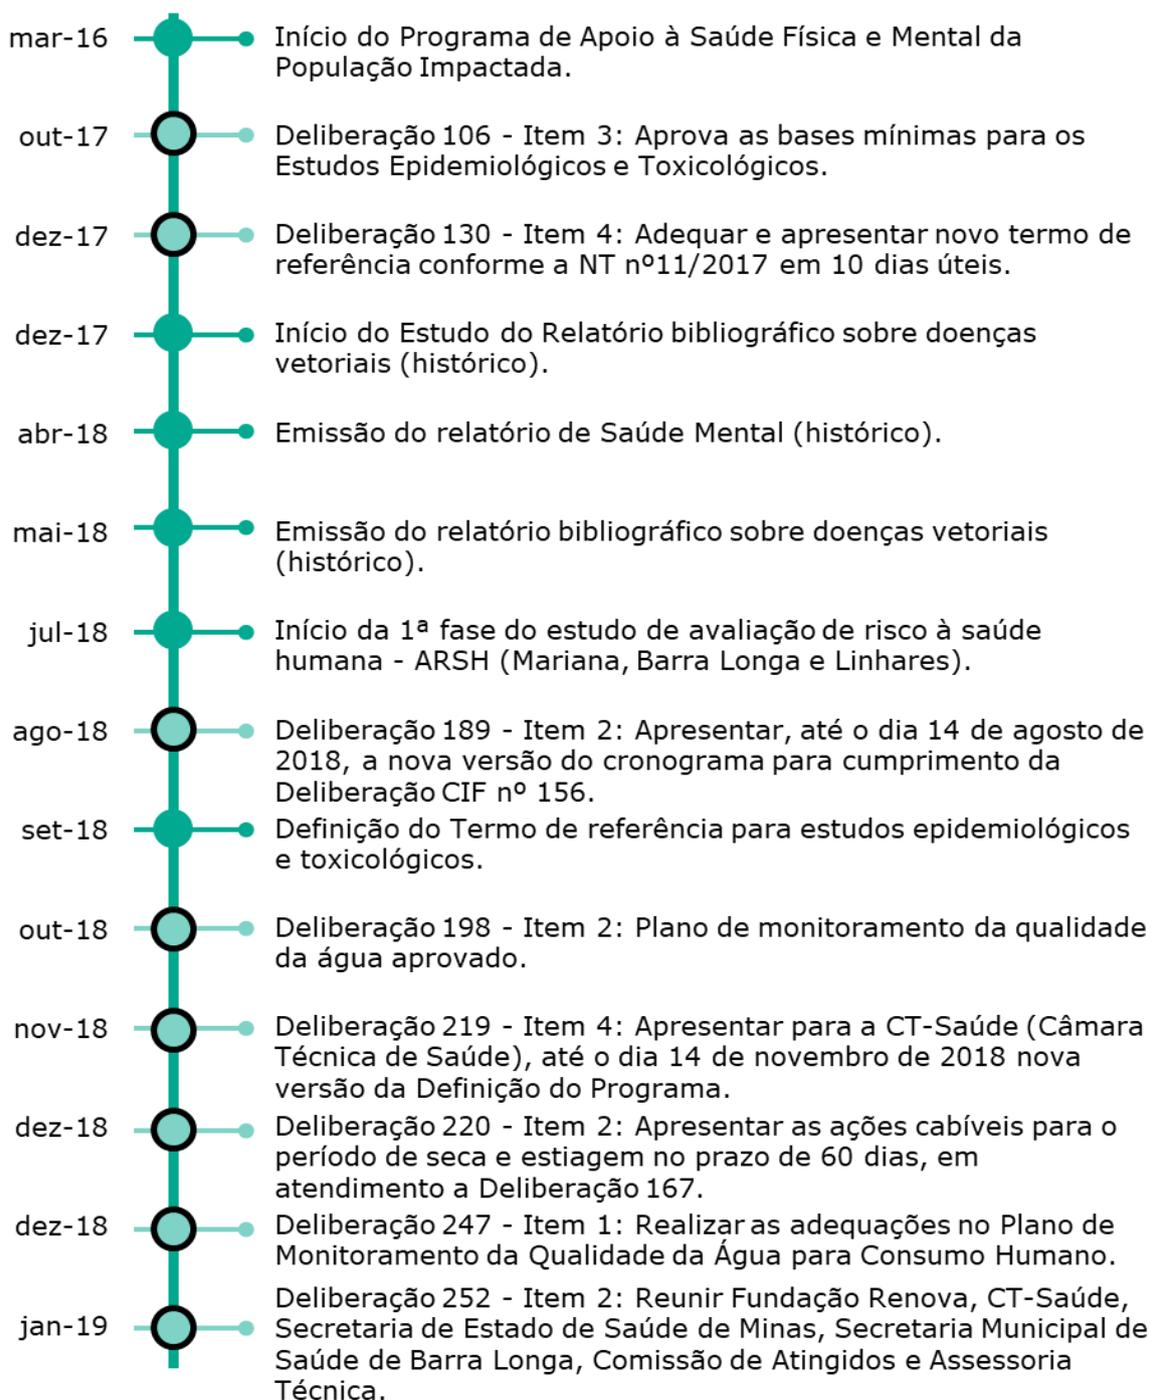


- abr-19 ● Deliberação 220 - Item 3: As ações cabíveis para o período de seca e estiagem devem ser apresentadas pela Fundação Renova no prazo de 60 (sessenta) dias.
- abr-19 ● Homologação com os municípios dos Planos de reparação em Saúde de Mariana.
- abr-19 ● Deliberação 266 - Item 2: Promover as adequações propostas pela CT-Saúde (Câmara Técnica da Saúde) e enviar documento em 10 dias.
- mai-19 ● Deliberação 197 - Itens 1 e 2: Celebração de Acordos de Cooperação Técnica entre a Fundação Renova e as Fundações de Apoio e Amparo à Pesquisa, para a realização dos Estudos.
- mai-19 ● Deliberação 264 - Item 4: Promover as adequações propostas pela CT-Saúde (Câmara Técnica da Saúde) na Definição do Programa e enviar no prazo de 20 dias.
- mai-19 ● Deliberação 265 - Item 2: PMQACH: Enviar para a Câmara Técnica nova versão do documento, no prazo máximo de 20 dias.
- mai-19 ● Deliberação 301: Aprovar as Bases Mínimas para a elaboração do relatório semestral do PMQACH (Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano).
- mai-19 ● Elaboração do plano de monitoramento da qualidade da água.
- mai-19 ● Conclusão do 1º repasse de Verba ao Município de Mariana para Suplementação de mão de obra.
- mai-19 ● Conclusão das obras para recuperação do Ponto de Atendimento Primário à Saúde na localidade de Ponte do Gama em Mariana.
- jul-19 ● Recuperação e Entrega do Ponto de Atenção Primária à Saúde da localidade de Ponte do Gama em Mariana ao município de Mariana.
- jul-19 ● Submissão às avaliações necessárias dos relatórios (parciais e final) da 1ª fase do Estudo de avaliação de risco à saúde humana - ARSH - (Peer Review).
- jul-19 ● Entrega dos Mobiliário/Equipamentos para o espaço CONVIVER em Mariana.
- jul-19 ● Encaminhamento da definição do Programa Saúde para Câmara Técnica da Saúde - CT Saúde.

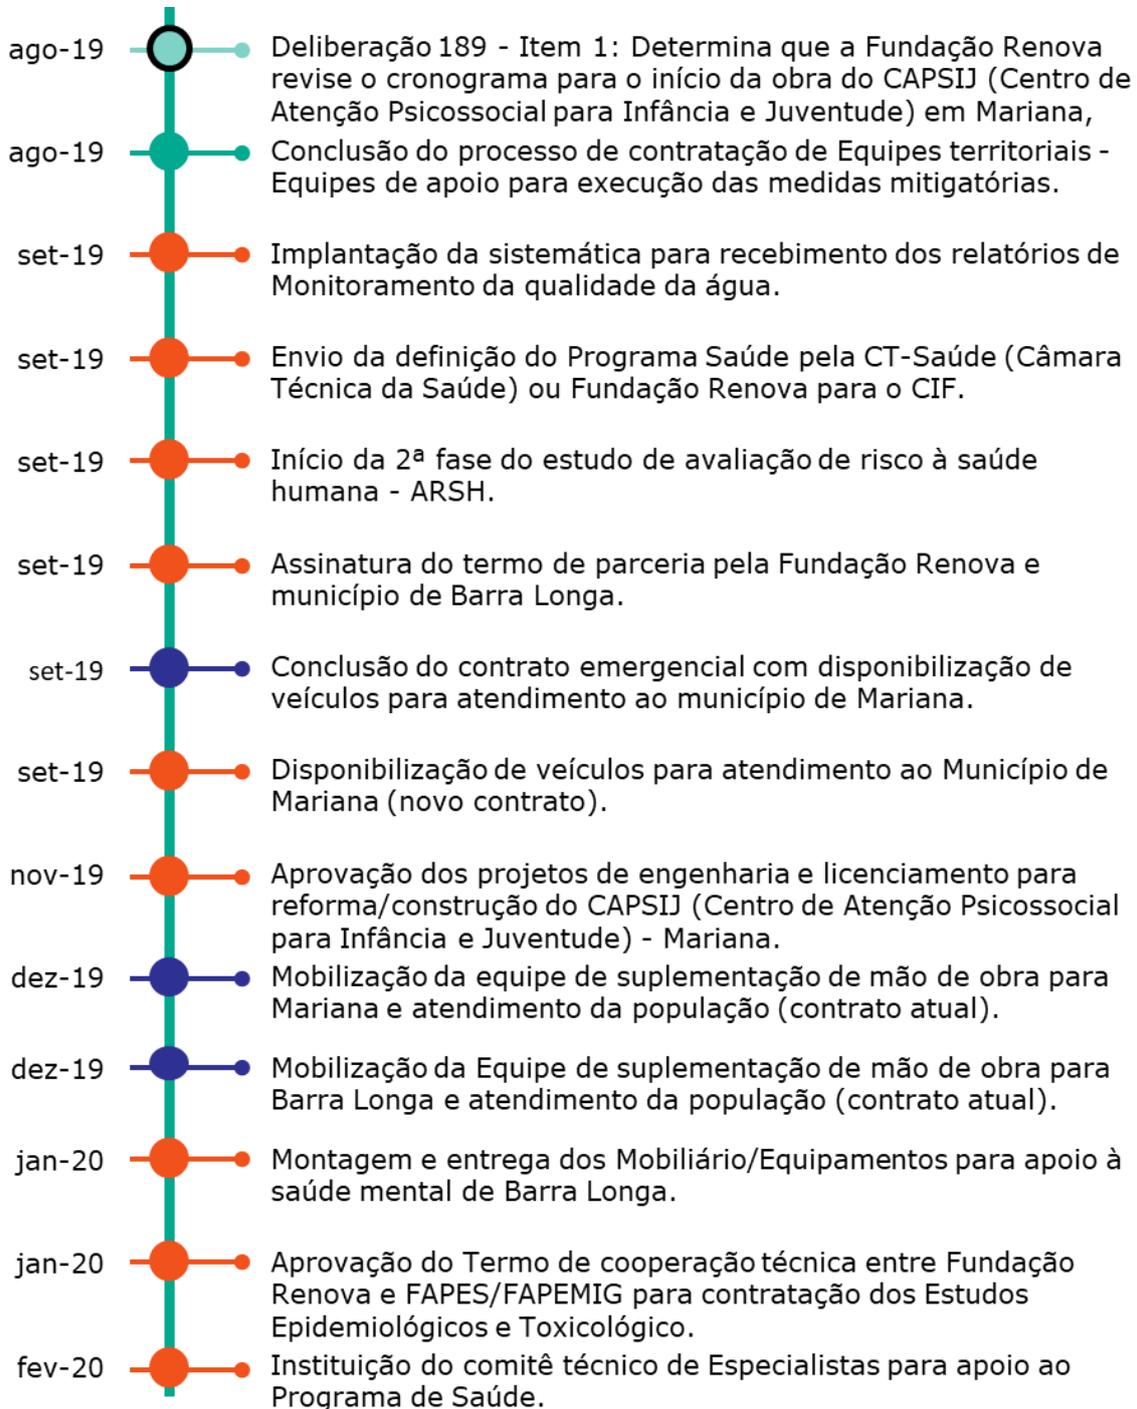

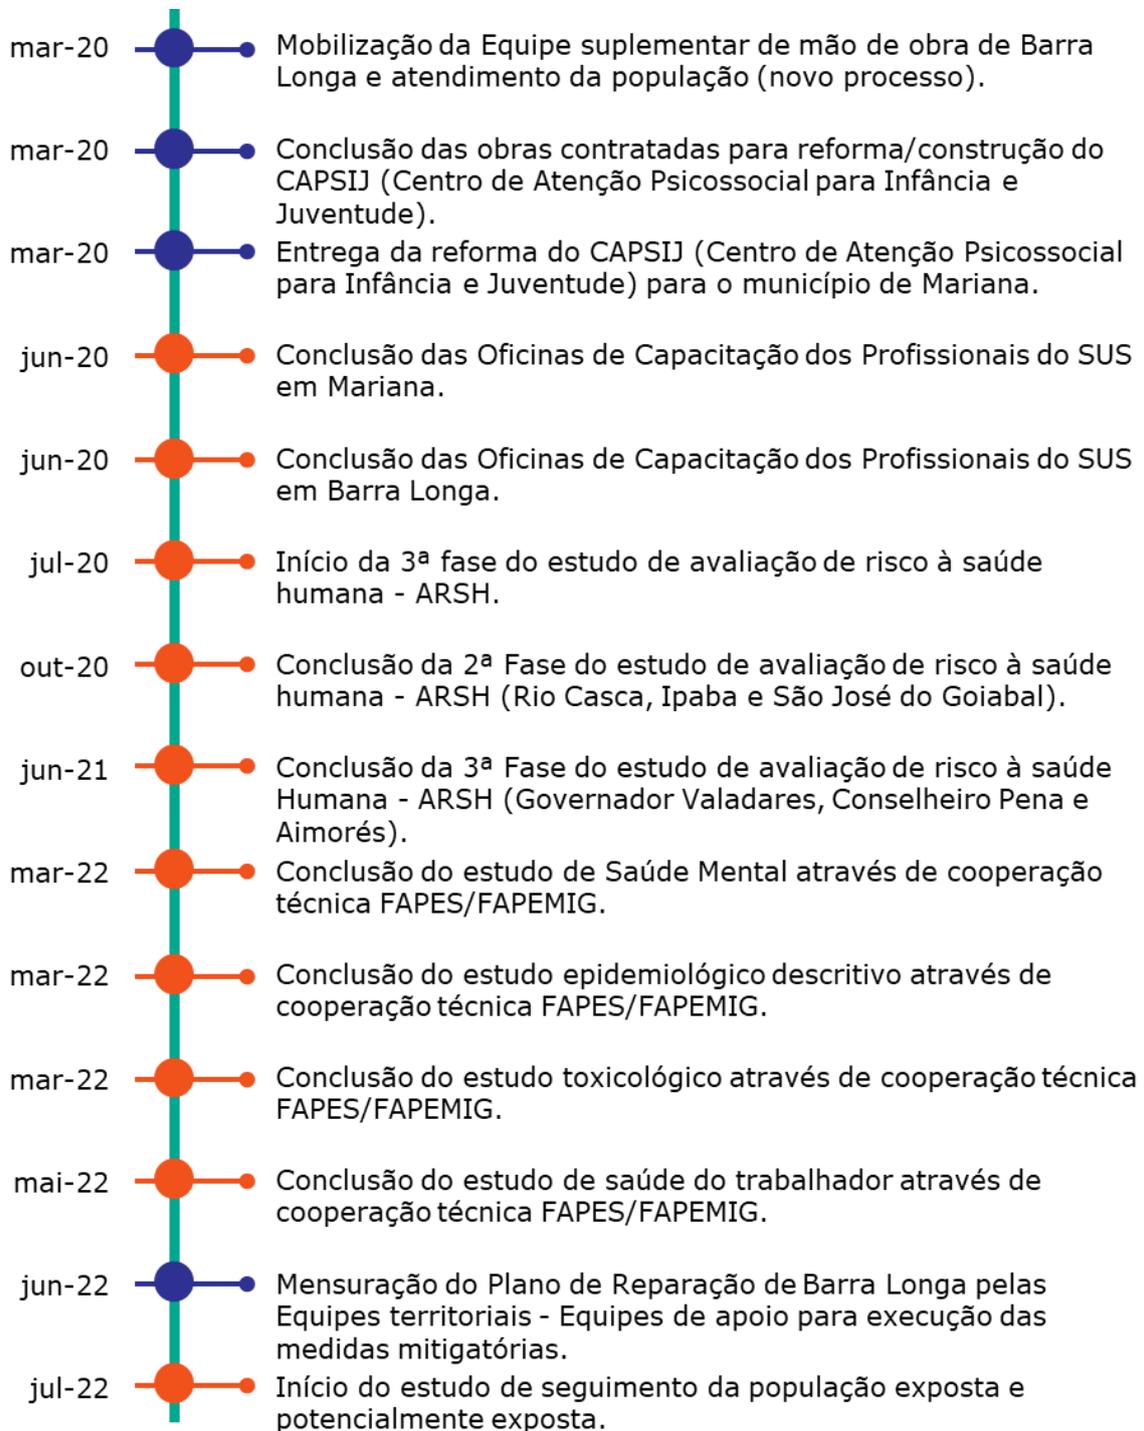



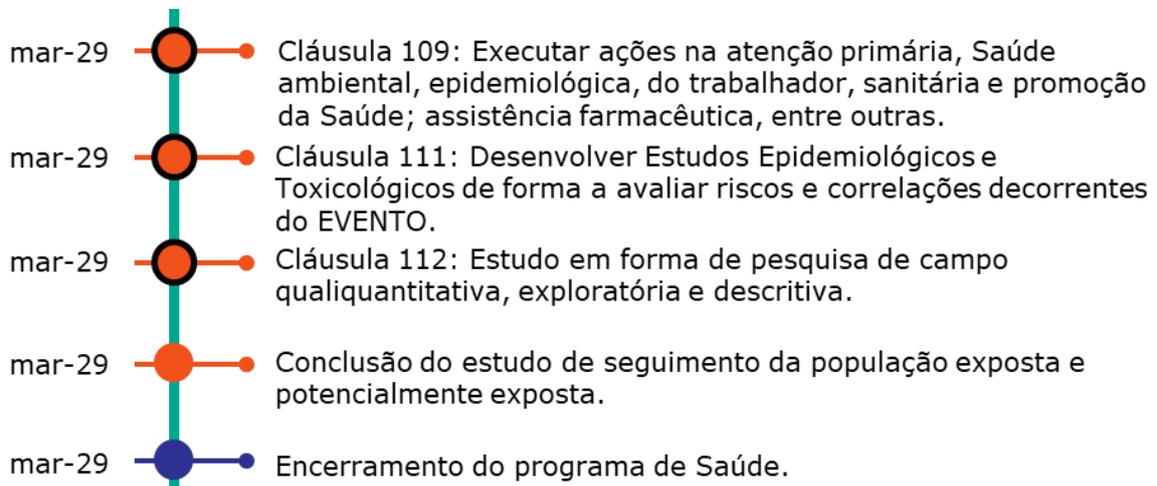

- Concluído
 ● Em Andamento
 ● Planejado
 ● Reprogramado
- Concluído Internamente
 ○ Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Cronograma para o início da obra do Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Juventude - CAPSij em Mariana revisado, conforme Deliberação CIF 189 (Fonte: P14-RMS-001-01_Cronograma CAPSij_190813.pdf);
- Concluída a contratação das equipes de território que atuarão apoiando na execução das medidas mitigatórias (apoio a Proteção Social e Saúde) junto aos municípios atingidos (Fonte: SUP-PC-000-01_4900000054_190827.pdf);
- Visita aos municípios de Colatina, Baixo Gandu e Linhares (Fonte: P14-ATA-001-01_Colatina_190808.pdf; P14-ATA-001-01_Baixo Gandu_190808.pdf; P14-ATA-001-01_Linhares_190816.pdf);
- Instalação de uma grade adicional na unidade de Atenção Primária à Saúde da localidade de Ponte do Gama em Mariana (item não contemplado no escopo da recuperação feita pela Fundação Renova), conforme solicitação do secretário Municipal de Saúde de Mariana (Fonte: P14-RMS-001-01_Grades Ponte do Gama_190820.jpg);
- Atraso na aprovação dos Projetos de engenharia e licenciamento para reforma/construção do Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Juventude – CAPSIJ em Mariana. Em 30/08/19, os projetos revisados atendendo as revisões propostas pelos órgãos responsáveis, foram protocolados junto a Prefeitura de Mariana (Fonte: P14-RMS-002-01_Protocolo CAPSij_190830.pdf);
- Atraso no início do repasse de verba para suplementação de mão de obra em Barra Longa. O município alega estar no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo receber recursos para contratação direta ou indireta de

profissionais. O modelo a ser utilizado para a suplementação de mão de obra está sendo reavaliado junto à CT Saúde e o município para que o processo seja iniciado;

- Implantação da sistemática para recebimento dos relatórios de Monitoramento da qualidade da água para consumo humano em fase de validação dos prazos de recebimento junto ao Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce.

Próximas entregas

- Aprovar e assinar o termo de parceria junto ao município de Barra Longa. Esta entrega refere-se ao Marco Assinatura do termo de parceria pela Fundação Renova e município de Barra Longa;
- Receber da CT Saúde as recomendações referentes ao documento da Definição do Programa Saúde e encaminhamento para o CIF. Esta entrega refere-se ao Marco Envio da Definição do Programa Saúde para o CIF pela CT Saúde ou Fundação Renova;
- Concluir a implantação da sistemática de recebimento dos relatórios de Monitoramento da qualidade da água para consumo humano. Esta entrega refere-se ao Marco Implantação da sistemática para recebimento dos relatórios de Monitoramento da qualidade da água;
- Encerrar o contrato emergencial de disponibilização de veículos para atender o município de Mariana. Esta entrega refere-se ao Marco Conclusão do contrato emergencial com disponibilização de veículos para atendimento ao município de Mariana;

- Concluir o processo de suprimentos para locação de veículos (novo processo concorrencial) e disponibilizar veículos para o município de Mariana. Esta entrega refere-se ao Marco Disponibilização de veículos para atendimento ao Município de Mariana (novo contrato).

Desafios

- Efetivação do Convênio de cooperação técnica com a FAPES e FAPEMIG para contratação dos estudos epidemiológicos e toxicológicos (nova estratégia adotada para o chamamento de entidades interessadas em realizar os estudos);
- Obter licenciamento para construção e reforma do CAPSij de Mariana junto à Secretaria de Obras, IPHAN e Secretaria de Saúde;
- Atuar frente a uma possível transferência da responsabilidade pelos serviços de garantia da saúde das comunidades do setor público para a Fundação devido às dificuldades operacionais, financeiras ou técnicas do gestor público em responder às demandas de saúde da população impactada;
- Avaliação e aprovação do documento de "Definição do Programa" da Saúde junto a CT Saúde e posterior encaminhamento para aprovação do CIF;
- Assinar o termo de parceria do Programa de Saúde com o município de Barra Longa, para iniciar as ações do programa neste município.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores foram redefinidos e o plano de implementação para início do controle está em andamento.

Fotos



Foto relacionada à: Visita ao Município de Colatina – agosto/2019.



Foto relacionada à: Visita ao Município Baixo Guandu – agosto/2019.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Fomentar a inovação e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação.


Cláusulas do TTAC: 113,114 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 100, 126, 31 – Concluída internamente.

Marcos do Programa

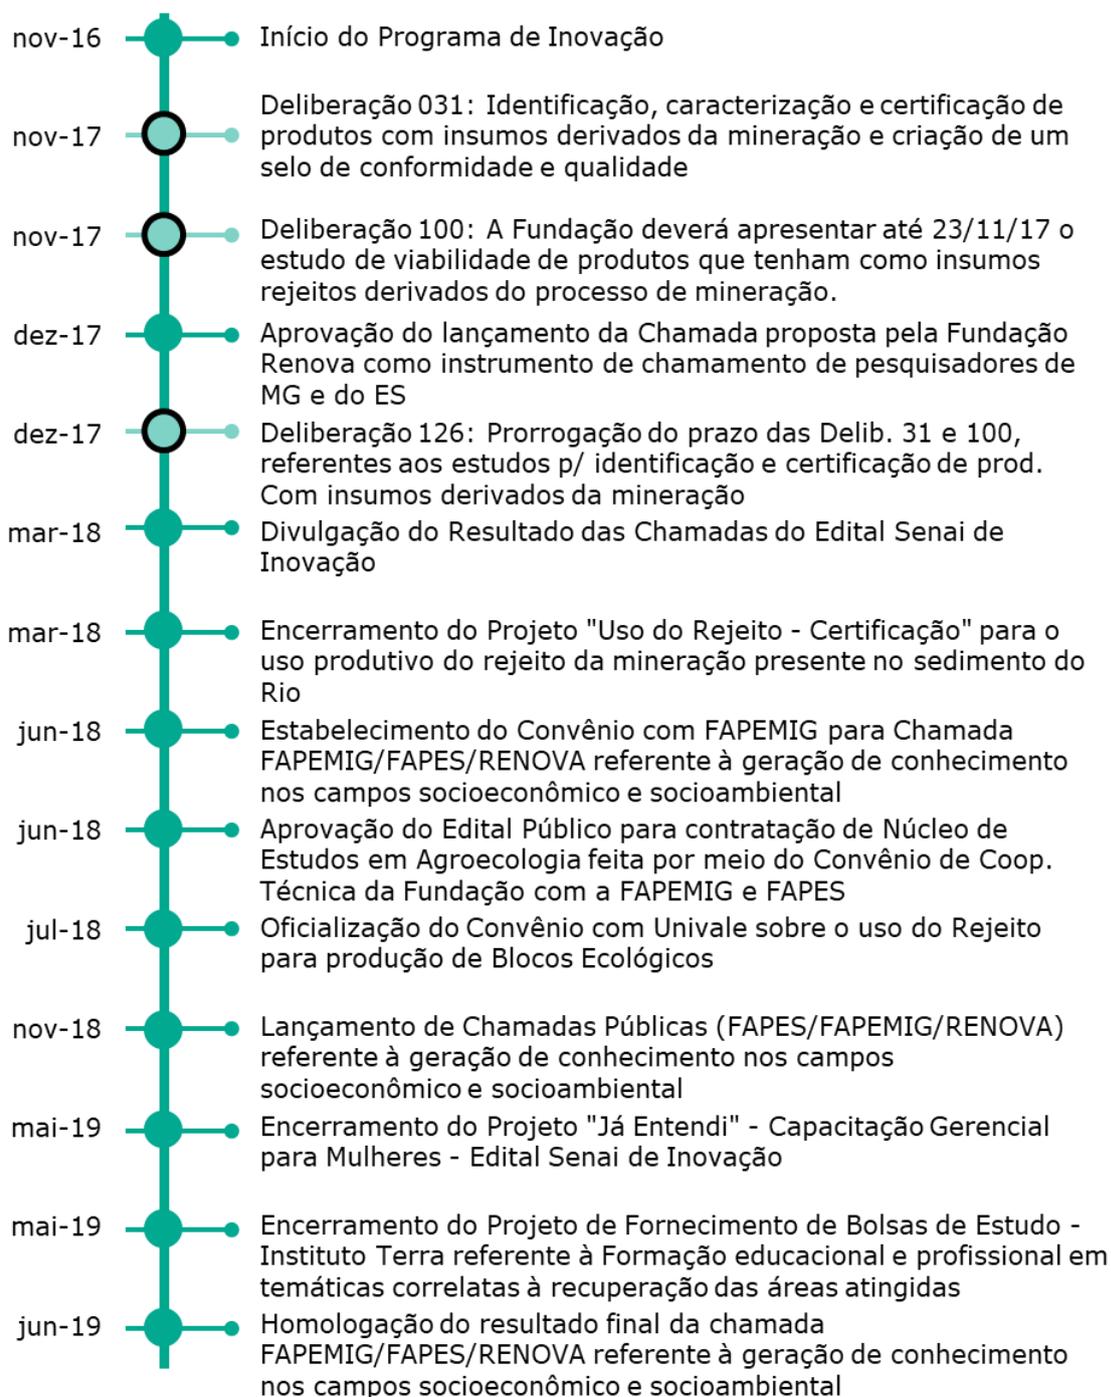



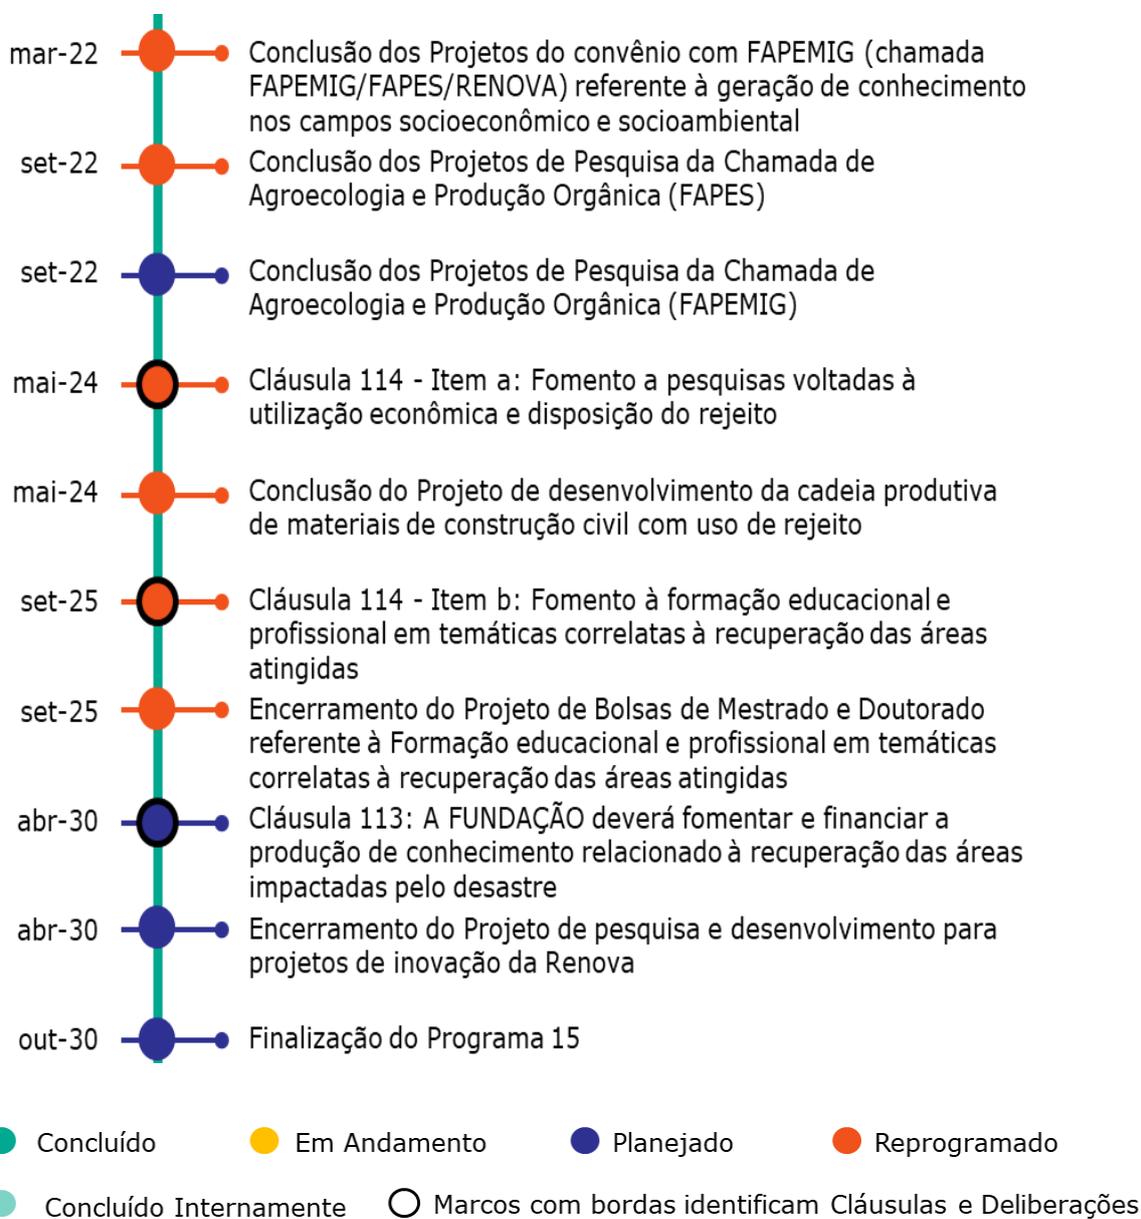

Entregas e fatos relevantes do mês

Projeto Skyvideo - Drone para coleta de amostras de água e análise ambiental com sonda multiparamétrica:

- Em 20/08/2019, foi realizada a adaptação do drone atual para que o mesmo seja capaz de ter acoplado à sua estrutura a sonda multiparamétrica, responsável pelas análises físico-químicas, que poderá ser realizada em contato com a água.

Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Ecológicos:

- No dia 22/08/2018, os bolsistas do projeto de pesquisa de caracterização do solo com rejeitos e análise da viabilidade técnica para produção de blocos ecológicos finalizaram a segunda coleta de amostras para testes de resistência e absorção de água dos blocos ecológicos.

Próximas entregas

Chamada de Agroecologia e Produção Orgânica (FAPEMIG):

- Formalizar convênio com FAPEMIG para chamada de agroecologia e produção orgânica em Minas Gerais. Esta entrega refere-se ao Marco "Realização do Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPEMIG)".

Chamada de Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES):

- Formalizar convênio com FAPES para chamada de agroecologia e produção orgânica no Espírito Santo. Esta entrega refere-se ao Marco "Realização do Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)".

Desafios

- Compatibilizar o prazo de conclusão das pesquisas financiadas através dos editais com o prazo de execução das ações reparatórias da Renova.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Viabilizar o retorno da atividade pesqueira diretamente impactada ao longo da área de abrangência socioeconômica, criando as condições para a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca. Identificar e viabilizar a realocação em novas atividades econômicas e produtivas, compatíveis com o modo de vida de pescadores e aquicultores impactados, sempre que a retomada da atividade de pesca não for possível, em razão dos efeitos causados pelo rompimento da barragem.


Cláusulas do TTAC: 116 – Em andamento; 117 – Em andamento; 118 – Em andamento; 119 – Em andamento; 120 – Em andamento; 122 – Em andamento; a 123 – Em andamento

Deliberações que impactam escopo e prazo: 147 – Concluída internamente; 121 – Em andamento; 58 – Em andamento e 167 – Em andamento.

Marcos do programa

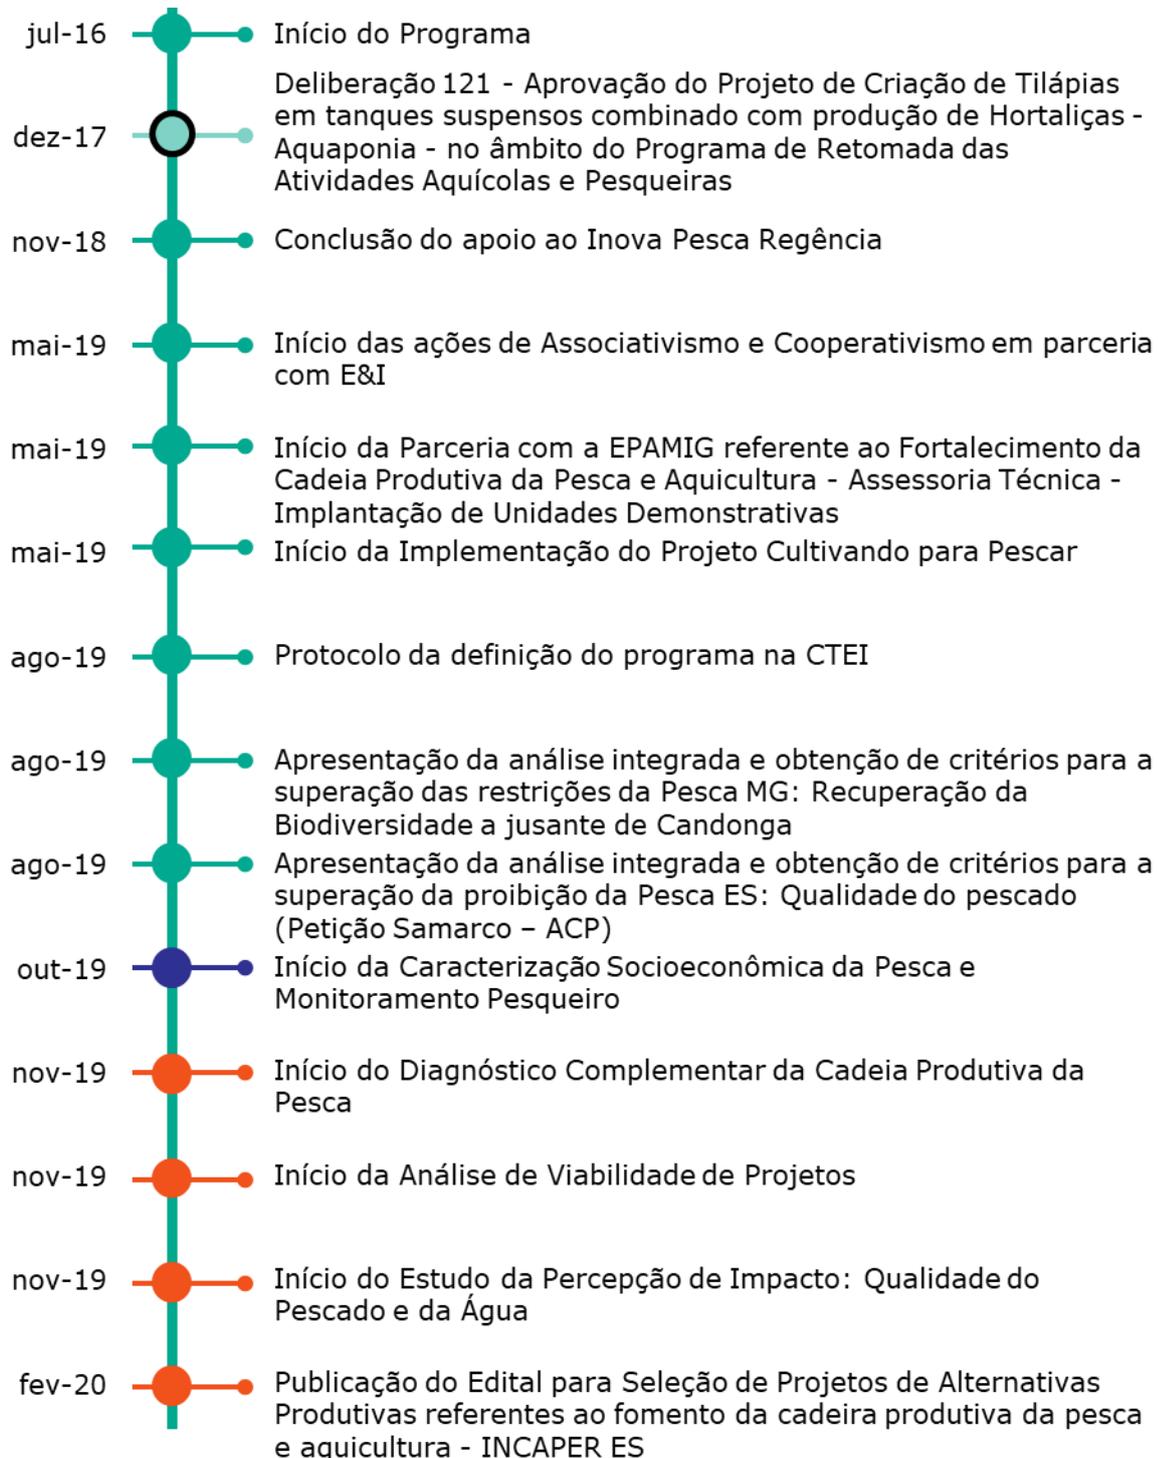

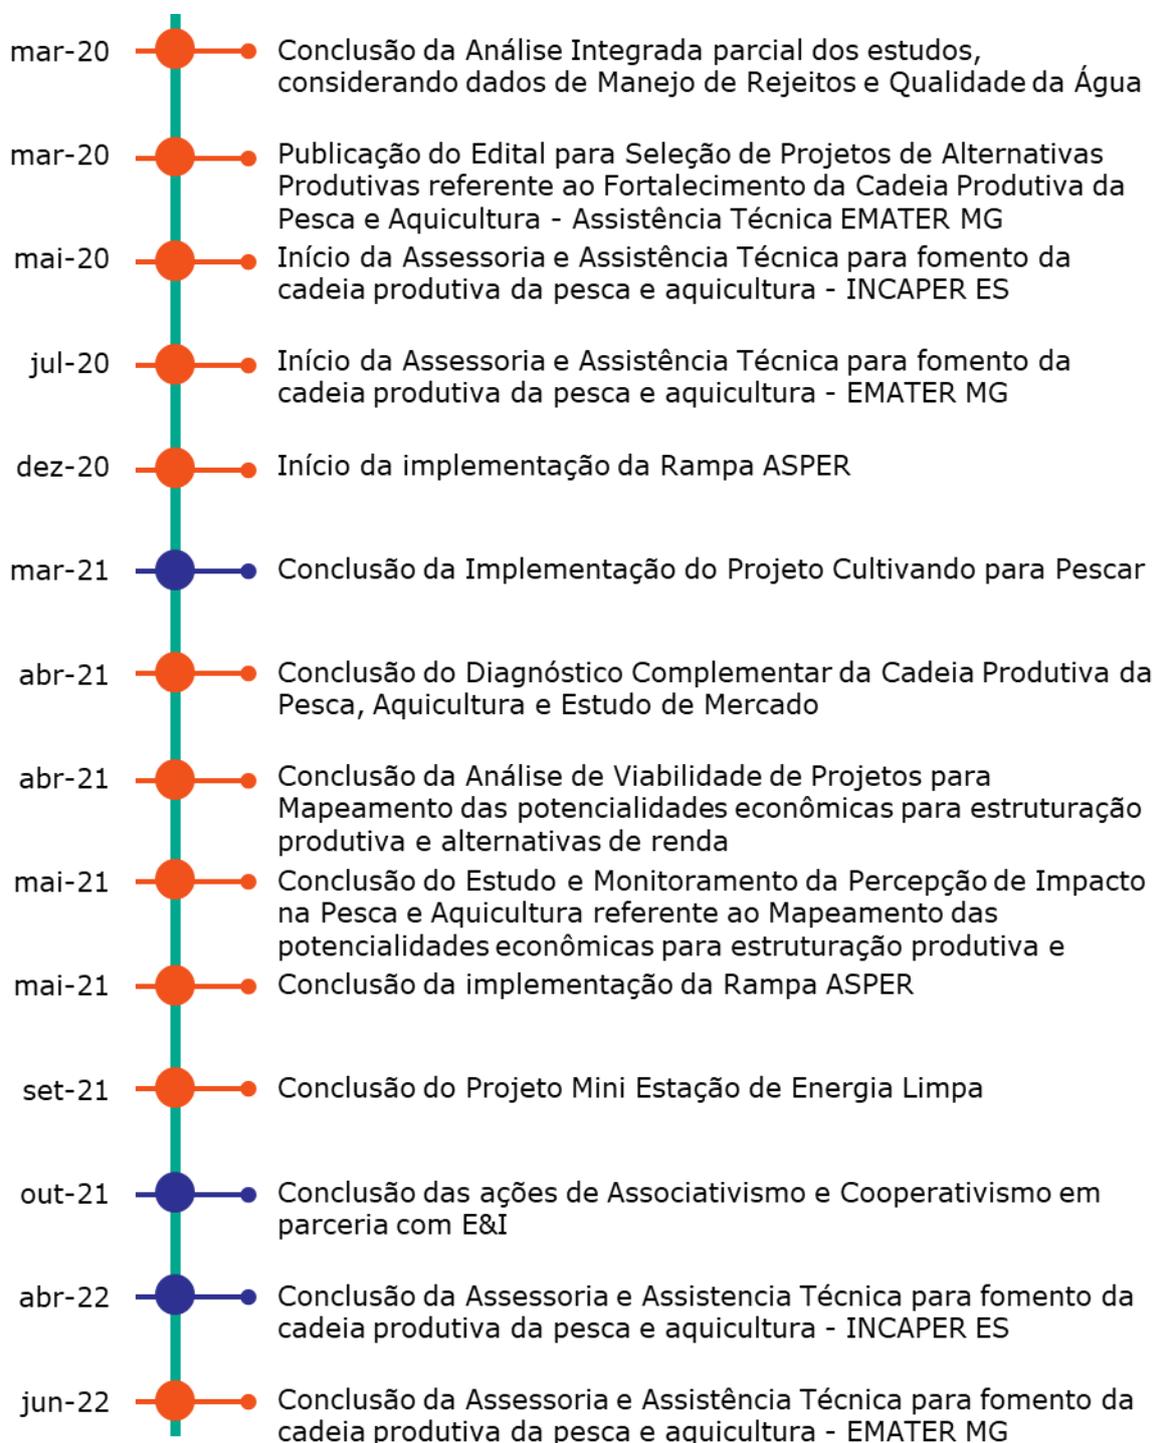

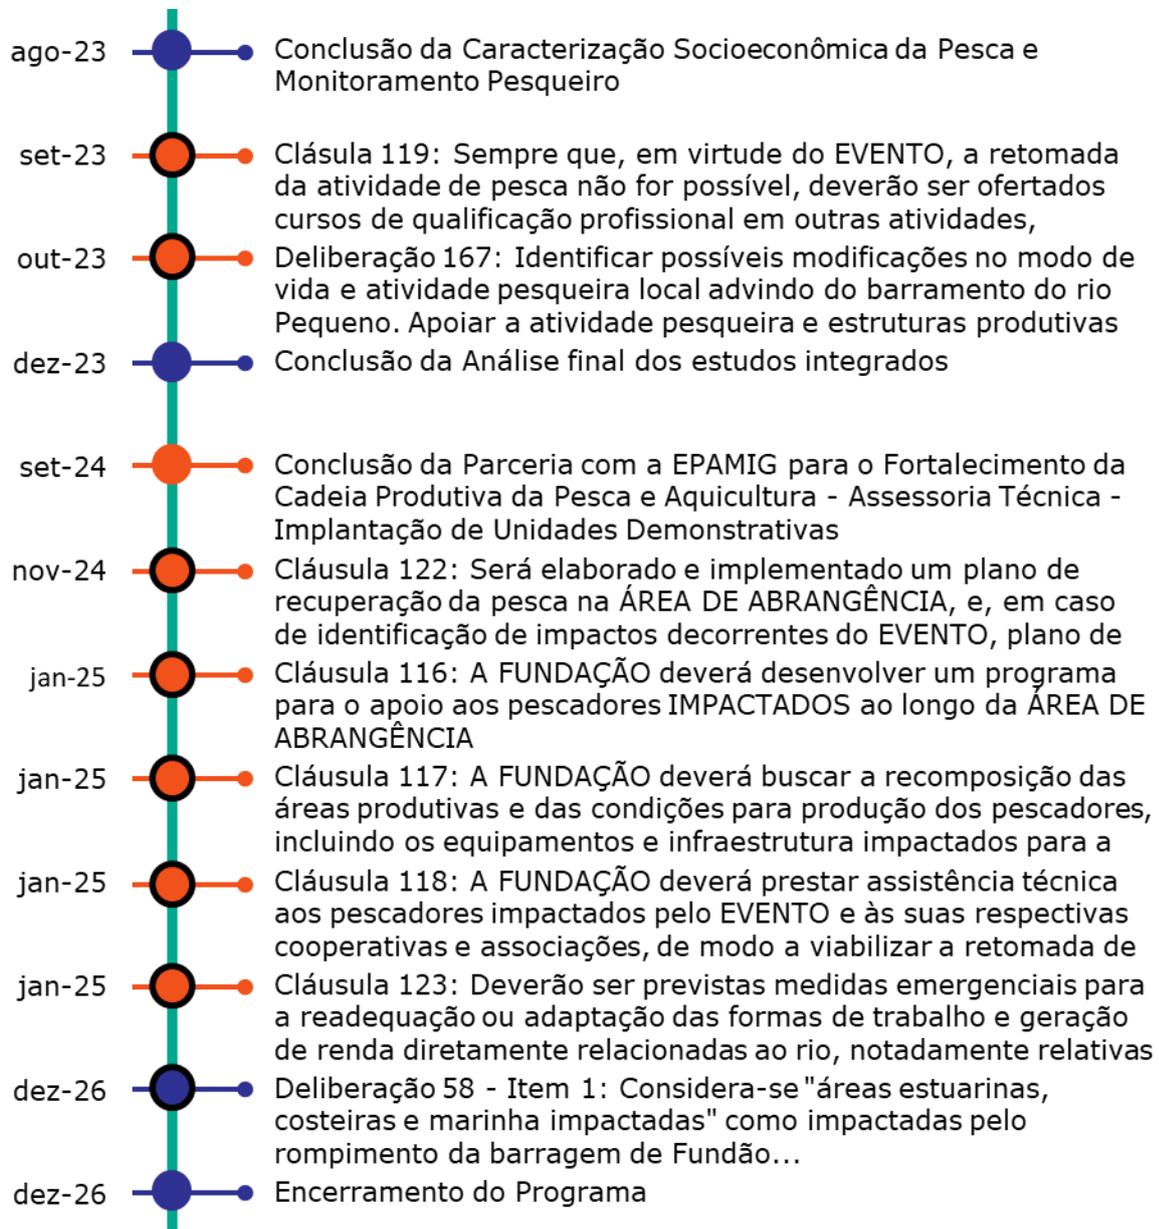

*As datas acima foram planejadas pela equipe do Programa da Pesca e ainda não contemplam as interfaces. As datas podem sofrer alterações após a inclusão das interfaces.

- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

Documento de Definição do programa:

- Documento de Definição do Programa protocolado na CTEI. (Fonte: OFI.NII.082019.7698 - Definição PG16).

Avaliação Integrada dos Estudos - Avaliação das conclusões com viés programa da pesca para resposta à Portaria do IEF (População de ictiofauna - Biodiversidade):

- Análise integrada dos estudos realizados pelos programas de interface (Biodiversidade, Manejo de Rejeitos, Qualidade da Água, tal como os estudos do PG 16) elaborada e apresentada no Seminário Técnico. (Fonte: PG016-ATA-001-01_Reunião GT PESCA_190812).

Avaliação das conclusões com viés programa da pesca para resposta à ACP - Qualidade do pescado (Biodiversidade) - Impacto Ecológico (Rede de arrasto) BIO/FEST/UFES:

- Análise integrada dos estudos realizados pelos programas de interface (Biodiversidade, Manejo de Rejeitos, Qualidade da Água e Saúde Humana tal como os estudos do PG 16) elaborada e apresentada no Seminário Técnico. (Fonte: PG016-ATA-001-01_Reunião GT PESCA_190812).

Projeto Cultivando para Pescar:

- Início dos cursos de capacitação, seleção de áreas e mobilização para instalação dos tanques do projeto Cultivando para Pescar (Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES_190820).

Próximas entregas

Mapeamento das potencialidades econômicas para estruturação produtiva e alternativas de renda (Diagnóstico da cadeia produtiva, Viabilidade de projetos e Estudo da Percepção de Impacto):

- Finalização da contratação do pacote de Diagnóstico complementar, percepção do impacto da pesca e viabilidade de projetos, referente aos marcos: “Início do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca”, “Início do Estudo da Percepção de Impacto: Qualidade do Pescado e da Água” e “Início da Análise de Viabilidade de Projetos”.

Desafios

- Superar as Limitações e Restrições à Pesca e Aquicultura junto à Portaria IEF nº 40/2017 e à Ação Civil Pública (ACP) 000257113.2016.4.02.5004 (2016.50.04.0025710);

- Aceitação dos resultados obtidos sobre a qualidade do pescado e da água a partir dos resultados dos estudos existentes e os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente;
- Definição de a quem compete a comunicação dos resultados dos estudos sobre a qualidade do pescado (Agências reguladoras);
- Ampliação e/ou permanência da proibição ou da restrição da pesca e impedimento do ofício no rio Doce, áreas estuarinas e/ou marinha;
- Adesão dos pescadores, colônias e associações ao programa de retomada das atividades aquícolas e pesqueiras.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores estão propostos na revisão da definição do programa e serão avaliados pela CTEI.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água


Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a garantir o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento, incluindo ações relacionadas ao incremento de alternativas para manejo de solo e água. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis, visando à agregação de valor, diversificação econômica inclusiva e alternativas aos produtores rurais que também atuam em atividades pesqueiras no rio Doce.

Cláusula do TTAC: 124 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 145 263-2 e 263-3 – Concluídas internamente.

Marcos do Programa

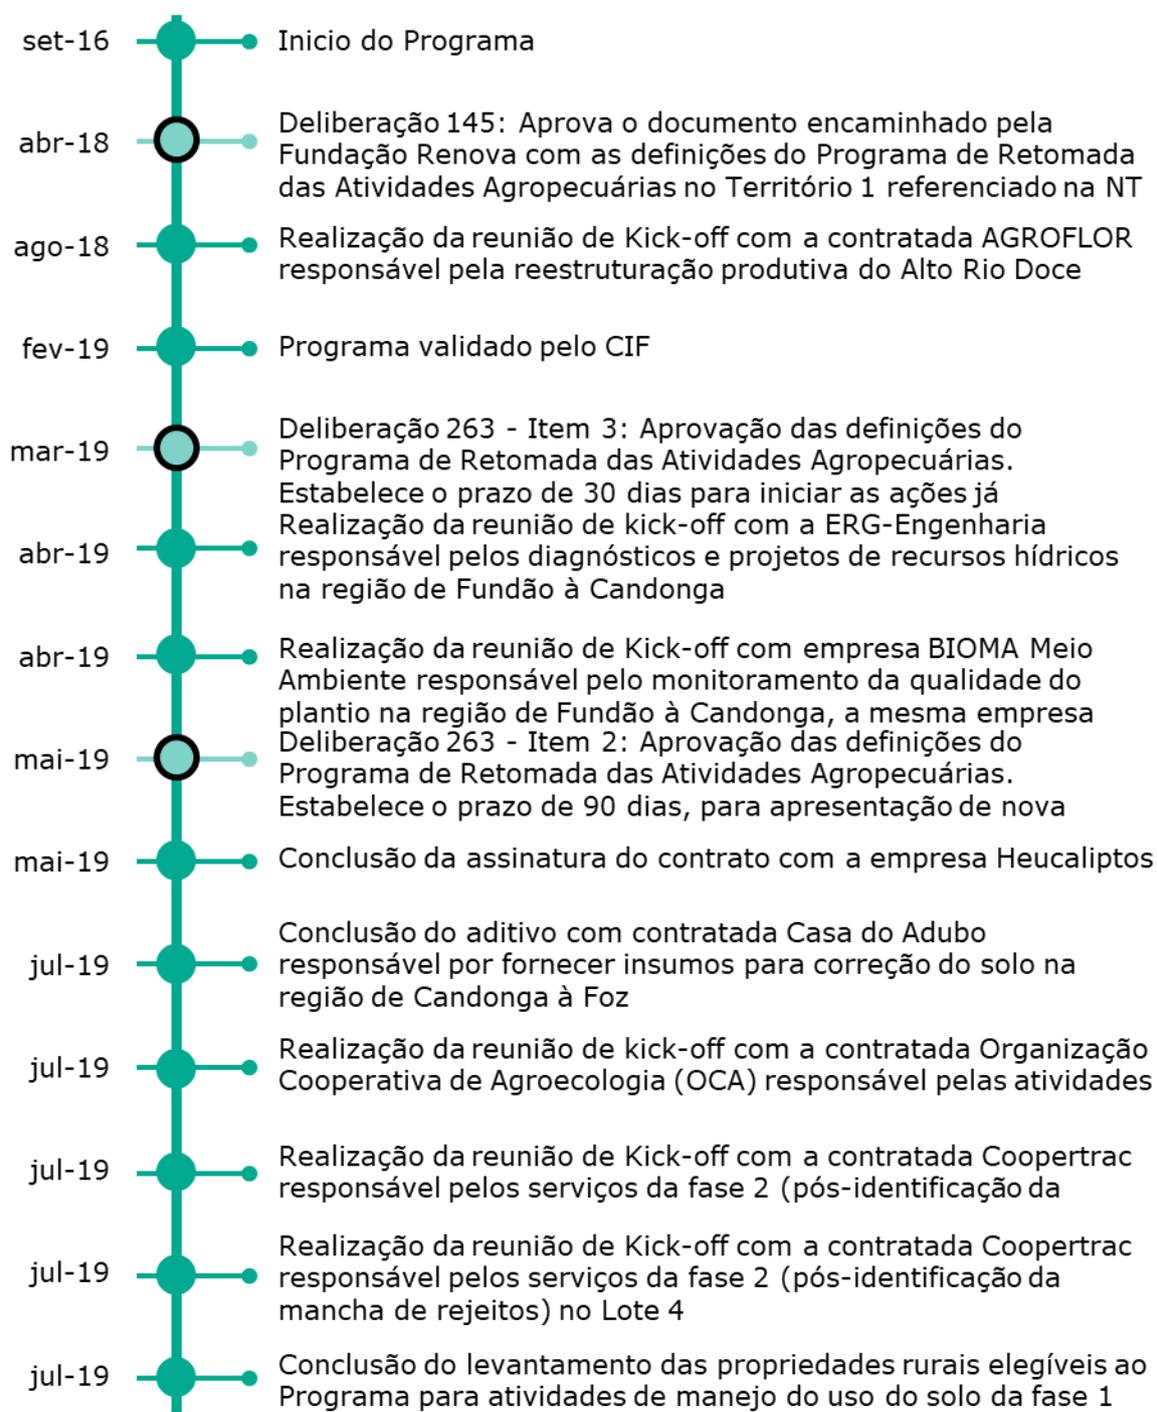










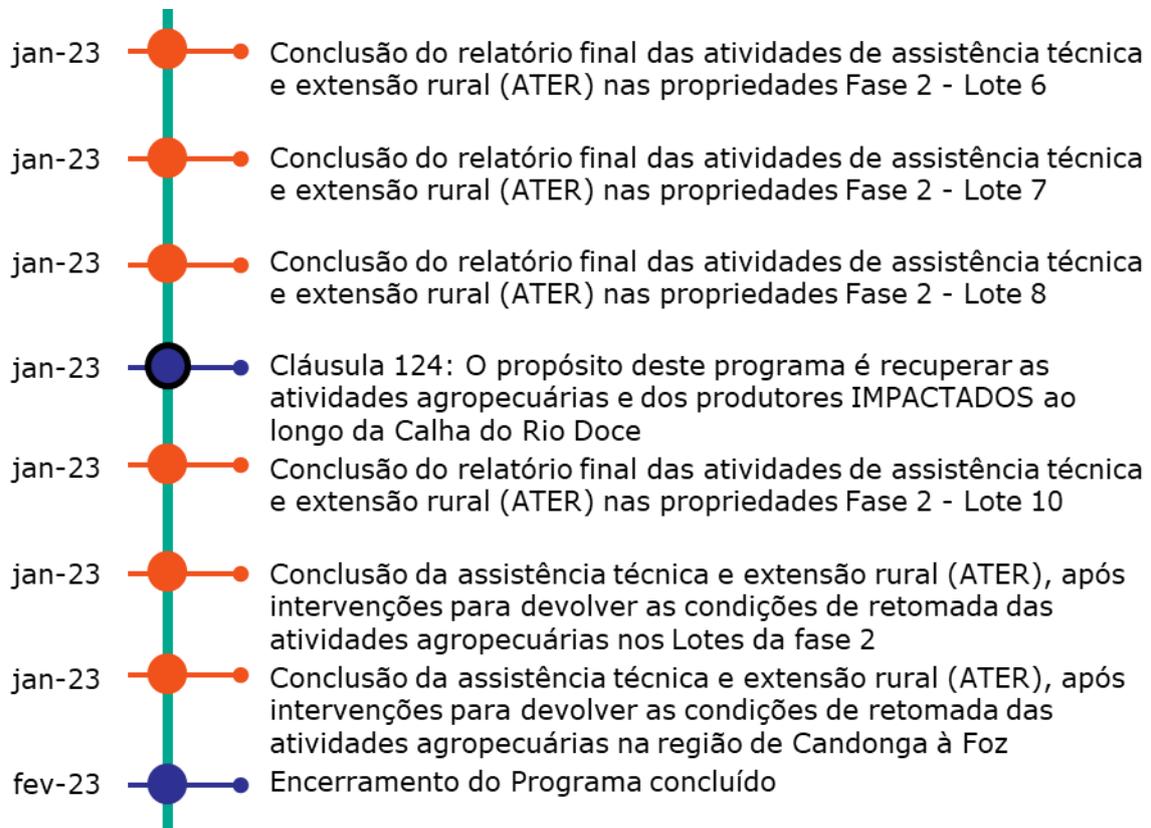

Entregas e fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce:

- Kick-off da empresa responsável pela reestruturação produtiva em Barra Longa não realizada; **Causa:** Atraso na liberação da minuta contratual. **Contramedida:** Realizar o kick-off com a contratada em 06/09;
- Continuidade nas atividades de execução de barraginhas nos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Ponte Nova/MG, Rio Doce/MG e Santa Cruz do Escalvado/MG;
- Mobilização da contratada vencedora do edital de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para os lotes 1 (Mariana/MG e Barra Longa/MG) e 2 (Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG, Ponte Nova/MG e Rio Doce/MG);
- Realização do curso de capacitação ISA/PASEA em Mariana/MG. O curso foi realizado em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG);
- Realização do curso de capacitação de bovino cultura (manejo sanitário) em Barra Longa/MG. O curso foi realizado em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG);
- Realização do curso de capacitação de avicultura em Governador Valadares. O curso foi realizado em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG);

- Realização do curso de capacitação de criação e manejo de horta comunitária em São José do Goiabal/MG e Fernandes Tourinho/MG. O curso foi realizado em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG);
- Conclusão das atividades de ATER que eram realizadas pela equipe Renova devido à mobilização da contratada vencedora do edital de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para os lotes 1 (Mariana/MG e Barra Longa/MG) e 2 (Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG, Ponte Nova/MG e Rio Doce/MG);
- A formalização da Parceria da Fundação Renova com a Universidade Federal de Viçosa para implementação do Programa de Articulação e Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural em cinco municípios mineiros atingidos não ocorreu. **Causa:** Atraso na minuta contratual devido a alterações solicitadas pelo jurídico. **Contramedida:** Realizar a formalização no dia 25/09;

Médio Rio Doce:

- O início das atividades da contratada prestadora de serviços de preparo de solo e plantio não foi realizado, pois o kick-off com a mesma não ocorreu. **Causa:** Divergências na proposta comercial apresentada pela empresa em relação ao escopo demandado. **Contramedida:** Repassar o escopo que seria executado pela Allonda às empresas que serão contratadas pelos Editais dos Lotes de ATER do Programa e cancelar o processo de contratação com a Allonda;
- Mobilização da contratada responsável pelas atividades de ATES (Assistência Técnica para Assentamentos) – Lote 3 (Tumiritinga - 1º Junho, Cachoeirinha, Terra Prometida e Águas da Prata e Periquito - Liberdade);

Baixo Rio Doce:

- Mobilização da contratada responsável pelas atividades de ATES (Assistência Técnica para Assentamentos) – Lote 4 (Linhares - Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus).

Próximas entregas

Alto Rio Doce:

- Continuar as atividades de reestruturação produtiva dentro da área de rejeito das propriedades de Mariana, Rio Doce, Santa Cruz e Ponte Nova. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das intervenções para devolver as condições de retomada das atividades agropecuárias nas propriedades da região de Fundão à Candonga”;
- Continuar as atividades de execução de barraginhas nos municípios de Mariana, Rio Doce, Santa Cruz e Ponte Nova. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das intervenções para devolver as condições de retomada das atividades agropecuárias nas propriedades da região de Fundão à Candonga”;
- Iniciar atividades de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) a partir da nova empresa contratada. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das atividades de assistência técnica e extensão rural (ATER), após intervenções para devolver as condições de retomada das atividades agropecuárias nos Lotes 1 e 2 - Região de Fundão a Candonga”;
- Assinar o contrato de parceria entre Fundação Renova e Universidade Federal de Viçosa para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para monitoramento e

recuperação do solo diretamente impactado pelo rejeito de Fundão nos municípios de Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa (Área Ambiental 1). Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das intervenções para devolver as condições de retomada das atividades agropecuárias nas propriedades da região de Fundão à Candonga”;

Médio Rio Doce:

- Realizar primeira reunião coletiva com as famílias do lote 3 – Tumiritinga e Periquito. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das intervenções para devolver as condições de retomada das atividades agropecuárias nas propriedades - Fase 2 - Lote 3 - Tumiritinga (1º Junho, Cachoeirinha, Terra Prometida e Águas da Prata) e Periquito (Liberdade)”;

Baixo Rio Doce:

- Realizar primeira reunião coletiva com as famílias do lote 4 - Linhares. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das intervenções para devolver as condições de retomada das atividades agropecuárias nas propriedades - Fase 2 - Lote 4 - Linhares (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus)”.

Desafios

- A não adesão dos produtores rurais nas ações do PASEA gera risco de não cumprimento da recuperação das áreas de pasto impactadas pelo rejeito;
- Garantir a execução dos plantios para os produtores rurais do PASEA no próximo período chuvoso, garantindo assim áreas de produção agrícolas para o ano de 2020;
- Realizar a devolutiva do PASEA aos produtores, contextualizando os trabalhos que serão realizados em sua propriedade. Interface direta com os órgãos municipais, estaduais, federais e entidades;
- Nos municípios de Itueta/MG e Aimorés/MG (Médio Rio Doce), as visitas técnicas a produtores impactados foram suspensas por um período, devido ao posicionamento da Associação dos Produtores Rurais de Aimorés, Itueta e Resplendor (APPRAIR), de não atender os técnicos de campo. Por este motivo, as visitas previstas para estes municípios foram redirecionadas momentaneamente para o município de Tumiritinga/MG temporariamente; Posteriormente a essa suspensão foram feitos atendimentos aos impactados por meio de plantões e visitas aos que não puderam estar presente nos plantões;
- As definições de ações para a retomada de atividades agropecuárias, aos Produtores Rurais impactados pelo alagamento proveniente do barramento do rio Pequeno, dependem de decisões sobre a permanência ou descomissionamento do barramento. Se permanecer o Barramento, irá depender do modelo do mesmo, pois da forma como está, há uma sazonalidade de cheias, o que limita ou até restringe algumas atividades.

Indicadores/Grandes Números

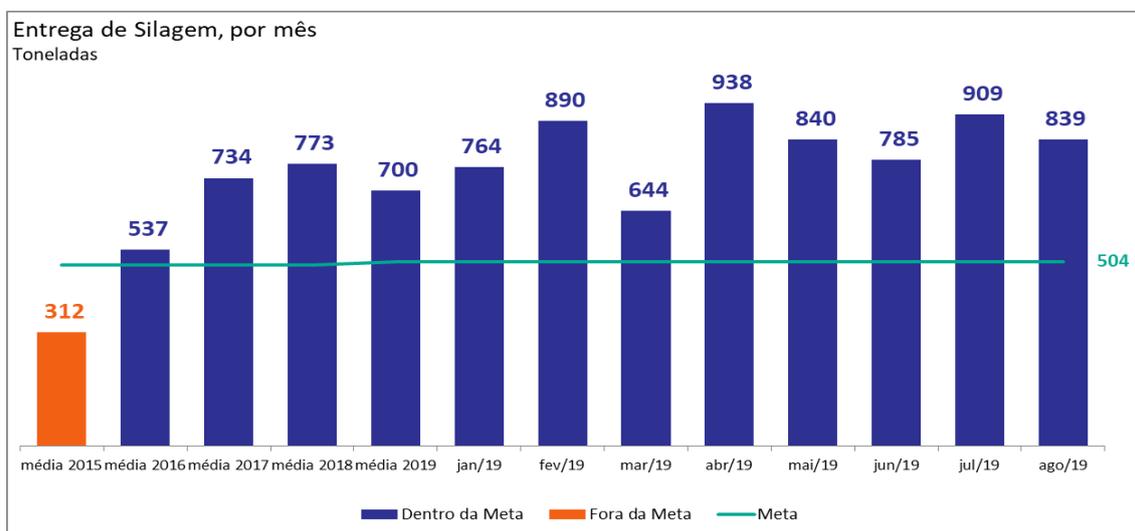


Gráfico 1. Entrega de Silagem, por mês (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx

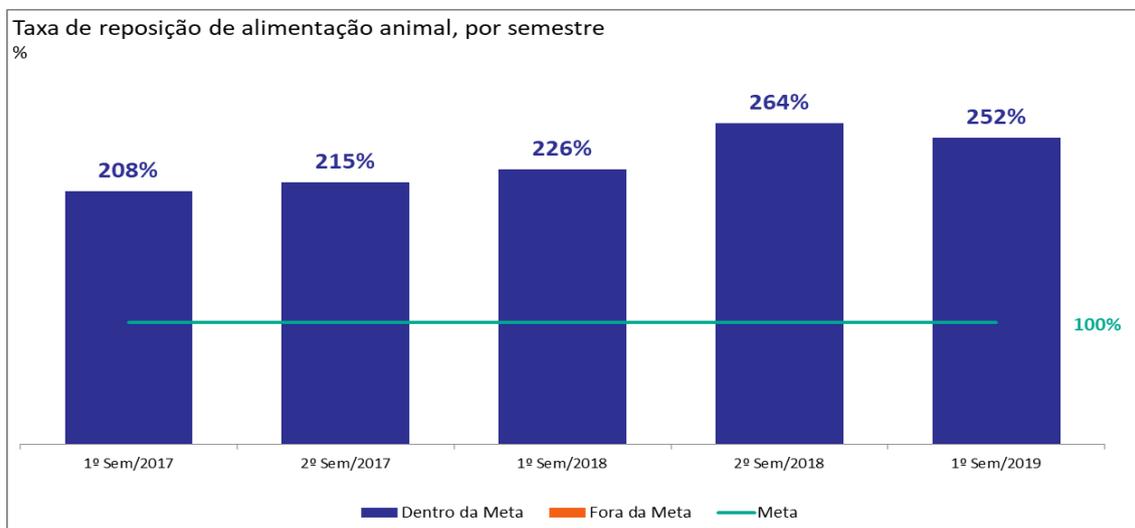


Gráfico 2. Taxa de reposição de alimentação animal por semestre (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx

Fotos



Foto relacionada à: Visita técnica de definição dos serviços na fazenda Santo Antônio - Linhares/ES - agosto/2019.



Foto relacionada à: Curso de capacitação de Manejo Sanitário de Bovinos - Barra Longa/MG - agosto/2019.



Foto relacionada à: Curso de capacitação de Avicultura – Governador Valadares/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: Roçada seletiva manual (Manutenção) - Ivaldil de Souza - agosto/2019.

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Adotar estratégias que contribuam para o desenvolvimento econômico da região e a redução da dependência da atividade minerária, estimulando o surgimento de novas indústrias/negócios baseadas em alternativas tecnológicas e sustentáveis, promovendo uma maior integração produtiva da população, conforme cláusulas 129 e 130 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.


Cláusulas do TTAC: 129, 130 e 131 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 109, 163 – Concluídas internamente.

Marcos do Programa

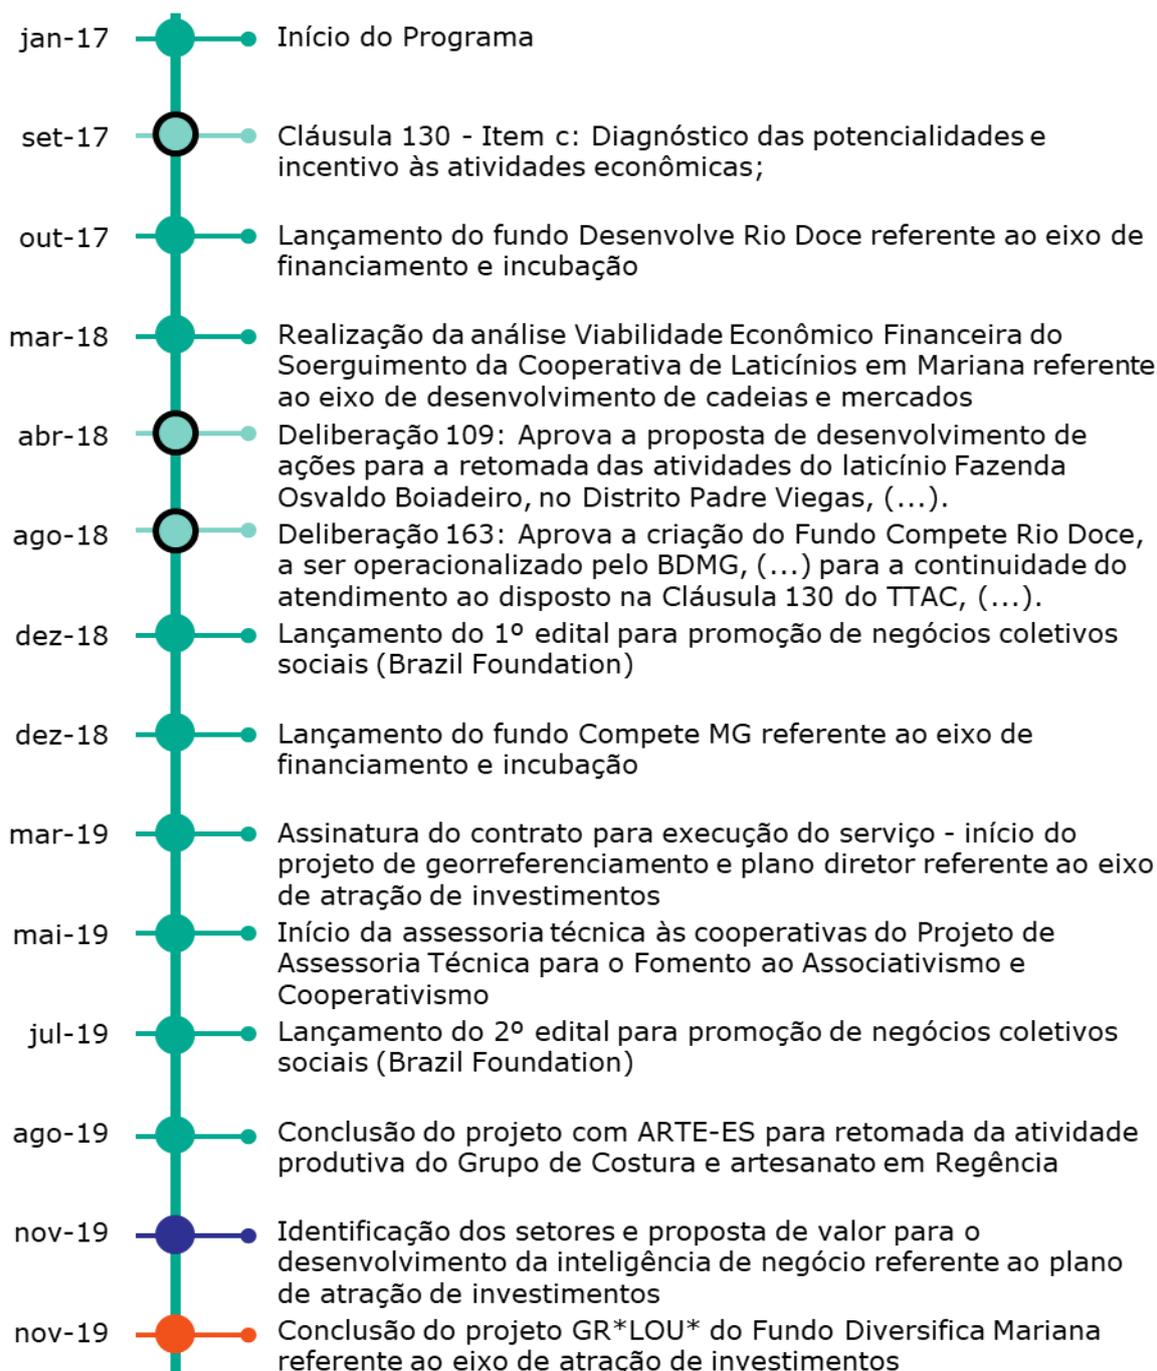



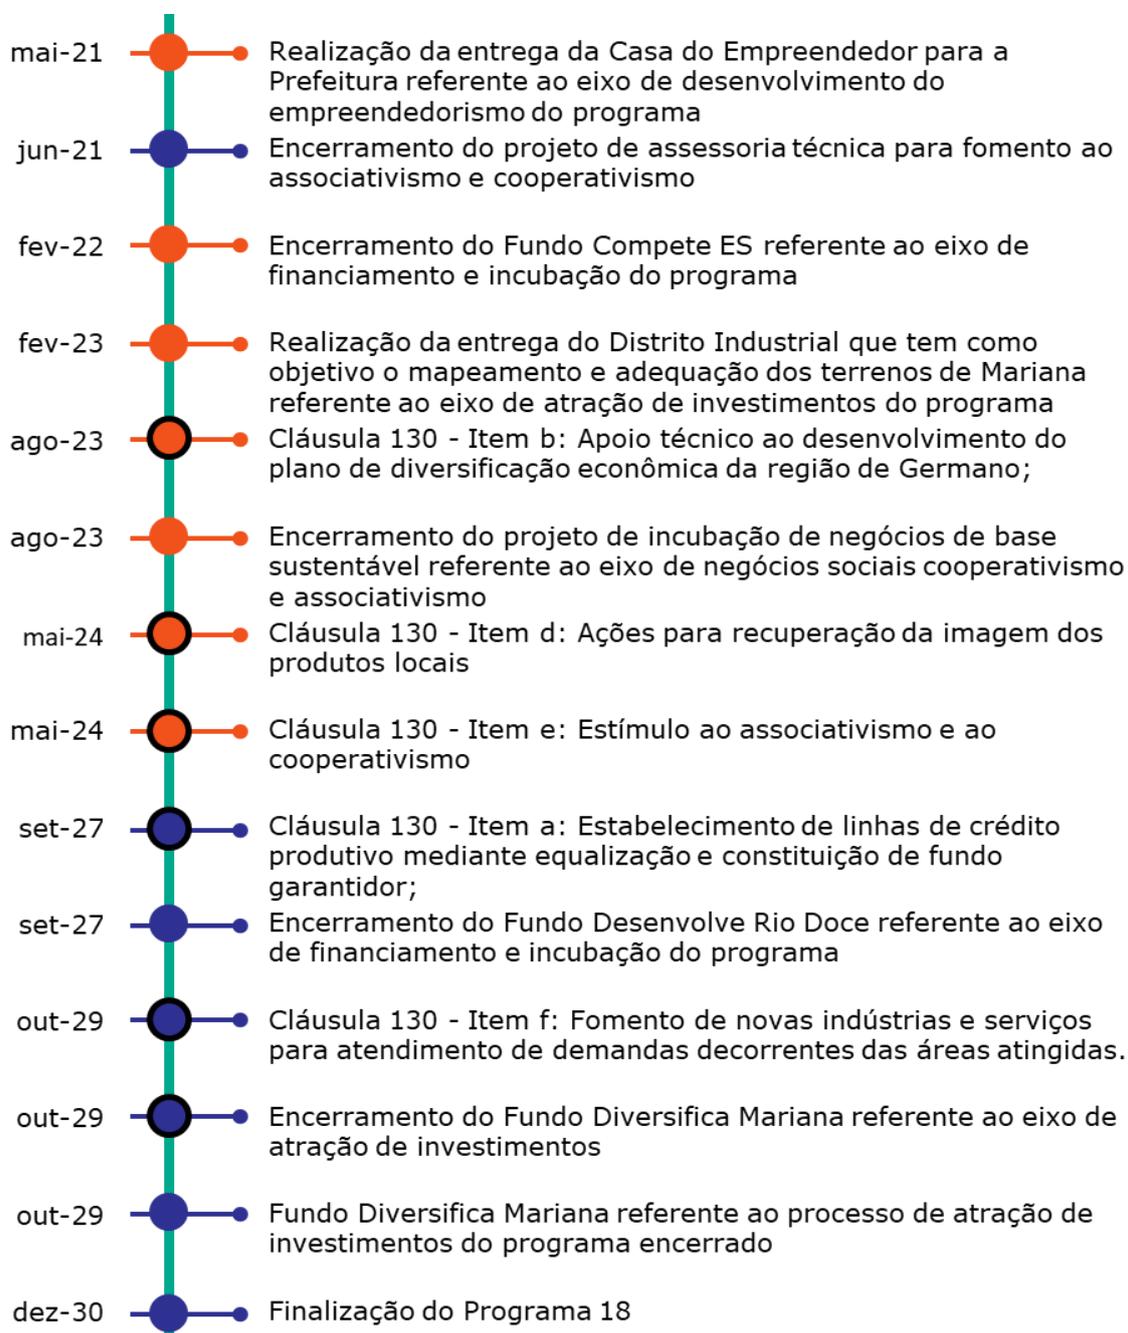

- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

Georreferenciamento e Plano Diretor:

- Entrega da Planta de Valores Genéricos à Prefeitura de Mariana que será usada para a revisão do código tributário do município. (Fonte: MÊS 5 Relatório de atividades realizadas Ago.pdf)

Promoção de Negócios Coletivos Sociais:

- Conclusão das inscrições para a segunda chamada de projetos de estímulo ao desenvolvimento socioeconômico em parceria com a BrazilFoundation. Foram recebidas 40 propostas de projetos.
- Início da segunda rodada de capacitações presenciais para os 13 projetos aprovados na primeira chamada do projeto em parceria com a BrazilFoundation.

Convênio com ARTE - ES - Reestruturação da atividade produtiva do Grupo de Costura em Regência:

- Conclusão do Projeto com ARTE-ES para reestruturação da atividade produtiva do Grupo de Costura e artesanato em Regência.

Próximas entregas

Promoção de Negócios Coletivos Sociais:

- Término do 2º ciclo das capacitações presenciais para os 13 projetos aprovados na 1ª chamada em parceria com a BrazilFoundation.
- Divulgação dos projetos aprovados na segunda chamada em parceria com a BrazilFoundation.

Desafios

- Queda nas previsões de crescimento do PIB do país para o ano de 2019, de acordo com reportagem do Valor Econômico do dia 06 de maio de 2019 (<https://www.valor.com.br/brasil/6240333/mercado-faz-corte-expressivo-em-projecao-do-crescimento-do-pib-em-2019>), que pode dificultar a atração de investimentos e novas empresas aos territórios afetados.
- Infraestrutura para atração de negócios deficiente no município de Mariana, o que dificulta a atração de novas empresas para o município.
- Tendência de crescimento de demandas socioeconômicas, sobretudo relacionadas à geração de emprego e renda nos municípios da área de atuação da Fundação Renova que podem sobrecarregar a capacidade operacional do programa.
- Maior dificuldade para o estabelecimento de parcerias institucionais para implementação de projetos em função de perda reputacional da Fundação Renova e complexidade e magnitude dos mesmos.

Indicadores/Grandes Números

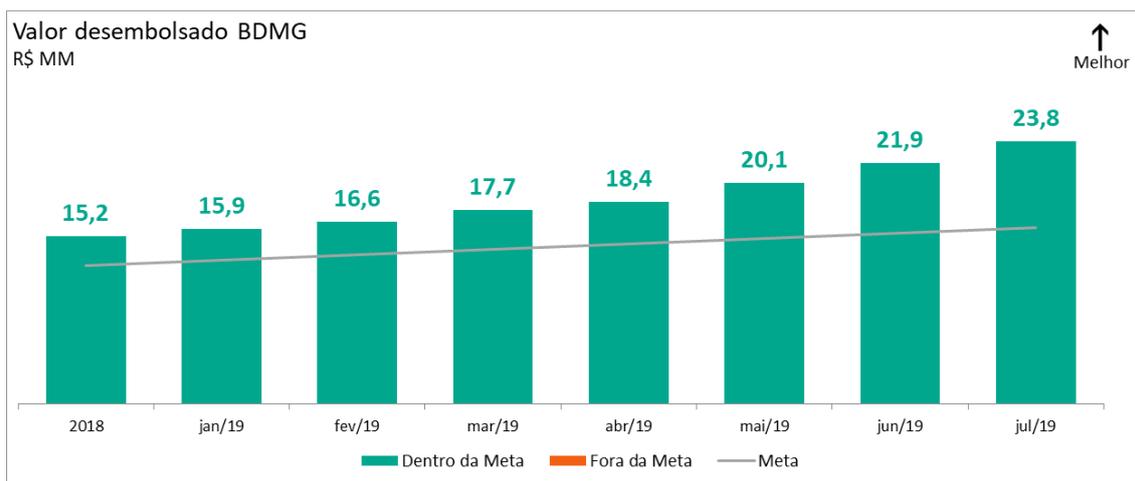


Gráfico 8. Valor desembolsado BDMG. (julho/2019). Fonte: Relatório Renova Julho.docx

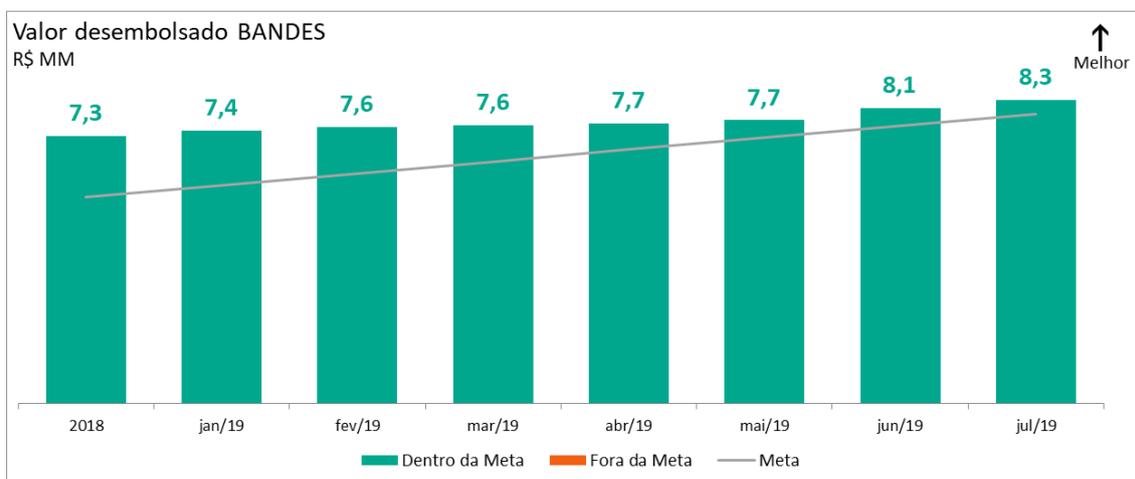


Gráfico 9. Valor desembolsado BANDES. (julho/2019). Fonte: 08 - Relatório Renova 07-ago-2019.pdf

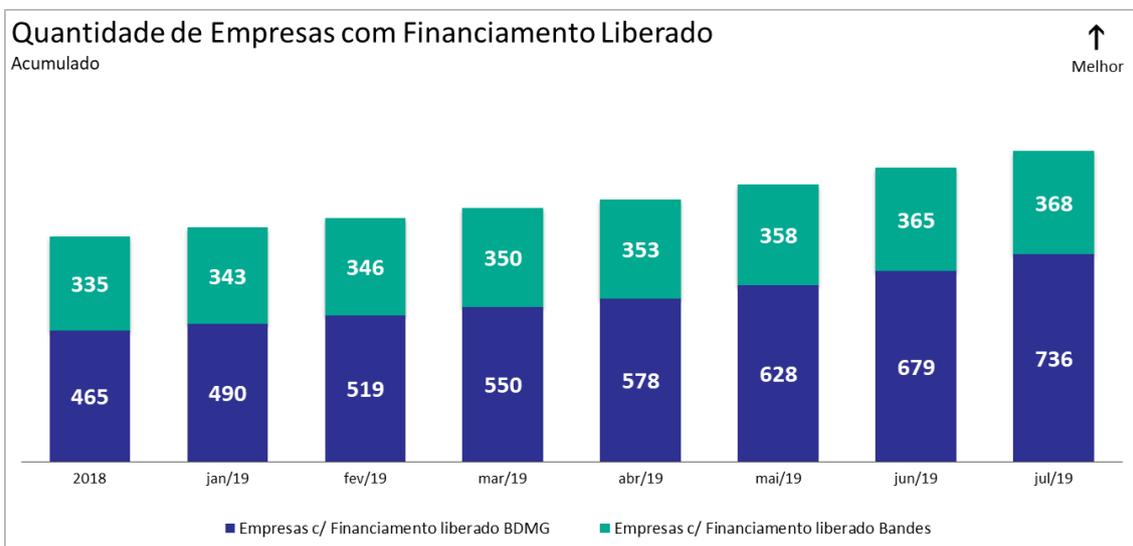


Gráfico 10. Quantidade de empresas com financiamento liberado BDMG e BANDES. (julho/2019). Fonte: 08 - Relatório Renova 07-ago-2019.pdf e Relatório Renova Julho.docx

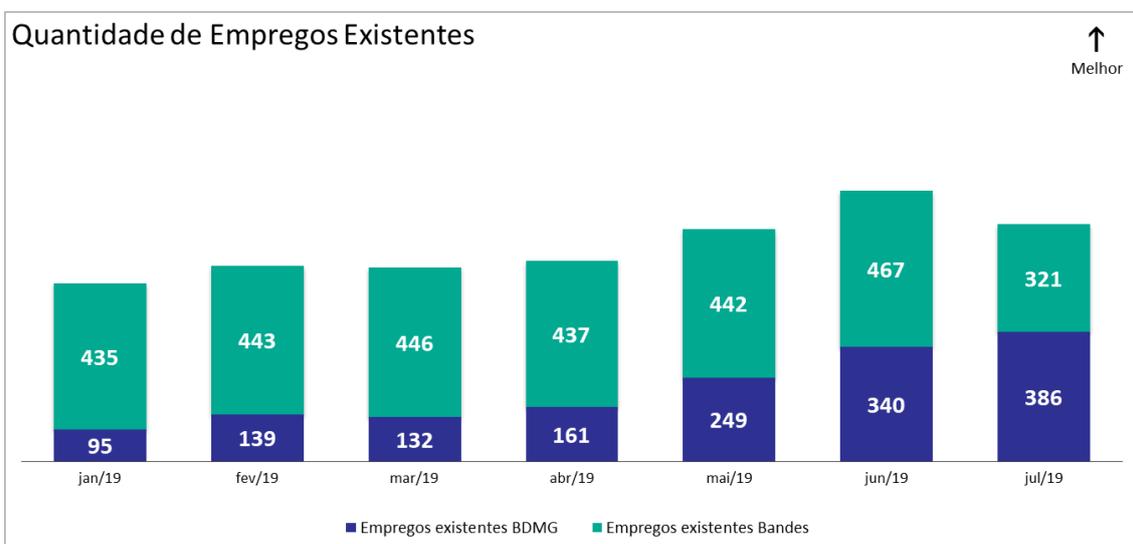


Gráfico 11. Quantidade de empregos existentes. (julho/2019). Fonte: 08 - Relatório Renova 07-ago-2019.pdf e Relatório Renova Julho.docx

Até a data de fechamento do material não foram recebidos os dados atualizados para o mês de Agosto.

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Cláusulas do TTAC: Cláusula 132 - Em andamento; Cláusula 133 - Em andamento.


Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 58 – Em andamento

Marcos do Programa

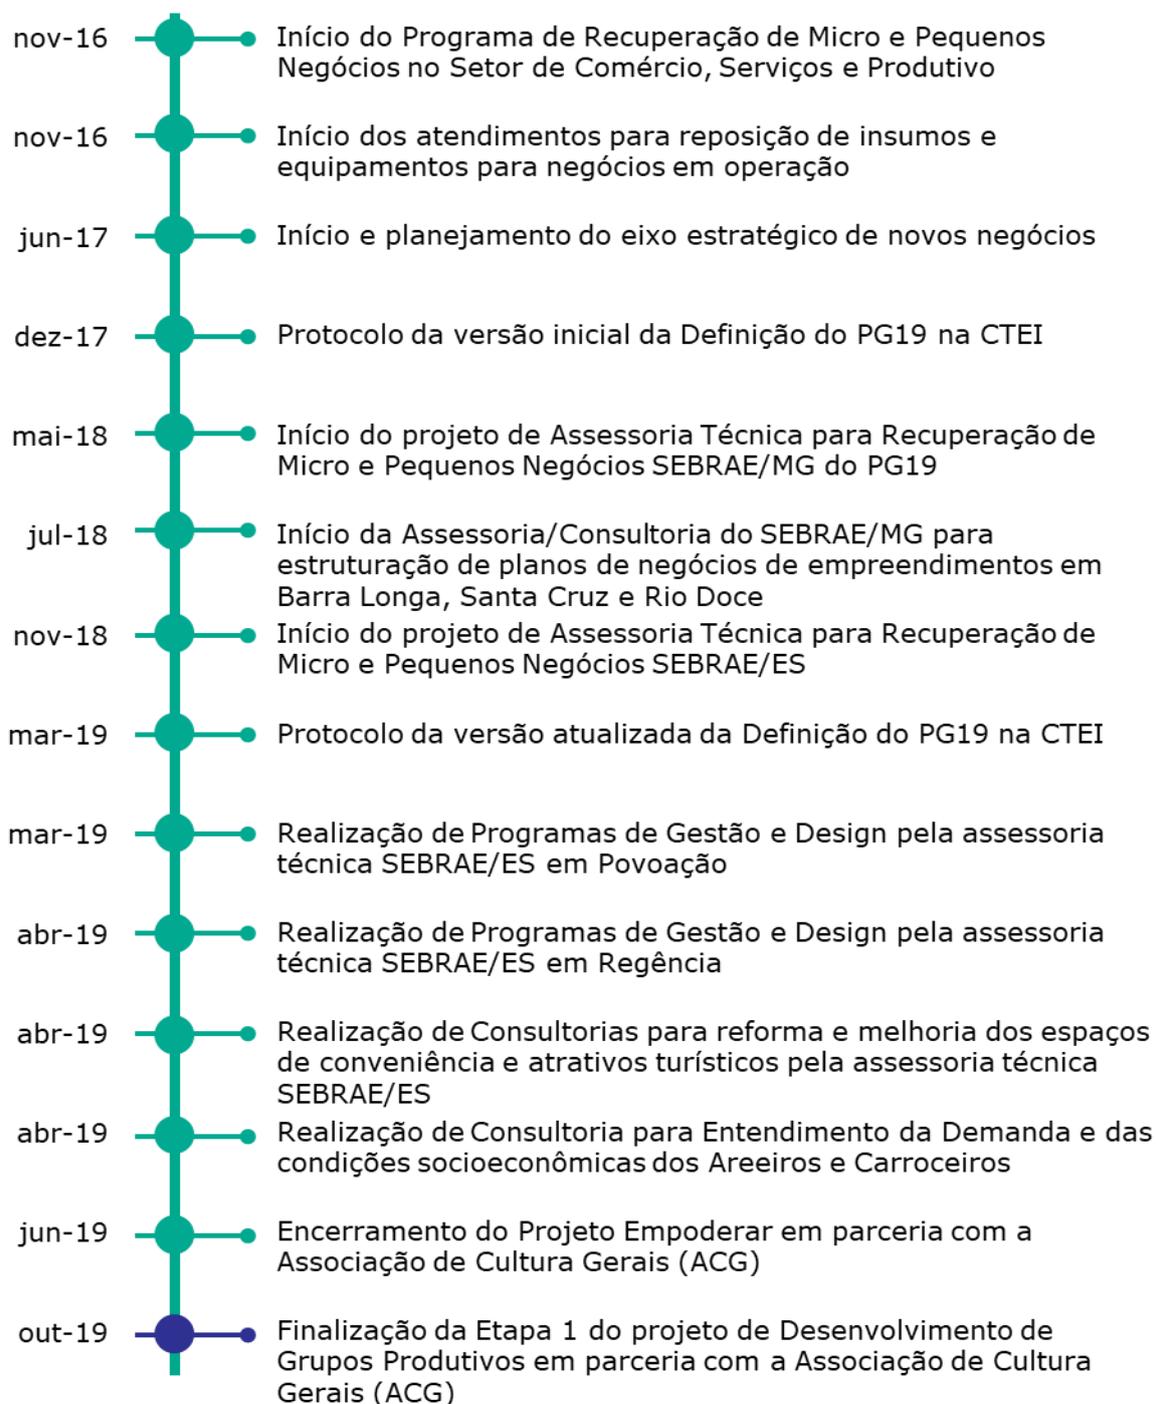

- out-19 ● Realização da Consultoria para criação de Circuitos e Roteiros Turísticos pela assessoria técnica SEBRAE/ES
- out-19 ● Realização de Cursos de Turismo para empreendedores pela assessoria técnica SEBRAE/ES
- nov-19 ● Realização da Capacitação Gerencial da Assessoria Técnica para Recuperação de Micro e Pequenos Negócios SEBRAE/ES
- nov-19 ● Realização de Projeto para Centro de Atendimento ao Turista de Regência e Povoação pela assessoria técnica SEBRAE/ES
- nov-19 ● Realização de Consultorias e Palestras de Gastronomia pela assessoria técnica SEBRAE/ES
- nov-19 ● Realização de Oficinas e consultorias de artesanato pela assessoria técnica SEBRAE/ES
- dez-19 ● Finalização da 'Análise do Potencial Mercadológico e Empreendedor do Território' realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
- dez-19 ● Finalização da Assessoria/Consultoria do SEBRAE/MG com a elaboração de planos de negócios para empreendimentos em Barra Longa, Santa Cruz, Rio Doce e Mariana (...)
- jan-20 ● Realização do estudo de avaliação de impacto econômico nas novas áreas - São Matheus, Aracruz, Serra, Linhares, Conceição da Barra e Fundão
- mar-20 ● Encerramento do Projeto de Assessoria Técnica para Recuperação de Micro e Pequenos Negócios SEBRAE/MG
- abr-20 ● Realização de Consultorias de Promoção de Destino pela assessoria técnica SEBRAE/ES
- abr-20 ● Avaliação e mensuração do Projeto de Assessoria Técnica para Recuperação de Micro e Pequenos Negócios SEBRAE/ES
- abr-20 ● Encerramento do Projeto de Assessoria Técnica para Recuperação de Micro e Pequenos Negócios SEBRAE/ES
- mai-20 ● Finalização da Etapa 2 do projeto de Desenvolvimento de Grupos Produtivos em parceria com a Associação de Cultura Gerais (ACG)



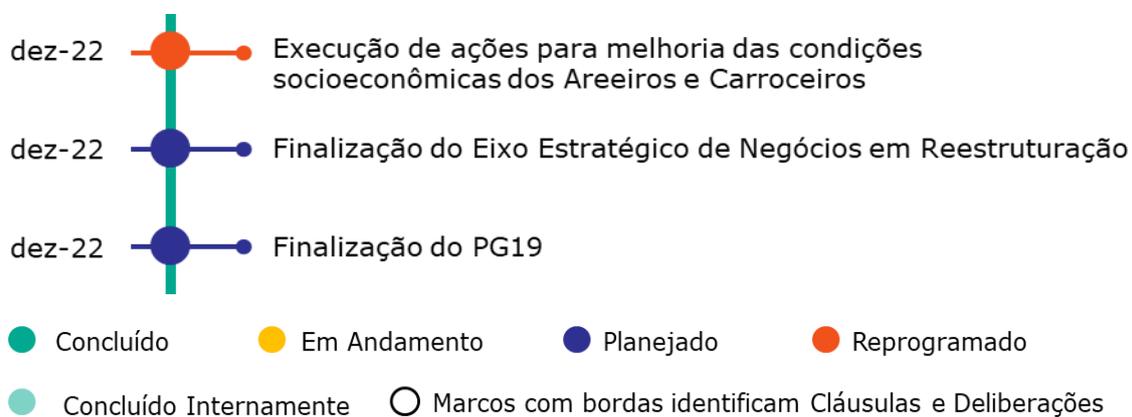

Entregas e fatos relevantes do mês

Eixo Estratégico de Negócios em Reestruturação:

- Participação de empreendedores atingidos de Mariana e Barra Longa em feiras e eventos organizados pela Fundação Renova e seus parceiros, no estado de Minas Gerais, para exposição e comercialização de seus produtos, gerando uma receita para os atingidos em torno de 12 mil reais.
- Participação da Associação dos Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues - AHOBERO no Super Encontro de Varejistas – SEVAR 2019 em Juiz de Fora (MG).
- Participação da Associação dos Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues – AHOBERO e da Cooperativa de Gesteira no Festival de Turismo de Ouro Preto (MG).

Eixo Estratégico de Negócios em Operação:

- Entrega de 240 sacos de cimento, uma betoneira, um compressor, 50 m³ de areia e 50 m³ de pedra brita zero para o retorno da atividade da fábrica de blocos do Sr. Clerio Vieira em Santana do Deserto - Rio Doce. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização dos atendimentos para reposição de insumos e equipamentos para negócios em operação”. (Fonte: PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios.mpp);
- Reposição de um novo equipamento moedor de carnes para o Mini Mercado/Mercearia do Sr. Joubert Macário de Castro em Gesteira - Barra Longa. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização dos atendimentos para reposição de

insumos e equipamentos para negócios em operação”. (Fonte: PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios.mpp).

Eixo Estratégico de Novos Negócios:

- Iniciados os atendimentos de assessoria técnica para desenvolvimento de 14 grupos produtivos em parceria com a Associação de Cultura Geraes – ACG, em Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Esta entrega refere-se ao Marco “Encerramento do projeto de Desenvolvimento de Grupos Produtivos em parceria com a Associação de Cultura Gerais (ACG)”.

Próximas entregas

Eixo Estratégico de Negócios em Reestruturação:

- Iniciar os atendimentos de assessoria do projeto ‘Desenvolvimento da Cultura Empreendedora’ para os empreendedores impactados em parceria com o Instituto Criare em Bento Rodrigues e Paracatu. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização da Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora pelo Instituto Criare Rio”;
- Iniciar os atendimentos de assessoria do projeto ‘Incubação de Novos Negócios – Base Social e Tecnológica’ para 20 empreendedores impactados em parceria com a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (IEBT). Esta entrega refere-se ao Marco “Encerramento do Projeto de Incubação de Novos Negócios pelo IEBT - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica”;

Desafios

- Promover o engajamento dos atingidos para garantir maior participação e continuidade nos projetos propostos pelo programa PG019.

Indicadores/Grandes Números

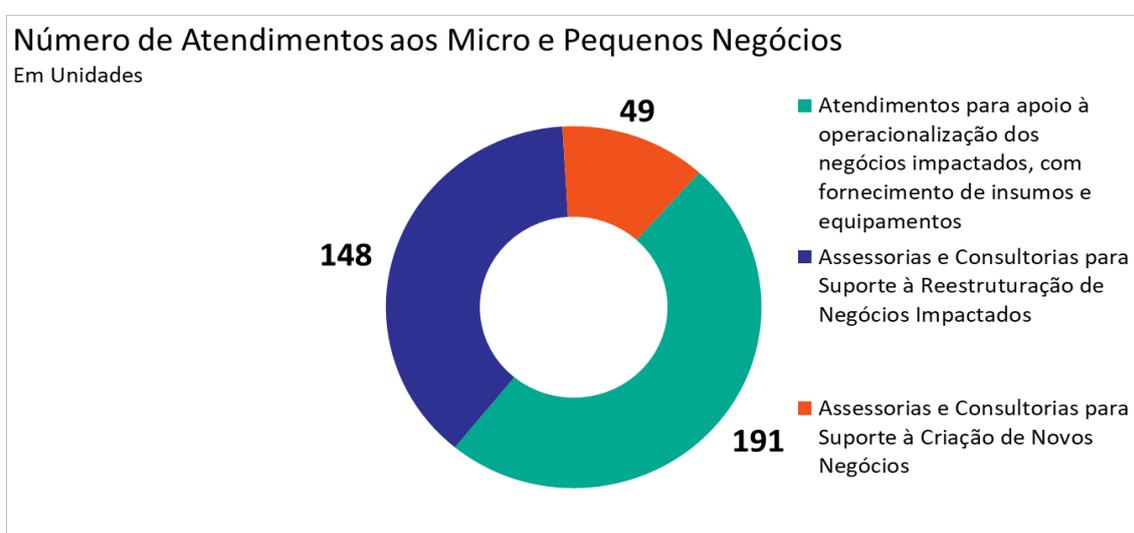


Gráfico 12. Nº de atendimentos finalizados a micro e pequenos negócios. Fonte: Planilha de Gestão de Atendimento PG19_1908.xlsx.

O número de atendimentos a micro e pequenos negócios finalizados pelo PG019 até julho de 2019 foi de 388, divididos nos 3 eixos estratégicos do programa: Eixo de Negócios em Operação, Negócios em Reestruturação e Novos Negócios.

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso da força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: Cláusula 134 - Em andamento; Cláusula 135 - Em andamento; Cláusula 136 - Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 55 – Concluída Internamente; Deliberação 84 – Concluída Internamente; Deliberação 146 – Concluída Internamente.

Marcos do Programa

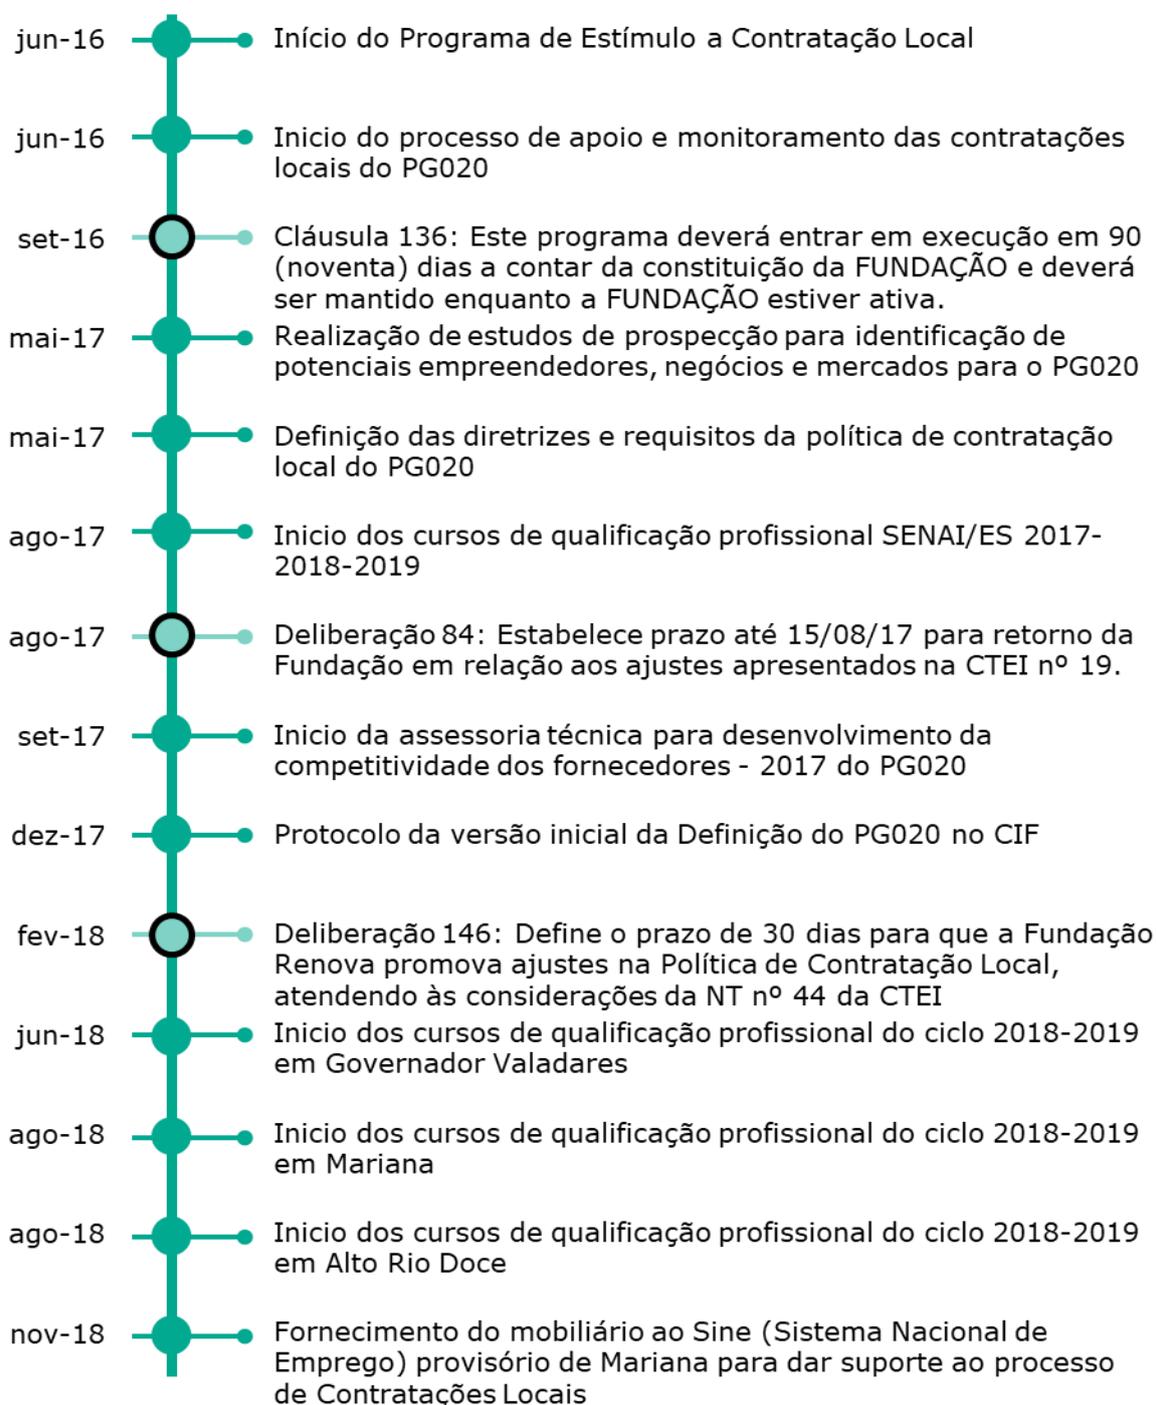





Entregas e fatos relevantes do mês

Processo de Desenvolvimento da Competitividade de Fornecedores:

- Iniciado o projeto de desenvolvimento da competitividade dos fornecedores. Esta entrega refere-se ao Marco “Encerramento da assessoria técnica para desenvolvimento da competitividade dos fornecedores - 2019 do PG020”. (Fonte: PG020 Estímulo à Contratação Local.mpp).

Processo de Qualificação de Mão de Obra:

- Iniciado o curso de qualificação profissional em Pedreiro de Infraestrutura em Rio Doce para 30 alunos, com carga horária de 160 horas e realizado pelo SENAI MG. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2019 de Candonga”. (Fonte: PG020 Estímulo à Contratação Local.mpp).
- Finalizado o curso de iniciação profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão em Mariana para 30 alunos, com carga horária de 80 horas e realizado pelo SENAI MG. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Mariana”. (Fonte: PG020 Estímulo à Contratação Local.mpp).
- Finalizado o curso de iniciação profissional em Serralheiro de Materiais Ferrosos (Telhadista) em Mariana para 20 alunos, com carga horária de 80 horas e realizado pelo SENAI MG. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Mariana”. (Fonte: PG020 Estímulo à Contratação Local.mpp).

Próximas entregas

Processo de Qualificação de Mão de Obra:

- Iniciar o curso de qualificação profissional de Costura Industrial de Vestuário/Tecido Plano em Baixo Guandu para 20 alunos, com carga horária de 200 horas e realizado pelo SENAI ES. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão dos cursos do SENAI/ES de Qualificação Profissional 2017-2018-2019”;
- Iniciar o curso de qualificação profissional de Confeitaria em Rio Doce para 12 alunos, com carga horária de 75 horas e realizado pelo SENAI MG. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização dos Cursos de Panificação e Confeitaria para as Merendeiras de Candonga em suporte ao TAC Fazenda Floresta”;
- Iniciar o curso de iniciação profissional em Serviços Administrativos em Mariana para 30 alunos, com carga horária de 60 horas e realizado pelo SENAI MG. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Mariana”;

Desafios

- Compatibilizar todos os Acordos, ACPs e TACs que estipulam metas para a contratação local entre si.
- Promover cursos de qualificação que sejam de interesse da população atingida e condizente com as potencialidades locais de geração de emprego e renda.

Indicadores/Grandes Números

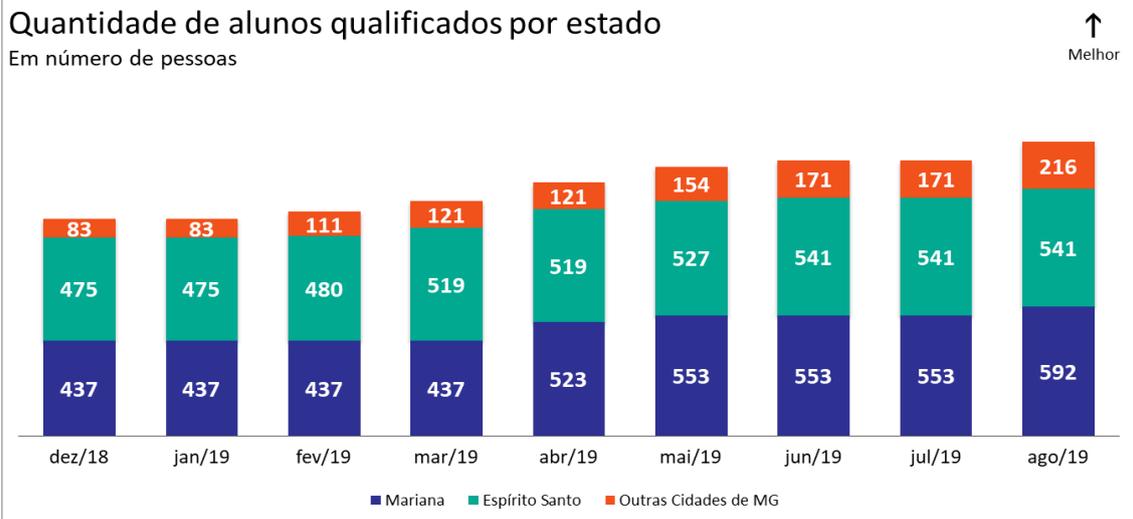


Gráfico 13. Quantidade de alunos qualificados nos cursos de qualificação profissional por estado. Fonte: Cursos_Qualificação_Mão_Obra_190829.xlsx.

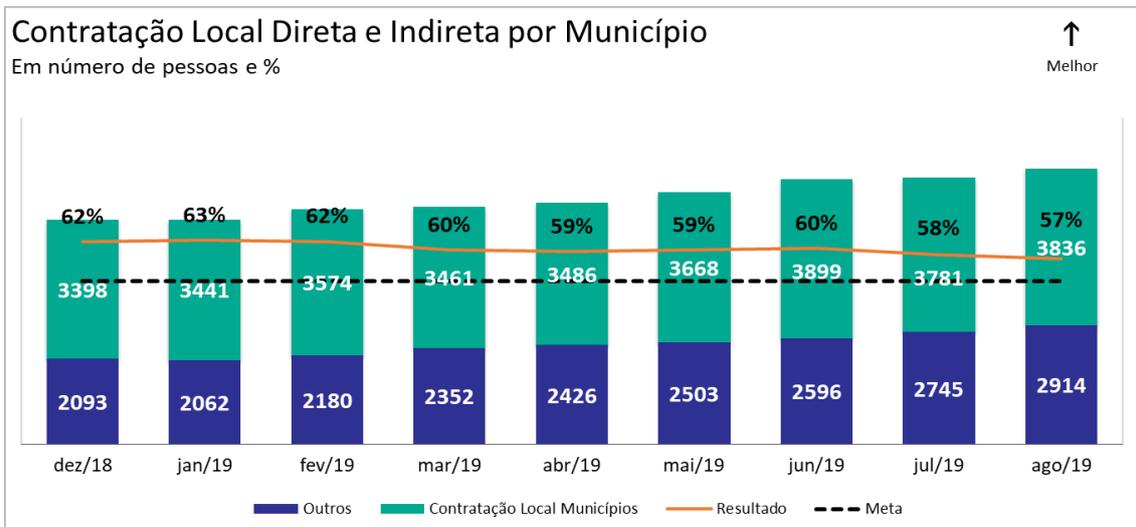


Gráfico 14. Contratação Local Direta e Indireta por Município. Fonte: MDO Local Direta e Indireta 201908.xlsm.

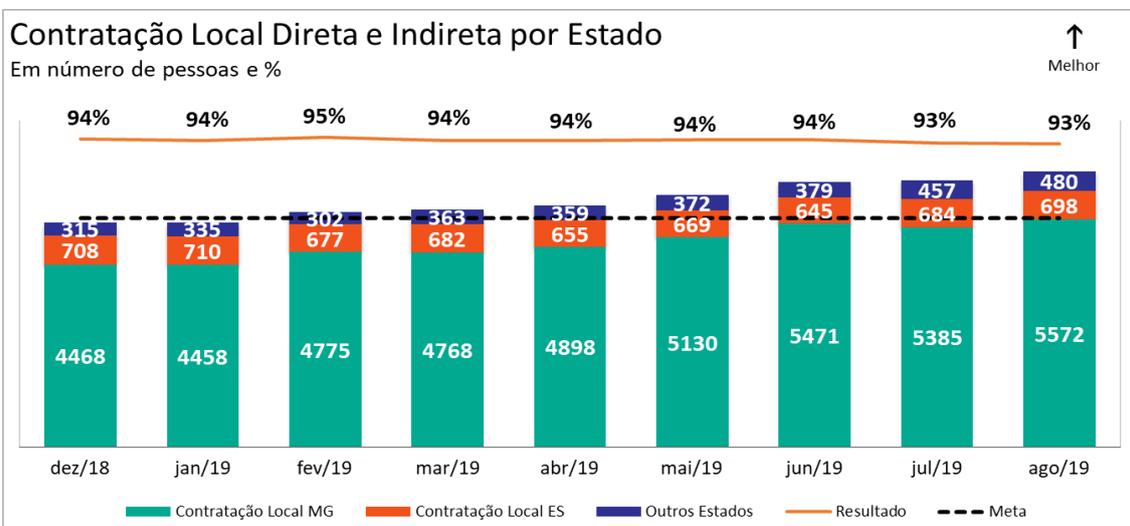


Gráfico 3. Contratação Local Direta e Indireta por Estado. Fonte: MDO Local Direta e Indireta 201908.xlsm.

Novos Contratos Iniciados com Fornecedores Locais

- Visão Estados -

(Serviços e Materiais)

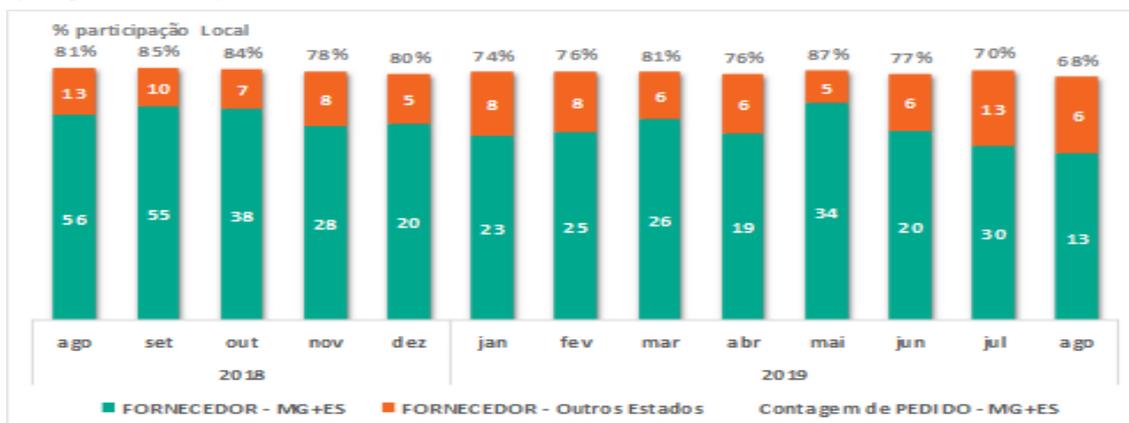


Gráfico 4. Contratação de Fornecedores Locais por Estado. Fonte: Inteligência de Suprimentos.

Nota-se que os dados da Contratação de Fornecedores Locais por Estado de maio e junho de 2019 diferem dos reportados no relatório anterior. O motivo se dá pelo fato de que os dados de fornecedores são atualizados retroativamente, mês a mês, para o

cálculo do indicador.

Dessa forma, contratos cancelados são retirados do indicador e contratos recém-aprovados são adicionados ao indicador, uma vez que a data do pedido do contrato, anterior à aprovação, é utilizada como referência para o cálculo, explicando a variação de 1 p.p. nos referidos meses.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusulas: 137, 138, 139, 140 – Reprogramadas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 35, 48, 111, 141, 210 – Concluídas internamente; 111 – Em andamento; 167,234 – Planejadas.

Marcos do Programa



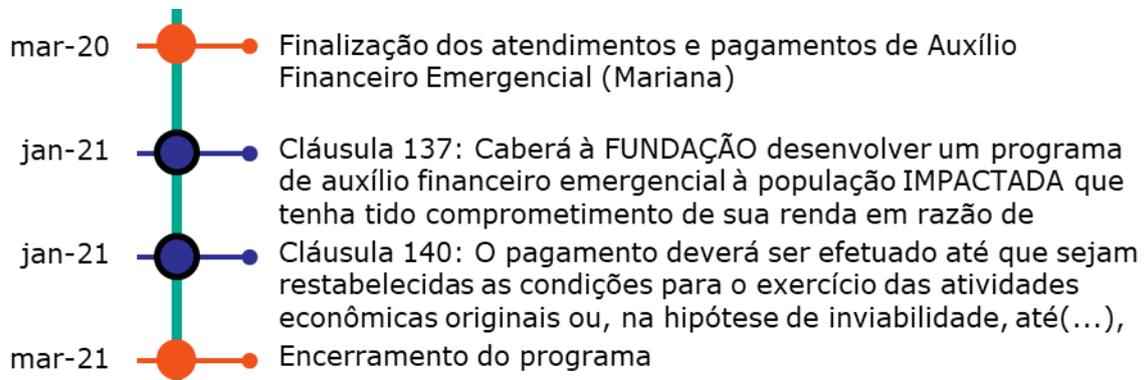

- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Atualmente há 13.673 auxílios ativos, com 31.184 pessoas assistidas pelo Programa, entre titulares e dependentes (Base 31/08/2019); (Fonte: PG21-AGN-001-00_ @ Dados por cidade Setembro 19.xlsx);
- Inclusão de 59 novos Auxílios em Agosto/2019; (Fonte: PG21-AGN-001-00_ @ Dados por cidade Setembro 19.xlsx).

Próximas entregas

- Previsão de inclusão de 105 novos titulares de Auxílio Financeiro em agosto/2019. Esta entrega refere-se ao Marco Campanhas 1, 2 e 3 tratadas para cadastros prioritários. (Fonte: PG21-AGN-001-00_ filtro_1585.xlsx).

Desafios

Devido à natureza processual do programa, os desafios apresentados a seguir se manterão até seu devido tratamento.

- Falta de documentação de residência na época do evento, ausência de comprovações e evidências de perda de renda e ausência de outros documentos.
- Localização dos atingidos que recebem AFE da época emergencial para realização do cadastro integrado da Fundação.

- Manutenção administrativa do programa considerando reanálise recorrente da elegibilidade para inclusão/exclusão de dependentes e titulares.

Indicadores/Grandes Números

CLASSE	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO
Eficiência	I01	$\frac{\text{(Número de pessoas que efetivamente receberam AFE no mês de referência)}}{\text{(Número total de pessoas que efetivamente deveriam receber AFE no mês de referência)}}$
Eficácia	I02	$\frac{\text{(Número de pessoas elegíveis que recebem AFE)}}{\text{(Número de pessoas elegíveis ao AFE)}}$

Tabela 6. Indicadores. Fonte (Definição do Programa).

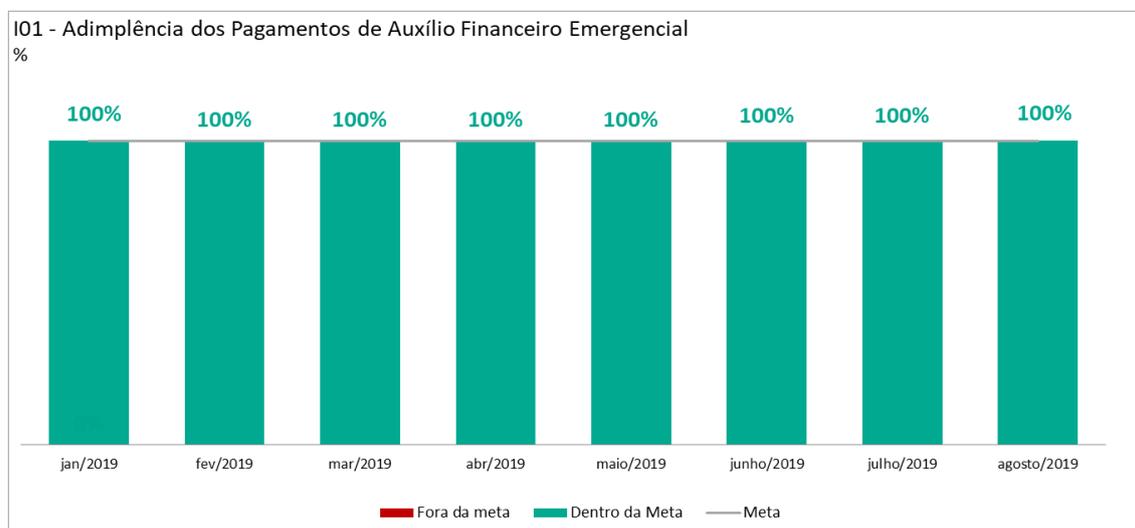


Gráfico 15. Adimplência de Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Fonte: PG21-AGN-001-00_ @ Dados por cidade Setembro 19.xlsx

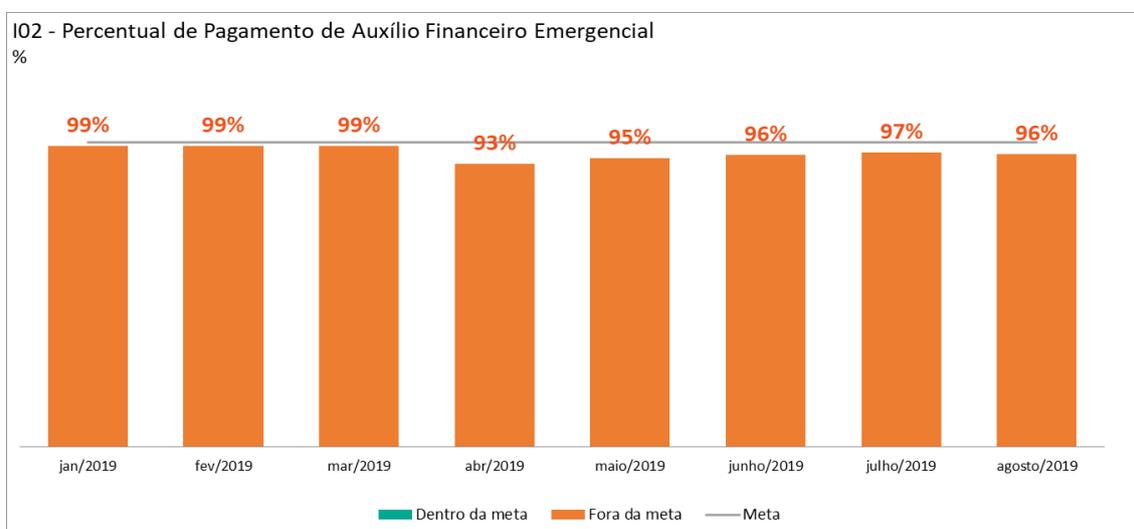


Gráfico 2: Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - PAFE. Gráfico 16. Percentual de Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Fonte: PG21-AGN-001-00_@ Dados por cidade Setembro 19.xlsx; PG21-AGN-001-00_ Base_Status_Set_AFE; PG21-AGN-001-00_ filtro_1585.xlsx.

A partir do mês de dezembro/18 foi realizado ajuste no cálculo do indicador tendo como base a Definição do Programa validada pelo CIF. A queda apresentada no Gráfico 2, referente ao realizado do mês de agosto, se dá pelo tratamento dos novos auxílios com o primeiro pagamento previsto para setembro/19.

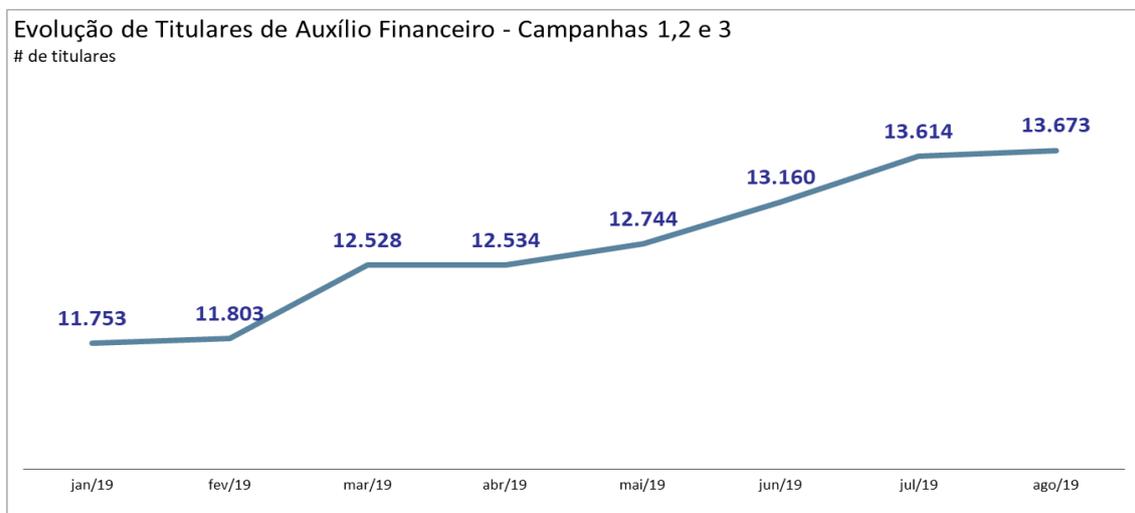


Gráfico 3. Evolução do número de titulares AFE campanha 1,2 e 3. Fonte: Fonte: PG21-AGN-001-00_@ Dados por cidade Setembro 19.xlsx

PG022 Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Dotar os programas socioeconômicos de mecanismos e processos de gestão, monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados e definição de indicadores, em conformidade com mecanismos e processos de governança estabelecidos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

As ações deste programa estão sendo desenvolvidas de forma integrada ao PG041 – Gerenciamento dos Programas Socioambientais.

Cláusulas do TTAC: 144 – Em andamento, em conjunto com a cláusula 182 do PG041.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.


Cláusulas do TTAC: 150, 151, 152, 153, 156 e 180 – Em andamento.


Deliberações que impactam escopo e prazo: 86, 164, 165, 173 e 245 – Concluída internamente; 194, 222, 273 e 285 – Em andamento; 80 e 261 – Atrasada.


Marcos do Programa






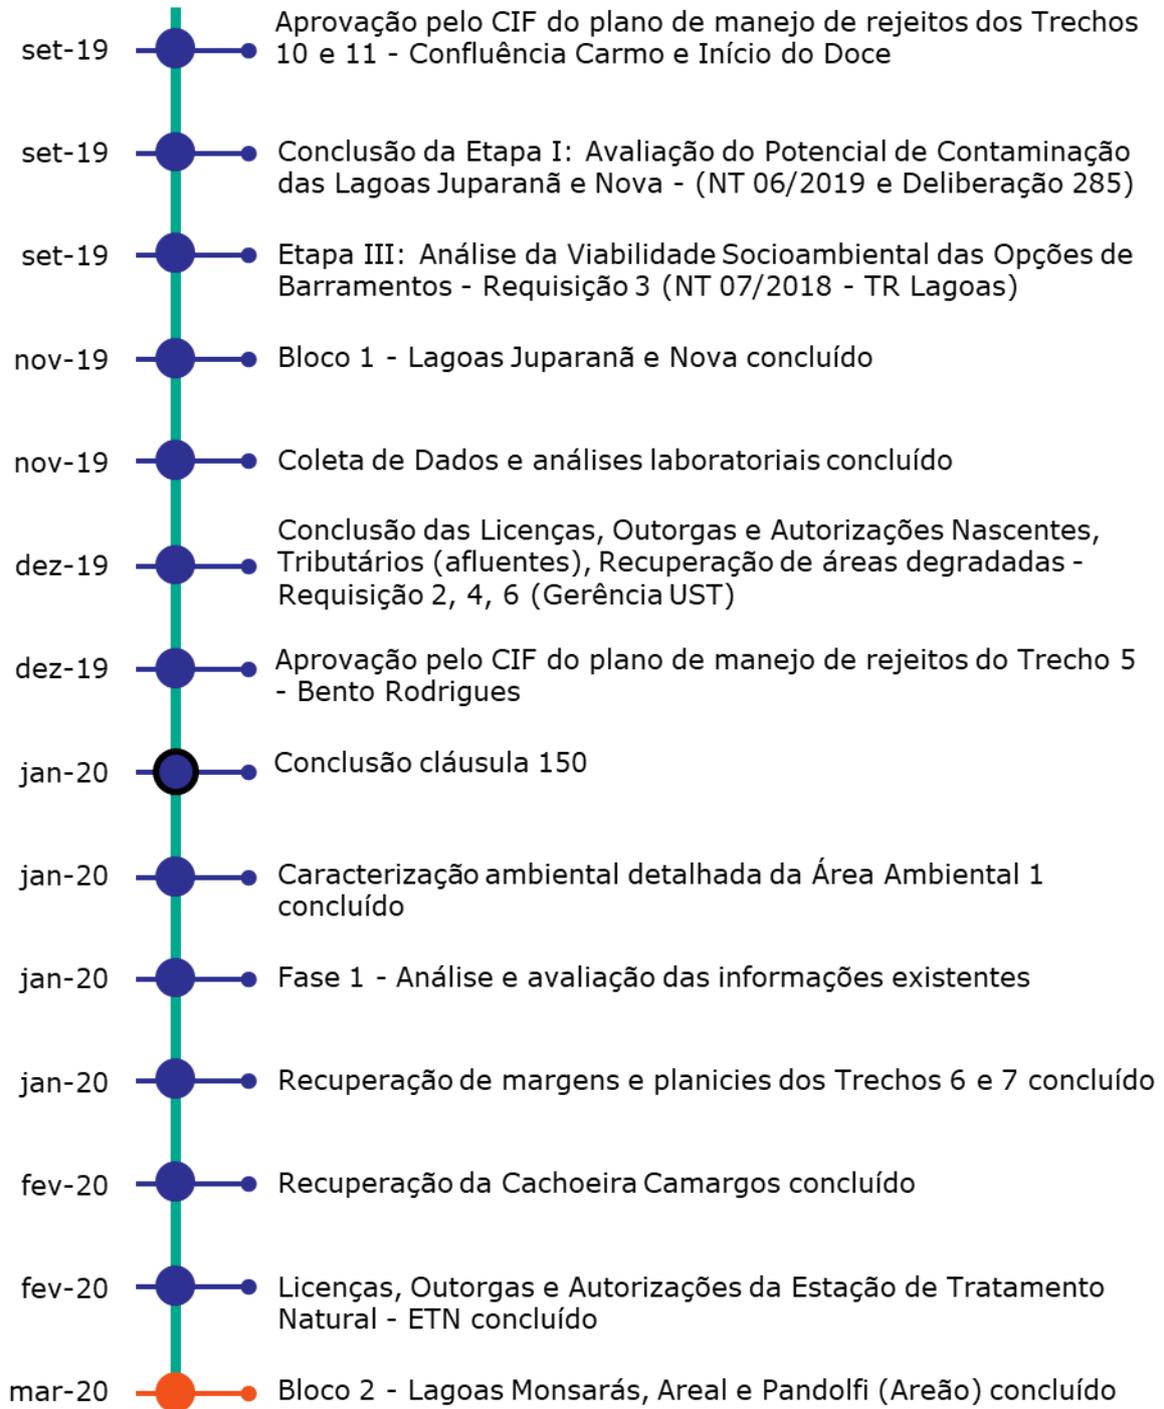

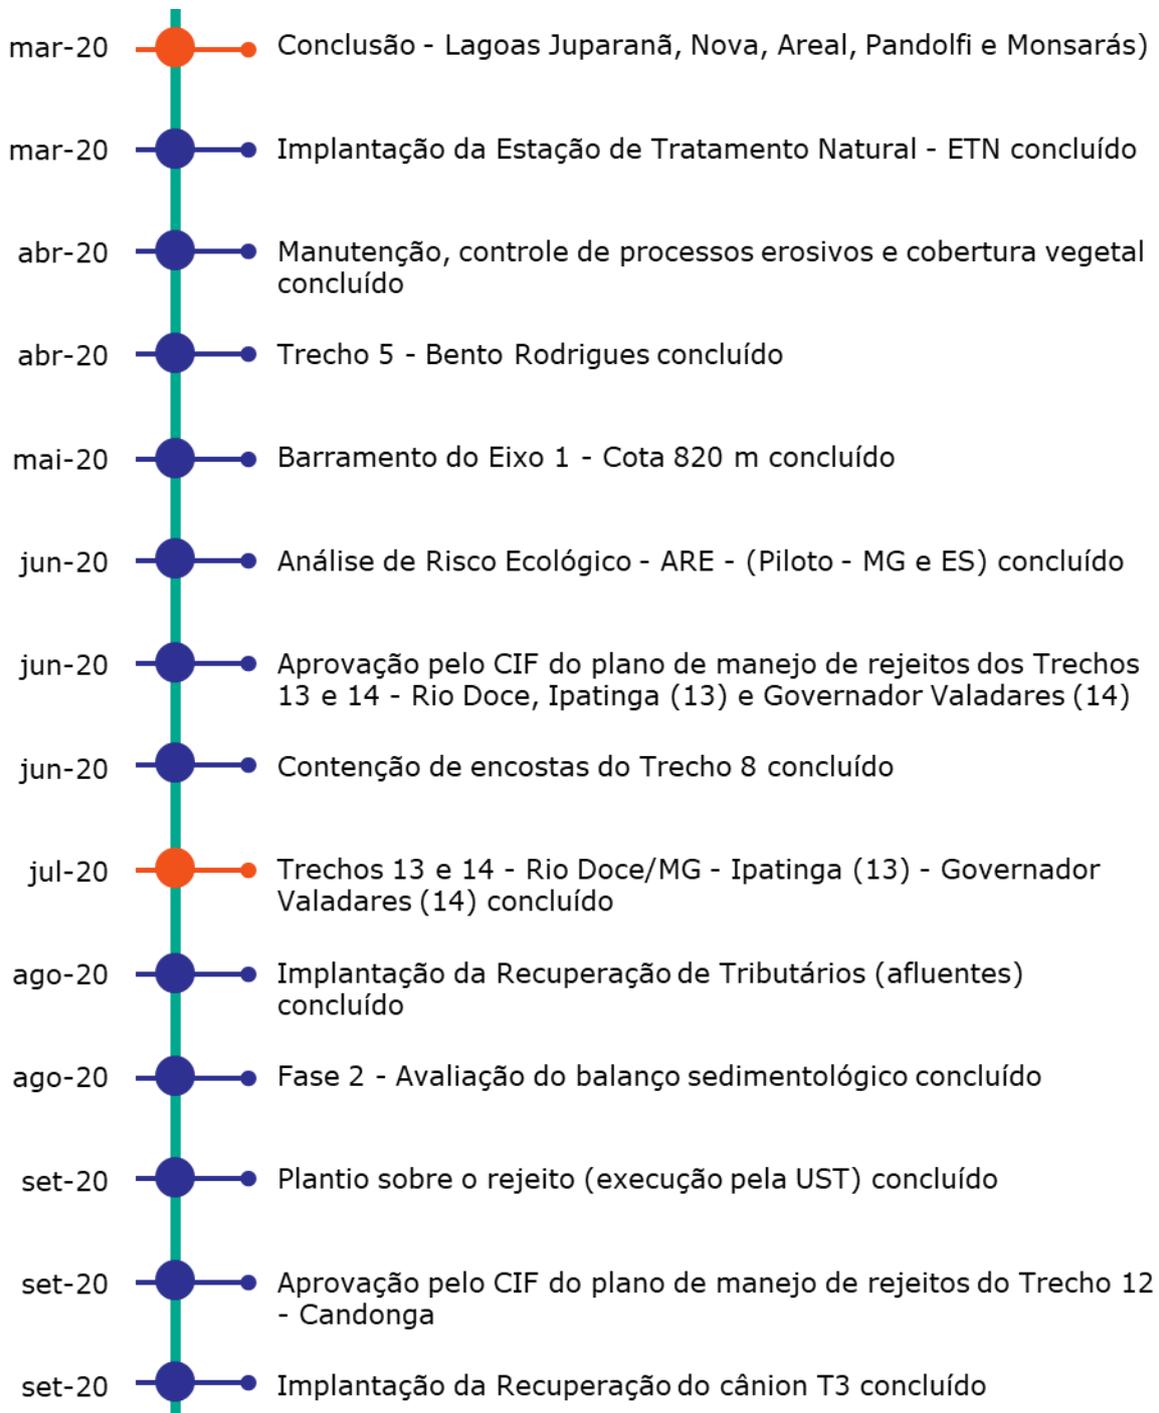

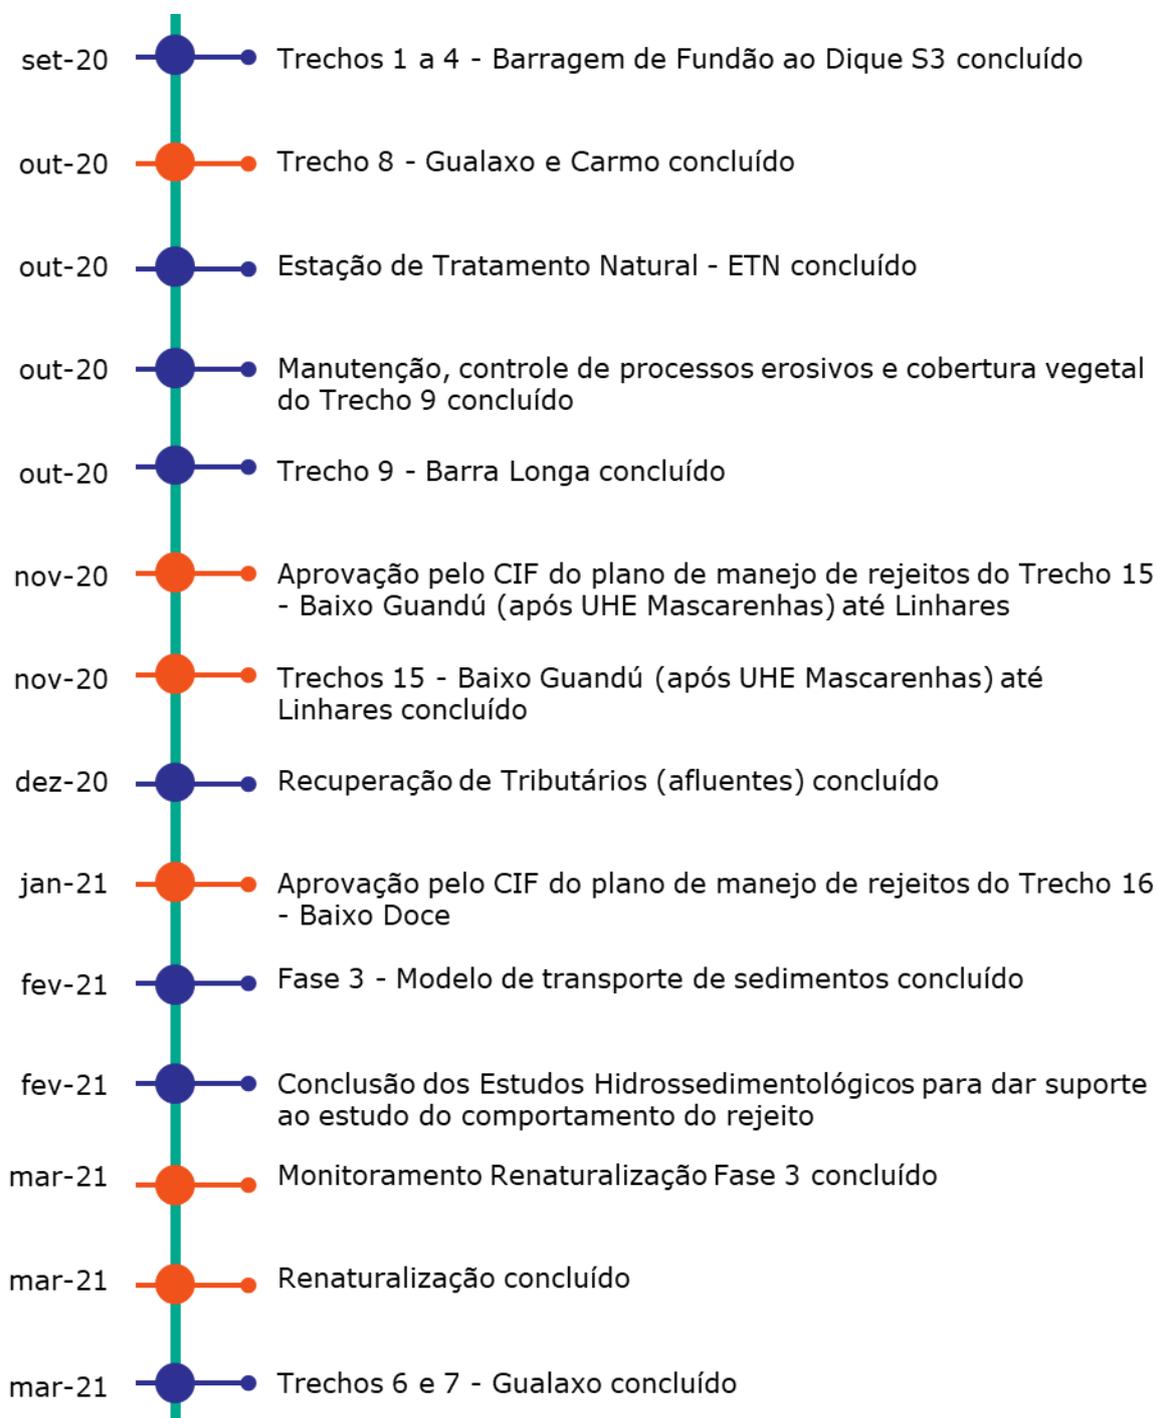



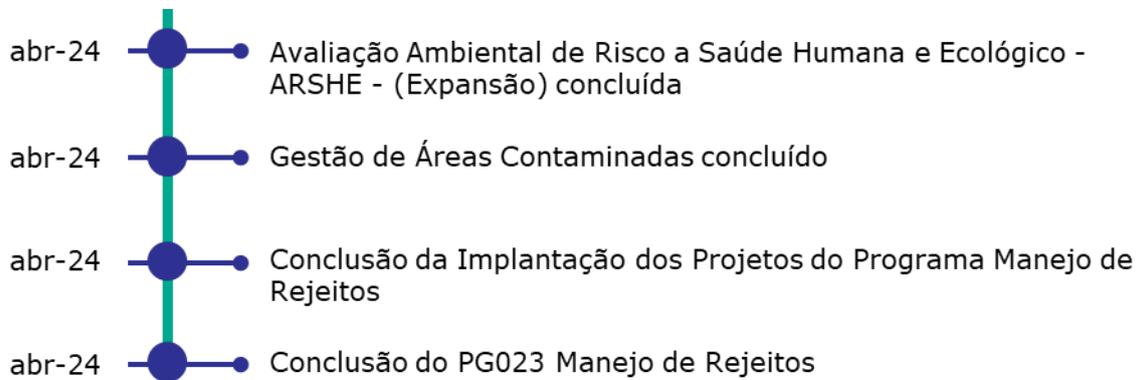

- Concluído ● Em Andamento ● Planejado ● Reprogramado
- Concluído Internamente ○ Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Em 20/08/2019, foram validados os dados de qualidade do ar dos municípios de Mariana e Barra Longa, e a classificação da qualidade do ar como “boa” pela CT-GRSA. (Fonte: P23-NTC-001-00_NT142019_190820);
- Em 20/08/2019, foram aprovados os Planos de Manejo dos trechos 10 e 11, referentes ao município de Barra Longa/MG, pela CT-GRSA. (Fonte: P23-NTC-001-00_NT142019_190820);
- Em 27/08/2019, foi protocolado o relatório de conclusão da Fase 2 da Renaturalização, que corresponde à implantação de troncos na calha do rio Gualaxo do Norte, nos trechos 6 e 7 (Mariana/MG). (Fonte: P23-OFI-002-00_Renaturalização_190827).
- Concluir Área de Depósitos referente a Pilha 6A do projeto da Intracalha. Esta entrega tem como objetivo a finalização do projeto de engenharia da área de disposição de rejeito. A entrega foi reprogramada para setembro/2019, devido a revisões no projeto. Esta entrega refere-se ao Marco “Área de Depósitos Pilha 6A concluído”.

Próximas entregas

- Concluir Área de Depósitos referente a Pilha 6A do projeto da Intracalha, que tem como objetivo a finalização do projeto de engenharia da área de disposição de rejeito. Esta entrega refere-se ao Marco “Área de Depósitos Pilha 6A concluído”;

- Concluir a revisão do projeto detalhado da recuperação da Cachoeira Camargos, que tem como objetivo adequar o projeto apresentado de acordo com as solicitações do órgão ambiental. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão da revisão do projeto detalhado da recuperação da cachoeira Camargos”;
- Concluir os estudos ambientais relacionados à Ação Civil Pública das lagoas de Linhares, que tem como objetivo subsidiar tecnicamente a tomada de decisão sobre a alternativa definitiva mais adequada para estes ambientes, considerando o potencial de contaminação e a viabilidade socioambiental para construção de barragens definitivas. Esta entrega refere-se ao Marco “Estudo do Potencial Risco de Contaminação das águas do Rio Doce (NT 06/2019 e Deliberação 285)”.

Desafios

- Gestão eficiente dos stakeholders para definição e validação da solução definitiva das Lagoas de Linhares/ES;
- Intensificação da interface com os Programas que dependem dos resultados das análises de risco ambiental à saúde humana e ecológico;
- Gerenciamento integrado dos cronogramas dos programas de recuperação ambiental e UST;
- Obtenção do licenciamento ambiental referente ao programa de manejo de rejeito, uma vez que todas as intervenções em Áreas de Prevenção Permanente (APP) não estão mais configuradas como ações emergenciais. Deverá ser orientado um processo específico por parte da SUPPRI (Superintendência de Projetos Prioritários), podendo impactar no cronograma de implantação do Programa;

- Regularização fundiária das áreas de intervenção ou atuação direta da Fundação Renova.

Indicadores/Grandes Números

CONCENTRAÇÃO DE POEIRA INALÁVEL – PM10 Limite superior: 40 µg/m ³ (CONAMA 491/2018)	MÉDIA PERÍODO [µg/m³]
Mariana/MG – Paracatu	26
Barra Longa/MG – Centro	24
Barra Longa/MG – Volta da Capela	19
Barra Longa/MG – Gesteira	19
Rio Doce/MG – Santana do Deserto	18

Tabela 7. Indicadores (agosto/2019). Fonte: P23-KPI-004-00_Estações - Report PM10_190904.xls

Paracatu – medição entre 01/09/18 e 31/08/19. Início da operação em 22/12/17.

Centro - medição entre 01/09/18 e 31/08/19. Início da operação em 18/02/16.

Volta da Capela - medição entre 01/09/18 e 31/08/19. Início da operação em 11/08/17.

Gesteira - medição entre 01/09/18 e 31/08/19. Início da operação em 19/05/18.

Santana do Deserto – medição entre 17/04/19 e 25/08/19. Início da operação em 17/04/19. Não foi possível coletar os dados a partir do dia 26/08/19 devido à manifestação que ocorre no local, portanto, estes dados serão incluídos no próximo mês.

Fotos



Foto relacionada à: estação fixa de monitoramento do ar no centro de Barra Longa, MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: implantação dos troncos no projeto de Renaturalização executada no rio Gualaxo do Norte em Mariana, MG – agosto/2019.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental

1

Eixo Terra e Água


Objetivo


Recuperar a área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado.


Cláusulas do TTAC: Cláusula 158, 160 – Concluídas internamente; Cláusula 159 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 26, 66, 186, 223, 249 – Concluídas internamente.

Marcos do Programa

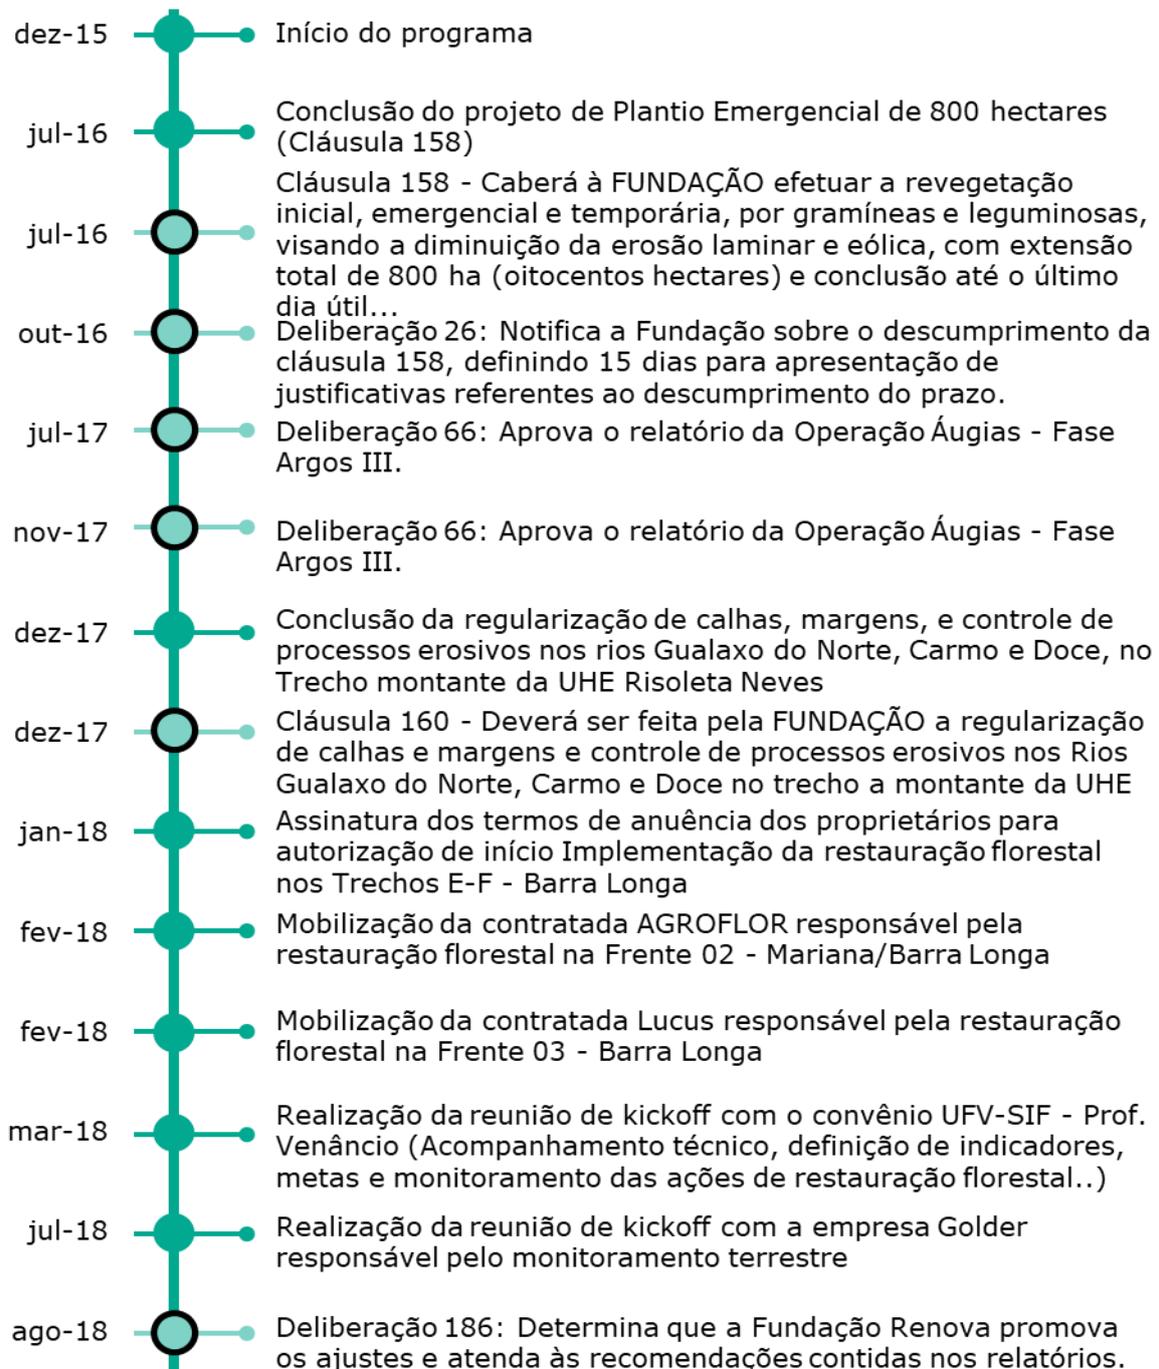

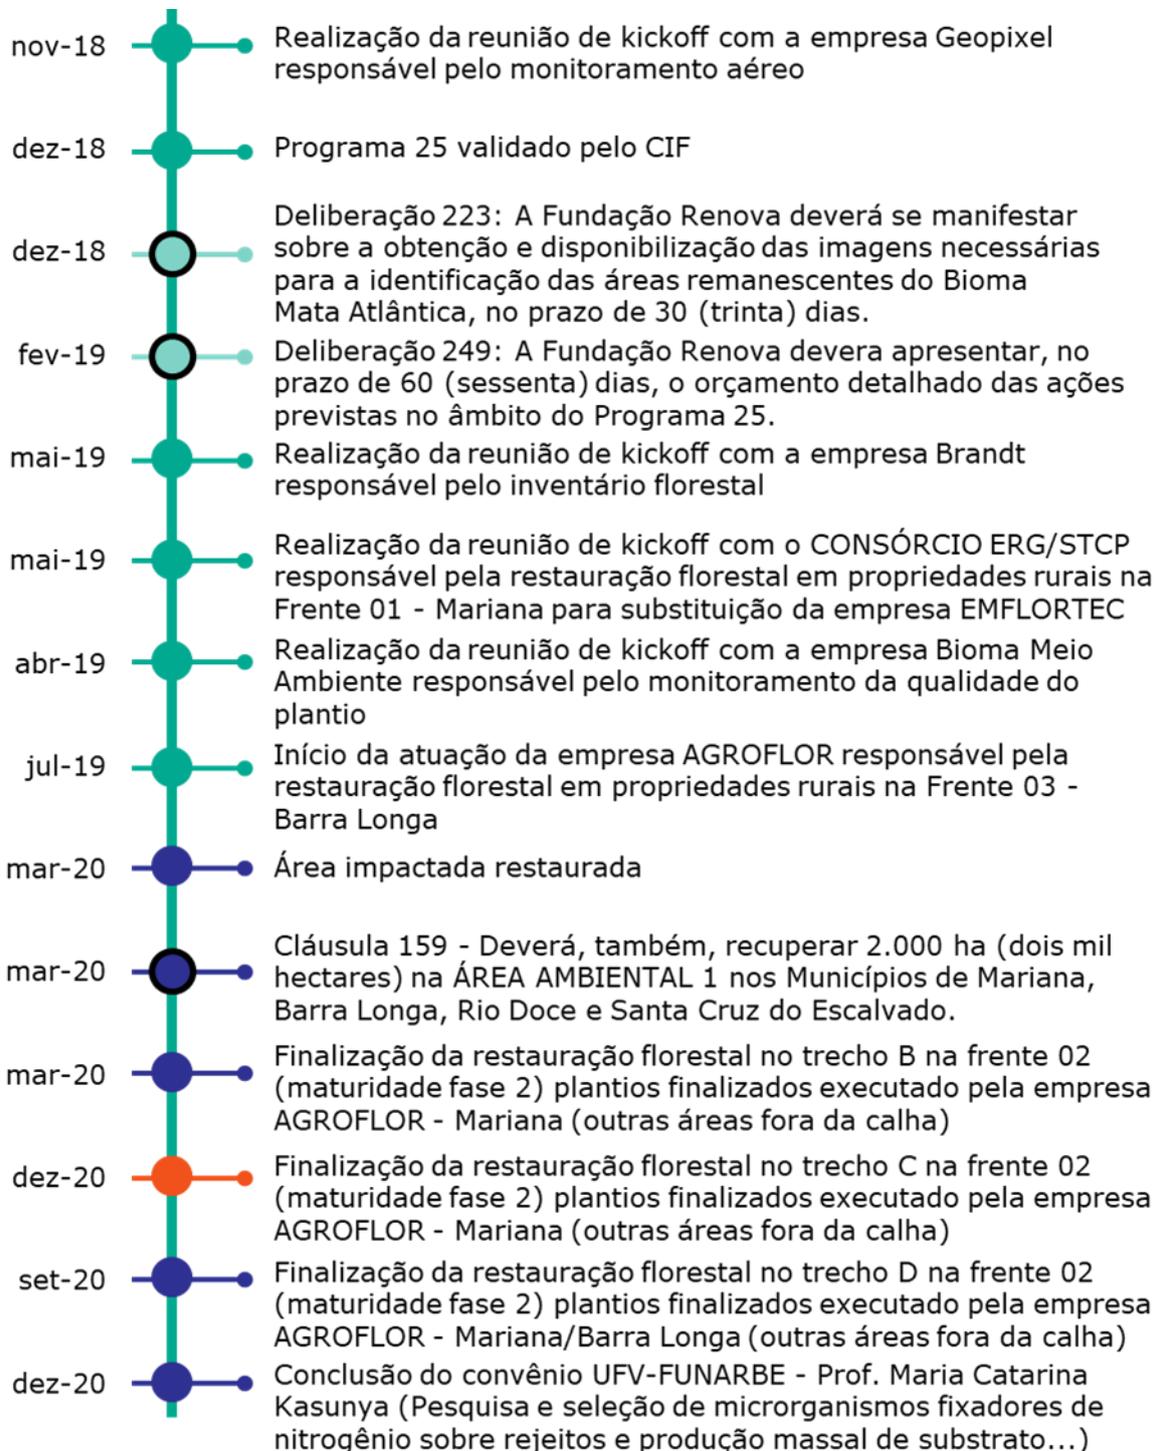

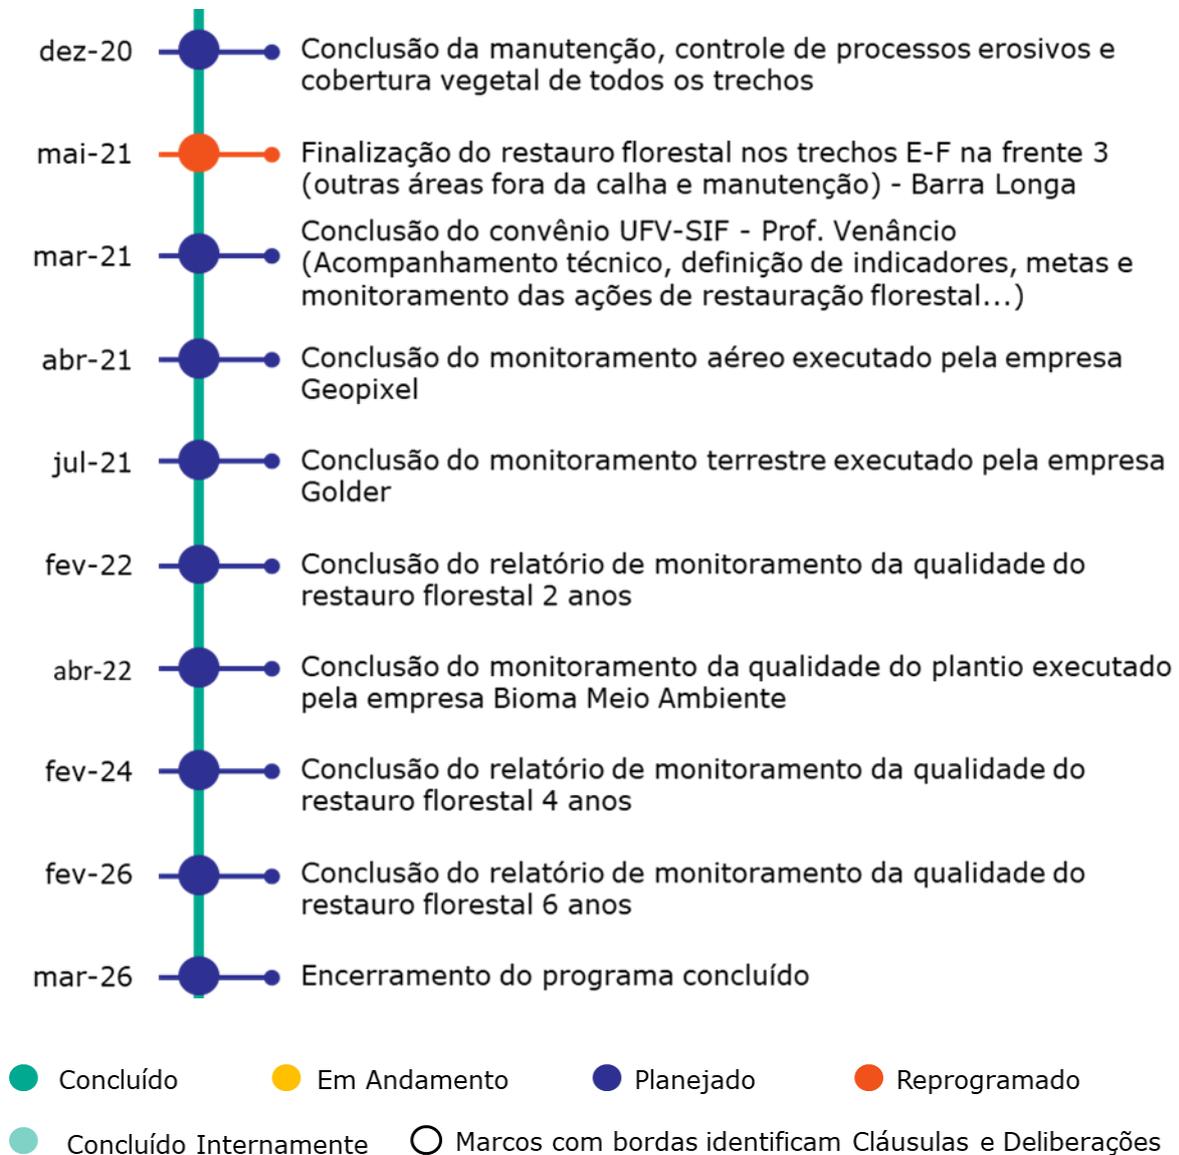

Entregas e fatos relevantes do mês

- Execução de cercamento de APP a fim de liberar área para plantio de modo a cumprir o marco de restauro florestal em área impactada até março de 2020;
- Execução dos diagnósticos técnicos, elaboração de projetos e preparo de solo;
- Execução de trabalhos de manutenção das áreas plantadas;
- Execução de irrigações das áreas plantadas;
- Entrega do relatório de indicadores de cobertura vegetal e de solo exposto;
- Entrega do relatório de indicador de redução de perda de solo;
- Apresentação da metodologia e cronograma do Inventário Florestal realizado pela empresa contratada Brandt no SEAMA-ES (com a participação do secretário do meio ambiente do estado do Espírito Santo) e no ICMBio (Brasília);
- Workshop Produção de mudas de espécies florestais nativas inoculadas com microrganismos benéficos para a revegetação da Bacia do Rio Doce, em Governador Valadares, MG, produto da parceria entre UFV/ FUNARBE e a Fundação Renova;
- Capacitação técnica de monitoramento de áreas naturais e em processo de restauração realizada nos dias 19 e 20/08/2019 no Instituto Terra, em Aimorés-MG. Com a participação de técnicos envolvidos na recuperação da bacia do Rio Doce, o curso contou com aulas práticas e teóricas ministradas por especialistas da Bioflora Tecnologia da Restauração. Além dos colaboradores da Fundação Renova, Progen, Brandt e Instituto Terra, também participaram os membros da CTFlor (Ibama, CBH-doce, IEF, IEMA);

- Apresentação do Portal GIS (Geographic Information System) e início do processo de cadastro e treinamentos dos membros da CTFlor, no portal. O portal irá facilitar o acompanhamento e trazer mais assertividade as vistorias e avanços dos programas.

Próximas entregas

- Continuar os trabalhos de cercamento de APP a fim de liberar área para plantio de modo a cumprir o marco de restauro florestal em área impactada até março de 2020;
- Continuar os trabalhos de execução dos diagnósticos técnicos, elaboração de projetos e preparo de solo;
- Continuar os trabalhos de manutenção das áreas plantadas;
- Executar irrigações das áreas plantadas;
- Firmar parceria entre Fundação Renova e Universidade Federal de Viçosa para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para monitoramento e recuperação do solo diretamente impactado pelo rejeito de Fundão nos municípios de Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa (Área Ambiental 1).

Desafios

- Hoje existem mais de **186** hectares de APP impactadas e não liberadas pelos proprietários, interferindo no escopo de área total prevista para recuperação até

março de 2020. Foi realizado plano de visita e de engajamento do produtor, onde conseguimos realizar mapeamento das causas da não adesão. Encaminharemos esta lista com os motivos de cada um para a CTFlor ainda no mês de setembro de 2019;

- Interferência de gado em APP, prejudicando a sobrevivência de mudas já plantadas nas propriedades. Relatório já protocolado nas CT's.

Indicadores/Grandes Números

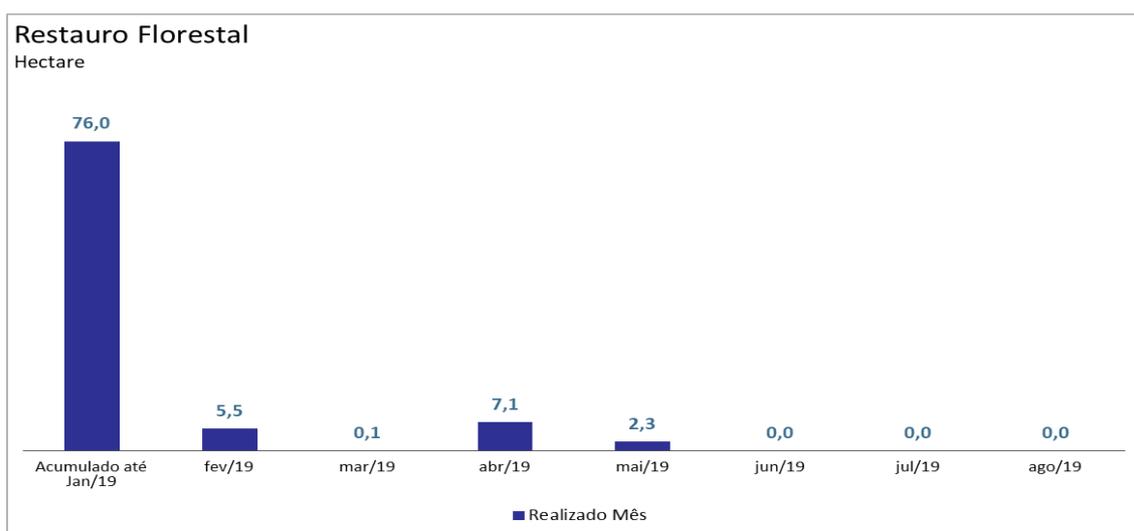


Gráfico 1. Restauração Florestal – por mês (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx. *Não houve restauração florestal no período de junho, julho e agosto por ser período seco.

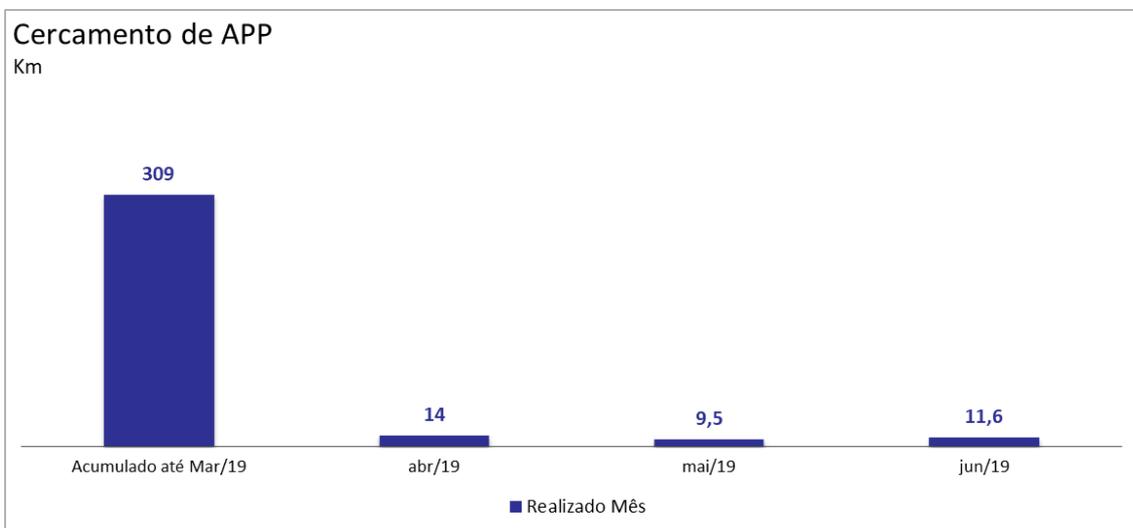


Gráfico 2. Cercamento de APP – por mês (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190904.xlsx. *Até a data de fechamento do relatório, os dados de julho e agosto/19 ainda estavam em processo de coleta e geração.

Fotos



Foto relacionada à: Operação de coveamento (manutenção) em Santa Cruz do Escalvado/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: Operação de controle de formigas cortadeiras (manutenção) em Santa Cruz do Escalvado/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: Operação de tratos culturais em fragmentos florestais em Rio Doce/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: Apresentação da metodologia e cronograma do inventário florestal em Vitória/ES – agosto/2019.



Foto relacionada à: Apresentação do portal GIS em Belo Horizonte/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: Capacitação técnica de monitoramento de áreas naturais em Aimorés/MG – agosto/2019.

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradadas ao longo da Bacia do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, às sub-bacias dos rios definidos como fonte de abastecimento alternativa para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula 171 do TTAC, conforme as prioridades definidas pelo Comitê Interfederativo (CIF) numa extensão de 40.000 hectares em 10 anos. Dessa área, 10 mil hectares deverão ser reflorestados e os 30 mil hectares restantes deverão ser recuperados por meio de regeneração.


Cláusulas do TTAC: 161 – Em andamento.


Deliberações que impactam escopo e prazo: 11, 14, 44, 62, 65, 88, 89, 90, 108, 133, 134, 143, 144 e 196 concluídas internamente; 270 em andamento.


Marcos do Programa





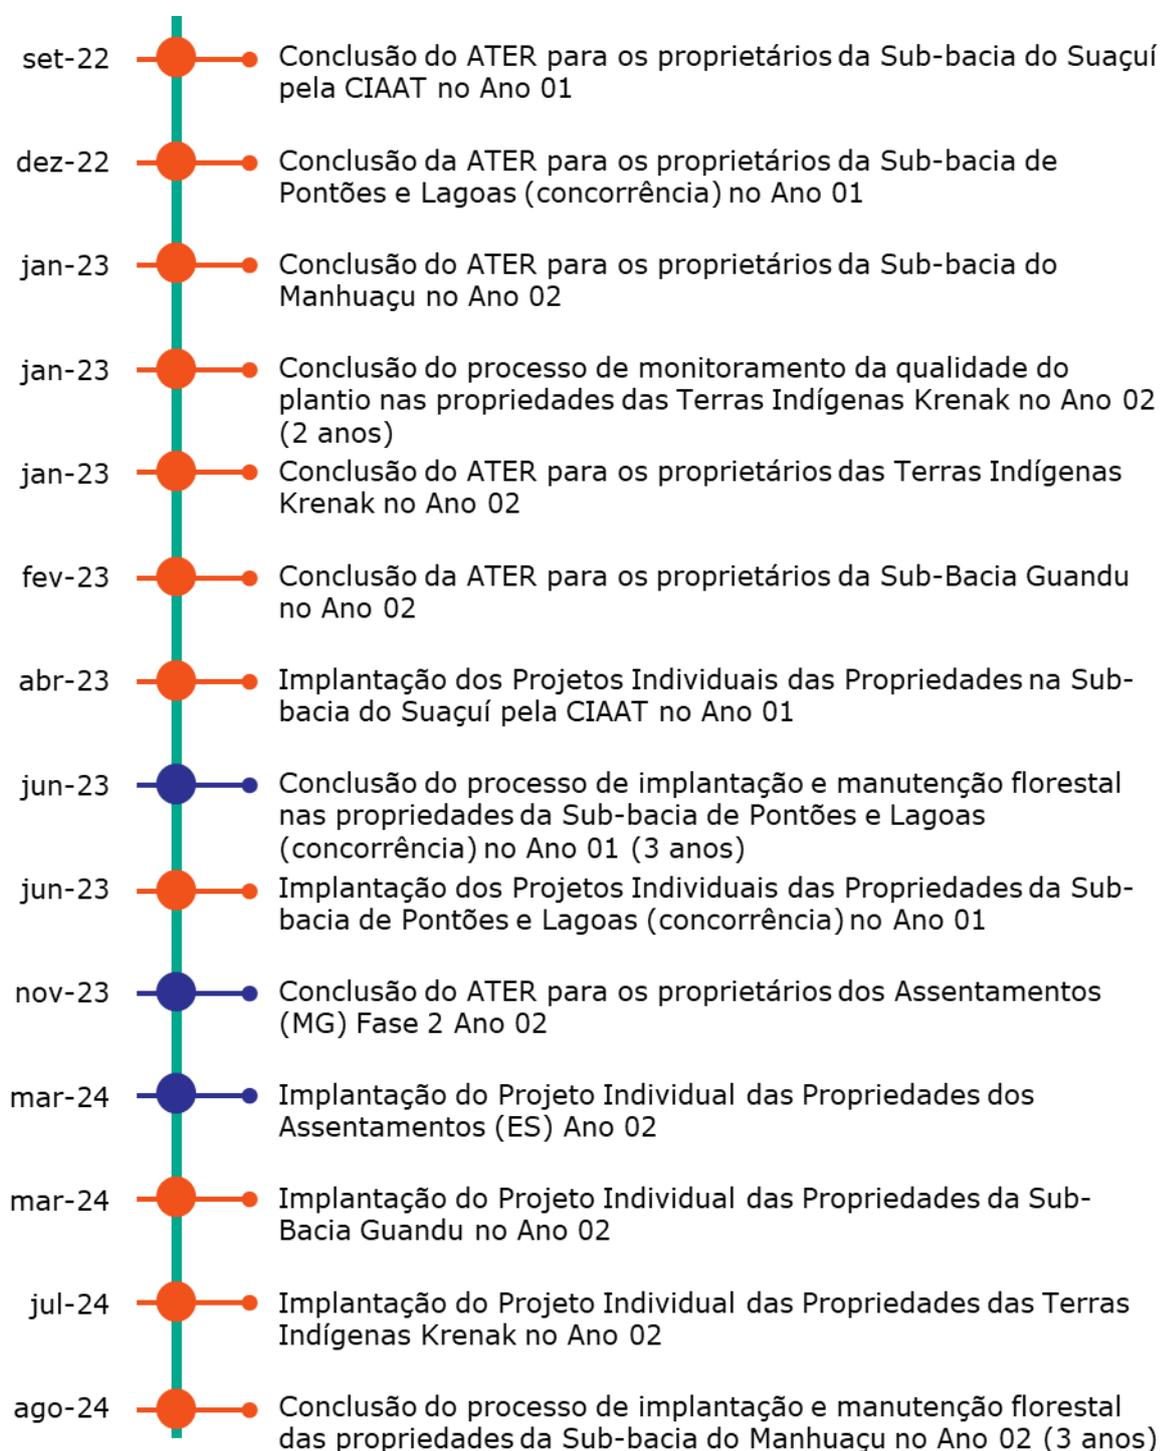

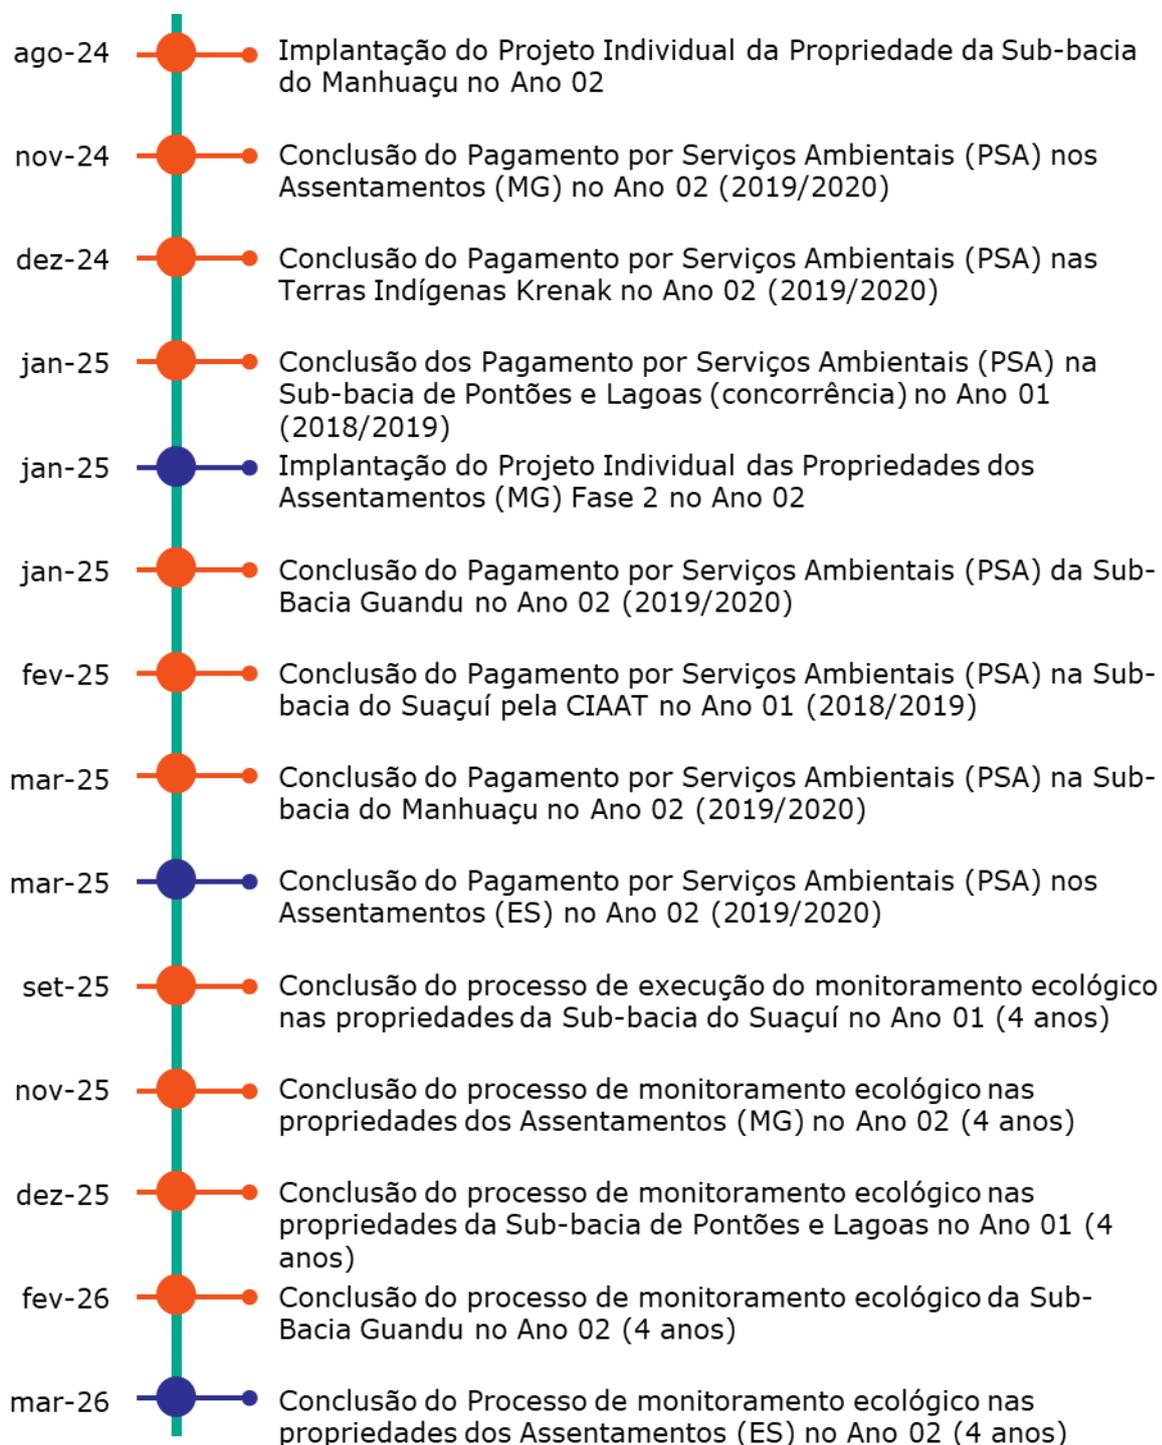

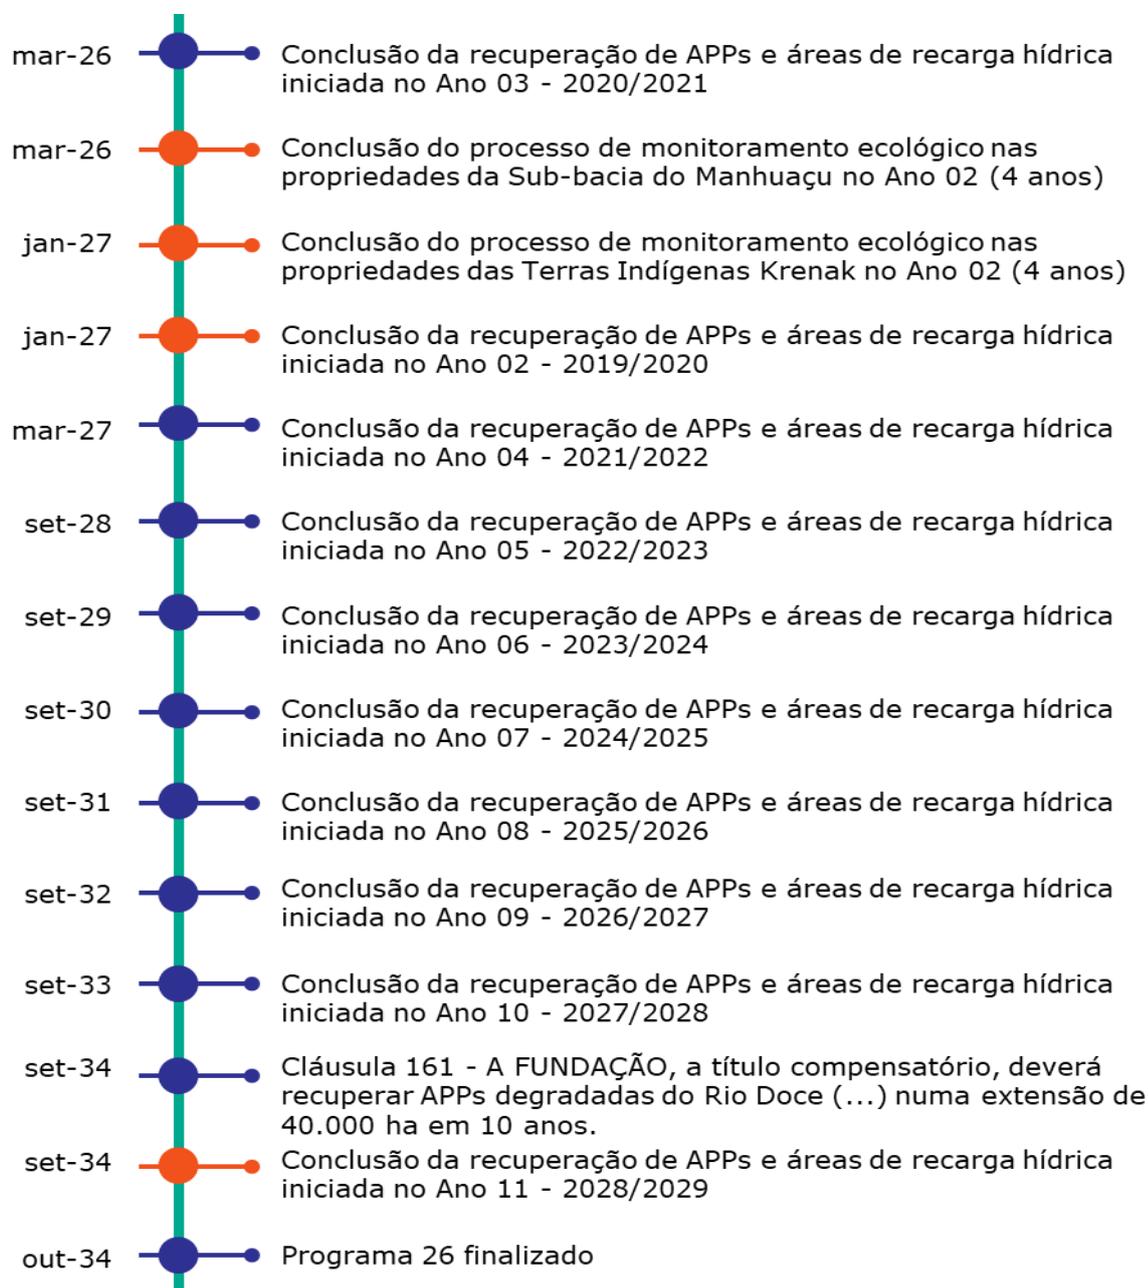

- Concluído ● Em Andamento ● Planejado ● Reprogramado
- Concluído Internamente ○ Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Formalização da Unidade de Acompanhamento Local - UAL Suaçuí – Governado Valadares, discussão de melhores formas de divulgação do Edital na região e tratativas para inclusão de novos membros;
- Formalização da Unidade de Acompanhamento Local - UAL Piranga - Viçosa, discussão de melhores formas de divulgação do Edital na região e tratativas para inclusão de novos membros;
- Mobilização da contratada responsável por operacionalizar a rede de produção de sementes e mudas (cláusula 162) para fornecimento de sementes e mudas para a recuperação das áreas objeto das cláusulas 161 e 163;
- Formalização da parceria com a WWF para criar unidades de acompanhamento local nos territórios que receberão restauro florestal;
- Apresentação da metodologia e cronograma do Inventário Florestal realizado pela empresa contratada Brandt no SEAMA-ES (com a participação do secretário do meio ambiente do estado do Espírito Santo) e no ICMBio (Brasília);
- Capacitação técnica de monitoramento de áreas naturais e em processo de restauração realizada nos dias 19 e 20/08/2019 no Instituto Terra, em Aimorés-MG. Com a participação de técnicos envolvidos na recuperação da bacia do Rio Doce, o curso contou com aulas práticas e teóricas ministradas por especialistas da Bioflora Tecnologia da Restauração. Além dos colaboradores da Fundação Renova, Progen, Brandt e Instituto Terra, também participaram os membros da CTFlor (Ibama, CBH-doce, IEF, IEMA);

- Apresentação do Portal GIS (Geographic Information System) e início do processo de cadastro e treinamentos dos membros da CTFlor, no portal. O portal irá facilitar o acompanhamento e trazer mais assertividade as vistorias e avanços dos programas.

Médio Rio Doce:

- Kick-off com o CIAAT, que irá implantar o restauro florestal (460 hectares de Áreas de Preservação Permanente e 240 nascentes) na Sub-bacia do Suaçuí em 2019;
- Kick-off com o Centro de Formação Francisca Veras vinculada ao MST, que irá implantar o restauro florestal (180 hectares) nos Assentamentos da Reforma Agrária do Médio Rio Doce em 2019;
- Lançamento do edital para mobilizar e implantar restauro florestal nas propriedades e início das inscrições dos proprietários da Sub-bacia do Manhuaçu no Ano 02 (2019/2020).

Baixo Rio Doce:

- Lançamento do edital para mobilizar e implantar restauro florestal nas propriedades da Sub-bacia do Guandu no Ano 02 (2019/2020);

Próximas entregas

- Divulgar o projeto de formação de redes de sementes e mudas à população, para iniciar o “Projeto de Construção Participativa das Redes”. Esta atividade se refere ao Marco “Conclusão do fomento a cadeia de sementes e mudas (REDE)”.

Médio Rio Doce:

- Iniciar atividades de assistência técnica e extensão rural para os proprietários da Sub-bacia do Suaçuí do Ano 01 (2018/2019). Esta atividade se refere ao Marco “Conclusão da ATER para os proprietários da Sub-bacia do Suaçuí pela CIAAT no Ano 01”.

Desafios

- A CT-Flor aprovou previamente a definição do escopo do programa e orçamento, no entanto ainda está pendente a revisão dos custos do programa para aprovação do escopo completo. Sendo assim, a definição do programa não foi aprovada pelo CIF, podendo interferir na conclusão do programa dentro da qualidade e conforme prazo estipulado.

Baixo Rio Doce:

- Redefinição e escalonamento em função da priorização dos PG's reparatórios, que precisam ser novamente submetidos ao CTFLOM para validação, pode gerar um novo ciclo de planejamento de cronograma e novas entregas para o programa, impactando assim, em termos de escopo e prazo a execução e cumprimento dos objetivos do Programa.

Indicadores/Grandes Números

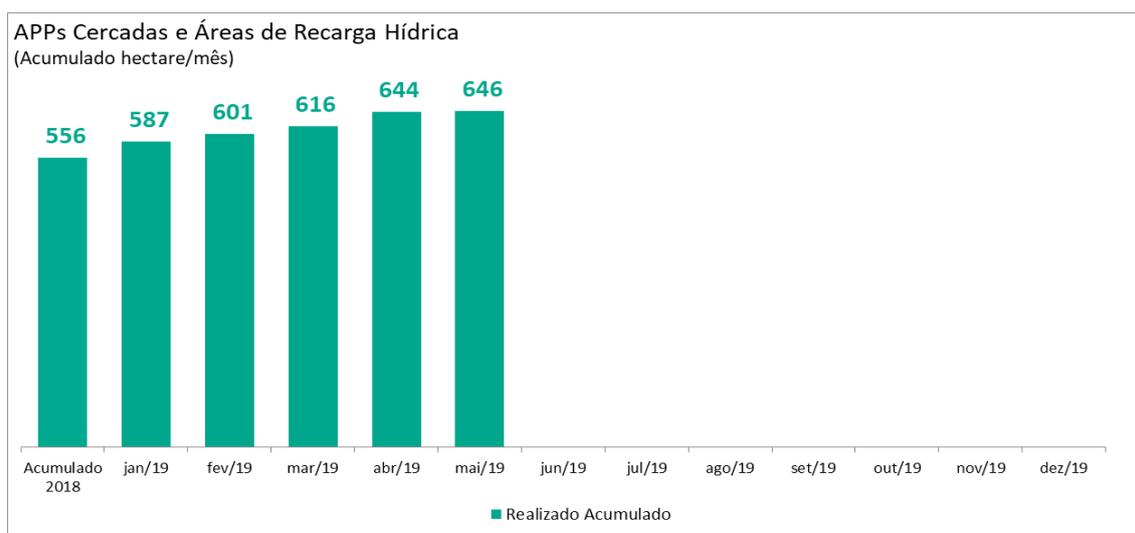


Gráfico 1. Áreas de Preservação Permanente Cercadas (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190807.xlsx. *Até a data de fechamento do relatório os dados de junho/19, julho/19 e agosto/19 ainda estavam em processo de coleta e geração.

Fotos



Foto relacionada à: Curso de monitoramento da restauração florestal – Aimorés (MG) – agosto/2019.



Foto relacionada à: Apresentação da metodologia e cronograma do inventário florestal em Vitória/ES – agosto/2019.



Foto relacionada à: Manutenção das áreas do ano 01. Atividade de roçada seletiva – Colatina (ES) – agosto/2019.



Foto relacionada à: Apresentação do portal GIS em Belo Horizonte/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: Capacitação técnica de monitoramento de áreas naturais em Aimorés/MG – agosto/2019.

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água


Objetivo


Recuperar 5.000 nascentes na bacia do rio Doce em um período máximo de 10 anos em atendimento à cláusula 163 (Recuperação de 5 mil nascentes) do TTAC.

Cláusulas do TTAC: Cláusula 163 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 68, 87, 135 e 293 concluídas internamente.

Marcos do Programa

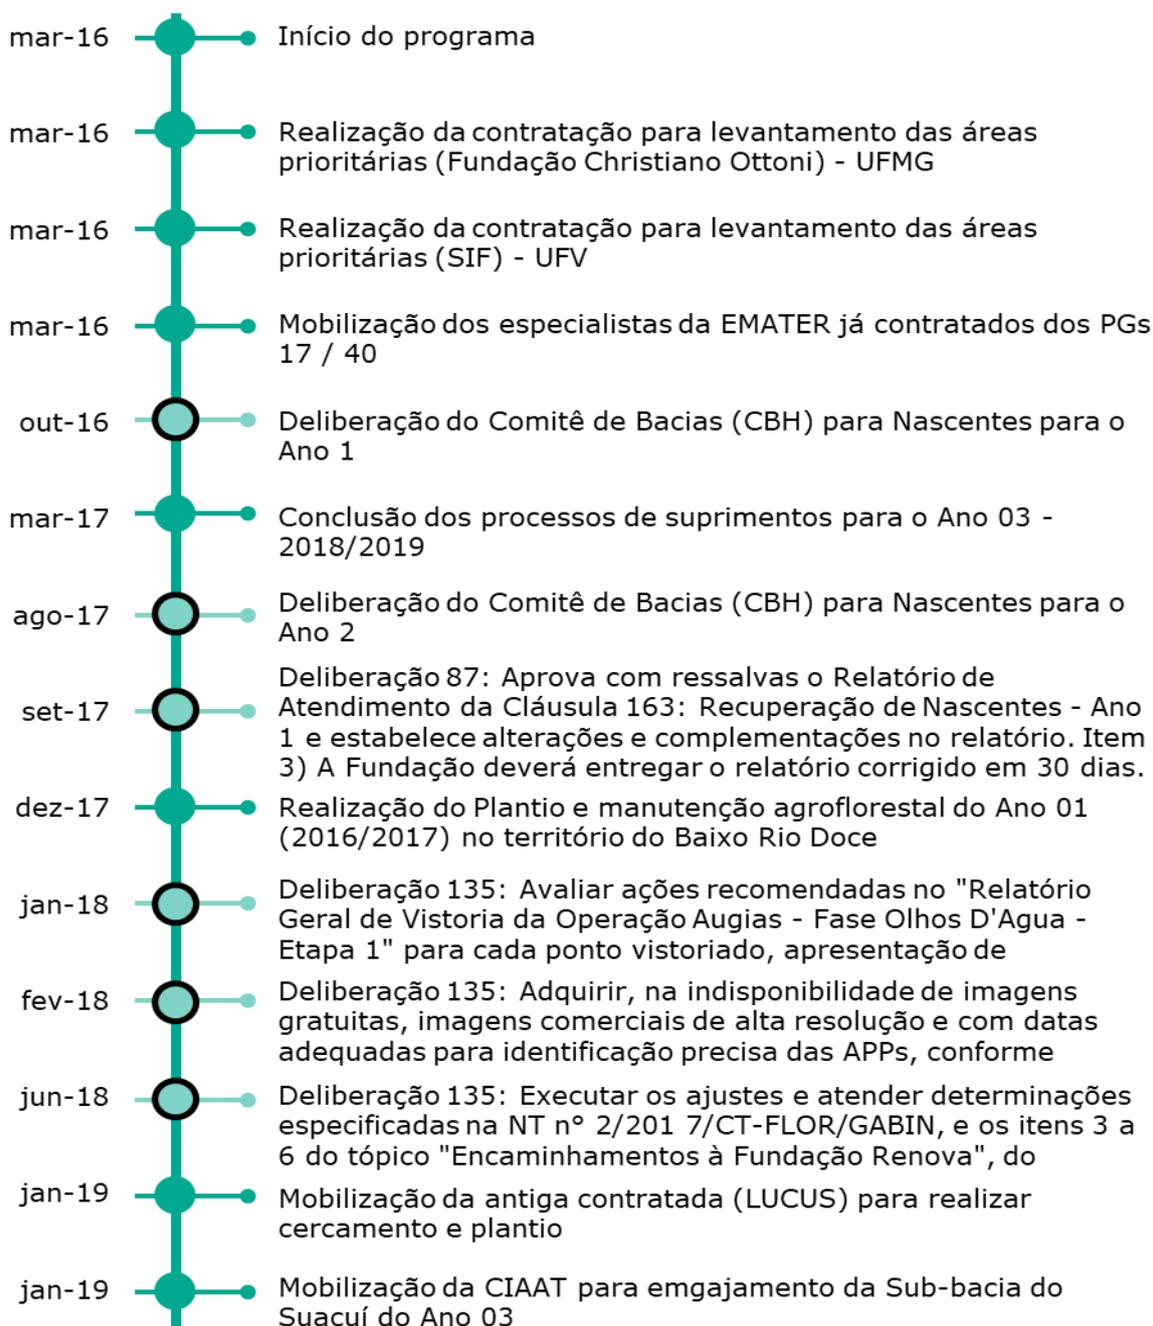


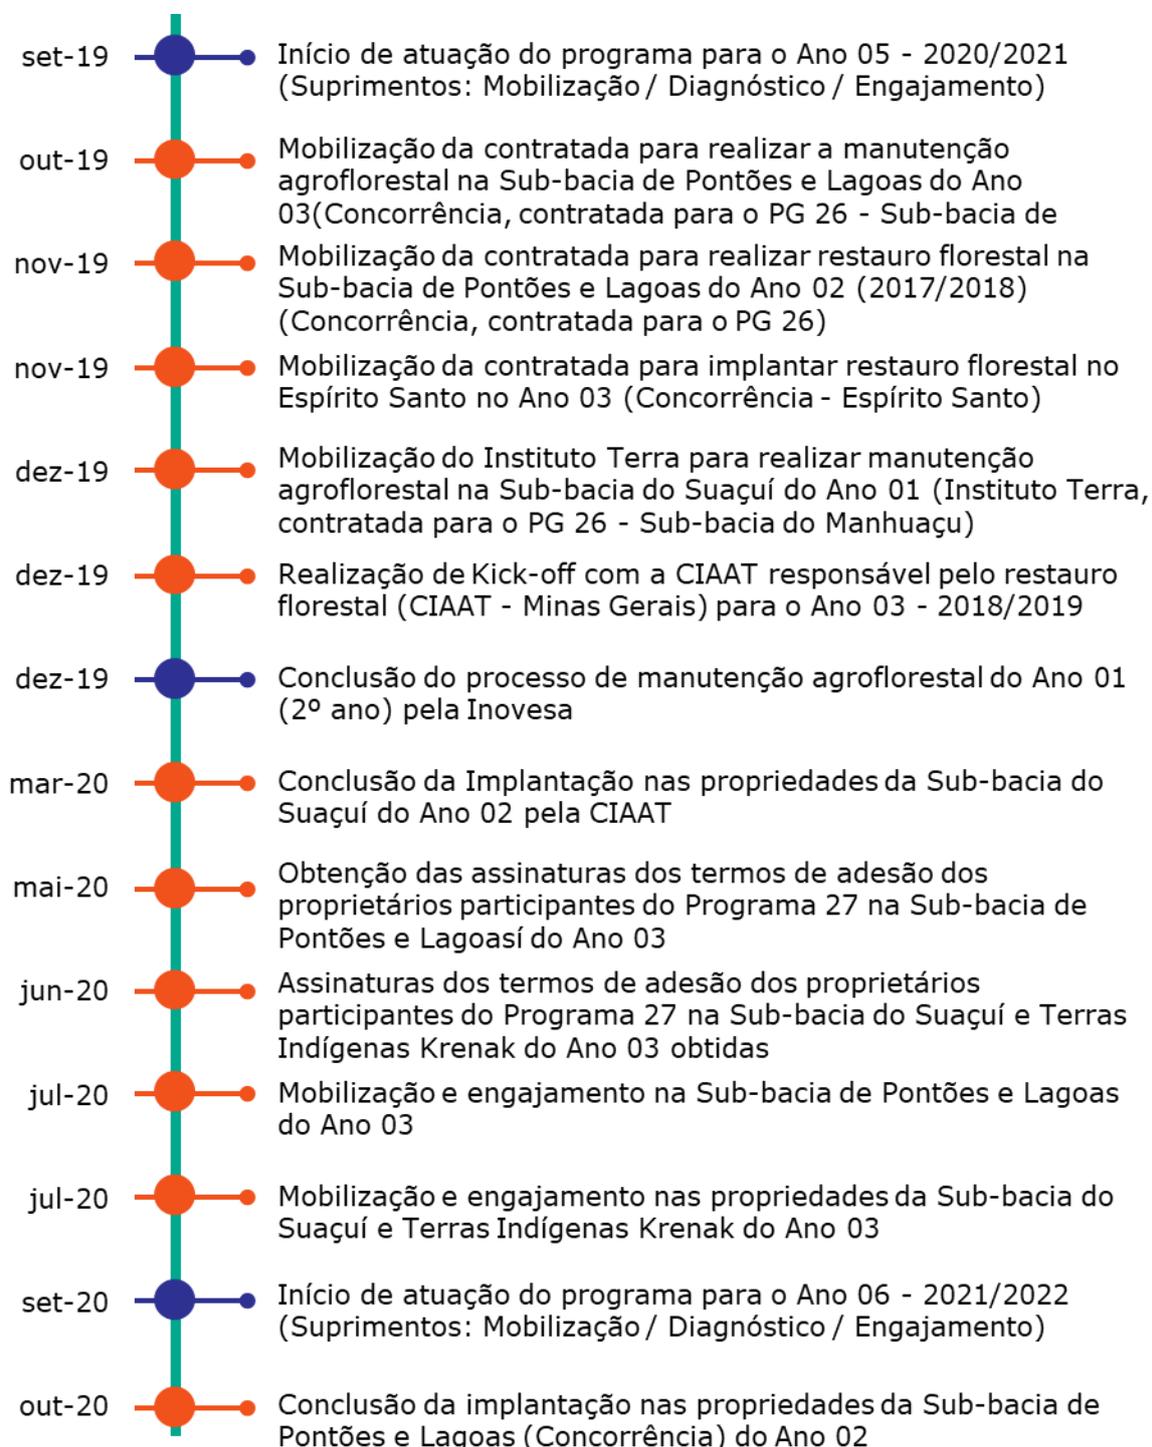







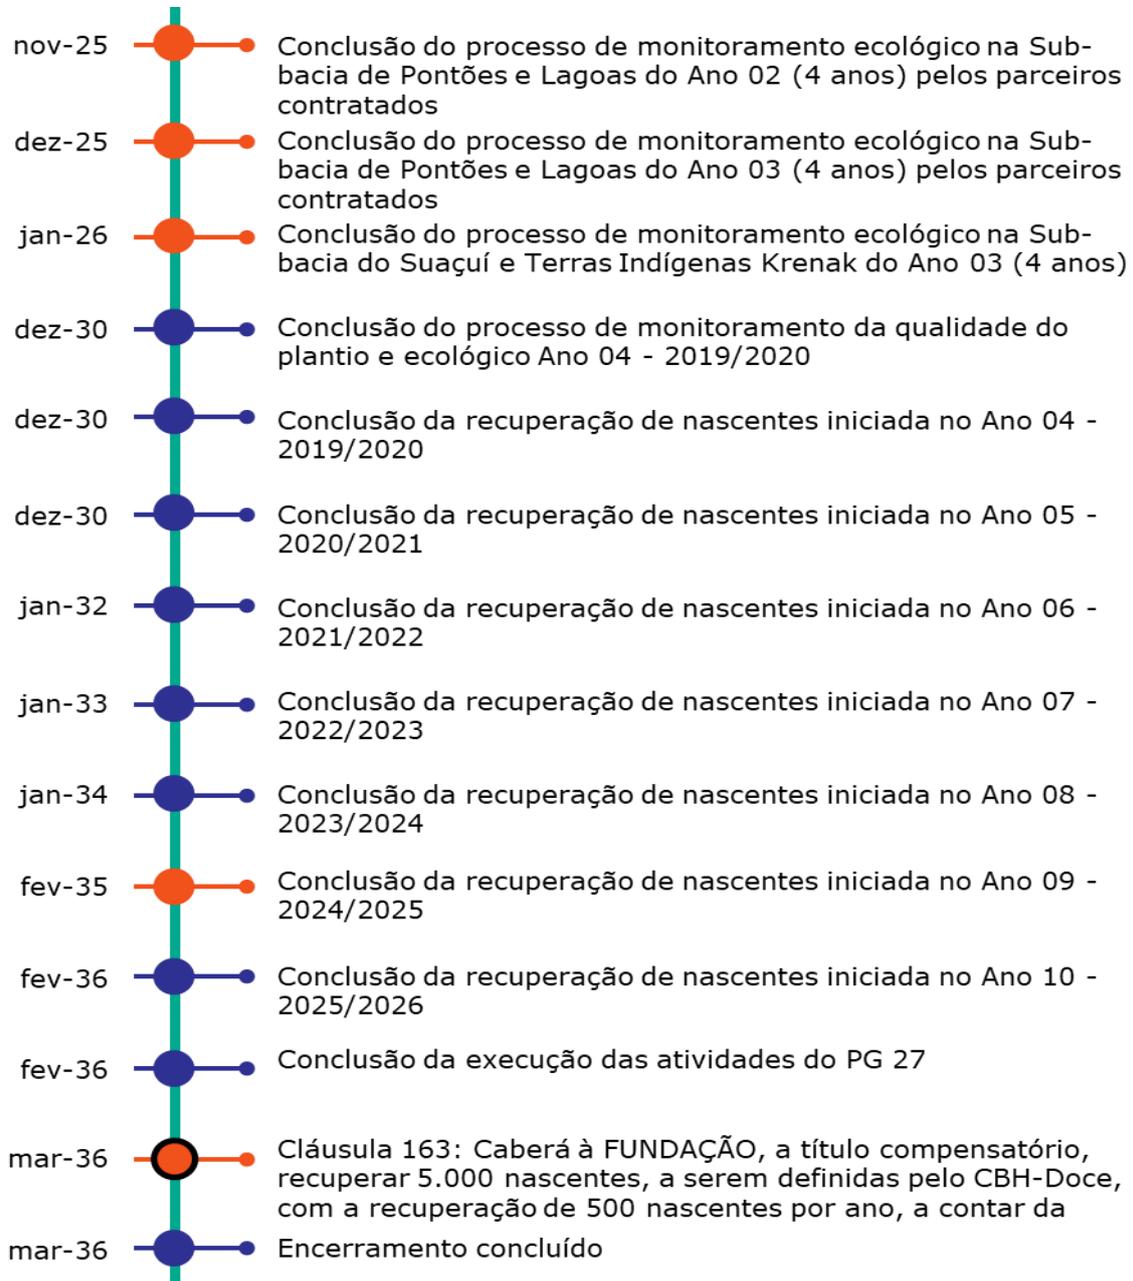

- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Apresentação da metodologia e cronograma do Inventário Florestal realizado pela empresa contratada Brandt no SEAMA-ES (com a participação do secretário do meio ambiente do estado do Espírito Santo) e no ICMBio (Brasília);
- Capacitação técnica de monitoramento de áreas naturais e em processo de restauração realizada nos dias 19 e 20/08/2019 no Instituto Terra, em Aimorés-MG. Com a participação de técnicos envolvidos na recuperação da bacia do Rio Doce, o curso contou com aulas práticas e teóricas ministradas por especialistas da Bioflora Tecnologia da Restauração. Além dos colaboradores da Fundação Renova, Progen, Brandt e Instituto Terra, também participaram os membros da CTFlor (Ibama, CBH-doce, IEF, IEMA);
- Apresentação do Portal GIS (Geographic Information System) e início do processo de cadastro e treinamentos dos membros da CTFlor, no portal. O portal irá facilitar o acompanhamento e trazer mais assertividade as vistorias e avanços dos programas.

Próximas entregas

Médio Rio Doce:

- Obter o distrato do contrato com a empresa Lucus;
- Concluir o escopo iniciado (cercamento e plantio) pela Lucus nas Sub-Bacias do Suaçuí e Pontões e Lagoas;

- Mobilizar pessoal da CIAAT para realização do restauro florestal na Sub-Bacia do Suaçuí do ano 02 (2017/2018);
- Realizar entregas de insumos e equipamentos nas Terras Indígenas Krenak no ano 03 (CIAAT).

Desafios

Médio Rio Doce:

- Realizar prospecção e seleção de nascentes na região/localidade definida para o projeto – Ano 3 (2018/2019) de forma a entregar tal ano dentro do prazo e escopo planejados.

Indicadores/Grandes Números

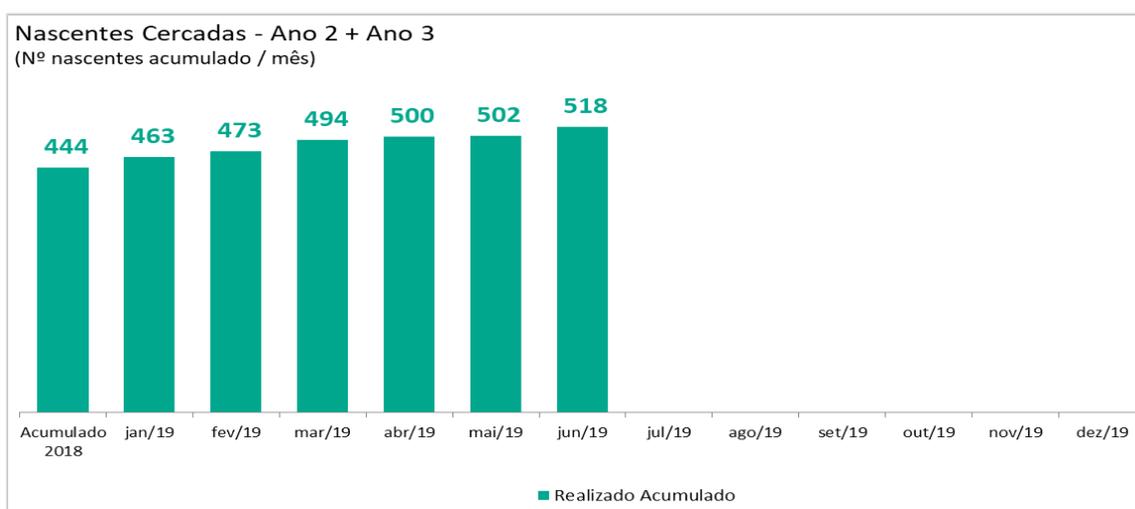


Gráfico 17. Nascentes Cercadas no Ano 2 e Ano 3 (agosto/2019). Fonte: UST-BDD-001-00_BDAGRO_190705.xlsx.
*Até a data de fechamento do relatório os dados de julho/19 e agosto/19 ainda estavam em processo de coleta e geração.

Fotos



Foto relacionada à: Validação e cadastramento de nascentes na micro bacia do córrego Graça Aranha – Colatina (ES) – agosto/2019.



Foto relacionada à: Curso de monitoramento da restauração florestal – Aimorés (MG) – agosto/2019.



Foto relacionada à: Validação e cadastramento de nascentes na micro bacia do córrego Iriri-timirim – Linhares (ES) – agosto/2019.



Foto relacionada à: Apresentação da metodologia e cronograma do inventário florestal em Vitória/ES – agosto/2019.



Foto relacionada à: Apresentação do portal GIS em Belo Horizonte/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: Capacitação técnica de monitoramento de áreas naturais em Aimorés/MG – agosto/2019.

PG028 Conservação da Biodiversidade.

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, bem como realizar o monitoramento e implementar eventuais ações de contingência da fauna aquática da foz do Rio Doce, dos ambientes estuarinos e marinho impactados.


Cláusulas do TTAC: 164 – Em andamento; 165 - Atrasada; 166 - Atrasada.


Deliberações que impactam escopo e prazo: 74 – Concluída internamente; 79 – Concluída internamente; 102 – Concluída internamente; 112 – Concluída internamente; 113 – Concluída internamente; 148 – Concluída internamente; 159 – Atrasada; 212 – Concluída internamente; 218 - item 3 – Concluída internamente; 279 – Concluída internamente; 282 – Concluída internamente.

Marcos do Programa

- jun-16 ● Início do programa
- mai-18 ● Protocolo do relatório semestral do monitoramento de tartarugas marinhas (Ciclo 1), na CT-Bio
- jul-18 ● Conclusão do Fase 1 do Estudo da Qualidade do Pescado no rio Doce, Foz e Zona Costeira - Parecer técnico
- ago-18 ● Conclusão da Fase 2 do Estudo da Qualidade do Pescado no rio Doce, Foz e Zona Costeira - Pareceres Técnicos Individuais
- set-18 ● Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 1 de Monitoramento da Biota Aquática em Atendimento à Notificação IBAMA 678311/2015 - Anexo 2 - na CT-Bio
- set-18 ● Deliberação 148: Determina que a Renova inicie até dia 28/02/18 a execução das atividades referentes ao monitoramento da fauna do rio doce na porção capixaba e ambientes estuarinos e marinhos impactados
- out-18 ● Cláusula 164 - Alínea "a": Apresentar um projeto para o estudo populacional de ictiofauna de água doce da calha e tributários do Rio Doce na Área Ambiental 1
- out-18 ● Protocolo do Relatório do Estudo Populacional da Ictiofauna e de invertebrados aquáticos da calha e tributários do rio Doce na Área Ambiental 1 na CT-Bio
- out-18 ● Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 1 de Monitoramento das Tartarugas Marinhas, na CTBio
- out-18 ● Deliberação 212 - Item 3: Apresentar em 30 dias um adequação ao Plano de Trabalho apresentado, quanto ao monitoramento da cláusula 165 em Minas Gerais.
- dez-18 ● Conclusão do Estudo da Qualidade do Pescado no rio Doce, Foz e Zona Costeira
- jan-19 ● Deliberação 218 - Item 3: Apresentar ao CIF nova versão da Definição do Programa ajustada conforme sugestões da CTBio.
- abr-19 ● Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 1 de Monitoramento para os Anexos 1 a 8 (exceto Ictiofauna, Ictioplâncton e Macroinvertebrados Bentônicos e Monitoramento das Tartarugas
- mai-19 ● Protocolo, na CTBio, do Relatório Anual do Ciclo 1 de Monitoramento da Biota Aquática em Atendimento à Notificação IBAMA 678311/2015

- jun-19  Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 2 Monitoramento reprodutivo de tartarugas marinhas na CT-Bio
- jun-19  Deliberação 279: Apresentar a estratégia de continuidade do programa de monitoramento da biodiversidade aquática
- jul-19  Deliberação 282: Apresentar o Plano de Trabalho para a avaliação do estado de conservação das espécies de peixes nativas do rio Doce, referente à Cláusula 164 alínea "b"
- ago-19  Contratação de Fornecedores para a Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do rio Doce
- set-19  Contratação para o monitoramento complementar da biodiversidade aquática em Minas Gerais
- set-19  Contratação para o Ciclo 2 de Monitoramento dos Anexo 1 a 8 (ES) para a continuidade do programa de monitoramento da biodiversidade aquática no rio Doce
- set-19  Finalização dos processos de seleção de projetos do Convênio FAPEMIG para o monitoramento do Rio Doce em MG e divulgação dos projetos selecionados
- out-19  Conclusão da FASE 1: Estudo Populacional da Ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do rio Doce na Área Ambiental 1
- out-19  Protocolo na CTBio do Relatório Final do monitoramento (em MG e ES), para a avaliação pelo SIF/UFV, da concentração de metais e arsênio nos peixes
- nov-19  Conclusão da etapa preparatória para a Avaliação do estado de Conservação de peixes e invertebrados aquáticos nativas do rio Doce
- nov-19  Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 1 de Monitoramento para os Anexos 1 a 8 (exceto Ictiofauna, Ictioplâncton e Macroinvertebrados Bentônicos e Monitoramento das Tartarugas Marinhas) na CTBio
- dez-19  Definição do Programa aprovada pelo CIF
- jan-20  Conclusão da etapa de Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do rio Doce
- jan-20  Conclusão da etapa de Validação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do rio Doce pelo ICMBio

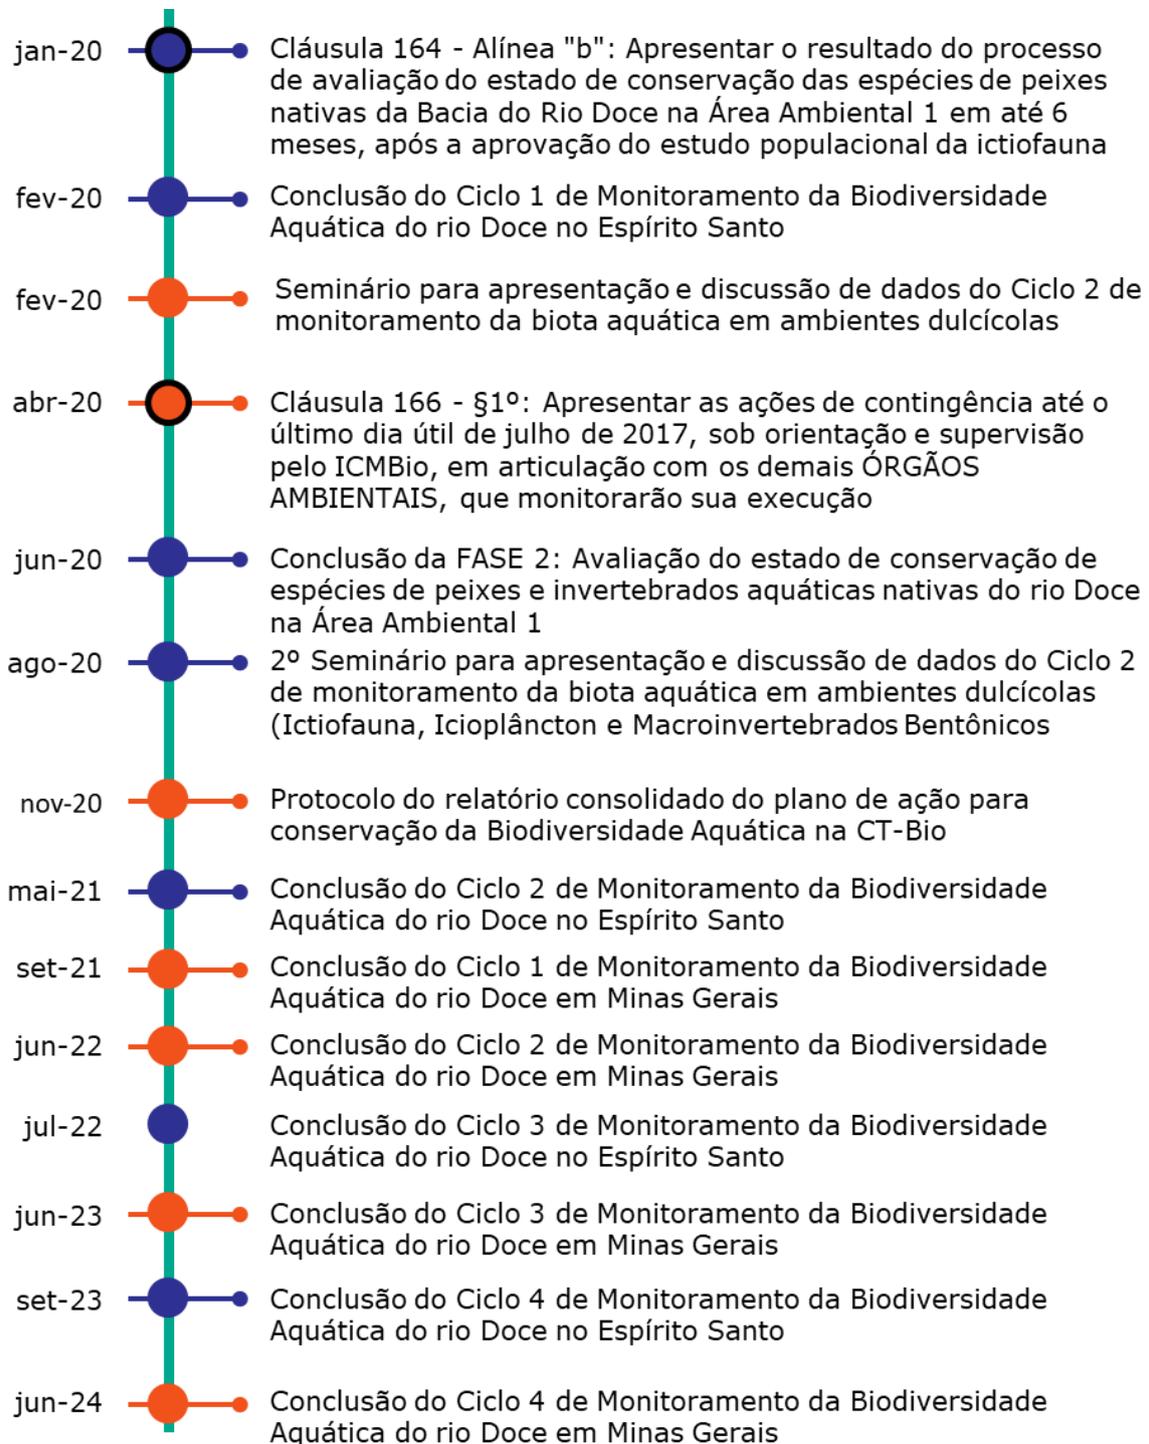

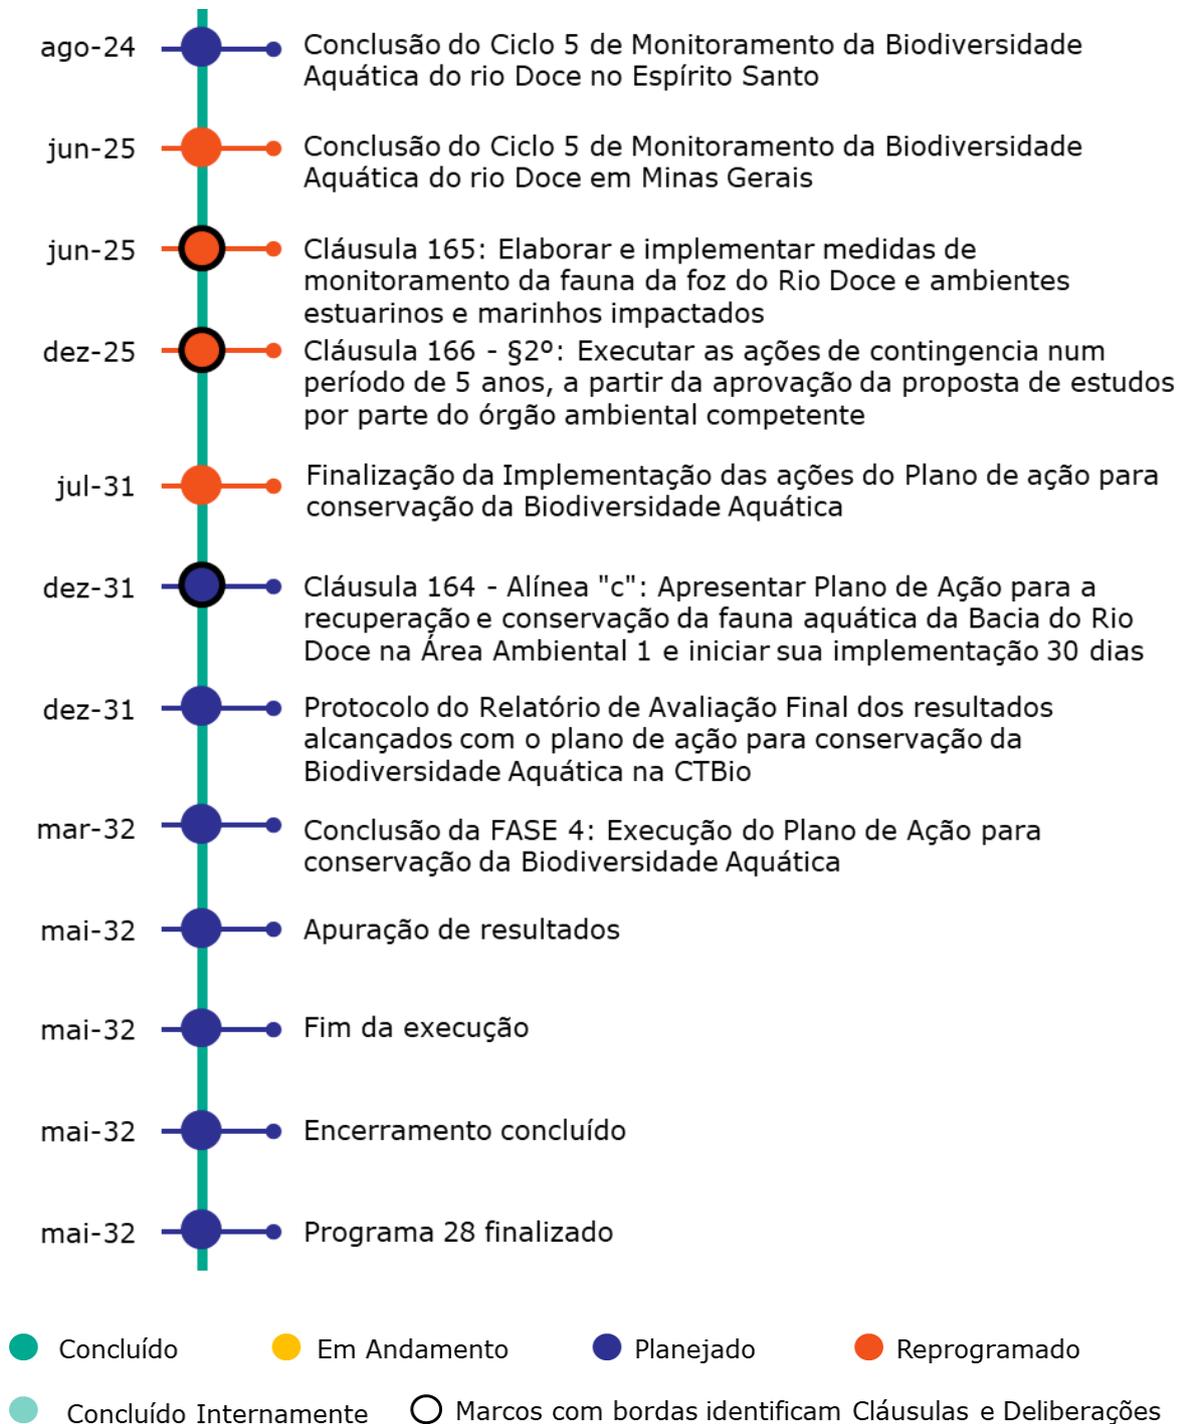

Entregas e fatos relevantes do mês

- Em 13/8/2019, foi concluído o processo de contratação da Fundação Biodiversitas para a execução da Fase 2: Avaliação do estado de conservação de peixes e invertebrados aquáticos nativos do rio Doce na Área Ambiental 1. O objetivo da fase é avaliar o estado de conservação de espécies da biota aquática ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce, em função do rompimento da barragem de Fundão, utilizando como alvo as classes de invertebrados aquáticas e ictiofauna (Fonte: P28-CON-001-00_Minuta Biodiversitas_190819);
- Em 20/8/2019, ocorreu a homologação dos resultados da seleção dos projetos para o monitoramento do rio Doce em Minas Gerais referentes às linhas temáticas I à V do edital de ampla concorrência realizado em parceria com a FAPEMIG (Fonte: P28-EDL-001-00_Resultado julgamento de recursos da chamada FAPEMIG 102018_190819. pdf). O resultado para a linha temática VI – Matas Ciliares – ainda se encontra em diligência e a seleção do projeto vencedor será reavaliada por profissionais indicados pela Academia Brasileira de Ciências e encaminhada à FAPEMIG para homologação e divulgação. Assim, o marco “Processos seleção de projetos do Convênio FAPEMIG para o monitoramento do Rio Doce em MG finalizados” foi reprogramado para setembro.

Próximas entregas

- Homologar recursos e publicar o resultado final dos projetos selecionados para o monitoramento do rio Doce em Minas Gerais no edital de ampla concorrência realizado em parceria com a FAPEMIG. Esta entrega refere-se ao Marco “Processos

seleção de projetos do Convênio FAPEMIG para o monitoramento do Rio Doce em MG finalizados”;

- Concluir processo interno de contratação para o monitoramento complementar da biodiversidade aquática do rio Doce em Minas Gerais. Esta entrega refere-se ao Marco “Contratação para o monitoramento complementar em MG (Ciclo 1) concluída”;
- Elaborar Relatório analítico com os dados da quantificação de metais e arsênio nos organismos coletados durante o monitoramento do rio Doce para avaliação de sanidade alimentar do pescado, em Minas Gerais e Espírito Santo, realizado pelo SIF/UFV. Esta entrega refere-se ao Marco “Estudos de Bioacumulação de metais e arsênios nos organismos coletados no monitoramento concluídos”.

Desafios

- Obter diretrizes da Câmara Técnica (CT-Bio) quanto à revisão do Termo de Referência para a continuidade do monitoramento da biodiversidade aquática do rio Doce, foz e regiões estuarinas, baseado nos resultados apresentados até o momento através dos relatórios de monitoramento.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG029 Recuperação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água


Objetivo


Fortalecer as estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre, englobando a construção, o aparelhamento e a manutenção (pelo período de três anos) de dois Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), sendo um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo.

Cláusulas do TTAC: 167 – Em andamento

Deliberações que impactam escopo e prazo: 218 - item 3 – Concluída internamente.

Marcos do Programa

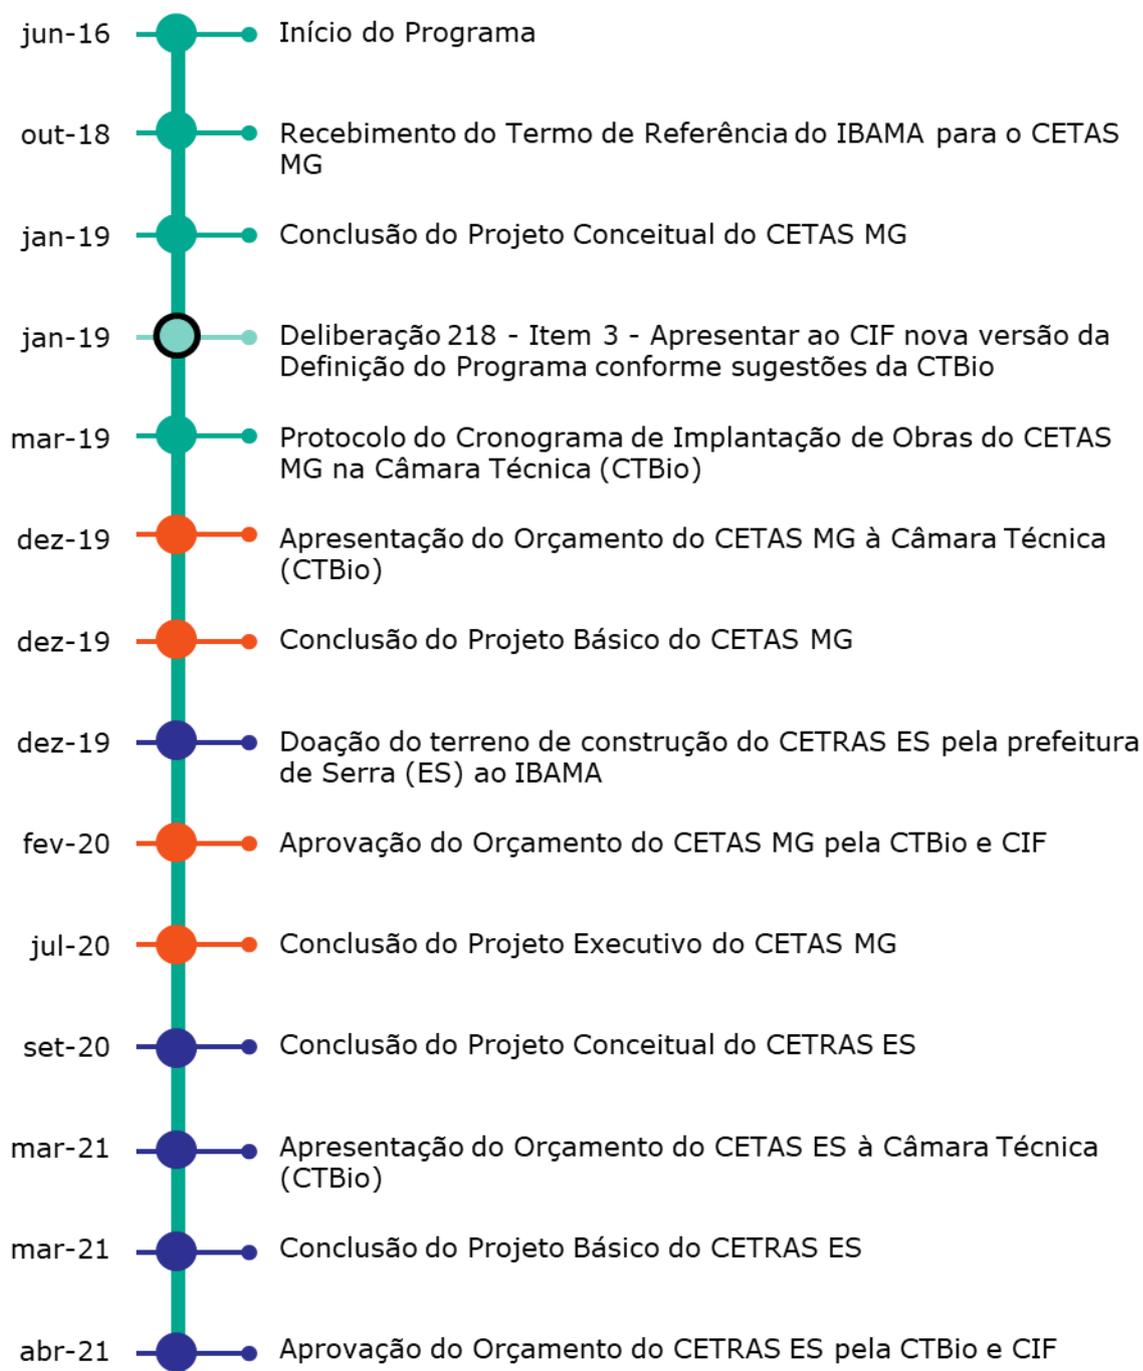

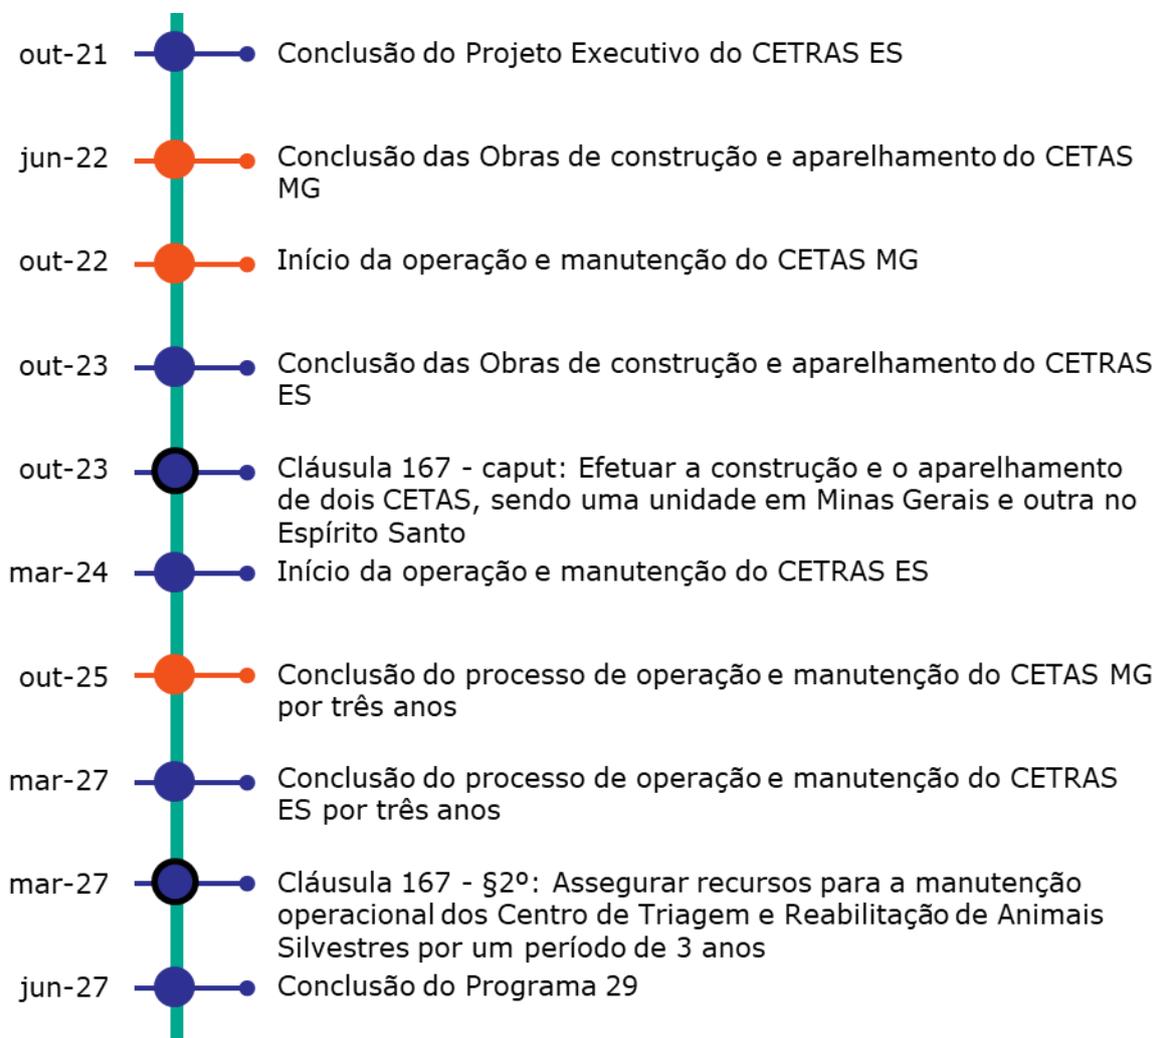

- Concluído ● Em Andamento ● Planejado ● Reprogramado
- Concluído Internamente ○ Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

CETAS MG:

- Não houve fato relevante do CETAS MG no mês de agosto, porque as ações estão paradas aguardando a conclusão da avaliação do IBAMA e IEF do Projeto de Engenharia elaborado até o momento. A conclusão desta avaliação estava acordada para o dia 31/07/19, porém até agosto a Fundação Renova não a recebeu. Após o retorno dessa avaliação será feito novo planejamento para o andamento do projeto de acordo com o volume de adequações solicitadas pelo IEF e IBAMA. CETRAS ES

CETRAS ES:

- Comunicação, pelo IBAMA ES, da sanção, pelo prefeito de Serra (ES), do projeto de lei que permite a doação de terreno para a construção do CETRAS ES. (Fonte: P29-LEI-001-00_Doação da área do IBAMA CETAS-ES_190829)

Próximas entregas

CETAS MG:

- Obter análise do IBAMA e IEF sobre o do Projeto de Engenharia elaborado até o momento do CETAS MG. Esta entrega refere-se aos Marcos “Aprovação das Premissas do Projeto Básico do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres Minas Gerais” e “Conclusão do Projeto Arquitetônico Básico / Complementares para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres Minas Gerais”;
- Avaliar a análise recebida do IBAMA e IEF sobre o Projeto de Engenharia elaborado até o momento do CETAS MG e adequar o planejamento para o projeto de acordo com o volume de adequações solicitadas. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão do Projeto Básico do CETAS MG”.

Desafios

CETAS MG:

- Obtenção da avaliação do IEF-MG sobre os projetos básicos e arquitetônicos elaborados pela Fundação Renova seguindo diretrizes do IBAMA. Este atraso da avaliação do IEF resultou no atraso do cronograma de construção do CETAS MG.

CETRAS ES:

- Apresentação da documentação que atesta condição de desimpedimento para a construção do CETRAS-ES. Sem esta formalização não é possível que a Fundação Renova apresente um cronograma de implantação de obras, conforme exigido no TTAC;
- Recebimento do Termo de Referência de Construção e Aparelhamento do CETRAS-ES ajustado com a inclusão dos equipamentos, a ser emitido pelo IBAMA. Esse termo é a premissa necessária para iniciar a elaboração do projeto.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG030 Fauna e Flora terrestre

Eixo Terra e Água


Objetivo

Desenvolver um estudo para identificação e caracterização do impacto do rompimento sobre as espécies da fauna e flora terrestre na Área Ambiental 1 e respectiva área de influência direta e apresentar plano de ação para conservação desta biota conforme resultados do estudo de impacto.


Cláusulas do TTAC: 168 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 91 – Concluída internamente; 132 – Concluída internamente; 218 - item 3 – Concluída internamente.


Marcos do Programa

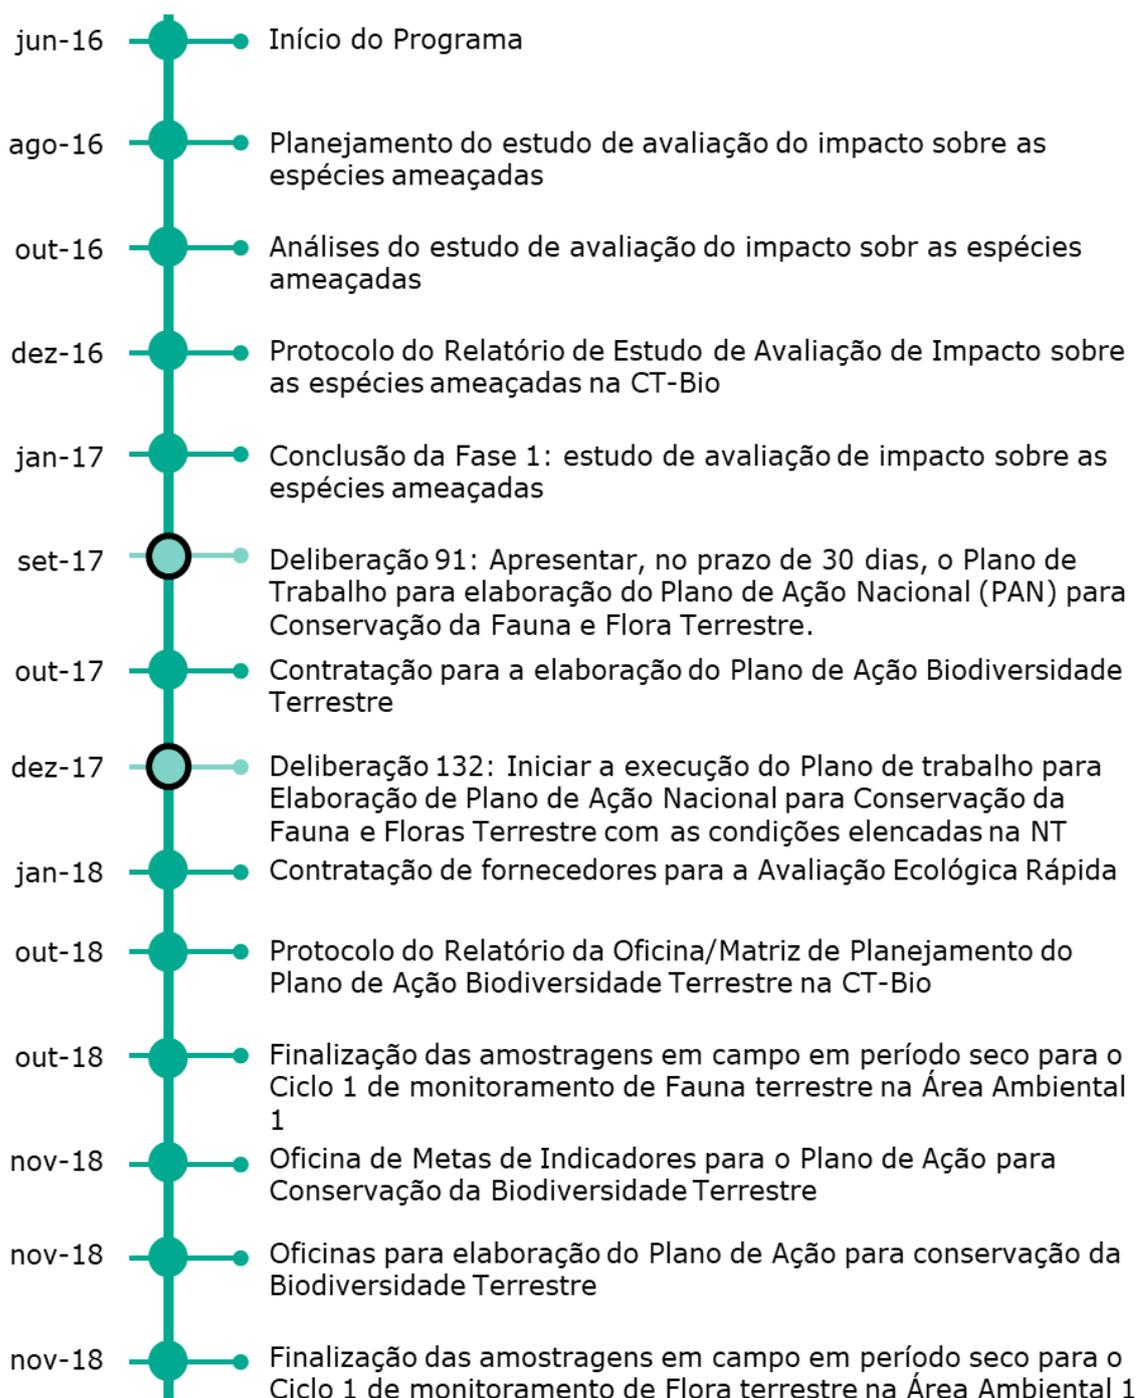



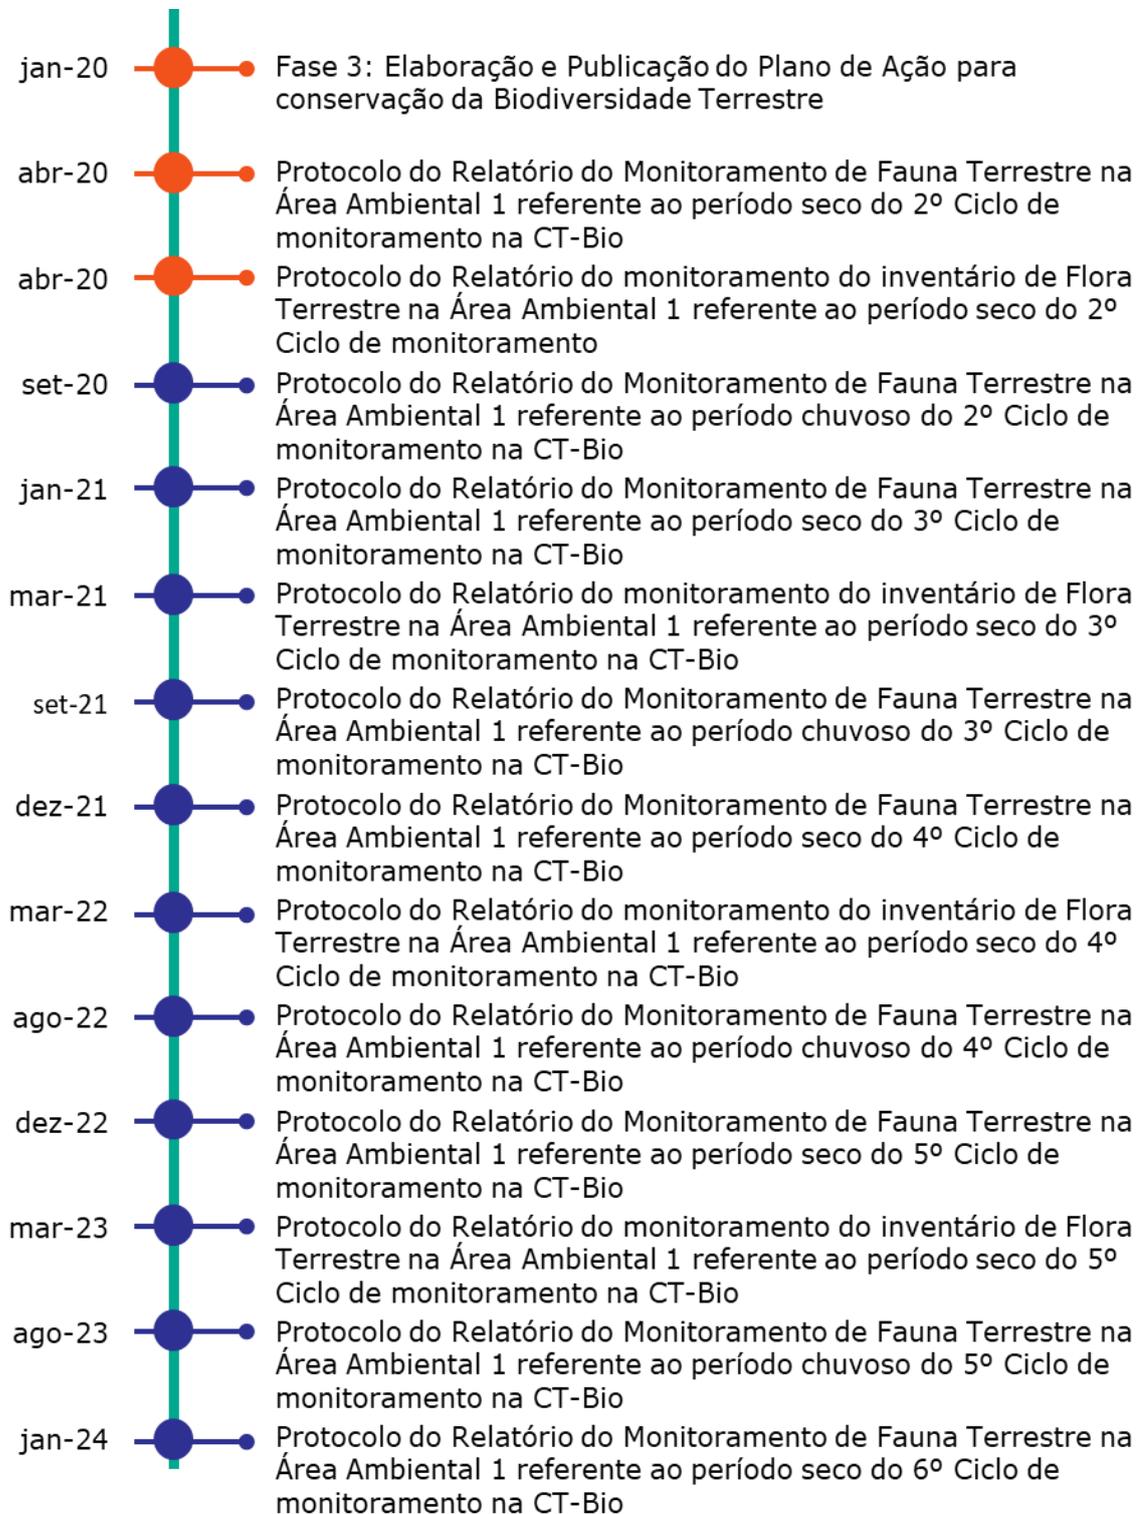

- mar-24 ● Protocolo do Relatório do monitoramento do inventário de Flora Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 6º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- ago-24 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período chuvoso do 6º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- jan-25 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 7º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- mar-25 ● Protocolo do Relatório do monitoramento do inventário de Flora Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 7º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- set-25 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período chuvoso do 7º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- jan-26 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 8º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- mar-26 ● Protocolo do Relatório do monitoramento do inventário de Flora Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 8º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- set-26 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período chuvoso do 8º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- jan-27 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 9º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- mar-27 ● Protocolo do Relatório do monitoramento do inventário de Flora Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 9º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- set-27 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período chuvoso do 9º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- jan-28 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 10º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- mar-28 ● Protocolo do Relatório do monitoramento do inventário de Flora Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período seco do 10º Ciclo de monitoramento na CT-Bio
- set-28 ● Protocolo do Relatório do Monitoramento de Fauna Terrestre na Área Ambiental 1 referente ao período chuvoso do 10º Ciclo de monitoramento na CT-Bio

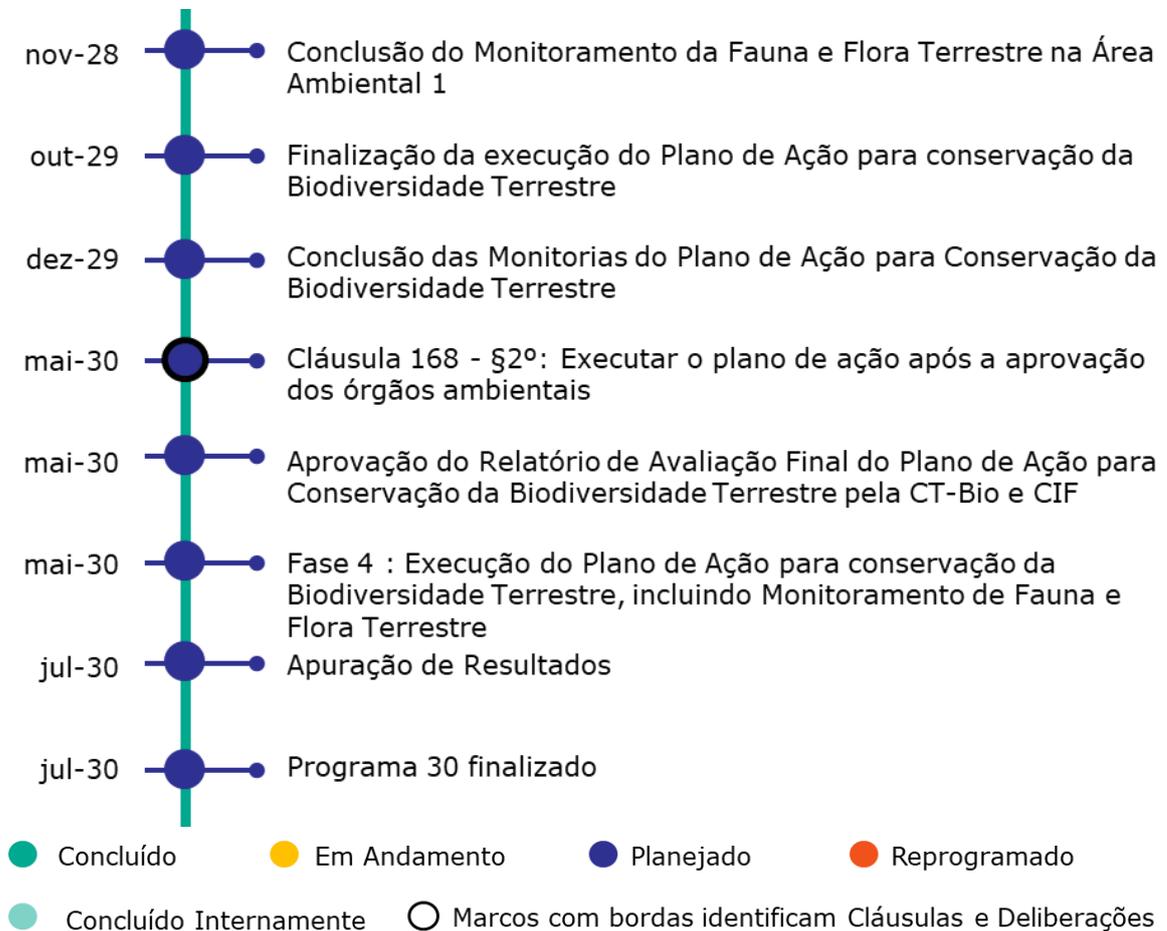

Entregas e fatos relevantes do mês

- Em 19/08/2019, foi realizado alinhamento com representantes do IBAMA e da Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CT-Bio) sobre a execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, com apresentação e alinhamento quanto à estratégia de definição das premissas para a execução das ações da Fase I do plano e elaboração do orçamento (Fonte: P30-APR-001-00_Apresentação Plano de Ação_190819);
- O protocolo do Relatório Consolidado do Monitoramento de Flora Terrestre, referente aos dados da campanha de monitoramento da avaliação ecológica rápida, realizada em período seco no ano de 2018, planejado para julho, foi reprogramado para outubro de 2019, devido à solicitação da CT-Bio em se alterar a metodologia de avaliação dos dados conforme discutida no *Workshop* realizado em julho.

Próximas entregas

- Conclusão do processo interno de contratação de fornecedores para a continuidade do monitoramento de fauna terrestre na Área Ambiental 1, em atendimento à Notificação IBAMA nº 678322-E. Esta entrega refere-se ao Marco "Fornecedor para a continuidade do Monitoramento de Fauna terrestre contratado";
- Conclusão do processo interno de contratação de fornecedores para a continuidade do monitoramento de flora terrestre na Área Ambiental 1, em atendimento à Notificação IBAMA nº 678322-E. Esta entrega refere-se ao Marco "Fornecedor para a continuidade do Monitoramento de Flora terrestre contratado".

Desafios

- A execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, devido à complexidade e volume das ações propostas, número de interfaces e envolvidos na implementação.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo


O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do TTAC e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do CONDOESTE (consórcio de Espírito Santo de Resíduos Sólidos), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: Cláusula 169 – Em andamento dentro do prazo; Cláusula 170 - Em andamento dentro do prazo; Cláusula 232 - Em andamento dentro do prazo.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 75 e 122 – Concluídas internamente.

Marcos do Programa

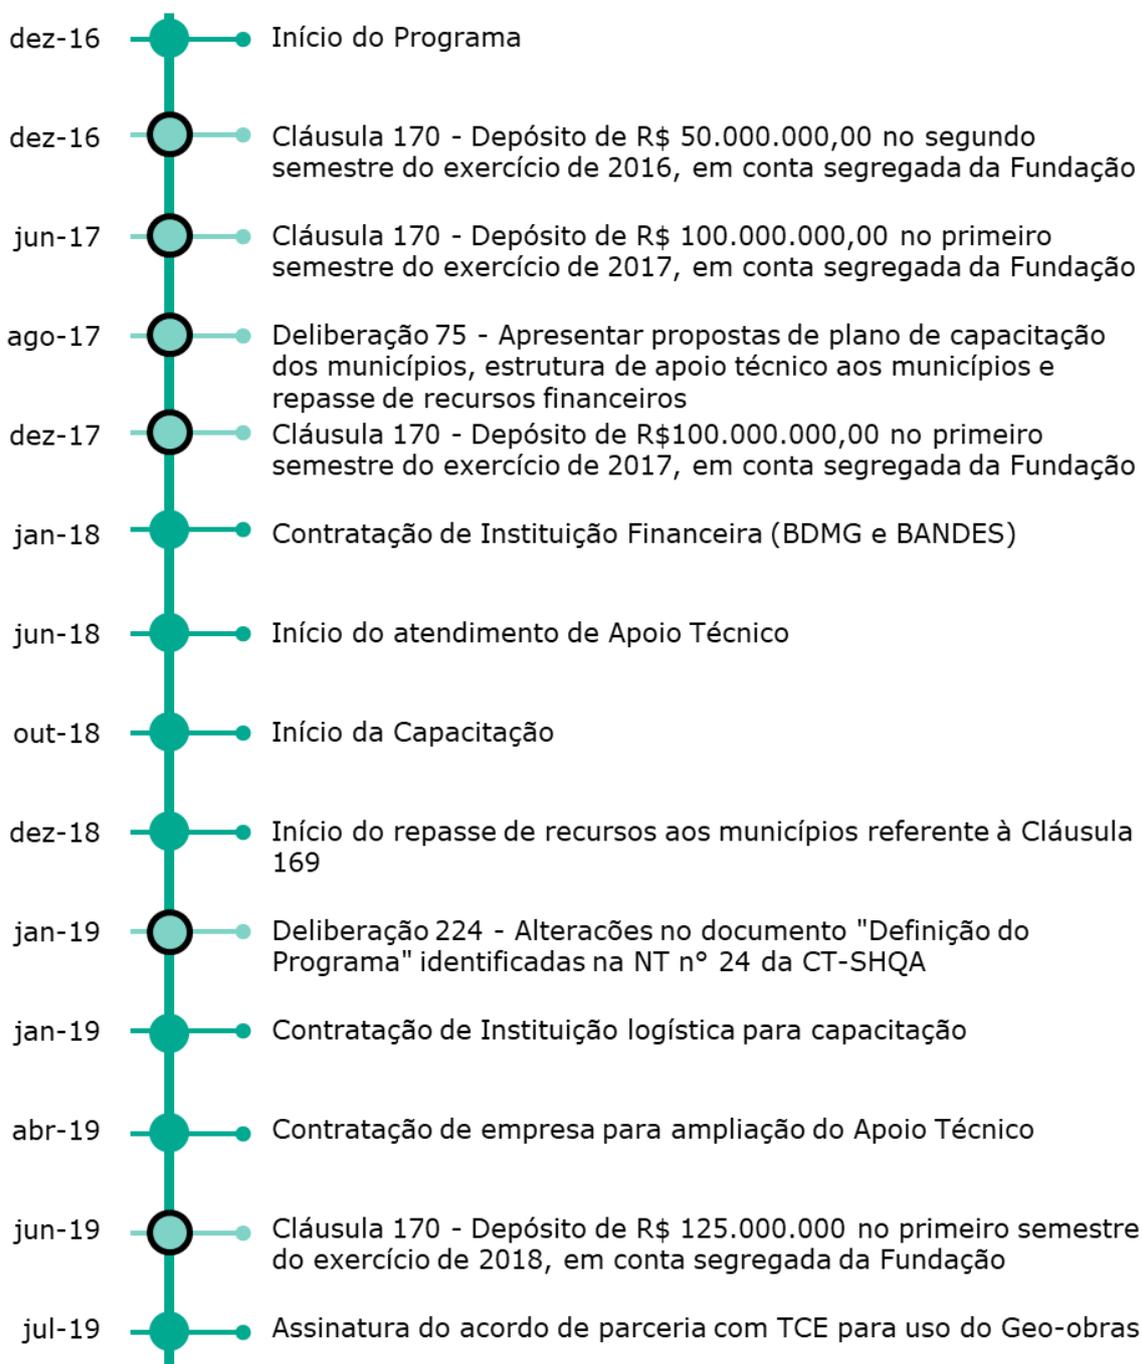

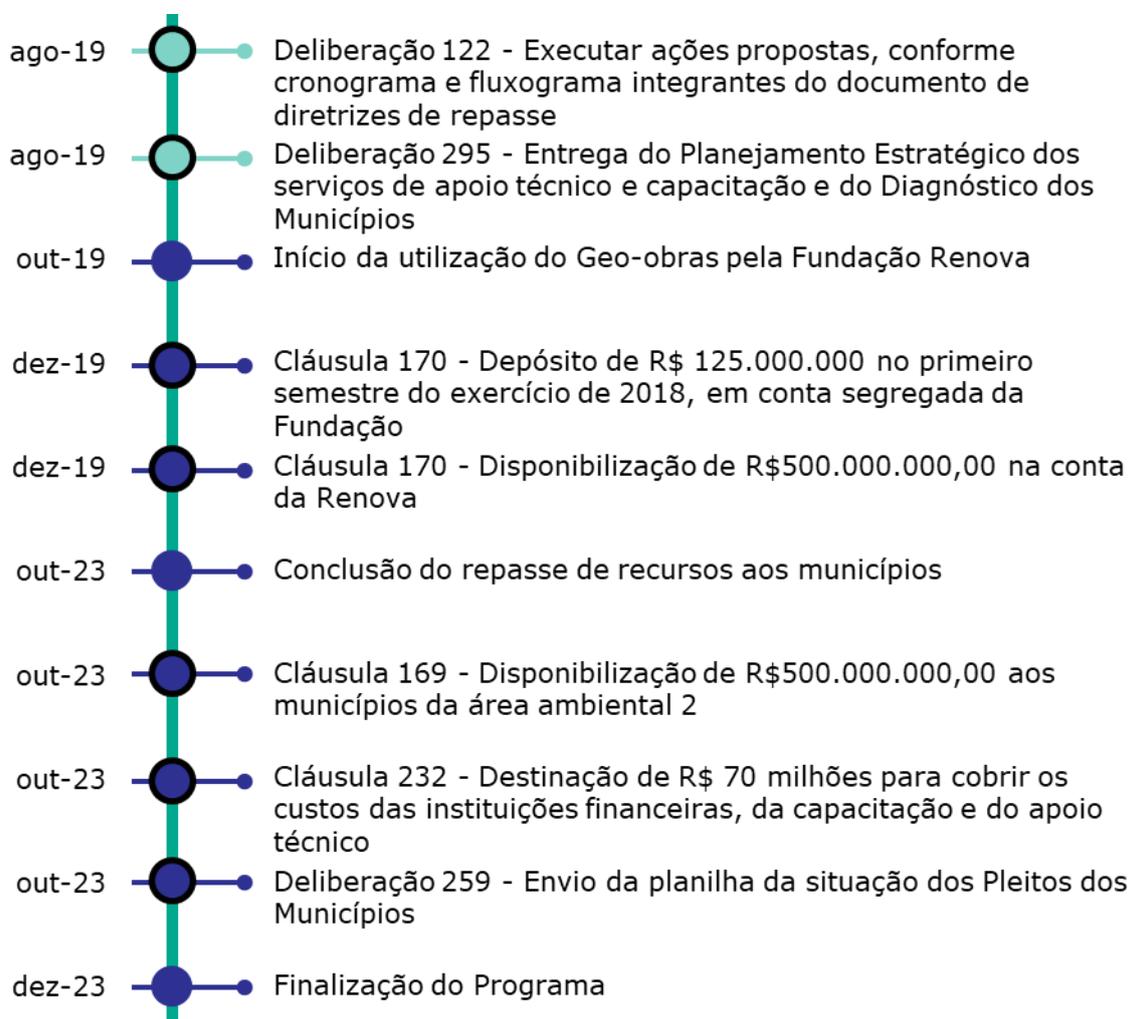

- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Em 31/07/2019, foi firmado o Termo de parceria entre TCE Espírito Santo, Fundação Renova e Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo para uso do Geobras. (Fonte: P31-TCP-001-00 – Termo de Cooperação_190731);
- Em 02/08/2019, foi protocolado ofício à CTSHQA referente à entrega do Planejamento Estratégico dos serviços de apoio técnico e capacitação a serem prestados junto aos Municípios, considerando o adequado dimensionamento das equipes e seu alinhamento com as demandas municipais e com as especificidades do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos. (Fonte: P31-OFI-001-00 – OFI.NII.072019.7123-02 - Atendimento à deliberação 295 - Diagnóstico e Planejamento Estratégico_190802);
- Em 02/08/2019, foi protocolado ofício à CTSHQA referente à entrega do Diagnóstico dos Municípios, considerando que o mesmo é essencial para a avaliação do Planejamento Estratégico entregue. (Fonte: P31-OFI-001-00 – OFI.NII.072019.7123-02 - Atendimento à deliberação 295 - Diagnóstico e Planejamento Estratégico_190802).
- Em 05/08/2019, foram repassados R\$ 329.078,07 ao município de Colatina pela 1ª e 2ª medição da obra da ETE Barbados. (Fonte: P31-CPR-004-00_COLESOB26-Colatina – Primeira e Segunda medição da obra_190805);

Próximas entregas

- Alinhar estratégias das ações de execução do programa junto às prefeituras dos municípios de Minas Gerais entre os dias 16 e 20 de setembro.

- Alinhar estratégias das ações de execução do programa junto às prefeituras dos municípios de Espírito Santo entre os dias 9 e 13 de setembro;
- Entregar o Manual das Oficinas de Capacitação para os Municípios contendo calendário, programação e como indicar os representantes de cada município para que estes possam se organizar para participar das oficinas;
- Divulgar o Manual de Atividades de Apoio Técnico para Fundação Renova, Apoio Técnico e Municípios, com o objetivo de estabelecer e tornar transparente as possibilidades e limites de atuação do Apoio Técnico da Fundação Renova junto aos Municípios e outros atores envolvidos.

Desafios

- Conciliar as expectativas dos municípios com os prazos dos processos de aprovação dos pleitos na CTSHQA e deliberação do CIF;
- Suportar o Apoio Técnico na execução das ações dos municípios dentro do prazo pactuado com a Fundação Renova, CTSHQA e bancos;
- Melhorar a qualidade das entregas dos municípios aos bancos por meio do Apoio Técnico, visando minimizar a necessidade de revisões e adequações solicitadas e o atraso dos repasses planejados;
- Estabelecer processos com as Instituições Financeiras, BDMG e BANDES, que garantam a qualidade das avaliações técnicas dos projetos dos municípios, medições das obras dos municípios e outros itens analisados;
- Contrato entre a Fundação Renova e a Instituição Financeira - BDMG.

Indicadores/Grandes Números

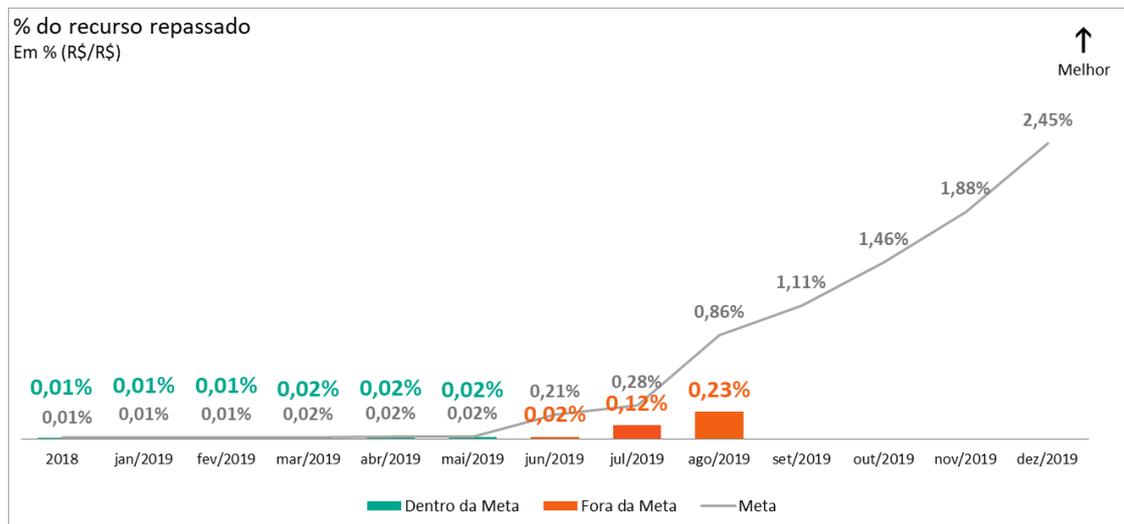


Gráfico 18. Percentual do recurso repassado. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-012-00_Controle Gerencial Renova_190906; P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_190906

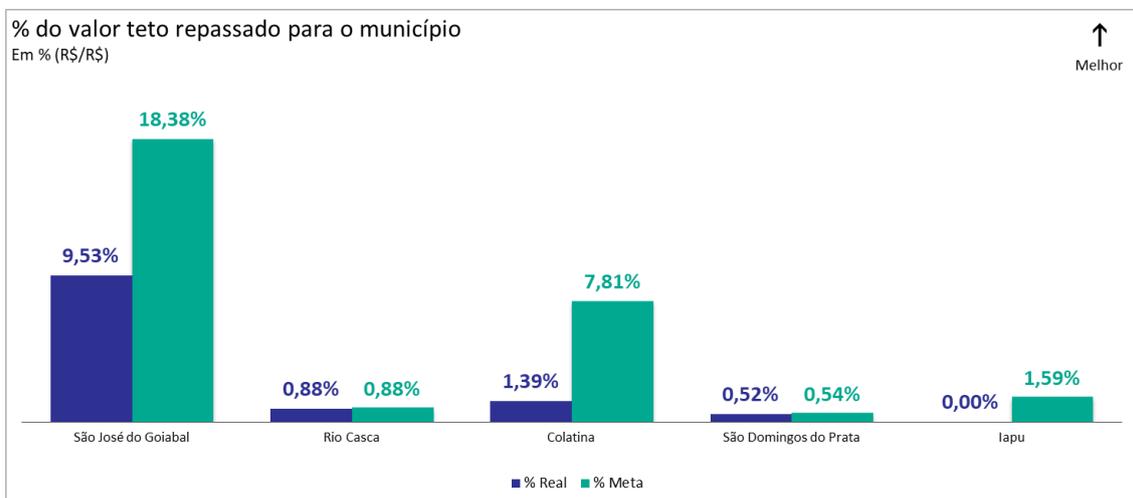


Gráfico 19 Percentual do valor teto repassado para o município. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-012-00_Controle Gerencial Renova_190906; P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_190906

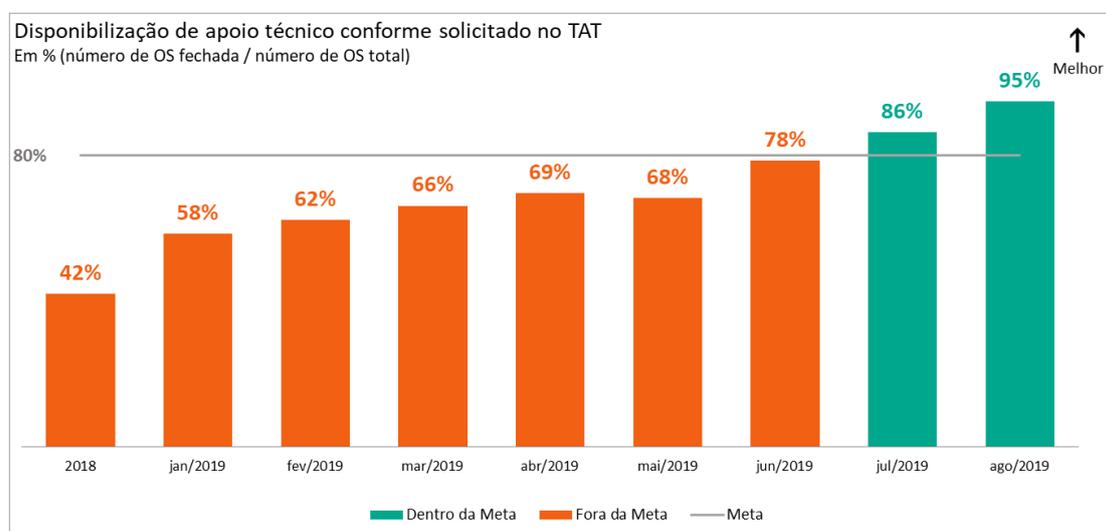


Gráfico 20 Disponibilidade de apoio técnico conforme solicitado no TAT. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-014-00_Apoio Tecnico_V3_190906

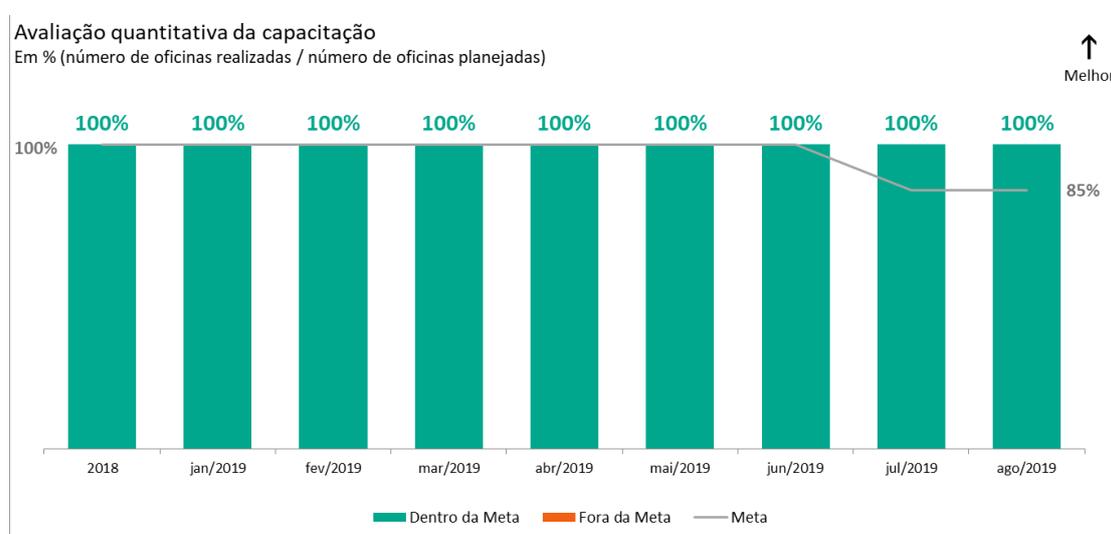


Gráfico 21 Avaliação quantitativa da capacitação. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-015-00_Capacitação_V3_190805

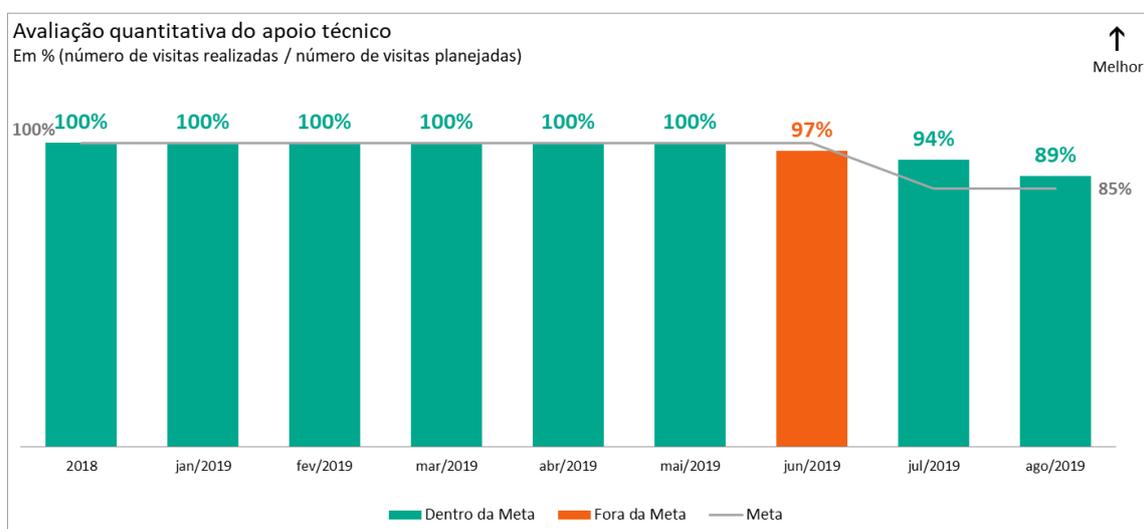


Gráfico 22 Avaliação quantitativa do apoio técnico. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-014-00_Apoio Tecnico_V3_190906

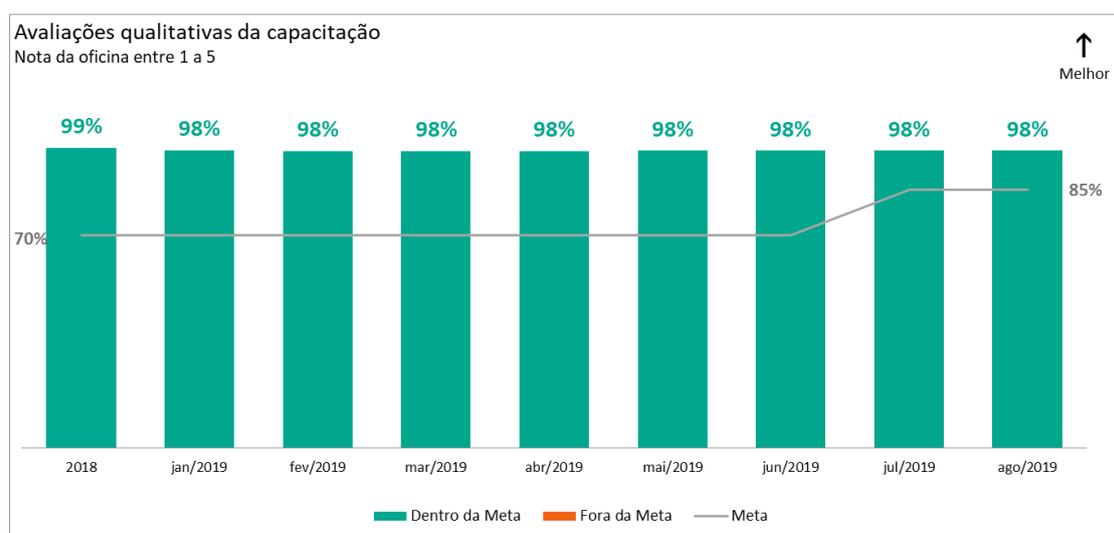


Gráfico 23 Avaliações qualitativas da capacitação. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-015-00_Capacitação_V3_190805

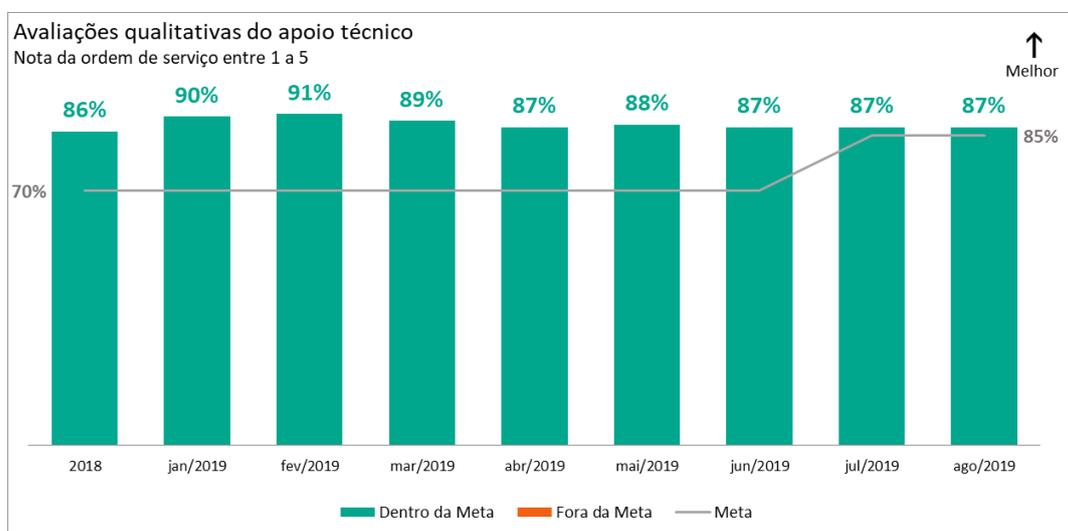


Gráfico 24 Avaliações qualitativas do apoio técnico. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-014-00_Apoio Tecnico_V3_190906

Ainda estão pendentes a entrega de avaliações qualitativas dos municípios Aimorés, Alpercata, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dionísio, Galiléia, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Linhares, Mariana, Marliéria, Naque, Periquito, Pingo d'água, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santo Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Pedro dos Ferros, Sobrália e Tumiritinga. Por isso, o resultado do indicador pode mudar à medida que o programa receber as avaliações das ordens de serviço antigas (anteriores ao período atual).

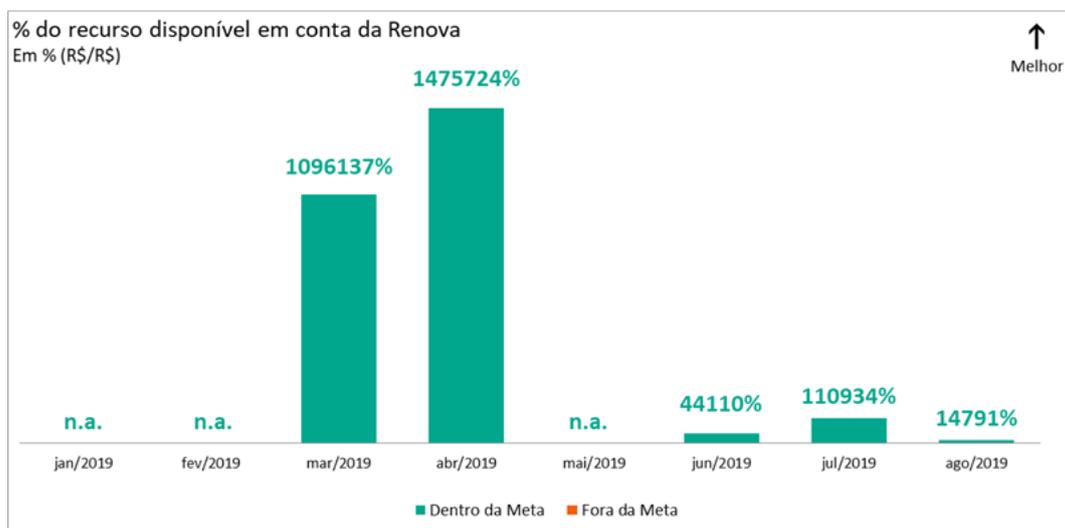


Gráfico 25 % do recurso disponível em conta da Renova. (agosto/2019). Fonte: P31-BDD-0013-00_Gestão Pleitos_V2_190906; P31-BDD-016-00_Saldo Conta Renova _190906

O indicador não é mensurável (n.a.) nos meses em que não foi planejado repasse de recurso, visto que a divisão do saldo da conta segregada do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos pelo valor planejado de repasse igual a zero é uma indeterminação.

Os indicadores e suas metas foram propostos pela Fundação Renova na Definição do Programa e foram revisados no Planejamento Estratégico, que foi entregue em agosto de 2019 à CTSHQA.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo


Construção, utilizando a tecnologia adequada, de sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as localidades que captam diretamente da calha do rio Doce, cuja operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente em decorrência do rompimento da barragem.

Cláusulas do TTAC: 171 – Em andamento

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberações 4, 10, 16, 98, 123, 124 – Concluídas Internamente; Deliberação 33 – Em atendimento; Deliberações 185 e 308 – A iniciar; Deliberação 258 – Atrasada;

Marcos do Programa

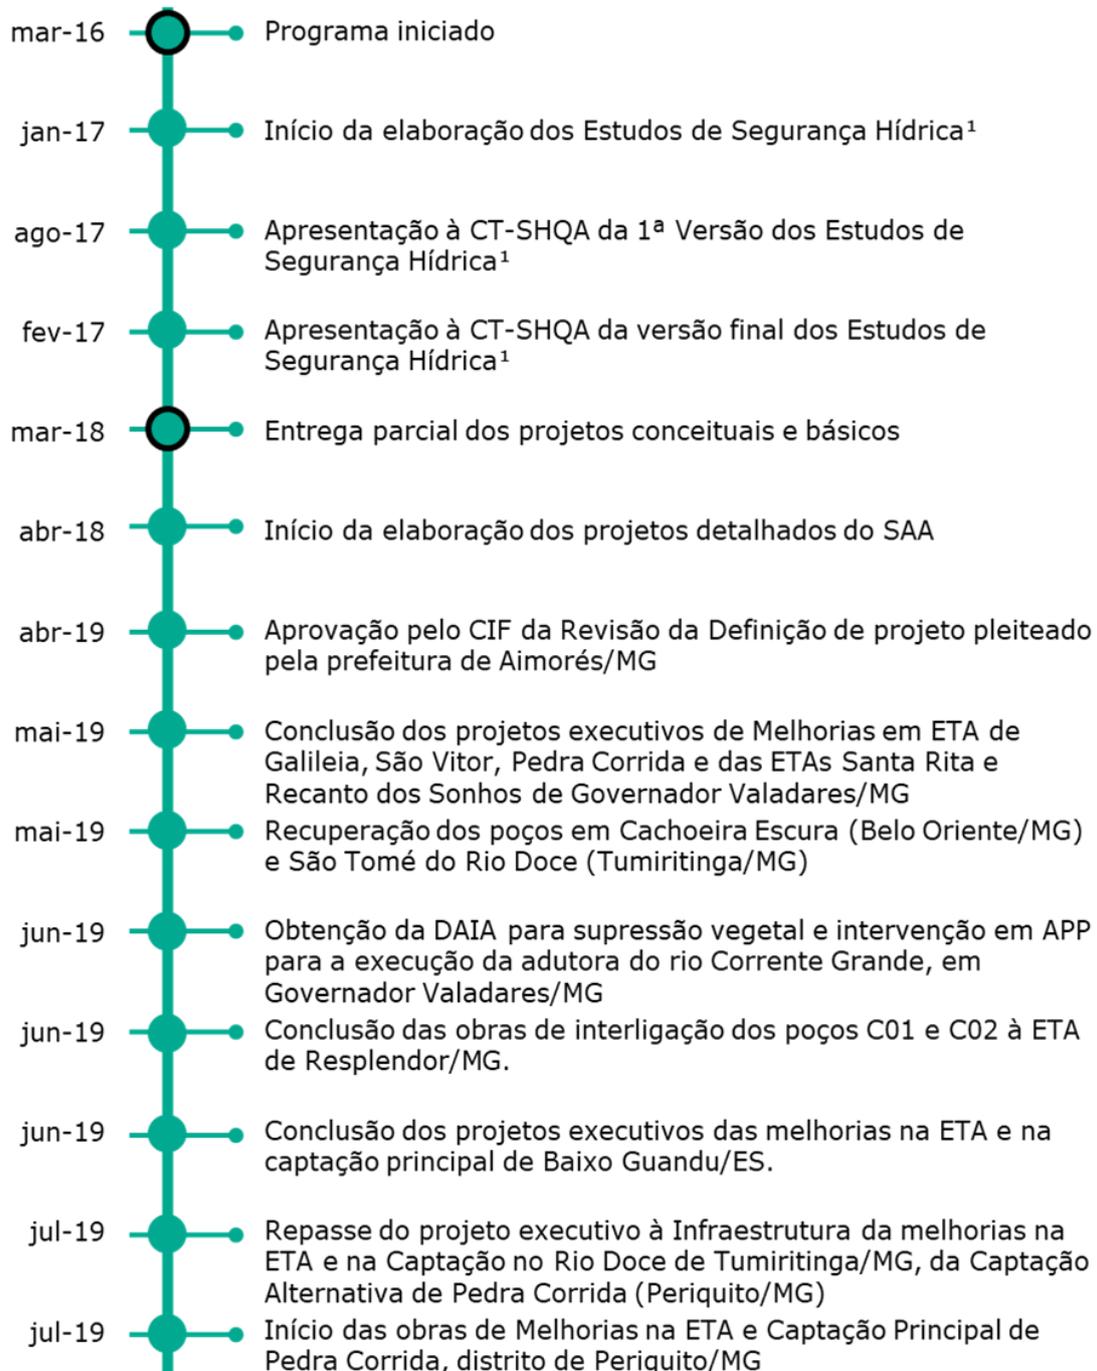

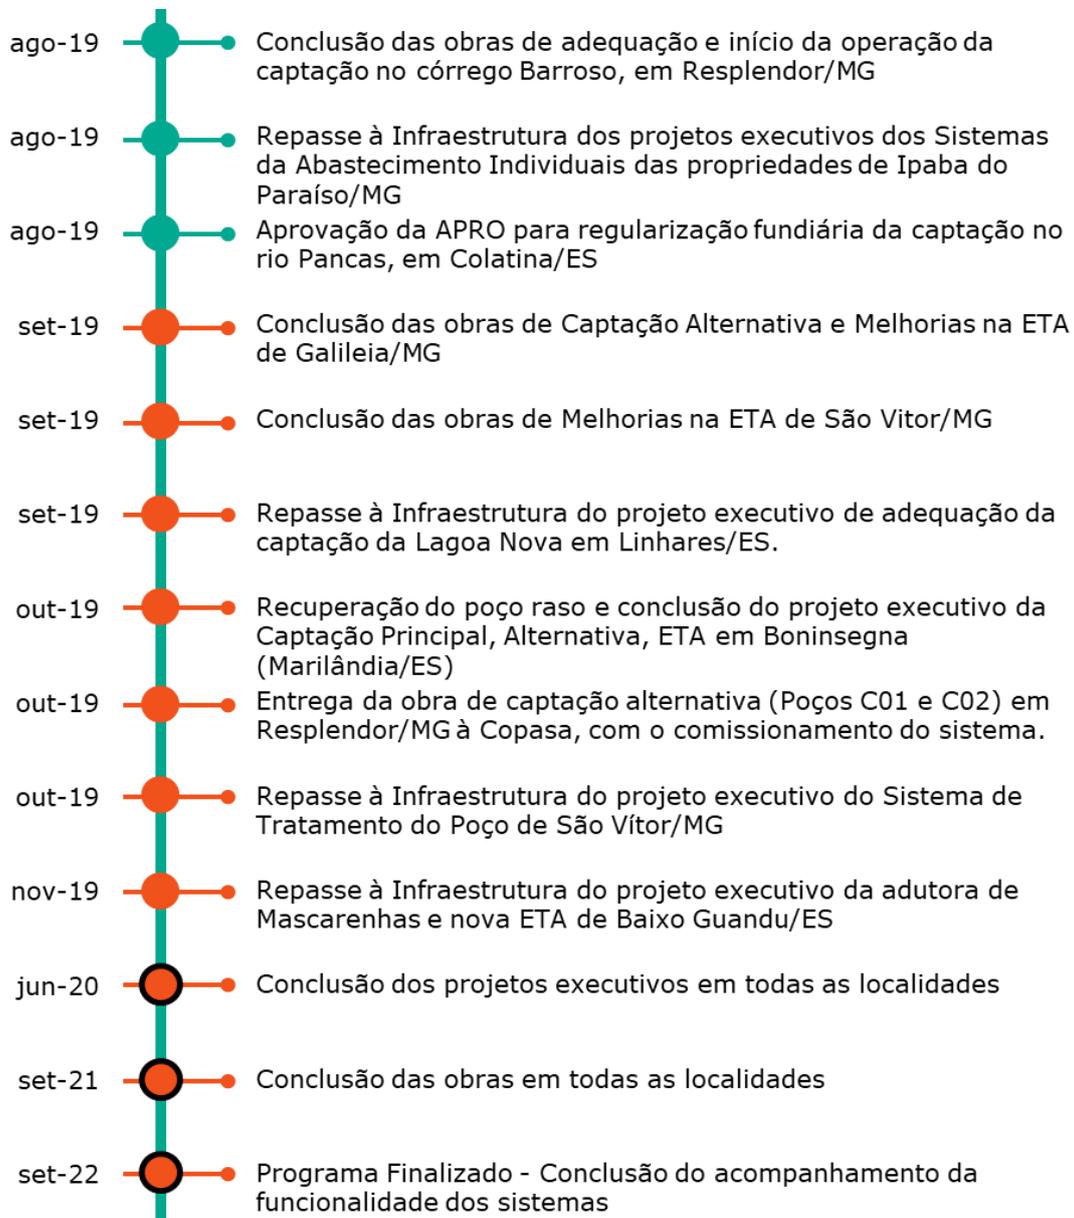

¹Estudo de Segurança Hídrica: "Estudos de capacidade de mananciais superficiais e subterrâneos, visando a construção de sistemas alternativos de abastecimento de água".

- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Aprovação da APRO para regularização fundiária da área utilizada para instalação da adutora e estação elevatória da captação de água no rio Pancas, solução de captação alternativa em Colatina/ES;
- Conclusão dos projetos detalhados dos Sistemas Individuais de Abastecimento de Água de Ipaba do Paraíso, distrito de Santana do Paraíso/MG;
- Conclusão das obras de adequação e início da operação da captação no córrego Barroso, em Resplendor/MG. A entrega irá reduzir a dependência do município do fornecimento de água por caminhão pipa;
- Execução das obras de pavimentação e melhorias nas ETAs Recanto dos Sonhos e de São Vítor, em Governador Valadares/MG e na ETA de Pedra Corrida, em Periquito/MG;
- Montagem eletromecânica e instalação das balsas de captação no rio Doce em Galileia/MG;
- Escavação do trecho sob a BR-381 (*Tunnel Liner*) da adutora da captação de água no rio Corrente Grande, em Governador Valadares/MG.

Próximas entregas

- Concluir as obras de Melhorias na ETA de São Vitor/MG, até setembro/19;
- Concluir as obras da Captação Alternativa e Melhorias na ETA de Galileia/MG, até setembro/19;

- Repassar à Infraestrutura do projeto executivo de adequação da captação da Lagoa Nova em Linhares/ES, até setembro/19;
- Realizar o comissionamento dos poços C01 e C02 de Resplendor/MG, concluindo a entrega da solução de captação alternativa do município, até outubro/19;
- Elaborar a APRO para recuperação do poço e elaboração do projeto executivo da Captação Principal, Captação Alternativa e ETA de Boninsegna (Marilândia/ES), até outubro/19;
- Concluir o projeto executivo do Sistema de Tratamento do Poço de São Vítor, distrito de Governador Valadares/MG, até outubro/19;
- Concluir os projetos executivos da adutora de água tratada de Mascarenhas (distrito de Baixo Guandu/ES) e da nova ETA de Baixo Guandu/ES, até novembro/19;
- Entregar os projetos básicos dos Sistemas de Abastecimento de Água das localidades atendidas pelo programa, em atendimento ao item 2 da deliberação CIF nº 308/2019, até dezembro/19.

Desafios

- Retomar a captação no Rio Doce para utilização como abastecimento ainda não realizada devido à resistência por parte do poder público municipal e das comunidades - nas localidades onde essa era a principal fonte de água para abastecimento público;

- Obter aprovação da solução de abastecimento de água proposta para Alpercata/MG;
- Estabelecer alternativas de abastecimento público para Resplendor/MG;
- Reduzir a dependência do fornecimento de água por caminhões pipa dos municípios.

Indicadores/Grandes Números

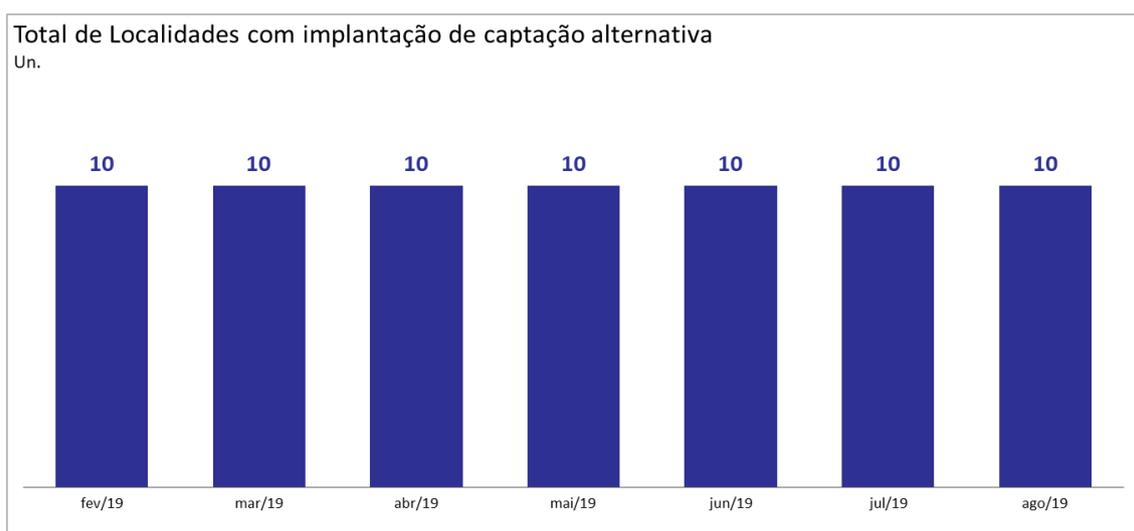


Gráfico 26. Total de localidades com implantação de captação alternativa. (agosto/2019).

O indicador de implantação de captação alternativa considera as obras realizadas em Gesteira (distrito de Barra Longa/MG), Cachoeira Escura (distrito de Belo Oriente/MG), Pedra Corrida (distrito de Periquito/MG), São Vitor (distrito de Governador Valadares/MG), Galileia/MG, São Tomé do Rio Doce (distrito de Tumiritinga/MG), Itueta/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES e Linhares/ES.

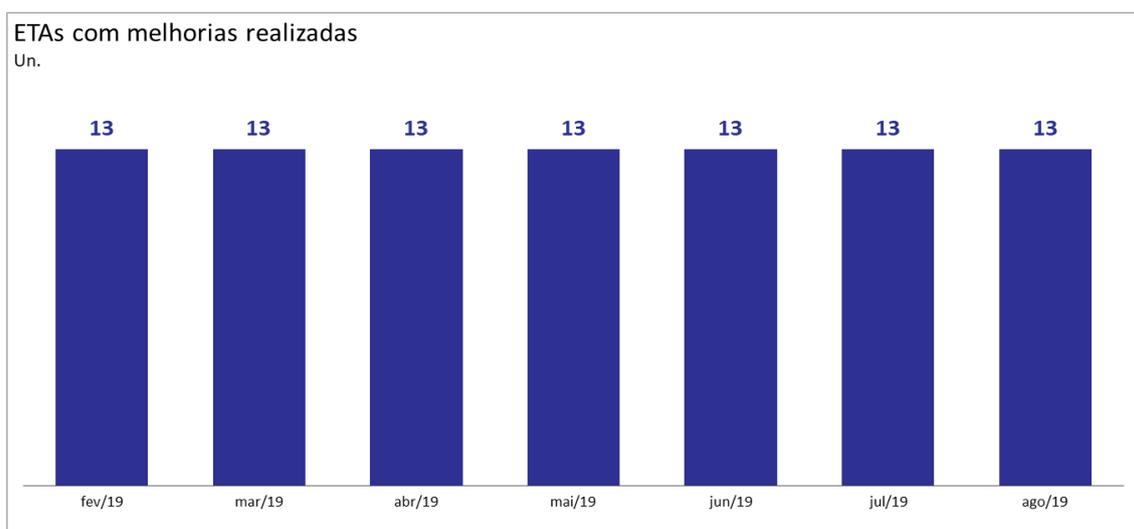


Gráfico 27. ETAs com melhorias realizadas. (Agosto/2019). Fonte: P32-BDD-002-00_BD Indicadores CIF_190905.xlsx

O indicador de melhorias em ETAs realizadas considera obras realizadas em Galileia/MG (1), Regência/MG (1) Colatina/ES (3), São Tomé do Rio Doce (distrito de Tumiritinga/MG) (1), Governador Valadares/MG (Sede - 4 e São Vitor - 1) (5), Cachoeira Escura (distrito de Belo Oriente/MG) (1) e Gesteira (distrito de Barra Longa/MG) (1).

Fotos



Foto relacionada à: pavimentação do acesso à ETA Recanto dos Sonhos em Governador Valadares/MG – Agosto/2019.



Foto relacionada à: instalação das balsas da captação no rio Doce em Galileia/MG – Agosto/2019.



Foto relacionada ao: sistema de captação de água no córrego Barroso, em Resplendor/MG – Agosto/2019.



Foto relacionada às: obras de melhoria na ETA de Pedra Corrida/MG – Agosto/2019.



Foto relacionada à: escavação do Tunnel Liner da adutora de Governador Valadares/MG – Agosto/2019.



Foto relacionada à: montagem da balsa para captação em São Vítor, distrito de Governador Valadares/MG – Agosto/2019.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.


Cláusulas do TTAC: 172 – Em andamento.


Deliberações: 136, 240 – Em andamento; 288 – Concluída internamente.


Marcos do Programa

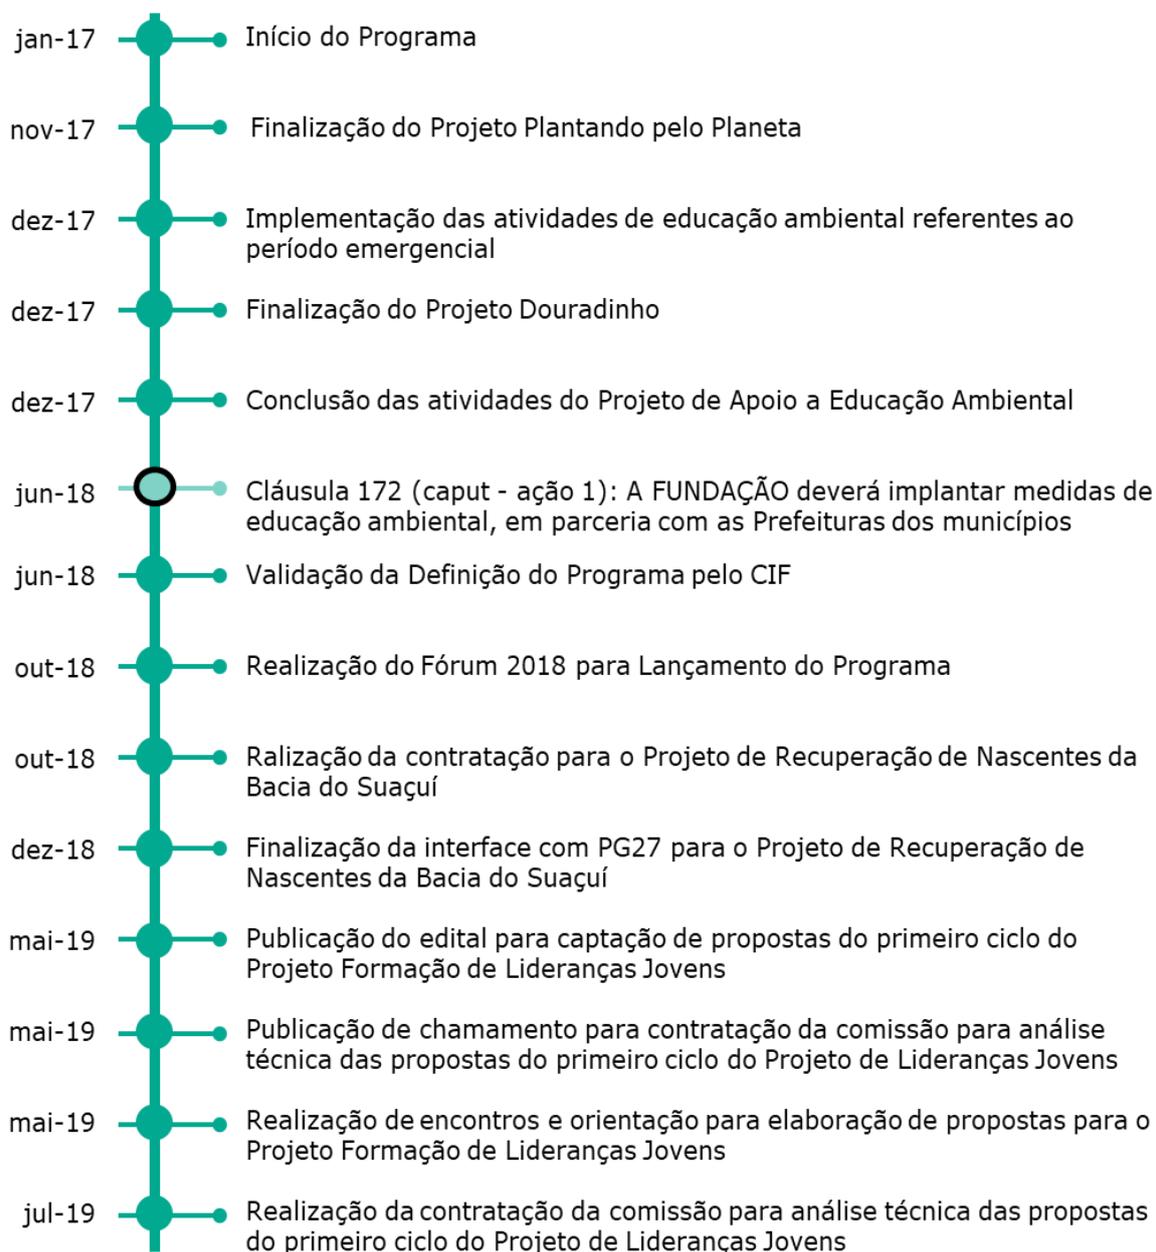

- jul-19  Deliberação 288: Atualização do Programa de Educação para a Revitalização da Bacia do Rio Doce e apresentação de Relatório detalhado das ações do Programa, com prazos e custos
- set-19  Elaboração do Plano de trabalho com parceria UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores
- set-19  Seleção das instituições parceiras para realização do primeiro ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
- dez-19  Assinatura do Termo de Parceria para realização de curso técnico em agroecologia e restauração florestal
- dez-19  Deliberação 240: Referente à NT 18/2018 relacionada à concessão de bolsas de estudos para professores participantes do Curso de Formação de Educadores, cujo valor unitário e procedimentos deverão ser definidos pela Fundação Renova e CT até 31/01/2019
- jan-20  Assinatura do Termo de Parceria para realização do primeiro ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
- fev-20  Oficialização da contratação de funcionários, e estrutura do escritório das Instituições responsáveis pelo 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
- mar-20  Assinatura do Termo de Parceria com IFES para realização do Projeto de Formação de Educadores
- mar-20  Assinatura do Termo de Parceria com ANPPEA para realização do monitoramento e avaliação técnica do PG033
- abr-20  Assinatura do Termo de Parceria com UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores
- mai-20  Realização do Seminário para apresentação da proposta de Formação dos Educadores às Secretarias Regional e Municipal de Educação
- mai-20  Articulação Institucional do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
- mai-20  Assinatura dos termos de adesão dos municípios referente ao Projeto de Formação de Educadores
- jun-20  Formação dos formadores e tutores do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental do Projeto de Formação de Educadores

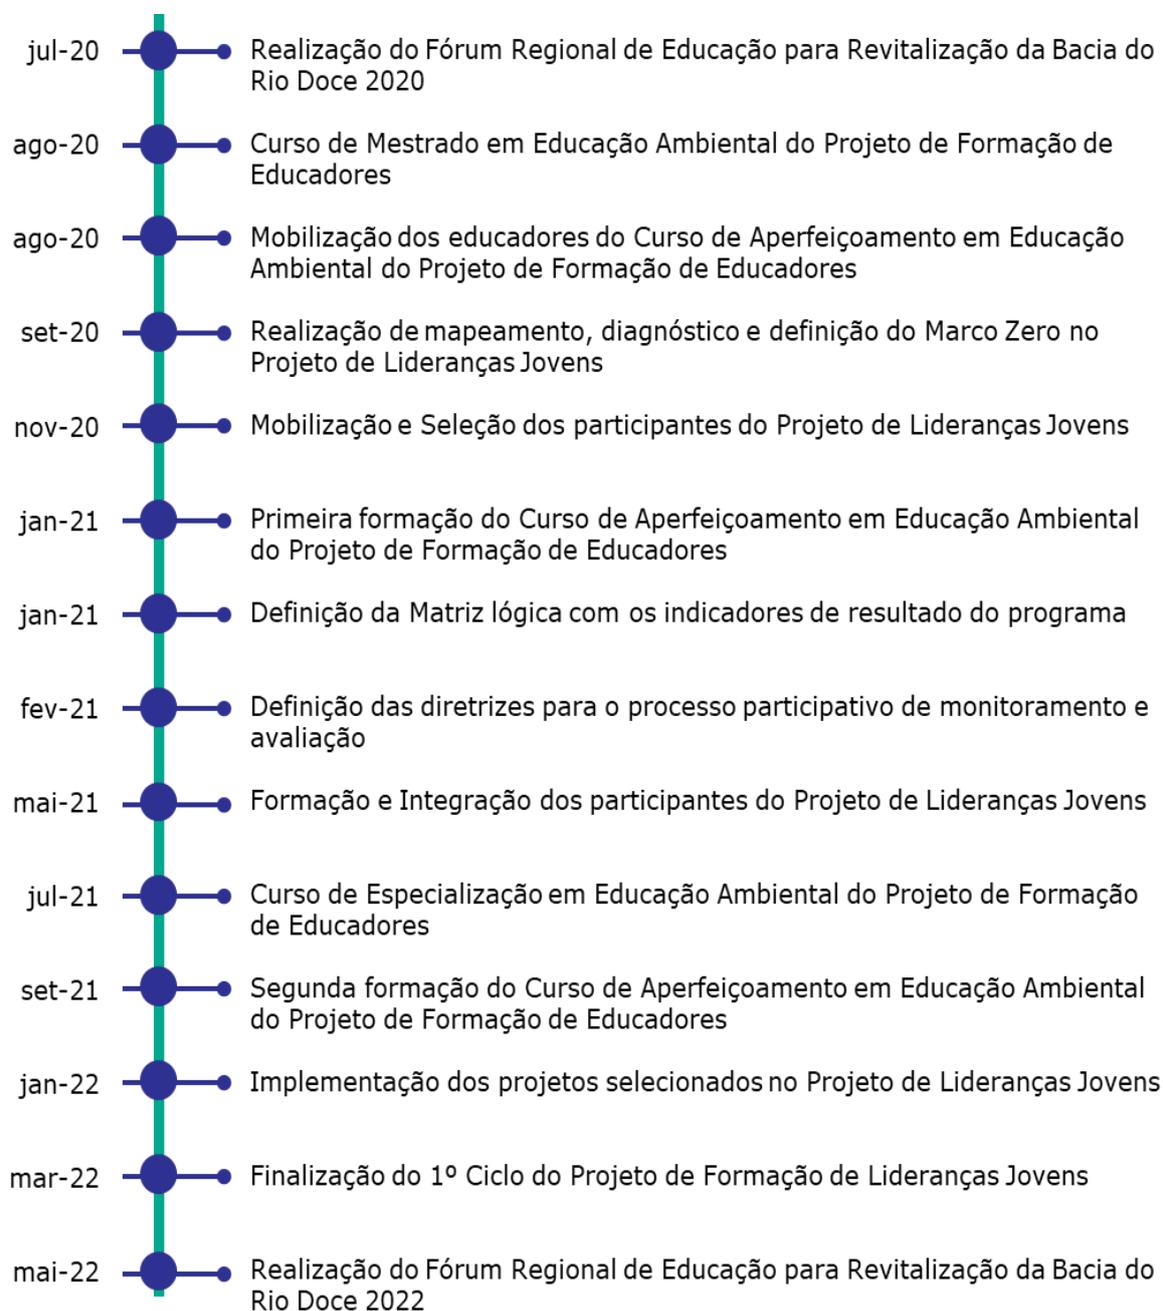

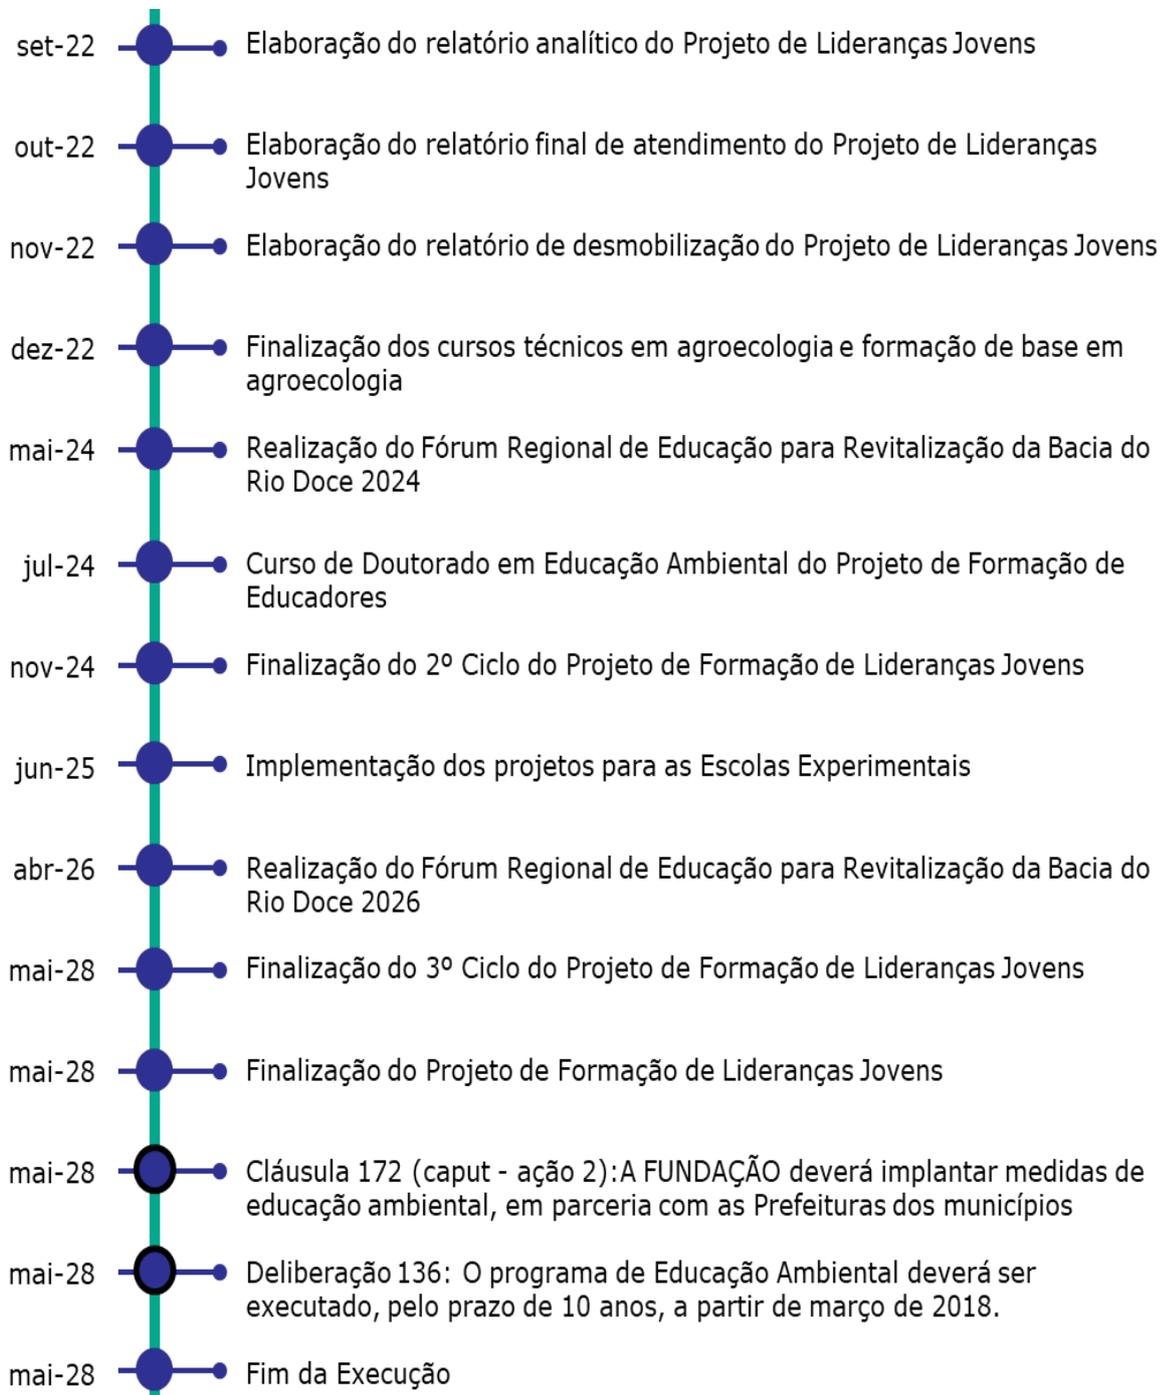

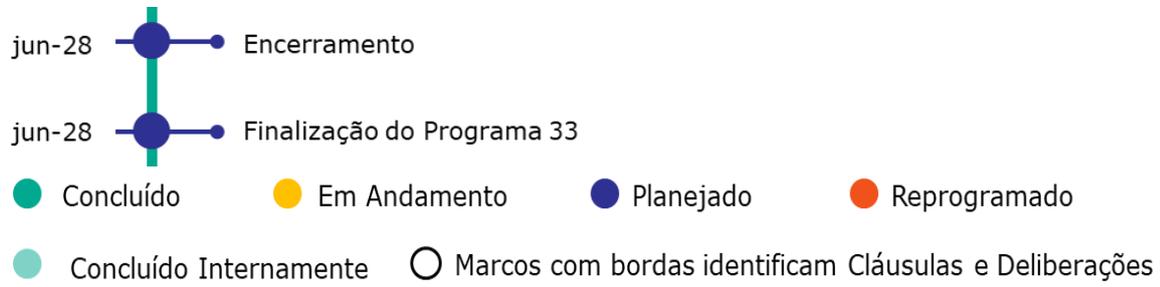

Entregas e fatos relevantes do mês

Definição do Programa:

- Entrega do Relatório em atendimento ao item 2 da Nota Técnica nº 24/2019; Deliberação nº 288 e ata da Reunião Extraordinária realizada entre a Fundação Renova e CT-ECLET (Fonte: Ofício: OFI.NII.072019.7450-01.pdf).

Próximas entregas

Projeto de Formação de Lideranças Jovens:

- Finalizar as avaliações das Propostas Técnicas do Edital de Formação de Lideranças Jovens – 1º Ciclo. Esta entrega refere-se ao Marco “Seleção das instituições parceiras para realização do primeiro ciclo do Projeto de Lideranças Jovens”.

Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais:

- Finalizar o plano de trabalho para estabelecimento de parceria com UFMG/UFOP referente à realização das formações dos professores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais. A finalização desta atividade estava prevista para o mês de Agosto/2019, porém, devido aos trâmites internos das universidades envolvidas, não foi possível concluí-lo. Como contramedida a área está traçando estratégias com estas instituições para garantir o início das formações nos prazos previstos. Esta entrega refere-se ao Marco “Elaboração do Plano de trabalho com parceria UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores”.

Desafios

- Receber os planos de trabalho das universidades (UFMG/UFOP) e institutos federais (IFES) em tempo hábil para compatibilizar as datas para início dos projetos planejadas na Definição do Programa.
- Engajamento dos públicos alvo para participar ativamente dos projetos Formação de Lideranças Jovens, Formação de Educadores e Escolas Experimentais e Fortalecimento de Redes e Políticas Públicas.
- Desenvolvimento de projetos relevantes para as comunidades e aderentes às realidades locais, de modo que possam de fato promover mudanças positivas na comunidade.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC.


Cláusulas do TTAC: 173 - Em andamento.


Deliberações: 128 – Concluída internamente; 303 – Em andamento.

Marcos do Programa

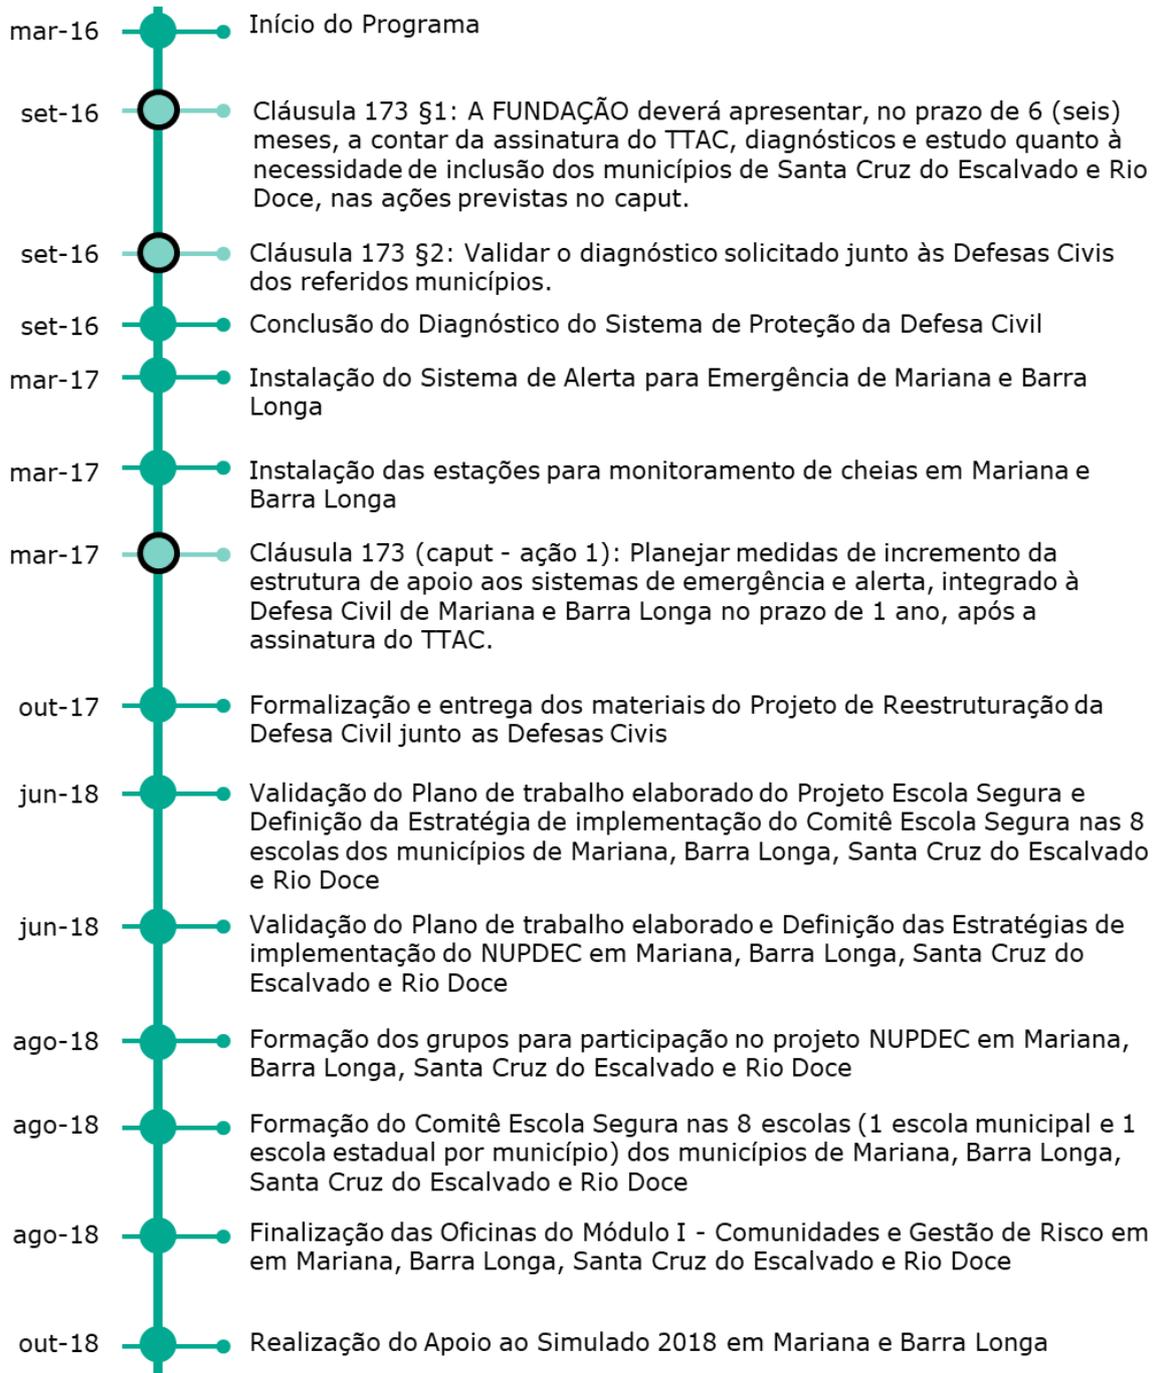

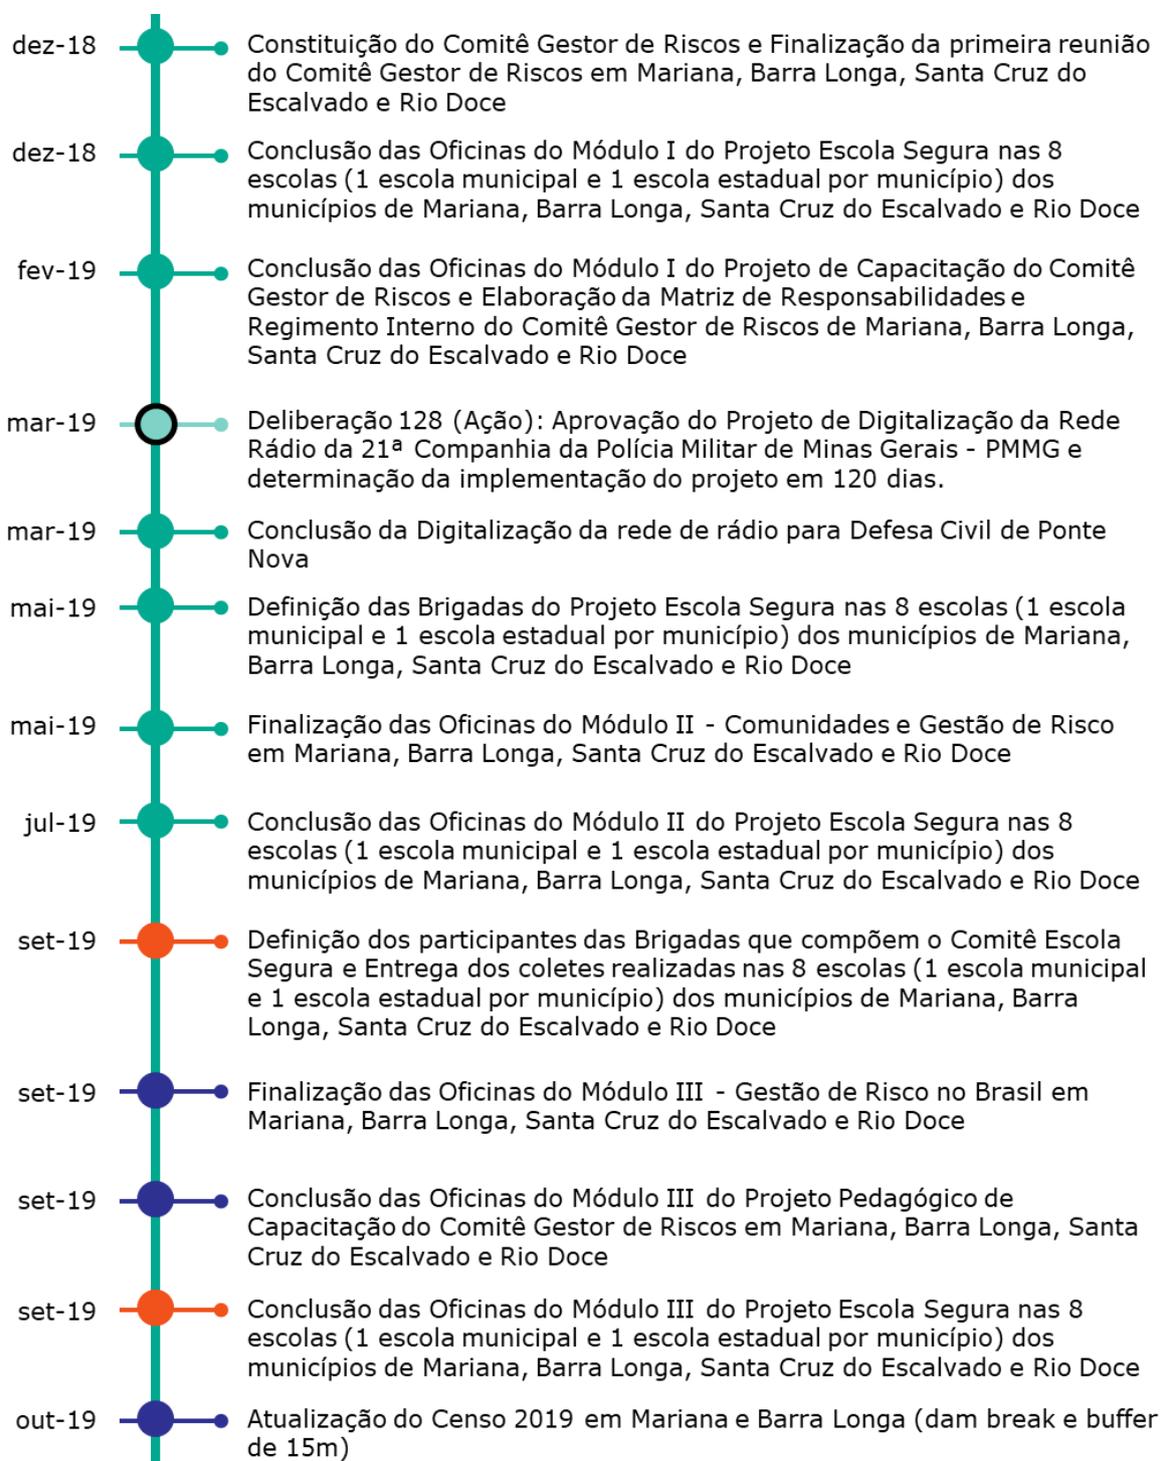

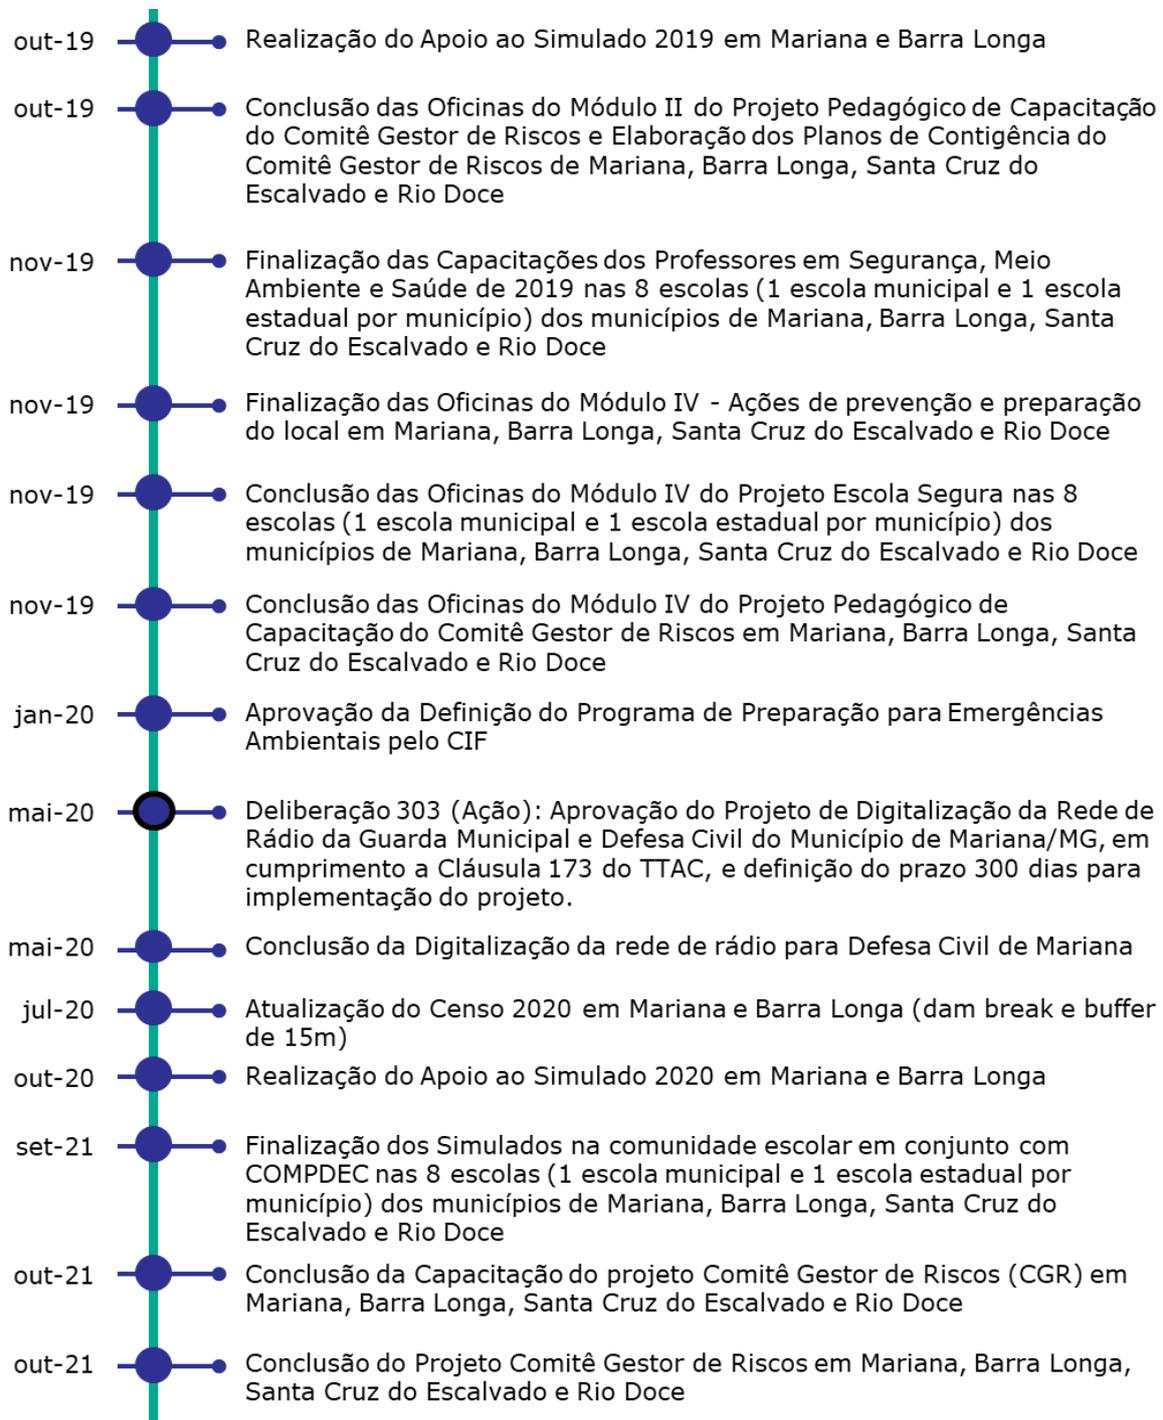

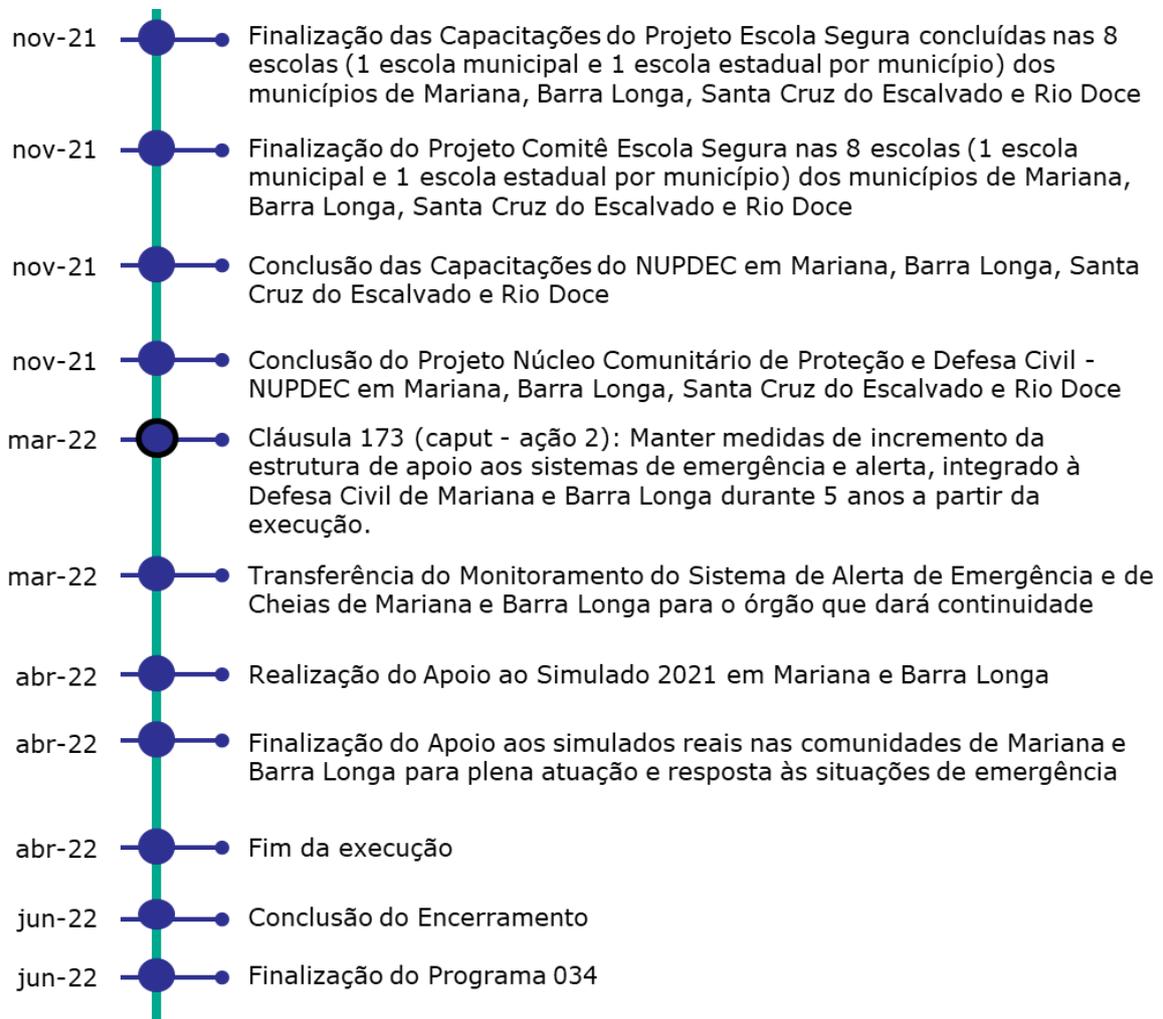

- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

Processo de Apoio a Defesa Civil – Comitê Gestor de Risco:

- Realização da capacitação “Construindo Cidades Mais Resilientes” em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Esse treinamento é a 2º oficina de 3 referentes à Entrega do Módulo III do Projeto Pedagógico para o Comitê Gestor de Risco. (Fonte: CG-BL-190801-RA-PR-M3-CA02-V00.docx; CG-MA-190801-RA-PR-M3-CA02-V00.docx; CG-RD-190731-RA-M3-CA02-V00.docx; CG-SC-190731-RA-M3-CA02-V00.docx).

Processo de Apoio a Defesa Civil – Comitê Escola Segura (CES):

- Realização da capacitação “Especialização das Brigadas: Apoio Psicossocial” em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Esse treinamento é a 1º oficina de 6 referentes à Entrega do Módulo III da Metodologia de Gestão de Risco de Desastres (GRD) para docentes do Comitê Escola Segura (CES). A Entrega deste Módulo III estava prevista para o mês de Agosto/2019, porém, devido à dificuldade de coordenar as agendas das escolas com as capacitações, não foi possível concluí-lo. Como contramedida a área está traçando estratégias com o fornecedor para finalizar o módulo em Setembro/2019 sem impactar a continuidade e os prazos das capacitações seguintes. (Fonte: ES-BL-190731-RA-M3-OF01-CES-EE-V00.pdf; ES-BL-190806-RA-M3-OF01-CES-EM-V00.pdf; ES-MA-190817-RA-M3-OF02-CES-EE-CERT-V00.pdf; ES-RD-190708-RA-M3-OF01-CES-EE-V00.pdf; ES-RD-190708-RA-M3-OF01-CES-EM-V00.pdf; ES-SC-190709-RA-M3-OF01-CES-EE-V00.pdf; ES-SC-190709-RA-M3-OF01-CES-EM-V00.pdf).

- Realização da capacitação dos professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde no tema “Introdução a combate incêndio” em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Esse treinamento é a 2º oficina de 3 referentes à Entrega da Capacitação dos Professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2019. (Fonte: ES-SC-190821-RA-M2-OF-PRO-EEM-CERT-V00.pdf; ES-BL-190815-RA-M3-OF02-CES-EM-CERT-V00.pdf; ES-BL-190816-RA-M3-OF02-CES-EE-CERT-V00.pdf; ES-MA-190629-RA-M3-OF01-CES-EE-V00.pdf; ES-MA-190710-RA-M3-OF01-CES-EM-V00.pdf; ES-MA-190814-RA-M3-OF01-PII-CES-EM-CERT-V00.pdf; ES-RD-190812-RA-M3-OF02-CES-EE-CERT-V00.pdf; ES-RD-190812-RA-M3-OF02-CES-EM-CERT-V00.pdf; ES-SC-190822-RA-M3-OF02-CES-EE-CERT-V00.pdf).

Processo de Apoio a Defesa Civil – Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC):

- Realização da capacitação “Práticas em Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Combate à Incêndio” no NUPDEC de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Esse treinamento é a 2º oficina de 4 referentes à Entrega do Módulo III de Gestão de Risco no Brasil do Programa de Qualificação do NUPDEC em conjunto com a COMPDEC. (Fonte: NU-BL-190816-RA-M3-OF03-CERT-V00.pdf; NU-MA-190818-RA-M3-OF03-CERT-V00.pdf; NU-RD-190820-RA-M3-OF03-CERT-V00.pdf; NU-SC-190822-RA-M3-OF03-CERT-V00.pdf).

Próximas entregas

Processo de Apoio a Defesa Civil – Comitê Gestor de Risco:

- Realizar a entrega dos coletes para as Brigadas do Comitê Escola Segura nas 8 escolas dos municípios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Essa ação tem como objetivo garantir a correta identificação das Brigadas nos simulados que serão realizados. Esta entrega refere-se ao Marco “Definição das Brigadas que compõe o Comitê Escola Segura e Entrega dos coletes realizadas nas 8 escolas (1 escola municipal e 1 escola estadual por município) dos municípios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce”.
- Finalizar as Oficinas do Módulo III da Capacitação do NUPDEC. As oficinas têm por objetivo preparar o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil de cada município para tomar estratégias adequadas no combate aos riscos em situações de desastres. Esta entrega refere-se ao Marco “Finalização das Oficinas do Módulo III - Gestão de Risco no Brasil de Capacitação do NUPDEC em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce”.
- Finalizar as Oficinas do Módulo III do Projeto Pedagógico de Capacitação do Comitê Gestor de Riscos. As oficinas têm por objetivo preparar o Comitê Gestor de Riscos de cada município para tomar estratégias adequadas no combate aos riscos em situações de desastres. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das Oficinas do Módulo III do Projeto Pedagógico de Capacitação do Comitê Gestor de Riscos em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce”.
- Finalizar as Oficinas do Módulo III do Projeto Escola Segura. As oficinas têm por objetivo preparar o Comitê Escola Segura de cada unidade de ensino em que o projeto foi implementado para tomar estratégias adequadas no combate aos riscos

em situações de desastres. Esta entrega refere-se ao Marco “Conclusão das Oficinas do Módulo III do Projeto Escola Segura nas 8 escolas (1 escola municipal e 1 escola estadual por município) dos municípios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce”.

Desafios

- Garantir o alinhamento dos objetivos e entregas do programa entre Fundação Renova, Defesa Civil e Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental para aprovação da Definição do Programa.
- Conciliar a programação de capacitações do Projeto Escola Segura com a agenda e disponibilidade das escolas tendo em vista o atraso das oficinas do Módulo III.
- Garantir o cumprimento das agendas do Projeto Escola Segura, Projeto de Gestão de Riscos e NUPDEC tendo em vista os impactos das manifestações ocorridas nos municípios.
- Manter o engajamento da comunidade e público alvo com as atividades previstas do Projeto Escola Segura, Projeto de Gestão de Riscos e NUPDEC.
- Garantir a participação efetiva da Defesa Civil nas atividades previstas em Barra Longa e Santa Cruz do Escalvado.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Implantar um Centro de Informações Técnicas (CIT) da Área Ambiental 1 em Mariana, bem como, um CIT em Minas Gerais na cidade de Governador Valadares e um em Linhares, ES. Essas estruturas, são destinadas a comunicar e informar a população quanto aos aspectos socioambientais e socioeconômicos conforme cláusula 174 (Anexo II) do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta.

Cláusulas do TTAC: Cláusula 174 – Concluída internamente; Cláusula 174 §1º - Planejada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 229 - Item 3 e 5 – Concluída internamente; Deliberação 229 - Item 4 - Atrasada; Deliberação 306 – Em andamento.

Marcos do Programa

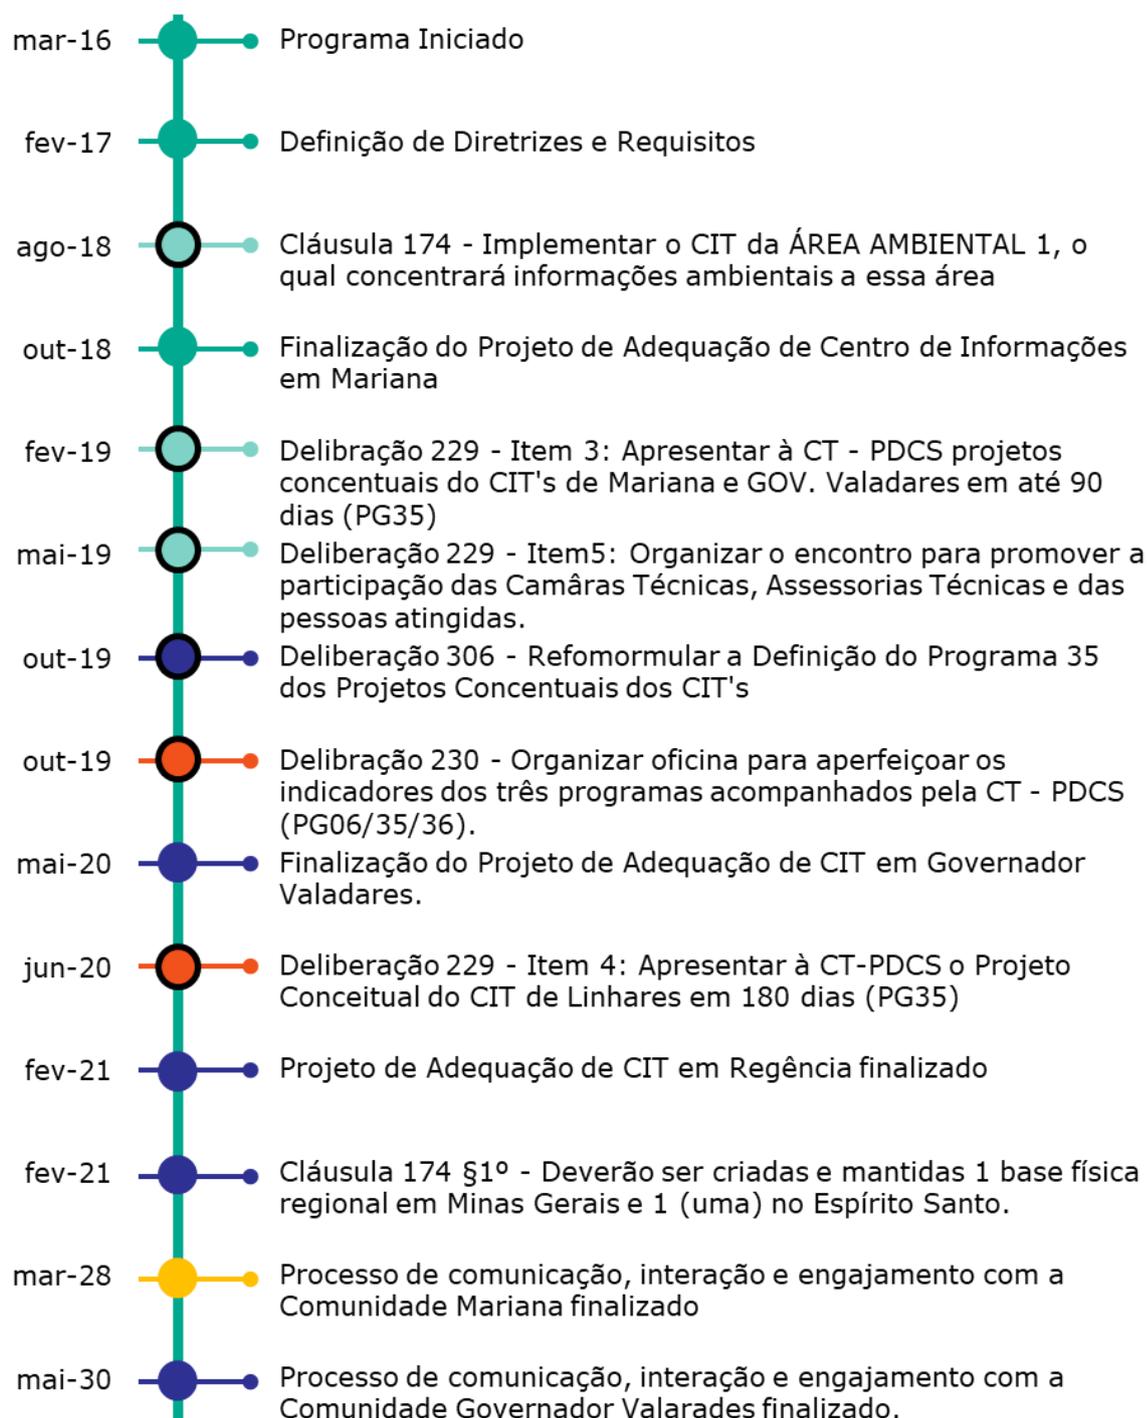



- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Fatos e entregas relevantes do último mês

Centro de Informações Técnicas (CIT) em Mariana (MG) – Casa do Jardim:

- 680 visitantes das mais diversas localidades, incluindo os participantes do VimVer. (Fonte: P35-RLD-000-00_Livro de Visitas_190831.docx)
- Realização de uma exposição de artesanato das Associações de grupos das regiões atingidas como acordado em oficina participativa.
- Realização de plantões de Reassentamento Coletivos que ocorreram às Terças-Feiras e plantões de Reassentamento Familiar às Quintas – Feiras do mês de agosto.
- Continuação de exposição para comercialização de produtos artesanais produzidos por associações de grupos atingidos de Mariana, consolidando o local como um importante ponto para divulgação do trabalho das associações e para comércio.

Centro de Informações Técnicas (CIT) em Governador Valadares (MG):

- Verificado o registro do imóvel junto à prefeitura, constatando que não há ônus ou gravame do mesmo, encaminhando-se para firmar acordo de cessão entre Prefeitura Municipal de Governador Valadares e Fundação Renova.

Centro de Informações Técnicas (CIT) em Regência (ES):

- Realizado uma Oficina Participativa no distrito de Regência com a participação da comunidade da Foz do Rio Doce, município de Linhares, para iniciar o Projeto de Concepção do CIT de Regência (definição com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social – CTPDCS e com representantes do ICMBio). Participaram também membros da CT-PDCS, gestores do ICMBio e representantes de poder público local.

Próximas entregas

- Assinar o Acordo de Cooperação ICMBio (em análise pelo jurídico do ICMBio), para implantação do CIT de Regência no Espírito Santo (ES) no Projeto Tamar. Esta entrega refere-se ao Marco “Negociação de parceria com ICMBio finalizada”.
- Seguir as tratativas com a Prefeitura de Governador Valadares, para celebração de documento jurídico pertinente à doação do terreno para implementação do CIT neste município. Esta entrega refere-se ao Marco “Concepção do espaço de Governador Valadares finalizada”.
- Realizar demais Oficinas Participativas para co-construção da concepção do CIT de Regência, que se refere ao território da Foz do Rio Doce. Esta entrega refere-se ao Marco “Concepção do espaço de Regência finalizada”.
- Realizar a Oficina para Aperfeiçoamento dos Indicadores do PG 35. Esta entrega refere-se ao atendimento da “Deliberação 230”.

Desafios

- Proporcionar a socialização sobre as ações socioeconômicas e socioambientais que estão em andamento e que serão realizadas pela Fundação Renova – servindo como um mecanismo que possibilite o acesso a uma informação clara e didática, pensando no público que visita o CIT e que, muitas vezes, não possui conhecimentos específicos sobre as questões que envolvem o passo a passo dos processos de reparação.
- Dialogar com as temáticas que envolvem o rompimento, a história da comunidade e do lugar – refletindo sobre o encontro do homem com a cidade, com o meio ambiente e com seu poder de transformar o futuro a partir de suas próprias ações – possibilitando o diálogo com os visitantes e mostrando aos mesmos que todos os dias, o processo complexo e múltiplo, que compete à Fundação Renova, está sendo realizado.
- Funcionar como espaço de uso público, proporcionando informação, atendimento humanizado e inclusivo, com uma equipe capacitada a prestar esclarecimentos aos diversos públicos.
- Construir uma estratégia respaldada por um termo de cooperação técnica com o ente público e/ou sem fins lucrativos, atuante nas localidades, de forma a preparar a futura gestão dos equipamentos, após o encerramento do Programa pela Fundação Renova.
- Envolver as comunidades no projeto para construção da ideia de pertencimento e apropriação do espaço, visando a continuidade das ações.

Indicadores/Grandes Números




Gráfico 1: Origem dos visitantes – Casa do Jardim – Mariana (MG). Fonte: P35-RLD-000-00_Livro de Visitas_190831

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Implantar um Centro de Informações Técnicas (CIT) da Área Ambiental 1 em Mariana, bem como, um CIT em Minas Gerais na cidade de Governador Valadares e um em Linhares, ES. Essas estruturas, são destinadas a comunicar e informar a população quanto aos aspectos socioambientais e socioeconômicos conforme cláusula 174 (Anexo II) do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta.

Cláusulas do TTAC: Cláusula 174 – Concluída internamente; Cláusula 174 §1º - Planejada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 229 - Item 3 e 5 – Concluída internamente; Deliberação 229 - Item 4 - Atrasada; Deliberação 306 – Em andamento.

Marcos do Programa

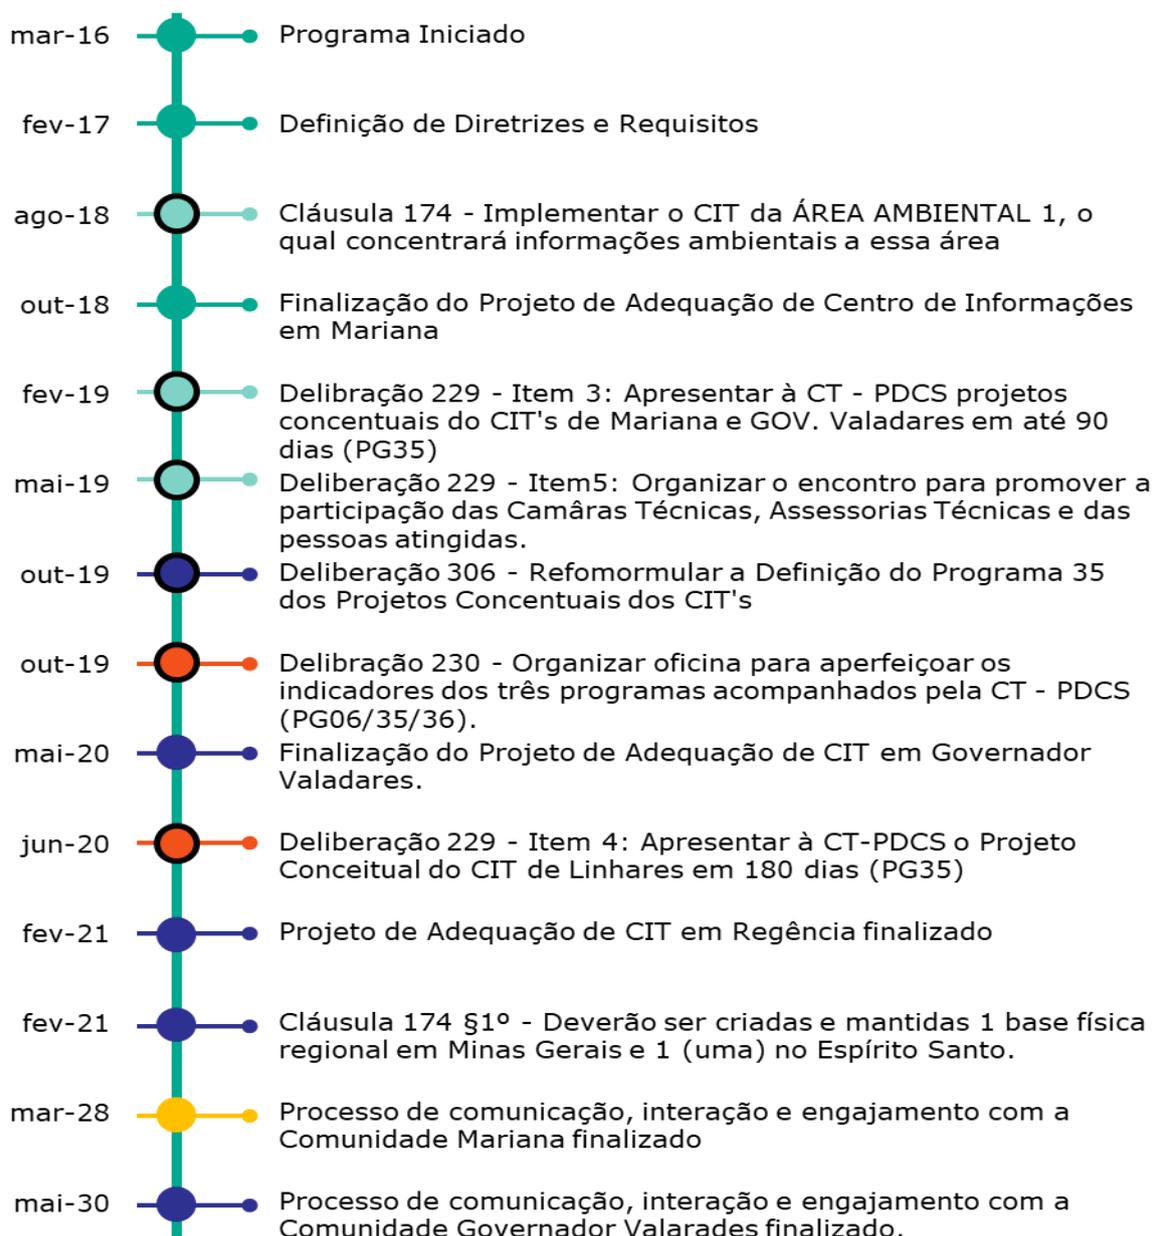



- Concluído
- Em Andamento
- Planejado
- Reprogramado
- Concluído Internamente
- Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Fatos e entregas relevantes do último mês

Centro de Informações Técnicas (CIT) em Mariana (MG) – Casa do Jardim:

- 680 visitantes das mais diversas localidades, incluindo os participantes do VimVer. (Fonte: P35-RLD-000-00_Livro de Visitas_190831.docx)
- Realização de uma exposição de artesanato das Associações de grupos das regiões atingidas como acordado em oficina participativa.
- Realização de plantões de Reassentamento Coletivos que ocorreram às Terças-Feiras e plantões de Reassentamento Familiar às Quintas – Feiras do mês de agosto.
- Continuação de exposição para comercialização de produtos artesanais produzidos por associações de grupos atingidos de Mariana, consolidando o local como um importante ponto para divulgação do trabalho das associações e para comércio.

Centro de Informações Técnicas (CIT) em Governador Valadares (MG):

- Verificado o registro do imóvel junto à prefeitura, constando que não há ônus ou gravame do mesmo, encaminhando-se para firmar acordo de cessão entre Prefeitura Municipal de Governador Valadares e Fundação Renova.

Centro de Informações Técnicas (CIT) em Regência (ES):

- Realizado uma Oficina Participativa no distrito de Regência com a participação da comunidade da Foz do Rio Doce, município de Linhares, para iniciar o Projeto de Concepção do CIT de Regência (definição com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social – CTPDCS e com representantes do ICMBio). Participaram também membros da CT-PDCS, gestores do ICMBio e representantes de poder público local.

Próximas entregas

- Assinar o Acordo de Cooperação ICMBio (em análise pelo jurídico do ICMBio), para implantação do CIT de Regência no Espírito Santo (ES) no Projeto Tamar. Esta entrega refere-se ao Marco “Negociação de parceria com ICMBio finalizada”.
- Seguir as tratativas com a Prefeitura de Governador Valadares, para celebração de documento jurídico pertinente à doação do terreno para implementação do CIT neste município. Esta entrega refere-se ao Marco “Concepção do espaço de Governador Valadares finalizada”.
- Realizar demais Oficinas Participativas para co-construção da concepção do CIT de Regência, que se refere ao território da Foz do Rio Doce. Esta entrega refere-se ao Marco “Concepção do espaço de Regência finalizada”.
- Realizar a Oficina para Aperfeiçoamento dos Indicadores do PG 35. Esta entrega refere-se ao atendimento da “Deliberação 230”.

Desafios

- Proporcionar a socialização sobre as ações socioeconômicas e socioambientais que estão em andamento e que serão realizadas pela Fundação Renova – servindo como um mecanismo que possibilite o acesso a uma informação clara e didática, pensando no público que visita o CIT e que, muitas vezes, não possui conhecimentos específicos sobre as questões que envolvem o passo a passo dos processos de reparação.
- Dialogar com as temáticas que envolvem o rompimento, a história da comunidade e do lugar – refletindo sobre o encontro do homem com a cidade, com o meio ambiente e com seu poder de transformar o futuro a partir de suas próprias ações – possibilitando o diálogo com os visitantes e mostrando aos mesmos que todos os dias, o processo complexo e múltiplo, que compete à Fundação Renova, está sendo realizado.
- Funcionar como espaço de uso público, proporcionando informação, atendimento humanizado e inclusivo, com uma equipe capacitada a prestar esclarecimentos aos diversos públicos.
- Construir uma estratégia respaldada por um termo de cooperação técnica com o ente público e/ou sem fins lucrativos, atuante nas localidades, de forma a preparar a futura gestão dos equipamentos, após o encerramento do Programa pela Fundação Renova.
- Envolver as comunidades no projeto para construção da ideia de pertencimento e apropriação do espaço, visando a continuidade das ações.

Indicadores/Grandes Números




Gráfico 1: Origem dos visitantes – Casa do Jardim – Mariana (MG). Fonte: P35-RLD-000-00_Livro de Visitas_190831

PG036 Comunicação Nacional e Internacional


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer sítio eletrônico, em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e os programas desenvolvidos em função do TTAC.

Cláusula do TTAC: 175 – Concluída internamente.

Marcos do Programa

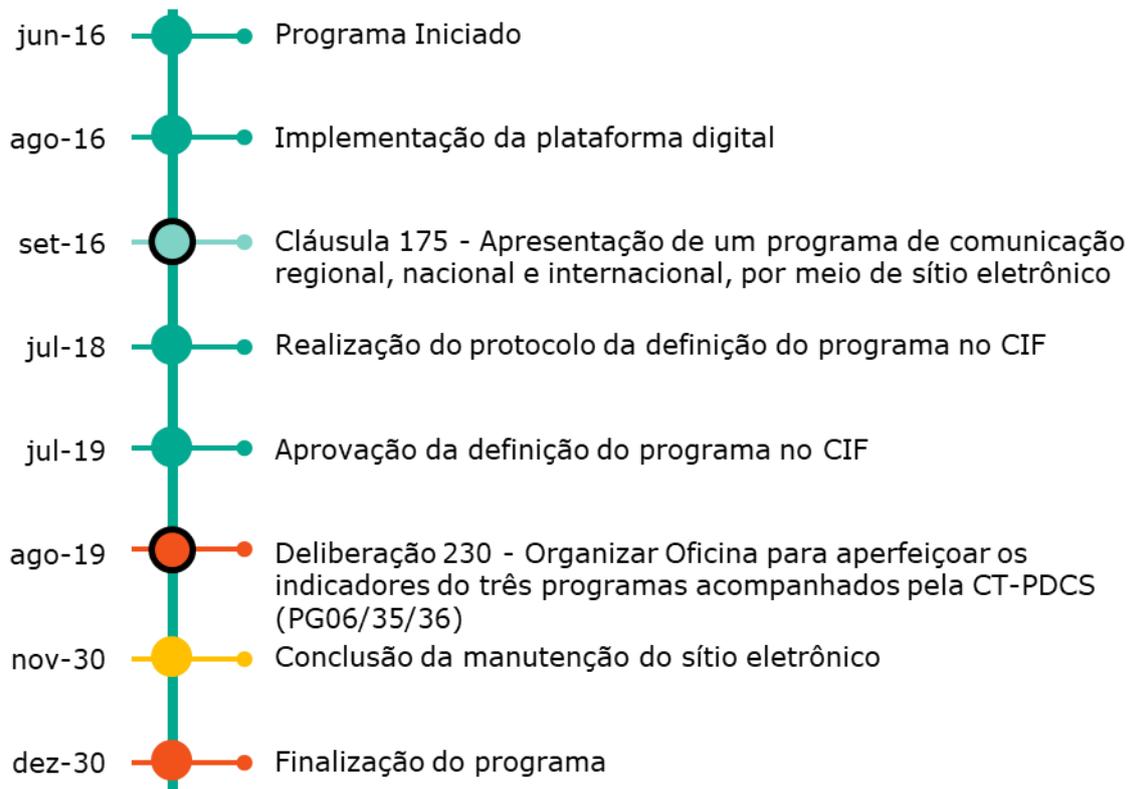

- Concluído ● Em Andamento ● Planejado ● Reprogramado
- Concluído Internamente ○ Marcos com bordas identificam Cláusulas e Deliberações

Entregas e fatos relevantes do mês

- Transmissão da 40ª reunião do Comitê Interfederativo no site e no canal do YouTube (Fonte: <https://www.fundacaorenova.org/paineis/transmissao-da-40a-reuniao-do-comite-interfederativo/> e https://www.youtube.com/watch?v=nq_RRNISITQ).
- Transmissão da 38ª reunião da Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) pelo canal do YouTube (Fonte: https://youtu.be/fcZn5qJp_Bw; <https://youtu.be/kJZlqHzwv2E> e <https://youtu.be/sQtgzwk08F0>).
- Publicação de agenda dos meses de agosto e setembro no Calendário do site (Fonte: <https://www.fundacaorenova.org/calendario/>).
- Criação da página de Arquivos e Relatórios para os conselhos Consultivo, Fiscal e Curador da Fundação Renova no site (Fonte: <https://www.fundacaorenova.org/conselho-consultivo/>; <https://www.fundacaorenova.org/conselho-fiscal/> e <https://www.fundacaorenova.org/conselho-curador/>).

Próximas entregas

- Atualizar e divulgar periodicamente a página Dados da Reparação. Esta entrega refere-se ao Marco “Processo de Manutenção do sítio eletrônico (Inserção de matérias, informações e relatórios no site) finalizado”.

- Incluir eventos no Calendário do site. Esta entrega refere-se ao Marco “Processo de Manutenção do sítio eletrônico (Inserção de matérias, informações e relatórios no site) finalizado”.

Desafios

- Comunicar à sociedade e às comunidades sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova.
- Contrapor boatos e notícias de teor falso nas redes sociais.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Indicadores/Grandes Números

INDICADOR	JULHO 2019	AGOSTO 2019	ACUMULADO 2019	ACUMULADO 2016 a 2019
Acessos ao site	63.704*	95.796*	590.625*	1.855.801*
Documentos no site	13	66	115	239
Vídeos	9	20	82	295
Notícias Publicadas	17	12	96	545

Tabela 8. Indicadores e Grandes Números (agosto/2019). Fonte: Site Fundação Renova + Google Analytics.
 *Foi identificado um erro na medição do número de acessos ao site nos meses de janeiro, abril, maio, junho e julho de 2019. Os dados foram atualizados na Tabela 1. Indicadores e Grandes Números (agosto/2019).

INDICADOR	Agosto 2019
Tempo médio de resposta nas redes sociais	2h15min
Alcance orgânico LinkedIn	158.000
Alcance orgânico Facebook	71.000
Visualizações no Youtube	4.00

Tabela 2. Indicadores e Grandes Números (agosto/2019). Fonte: Google Analytics

Indicadores - PG36		Agosto			
Endereço da página	Página	Visualizações de página / total	Porcentagem do Total	Visualizações de página / Prioritárias	Porcentagem do Total / Prioritárias
/trabalhe-conosco/	Trabalhe Conosco	51.503	12,07%	33.699	11,97%
/portal/	Portal do Usuário	31.613	7,41%	25.128	8,92%
/fale-conosco/	Fale Conosco	10.273	2,41%	6.390	2,27%
/fornecedores/	Portal do Fornecedor	5.916	1,39%	4.603	1,63%
/arquivos-e-relatorios/	Arquivos e Relatórios	2.353	0,55%	1.647	0,58%
/periodo-chuvoso/	Especial Período Chuvoso	330	0,08%	209	0,07%
/mapa-de-atuacao/	Mapa de Atuação Fundação Renova	877	0,21%	598	0,21%
/dadosdareparacao/	Dados da Reparação	50.475	11,83%	23.137	8,22%
Total de visualizações do site		426.752			
Total de visualizações das páginas de serviço		153.340			
Percentual do Total de acessos		35,93%			
Total de visualizações do site / Cidades Prioritárias		281.547			
Total de visualizações das páginas de serviço / Cidades Prioritárias		95.411			
Percentual de acessos / Cidades Prioritárias		33,89%			

Tabela 3. Indicadores e Grandes Números (agosto/2019). Fonte P36-RLD-000-00_Indicadores_190908.pdf

PG037 Gestão de Riscos Ambientais

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Apresentar estudo para identificar riscos ambientais dos ativos da Samarco, diretamente afetados pelo rompimento, que possam impactar a bacia do rio Doce, bem como propor ações preventivas e mitigatórias associadas a esses riscos.

Cláusulas do TTAC: 176 – Concluída.

Entregas e fatos relevantes do mês

Não houve entregas relevantes neste mês.

Próximas entregas

Não há entregas a serem concluídas no próximo mês. O parágrafo único desta cláusula prevê revisões do documento no caso de renovação das licenças ambientais destas estruturas, que não estão previstas no curto prazo.

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água


Objetivo


Desenvolver e implementar um programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, área estuarina, costeira e marinha impactadas, gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para suportar a tomada de decisões dos demais programas da Fundação Renova, órgãos ambientais e agências de água.


Cláusulas do TTAC: 177 e 179 – Concluídas internamente; 178 – Em andamento.


Deliberações que impactam escopo e prazo: 76 – Concluída internamente, 310 – Em andamento.


Marcos do Programa

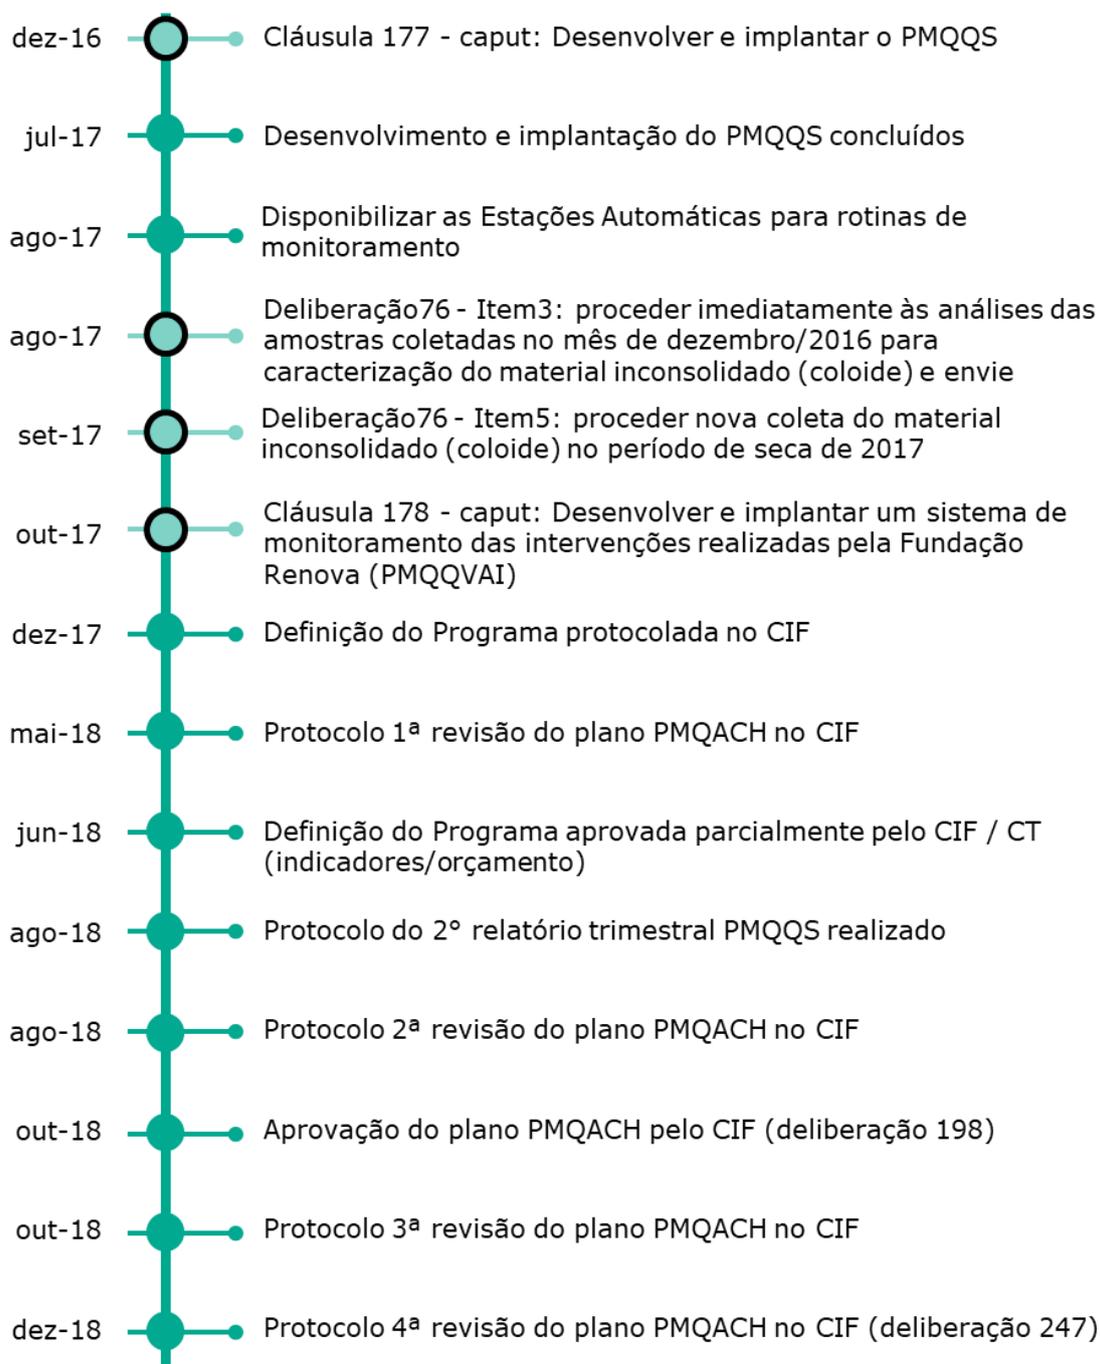

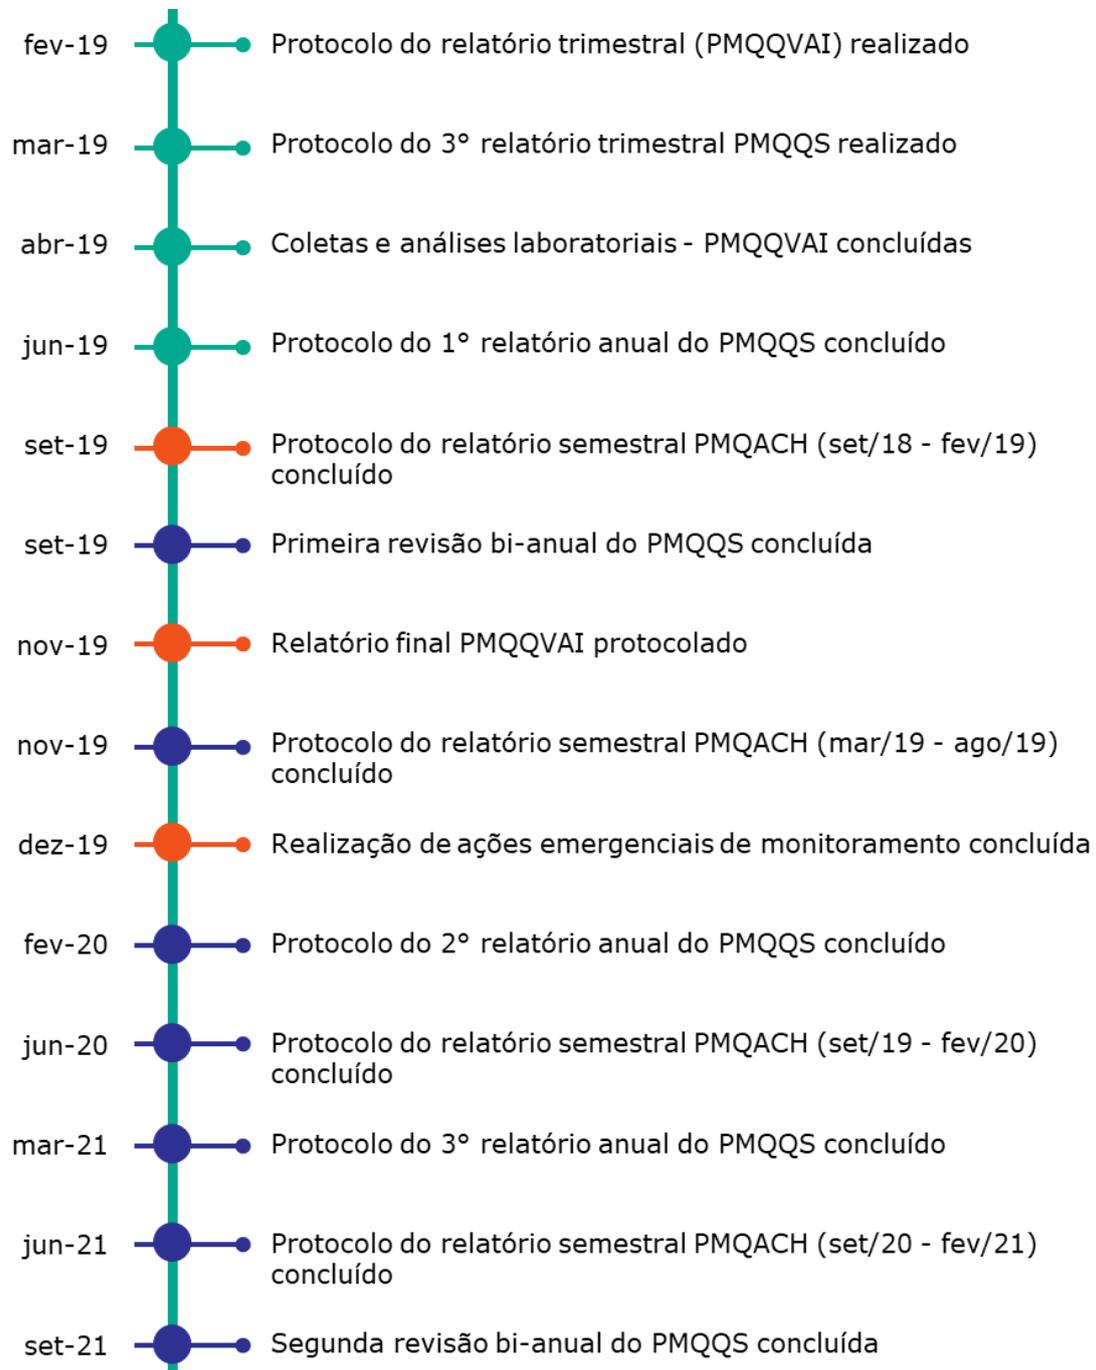

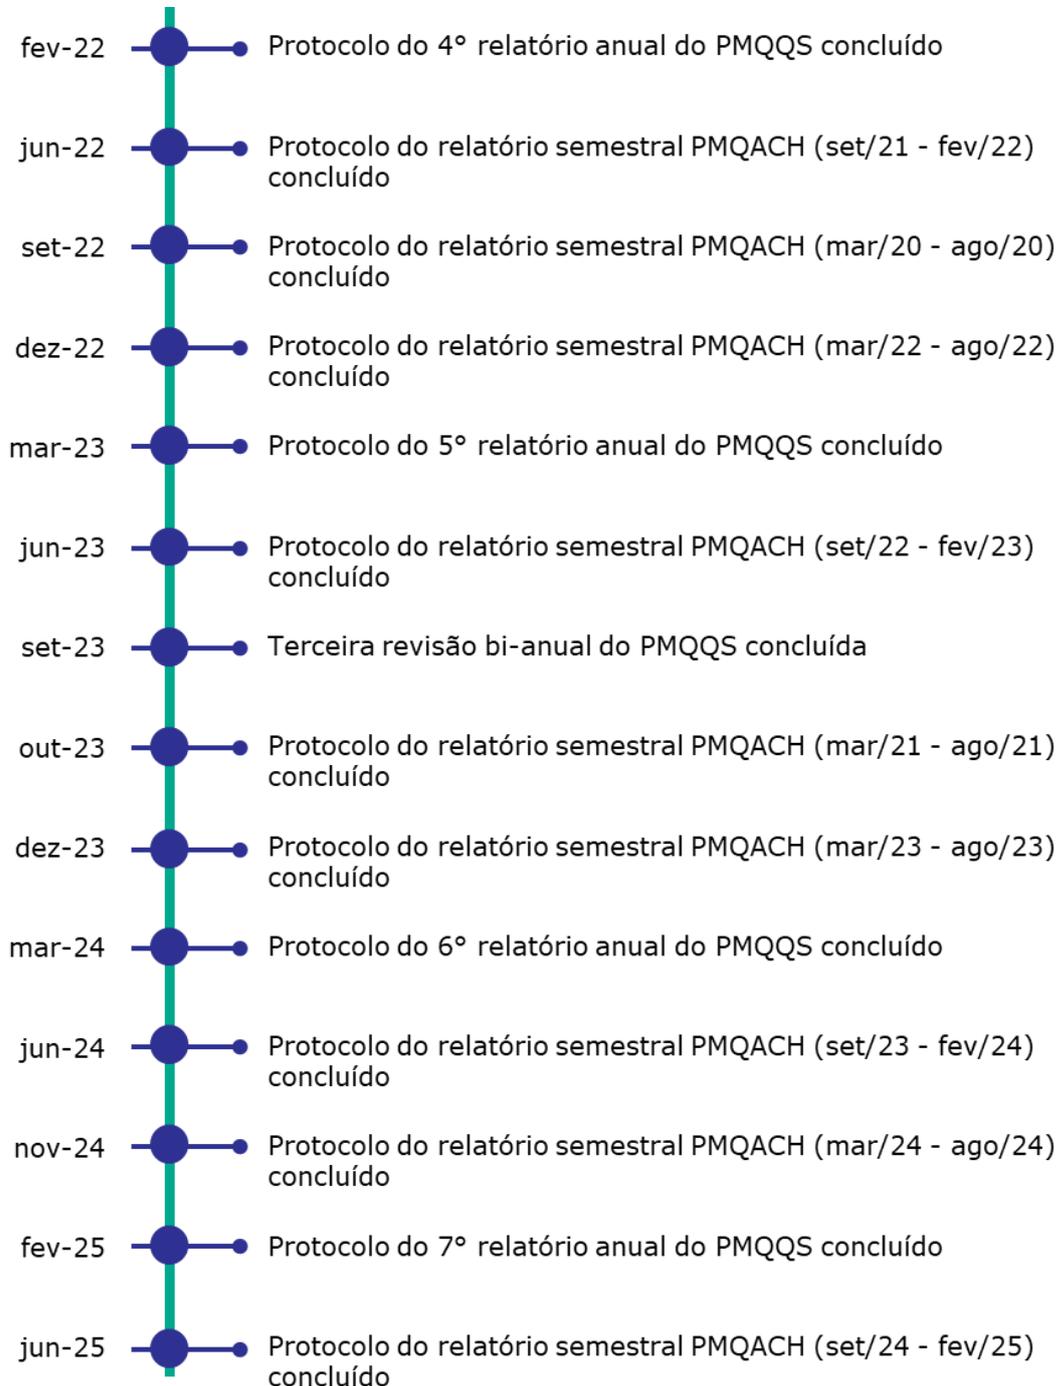

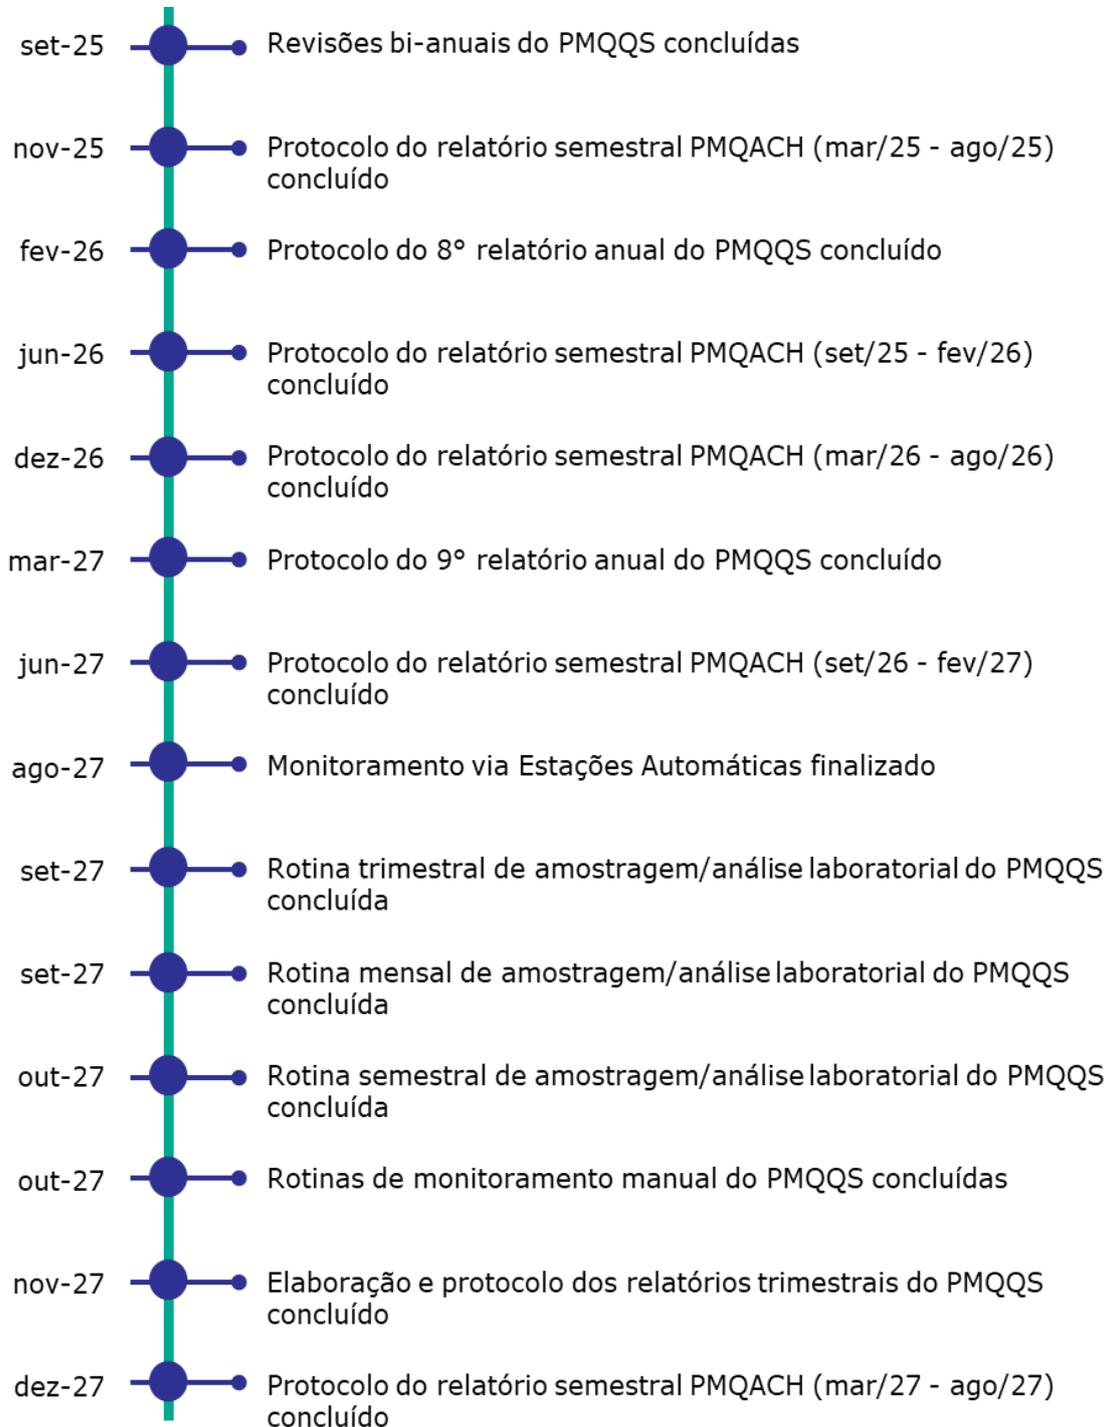

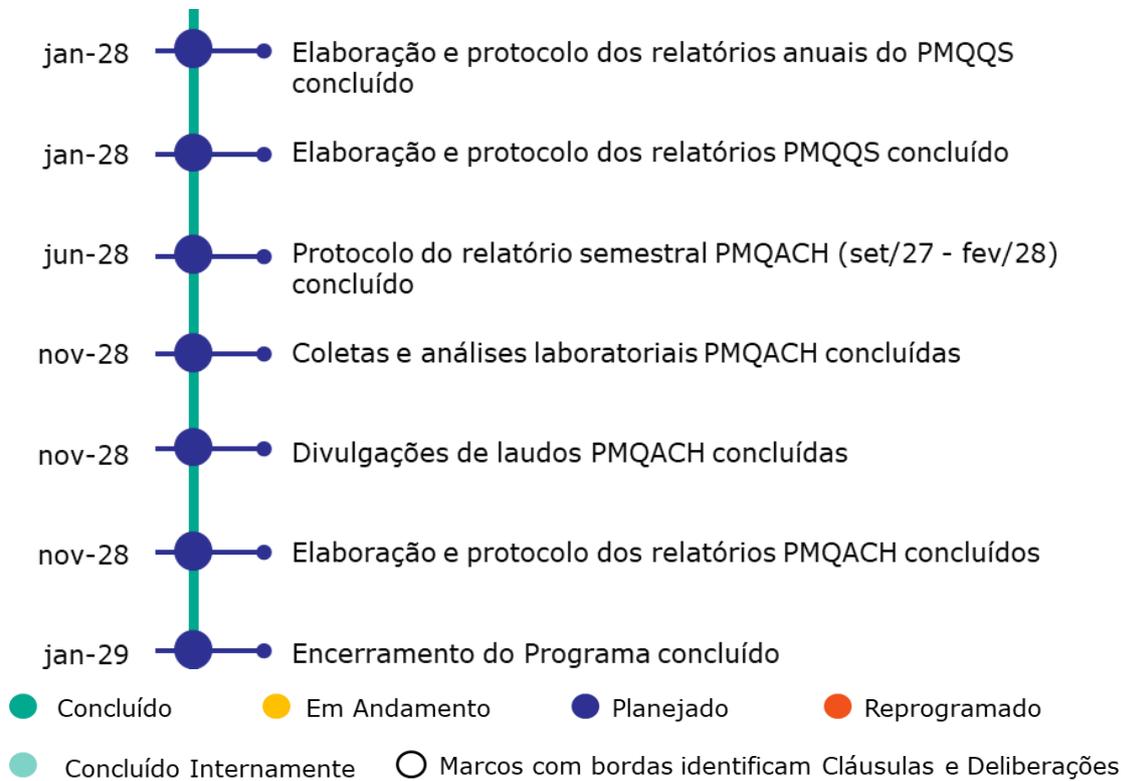

Entregas e fatos relevantes do mês

PMQQS:

- Em 15/08/2019, foi concluído o workshop na Fundação Dom Cabral, para discussão das diretrizes da revisão bianual do monitoramento de rios e mar na bacia do rio Doce (PMQQS). O workshop contou com a presença de representantes da Fundação Renova, órgãos ambientais, GTA-PMQQS, CTs (Saúde, SHQA, Bio, ECLET), Ministério Público, entre outros. (Fonte: P38-FOT-002-00_WORKSHOPPMQQS_190902)

Próximas entregas

PMQQS:

- Revisar e aprovar as diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS). Esta entrega refere-se ao Marco "Primeira revisão bianual do PMQQS concluída".

PMQACH:

- Protocolar o 1º relatório semestral do PMQACH, que aborda os resultados das análises da primeira a sexta campanhas de coletas. Esta entrega refere-se ao Marco "Protocolo do relatório semestral PMQACH (set/18 - fev/19) concluído".

Desafios

- Estabelecer comunicação eficiente sobre melhoria de qualidade da água na bacia do Rio Doce para as comunidades envolvidas, a fim de melhorar a percepção sobre a reparação do impacto do rompimento da Barragem do Fundão;
- Desenvolver e estabelecer a revisão bianual do PMQQS conforme estabelecido nas diretrizes mínimas do programa;
- Analisar de forma integrada os resultados obtidos em todas as matrizes monitoradas sempre que cabível, para responder à evolução da melhoria da qualidade da água ao longo do tempo no processo de reparação dos recursos hídricos afetados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Indicadores/Grandes Números

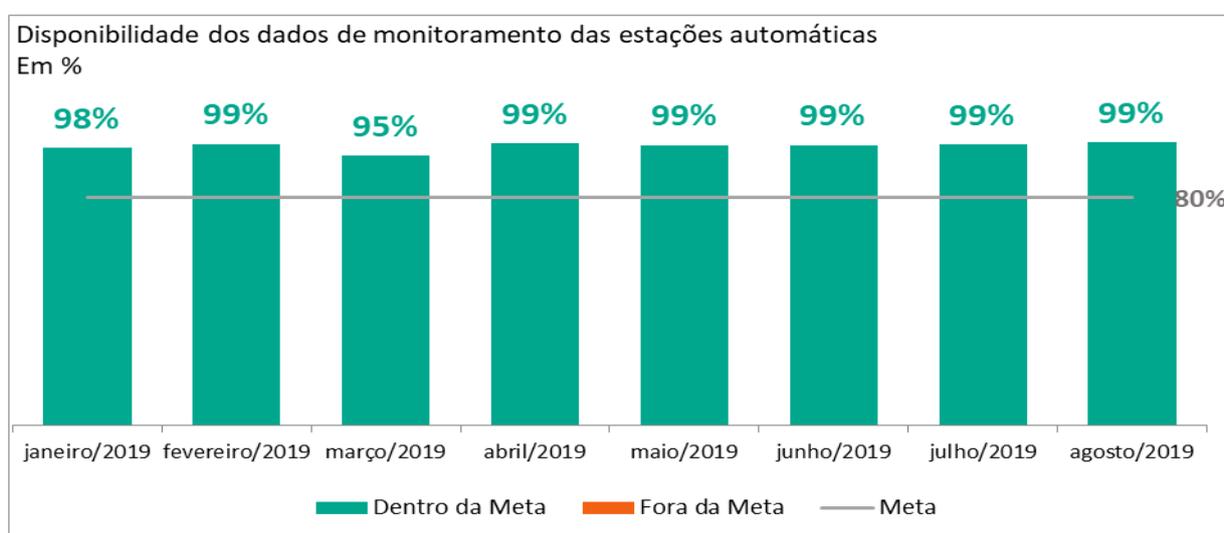


Gráfico 28. Disponibilidade dos dados de monitoramento das estações automáticas. Fonte: P38-KPI-004-00_EstAuto_190826.xlsx.

Foi necessário um ajuste no cálculo do indicador, uma vez que o parâmetro profundidade (que corresponde à profundidade da sonda na água) não é um parâmetro de relevância para o monitoramento do PMQQS e, com isso, seu envio ao MP5 foi suspenso desde Abril/19. Após essa melhoria, foram corrigidos os valores referentes aos meses de Abril e Maio de 2019, que ainda estavam considerando este parâmetro.

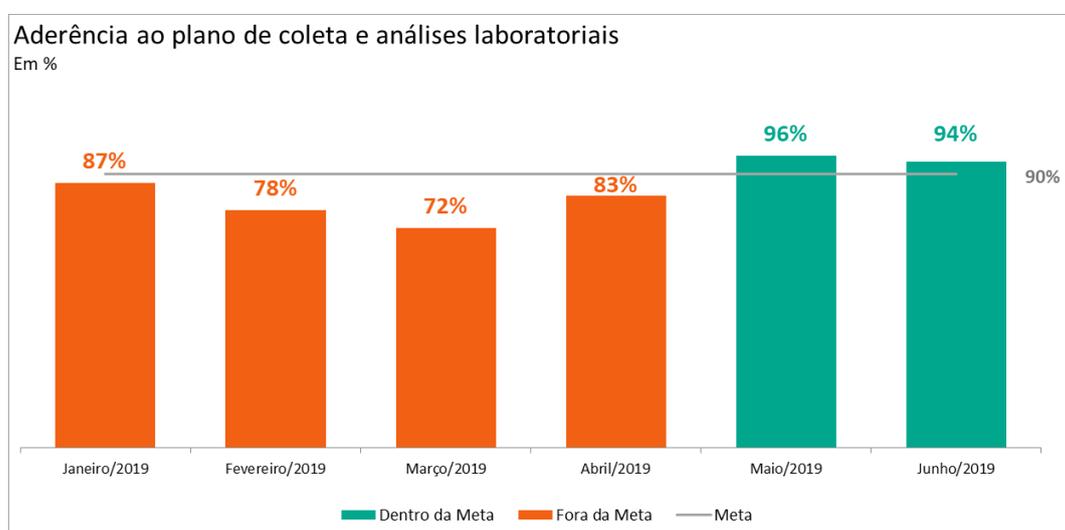


Gráfico 2. Aderência ao plano de coleta e análises laboratoriais. Fonte: P38-KPI-004-00_ColAnl_190903.xlsx

O indicador de aderência é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo máximo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados acordado é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de Chumbo 210, de acordo com a NT 45/2019 do GTA-PMQQS.

Fotos



Foto relacionada à: workshop de discussão da revisão bianual do PMQQS, realizado na Fundação Dom Cabral, em Nova Lima/MG – agosto/2019.



Foto relacionada à: estação automática de monitoramento do rio Doce, no município de Linhares/ES – agosto/2019.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo


Custear estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação direta e indiretamente afetadas pelo rompimento e implementar ações de reparação. Além disso, custear, em caráter compensatório, ações referentes à consolidação de duas Unidades de Conservação (UC), além de ações compensatórias na Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo Poder Público.


Cláusulas do TTAC: 181, 182 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 36, 114, 138, 218 – item 3, 221 – Concluída internamente; 283 – item 3 – Em andamento.

Marcos do Programa



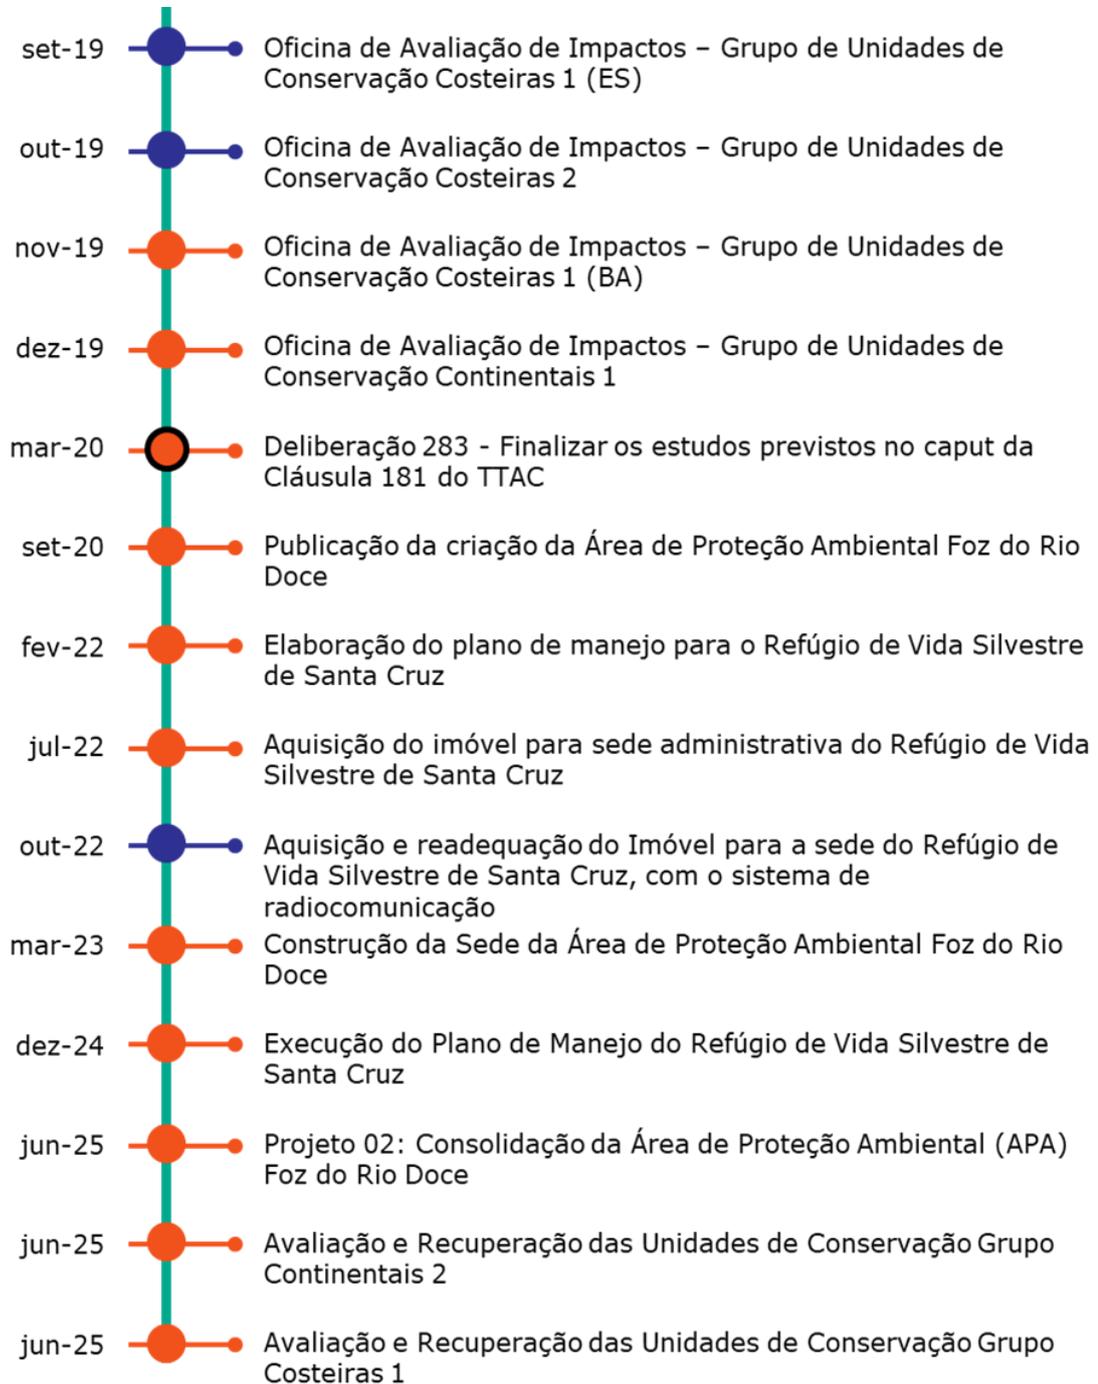

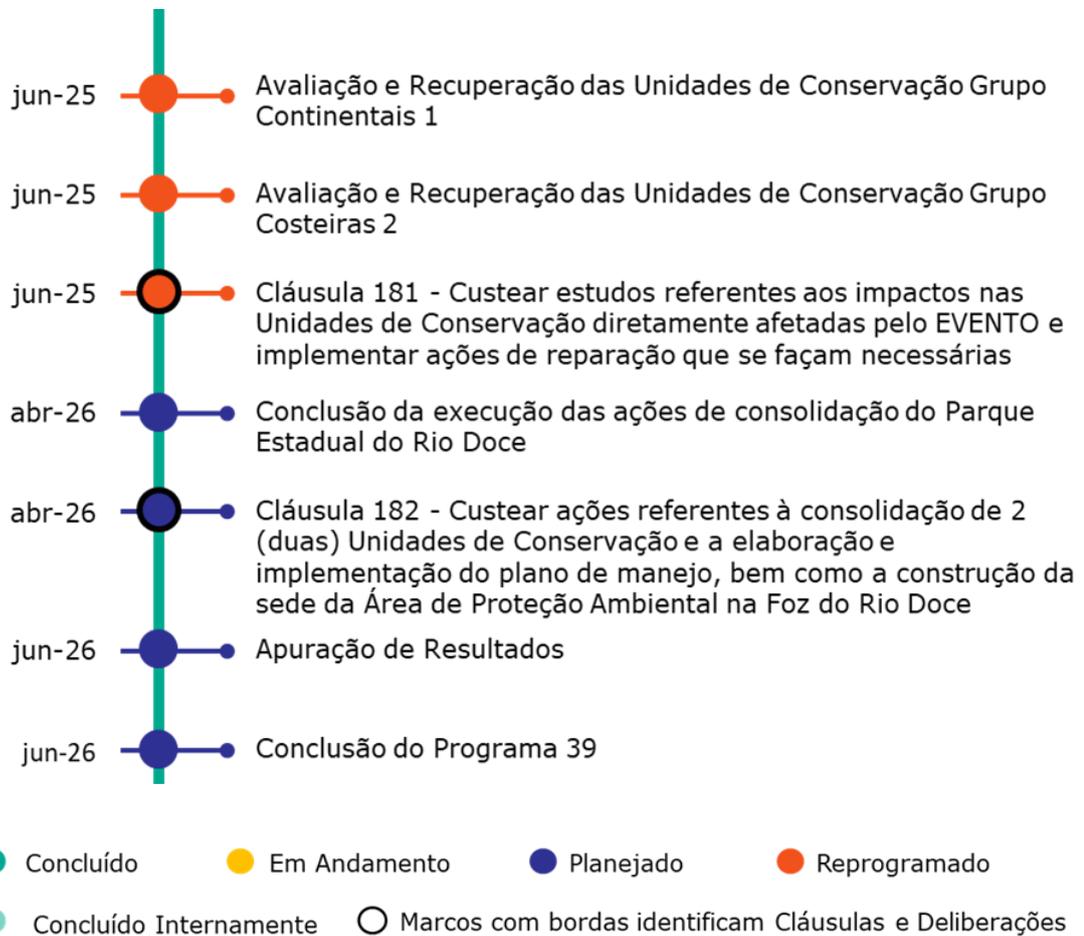

Entregas e fatos relevantes do mês

- Em 07/08/2019, foi apresentado o Relatório de Avaliação de Impacto sobre as Unidades de Conservação do grupo Continentais 2 na CT-Bio. (Fonte: P39-ATA-001-00-Ata reunião CTBio_190807)
- Em 13/08/2019 e 14/08/2019, foi realizada a Oficina de Diagnóstico das Unidades de Conservação do grupo Continentais 1, com o objetivo de apresentar e debater o diagnóstico de linha de base dos meios físico, biótico e socioeconômico para as Unidades de Conservação do Alto Rio Doce e novas informações compartilhadas pelos participantes. (Fonte: P39-LSP-004-00_Lista de Presença Oficina de Diagnóstico Continentais 1_190813)

Próximas entregas

- Realizar expedições a campo para complementação dos dados da Oficina de Diagnóstico dos impactos ambientais nas Unidades de Conservação do grupo Continentais 1. Esta entrega refere-se ao Marco “Etapa de Diagnóstico dos impactos ambientais nas Unidades de Conservação do grupo Continentais 1 concluída”.

Desafios

- Não há definição de quando o Poder Público autorizará a criação da Unidade de Conservação APA (Área de Proteção Ambiental) na Foz do Rio Doce,

impossibilitando a construção da sede, elaboração e execução do Plano de Manejo para a Unidade de Conservação, conforme previsto pela Cláusula 182;

- Conciliar o avanço das entregas dos órgãos públicos com os prazos da consolidação das Unidades de Conservação previstos nas Deliberações do CIF;
- Dificuldade de execução do plano de trabalho de avaliação das Unidades de Conservação da Bahia aprovado pela CT-Bio dentro do prazo estabelecido na Deliberação 283 devido a conflitos locais.

Indicadores/Grandes Números

Os indicadores do programa estão em revisão.

Fotos



Foto relacionada à: Oficina de Diagnóstico das Unidades de Conservação do grupo Continentais 1 – agosto/2019.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água


Objetivo


Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.


Cláusulas do TTAC: 183 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 28 – Concluída internamente.

Marcos do Programa

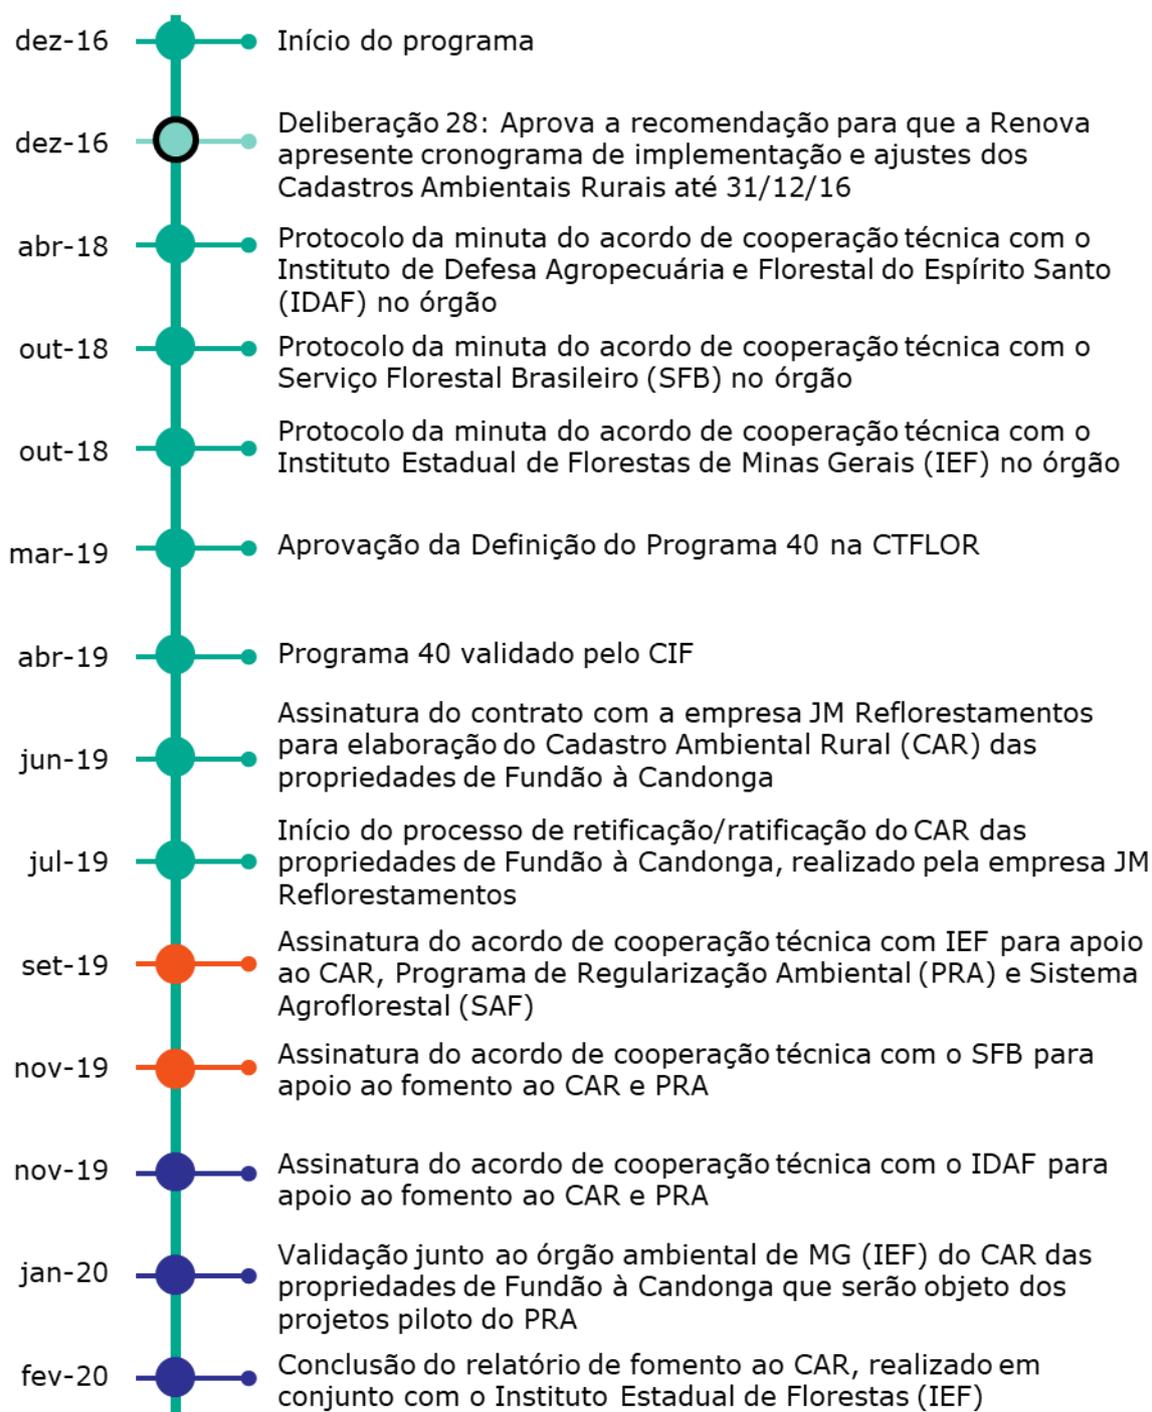

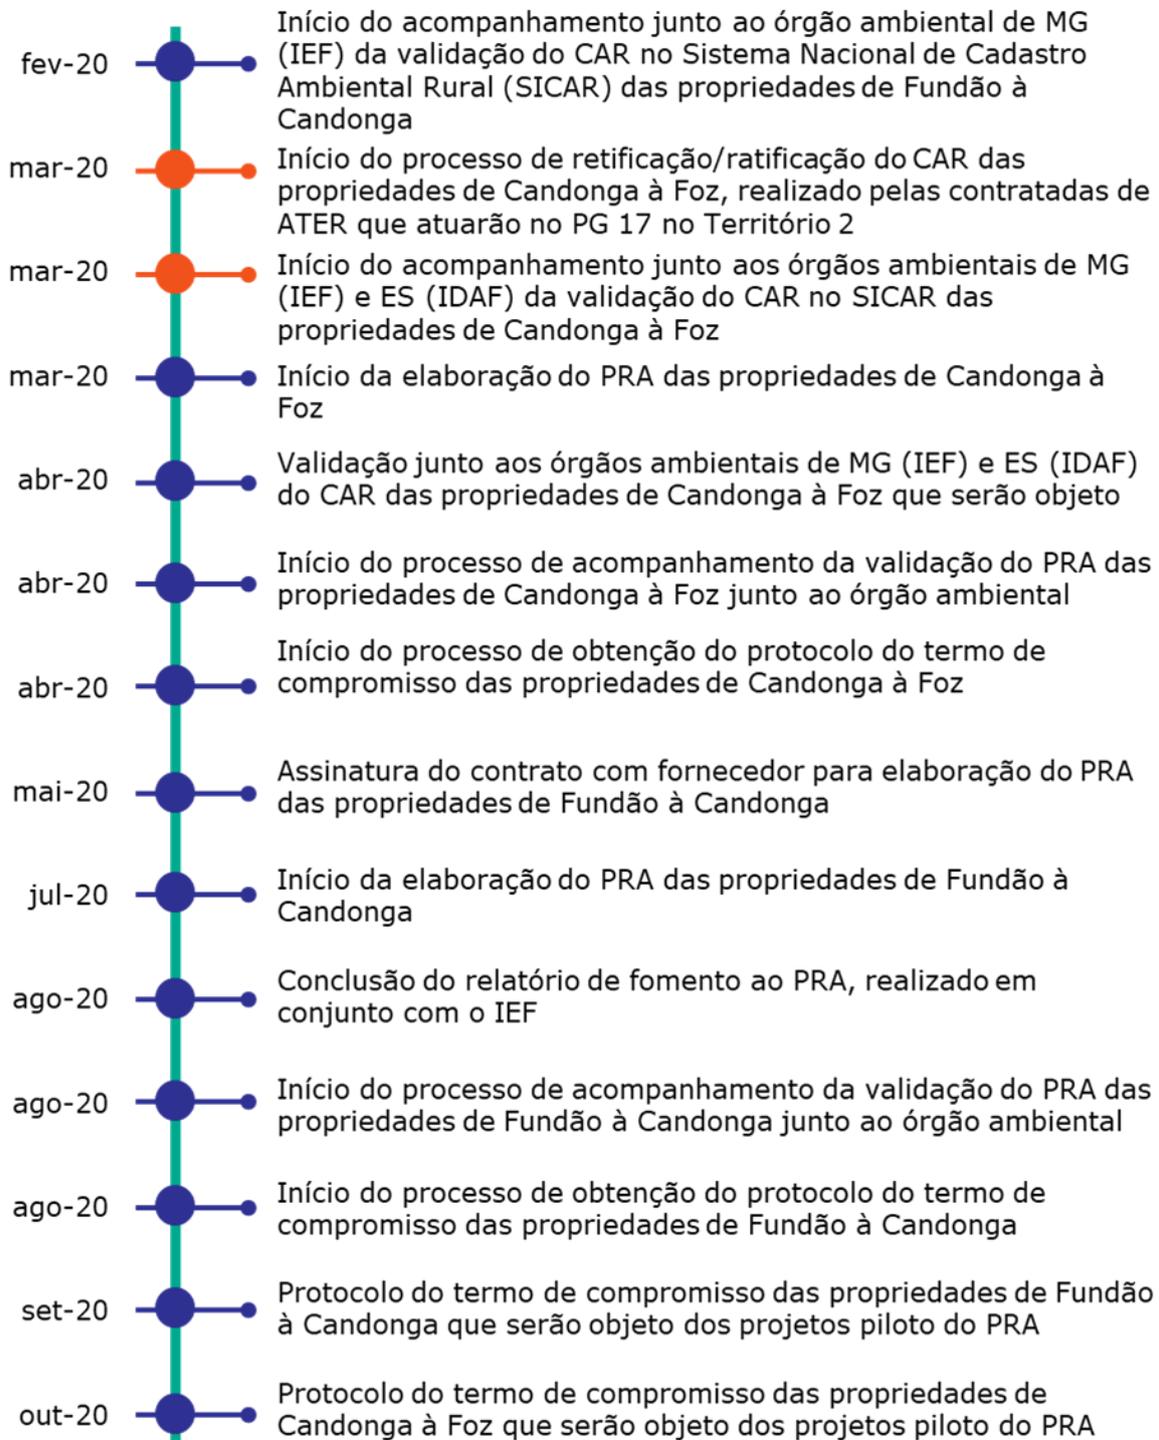

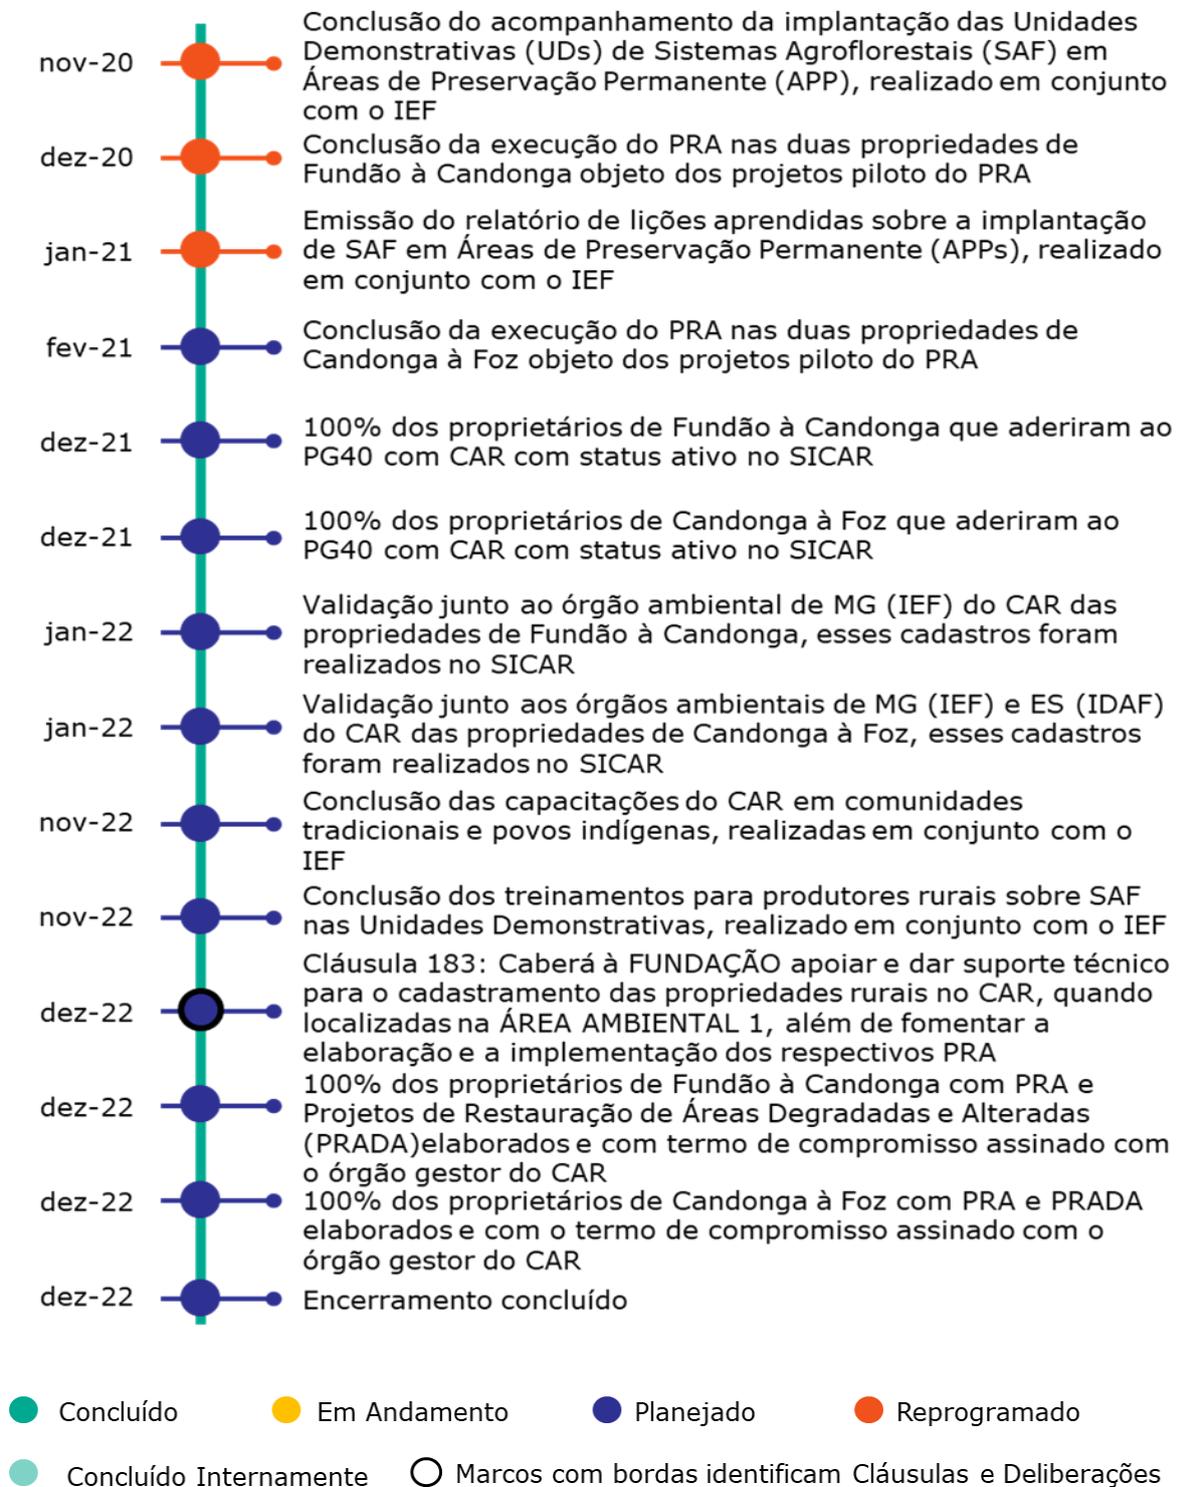

Entregas e fatos relevantes do mês

- Retificação/Ratificação do cadastro das propriedades que serão objeto dos projetos piloto do Programa de Regularização Ambiental (PRA) no território de Fundão à Candonga não foi concluída. Esta entrega refere-se ao Marco “Validação junto ao órgão ambiental de MG (IEF) do CAR das propriedades de Fundão à Candonga que serão objeto dos projetos piloto do PRA” **Causa:** A etapa de análise dos cadastros demandou uma aferição mais efetiva das informações que são necessárias para retificação do Cadastro Ambiental Rural, gerando atraso na conclusão da retificação. **Contramedida:** Concluir a retificação/ratificação do cadastro das propriedades objeto dos projetos piloto até 20/09/2019.

Próximas entregas

- Retificar/Ratificar o cadastro das propriedades que serão objeto dos projetos piloto do Programa de Regularização Ambiental (PRA) no território de Fundão à Candonga. Esta entrega refere-se ao Marco “Validação junto ao órgão ambiental de MG (IEF) do CAR das propriedades de Fundão à Candonga que serão objeto dos projetos piloto do PRA”;
- Obter assinatura do Acordo de Cooperação entre o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF) e a Fundação Renova para fomentar a recuperação e restauração florestal em Áreas de Preservação Permanente, Uso Restrito e Reserva Legal em imóveis rurais alvos de ações da Renova ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A assinatura deste acordo está prevista para ocorrer em 12/09/2019. Esta entrega refere-se ao Marco “Assinatura do acordo de cooperação técnica com

IEF para apoio ao CAR, Programa de Regularização Ambiental (PRA) e Sistema Agroflorestal (SAF)”;

Desafios

- Engajamento dos proprietários para atendimento da adequação ambiental da propriedade. Atualmente, **43** proprietários permanecem sem aderir à adequação ambiental o que impede que os cadastros ambientais rurais sejam realizados considerando a legislação ambiental vigente.

Indicadores/Grandes Números

O primeiro reporte do indicador “Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova” está previsto para o relatório de outubro de 2019.

Esse indicador tem como objetivo medir a quantidade de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) elaborados, retificados e/ou ratificados sem inconsistências ou pendências, conforme análise da Fundação Renova, dentre o público que aderiu ao programa 40. O reporte terá caráter mensal e a meta do indicador é atingir 100% de cadastros sem inconsistências ou pendências até o final do programa.

Fotos



Foto relacionada à: etapa de retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) das propriedades objeto dos projetos piloto do Programa de Regularização Ambiental (PRA) no território de Fundão à Candonga – agosto/2019

|

PG041 Gerenciamento dos Programas Socioambientais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Dotar os programas socioambientais de mecanismos e processos de gestão, monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados e definição de indicadores, em conformidade com os mecanismos e processos de governança estabelecidos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusulas do TTAC: 184 – Em andamento.

Fatos e entregas relevantes do último mês

- Continuidade dos trabalhos de desenvolvimento do cronograma máster, considerando a identificação, validação e atualização das interfaces. Fez parte deste trabalho, novas avaliações de riscos de cumprimento de prazos;
- A equipe do PMO está trabalhando no desenvolvimento do banco de dados e na implantação de ferramentas para reportar informações de andamento dos Programas da Fundação, através de relatórios a partir da coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações para suporte a gestão.

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, devidamente comprovados por meio de documentos oficiais, dentre os quais notas de empenho de despesas e declaração de autoridade competente.

Cláusulas do TTAC: 141, 142 e 143 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 69, 78, 85, 171 e 291 – Concluída internamente; 49, 180, 208 e 254 – Em andamento.

Marcos do Programa

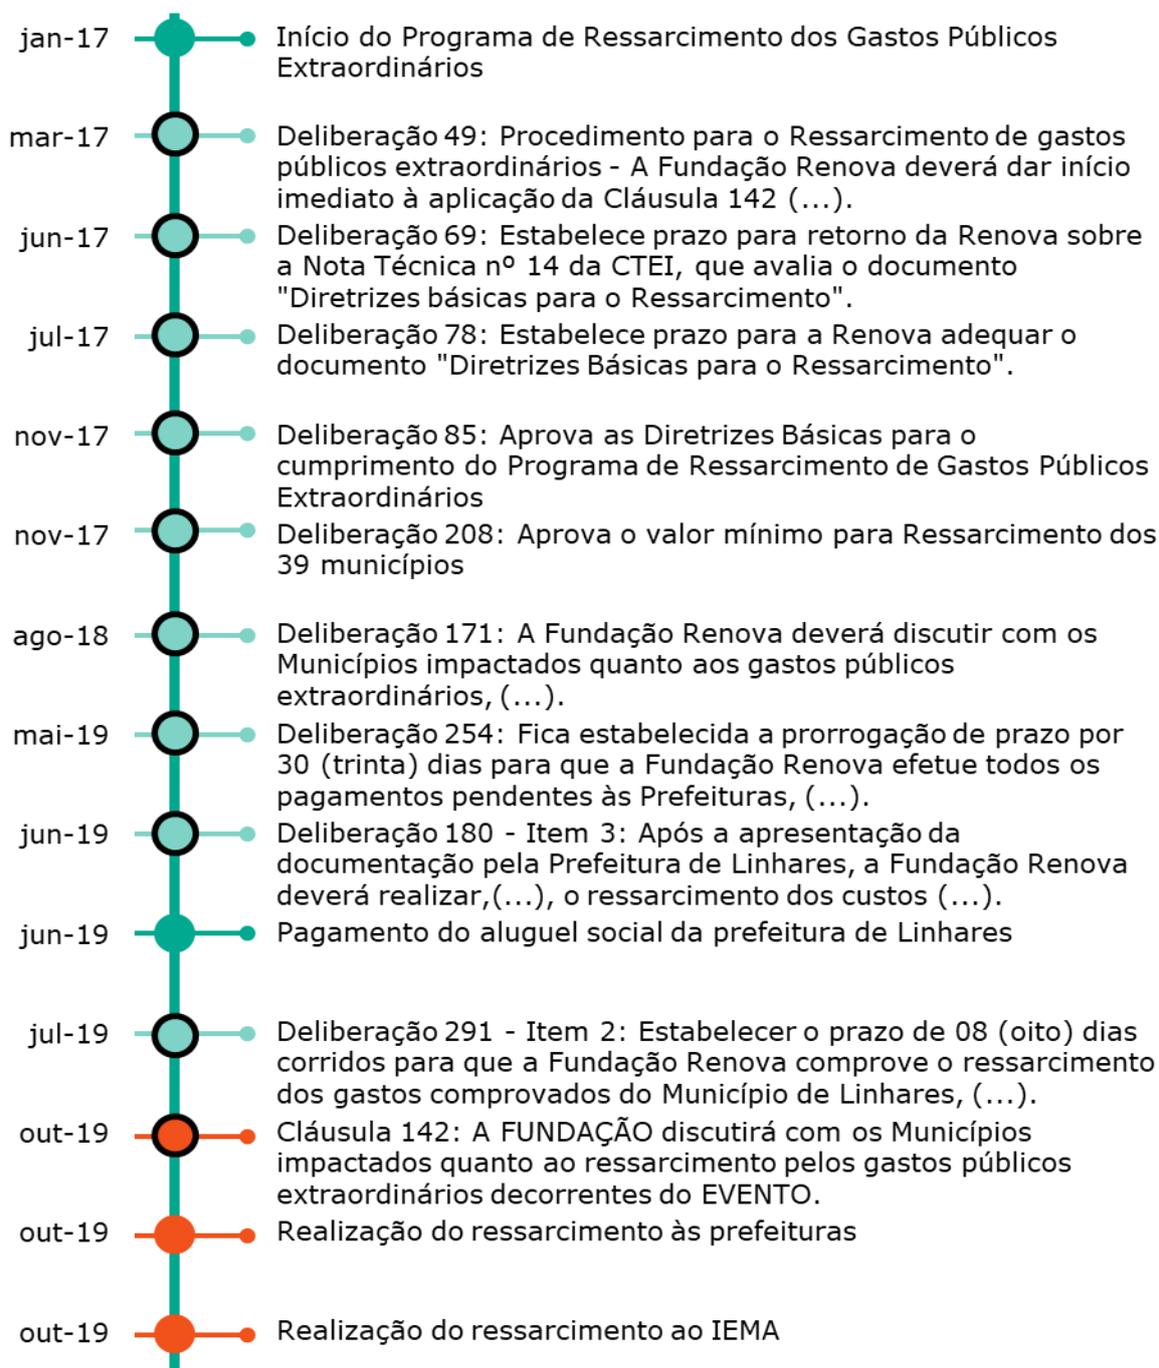

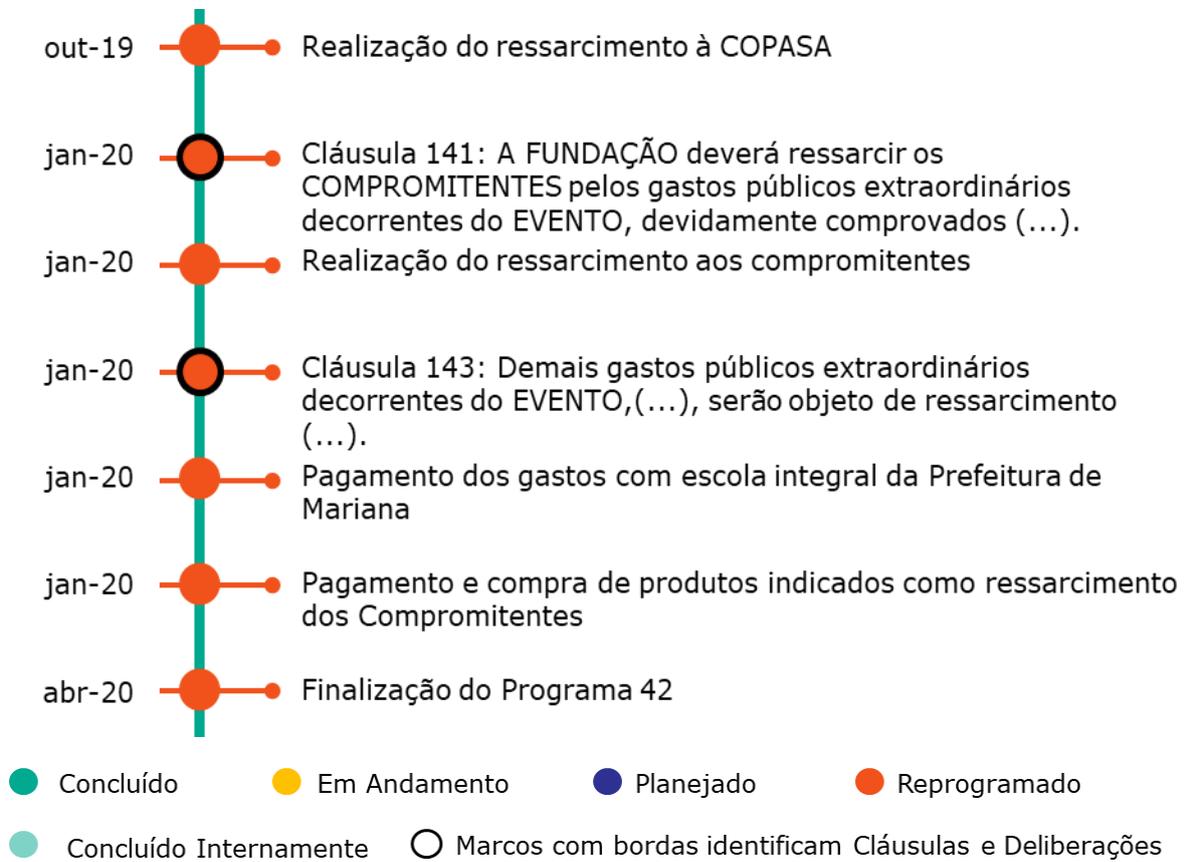

Entregas e fatos relevantes do mês

- Ressarcida a Prefeitura de Ipatinga. (Fonte: OFI.NII.072019.7459 - Deliberação 49 - JUL 19.docx)

Próximas entregas

- Não há entregas previstas para o próximo mês.

Desafios

- Concluir o ressarcimento das prefeituras considerando que sete prefeituras ainda não aderiram à proposta de ressarcimento aprovadas pelo CIF em 2018.
- Obter das Instituições a totalidade das despesas extraordinárias em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, bem como os respectivos termos de quitação.

Indicadores/Grandes Números

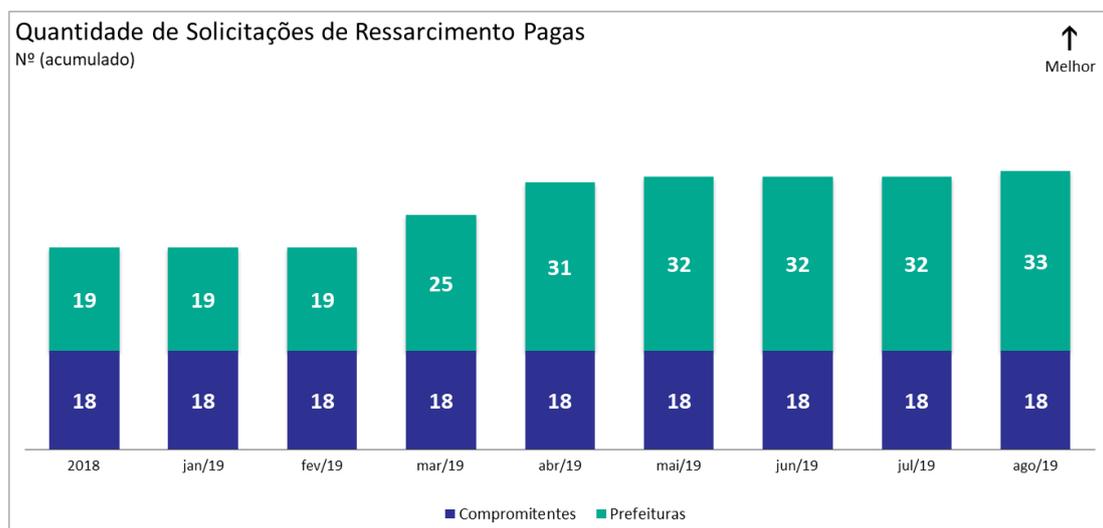


Gráfico 1. Quantidade de Solicitações de Ressarcimento Pagas. (agosto/2019). Fonte: OFI.NII.072019.7459 - Deliberação 49 - JUL 19.docx

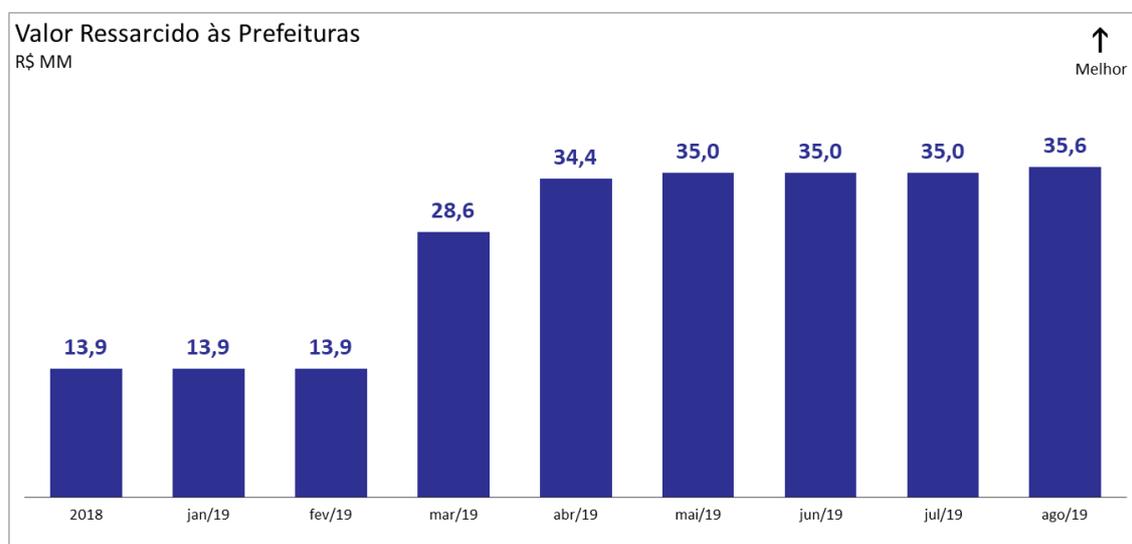


Gráfico 29. Valor resarcido às prefeituras. (agosto/2019). Fonte: OFI.NII.072019.7459 - Deliberação 49 - JUL 19.docx

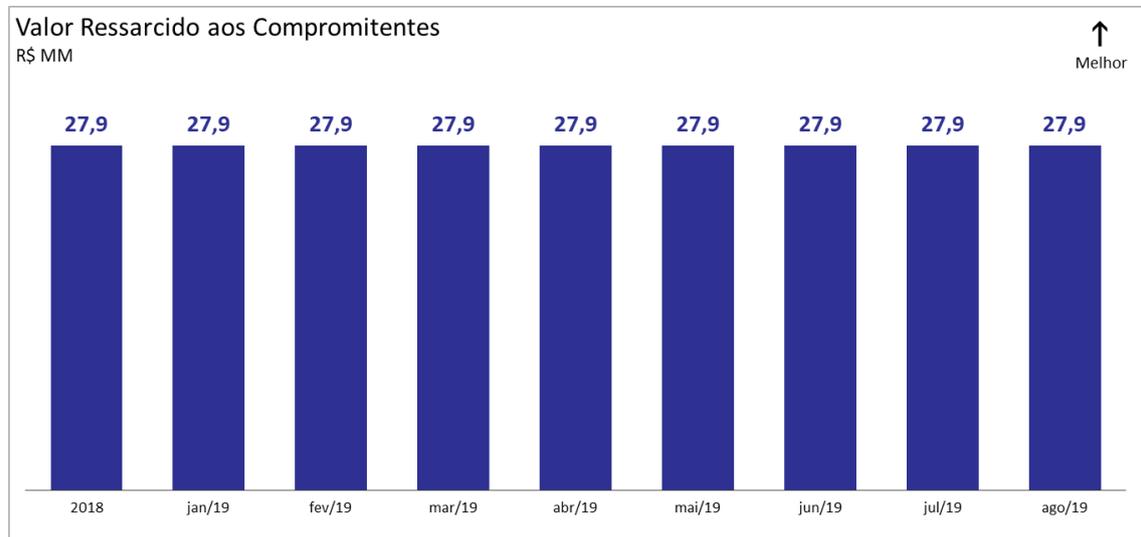


Gráfico 3. Valor ressarcido aos comprometidos. (agosto/2019). Fonte: OFI.NII.072019.7459 - Deliberação 49 - JUL 19.docx

Anexos

Glossário

I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:

- a) perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
- b) perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
- c) perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
- d) perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
- e) perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
- f) perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentabilidade das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
- g) prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;

h) inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i) danos à saúde física ou mental; e

j) destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

III. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na ÁREA DE ABRANGÊNCIA e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

IV. ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

V. ÁREA AMBIENTAL 2: os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

VI. **ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VII. **MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés.

VIII. **MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

IX. **PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. **PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

XI. **PROGRAMAS:** são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XII. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XIII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIV. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XVI. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVII. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVIII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XIX. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.


XXI. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXII. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

Segurança

Taxa de acidentes registrados

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

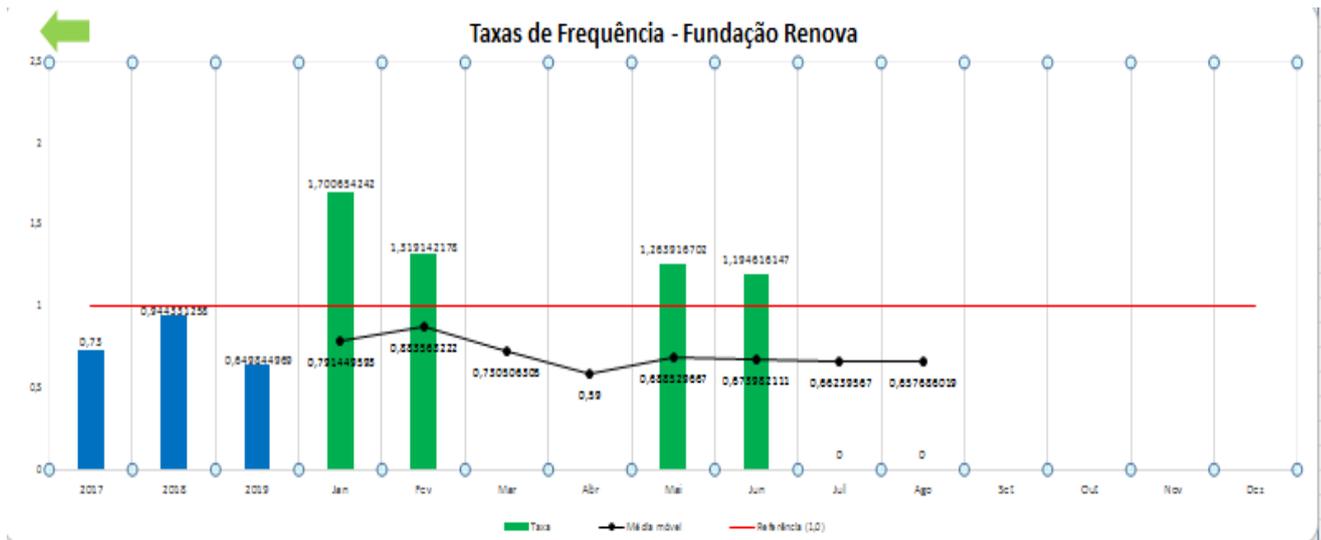

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

Programas	Orçamento	Realizado	Tendência	Orçamento	Realizado	Orçado Mês	Realizado Mês
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	409,08	288,43	409,08	53,88	8,80	4,96	0,30
PG08 - Reconstrução de vilas	15,00	-	15,00	-	-	-	-
PG09 - Recup Reservatório UHE Risoleta Neves	6,06	6,06	6,06	0,0	0,01	-	0,00
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	110,03	1,52	110,03	1,17	0,13	0,00	0,04
PG15 - Tecnologias Socioeconômicas	57,92	0,59	57,92	1,69	0,18	0,08	-
PG18 - Diversificação da Economia Regional	101,10	47,47	101,10	13,84	4,75	0,53	0,72
PG20 - Estímulo à Contratação Local	10,17	5,01	10,17	2,94	1,20	0,16	0,30
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	4,39	4,39	4,39	-	-	-	-
PG26 - Recuperação de APPs	1.247,18	16,02	1.247,18	16,30	9,01	1,90	0,52
PG27 - Recuperação de nascentes	269,54	26,92	269,54	15,12	8,20	1,14	1,01
PG29 - Recuperação da fauna silvestre	10,60	0,83	10,60	1,40	0,65	0,13	0,09
PG31 - Coleta e tratamento de esgoto	665,78	4,23	665,78	17,79	2,18	3,36	0,36
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	101,37	47,22	101,37	57,5	35,01	4,38	1,29
PG33 - Educação Ambiental	141,54	5,76	141,54	8,31	2,70	0,89	0,01
PG34 - Emergência ambiental	48,14	24,40	48,14	6,69	4,16	0,53	0,31
PG35 - Informação para a população	19,83	3,45	19,83	3,38	0,52	0,09	0,04
PG36 - Comunic. nacional/internacional	38,03	4,16	38,03	2,34	1,62	0,18	0,36
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	51,74	12,64	51,74	5,04	2,93	0,35	0,18
PG39 - Unidades de conservação	151,74	0,07	151,26	0,86	0,07	-	-
PG40 - CAR e PRAs	37,66	0,92	37,66	0,28	0,10	0,03	0,03
Saldo Compensatório	1.130,3	-	1.130,3	-	-	-	-
Total Compensatórios	4.627,2	500,1	4.626,7	208,6	82,2	18,7	5,6
Medidas mitigatórias emergenciais	202,39	202,39	202,39	-	-	-	-
PG01 - Cadastro dos Impactados	105,67	90,42	105,67	22,1	14,03	1,56	3,46
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	3.100,58	669,25	3.100,51	467,0	221,80	57,57	40,15
PG03 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	277,35	160,98	277,35	90,5	45,29	9,11	6,19
PG04 - Outros povos e comunidades tradicionais	54,48	32,94	54,48	15,2	6,98	1,61	0,78
PG05 - Proteção social	78,13	5,83	78,13	8,0	2,60	0,75	0,25
PG06 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	362,04	152,84	362,04	96,4	37,54	9,58	3,47
PG07 - Assistência aos Animais	32,35	25,25	32,35	6,1	3,48	0,52	0,53
PG08 - Reconstrução de vilas	1.642,99	274,90	1.642,99	342,9	135,14	35,39	26,45
PG09 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	1.128,66	660,99	1.128,66	194,9	79,20	16,41	8,50
PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	567,34	358,35	567,34	68,7	45,41	5,98	9,46
PG11 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	23,41	13,22	23,41	5,3	3,39	0,46	0,50
PG12 - Memória histórica, cultural e artística	105,02	31,38	105,02	14,1	6,11	1,95	1,71
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	31,95	12,12	31,95	3,6	2,42	0,26	0,67
PG14 - Saúde física e mental da população impactada	146,39	49,06	146,39	14,2	5,96	0,75	0,12
PG16 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	27,53	1,49	27,53	0,6	0,24	0,02	0,06
PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias	227,26	77,35	227,26	39,4	22,79	3,51	3,91
PG19 - Micro e Pequenos Negócios	21,61	4,67	21,61	7,6	1,75	0,83	0,35
PG21 - Auxílio Financeiro Emergencial	1.915,70	1.044,42	1.915,70	474,3	243,61	83,91	41,85
PG22 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	-	-	-	-	-	-	-
PG23 - Manejo dos rejeitos	334,21	112,35	334,21	64,4	49,23	4,86	7,60
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	1.034,60	875,05	1.034,60	208,8	122,31	24,27	10,73
PG25 - Recuperação área ambiental 1	462,93	330,37	462,93	23,4	9,63	2,32	1,67
PG28 - Conservação da biodiversidade	333,57	122,92	333,57	53,3	48,36	1,62	2,76
PG30 - Fauna e flora terrestre	56,65	14,48	56,65	7,3	3,97	0,38	0,07
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	256,39	149,25	256,39	100,9	71,44	7,60	9,37
PG37 - Gestão de riscos ambientais	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	390,70	167,73	390,70	26,4	17,50	1,95	2,84
PG39 - Unidades de conservação	5,25	2,74	5,73	1,9	2,38	0,04	0,58
PG41 Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	1.050,54	451,61	1.020,03	253,5	129,54	25,11	27,06
PG42 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	83,54	82,45	83,62	1,2	0,08	0,28	0,00
Total reparatórios	14.059,4	6.177,0	14.029,4	2.611,7	1.332,2	298,6	211,1
Total	18.686,6	6.677,0	18.656,1	2.820,3	1.414,4	317,3	216,7
