



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

agosto/2020

Sumário

Apresentação	5
Sumário Executivo	6
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	15
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	21
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas.....	26
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais.....	33
PG005 Programa de Proteção Social	38
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	43
PG007 Programa de Assistência aos Animais.....	66
PG008 Reconstrução de Vilas.....	74
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	90
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	96
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar.....	104
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística.....	108
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	112

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.....	115
PG015 Promoção da Inovação	119
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	122
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	127
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	137
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	141
PG020 Estímulo à Contratação Local	146
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	151
PG023 Manejo de Rejeitos	155
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	162
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas.....	169
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	175
PG028 Conservação da Biodiversidade.....	180
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	184
PG030 Fauna e Flora terrestre	188
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	192
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.....	199

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	205
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	210
PG035 Programa de Informação para a População	215
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	219
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	223
PG039 Unidades de Conservação	229
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	234
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	240
Glossário	245
Gestão Econômica	252

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em agosto de 2020, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em agosto foi protocolado Relatório Trimestral QAQC PMQQS referente ao trimestre FEV A ABR/20 em 07/08/2020 e o do Relatório Mensal QAQC PMQQS referente ao mês de JUL/20 28/08/2020 (PG038, pág. 223).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 155). Houve a conclusão da implantação da Estação de Tratamento Natural em Mariana.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 90) a qual, até o mês de agosto, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório. Buscando restabelecer as condições de operação da UHE, são contínuas as ações de infraestrutura como: realização de monitoramento dos instrumentos e estruturas, mostrando que as estruturas geotécnicas do PG09 apresentam condições de estabilidade adequadas; Elaboração de projetos de dragagem, desaguamento e tratamento. Processo de *Due diligence* e *handover* para Samarco em andamento.

No âmbito da conservação da biodiversidade (PG028, pág. 180), em atendimento à cláusula 165 do Termo de Referência 4, foi protocolado o Segundo Relatório Semestral

do Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente, junto à Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CTBio) e foi protocolado o Relatório Semestral “Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Planície Costeira do Rio Doce – agosto/2019 a janeiro/2020”. Em atendimento à alínea “c” da cláusula 164 do TTAC, foi protocolado o documento com a proposta do Plano de Ação para Reparação e Conservação da Biodiversidade Aquática do rio Doce, junto à Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CTBio).

Ainda em agosto, houve a publicação do Sumário Executivo de Conservação do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade terrestre no site do Comitê Interfederativo (CIF). O Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre do Rio Doce objetiva a elaboração de ações para conservação das espécies de fauna e flora potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais (PG030, pág. 188).

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 66), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 354 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.637 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade às atividades de entrega de alimentos aos animais. Houve a construção participativa de projetos executivos de pomares e hortas nos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Ponte Nova/MG, estas benfeitorias são pautas positivas na rotina produtiva das famílias rurais. E com objetivo de *report* do programa ao sistema Comitê Interfederativo (CIF) e clareza nas ações desenvolvidas, foi elaborada uma proposta de sumário do relatório quadrimestral do programa de

Retomada das Atividades Agropecuárias, para entrega de validação a Câmara Técnica de Economia e Inovação (CTEI), este documento está em acordo e atende a Nota Técnica 77/2020 CTEI (02/07/2020). (PG017, pág. 127). Na região do Médio e Baixo Rio Doce, houve o fornecimento de recursos financeiros para aquisição de silagem aos produtores rurais, localizados abaixo da Usina Risoleta Neves em Minas Gerais até o Espírito Santo, que estejam enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na manutenção de suas atividades produtivas, em atendimento à Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (SJMKG).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 169) e de Nascentes (pág. 175) —, que promoveu em agosto, dentre outras atividades, a elaboração do relatório anual de andamento do programa previsto na definição, além do retorno das atividades de implantação florestal do Ano 02 (2017/2018) na sub-bacia de Pontões e Lagoas, mediante liberação da sala de situação.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 15), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.395 famílias e 98.331 pessoas, desde o início do programa até agosto/2020.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 21). No mês de agosto, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 172 pessoas (97,7% dos 176 elegíveis). Destes, 168 receberam o pagamento das indenizações (97,7% dos atendidos). Em relação à campanha de Mariana, das 345 indenizações pagas até agora, 18 foram realizadas em agosto. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 151), atualmente existem 32.911 pessoas assistidas, com

um total de 14.763 pagamentos. Em agosto, 10 novos auxílios foram incluídos, todos por decisão judicial.

Neste eixo de trabalho da Fundação Renova, muito tem sido feito em busca da retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016, pág. 122). Em agosto, dentre as ações realizadas pelo programa, pode-se ressaltar a entrega dos relatórios parciais com informações preliminares de dados secundários dos municípios de Marliéria/MG, Pingo D'Água/MG, Raul Soares/MG, São Domingos do Prata/MG, Sem Peixe/MG, Timóteo/MG. Entrega do relatório de dados preliminares/secundários enviado pelos parceiros referente ao estudo da Caracterização Socioeconômica da Pesca, Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. Entrega do relatório final referente à sondagem da área de construção da Edificação de Povoação para a Associação de Pescadores Assemelhados de Povoação (APAP). Emissão do CNPJ e formalização da Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (ASPIPEC) em órgãos oficiais e normativos;

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 26) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 33), o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.214 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 236 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 38) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 115) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, para dar início das atividades do plano de trabalho acordado, houve a assinatura do termo de cooperação técnica e financeira junto ao município de Barra Longa/MG, no território do Alto do Rio Doce, realização do repasse de verba ao município de Santana

do Paraíso/MG, no território da Calha do Rio Doce, realização do repasse de verba ao município de Linhares/ES, no território do Foz Rio Doce, disponibilização de veículo e cartão combustível para a prefeitura de Itueta/MG, no território do Baixo Rio Doce e Disponibilização de veículo e cartão combustível para a prefeitura de Santana do Paraíso/MG no território da Calha do Rio Doce.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Garantir apoio psicopedagógico às escolas impactadas de Mariana e Barra Longa é um dos objetivos do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade, entres as ações realizadas no mês, pode citar a realização da devolutiva da avaliação psicopedagógica dos alunos das escolas de Mariana (PG011, pág. 104).

Em relação ao Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012, pág. 108), em agosto, houve a conclusão de oficina online de produção audiovisual com jovens de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo em Minas Gerais e conclusão do diagnóstico de bens arqueológicos nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova em Minas Gerais.

A título de preparação para emergências ambientais (PG034, pág. 210), em agosto, houve a conclusão da execução do cronograma de publicações da Assessoria Técnica Remota às Defesas Civis, que envolve estratégias para acompanhamento e continuidade das atividades desenvolvidas de apoio às Defesas Civis (Escola Segura,

Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Comitê Gestor de Riscos), durante o período de isolamento social devido a pandemia de COVID-19.

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente. Tais ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação econômica da região (PG018, pág. 137).

O programa de estímulo a contratação local (PG020, pág. 146) também merece destaque, dentre as ações realizadas pela Fundação Renova em agosto. Em relação a Assessoria Técnica Desenvolvimento de Fornecedores, pode-se citar a entrega do diagnóstico final de avaliação de desenvolvimento para a última empresa participante do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em Governador Valadares/MG e entrega dos relatórios individuais e do relatório final do 2º ciclo do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em Governador Valadares/MG.

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 43; PG035, pág. 215 e PG036, pág. 219), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros. O contato pode ser feito também pelos canais de relacionamento e ouvidoria disponíveis. A ouvidoria vem, desde a chegada do novo ouvidor-geral no final de 2019, passando por melhorias nos processos de gestão das manifestações, assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias recebidas.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Na frente de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032, pág. 199) dentre as ações realizadas pelo programa, pode-se citar perfuração do poço tubular em Regência, distrito de Linhares/ES, início das obras de fundação da captação da adutora do rio Corrente Grande, em Governador Valadares/MG, conclusão do projeto detalhado da captação principal, alternativa e sistema de tratamento de Pedras, distrito de Mariana/MG. Também foi concluído o projeto detalhado da nova estação de tratamento de água de Baixo Guandu/ES. No âmbito da Ação Civil Pública (ACP), houve a judicialização do Programa no contexto do Eixo Prioritário nº 9.

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 192), os repasses já realizados somam R\$ 12.220.043,27, contemplando os municípios de Alpercata/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Rio Casca/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 96), em agosto, houve o retorno das obras do Parque de Exposição, em Barra Longa/, conclusão de 69 Estruturas de Apoio Simples e conclusão da obra de Pavimentação de Camargos em Mariana/MG.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 74) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas

que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos. A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de junho:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em agosto, houve a conclusão do pavimento asfáltico da Rua Sagrado Coração de Jesus (est. 0 até est. 6) e do reforço de subleito (est. 6 até est. 15) na Área 1; Conclusão do pavimento intertravado das Ruas Alípio Viana e Cônego Veloso e do lançamento de rede de água bruta da Cônego Veloso na Área 3; Conclusão da instalação de 165 postes de iluminação urbana dos 291 planejados; Conclusão do projeto básico do Cemitério; Conclusão de projetos executivos de contenção para 3 casas; Conclusão de projetos executivos de fundação para 14 casas.

Paracatu de Baixo — em agosto houve o início da execução do gabião da Rua Monsenhor Horta; Início da execução da adutora de água tratada; Início da contenção da Trincheira; Conclusão drenagem longitudinal da Área 1; Conclusão de projetos básicos para 2 casa; Conclusão de projetos executivos de fundação para 6 casas e Cemitério.

Gesteira — em agosto houve tratativas e alinhamento junto aos stakeholders de forma a garantir o retorno das atividades de maneira segura.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em agosto, houve a emissão de 8 Licenças

Simplificadas; Aquisição de 2 imóveis; Conclusão de 1 projeto conceitual;
Conclusão de 3 projetos básicos.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusulas do TTAC: 20, 22, 25, 26 e 28 – Em andamento; 19 – Reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 251, 346 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

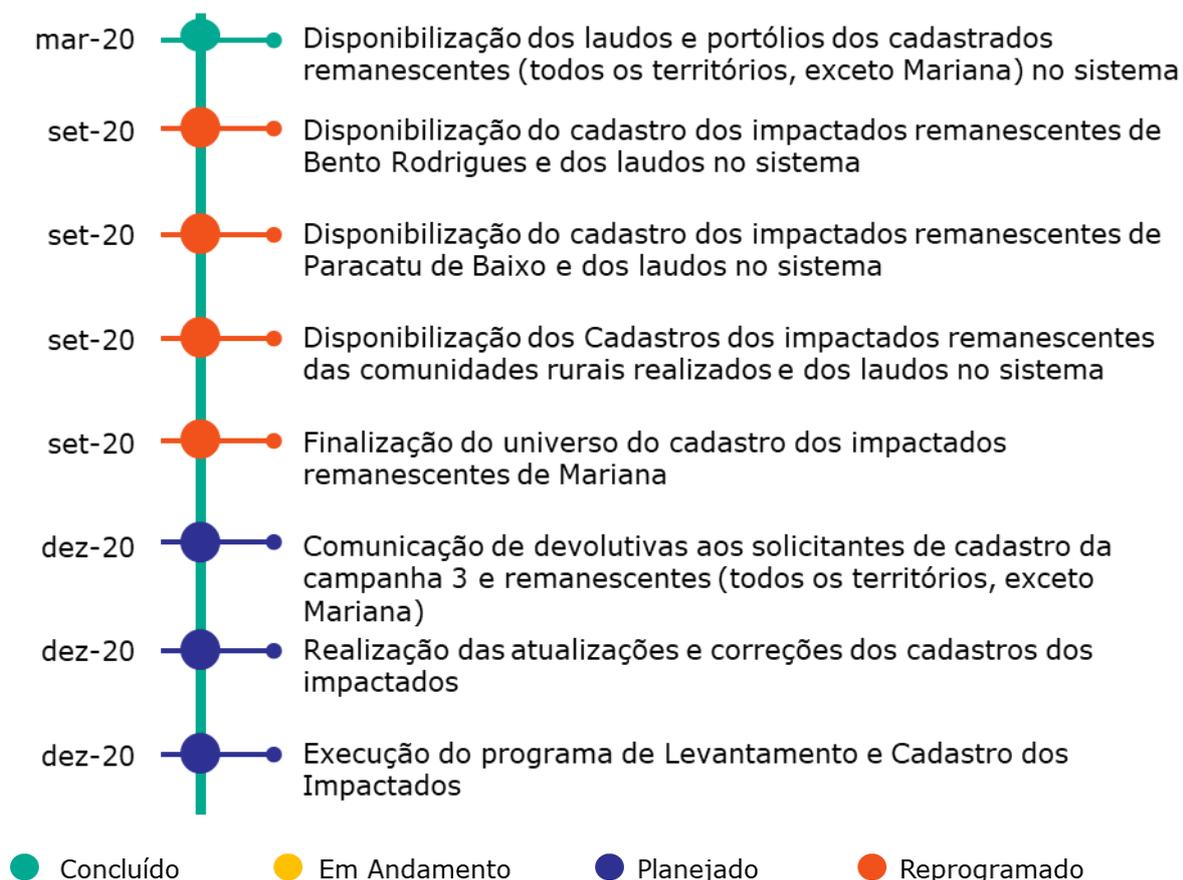

Grandes números do programa

- **60.149** solicitações de cadastro, desde o início do programa até agosto/2020.
- **34.870** cadastros enviados ao CIF, correspondente a **30.395** famílias e **98.331** pessoas, desde o início do programa até agosto/2020.

Fatos relevantes do mês

- Foram disponibilizados 25 dossiês pela Assessoria Técnica da Comissão de Atingidos de Mariana em agosto/2020.

Indicadores

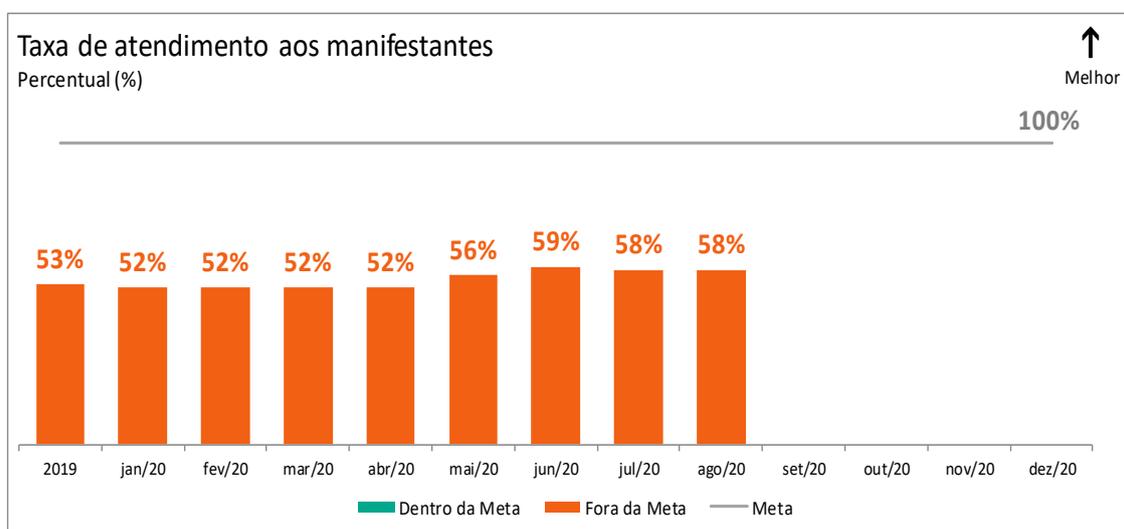


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado.

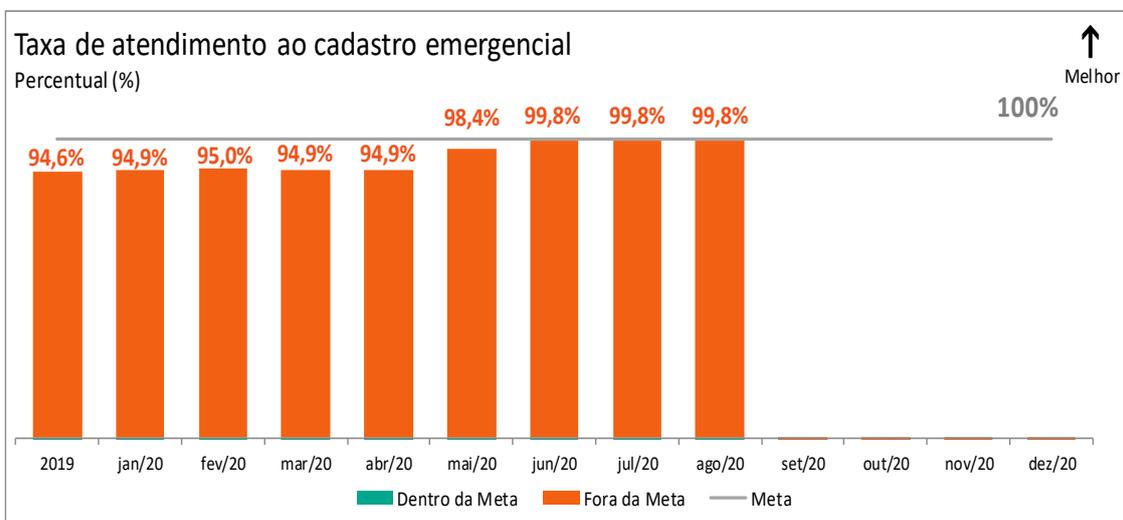


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado.

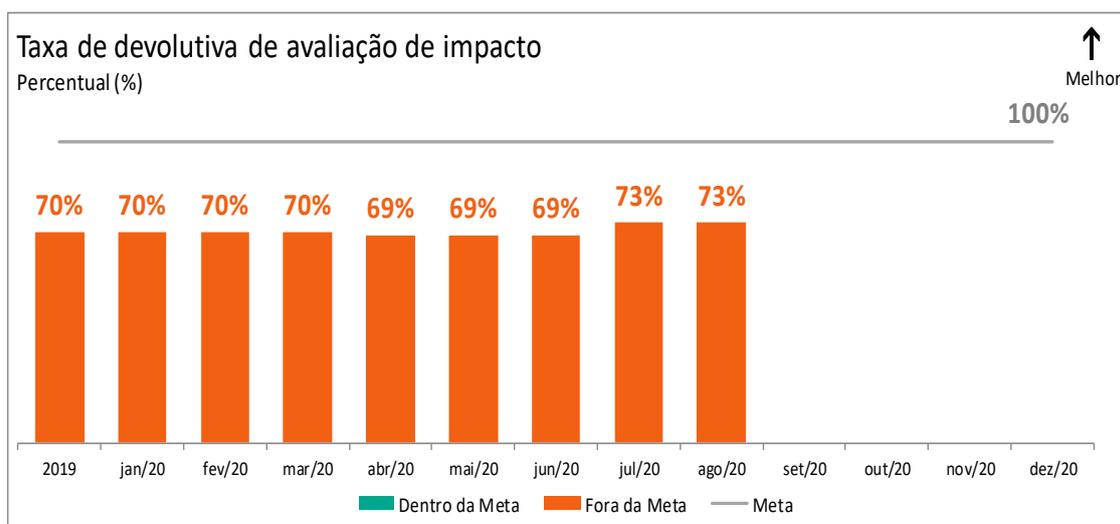


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.

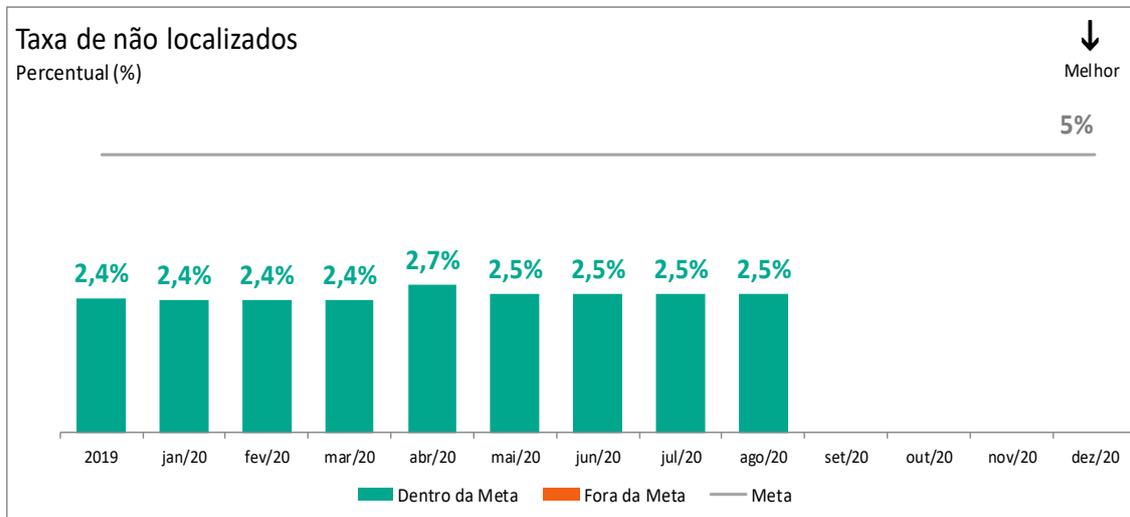


Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

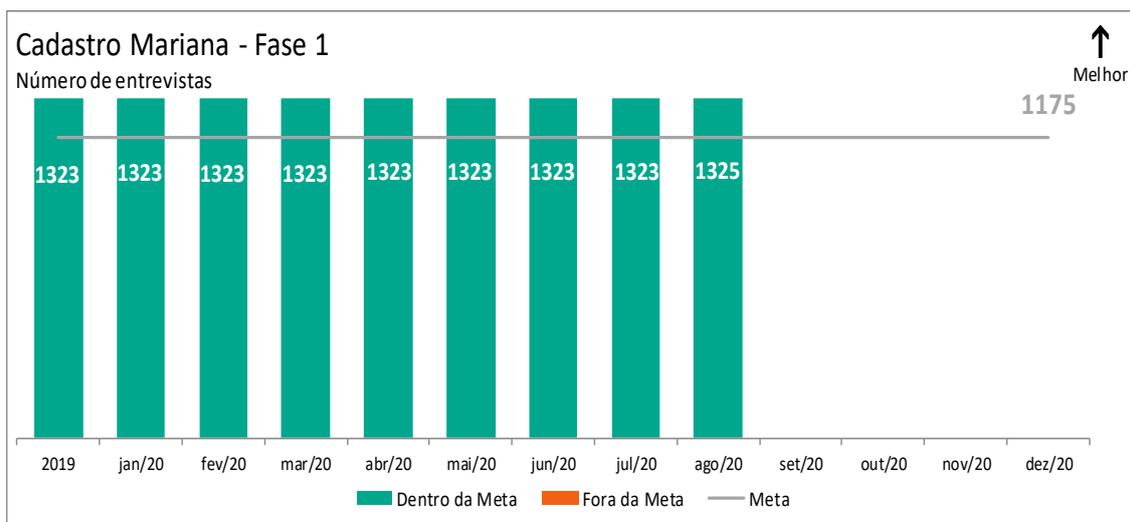


Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado.

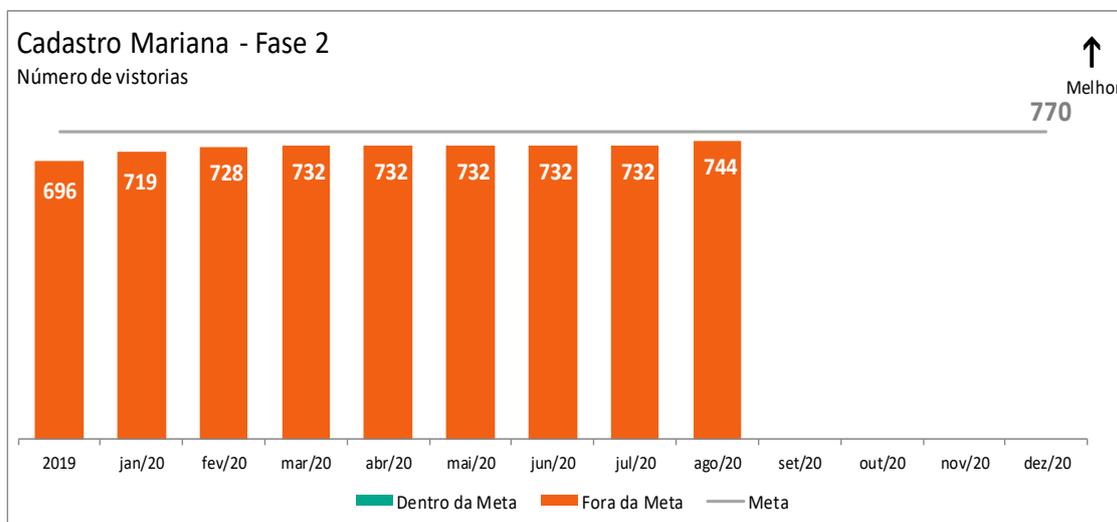


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado.

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço físico do programa.

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusulas do TTAC: 38 – Ação 1 - Judicializada e Ação 2 - Reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 18, 35, 119 – Itens 2 e 10, 141 – Item 4, 167 – Itens 1 e 2, 292 – Item 2 – Concluídas internamente; 111 - Item 6, 118 – Item 2, 181 - Itens 5 e 8, 422 – Item 2 – Em andamento; 167 - Item 3, 181 – Itens 6 e 7, 182 – Item 3, 211 - Item 2 – Judicializadas.

Entregas do ano 2020

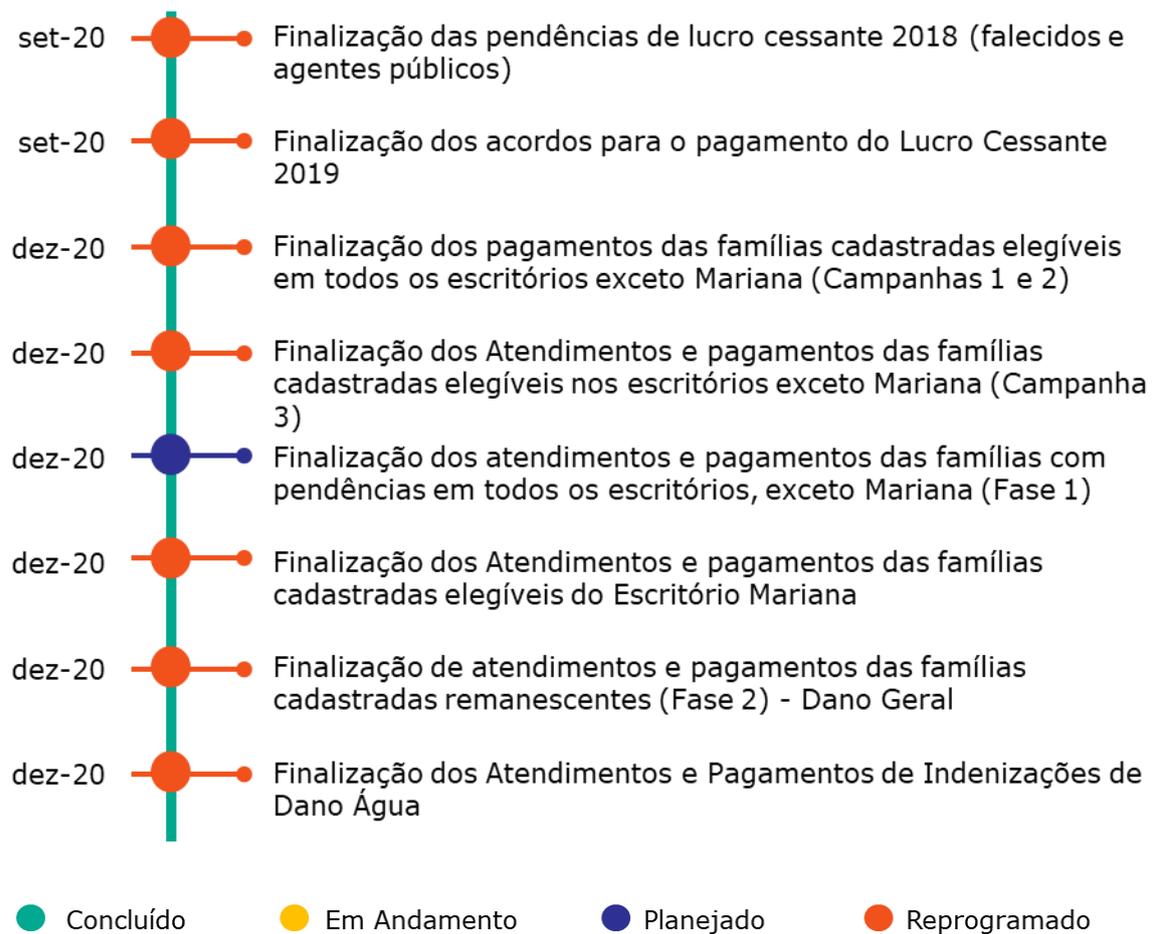

Grandes números do programa

- Para Dano Água, até o momento foram atendidas **320.178** pessoas, sendo que **270.372** aceitaram propostas. Destas, **270.312** propostas já foram pagas (**99,9%** das propostas aceitas). Além desse universo também foram pagas **7.900** indenizações referentes à Condenação Judicial e IRDR. Os pagamentos somam **R\$ 283,0 milhões**.
- Para Danos Gerais, **10.185** núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que **10.137** já foram pagos (**99,5%** dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 919,4 milhões**.

Fatos relevantes do mês

- Recebimento do aceite de 02 (dois) novos casos dos Camaroeiros da Enseada do Suá. Até o momento, foram atendidas **172** pessoas (**97,7%** dos **176** elegíveis). Destes, **168** receberam o pagamento das indenizações (**97,7%** dos atendidos).
- Pagamento de 18 (dezoito) indenizações de Mariana. Até o momento, foi realizado o pagamento de **345** indenizações, o que representa **90,3%** do total das **382** propostas aceitas.

Indicadores

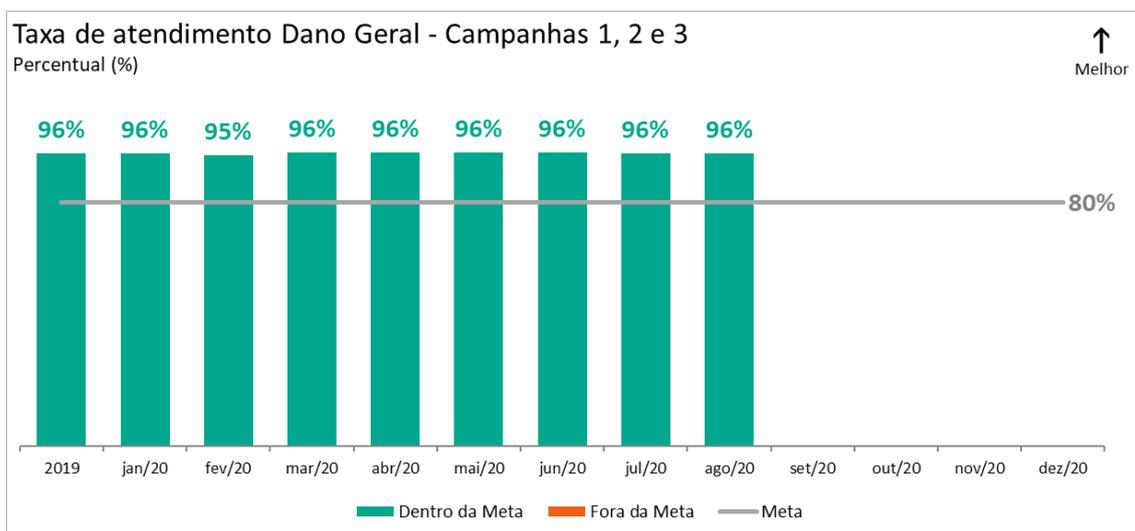


Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 – agosto/2020). Gráfico Acumulado.

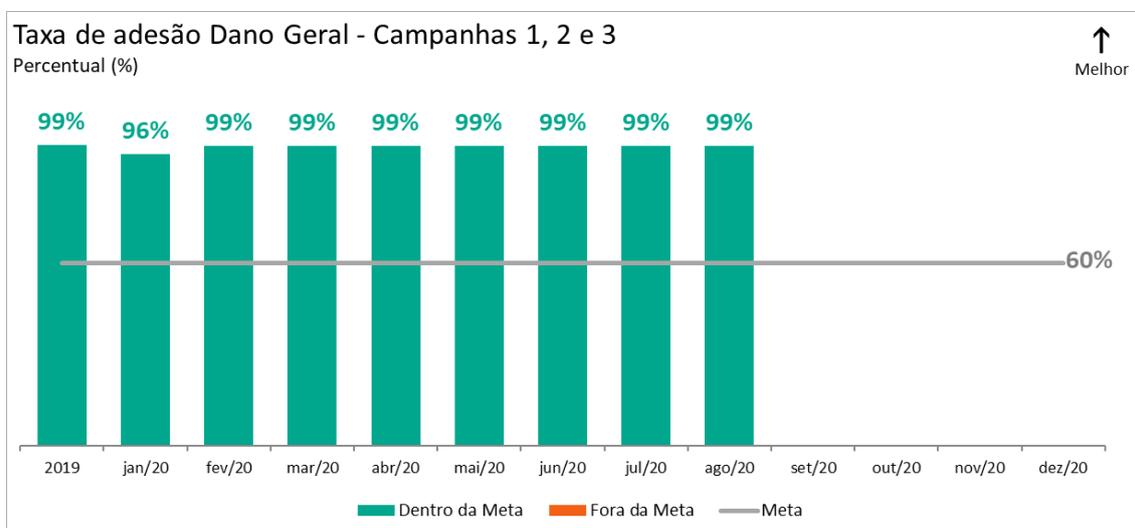


Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 – agosto/2020). Gráfico Acumulado.

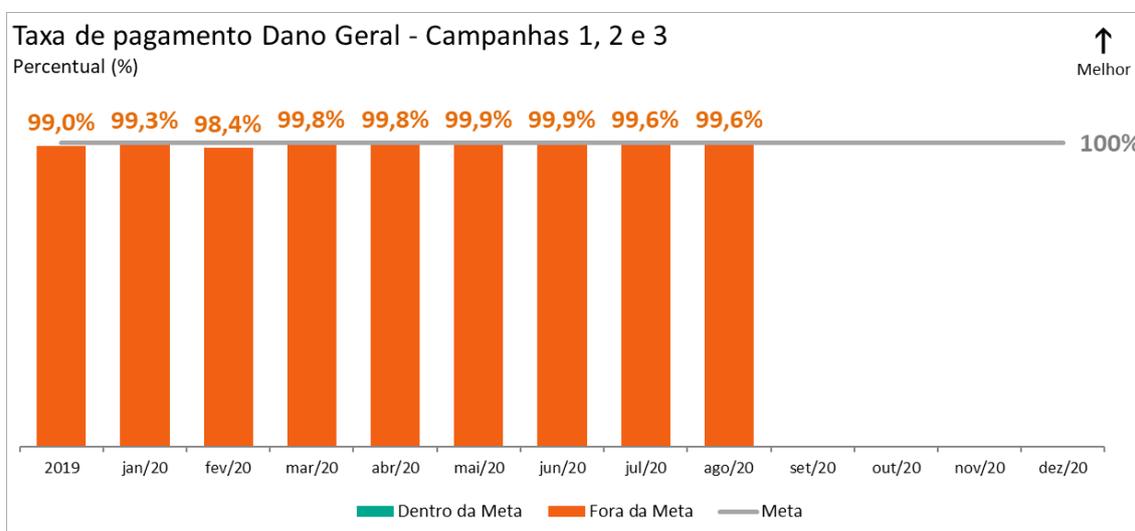


Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 – agosto/2020). Gráfico Acumulado.

Curva S

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento do avanço do programa.

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusulas do TTAC: 39, 43 - Incisos I, II, IV e V, 44 - Incisos II e IV - Em andamento; 43 - Parágrafo 1º e Inciso III, 44 - Incisos I e III - Concluídas internamente; 44 - Inciso V - Planejadas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 169 - Item 1, 187 - Itens 1 e 2, 201 - Item 2, 205 - Itens 2 e 3, 227 - Itens 1 e 2, 231 - Item 1, 299, 335 - Itens 2 e 3 e 360 - Concluídas internamente; 155 - Item 2, 201 - Item 1, 206 - Item 1 - Em andamento; 231 - Itens 2 e 3 - Planejada.

Entregas do ano de 2020*



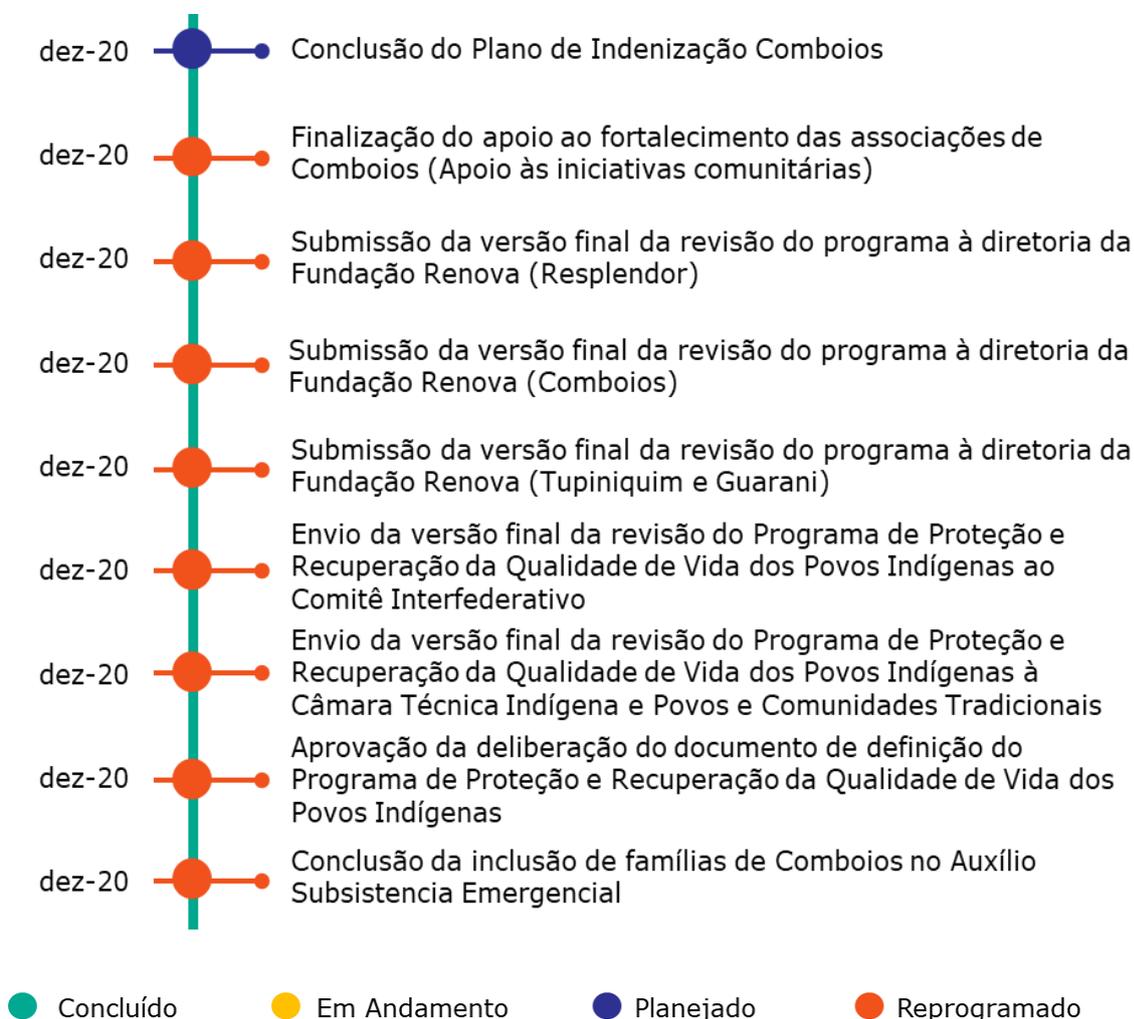

NOTA: *O CRONOGRAMA ESTÁ EM REVISÃO. COM A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, AS TAREFAS QUE NECESSITAM DE ESFORÇOS PRESENCIAIS FORAM REPROGRAMADAS.

Grandes números do programa

- **1.587 titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- **600 pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor de 21/07/2020 até 20/08/2020 (total de 90.000 litros);
- **142 pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- **147 pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor.

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.504.366,76 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822.xxx-1; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIACAO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE IRAJÁ; ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE AREAL; ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM AITG; ASSOCIACAO TUPINIKIM GUARANY D ATUGUAA e ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22;

02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1214 famílias indígenas das terras Tupiniquim-Guarani. As 1214 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 70 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 238 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM PAU BRASIL, 123 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE IRAJÁ, 51 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE AREAL, 700 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM AITG, 32 famílias da ASSOCIACAO TUPINIKIM GUARANY D ATUGUAA. O total de R\$ 2.504.366,76 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.045,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações;

Comboios

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 886.891,74 na conta bancária número (Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 13.xxx-2) da associação indígena de COMBOIOS, registrada sob o número de CNPJ 02.536.221/0001-04, para ser distribuído pela Associação Indígena à 236 famílias indígenas da terra de Comboios. As 236 famílias indígenas estão distribuídas na Associação Indígena de COMBOIOS. O total de R\$ 886.891,74 compreende o pagamento mensal de 2,5 salários mínimos por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxa administrativa para a Associação;
- Distribuição de água para a comunidade de Comboios – 33.340 litros distribuídos entre 01/08/2020 até 31/08/2020 (total de 1.667 galões de 20 litros).

Resplendor

- A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.288.485,00 nas contas bancárias números (Banco do Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; e 20.076.203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKAN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.288.485,00 compreende o pagamento mensal de R\$ 9.405,00 para cada uma das 137 famílias;
- Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – 5 litros por pessoa por dia de Água Mineral de 21/07/2020 até 20/08/2020 (total de 90.000 litros);
- Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/07/2020 até 20/08/2020;
- Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/07/2020 até 20/08/2020;

- Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40 kg para 108 famílias de 21/07/2020 até 20/08/2020.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa*

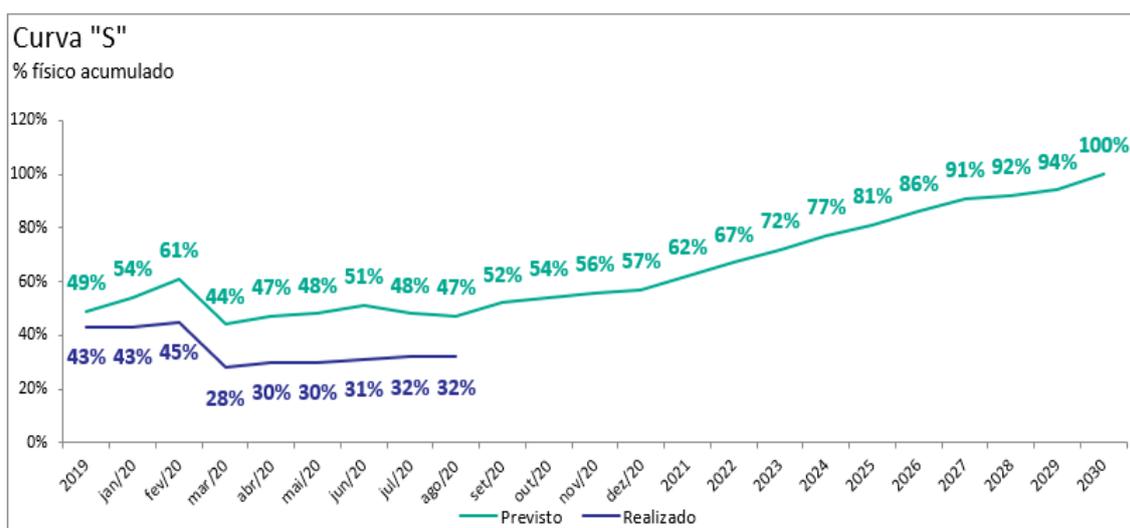


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

NOTA: *CURVA S SUJEITA A ALTERAÇÕES DEVIDO À POSSÍVEIS REVISÕES NO ESCOPO DO PROGRAMA E CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA. O PERCENTUAL PREVISTO DE AGOSTO/2020 ESTÁ MENOR QUE O PERCENTUAL PREVISTO DE JULHO/2020 DEVIDO AO PROCESSO DE GESTÃO DE MUDANÇAS REALIZADO. O RESULTADO DE AGOSTO/2020 REPRESENTA 68% DO PLANEJADO PARA O MÊS.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusulas do TTAC: 46 – Em andamento; 46 – parágrafo 2º – Concluída internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 154 - Item 1, 161 - Itens 1, 2 e 3, 202 - Itens 1, 2a, 2b, 2c, 3 e 4, 203 - Item 1, 204 - Item 1, 231 - Item 1, 232 - Item 1, 255 - Item 5, 256 - Itens 1, 2 e 3, 280 - Itens 1, 4 (ação 1) e 4 (ação 2), 281 - Itens 1 e 3, 298 - Item 1, 300 - Itens 1 e 2, 356 - Concluídas internamente; 155 - Item 2, 232 - Item 2, 233 - Item 2, 298 - Item 2 e 329 - Item 1 - Em andamento; 231 - Itens 2 e 3, 281 - Item 4 - Planejadas; 333 - Item 2 - Reprogramada; 202 - Item 5, 423 - Itens 3 e 4 - Judicializadas.

Entregas do ano de 2020*



dez-20  Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

 Concluído  Em Andamento  Planejado  Reprogramado

NOTA: *O CRONOGRAMA ESTÁ EM REVISÃO. COM A PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, AS TAREFAS QUE NECESSITAM DE ESFORÇOS PRESENCIAIS FORAM REPROGRAMADAS.

Grandes números do programa

- **387 titulares** (178 quilombolas, 105 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar de 01/08/2020 até 31/08/2020;
- **185 famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo de 03/08/2020 até 31/08/2020.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

- Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas elegíveis de Degredo – 178 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo;
- Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 15 litros por pessoa por dia, de 03/08/2020 até 31/08/2020 (total de 247.580 litros).

Faiscadores

- Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos faiscadores elegíveis – 209 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa*

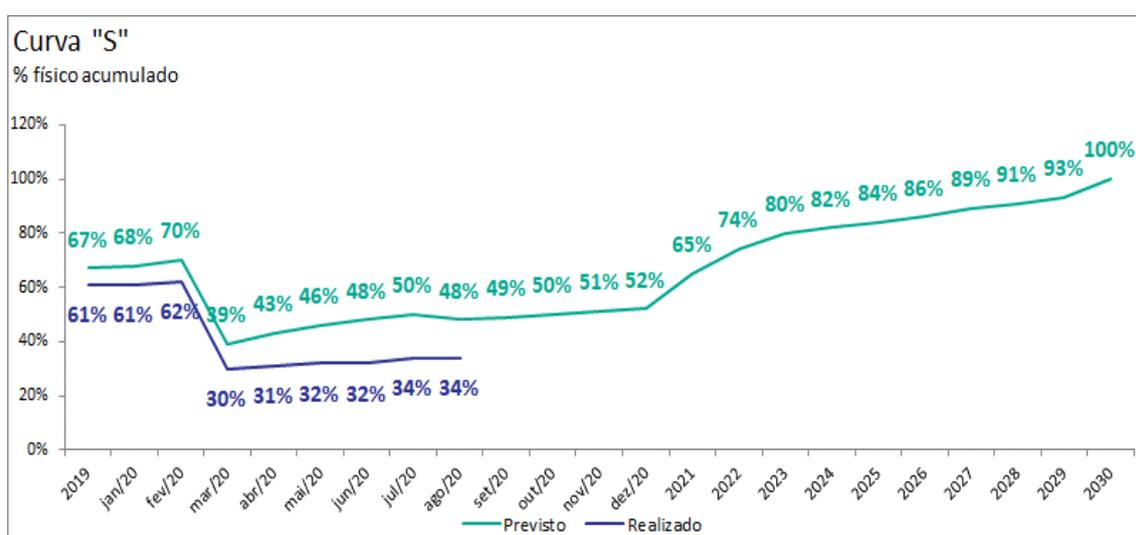


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

NOTA: *CURVA S SUJEITA A ALTERAÇÕES DEVIDO À POSSÍVEIS REVISÕES NO ESCOPO DO PROGRAMA E CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com deslocamento físico.

Cláusulas do TTAC: 58 – Concluída internamente; 54 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 141 – Item 4, 167 – Itens 1 e 2, 180 – Item 1, 192 – Item 2, 278 – Itens 1.1, 1.2 e 1.3, 292 – Item 2, 307 – Item 1, 330 e 332 – Concluídas internamente; 167 – Item 3 e 307 – Item 2 – Judicializadas.

Entregas do ano de 2020*



dez-20  Conclusão da elaboração dos Planos Integrados para promoção da Proteção Social junto aos programas de interface da Fundação Renova

 Concluído  Em Andamento  Planejado  Reprogramado

NOTA: *O CRONOGRAMA ESTÁ EM REVISÃO.

Grandes números do programa*

- **22 profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) atuaram nos municípios de **Mariana/MG** (20 profissionais) e **Barra Longa/MG** (02 profissionais) no período de 21/07/2020 até 20/08/2020.

*O NÚMERO REPORTADO PELO FORNECEDOR REFERE-SE AO NÚMERO EFETIVO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO PERÍODO DA MEDIÇÃO, DESCONSIDERANDO, POR EXEMPLO, AQUELES DE FÉRIAS OU AFASTADOS (PODENDO, PORTANTO, VARIAR DE UM RELATÓRIO PARA OUTRO) E ESTÁ SUJEITO À APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO REALIZADA ENTRE FORNECEDOR E FUNDAÇÃO RENOVA.

Fatos relevantes do mês

- Assinatura do termo de cooperação técnica e financeira junto ao município de Barra Longa/MG, no território do Alto do Rio Doce, para início das atividades do plano de trabalho acordado;
- Realização do repasse de verba ao município de Santana do Paraíso/MG, no território da Calha do Rio Doce, para início das atividades previstas no plano de trabalho acordado com o município;
- Realização do repasse de verba ao município de Linhares/ES, no território do Foz Rio Doce, para início das atividades previstas no plano de trabalho acordado com o município;
- Disponibilização de veículo e cartão combustível para a prefeitura de Itueta/MG, no território do Baixo Rio Doce, como previsto no plano de trabalho assinado pelo município junto à Fundação Renova;

- Disponibilização de veículo e cartão combustível para a prefeitura de Santana do Paraíso/MG no território da Calha do Rio Doce, como previsto no plano de trabalho assinado pelo município junto à Fundação Renova.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa*

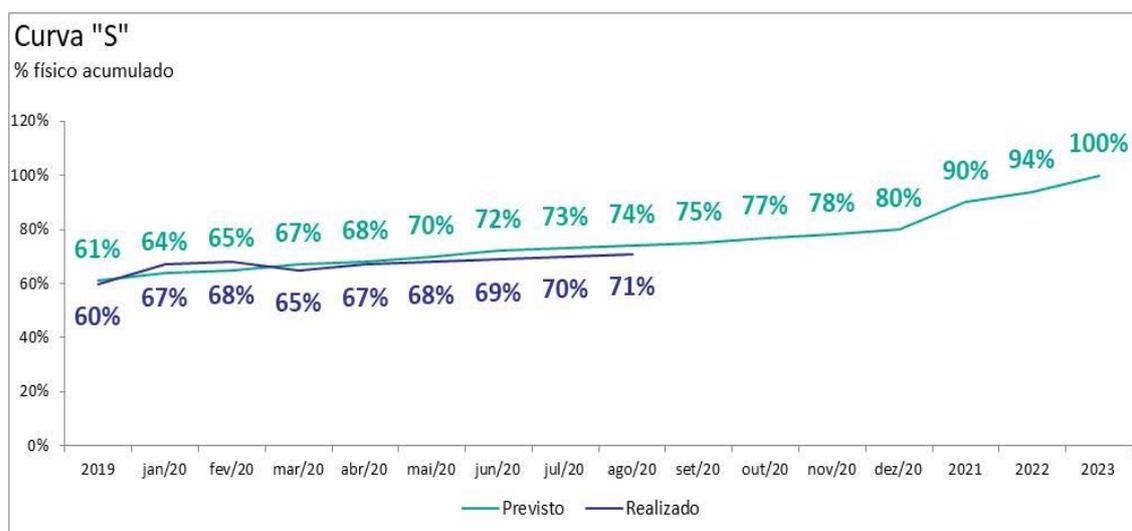


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

NOTA: *CURVA S SUJEITA A ALTERAÇÕES DEVIDO ÀS REVISÕES NO ESCOPO DO PROGRAMA E CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivos

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Apoiar os demais programas da Fundação Renova, no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no TTAC. Sua transversalidade visa garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação, executadas pela Fundação Renova, sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe ressaltar ainda, o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria - que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva territorial.

Cláusulas do TTAC: 59 – Planejada; 65, 66, 67 – Itens a, b, c, 68, 69, 70, 71 e 72 – Concluídas internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 105 – Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

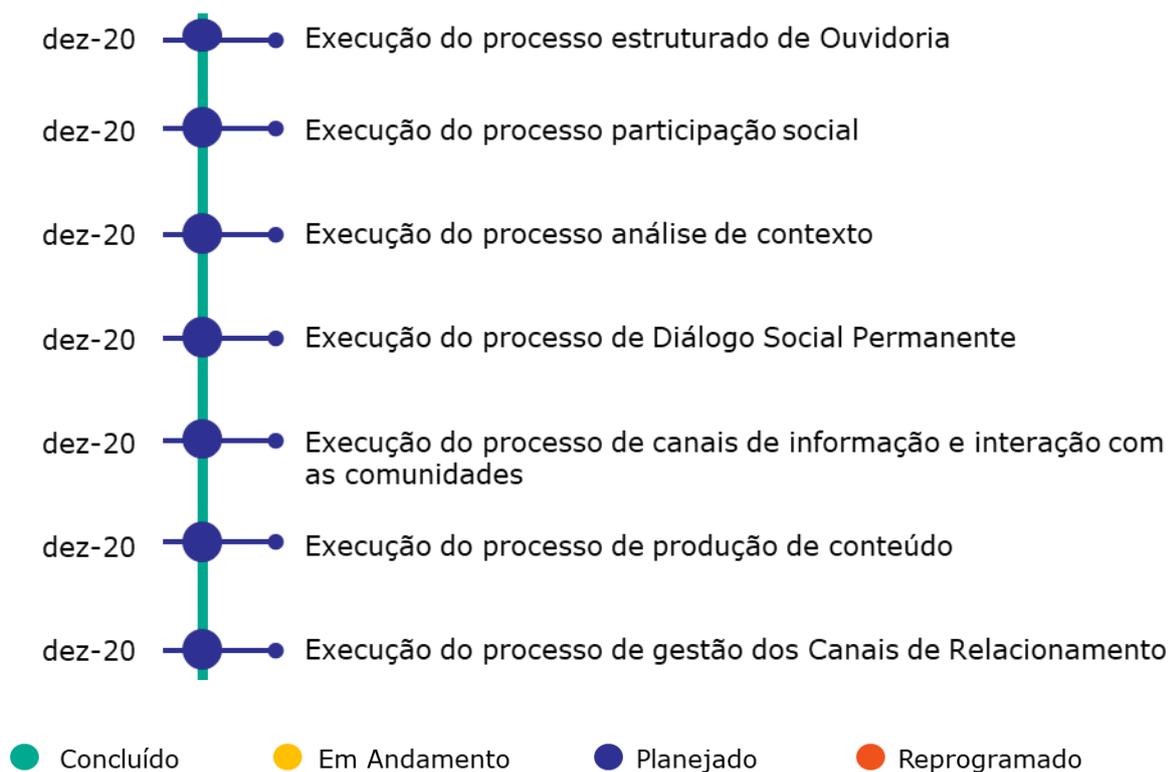

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	Julho/2020	Agosto/2020	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	18	30	3240
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	8	14	911
Reuniões Realizadas – Outras Localidades	-	-	11
Total de Participantes em Reuniões		-	113.04

Fatos relevantes do mês

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias e em atenção ao contexto da pandemia da Covid-19 (coronavírus) e seus desdobramentos, as equipes de Diálogo Social mantêm suas atividades em regime de teletrabalho, tendo sido suspensa a realização de ações presenciais de relacionamento, participação e controle social junto aos públicos de interesse.

Nesse contexto, as principais atividades desenvolvidas foram:

- Continuidade da implementação do Protocolo Social do Reassentamento, em conjunto com os programas de Reassentamento, Proteção Social e Saúde Física e Mental, para manutenção dos atendimentos às famílias em situação de deslocamento físico, no município de Mariana, durante o período de isolamento social. Neste mês, destaque para as ações de acompanhamento de indícios de vulnerabilidade social junto à população idosa; apresentação do Projeto Júpiter,

voltado para a formação de lideranças jovens; mobilização para cursos profissionalizantes ofertados pela Renova em parceria com o Senai; divulgação de vagas de trabalho em aberto; esclarecimentos sobre a desmobilização de equipes das obras dos reassentamentos; e fluxo de solicitação de manutenção das estradas.

- Continuidade da realização de reuniões com o Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo, a partir de ferramentas de comunicação remota, para discussões acerca do reassentamento coletivo da comunidade, como tratativas relacionadas à apresentação do panorama geral das obras e de metodologia para visita virtual aos lotes do reassentamento, além de discussão acerca das ações de manutenção da Igreja de Santo Antônio.
- Em Linhares, Aracruz, Governador Valadares, Alpercata, Periquito, Naque, Belo Oriente, Tumiritinga, Galileia e Conselheiro Pena, foram realizadas reuniões com lideranças sociais para apresentação do Projeto Lótus – Formação de Lideranças Jovens, promovido pelo Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, que tem como objetivo o engajamento de jovens em projetos voltados à revitalização ambiental, social, econômica e cultural da região.
- Em Santa Cruz do Escalvado, foi realizada reunião com moradores da comunidade de Florestinha para devolutiva à solicitação de aporte financeiro e aquisição de equipamentos para implantação de uma fábrica de blocos e apresentação das linhas de crédito oferecidas para a execução de projetos no território.
- Em Linhares, foi realizada reunião com representantes da Comissão Quilombola do Degredo e Associação dos Pescadores, Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo (Asperqd) para construção da metodologia para consulta pública do Plano Básico Ambiental Quilombola da comunidade.
- No município de Rio Casca, foi realizada reunião com a Associação de Pescadores de Rio Casca (Asperc) para devolutiva às solicitações de apoio à formalização da

Associação e atendimento pelo Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras para construção de projeto de Psicultura.

- Em Galileia e Baixo Guandu, foram realizadas reuniões com pescadores do município para apresentação e discussão das ações promovidas pelo Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras.
- Em Patrimônio da Lagoa (Sooretama), foi realizada reunião com moradores para devolutivas sobre a manutenção do sistema de bombeamento do brejo da lagoa Juparanã, repasse sobre as ações de limpeza e manutenção da areia da “praia” e informações sobre o monitoramento da qualidade da água bruta e captação de água para abastecimento.
- Em Itueta, foi realizada reunião com a Associação dos Apicultores e Meliponicultores do Território Rio Doce Krenak e Região – Apiridoce para definição de estratégias de ampliação de mercado, por meio do Marketing Digital, tendo em vista o cenário econômico causado pela pandemia da Covid-19.
- No Assentamento 1º de Junho (Tumiritinga), foi realizada reunião com representantes do grupo Arte Viva para discussão de ações relacionadas ao empoderamento feminino e empreendedorismo social, além da apresentação de possibilidades de apoio à formalização do grupo.
- Em Bom Jesus do Galho, foi realizada reunião com a Comissão Local de Revés do Belém para apresentação dos programas da Fundação Renova que atuam no território e as ações para continuidade do atendimento durante o período da pandemia da Covid-19.
- Manutenção constante de diálogo com lideranças sociais, pessoas atingidas e demais públicos dos municípios impactados, para esclarecimentos a respeito da atuação da Fundação Renova no período de isolamento social e divulgação de ações em curso e planejadas pela Fundação Renova nas localidades.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2019).

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2019)	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2019)
8.013*	133,55

* PARA A OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO "MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO", HOUE UMA MODIFICAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE CÁLCULO, DEVIDO À VERIFICAÇÃO DE UMA INCONSISTÊNCIA NA CONTABILIZAÇÃO DOS DADOS.

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS DE REFERÊNCIA	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
Janeiro/2020	249	282,33
Fevereiro/2020	321	
Março/2020	277	79,66
Abril/2020	94	
Maió/2020	64	
Junho/2020	81	208,5
Julho/2020	125	
Agosto/2020	292	

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Indicadores (agosto/2020).

INDICADOR (Valores Acumulados) *	JULHO 2020	AGOSTO 2020
Total de manifestações	665.567	671.904
Manifestações em tratamento	57.615	58.218
Manifestações respondidas	607.952	613.686
Manifestações registradas pelo 0800	530.033	534.603
Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	117.947	118.569
Manifestações registradas pelo Fale Conosco	12.748	12.777
Manifestações registradas pelo Portal do Usuário	4.839	5.955
Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	152.735	154.082
Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	23	16

*Os Indicadores relativos ao total de manifestações do Fale Conosco e do Portal do Usuário podem sofrer alterações, na comparação com relatórios passados, em função de ações de revisão da base, de forma a corrigir duplicidades de protocolos.

Em função do contexto de restrição às atividades presenciais e da orientação de isolamento social, devido aos riscos gerados pela pandemia do Coronavírus, não foi possível apurar os dados da Pesquisa de Satisfação das unidades dos CIAs. A seguir, segue resultado da pesquisa do 0800 e Fale Conosco.




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1 (agosto/2020).




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2, Q1=SIM (agosto/2020).




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2, Q1=NÃO (agosto/2020).

Fatos relevantes do mês

- Gestão e monitoramento das solicitações de silagem, a partir das definições da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. O Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias - *PG17* finalizou as análises de todos os proprietários conforme planilha em anexo. Ao final das análises, das 224 propriedades rurais analisadas, 135 foram consideradas elegíveis ao fornecimento de silagem – e já foram atendidas – e 89 foram consideradas inelegíveis. A Fundação Renova está em contato com cada proprietário rural para informar os motivos de inelegibilidade e, no caso, dos elegíveis, confirmar o recebimento. Os contatos serão finalizados em setembro deste ano.
- Produção e distribuição de Tutorial Interno – segunda versão - para tratamento de Casos Críticos.

- Acompanhamento e tratativa de solicitações referentes ao Portal do Advogado, conforme decisão judicial da 12ª Vara, disponível neste momento para Baixo Guandu e Naque. O objetivo é o esclarecimento de dúvidas e direcionamento de demandas relacionadas ao tema, tanto por parte dos atingidos, quanto de seus advogados.
- Apoio à Assessoria Técnica Rosa Fortini com o registro de manifestações no Portal do Usuário dos protocolos de Contestação aos pareceres da Deliberação CIF 300, 333 e 356 encaminhados pela mesma assessoria dentro do contexto da pandemia do COVID-19.
- Continuidade do projeto Guardiões de Temas, após reestruturação, que tem o objetivo de monitorar as manifestações registradas no SGS, com status “em tratamento”, tendo um guardião (líder) por tema. A proposta é de tratar e responder às dúvidas que ainda estão abertas junto aos manifestantes. Neste momento, foi iniciada a frente de tratamento de manifestações do ano de 2016. Tratamento de manifestações do PG032 Programa de Abastecimento de Água Tratada, que consistiu em fornecedor devolutivas das manifestações aos atingidos. 21 casos se referiram a devolutivas conclusivas, em que só havia manifestação em tratamento do referido programa e 736 casos em que havia manifestação sobre outro assunto, ainda em tratamento pela Fundação renova.
- Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes.
- Continuidade da capacitação dos atendentes das unidades dos CIAs em Língua Portuguesa, como forma de qualificar e aperfeiçoar os registros das solicitações

acolhidas por esses profissionais, junto aos públicos de atendimento da Fundação Renova.

- Início do treinamento “Atendimento em Foco”, que busca abordar as dimensões teóricas e práticas de atendimento, diálogo e relacionamento com os públicos atingidos, com foco no Diálogo Cooperativo, Mediação de Conflitos e Comunicação Não Violenta.
- Realização de treinamentos dos atendentes (Fale Conosco, Central 0800 e CIAs) para melhor compreensão e aplicação do documento de Perguntas e Respostas (Q&As) relativo à Política Indenizatória do “Pescador de Fato”, pelo Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova.
- Realização de contatos ativos, pelos atendentes das unidades dos CIAs do Médio Rio Doce, Baixo Rio Doce e Foz/Litoral ES, para solicitar autorização de visitas técnicas do Programa Manejo de Rejeitos (PG23) em propriedades rurais localizadas nos municípios atingidos, para coleta de amostras de solo.
- Realização de contatos ativos, pelos atendentes das unidades dos CIAs do Baixo Rio Doce, para divulgação de cursos *online* oferecidos pelo Senai em parceria com a Fundação Renova, no município de Baixo Guandu, para profissionalização de jovens nas áreas de empreendedorismo, mecânica, tecnologia da informação e suprimentos.
- No Alto Rio Doce, foi realizada análise das 48 manifestações sobre Moradia Temporária, vinculadas ao Programa de Infraestrutura, para mapeamento do status das manifestações e qualificação das principais demandas encontradas, a fim de identificar entraves e articular estratégias para respostas qualificadas às solicitações.

- No território de Mariana foram realizadas reuniões de alinhamento para discussão dos casos e disponibilização de devolutivas intermediárias e finais a manifestações sobre Moradia Temporária, vinculadas ao Programa de Reassentamento, relativas aos subtemas de Reparos, Móvel e Mudança/Nova Moradia. As atendentes dos CIAs realizaram análise e categorização das manifestações em tratamento no território, buscando qualificar as demandas pendentes de tratamento pelo Programa.
- Continuidade do recebimento, análise e encaminhamento de documentos físicos, nas unidades dos CIAs de Naque, Governador Valadares, Belo Oriente e Periquito, referentes às solicitações de atendimento pelo Cadastro Integrado Fase 2, como alternativa ao envio digitalizado por meio do Portal do Usuário no período de isolamento social.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

O pilar Comunicação não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Comunicação com territórios:

- Rádio Renova: veiculação de oito diferentes programas (Momento Renova) para os territórios Mariana, Alto Rio Doce, Calha, Médio, Baixo e Foz, na programação semanal de diversas rádios dessas áreas de abrangência. O Momento Renova contou com um total de 48 programas em agosto, com 144 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.
- Produção de pílula de *WhatsApp* e programas da Rádio Renova com informações sobre a Agenda Integrada, ação integrada entre a Fundação Renova, os governos de Minas Gerais e Espírito Santo, com a participação do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce.

Mariana:

- Elaboração e distribuição digital da 12ª edição do Boletim Jornada para a população de Mariana.

Calha do Rio Doce:

- Elaboração e distribuição digital da 3ª edição do Boletim Jornada para a população do território Calha do Rio Doce.

Médio Rio Doce:

- Produção e distribuição digital da 4ª edição do Boletim Jornada para a população de Governador Valadares;
- Produção e distribuição digital da 6ª edição do Boletim Jornada para a população de Belo Oriente, Naque e Periquito;
- Elaboração de pílulas de *WhatsApp* para convidar moradores de Tumiritinga, Conselheiro Pena, Naque, Belo Oriente, Periquito, Governador Valadares e Galileia para as Oficinas Temáticas em formato virtual. As reuniões apresentaram ações da Renova em andamento nas comunidades dentro dos temas Economia e Inovação e Retomadas das Atividades Aquícolas e Pesqueiras.

Baixo Rio Doce:

- Produção e distribuição digital da 7ª edição do Boletim Jornada para a população de Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia.

Foz do Rio Doce:

- Produção e distribuição da 11ª edição do Boletim Jornada para a população de Linhares;
- Produção e distribuição digital da 5ª edição do Boletim Jornada para a população de Degredo;
- Produção e distribuição digital da 5ª edição do Boletim Jornada para a população do entorno da Lagoa Juparanã;

- Elaboração da 12ª edição do jornal Voz da Foz, com produção finalizada em julho e distribuição digital em agosto. Informativo das comunidades de Areal, Entre Rios, Povoação e Regência.

Suporte aos Programas:

PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados

- Elaboração de cartilha com orientações sobre o atendimento remoto a pessoas cadastradas em Mariana que tenham sido consideradas elegíveis à indenização;
- Produção de cartilha para orientar pescadores do distrito de Patrimônio da Lagoa, em Regência, sobre atendimento remoto e utilização de um aplicativo para identificar suas embarcações. Também foi produzido um áudio com esse conteúdo para aqueles que têm dificuldade com a leitura.

PG07 – Assistência aos Animais

- Elaboração de *banners* informando a adoção de dois cães.

PG08 – Reconstrução de Vilas (Bento Rodrigues)

- Divulgação da 14ª edição do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues, com informações atualizadas sobre o andamento das obras;
- Produção de álbuns digitais para acompanhamento remoto dos avanços das obras das casas de Bento Rodrigues;

- Elaboração de cartaz A3 para portaria do reassentamento de Bento Rodrigues comunicando a suspensão das visitas ao local em função das regras sanitárias impostas pela Covid-19.

PG08 – Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)

- Divulgação da 14ª edição do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com informações atualizadas sobre o andamento das obras;
- Elaboração da 2ª e 3ª edições do álbum digital para acompanhamento remoto dos avanços das obras de Paracatu de Baixo;
- Produção de cartaz A3 para portaria do reassentamento de Paracatu de Baixo comunicando a suspensão das visitas ao local em função das regras sanitárias impostas pela Covid-19;
- Elaboração de caderno de visita remota a lote do reassentamento de Paracatu de Baixo;
- Produção de álbuns digitais para acompanhamento remoto dos avanços das obras das fundações do reassentamento de Paracatu de Baixo.

PG08 – Reconstrução de Vilas (Gesteira)

- Elaboração de pílula de *WhatsApp* convidando as famílias de Gesteira para participarem da reunião virtual sobre Reassentamento Familiar;

- Produção de cartilha com informações sobre o Reassentamento Familiar para famílias de Gesteira.

PG12 – Memória Histórica, Cultural e Artística

- Publicação de *post* em rede social para divulgar videoaula gratuita do curso de Cuidados com a Pele;
- Produção de pílula de *WhatsApp* e *post* em rede social para divulgar a videoaula gratuita do curso de Precificação de Peças Artesanais;
- Produção de pílula de *WhatsApp*, matéria para o programa da Rádio Renova e *post* em rede social para divulgar videoaula gratuita do curso de Cuidados com a Terra: Produção de Fertilizantes e Inseticidas Naturais;

PG13 – Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

- Divulgação dos cursos *on-line* gratuitos do projeto de Desenvolvimento do Empreendedorismo Turístico por meio de pílula de *WhatsApp*, *e-mail marketing*, *posts* nas redes sociais e programa da Rádio Renova.

PG18 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica

- Elaboração de pílula de *WhatsApp* divulgando a colheita do feijão em Rio Casca, resultado do projeto desenvolvido em comunidades rurais do município para abertura de mercado;

- Elaboração de convite para o evento de encerramento e certificação do 2º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Também foi produzida matéria para o programa da Rádio Renova;
- Produção de pílula de *WhatsApp* e programa da Rádio Renova divulgando o Encontro de Negócios, evento *on-line* e gratuito para fornecedores locais de Governador Valadares e empresas que atuam na adutora, com o objetivo de abrir oportunidades para os participantes conhecerem as necessidades da obra;
- Elaboração de pílula de *WhatsApp* e programa da Rádio Renova para divulgar os cursos *on-line* de iniciação profissional para jovens de Minas Gerais e Espírito Santo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
- Produção de pílula de *WhatsApp* divulgando a plataforma de Educação Financeira lançada pela Fundação Renova e a Menver, empresa de gestão de negócios. O objetivo é conscientizar os atingidos acerca da utilização consciente do orçamento familiar e fomentar ações de geração de trabalho e renda;
- Produção de pílula de *WhatsApp* mobilizando comerciantes de Governador Valadares para participarem da videoconferência de abertura do treinamento em Educação Digital, voltado aos atingidos participantes da plataforma ACE Loja – desenvolvida pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares e pela Apiki;
- Continuidade da campanha de divulgação do Fundo Desenvolve Rio Doce em Minas Gerais e no Espírito Santo, com produção de três *e-mails marketing*, veiculação da série de programas da Rádio Renova, produção de vídeo educativo para distribuição via *WhatsApp*, publicação de matérias nos boletins Jornadas do

Baixo Rio Doce, Governador Valadares e Linhares, além de publicação de matéria no site da Fundação Renova.

(Link - site: <https://www.fundacaorenova.org/noticia/fundo-desenvolve-rio-doce-empresta-cerca-de-r-53-milhoes-para-negocios-de-mg-e-do-es/>)

PG23 – Manejo de Rejeitos

- Elaboração de pílula de *WhatsApp* divulgando a pesquisa em áreas atingidas para complementar o Plano de Manejo de Rejeitos. Mais de 800 amostras de solo, água e sedimentos serão coletadas em 35 municípios da bacia do rio Doce, entre Rio Doce (MG) e Baixo Guandu (ES).

PG26 e PG27– Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e (APPs) e Recargas Hídricas; e Recuperação de Nascentes

- Elaboração de pílula de *WhatsApp* e programa da Rádio Renova comunicando que, em razão da pandemia da Covid-19, a Fundação Renova ainda não iniciou as atividades em campo relacionadas ao Edital de adesão ao Programa de Restauração Florestal.

Comunicação com a imprensa

- Fundação Renova repassa R\$ 830 milhões para investimentos em educação e infraestrutura em Minas Gerais e no Espírito Santo;
- Projetos oferecem futuro sustentável a produtores rurais de Mariana;

- Fundação Renova oferece 9 mil vagas em cursos de iniciação profissional para jovens;
- Encontro de Negócios reunirá fornecedores locais de GV e empresas que atuam na adutora;
- Itueta recebe veículo para fortalecer serviços de assistência social.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço físico do programa.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água


Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 73, 74 - Itens a e b – Concluídas internamente; 74 - Itens c e d – Em andamento; 74 - Itens e, f e g – Reprogramadas.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 328 - Itens 1, 2 e 3 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

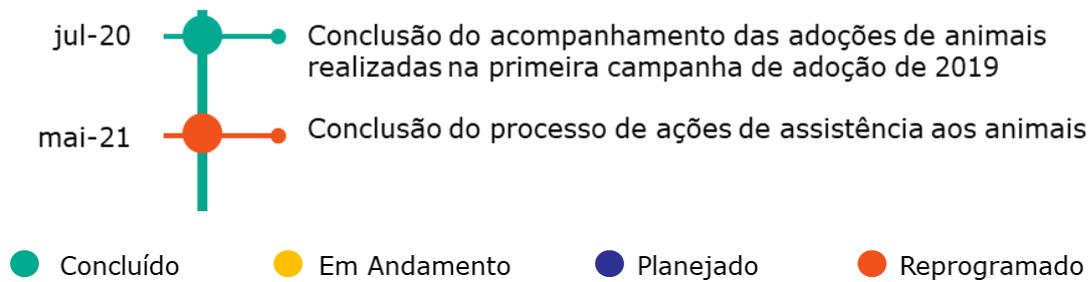

Grandes números do programa

- **1.048** registros de prontuários de atendimentos internos, sendo **143** adoções, **311** restituições, **146** óbitos, **12** extravios, **30** registros de dados insuficientes de destinação e **354** animais sob a guarda temporária da Fundação Renova, valores acumulados até agosto/2020;
- Atualmente existem **263** bovinos, **69** equinos, **50** caninos, **19** suínos, **três** muares, **dois** felinos sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2, valores acumulados até agosto/2020;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados **1.637** prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária, valores acumulados até agosto/2020.

Fatos relevantes do mês

- Conclusão da verificação do indicador de bem-estar animal, com conclusão prevista para agosto de 2020;
- Primeira adoção de cachorro na campanha virtual iniciada em julho de 2020.

Indicadores

Foi concluída a verificação do indicador de conformidade em bem-estar animal no mês de agosto/2020, sendo o resultado apresentado no Gráfico 1. A aplicação deste indicador se encontrava suspensa em função da pandemia de COVID19, e foi retomada entre os meses de julho e agosto, com uma avaliação total de 133 espécimes – amostragem com representação de 32,7% de todos os animais que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova.

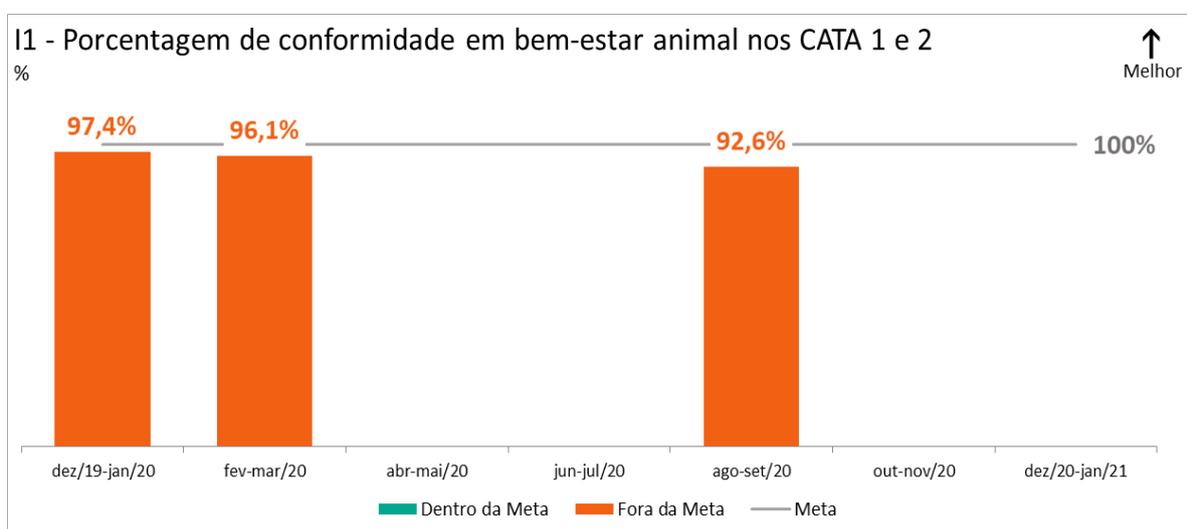


Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 (agosto/2020).

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

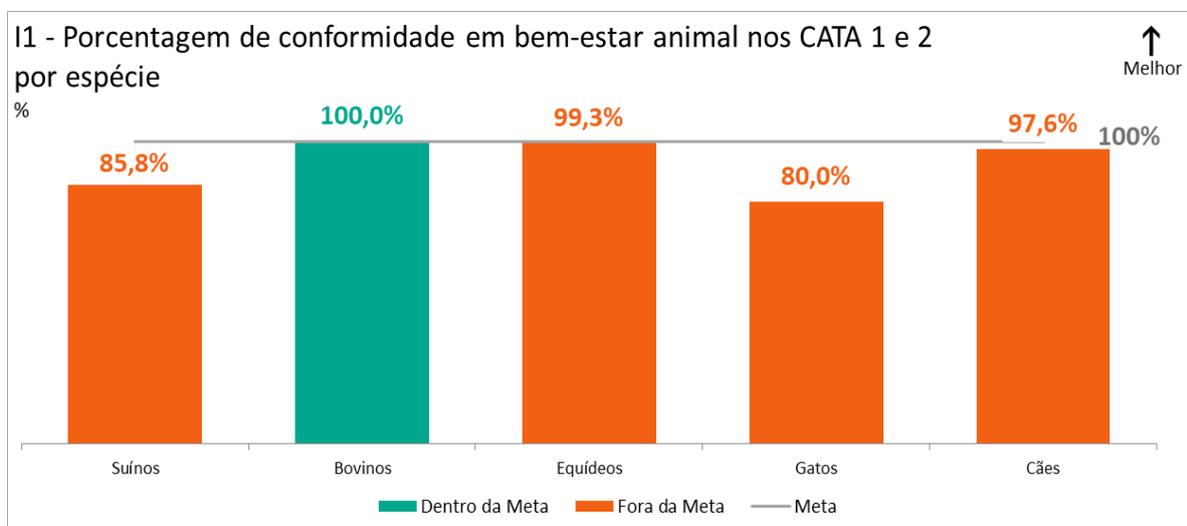


Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie (agosto/2020).

Os desvios apresentados em relação à meta vigente, não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Para o período vigente, não houve atualização do indicador que verifica a finalização dos processos adotivos realizados.

Até o dia 15 de agosto, data corte de dados deste relatório, um cão foi adotado durante a campanha virtual. Esta adoção, conforme metodologia da Definição do Programa, somente passará a compor o indicador após a finalização do acompanhamento de 6 meses do processo.

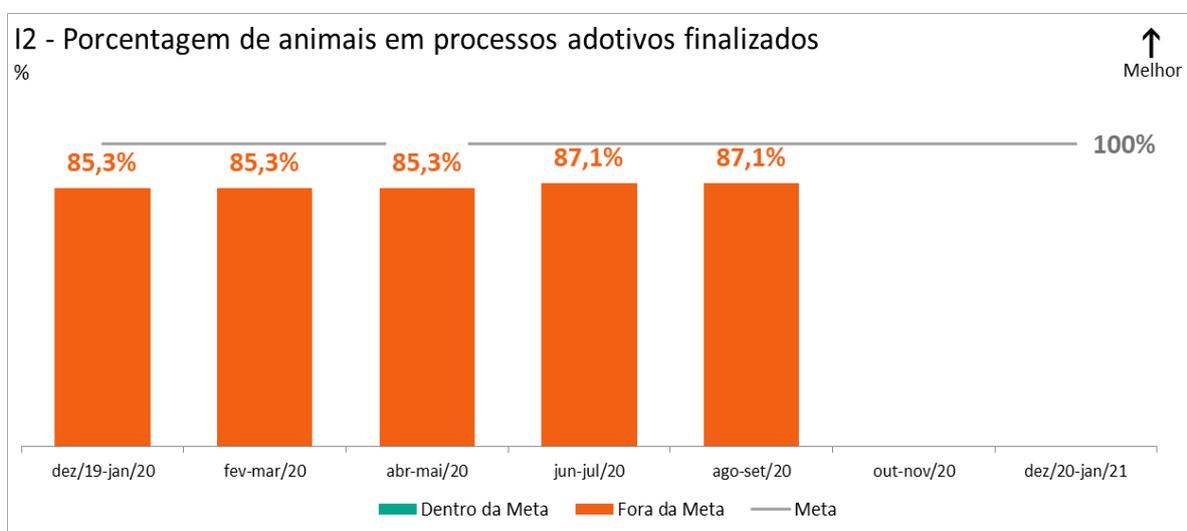


Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados (ago/2020).

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%	-	-	-
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%	-	-	-

Curva S do programa

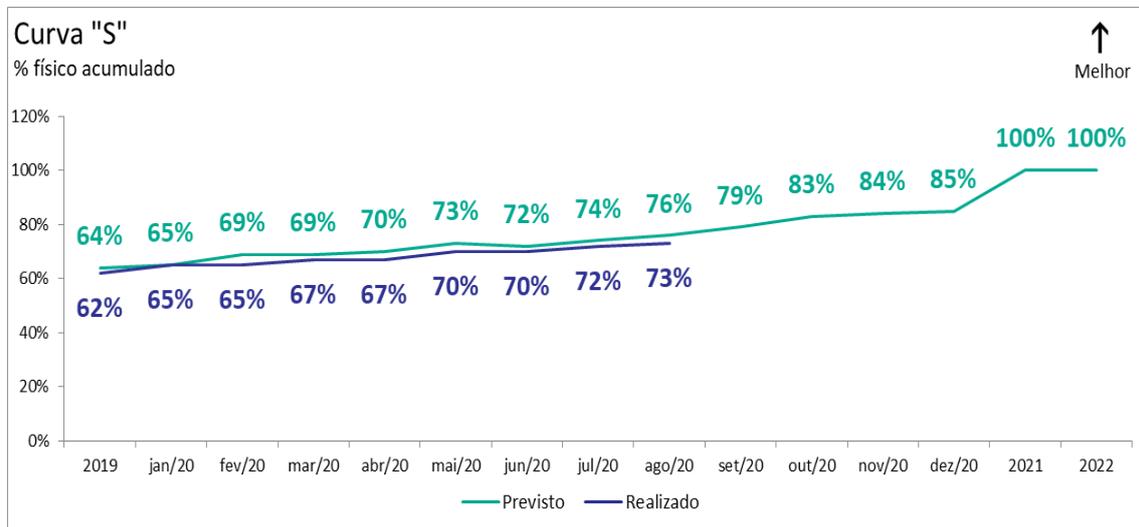


Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusulas do TTAC: 76 – reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 96, 257 – Concluídas internamente.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2020

- Em repactuação devido impacto das ações de contenção do COVID-19 no cronograma e nas metas.

Grandes números do projeto

- **211 famílias** atendidas;
- **35* casas** e **3 bens públicos** (escola, posto de serviços e unidade básica de saúde) com construção iniciadas;
- **Projetos conceituais** concluídos para **145** edificações, **22** lotes e **6** de bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para **145** casas, **23** lotes e **4** bens públicos;
- **Projetos básicos** protocolados na prefeitura de **127** casas e **20** lotes vagos;
- **Alvarás** para **98** casas e **3** de bens públicos emitidos (escola, posto de serviços e unidade básica de saúde) e **19 licenças de autorização de construção** de casas emitidas para os lotes sem edificação;
- **Projetos de contenção** concluídos para **129** casas e **14** lotes;
- **Projetos de fundação** concluídos para **128** casas.

OS GRANDES NÚMEROS EM CADA REASSENTAMENTO É ESTIMADO E SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO À POSSIBILIDADE DAS FAMÍLIAS MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES DE ATENDIMENTO OU ESTAREM COM ATENDIMENTO INTERROMPIDO – DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO – OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO;

* DAS 37 CASAS, TEMOS 2 EM ANDAMENTO, QUE ESTAVAM MAIS ADIANTADAS, E 2 TIVERAM SEU ATENDIMENTO INTERROMPIDO. AS DEMAIS CASAS ENCONTRAM-SE PARALISADAS DEVIDO AO COVID-19 DE MODO A EVITAR AGLOMERAÇÕES.

Fatos relevantes do mês

- Trabalho em regime de **Home Office** para parte do administrativo da Fundação Renova devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção do vírus COVID-19;
- Comprometimento das metas de 2020 do projeto que serão revistas após o retorno das atividades paralisadas devido vírus COVID-19;
- Realização de estudos para o retorno das atividades de campo de maneira a minimizar os impactos no cronograma do projeto e mitigar a probabilidade de contaminação dos colaboradores da obra por COVID-19;
- Tratativas e alinhamento junto aos stakeholders de forma a garantir o retorno das atividades de maneira segura;
- Em andamento a supressão vegetal, limpeza de top soil e terraplenagem do acesso, vias do entorno e lagoas facultativas para construção da estação de tratamento de esgoto;
- Conclusão do pavimento asfáltico da Rua Sagrado Coração de Jesus (est. 0 até est. 6) e do reforço de subleito (est. 6 até est. 15) na Área 1;
- Conclusão do pavimento intertravado das Ruas Alípio Viana e Cônego Veloso e do lançamento de rede de água bruta da Cônego Veloso na Área 3;
- Conclusão da instalação de 165 postes de iluminação urbana dos 291 planejados;
- Realizada mobilização do efetivo da 5ª árvore aprovada (174 colaboradores);
- Conclusão do projeto básico do **Cemitério**;

- Conclusão de projetos executivos de contenção para **3** casas;
- Conclusão de projetos executivos de fundação para **14** casas.

Curva S do projeto

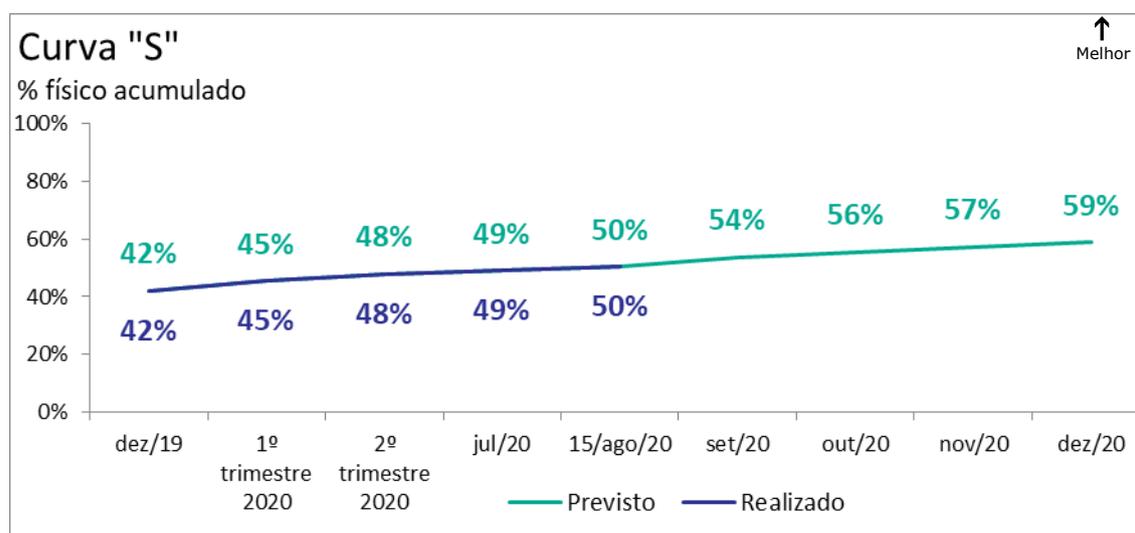


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Bento Rodrigues.

* PARA OS ANOS SEGUINTE A 2020, ESTÃO SENDO ELABORADOS ESTUDOS COM O OBJETIVO DE MITIGAR OS IMPACTOS DO COVID-19 NO CRONOGRAMA.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2020

- Em repactuação devido impacto das ações de contenção do COVID-19 no cronograma e nas metas.

Grandes números do projeto

- **97 famílias** atendidas;
- Das **8 casas** com construção iniciadas, **8** foram iniciadas com licenças simplificadas para execução de fundação;
- **Projetos conceituais** concluídos para **58** casas, **4** lotes e **7** bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para **55** casas, **4** lotes e **6** bens públicos;
- **Projetos básicos** protocolados na prefeitura de **7** casas e **5** bens públicos;
- **Licenças simplificadas** emitidas para **24** edificações para execução de fundação;
- **Projetos de fundação** concluídos para **32** casas e **5** bens públicos.

OS GRANDES NÚMEROS EM CADA REASSENTAMENTO É ESTIMADO E SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO À POSSIBILIDADE DAS FAMÍLIAS MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES DE ATENDIMENTO OU ESTAREM COM ATENDIMENTO INTERROMPIDO – DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO – OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO.

Fatos relevantes do mês

- Trabalho em regime de **Home Office** para parte do administrativo da Fundação Renova devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção do vírus COVID-19;
- Comprometimento das metas de 2020 do projeto que serão revistas após o retorno das atividades paralisadas devido vírus COVID-19;

- Realização de estudos para o retorno das atividades de campo de maneira a minimizar os impactos no cronograma do projeto e mitigar a probabilidade de contaminação dos colaboradores da obra por COVID-19;
- Tratativas e alinhamento junto aos stakeholders de forma a garantir o retorno das atividades de maneira segura;
- Início da execução do gabião da Rua Monsenhor Horta;
- Início da execução da adutora de água tratada;
- Início da contenção da Trincheira;
- Conclusão drenagem longitudinal da Área 1;
- Realizada mobilização do efetivo da 5ª arvore aprovada (55 colaboradores);
- Conclusão de projetos básicos para **2** casa;
- Conclusão de projetos executivos de fundação para **6** casas e **Cemitério**.

Curva S do projeto


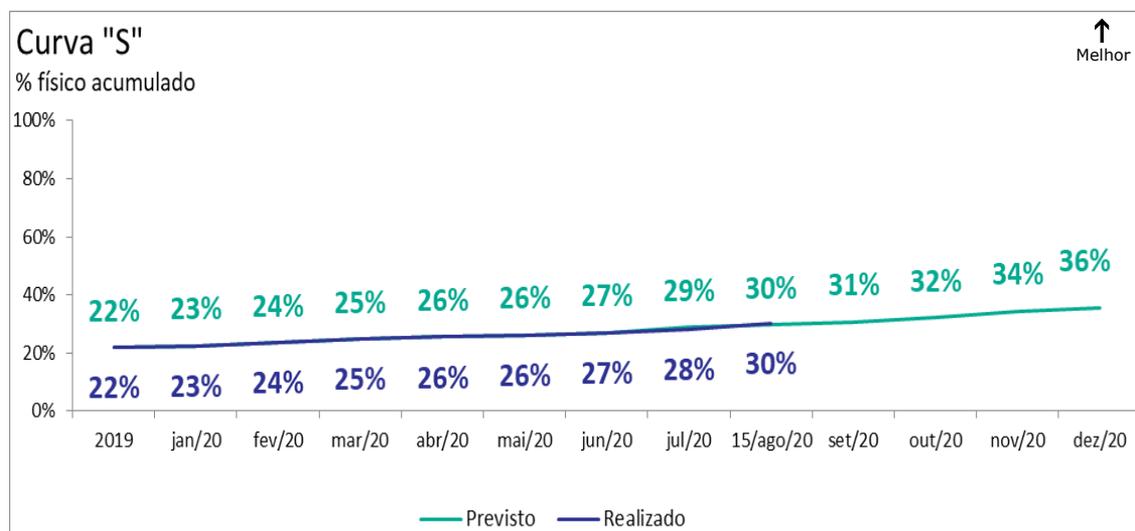


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Paracatu de Baixo.

* PARA OS ANOS SEGUINTE A 2020, ESTÃO SENDO ELABORADOS ESTUDOS COM O OBJETIVO DE MITIGAR OS IMPACTOS DO COVID-19 NO CRONOGRAMA.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2020

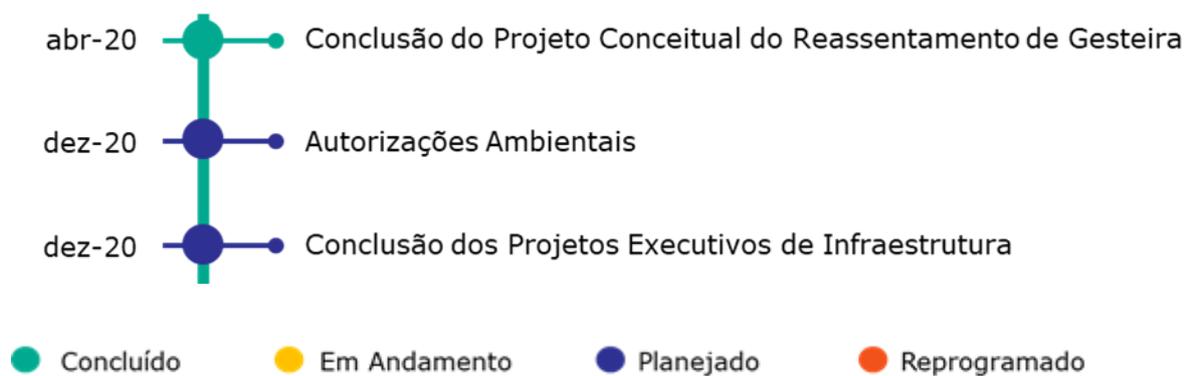

Grandes números do projeto

- **26 famílias** atendidas.

OS GRANDES NÚMEROS EM CADA REASSENTAMENTO É ESTIMADO E SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO À POSSIBILIDADE DAS FAMÍLIAS MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES DE ATENDIMENTO OU ESTAREM COM ATENDIMENTO INTERROMPIDO – DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO – OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO.

Fatos relevantes do mês


- Trabalho em regime de **Home Office** para parte do administrativo da Fundação Renova devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção do vírus COVID-19;
- Comprometimento das metas de 2020 do projeto, que serão revistas após o retorno das atividades paralisadas por conta do vírus COVID-19;
- Tratativas e alinhamento junto aos stakeholders de forma a garantir o retorno das atividades de maneira segura;

Curva S do projeto

- Em elaboração visto as tratativas do Reassentamento de Gesteira junto à Ação Civil Pública.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2020

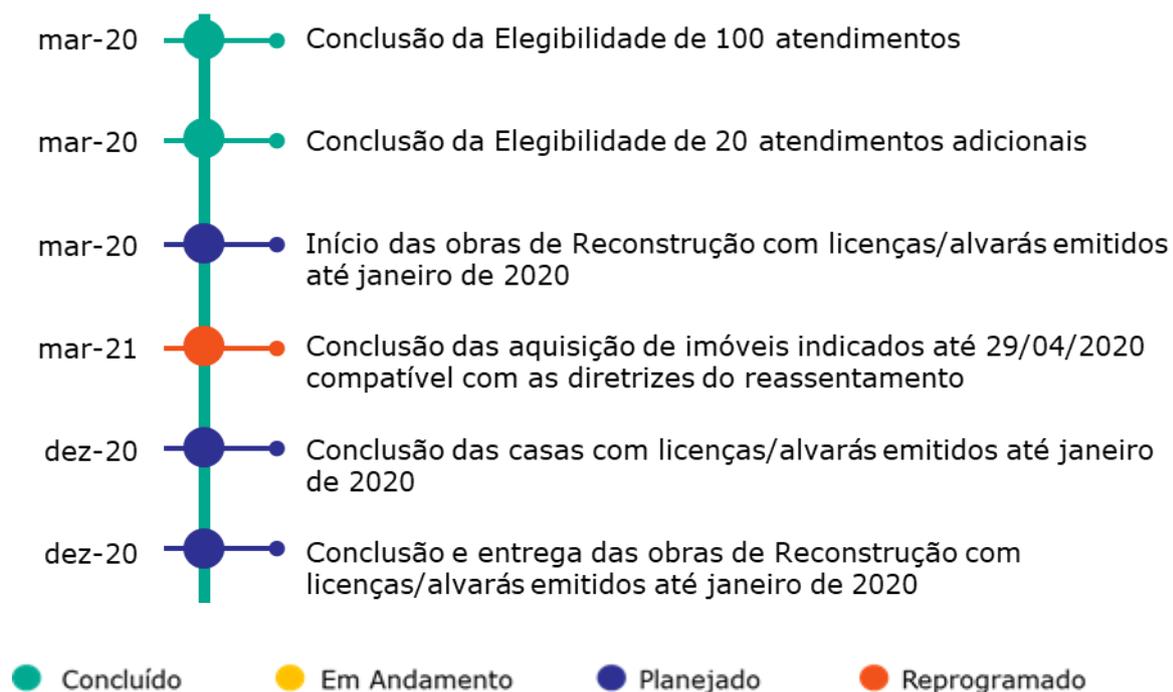

Grandes números do projeto

- **143 famílias** atendidas, sendo **129 do Reassentamento Familiar** e **14 das Reconstruções**;
- **48 imóveis** foram adquiridos para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia, sendo **17 imóveis para reformar**, **27 imóveis para construir** e **4 lotes vagos**;
- **37 projetos conceituais finalizados**, **22 para construção**, **13 para reforma** e **2 para lotes**;
- Para construção, **11 projetos básicos** e **12 licenças simplificadas/dispensas protocolados** na Prefeitura. Destes, **2 dispensas de licença foram emitidas**;
- Para reformas, **7 licenças simplificadas/dispensas protocolados** na Prefeitura. Destas, **6 licenças simplificadas foram emitidas**.
- Comunidades rurais: **9 casas** da modalidade de reconstrução **finalizadas do total de 15**.

OS GRANDES NÚMEROS EM CADA REASSENTAMENTO É ESTIMADO E SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO À POSSIBILIDADE DAS FAMÍLIAS MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES DE ATENDIMENTO OU ESTAREM COM ATENDIMENTO INTERROMPIDO – DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO – OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO.

Fatos relevantes do mês

- Trabalho em regime de Home Office para parte do administrativo da Fundação Renova devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção do vírus COVID-19;

- Comprometimento das metas de 2020 do projeto que serão revistas após o retorno das atividades paralisadas devido vírus COVID-19;
- Realização de estudos para o retorno das atividades de campo de maneira a minimizar os impactos no cronograma do projeto e mitigar a probabilidade de contaminação dos colaboradores da obra por COVID-19;
- Tratativas e alinhamento junto aos stakeholders de forma a garantir o retorno das atividades de maneira segura;
- Foi Protocolado a licença simplificada para realização da reforma do imóvel da Sra. Edir Margarida dos Santos (PRO 4713/2020);
- Insucesso na negociação do imóvel pretendido para a família do Sr. Adriano Márcio Dias por ausência de acordo financeiro;
- Emissão de **8** Licenças Simplificadas;
- Aquisição de **2** imóveis;
- Conclusão de **1** projeto conceitual;
- Conclusão de **3** projetos básicos.

Curva S do projeto

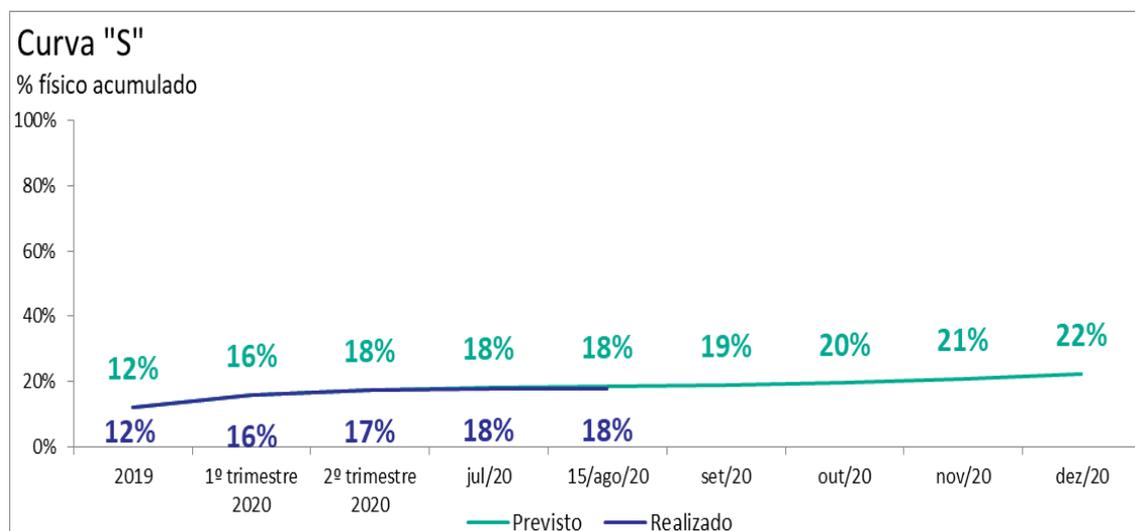


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento Familiar.

* PARA OS ANOS SEGUINTE A 2020, ESTÃO SENDO ELABORADOS ESTUDOS COM O OBJETIVO DE MITIGAR OS IMPACTOS DO COVID-19 NO CRONOGRAMA.

Indicadores do Programa

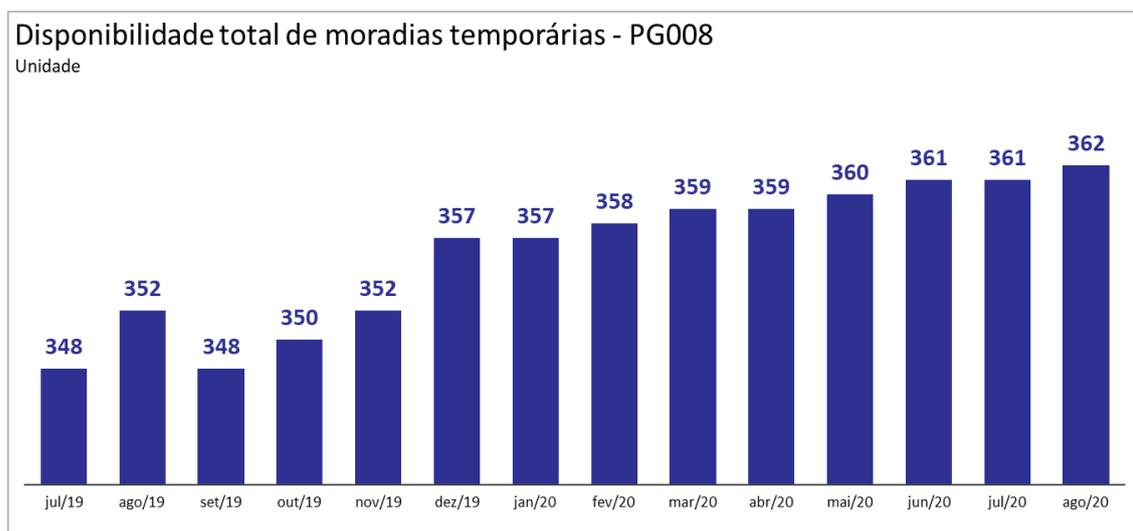


Gráfico 4. Disponibilização de moradias temporárias PG008 (agosto/2020). Gráfico Mensal.

O número de disponibilização de moradias temporárias desdobrado para o PG08 começou a ser divulgado em julho de 2019.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusulas do TTAC: 79 - Judicializado; 150 - Atrasada;

Deliberações que impactam escopo e prazo: 286, 30, 80 - itens 2.2, 4.1, 4.2 - Concluídas; 80 - item 2.1 - Descumprimento; 225 - item 2 - Judicializado.

Entregas do ano de 2020

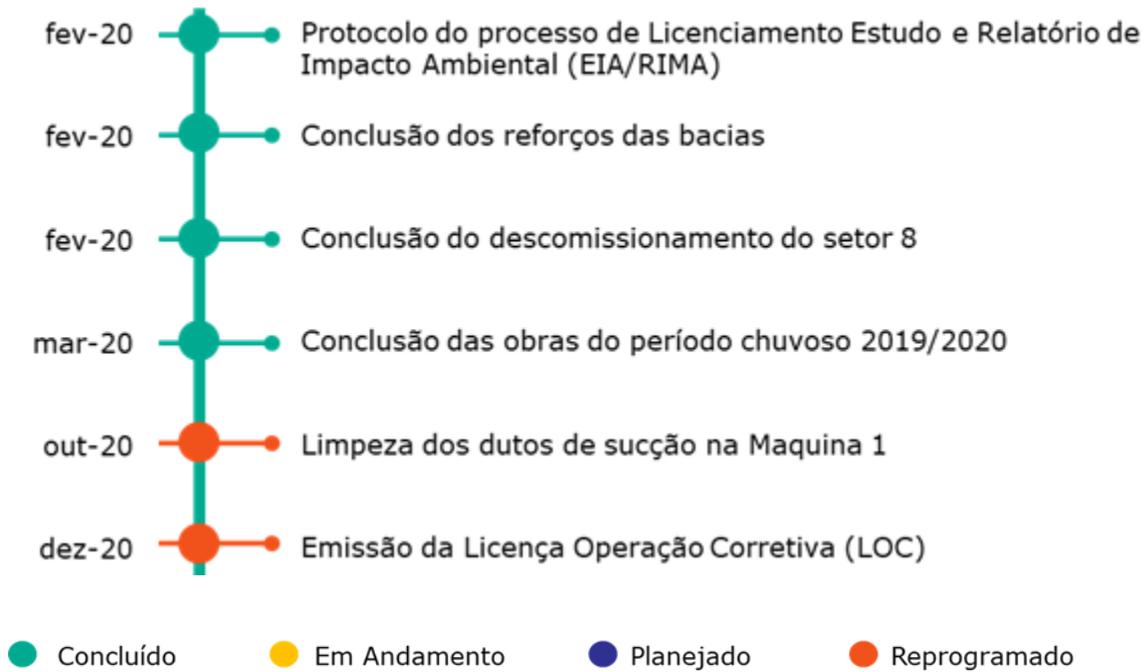

Grande número do programa

- **959 mil m³ de material foi bombeado** do reservatório da Usina Risoleta Neves, acumulado até agosto/2020.

Fatos relevantes do mês

- Atividades em campo paralisadas desde 20/mar, devido à pandemia do coronavírus;
- Projetos de dragagem, desaguamento e tratamento sendo elaborados;
- Realização de monitoramento dos instrumentos e estruturas, mostrando que as estruturas geotécnicas do PG09 apresentam condições de estabilidade adequadas.
- Fixado pela SUPPRI o prazo para apresentação das informações complementares do licenciamento de Candonga.
- Definido cronograma das obras do período chuvoso.
- Retorno da equipe em campo no dia 03/ago para dar continuidade as atividades de Reabilitação das UGs da UHE.
- *Due diligence e handover* para Samarco em andamento.

Indicadores

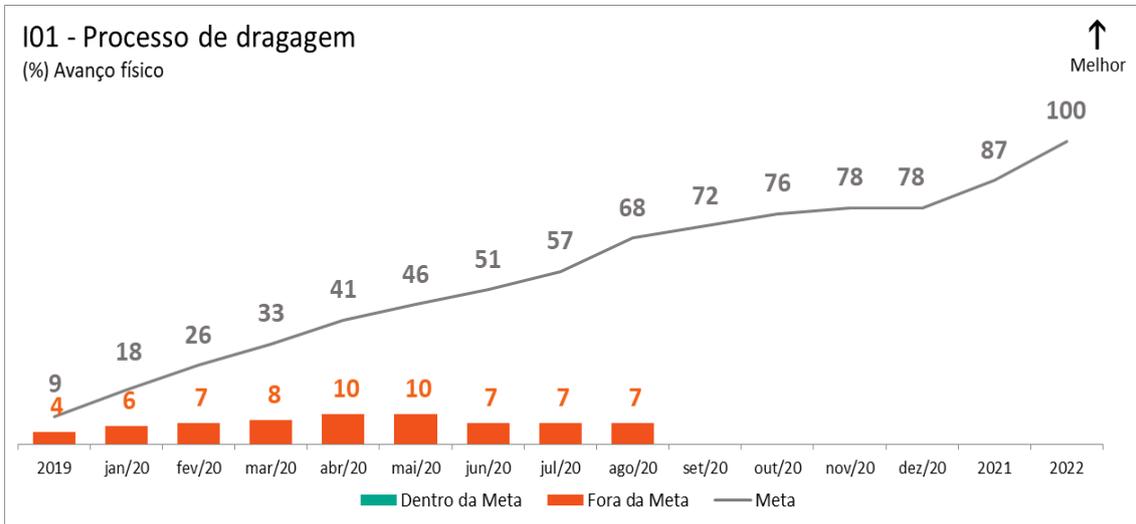


Gráfico 4. (%) Avanço físico do processo de dragagem (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

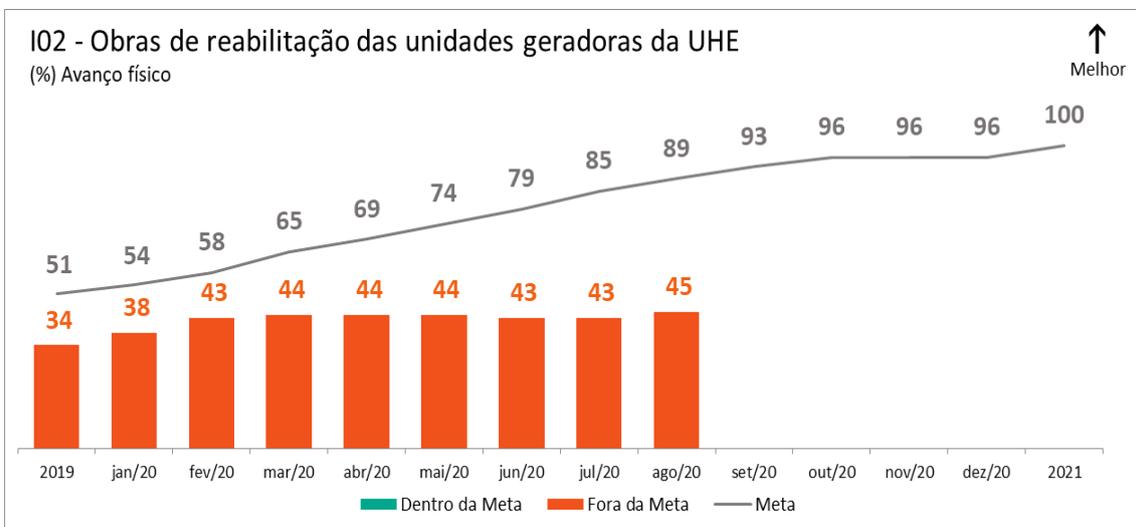


Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

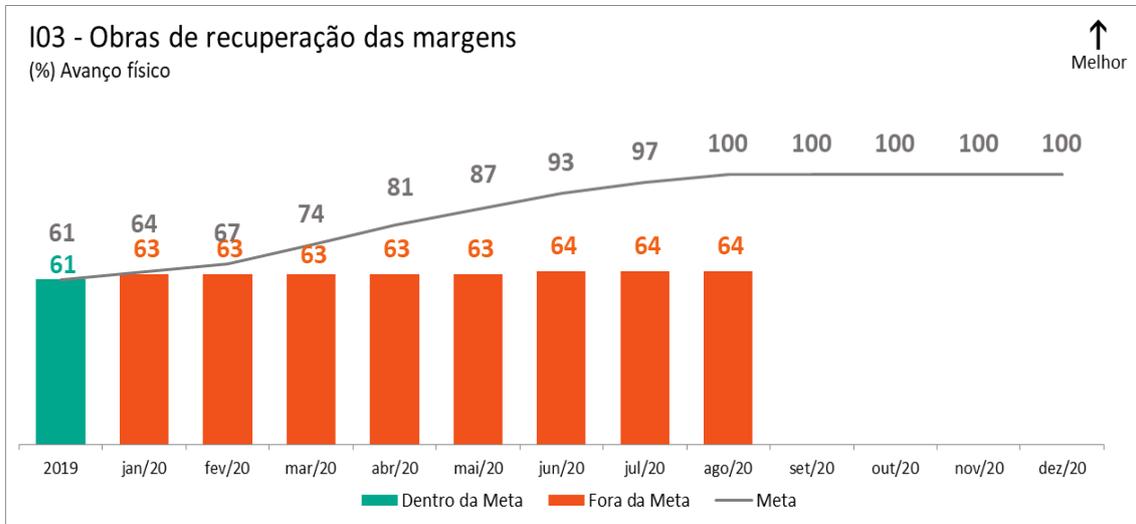


Gráfico 3. (%) Avanço físico das obras de recuperação das margens (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

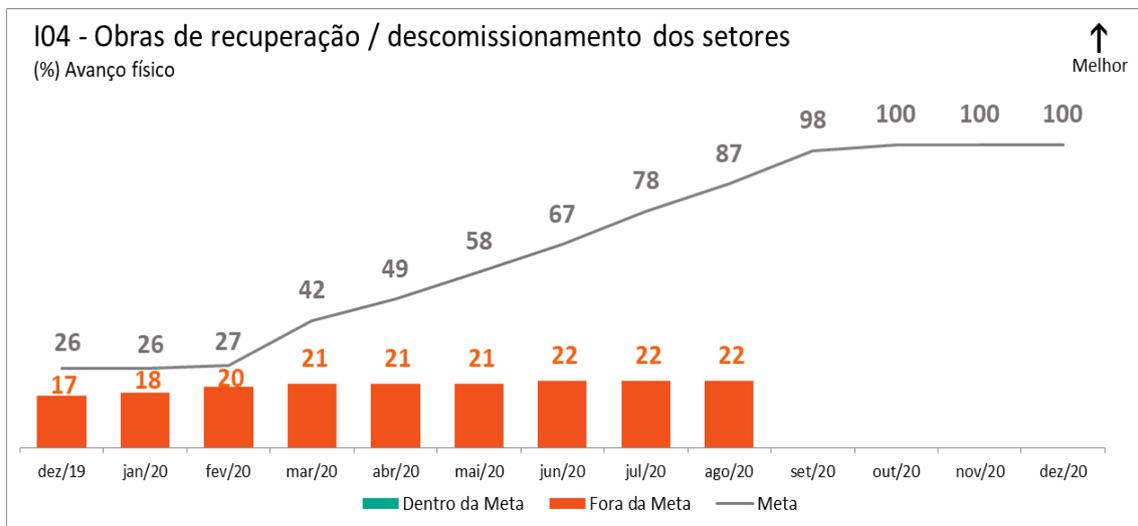


Gráfico 4. (%) Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

Curva S do programa

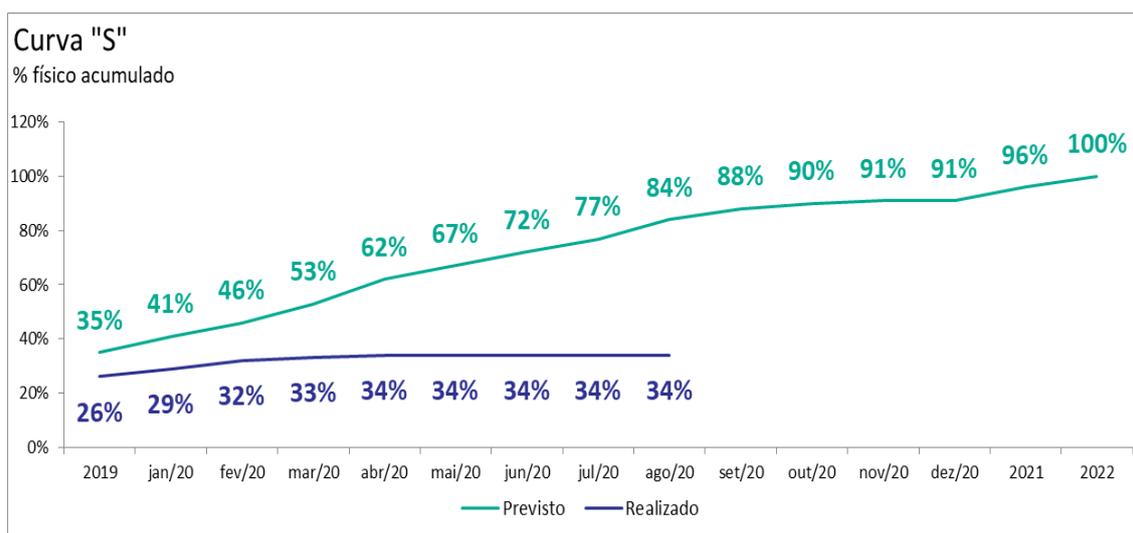


Gráfico 5. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula do TTAC: 82 - Atrasada.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 127 (itens 1.1, 1.4, 1.5 e 1.6) e 191 – Concluídas internamente; 190 (item 2), 207 (itens 1 e 2) e 217 (itens 2 e 3) – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: **1.602 obras concluídas** (projetos e processos) até agosto/2020, sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- **879** obras correspondem à manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1440,0 Km de manutenções realizadas, 142,2 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- **109** obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- **15** obras correspondem a casas reconstruídas;
- **28** obras correspondem a comércios reformados;
- **189** obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- **105** obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- **8** obras correspondem a casas reconstruídas;
- **27** obras correspondem a comércios reformados;
- **189** obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- **4** obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- **7** obras correspondem a casas reconstruídas;
- **1** obras correspondem a comércios reformados;
- **0** obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Fatos relevantes do mês

- Retorno das obras do Parque de Exposição, em Barra Longa/MG;
- Conclusão de 69 Estruturas de Apoio Simples sendo: 30 Cochos e 08 Porteiras em Rio Doce/MG, 10 Cochos, 02 Bebedouros e 02 Porteiras em Barra Longa/MG, 03 Cochos, 01 Bebedouro e 05 Porteiras em Mariana/MG, 05 Cochos e 01 Bebedouro em Santa Cruz do Escalvado/MG, 01 Bebedouro e 01 Porteira em Ponte Nova/MG;
- Conclusão da obra de Pavimentação de Camargos em Mariana/MG.

Indicadores

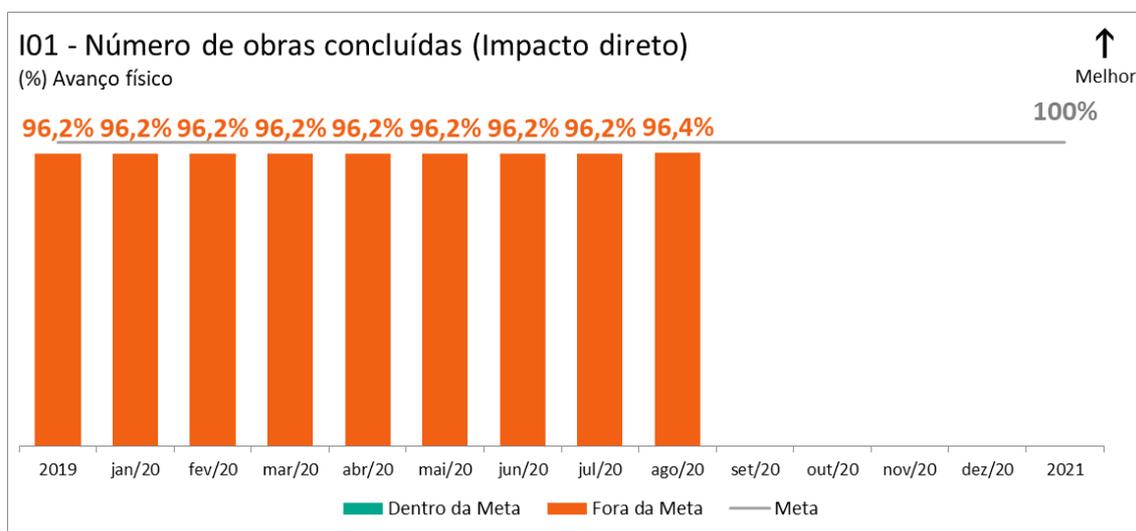


Gráfico 1. Número de obras concluídas (Impacto direto) (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

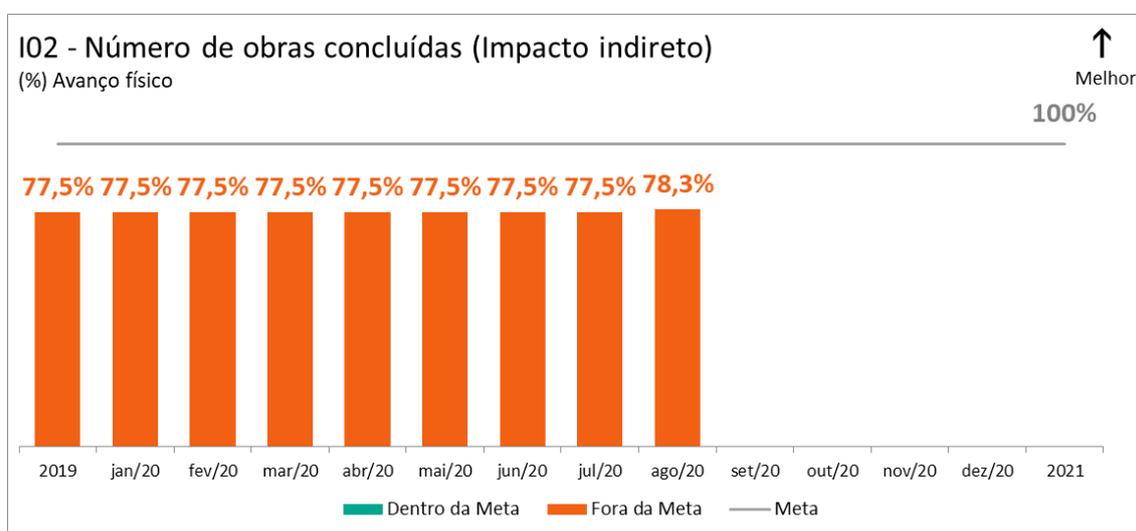


Gráfico 2. Número de obras concluídas (Impacto indireto) (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

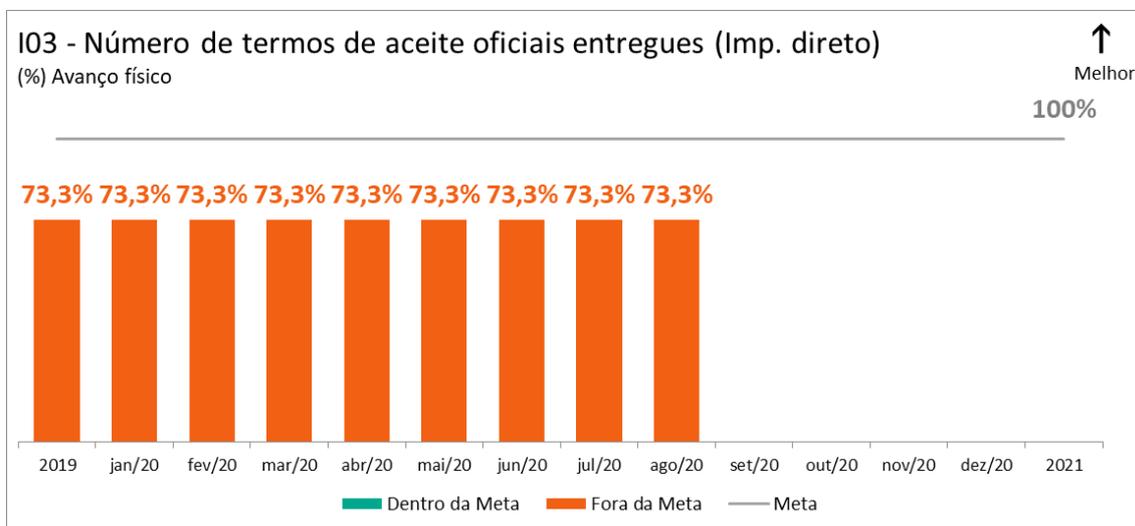


Gráfico 3. Número de termos de aceite entregues (Impacto direto) (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

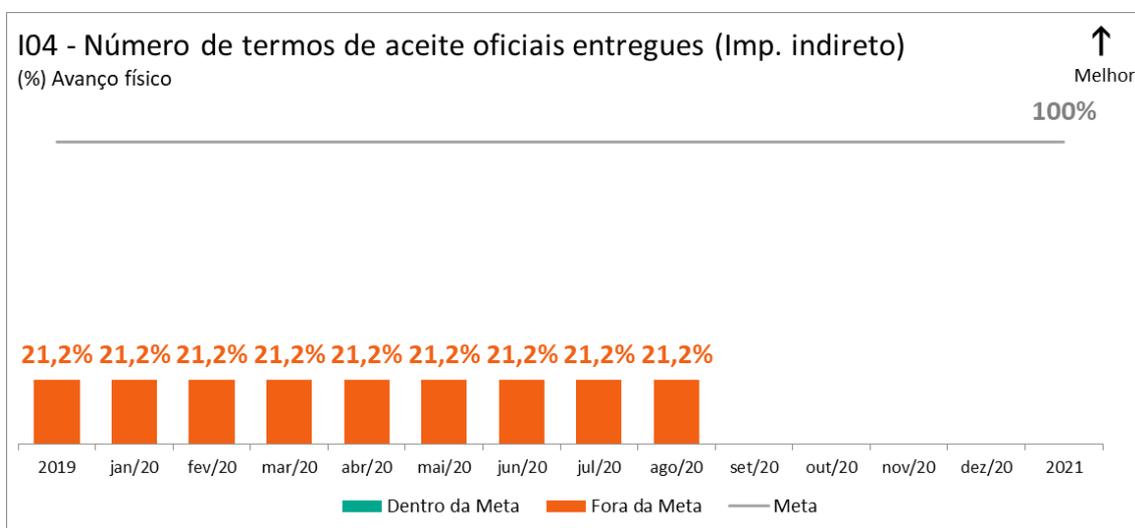


Gráfico 4. Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto) (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

Observação: os valores dos indicadores acima consideram quantitativos de processos e projetos de acordo com a Definição 12 do PG010.

Curva S do programa

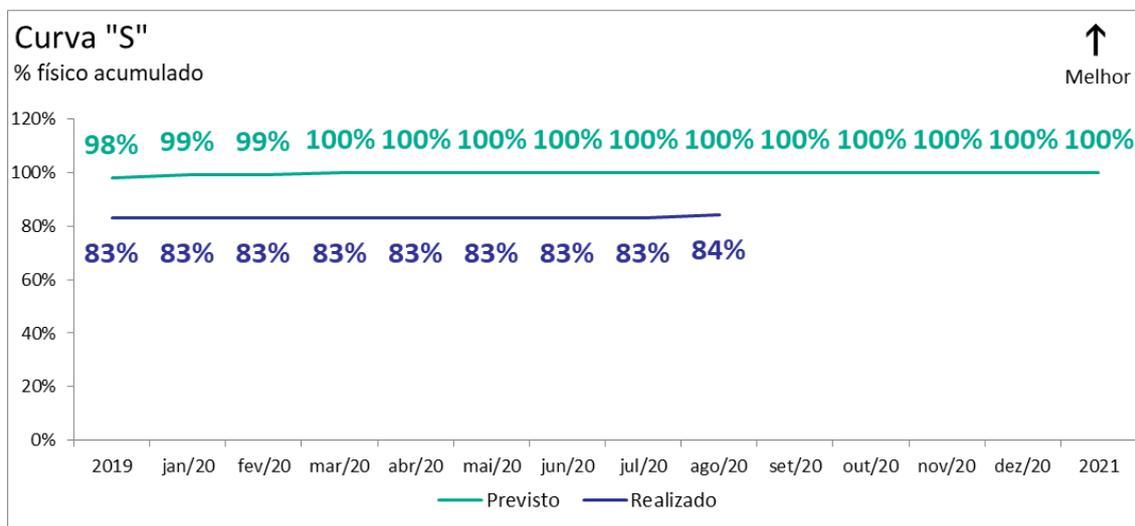


Gráfico 5. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 89, 91, 92 e 93 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 183 – Itens 2 e 3 – Concluída internamente; 238 – Item 1 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020

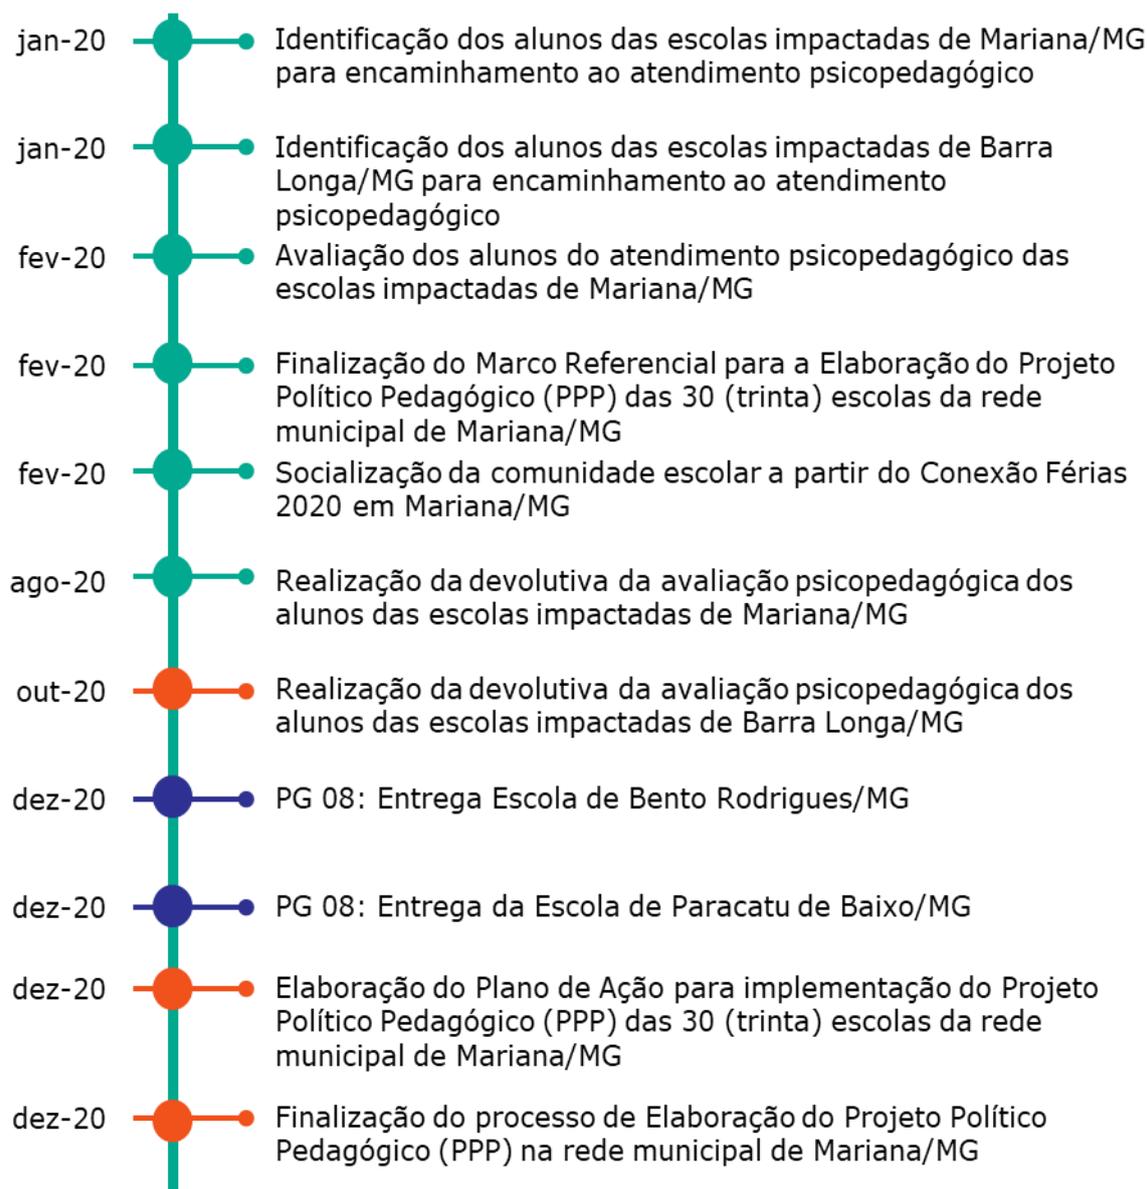

● Concluído
 ● Em Andamento
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos Relevantes do mês

- Realização da devolutiva da avaliação psicopedagógica dos alunos das escolas de Mariana.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I1	Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias	Demandas Escolares Atendidas / Total de Demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo	%	-	-	-
I2	Cumprimento das normas de infraestrutura escolar para as escolas temporárias	Normas cumpridas / Total de normas exigidas	%	-	-	-
I3	Disponibilidade de vagas para transportar alunos	Número de vagas disponibilizadas / Número de alunos que solicitaram transporte	%	-	-	-

I4	Cumprimento das atividades de convivência	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	%	-	-	-
I5	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Número de escolas que receberam Apoio Pedagógico / Número de escolas que demandaram Apoio Pedagógico	%	-	-	-
I6	Percentual de implantação do Apoio Psicopedagógico	Número de avaliações psicopedagógicas com devolutiva / Número de encaminhamentos para o apoio psicopedagógico	%	-	-	-

Curva S do programa

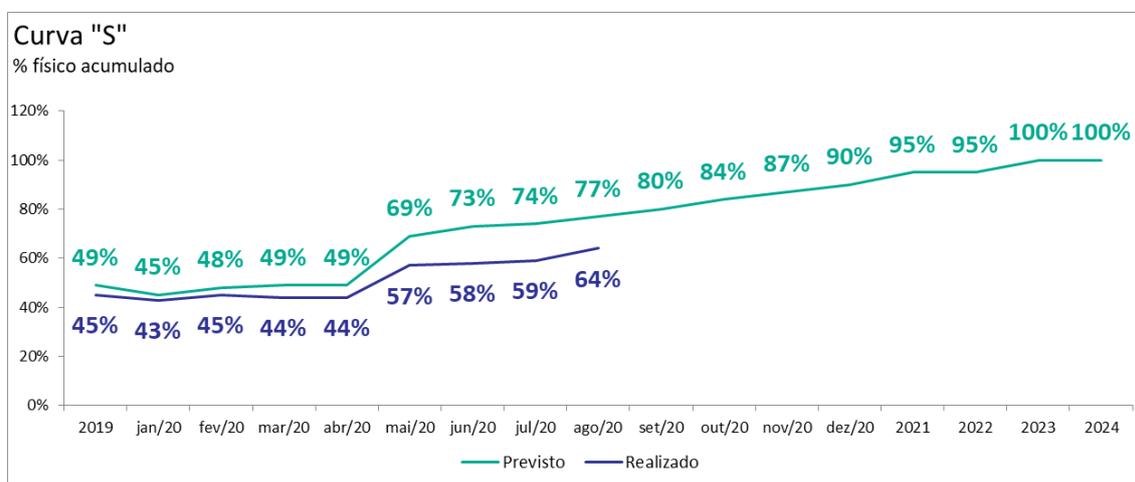


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

Obs.: A alteração do avanço físico vista no mês de maio é em decorrência da redistribuição dos pesos das tarefas do cronograma do PG11 em função do orçamento previsto para cada projeto. Essa alteração foi validada com a equipe técnica do programa e está seguindo o fluxo de gestão de mudanças padrão.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

O objetivo geral é implantar medidas socioeducativas para preservação, manutenção e fortalecimento do patrimônio cultural, histórico e artístico na região impactada, e em parceria com as comunidades e poder público, conforme determinações das Cláusulas 95 a 100 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 95 e 99 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 349 – Concluída internamente.

Entregas do ano de 2020

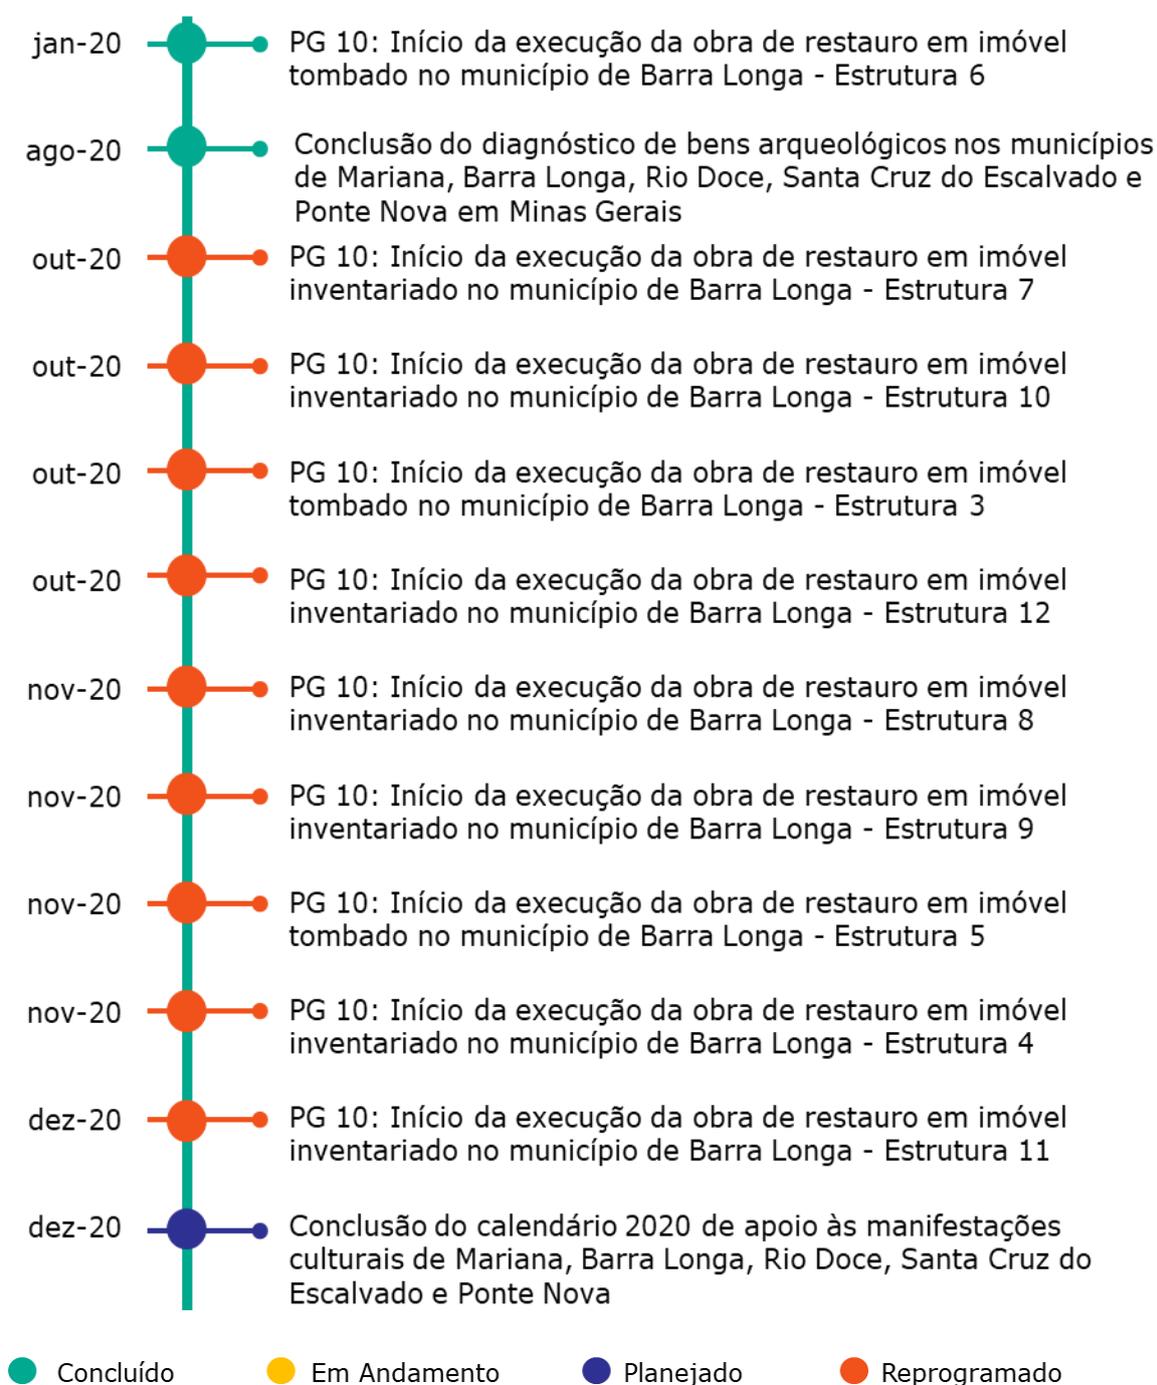

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Conclusão de oficina online de produção audiovisual com jovens de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo em Minas Gerais;
- Conclusão do diagnóstico de bens arqueológicos nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova em Minas Gerais.

Indicadores

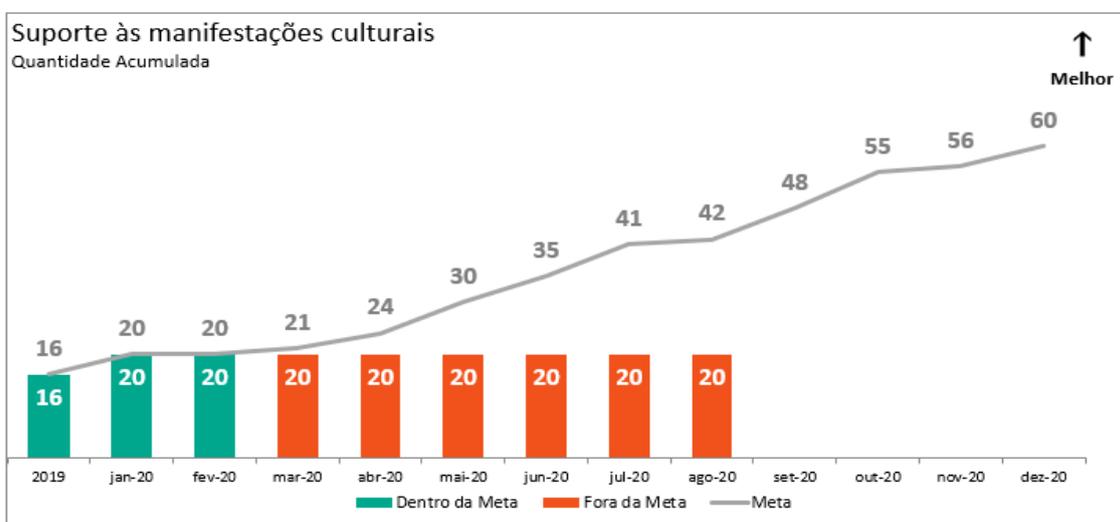


Gráfico 1. Suporte às manifestações culturais. Gráfico acumulado (agosto/2020).

NÃO HOUVE APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS PREVISTAS ENTRE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2020 EM DECORRÊNCIA DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDO AO CORONAVÍRUS.

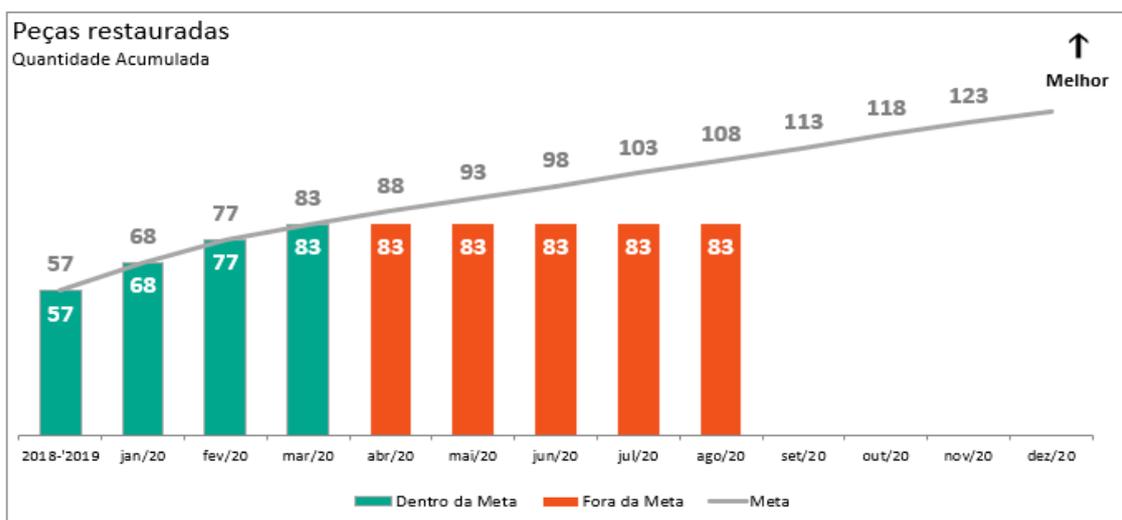


Gráfico 2. Projetos restaurados. Gráfico acumulado (agosto/2020).

HOUVE PARALISAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURO NA RESERVA TÉCNICA DE MARIANA/MG, EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO PELA FUNDAÇÃO RENOVA, DEVIDO AO CORONAVÍRUS.

Curva S do programa

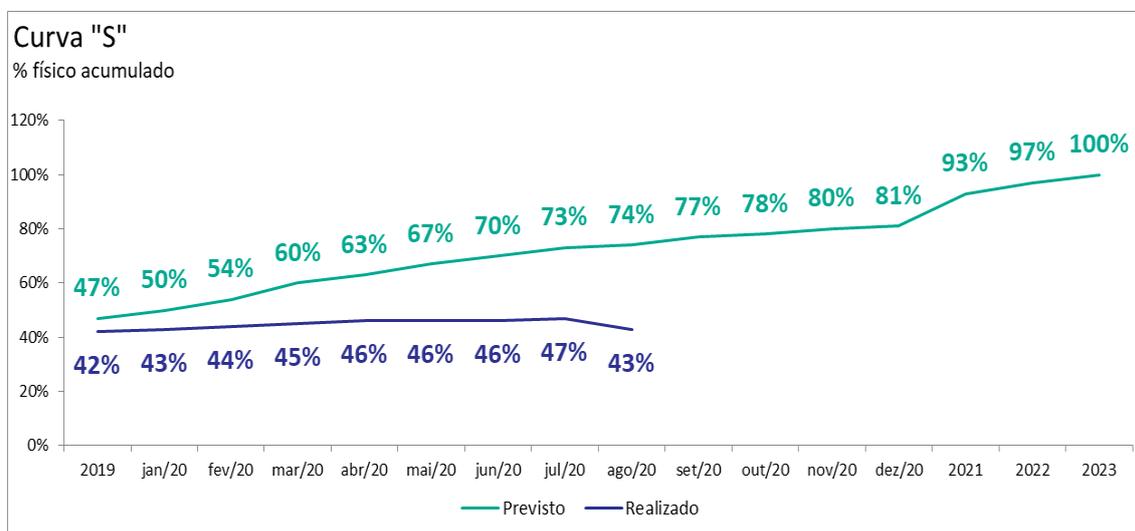


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

CURVA S SUJEITA A ALTERAÇÕES DEVIDO ÀS REVISÕES NO ESCOPO DO PROGRAMA E CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

O objetivo geral desse programa é, a partir de um diagnóstico de impacto do rompimento na área de abrangência socioeconômica, fomentar ações conjuntas para o fortalecimento das políticas públicas de gestão da cultura, turismo, lazer e esporte, através de um apoio técnico e material das estruturas necessárias para um melhor desenvolvimento dessas atividades nas regiões impactadas, de acordo com o grau de severidade sofrido por cada localidade, conforme determinação das Cláusulas 101 a 105 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 101 – Concluída internamente; 103 – Itens a, g e 104 – Itens a, b, c, d - Em andamento; 103 – Itens b, c, d, e, f e 104 – Item e – Planejada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 239 – Itens 1a, 1b, 3, 4 e 5; 287 – Item 3; 321 – Item 3 - Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

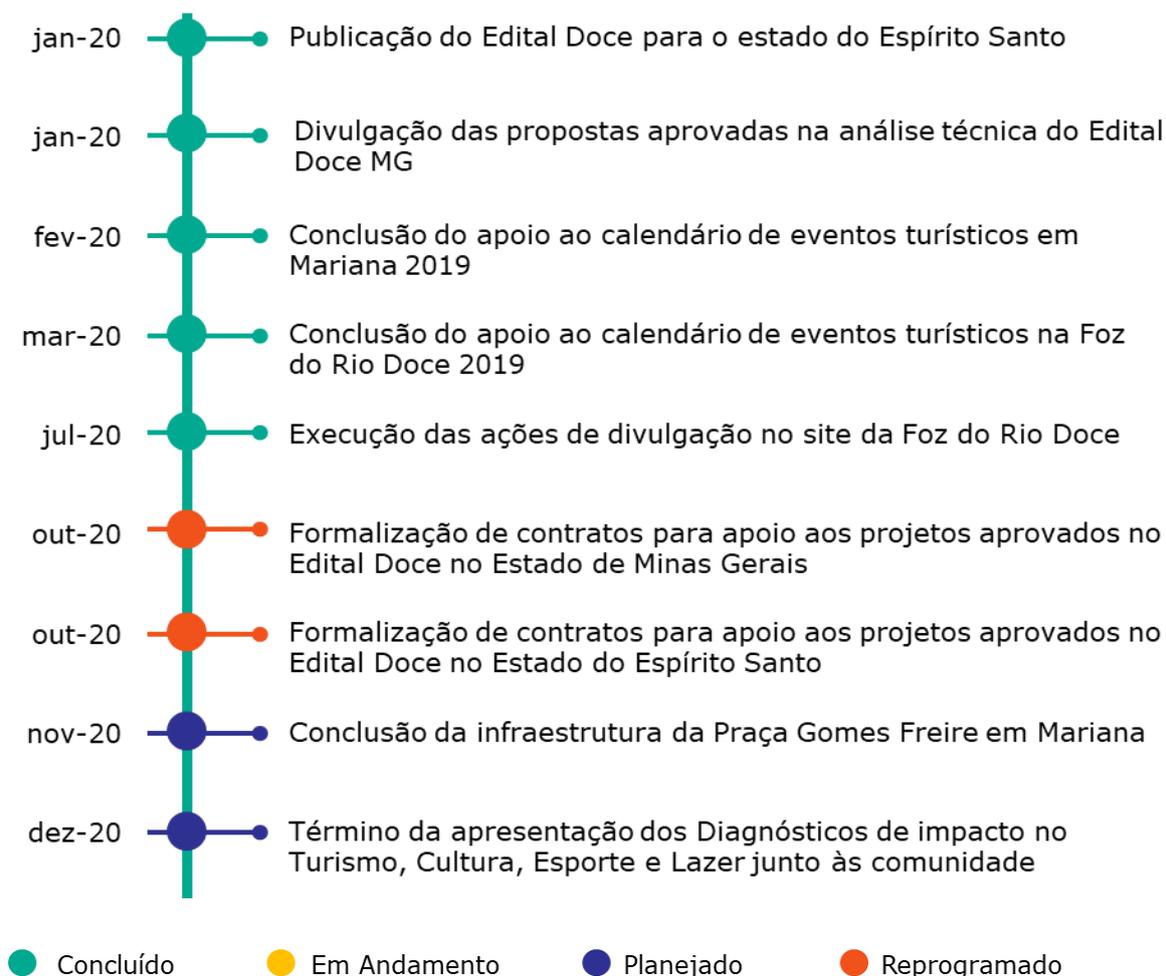

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

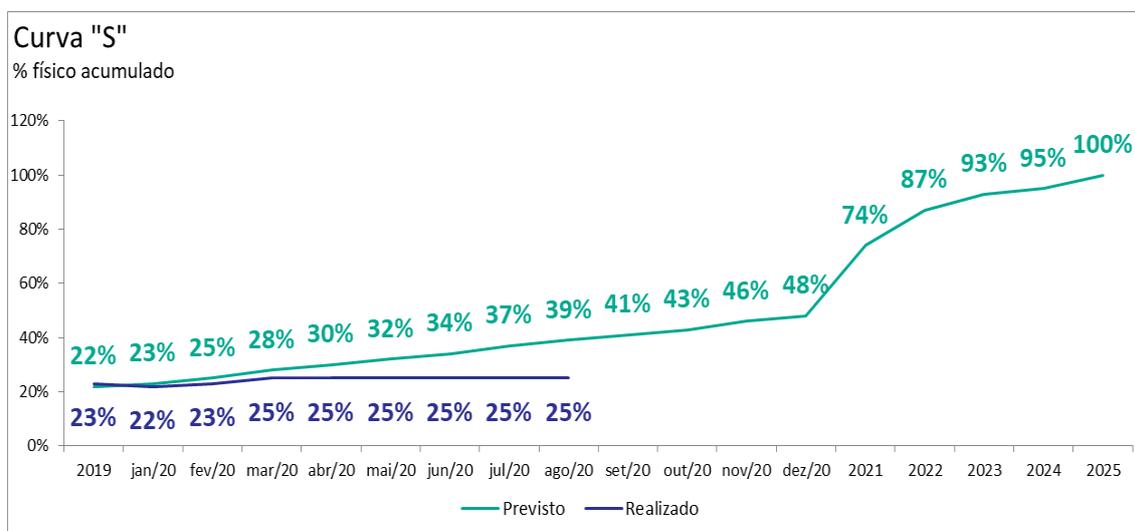


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Identificar alterações no perfil de saúde da população atingida, em decorrência do rompimento. Com base em evidências de correlação, desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados.

Cláusulas do TTAC: 106 – Planejada; 107, 109, 111 e 112 - § único - Em andamento.

Deliberações que impactam em escopo e prazo: 106 – Item 3, 130 – Item 4, 189 – Itens 1 e 2, 197 – Itens 1 e 2, 198 – Item 2, 219 – Item 4, 220 – Itens 2 e 3, 247 – Item 1, 252 – Item 2, 264 – Item 4, 265 – Item 2, 266 – Item 2, 313 – Item 2 - Concluídas internamente; 301, 386 e 416 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020*

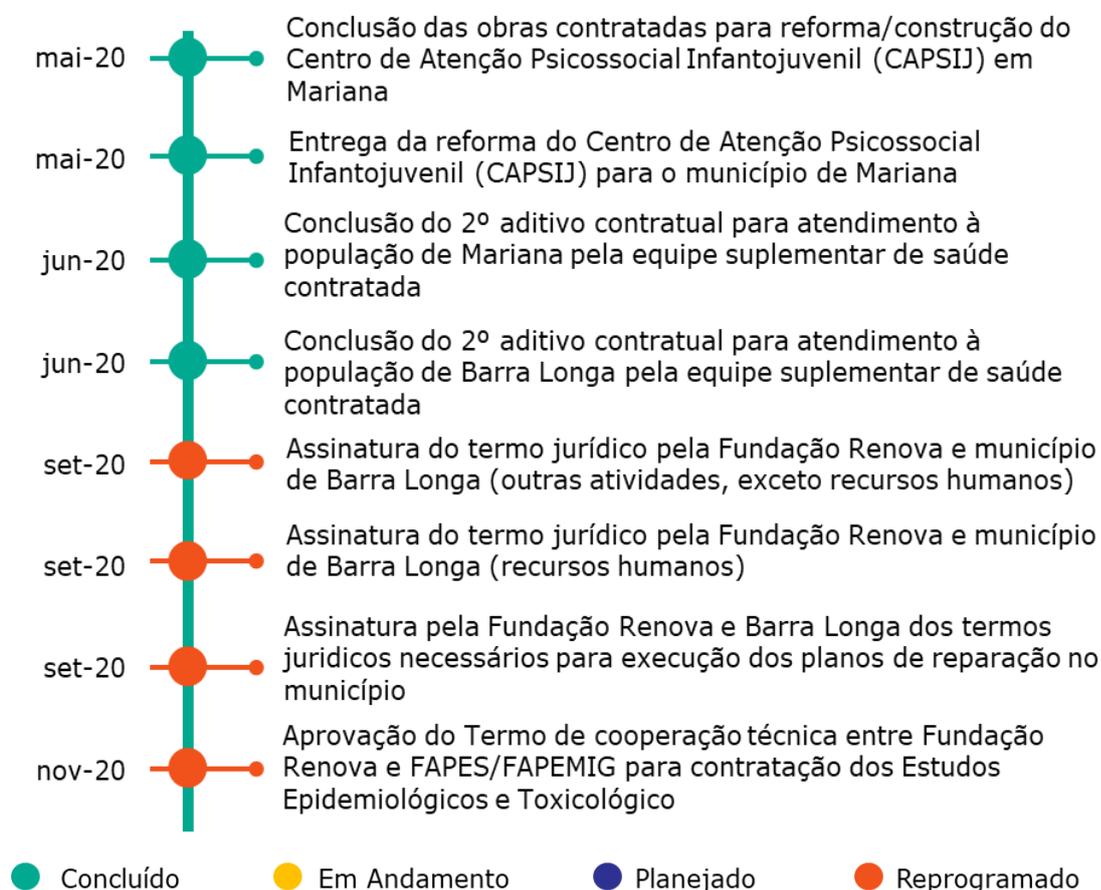

NOTA: *AS ENTREGAS FUTURAS RELACIONADAS À AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP 155) E AO PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EM SAÚDE DE BARRA LONGA PODEM SOFRER MUDANÇAS DE PRAZO, DE ACORDO COM AS DECISÕES JUDICIAIS.

Grandes números do programa

- **44 profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (**28 profissionais**) e Barra Longa/MG (**16 profissionais**) no período de 21/07/2020 até 20/08/2020.

*O NÚMERO REPORTADO PELO FORNECEDOR REFERE-SE AO NÚMERO EFETIVO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO PERÍODO DA MEDIÇÃO, DESCONSIDERANDO, POR EXEMPLO, AQUELES DE FÉRIAS OU AFASTADOS (PODENDO, PORTANTO, VARIAR DE UM RELATÓRIO PARA OUTRO) E ESTÁ SUJEITO À APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO REALIZADA ENTRE FORNECEDOR E FUNDAÇÃO RENOVA

Fatos relevantes do mês

- Recebimento de nova proposta do cronograma do processo do edital dos estudos epidemiológicos e toxicológicos em parceria com a FAPES/FAPEMIG.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa*

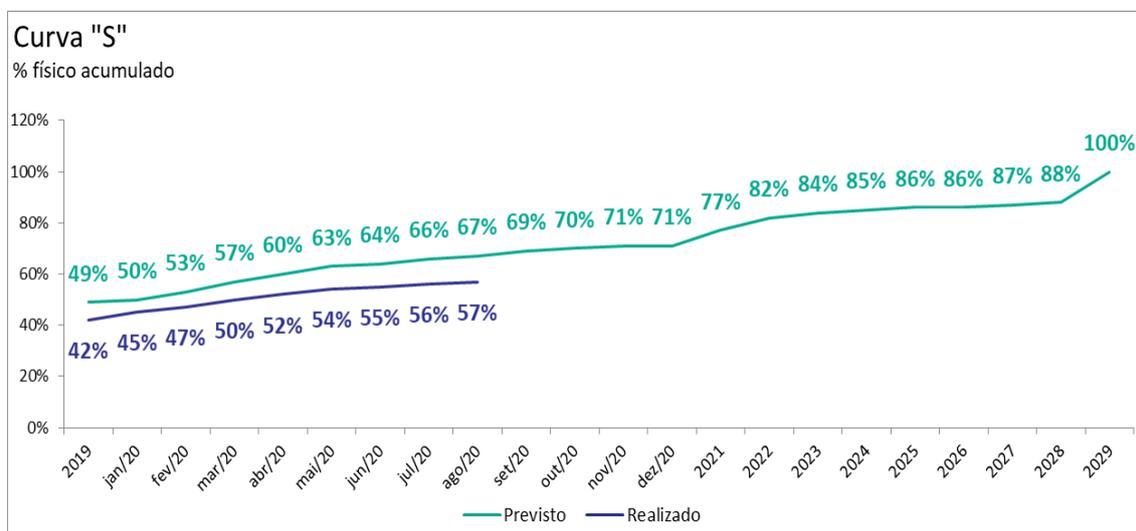


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

NOTA: *CURVA S SUJEITA A ALTERAÇÕES DEVIDO ÀS REVISÕES NO ESCOPO DO PROGRAMA E CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Fomentar a inovação e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação.

Cláusulas do TTAC: 113 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 31, 100, 126 – Item 2, 126 – Item 3 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

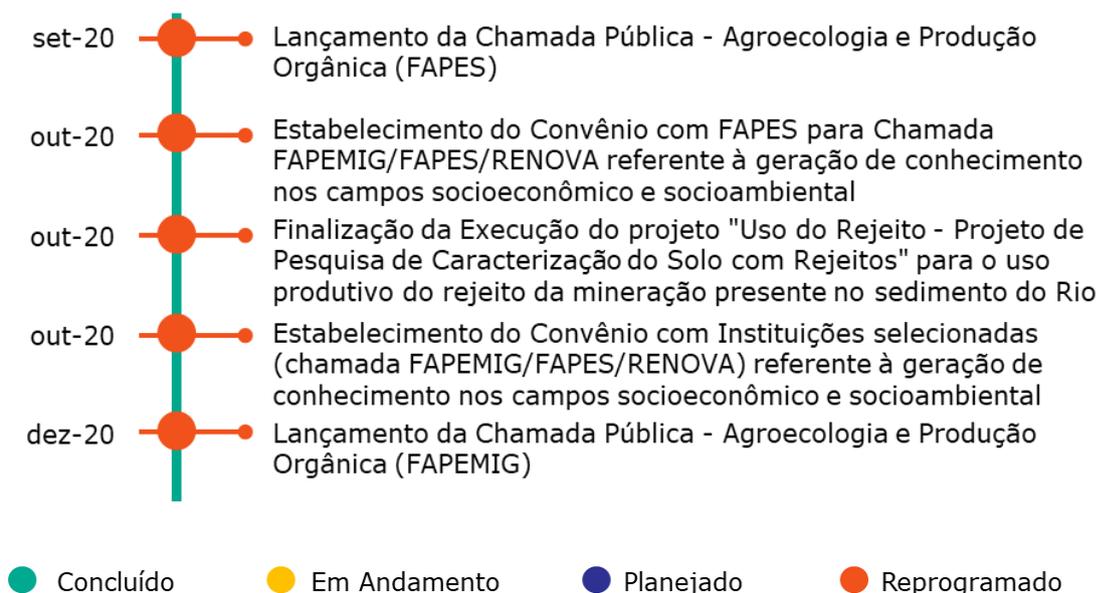

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Projeto para Estação de Tratamento Natural (ETN) - LiaMarinha

- Finalização da implantação do projeto piloto da Estação de Tratamento Natural (ETN) em um percurso do rio Gualaxo do Norte.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

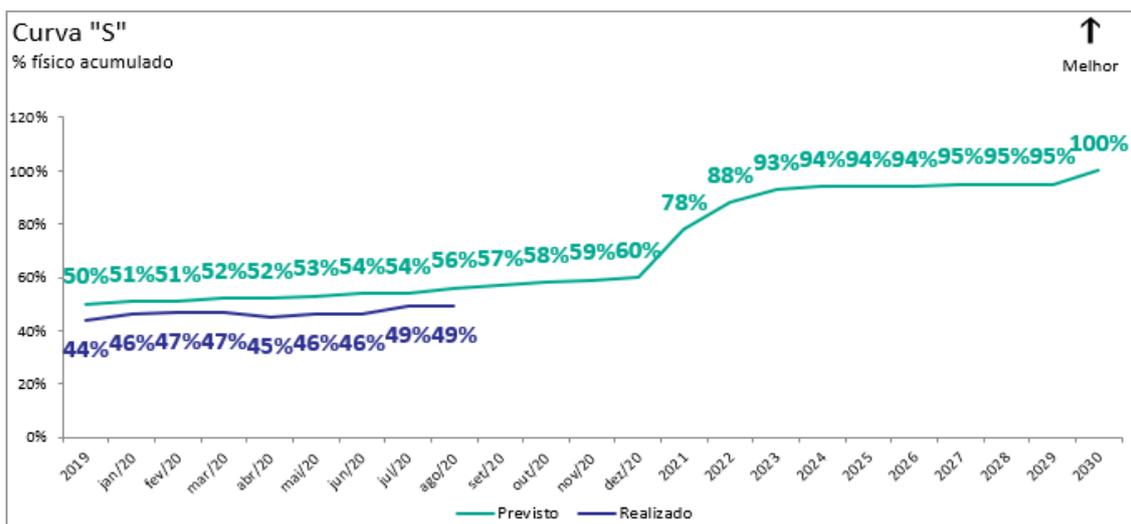


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade


Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do “Pescador de Fato” ou com protocolo emitido de acordo com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: um para superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e aquicultura e outro para reestruturação produtiva, alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusulas do TTAC: 116, 117, 118, 119, 120 e 123 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 121 – Concluída, conforme deliberação 147 de 28 de janeiro de 2018; 58 – Item 2; 58 – Item 3; 167 – Item 1; 167 – Item 2 e 167 – Item 3 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020*

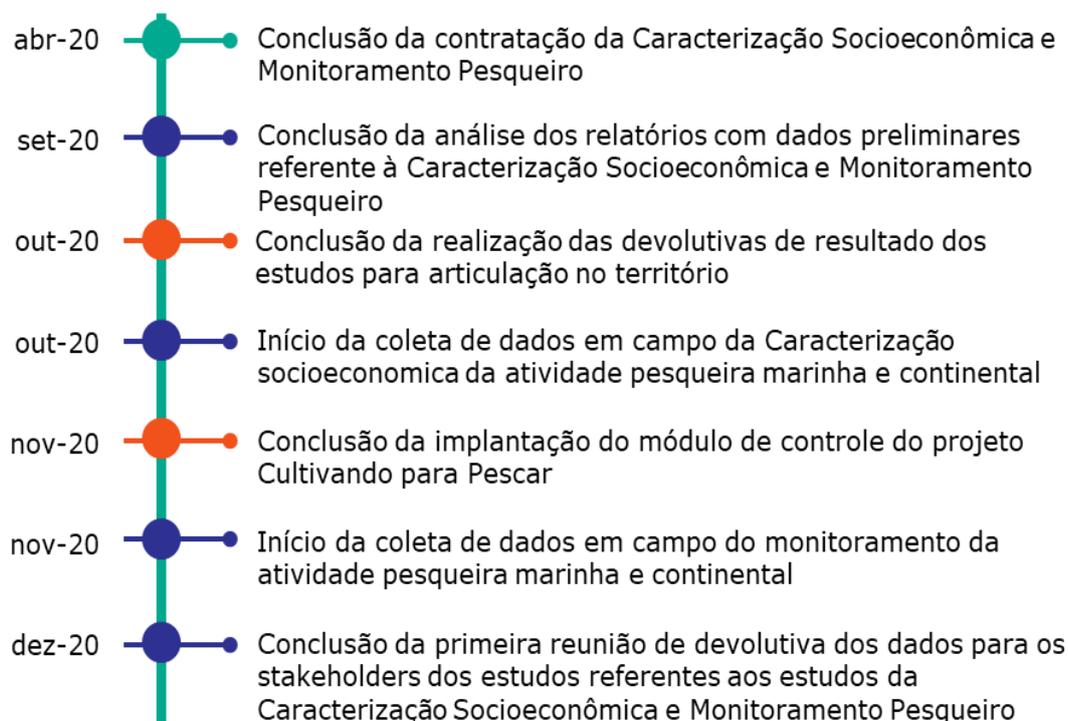

● Concluído
 ● Em Andamento
 ● Planejado
 ● Reprogramado

* AS DATAS ACIMA FORAM PLANEJADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DA PESCA E AINDA NÃO CONTEMPLAM AS INTERFACES DOS PROGRAMAS. AS DATAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES APÓS A INCLUSÃO DAS INTERFACES.

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Mapeamento das potencialidades econômicas para estruturação produtiva e alternativas de renda (Diagnóstico da cadeia, Percepção de impacto e Viabilidade de projetos)

- Entrega dos relatórios parciais com informações preliminares de dados secundários dos municípios de Marliéria/MG, Pingo D'Água/MG, Raul Soares/MG, São Domingos do Prata/MG, Sem Peixe/MG, Timóteo/MG.

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Monitoramento Pesqueiro

- Entrega do relatório de dados preliminares/secundários enviado pelos parceiros referente ao estudo da Caracterização Socioeconômica da Pesca, Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro.

Projetos Foz – Edificação de Povoação

- Entrega do relatório final referente à sondagem da área de construção da Edificação de Povoação para a Associação de Pescadores Assemelhados de Povoação (APAP).

Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo

- Emissão do CNPJ e formalização da Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (ASPIPEC) em órgãos oficiais e normativos;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Índice de atendimento aos pescadores (as) / aquicultores (as) em atividades alternativas	Quantidade de pescadores (as) aquicultores (as) atendidos (as) pela assistência técnica / ΣQuantidade de pescadores profissionais (SGS) + Pescadores de fato a serem validados pelo sistema CIF + Aquicultores – Nº de registros de “não interesse” ou “não aplicável”	%	-	-	-
I02	Índice de pescadores que atuam ou retornaram à pesca extrativista	Quantidade de pescadores (as) que atuam ou retornaram à pesca extrativista / ΣQuantidade de pescadores profissionais (SGS) + Pescadores de fato a serem validados pelo sistema CIF – Nº de registros de “não interesse”	%	-	-	-
I03	Índice de aquicultores(as) que atuam ou retornaram à atividade produtiva	Quantidade de aquicultores (as) que atuam ou retornaram à atividade produtiva/ ΣQuantidade de aquicultores profissionais (SGS) – Nº de registros de “não interesse”	%	-	-	-

Os indicadores acima foram propostos na revisão da definição do programa e serão avaliados pela Câmara Técnica de Economia e Inovação (CT-EI).

Curva S do programa

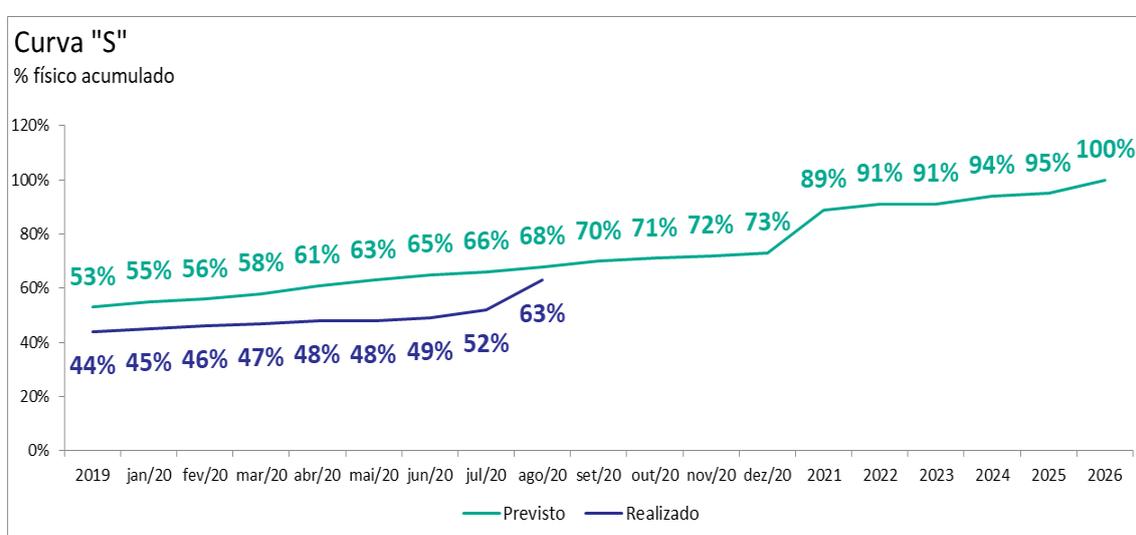


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico. (agosto/2020).

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a garantir o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento, incluindo ações relacionadas ao incremento de alternativas para manejo de solo e água. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis, visando à agregação de valor, diversificação econômica inclusiva e alternativa aos produtores rurais que também atuam em atividades pesqueiras no rio Doce.

Cláusula do TTAC: 124 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 145, 263 - Itens 2 e 3, 343, 354 – Itens 1 e 2 – Concluídas internamente; 341 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 253 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 47 direcionados ao reassentamento e 206 ao PASEA. Dos 206, 186 são PASEA planejados sendo que 166 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 20 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 150 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 5 não aderiram e 11 estão em análise pelo produtor;
- 43.688 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 904,65 toneladas no mês de agosto;
- 2.549,47 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 117 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 383 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 473 infraestruturas rurais simples concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.124,07 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 1.637 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 3.404 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- Duas feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade).

Baixo Rio Doce

- 1.005 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.136 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- Uma feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus).

Parcerias

- 33 Cursos de capacitação realizados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 16 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas nos territórios Mariana e Alto Rio Doce. As Unidades Demonstrativas foram implantadas em parceria com o *World Resources Institute* (WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

Ainda seguindo os alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, e diante do aumento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) no Brasil, a Fundação Renova, desde abril/2020 mantém suspensas algumas de suas atividades de campo. Portanto, há números do programa que não tiveram avanço no mês de referência.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

- Realização das entregas de alimentação animal no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- Construção participativa de projetos executivos de pomares e hortas nos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Ponte Nova/MG. Estas benfeitorias são pautas positivas na rotina produtiva das famílias rurais, favorecendo a segurança alimentar e dando oportunidades de uma possível diversificação de renda em um futuro próximo;
- Foi elaborada uma proposta de sumário do relatório quadrimestral do programa de Retomada das Atividades Agropecuárias, para entrega de validação a Câmara Técnica de Economia e Inovação (CTEI), este documento está em acordo e atende a Nota Técnica 77/2020 CTEI (02/07/2020). As apresentações de acompanhamento do Programa 17, foram realizadas na CTEI no dia 27/08/2020, também foram revisadas e seguem a NT77 e relatório. Os dois formatos foram apresentados ao Grupo de Trabalho de Agropecuária (GT-AGROPEC), apoio técnico da CTEI. O objetivo desse relatório é de *report* do programa ao sistema Comitê Interfederativo (CIF) e clareza nas ações desenvolvidas.

Médio e Baixo Rio Doce

- Fornecimento de recursos financeiros para aquisição de silagem aos produtores rurais, localizados abaixo da Usina Risoleta Neves em Minas Gerais até o Espírito Santo, que estejam enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na manutenção de suas atividades produtivas, em atendimento à Ação Civil Pública

da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (SJMG);

- Como parte das ações da Fundação Renova nas Comunidades de Rochedo, Leonel e Córrego Preto, em integração entre as áreas de Diálogo, Economia e Inovação e Uso Sustentável da Terra, foi realizado acompanhamentos técnicos para viabilizar o plantio e comercialização do feijão destas comunidades. Houveram interações com a EMATER e com a empresa AllNutri (marca Pink) que fez a compra do feijão produzido. O trabalho realizado, plantou 31,24 hectares e mais que dobrou a produtividade de sacas por hectare a despeito dos limites de atendimento em função do COVID-19. Algumas sacas foram destinadas para consumo das famílias, seleção de sementes e uma parte vendida a relações locais de comércio. Através do fomento de insumos (agro silício, adubo, semente, peças de plantadeira e equipamento de proteção individual), foram produzidos um total de 478 sacas de feijão carioca tipo pérola. A produtividade mais que dobrou em relação aos plantios anteriores, demonstrando a importância do acompanhamento técnico na produção agropecuária. O valor bruto tramitado e disponível para a comunidade foi na ordem de R\$114.233,98. Outros ganhos foram auferidos, com destaque a organização e a confiança da comunidade nos trabalhos das equipes da Fundação Renova.

Indicadores

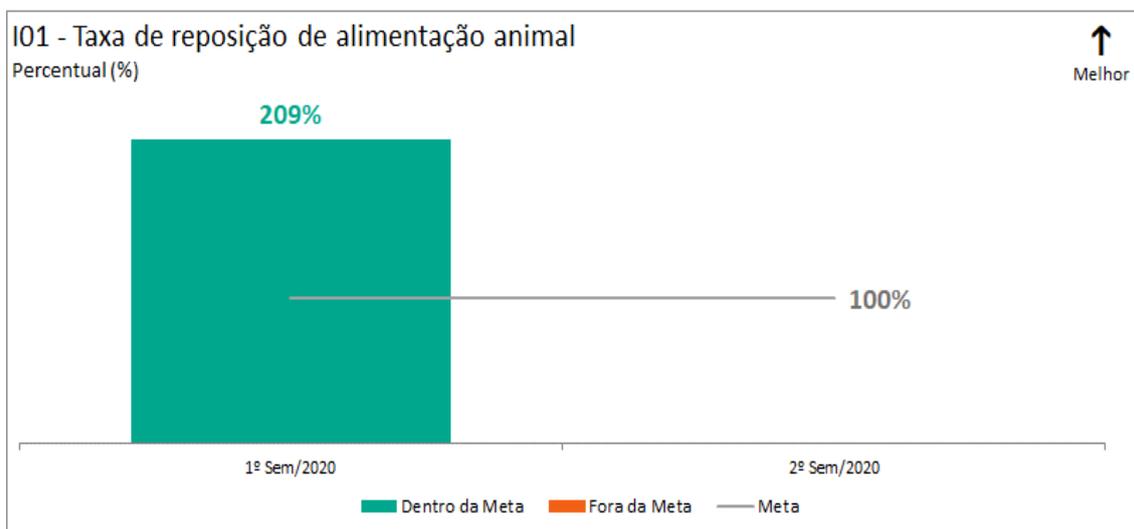


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal (agosto/2020). Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I2	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$\frac{\text{(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas)}}{\text{(Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)}}$	%	-	-	-
I3	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	$\frac{\text{Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas}}{\text{número de famílias atendidas}}$	h/ano	-	-	-
I4	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das	$\frac{\text{Nº de produtores com ISA maior ou igual a 0,7}}{\text{nº de}}$	%	-	-	-

	propriedades rurais à montante de Candonga	produtores participantes do Programa				
I5	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	-
I6	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	-
I7	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	Nº de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%	-	-	-
I8	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas) / (Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)	%	-	-	-

Curva S do programa

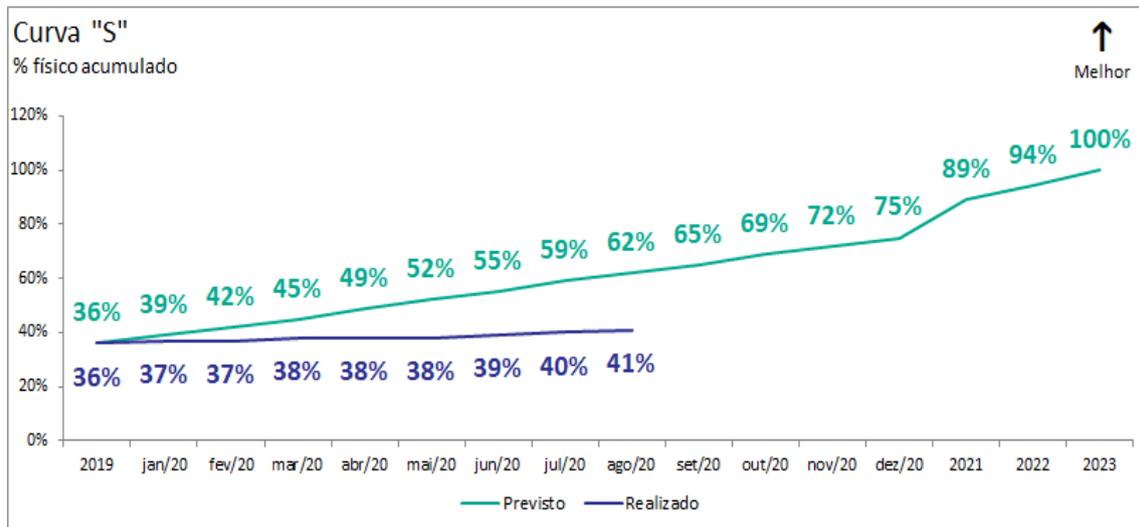


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Adotar estratégias que contribuam para o desenvolvimento econômico da região e a redução da dependência da atividade minerária, estimulando o surgimento de novas indústrias/negócios baseadas em alternativas tecnológicas e sustentáveis, promovendo uma maior integração produtiva da população, conforme cláusulas 129 e 130 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Cláusulas do TTAC: 129 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 109 e 163 – Item 3 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

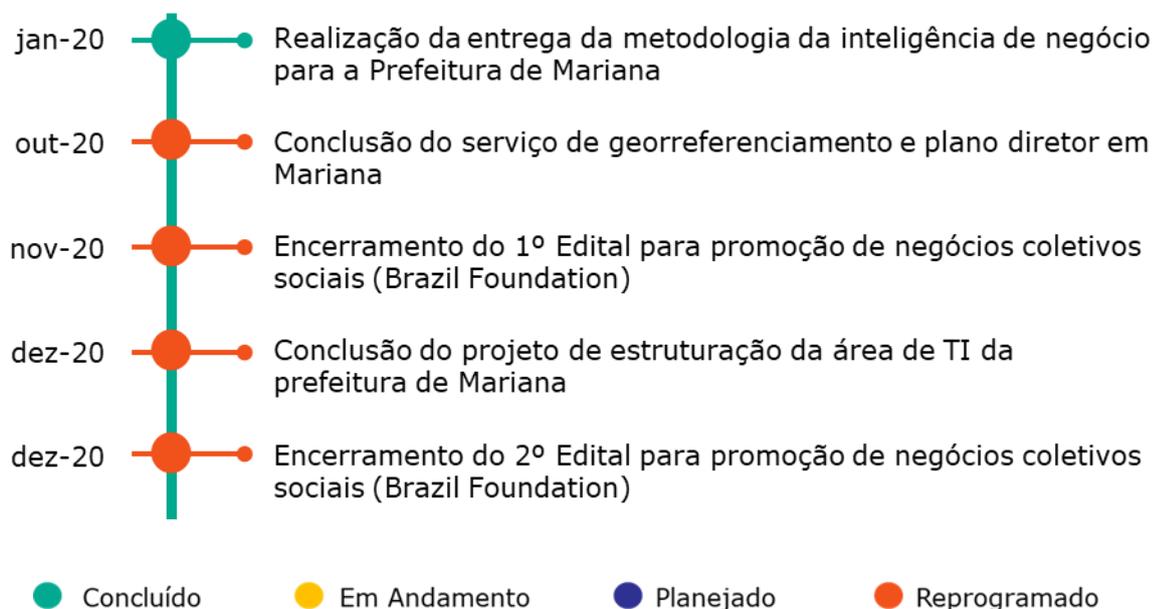

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 50,3 milhões** emprestados para negócios em Minas Gerais e no Espírito Santo. (Resultado acumulado até julho de 2020);
- **R\$ 40 milhões** em linhas de crédito.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito.

Fatos relevantes do mês

Fundo Desenvolve Rio Doce

- O BDMG concedeu 1237 empréstimos para 998 empresas, até julho/2020;
- O BANDES realizou 394 empréstimos para 385 empresas, até julho/2020.

Nota: Os dados de agosto/2020 não foram recebidos até o fechamento do presente relatório.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

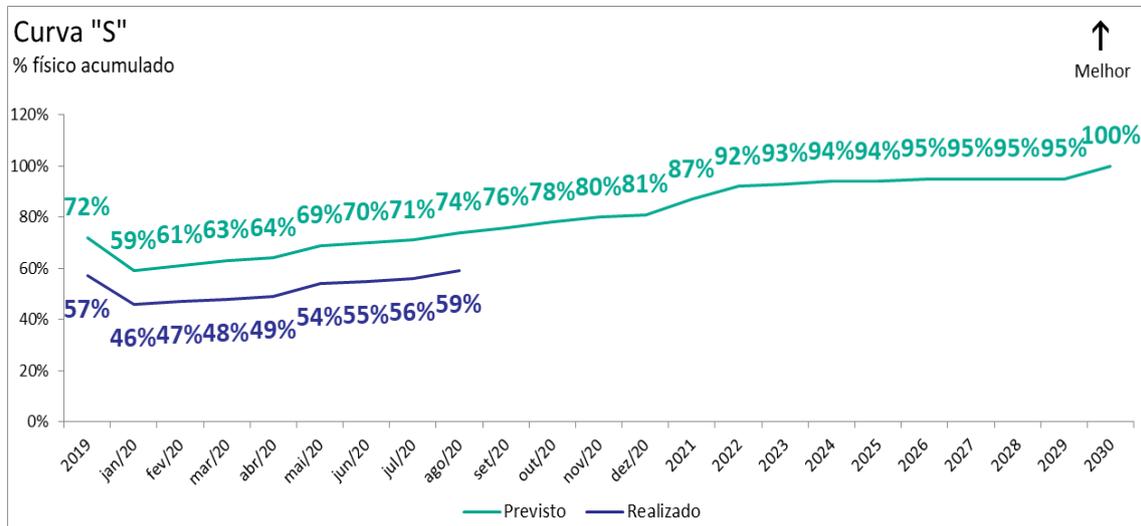


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusulas do TTAC: 132 – Caput.

Entregas do ano de 2020

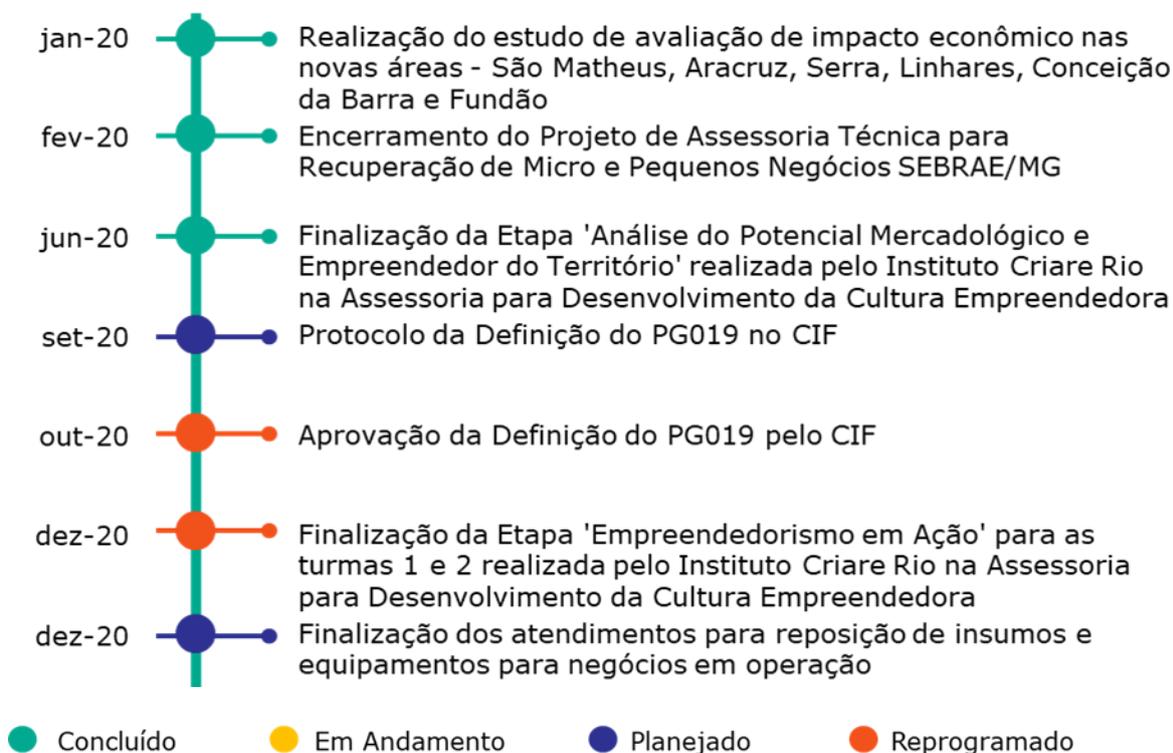

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores




Gráfico 5. Número de atendimentos aos Micro e Pequenos Negócios. Gráfico Acumulado.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I1	% de negócios impactados com condições de produção recuperadas	Total de empreendedores que tiveram o reestabelecimento das condições produtivas - equipamentos, insumos e estrutura física - para mesma atividade econômica / Número de empreendedores atingidos elegíveis que desejam retomar sua atividade comercial	%	-	-	-
I2	% de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada	Quantidade de empreendedores que desejam migrar para novo negócio e que foram atendidos por assessoria técnica ou consultoria / Quantidade de empreendedores que desejam migrar para um novo negócio e que solicitaram assessoria ou consultoria	%	-	-	-

Curva S do programa

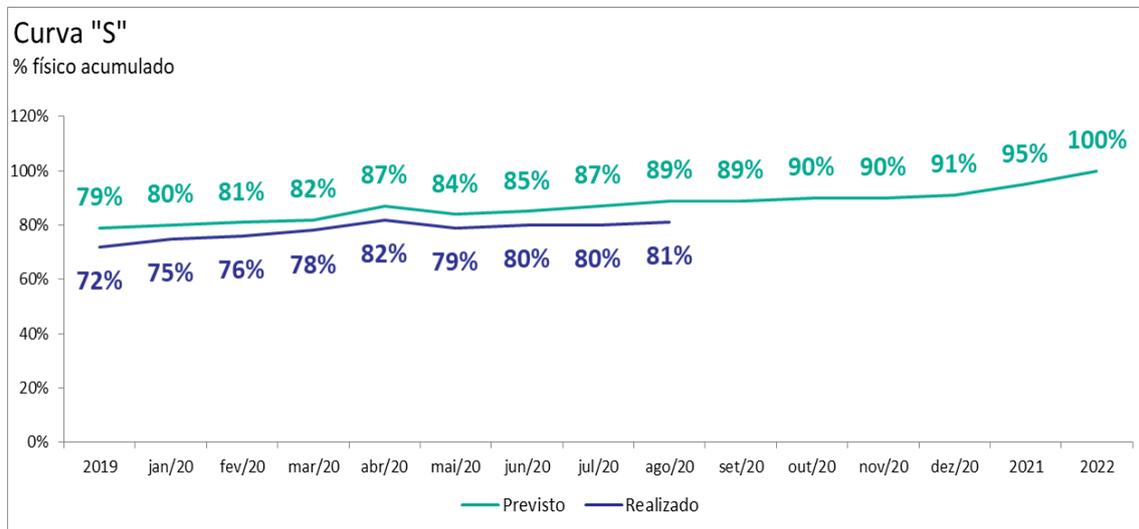


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso da força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 134 – Em andamento; 136 – Concluída internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 84 e 146 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

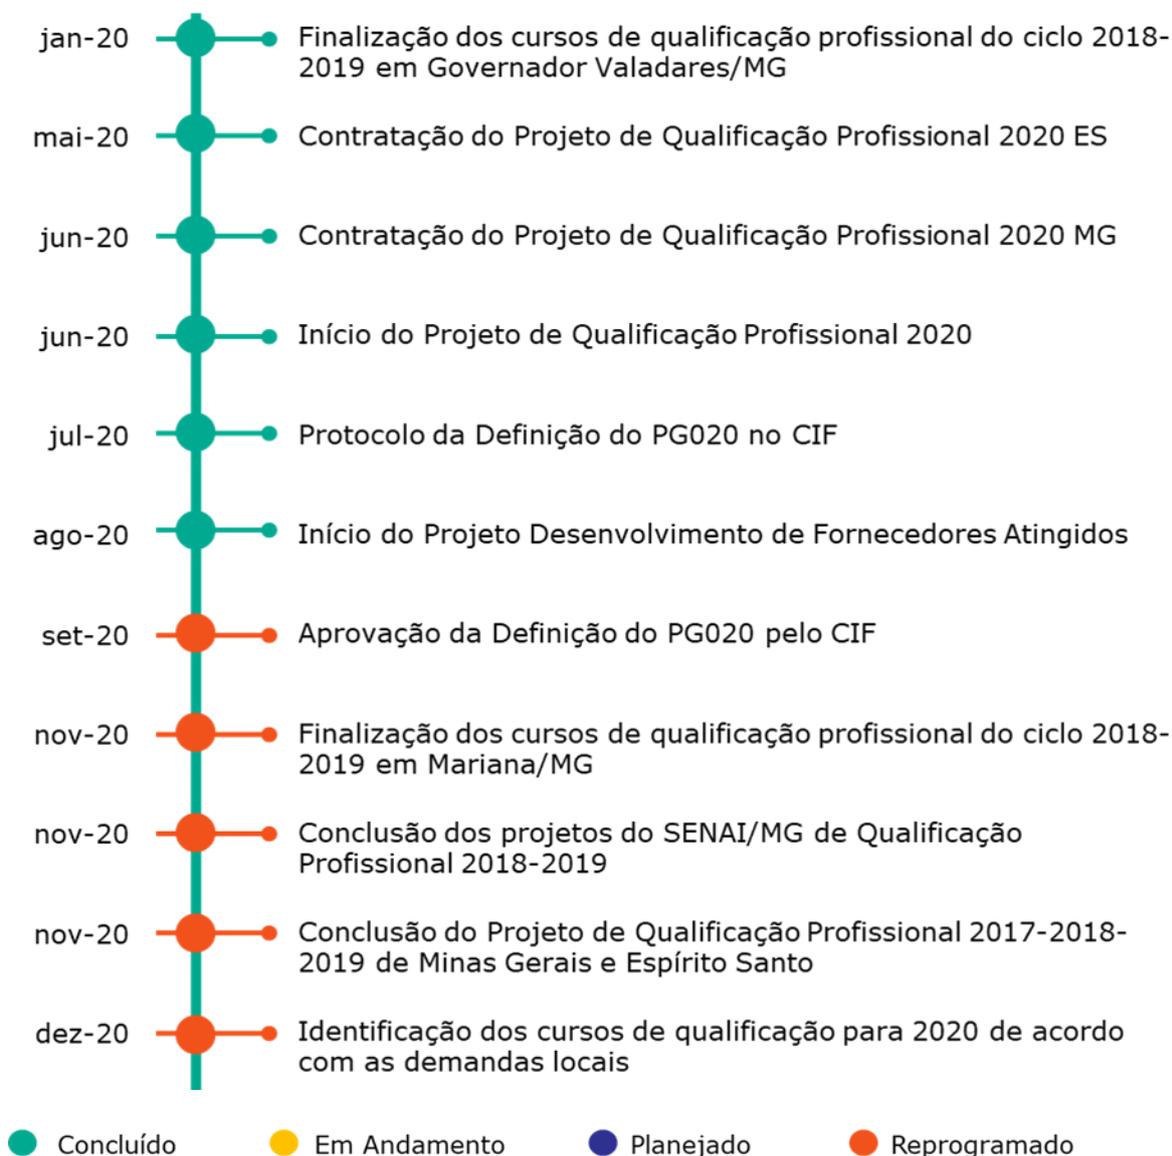

Grandes números do programa

- **1.813 profissionais qualificados**, dentre os quais: **960** qualificados em Mariana, **569** no Espírito Santo e **284** em outras cidades de Minas Gerais de setembro/2017 até agosto/2020. A meta é qualificar 2.000 profissionais até dezembro/2030.

Fatos relevantes do mês

Assessoria Técnica Desenvolvimento de Fornecedores

- Entrega do diagnóstico final de avaliação de desenvolvimento para a última empresa participante do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em Governador Valadares/MG;
- Entrega dos relatórios individuais e do relatório final do 2º ciclo do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em Governador Valadares/MG.

Indicadores

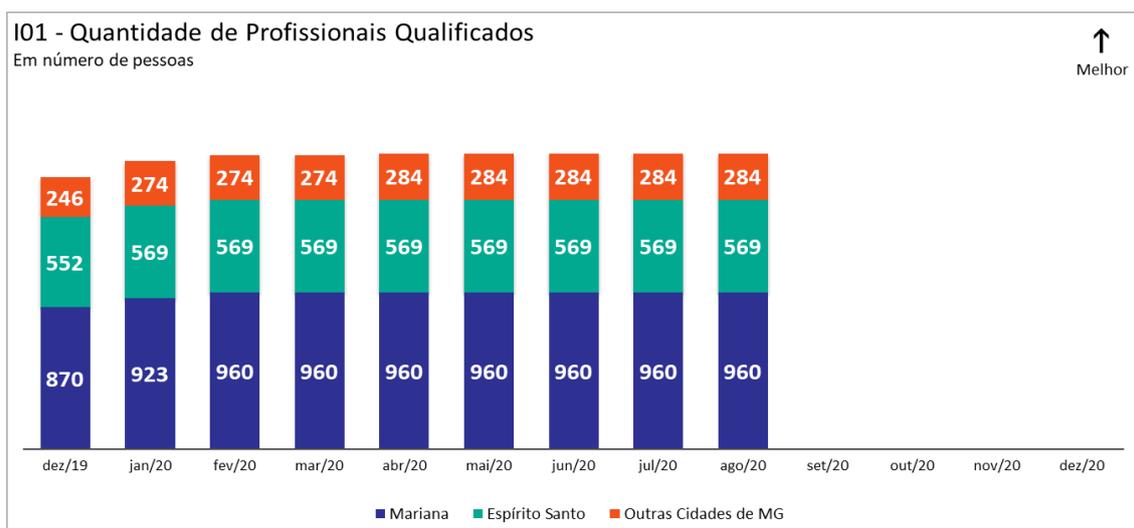


Gráfico 6. Quantidade de alunos qualificados nos cursos de qualificação profissional por localidade. Gráfico Acumulado.

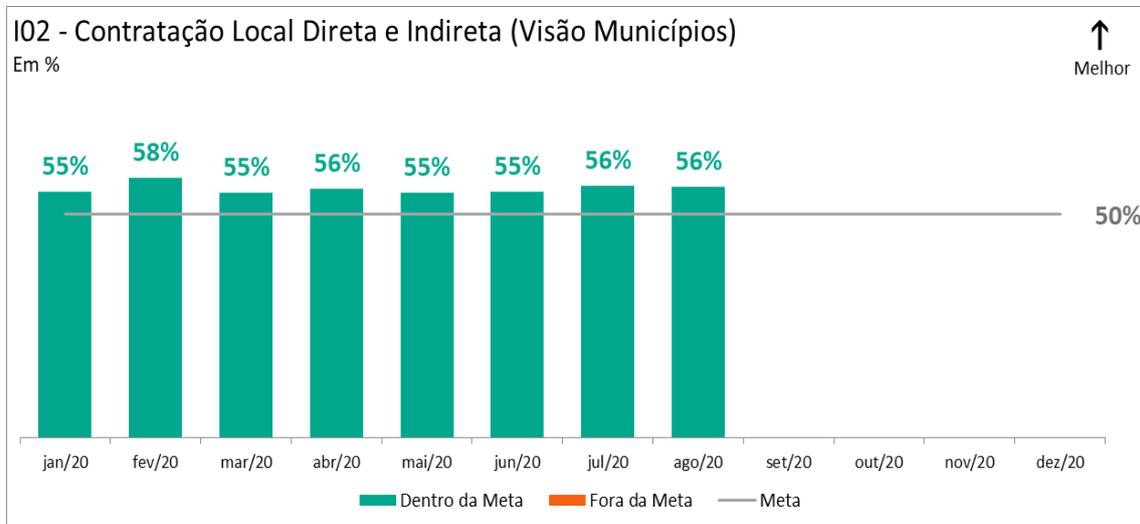


Gráfico 2. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Municípios). Gráfico Mensal.

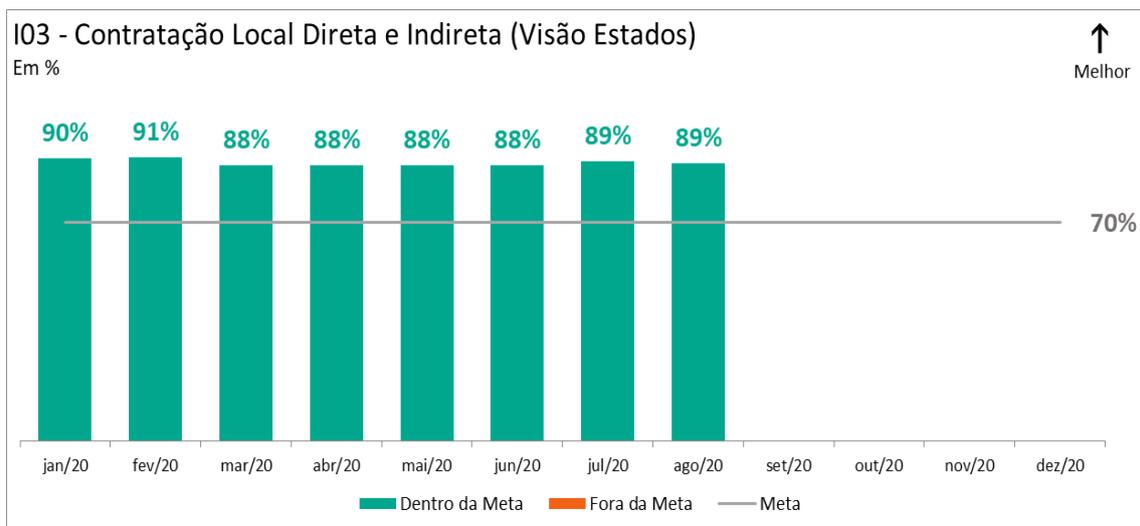


Gráfico 3. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Estados). Gráfico Mensal.

Curva S do programa

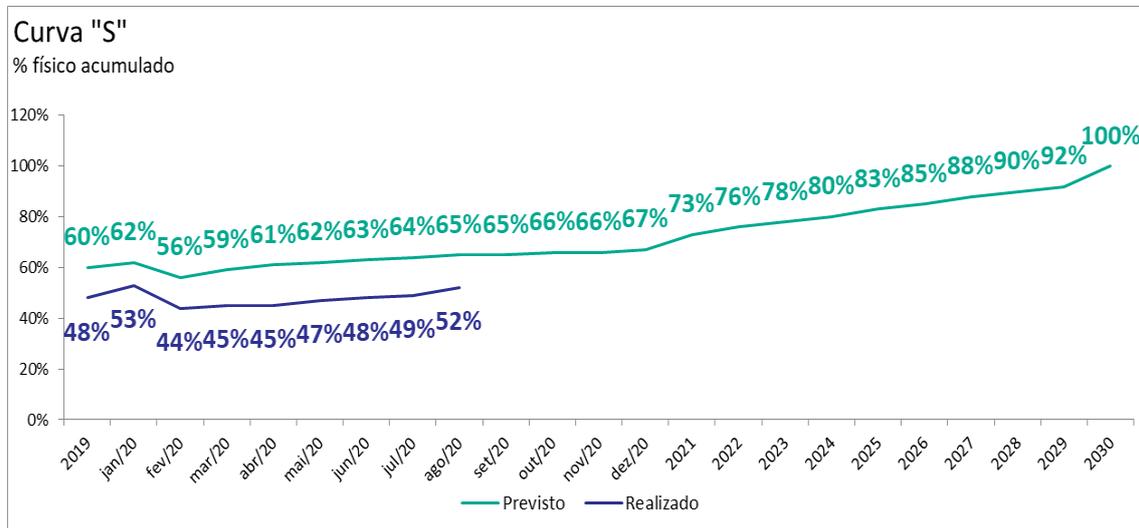


Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula do TTAC: 137 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 35, 48, 141 - Item 4, 167 - Itens 1 e 2, 210, 292 – Item 2 – Concluídas internamente; 111- Item 6, 420 – Item 3-a, 422 – Item 2 – Em andamento; 167 – Item 3 e 307 – Item 2 – Judicializadas; 333 – Item 2 - Reprogramada.

Entregas do ano de 2020

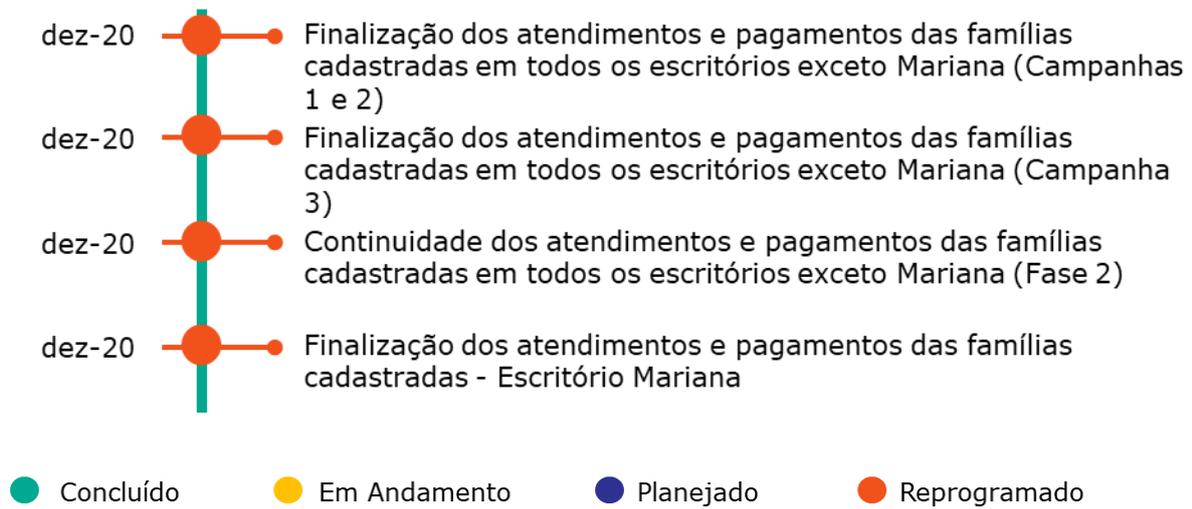

Grandes números do programa

- Atualmente há **14.763 titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (18.148), são **32.911** pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.402,85 milhões**.

Fato relevante do mês

- Inclusão de 10 auxílios, todos por decisão judicial.

Indicadores*




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

*FOI REALIZADO AJUSTE DO GRÁFICO, CONSIDERANDO AS CASAS DECIMAIS DO RESULTADO DO INDICADOR.

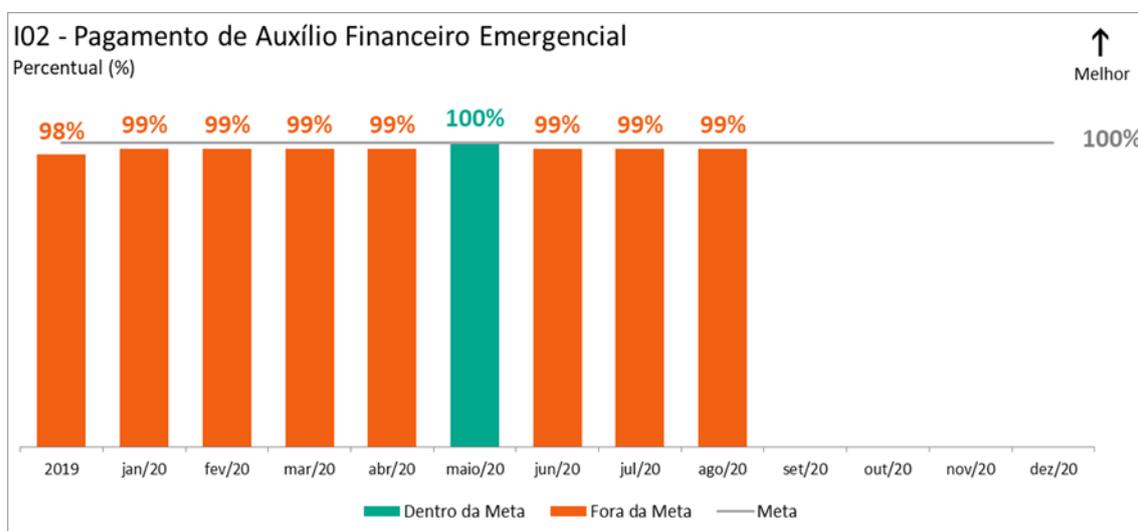


Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

Curva S

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento do avanço físico do programa.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água


Objetivo


Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.


Cláusulas do TTAC: 150 e 180 – Concluídas internamente; 151 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 3, 45, 86 (itens 1-c.; 1-a, f; e), 142 (item 2), 164 (item 1), 165 (item 2), 173 (item 3), 180 (item 2), 222 (itens 1.1; 1.3; 1.2; 1.7; 1.4; 1.6), 245 (itens 1.3; 1.1; 1.2), 246 (itens 2; 3), 261 (itens 1.19; 1.2; 1.16; 1.18; 1.4; 1.7; 1.3; 1.13; 1.5; 1.1; 1.14; 1.17), 273 (item 1.2), 284 (itens 1; 2), 285 (itens 3; 5; 2), 324 (item 2), 345 (item 2), 358 (itens 1, 2), 362 (item 2); 378 (item 6), 384 (item 1) – Concluídas internamente; 165 (item 1), 194 (item 2), 222 (itens 1, 1.5), 245 (itens 1, 1.4), 261 (itens 1, 1.9, 1.10, 1.12, 1.11), 273 (itens 1; 1.6; 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7), 304 (item 2), 378 (item 5) – Em andamento; 261 (item 1.8), 358 (item 3) – Judicializadas.

Entregas do ano de 2020

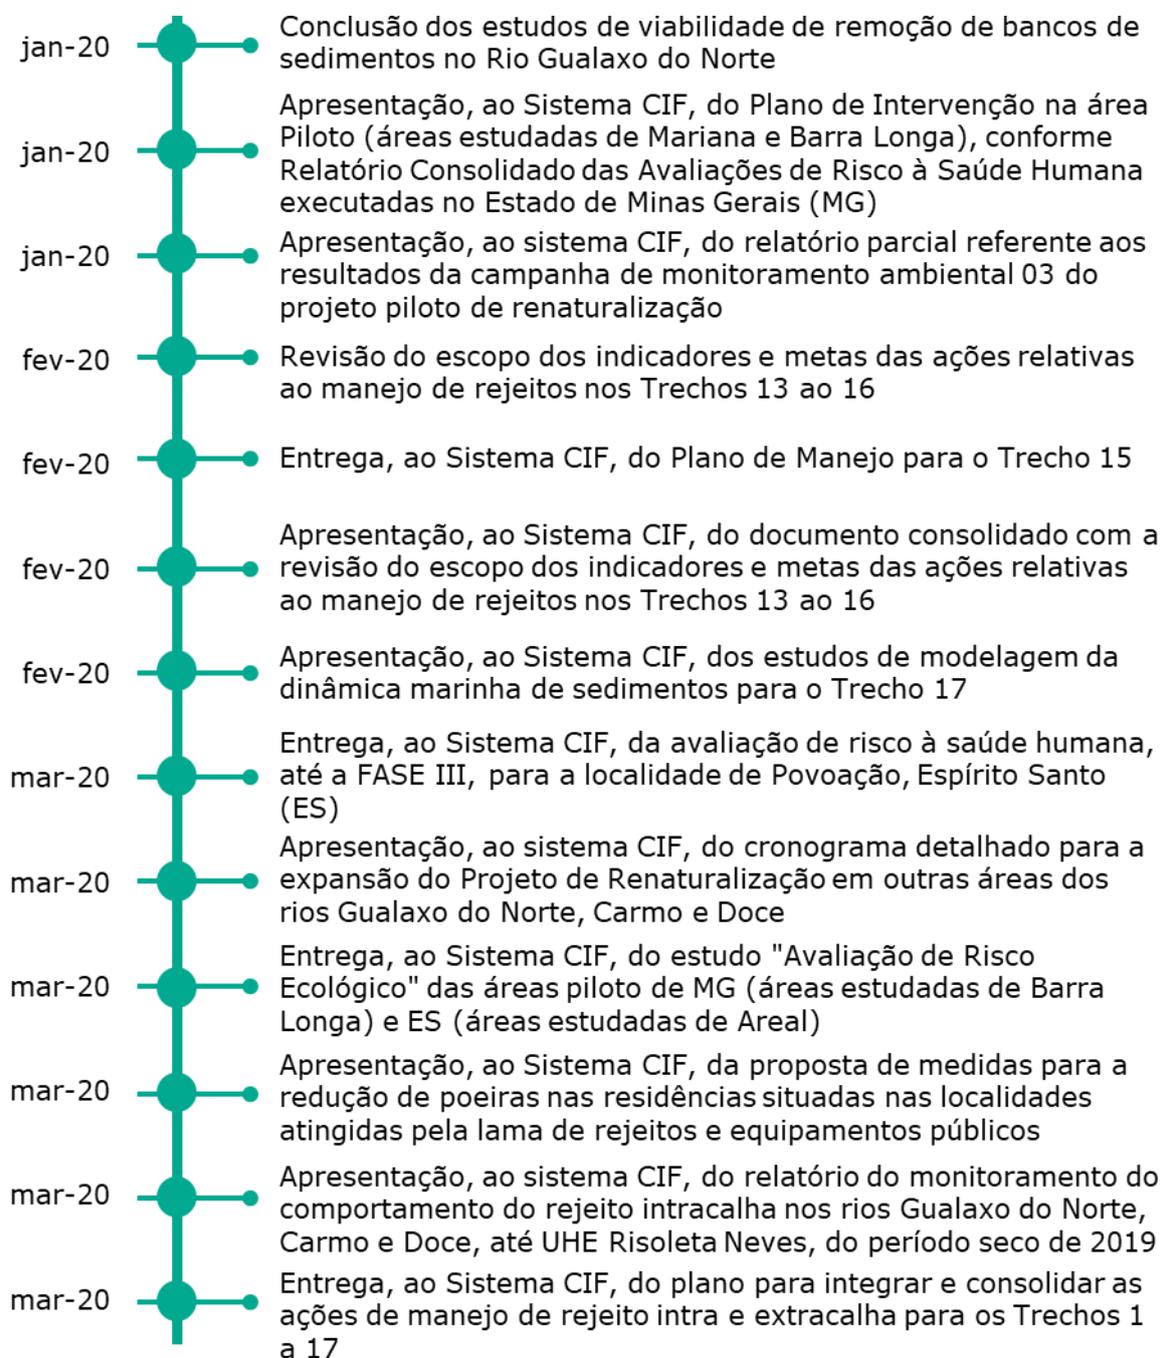

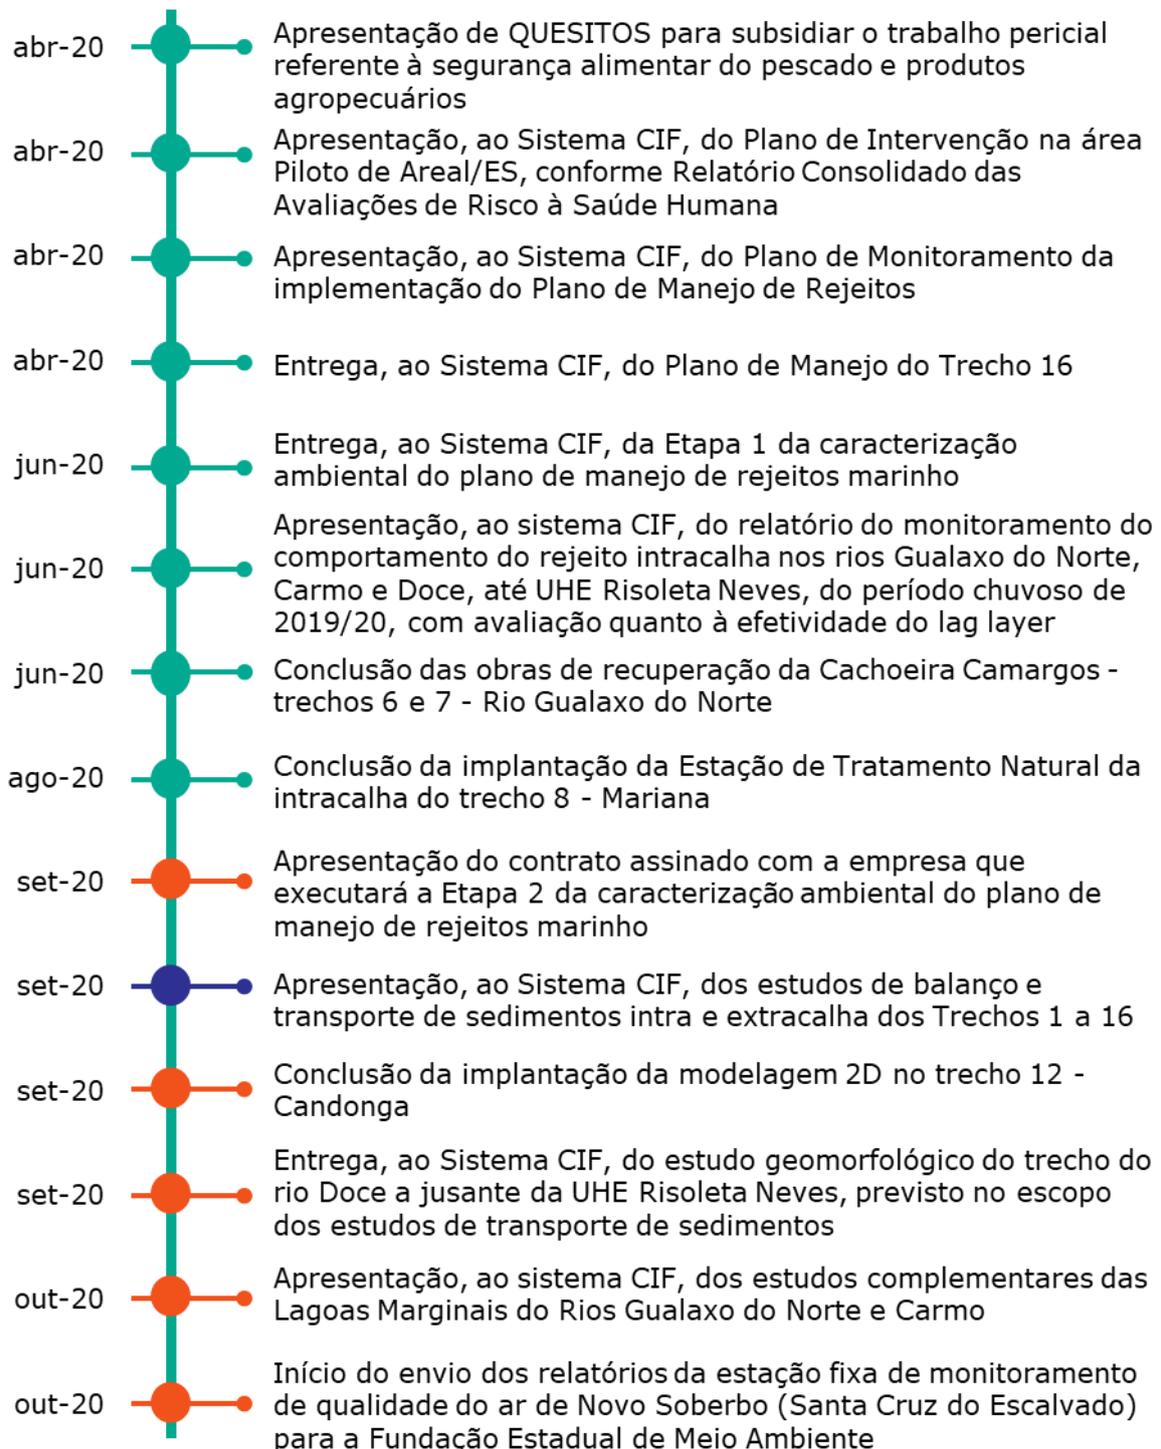

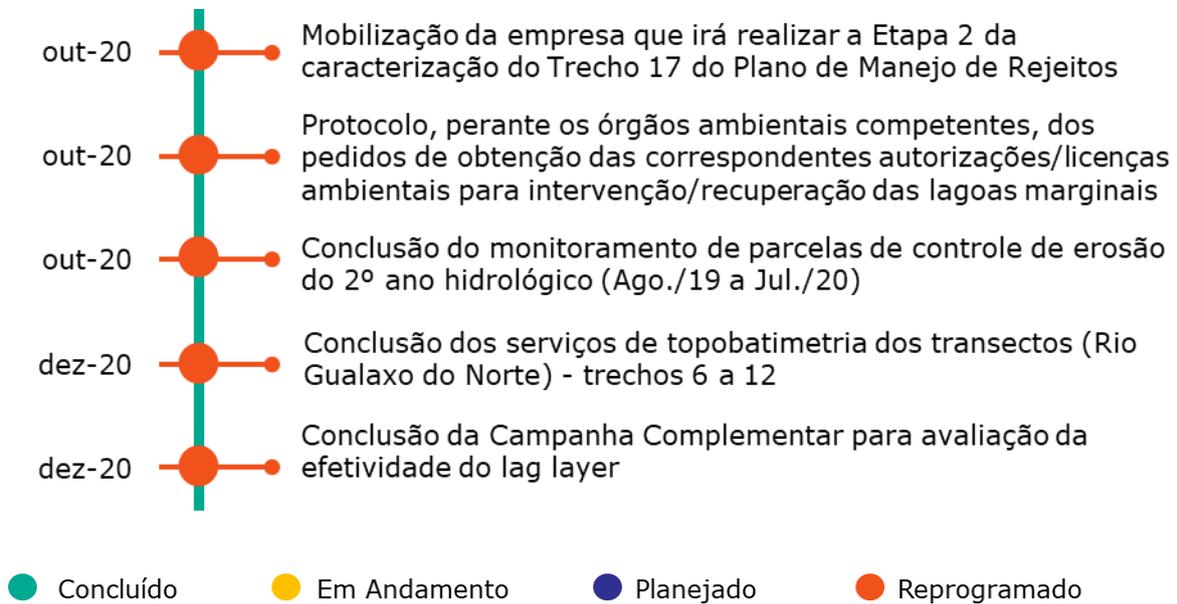

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Plano de Manejo de Rejeitos

- Conclusão da implantação da Estação de Tratamento Natural em Mariana.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores (agosto/2020).

CONCENTRAÇÃO DE POEIRA INALÁVEL – PM10 Limite superior: 40 µg/m ³ (CONAMA 491/2018)	MÉDIA PERÍODO [µg/m³]
Mariana/MG – Paracatu	25
Barra Longa/MG – Centro	22
Barra Longa/MG – Volta da Capela	18
Barra Longa/MG – Gesteira	18
Rio Doce/MG – Santana do Deserto	15
Rio Doce/MG - Centro	13

Mariana/ MG - Paracatu – medição entre 01/09/19 e 31/08/20. Início da operação em 22/12/17.

Barra Longa/MG - Centro - medição entre 01/09/19 e 31/08/20. Início da operação em 18/02/16.

Barra Longa/MG - Volta da Capela medição entre 01/09/19 e 31/08/20. Início da operação em 11/08/17.

Barra Longa/MG - Gesteira - medição entre 01/09/19 e 31/08/20. Início da operação em 19/05/18.

Rio Doce/MG - Santana do Deserto – medição entre 01/09/19 e 31/08/20. Início da operação em 17/04/19.

Rio Doce/MG - Centro – medição entre 06/02/20 e 31/08/20. Início da operação em 06/02/20.

As ausências de dados no período são em decorrência da interrupção do monitoramento devido à impossibilidade de realização das atividades de manutenções e verificação nos equipamentos, em função do atual cenário provocado pela pandemia da Covid-19.

É importante considerar que, diante dos alertas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde sobre o Coronavírus, diversas medidas de segurança foram adotadas visando prevenir a sua disseminação, tanto por parte da Fundação Renova, quanto dos municípios onde as estações de monitoramento foram instaladas.

Curva S do programa

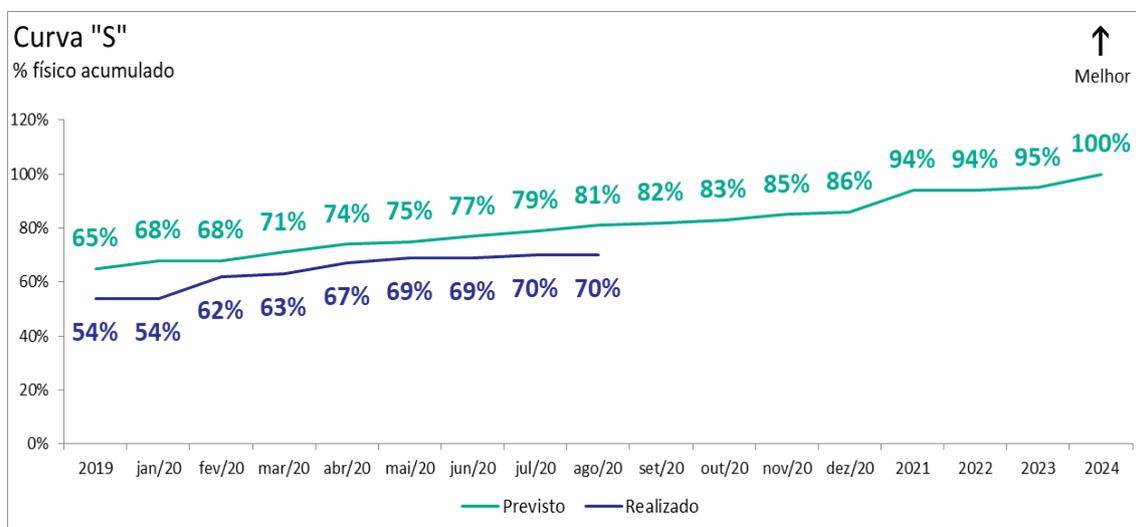


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água


Objetivo

Recuperar a área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado.

Cláusulas do TTAC: 158, 160 – Concluídas internamente; 159 – Atrasada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 26, 66, 186, 223, 249 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

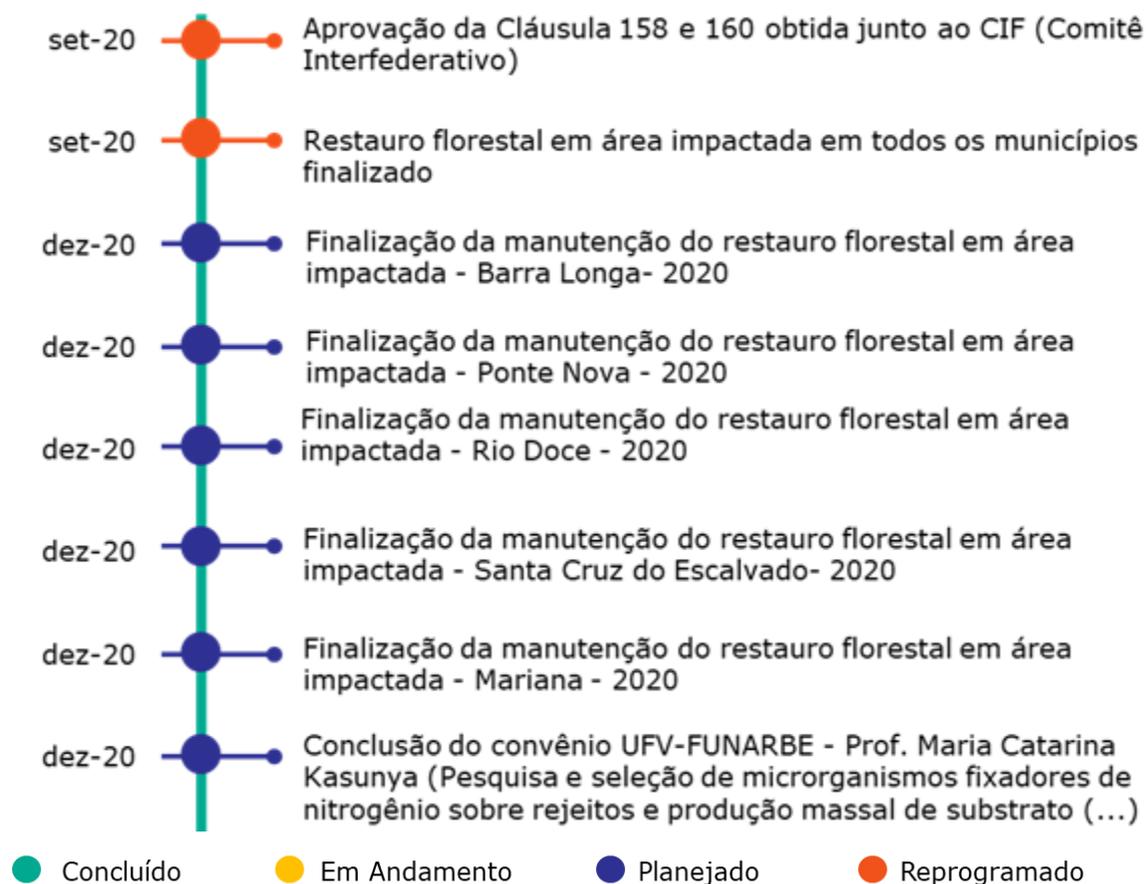

Grandes números do programa*

- **808 hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- **113 afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o Alto Rio Doce.

* OS GRANDES NÚMEROS DO PROGRAMA SE REFEREM AO PERÍODO DE AÇÕES EMERGENCIAIS (PÓS ROMPIMENTO ATÉ DEZEMBRO/2017).

Fatos relevantes do mês

- Ainda seguindo os alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, e diante do aumento de casos de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) no Brasil, a Fundação Renova, desde abril/2020 mantém suspensas algumas de suas atividades de campo nos municípios de Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz e Ponte Nova;
- Foram executados 431 hectares de restauro florestal em área impactada acumulados até agosto/2020;
- Foram executados 452 quilômetros de cercamento de Área de Preservação Permanente acumulados até agosto/2020;
- Manutenção em andamento do plantio já realizado no município de Mariana/MG;
- Preparo de solo em andamento para execução dos plantios e replantios previstos para o próximo período chuvoso;

- No dia 21 de agosto foi protocolado o ofício FR.2020.1670 referente ao relatório técnico sobre a conclusão da restauração florestal de recuperação da área ambiental 1 – cláusula 159 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Índice de Cobertura Vegetal	(Área total com cobertura vegetal herbácea – arbustiva/Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%	>=80	-	*
I02	Índice de Solo Exposto	(Área total com solo exposto/ Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%	<=20	-	*
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha	>=6	-	*
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	(Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia/Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle) * 100	%	>=80	-	*
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	-

I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	-
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	(Área total com espécie invasora/Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)) x 100	%	-	-	-
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	(Área total com solo exposto/Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)) x 100	%	-	-	-

* INDICADORES EM ANÁLISE PELA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA (CT-FLOR).

Curva S do programa

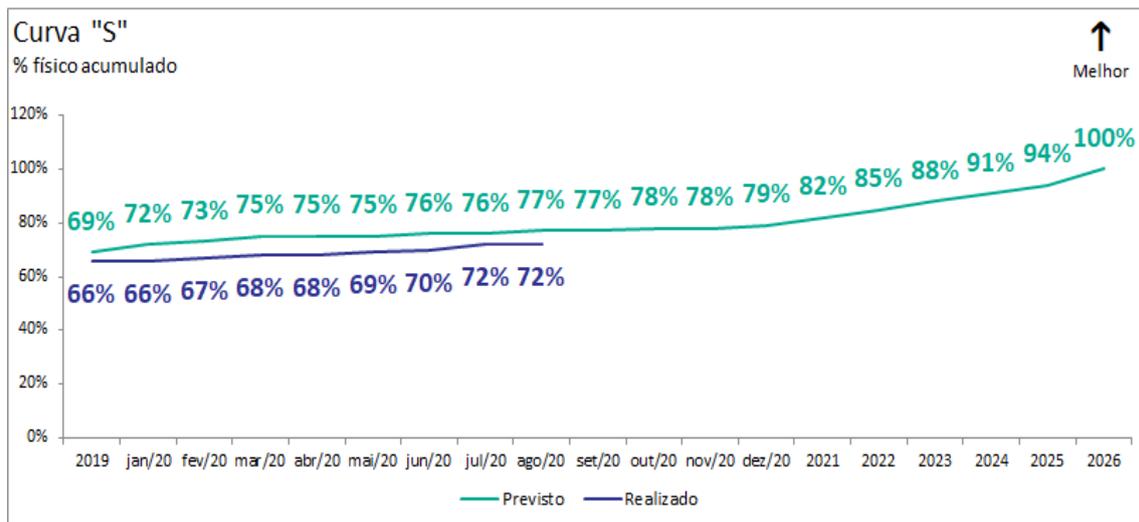


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água


Objetivo

Recuperar áreas de preservação permanente (APPs) degradadas ao longo da Bacia do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, às sub-bacias dos rios definidos como fonte de abastecimento alternativa para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula 171 do TTAC, conforme as prioridades definidas pelo Comitê Interfederativo (CIF) numa extensão de 40.000 hectares em 10 anos. Dessa área, 10 mil hectares deverão ser reflorestados e os 30 mil hectares restantes deverão ser recuperados por meio de regeneração.

Cláusulas do TTAC: 161 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 11, 14, 44, 62, 65, 88, 89, 90, 108 – item 2, 108 – item 3, 133, 134, 143 – item 3, 144, 196 e 343 – item 1.4 – concluídas internamente e 270 – item 4 – em atendimento.

Entregas do ano de 2020

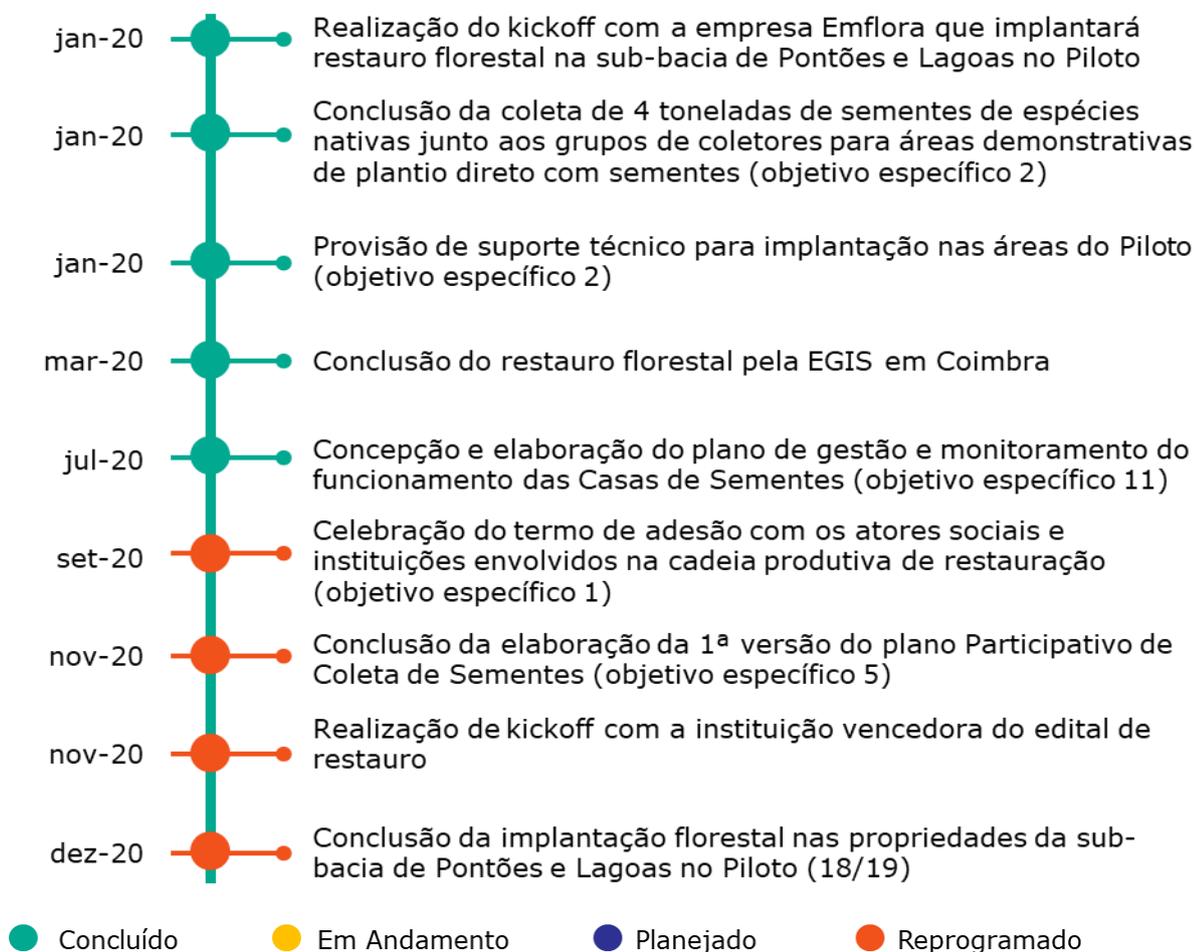

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Elaboração do relatório anual de andamento do programa previsto na definição;
- Em agosto, foram divulgados os 5 cinco projetos contemplados pelo Edital Concurso Ideias Renovadoras: Plantando Árvores e Colhendo Alimentos, em parceria da Renova com a *World Wide Fund for Nature* (WWF) Brasil, com o objetivo de auxiliar a recuperação da bacia do Rio Doce e promover os sistemas agroflorestais (SAF) no país. Foram ao todo 131 inscrições, recebidas entre 22 de março e 13 de julho. Dos 5 projetos vencedores, 3 são da bacia do rio Doce. Agora, os responsáveis pelas propostas selecionadas serão convidados para uma imersão com os especialistas em SAF. Esse encontro será viabilizado por uma plataforma online na semana do dia 21/09. As oficinas e outras atividades oferecidas na imersão ajudarão, inclusive, a customizar alguns modelos de sistemas agroflorestais para aplicação na bacia do Rio Doce. Também será preparada uma publicação com todas as propostas inscritas no concurso. Os sistemas agroflorestais já são uma realidade no Brasil com o potencial de agregar valor ao mesmo tempo que diminuem os impactos ambientais nas propriedades;

Alto Rio Doce

- Não houve fatos relevantes.

Médio Rio Doce

- Não houve fatos relevantes.

Baixo Rio Doce

- Retorno das atividades de implantação florestal do Piloto (2018/2019) na sub-bacia de Pontões e Lagoas, mediante liberação da sala de situação.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	-
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	-
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-

Curva S do programa

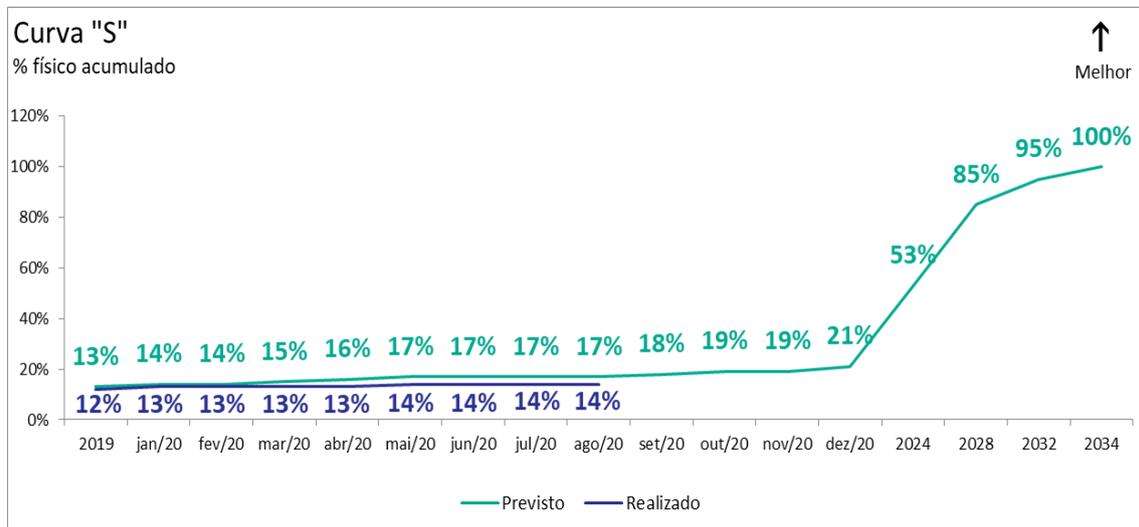


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água


Objetivo

Recuperar 5.000 nascentes na bacia do rio Doce em um período máximo de 10 anos em atendimento à cláusula 163 (Recuperação de 5 mil nascentes) do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 163 – Item 1 - Em andamento; 163 – Item 2 - Reprogramada.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 87 e 135 – Itens 3, 4 e 5 - Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

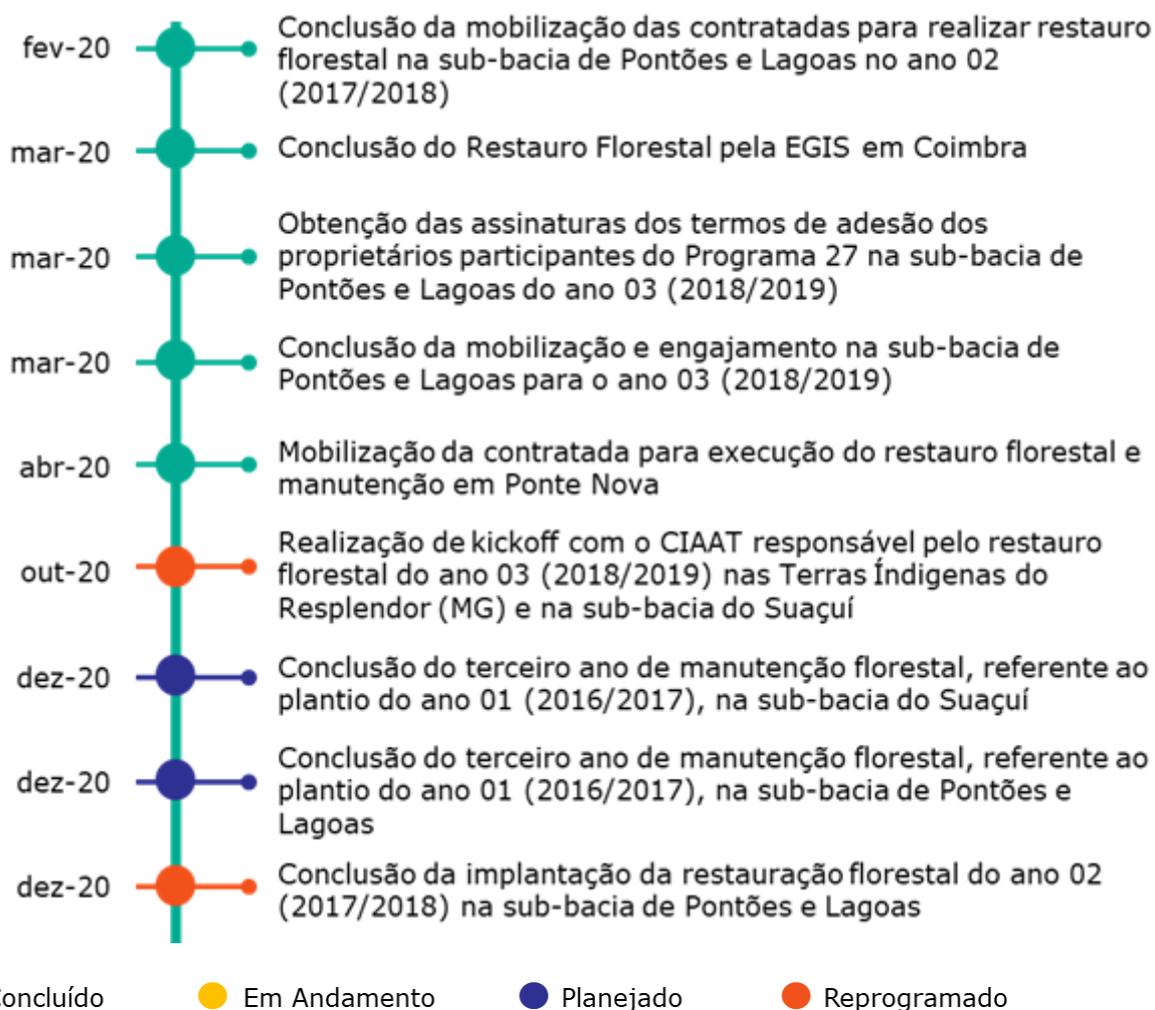

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Elaboração do relatório anual de andamento do programa previsto na definição.

Alto Rio Doce

- Não houve fatos relevantes no último mês.

Médio Rio Doce

- Não houve fatos relevantes no último mês.

Baixo Rio Doce

- Retorno das atividades de implantação florestal do Ano 02 (2017/2018) na sub-bacia de Pontões e Lagoas, mediante liberação da sala de situação.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	-
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	-
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-

Curva S do programa

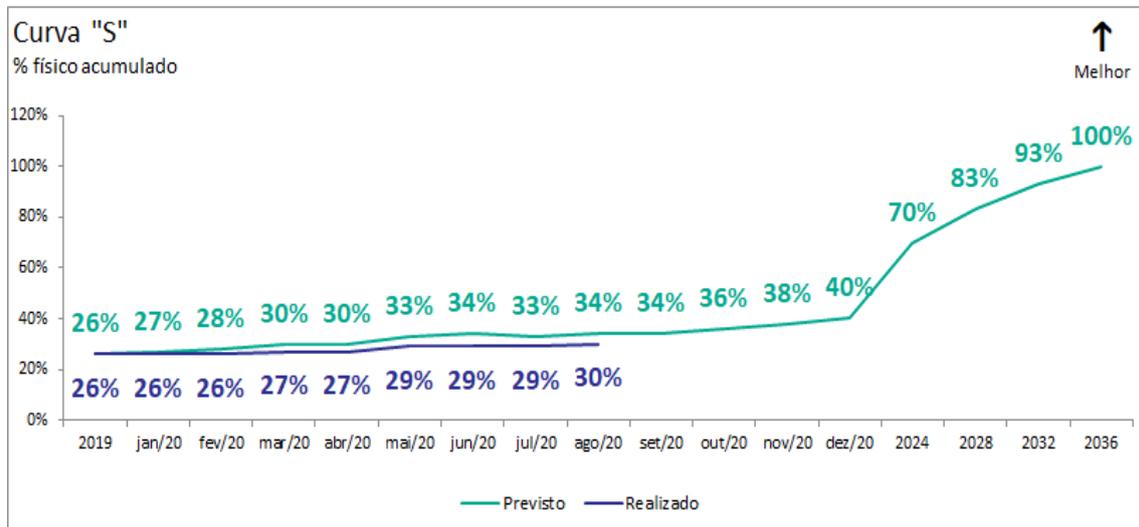


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água


Objetivo

O programa tem como objetivo identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, bem como realizar o monitoramento e implementar eventuais ações de contingência da fauna aquática da foz do Rio Doce, dos ambientes estuarinos e marinho impactados.

Cláusulas do TTAC: 164, 165 – Em andamento; 166 - Reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 74 – Item 1, 79, 102 – Item 2, 112 – Item 2, 113 – Item 2, 148 – Itens 3 e 4, 212 – Item 3, 218 – Itens 3 e 4, 279 – Itens 2 e 3, 282 – Itens 1 e 2, 336 – Item 1, 337 – Item 1, 347 – Itens 3 e 4, 361 – Item 2, 385 – Itens 1, 2 e 3 – Concluídas internamente; 159 – Item 3 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020

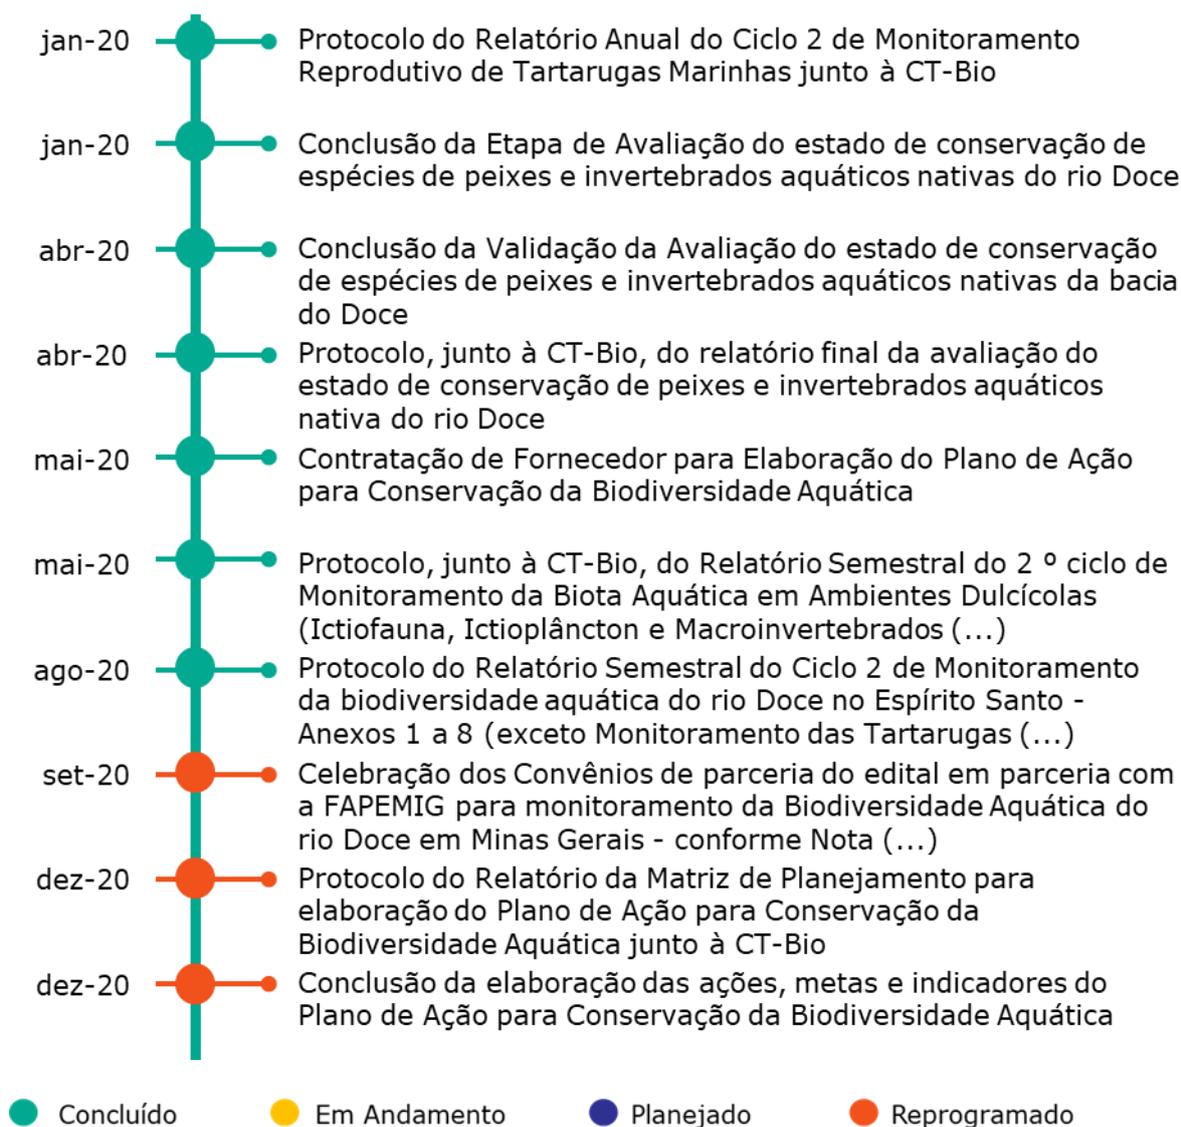

Grandes números

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Em 07/08/2020, foi protocolado o Segundo Relatório Semestral do Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente, junto à Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CTBio), em atendimento à cláusula 165 do Termo de Referência 4;
- Em 10/08/2020, foram retomadas as atividades de campo do “Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco”, conduzido pela Sociedade de Investigações Florestais (SIF) e Universidade Federal de Viçosa (UFV), referente ao monitoramento da fauna aquática na porção mineira do rio Doce, no âmbito da cláusula 165 do TTAC. A retomada considera ajustes na rotina de trabalho para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
- Em 13/08/2020, foi protocolado o Relatório Semestral “Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Planície Costeira do Rio Doce – agosto/2019 a janeiro/2020” em atendimento à cláusula 165, do Termo de Referência 4 do anexo 6;
- Em 19/08/2020, foi protocolado o documento com a proposta do Plano de Ação para Reparação e Conservação da Biodiversidade Aquática do rio Doce, junto à

Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CTBio), em atendimento à alínea “c” da cláusula 164 do TTAC.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF e começarão a ser medidos após o retorno dos especialistas e revisão da metodologia do monitoramento prevista para 2020.

Curva S do programa

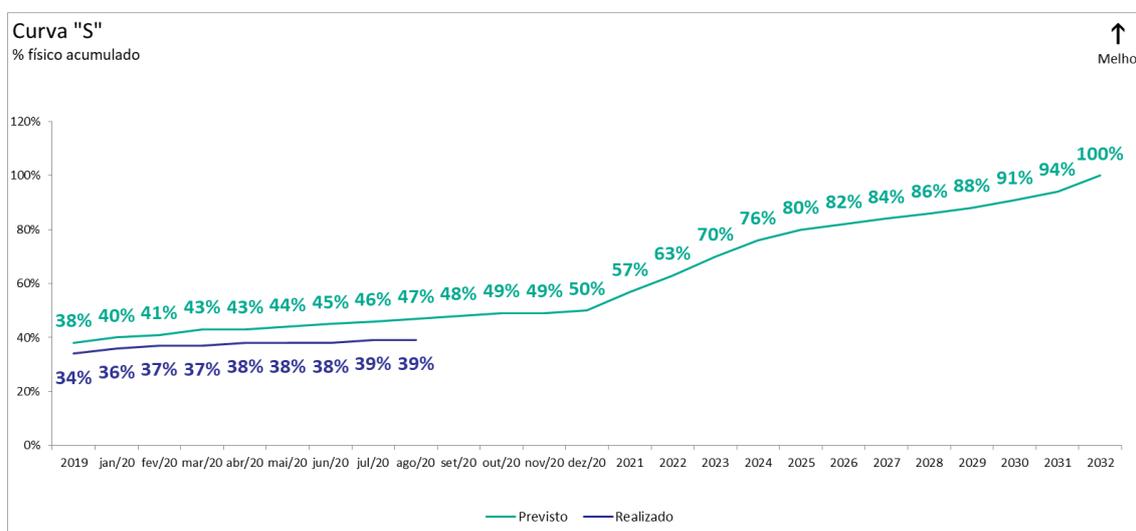


Gráfico 1. Curva “S” de avanço físico (agosto/2020).

PG029 Recuperação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água


Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusulas do TTAC: 167 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 218 – Item 3 e 4 – Concluída internamente.

Entregas do ano de 2020

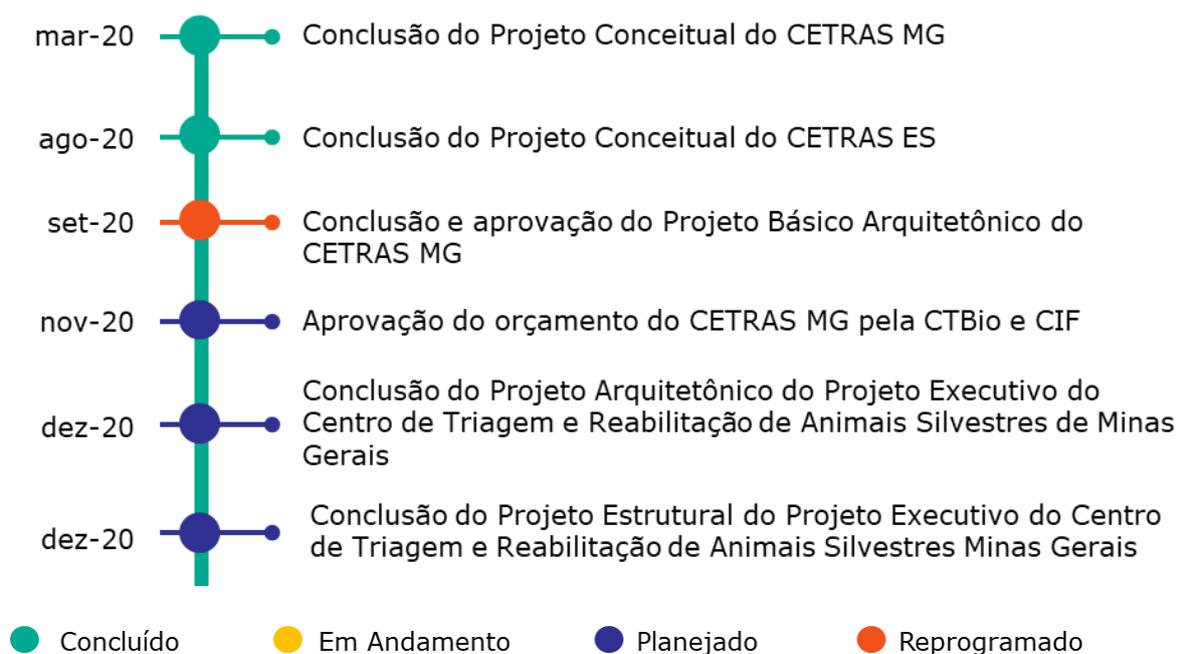

A conclusão do Projeto Básico do CETRAS MG e a conclusão do Projeto Conceitual do CETRAS ES desconsideram a aprovação do orçamento do programa.

As entregas previstas para 2020 sofreram alterações em relação ao mês anterior devido ao fato de que o cronograma passou pelo processo de gestão da mudança. Esse procedimento foi necessário para adequar ao novo planejamento de entregas definido pela equipe técnica do programa juntamente com as áreas suporte da Fundação Renova.

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Conclusão da elaboração do Projeto Conceitual e protocolo do cronograma de obras do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Espírito Santo (CETRAS-ES) junto ao Comitê Interfederativo (CIF) e à Câmara Técnica de Biodiversidade (CT-Bio).

Indicadores

Os indicadores do programa, apresentados na Definição, ainda não foram aprovados pelo CIF e começarão a ser medidos a partir do início da execução das obras do CETRAS-MG e CETRAS-ES que tem início previsto, respectivamente, em 2021 e 2022.

Curva S do programa

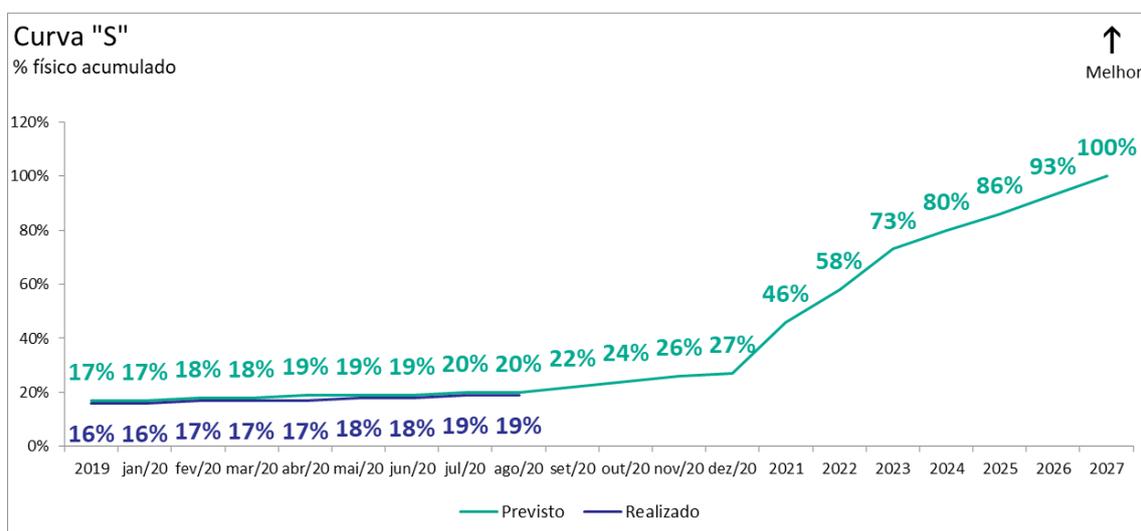


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

A Curva "S" sofreu alterações em relação ao mês anterior devido ao fato de que o cronograma passou pelo processo de gestão da mudança. Esse procedimento foi necessário para adequar ao novo planejamento de entregas definido pela equipe técnica do programa juntamente com as áreas suporte da Fundação Renova.

PG030 Fauna e Flora terrestre

Eixo Terra e Água


Objetivo

O programa tem como objetivo identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo. Os resultados desta avaliação de impacto servirão de subsídios para a elaboração do Plano de Ação para conservação desta biota.

Cláusulas do TTAC: 168 – § 1º - Concluído internamente; 168 – § 2º - Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 91, 132, 218 – Item 3 e 4 - Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020*

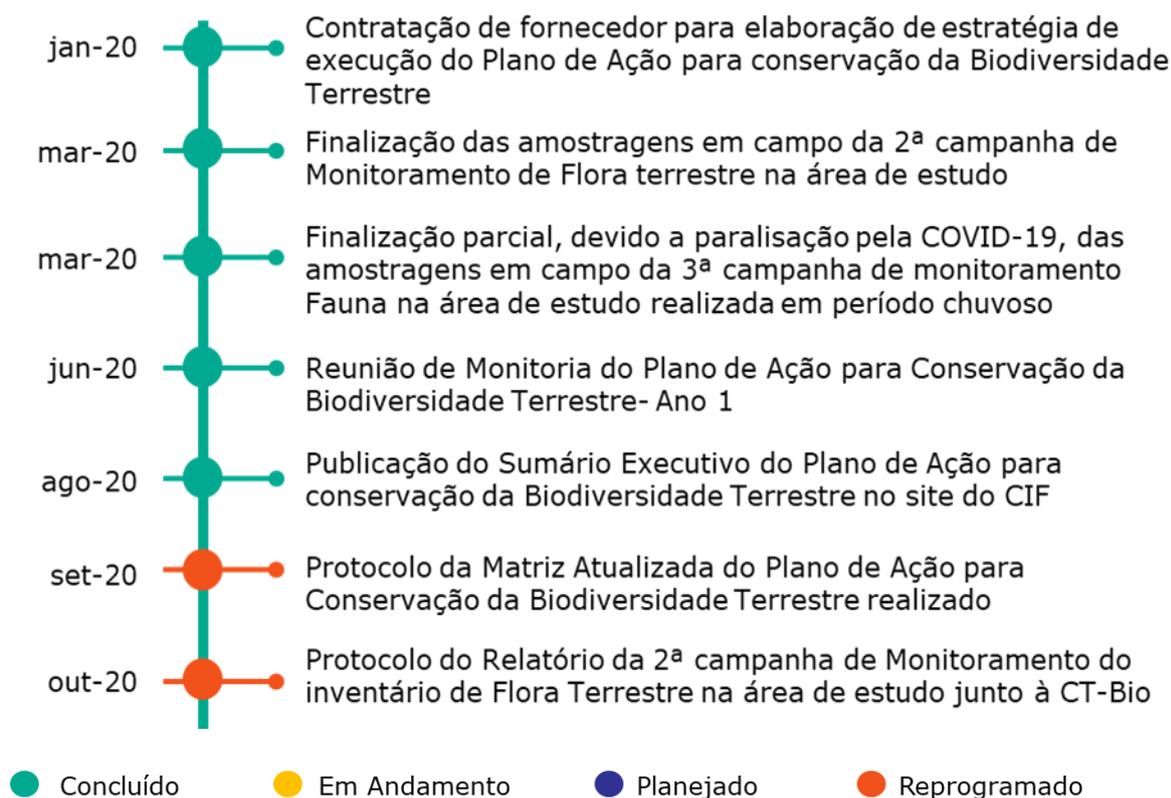

* Anteriormente constava na linha do tempo a entrega "Oficina de Monitoria do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre – Ano 1", mas, após alinhamentos internos, foi definido que no mês de junho houve reuniões já suficientes para atualização da matriz do Plano de Ação, com previsão de protocolo em agosto/20 junto à CT-Bio.

Grandes números do programa

- **14 grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- **108 parcelas de monitoramento de fauna e flora terrestres** delimitadas ao longo da calha do Rio Doce;
- **49 ações*** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

* Anteriormente era reportado neste tópico que o programa havia definido 92 ações para Conservação da Biodiversidade Terrestre, porém, neste mês de agosto, elas foram revistas e otimizadas chegando a um número de 49 ações.

Fatos relevantes do mês

- Publicação do Sumário Executivo de Conservação do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade terrestre no site do Comitê Interfederativo (CIF). O Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre do Rio Doce objetiva a elaboração de ações para conservação das espécies de fauna e flora potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CT-Bio/CIF e começarão a ser medidos após a revisão da metodologia do monitoramento prevista para 2020.

Curva S do programa

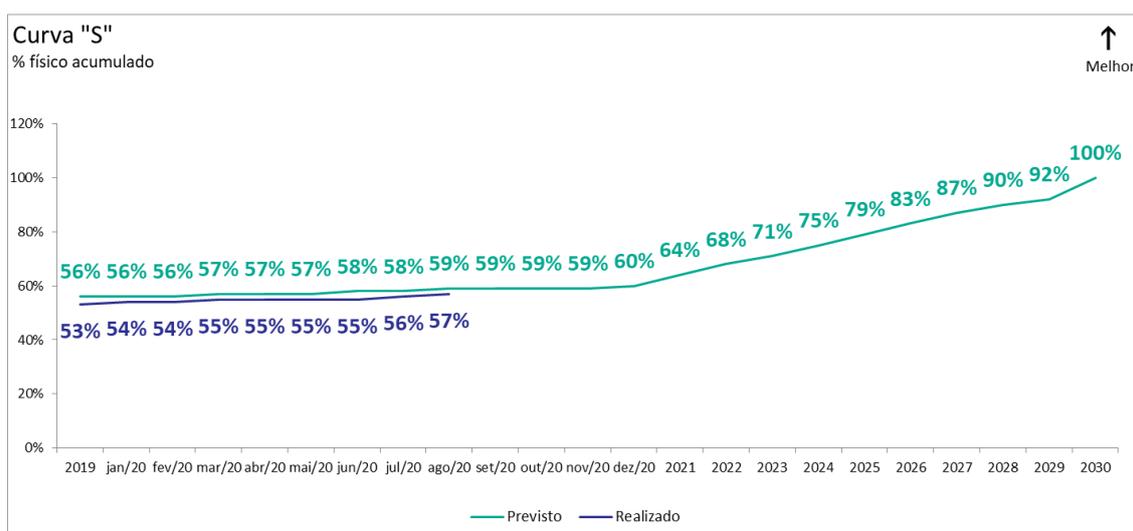


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 169 – Em andamento, 170 (Inc I, Inc II, Inc III, Inc IV, Inc V, 4ª Diretriz) – Concluída.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 75 e 122 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

O cronograma do PG031 está em revisão.

Grandes números do programa

- Foram repassados **R\$ 12.220.043,27 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos**, para os municípios de Alpercata/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Rio Casca/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga) até agosto/2020;
- Foram realizadas **727 horas de capacitação**, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2, até agosto/2020. Foram ofertadas oficinas de capacitações de: Elaboração de projetos referentes à esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo licitatório e acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo IV);
- A equipe técnica executou até agosto/2020 **1391 visitas e reuniões de apoio técnico aos municípios**.

Fatos relevantes do mês

- No dia 05/08/2020, foi realizado o repasse ao município de Sem-Peixe/MG, no valor de R\$18.720, referente ao pleito de elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu;
- No dia 05/08/2020, foi realizado o repasse ao município de Sem-Peixe/MG, no valor de R\$28.200, referente ao pleito de elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural;
- No dia 05/08/2020, foi realizado o repasse ao município de Rio Casca/MG, no valor de R\$6.492,60, referente à 23ª parcela do pleito de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras;
- No dia 06/08/2020, foi realizado o repasse ao município de São Domingos do Prata/MG, no valor de R\$376.000, referente ao pleito de aquisição de bens;
- No dia 12/08/2020, foi realizado o repasse ao município de São José do Goiabal/MG, no valor de R\$303.995,63, referente à obra de ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;
- No dia 13/08/2020, foi realizado o repasse ao município de Dionísio/MG, no valor de R\$105.000, referente ao pleito de elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e do distrito de Baixa Verde;
- No dia 17/08/2020, foi realizado o repasse ao município de Córrego Novo/MG, no valor de R\$476.990,15 referente ao pleito de obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

- No dia 18/08/2020, foi realizado o repasse ao município de Linhares/ES, no valor de R\$186.386,12, referente ao pleito de obra de execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira;
- No dia 20/08/2020, foi realizado o repasse ao município de Sem-Peixe/MG, no valor de R\$223.463,73, referente ao pleito de obra de complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14;

Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais. Abaixo os gráficos com realizado apurado na última medição (julho/2020).

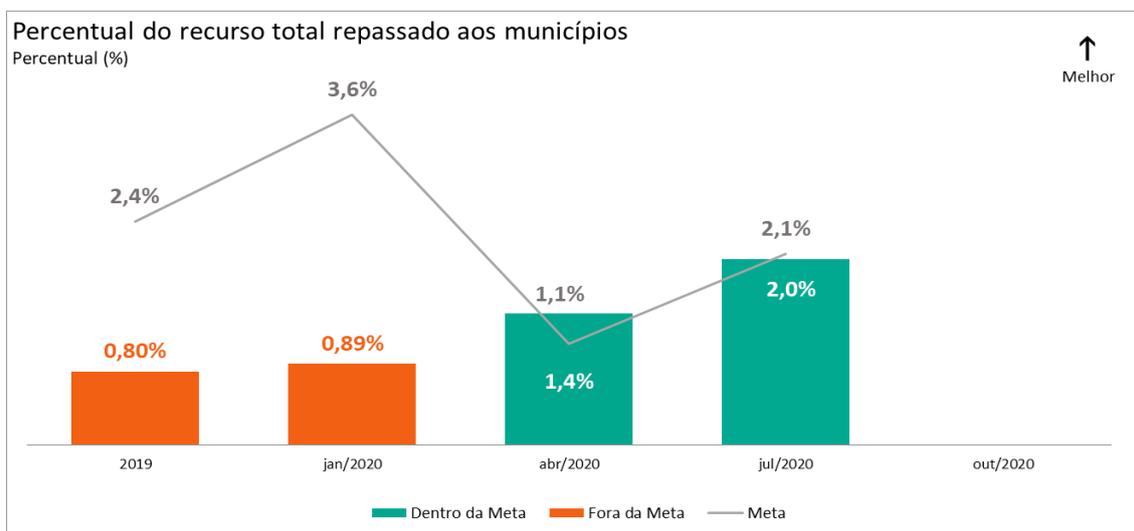


Gráfico 1. Percentual do recurso repassado. (julho/2020).

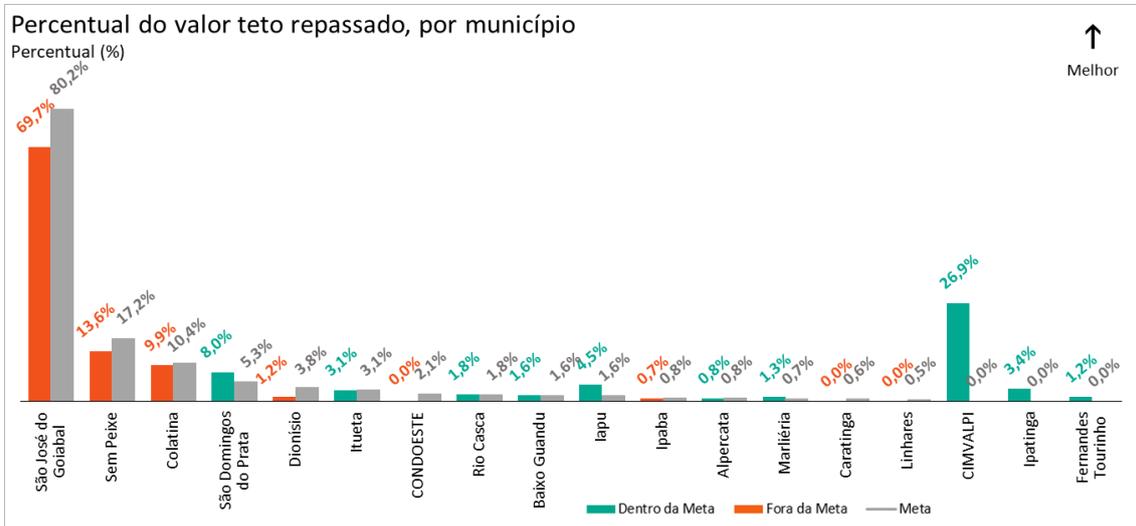


Gráfico 2. Percentual do valor teto repassado, por município. (julho/2020).

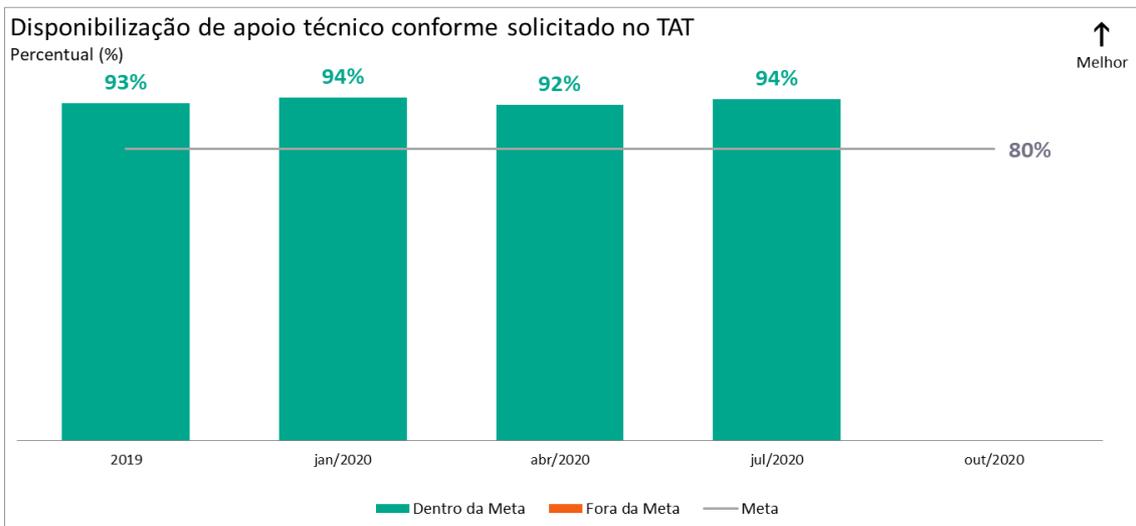


Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT). (julho/2020).

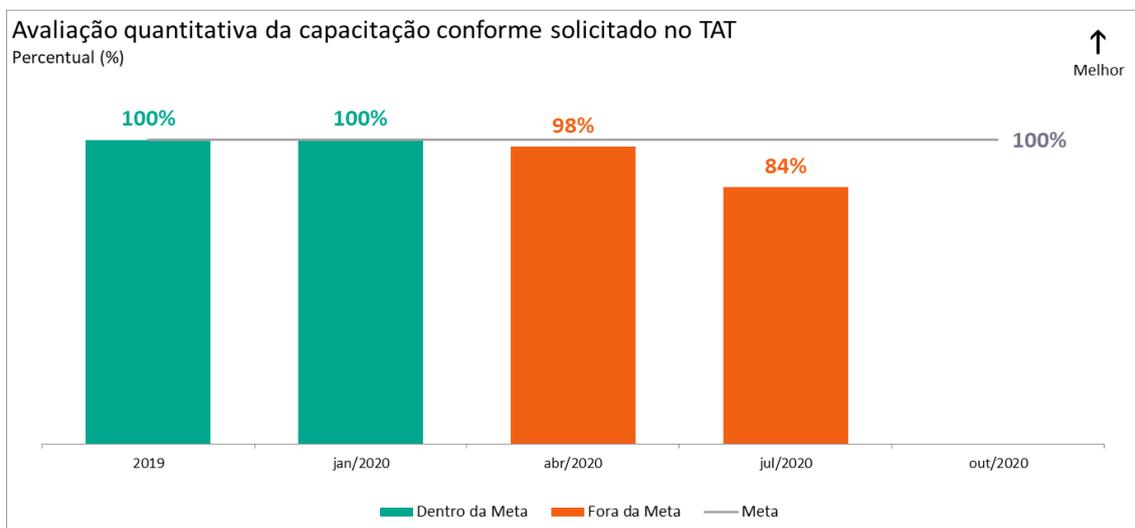


Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT. (julho/2020).

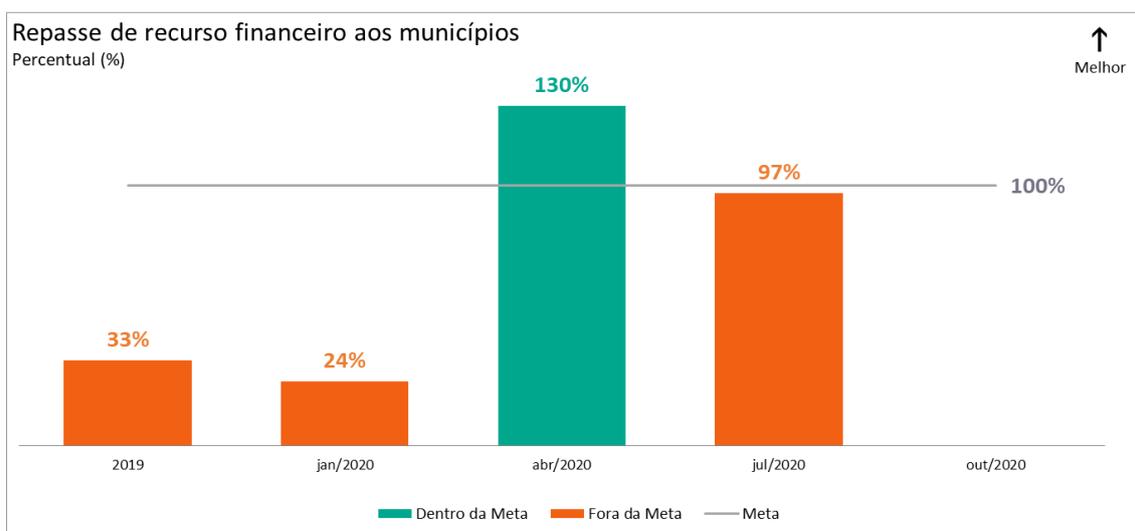


Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios. (julho/2020).

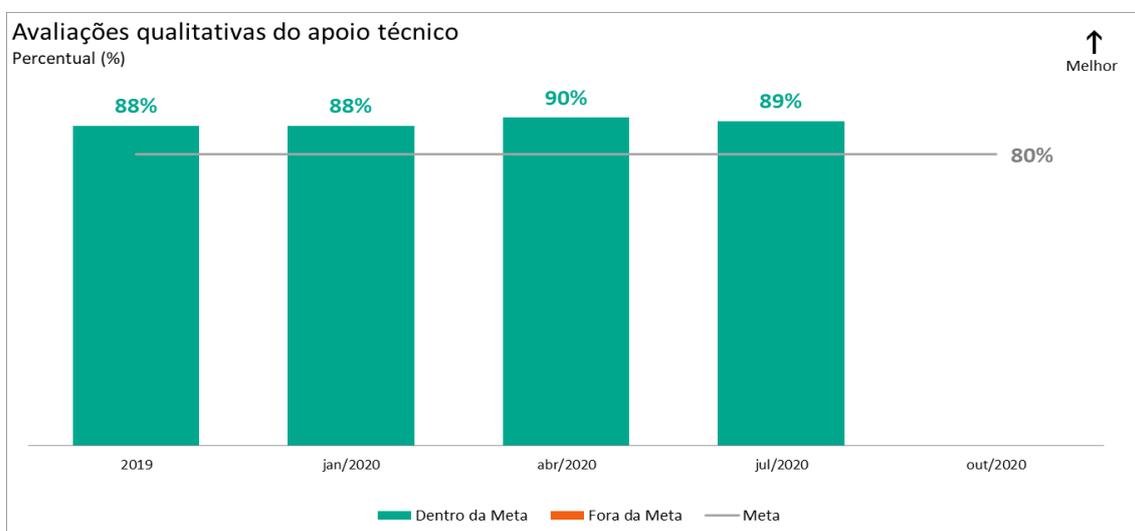


Gráfico 6. Avaliações qualitativas do apoio técnico. (julho/2020).

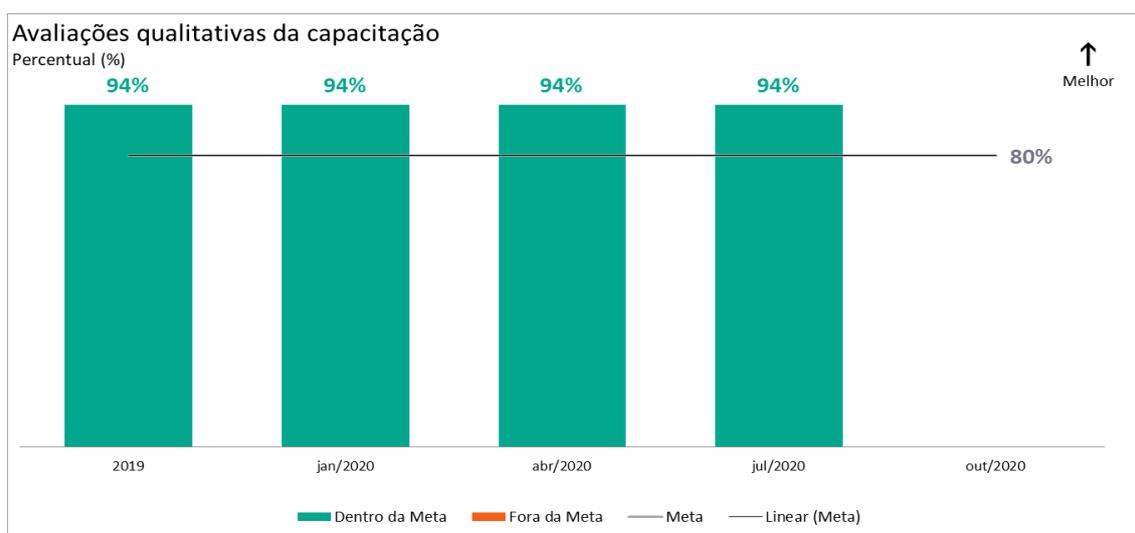


Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação. (julho/2020).

Curva S do programa

O cronograma do PG031 está em revisão.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula do TTAC: 171 – Judicializada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberações 10, 33 (item 1), 76, 98, 107, 123, 124, 185 (itens 2 e 3), 258 (itens 4 e 5), 315, 378 (item 6) e 379 (itens 2 e 3) – Concluídas Internamente; Deliberações 33 (itens I e II), 378 (item 5) e 379 (item 1) – Em andamento; Deliberação 185 (itens 4, 5 e 6) – Planejada; Deliberações 4, 16 e 258 (item 2) – Reprogramadas; Deliberação 308 (item 2) – Judicializada.

Entregas do ano de 2020¹

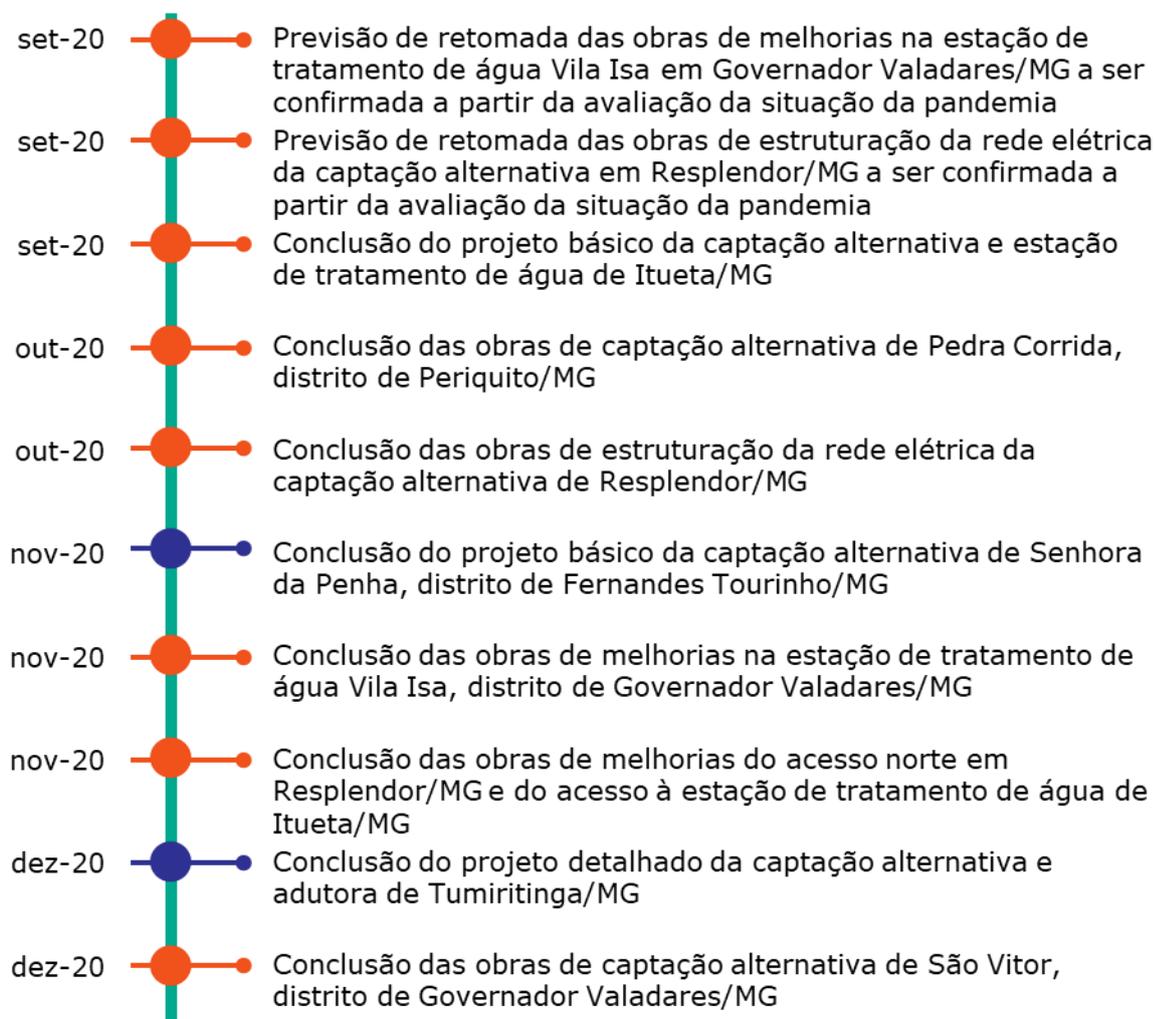

● Concluído
 ● Em Andamento
 ● Planejado
 ● Reprogramado

¹O planejamento das entregas foi definido anteriormente à judicialização do Programa.

Grandes números do Programa

- **13*** sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados, até agosto/2020;
- **10** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas), até agosto/2020;
- **15** sistemas de captação alternativos construídos (entre fontes superficiais e subterrâneas), até agosto/2020.

*Dentre os 13 sistemas concluídos, sete apresentam pendências na finalização das reformas.

Fatos relevantes do mês

- Perfuração de poço tubular em Regência, distrito de Linhares/ES. Serão realizados estudos de qualidade de água e vazão para averiguar a viabilidade do poço como solução de abastecimento para a localidade;
- Início das obras de fundação da captação da adutora do rio Corrente Grande, em Governador Valadares/MG;
- Retomada das obras de Captação Alternativa de São Vitor, distrito de Governador Valadares/MG;
- Conclusão do projeto básico da captação alternativa de Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente/MG;
- Conclusão do projeto detalhado da captação principal, alternativa e sistema de tratamento de Pedras, distrito de Mariana/MG;
- Conclusão do projeto detalhado da nova estação de tratamento de água de Baixo Guandu/ES;

- Fornecimento de 28.290 m³ de água para a população de Resplendor/MG através da operação dos poços C01 e C02 como solução definitiva de captação alternativa do município;
- Judicialização do Programa no contexto do Eixo Prioritário nº 9 da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. Muitos dos escopos das intervenções nas localidades estão sendo questionados judicialmente e, portanto, projetos e obras foram paralisados. Aguarda-se laudo pericial e consequente decisão judicial para revisão do escopo dos trabalhos e do cronograma de implantação das obras;
- Postergação da paralisação das obras não priorizadas do Programa como medida de prevenção em meio à pandemia de COVID-19, atendendo à diretriz da governança da Fundação Renova e às recomendações das entidades de saúde.

Indicadores

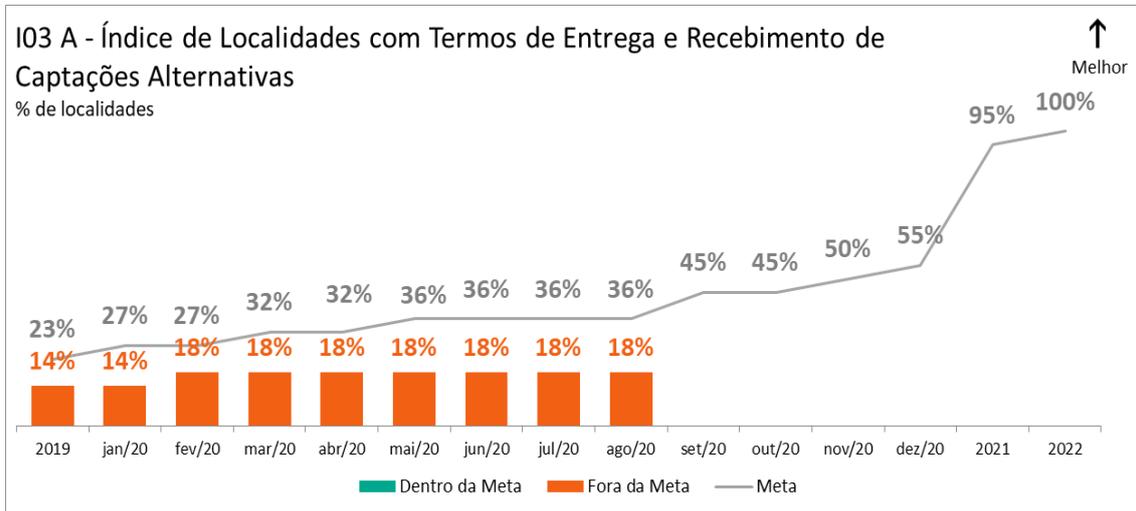


Gráfico 1. (%) de localidades com termo de entrega e recebimento de captações alternativas (agosto/2020). Gráfico acumulado.

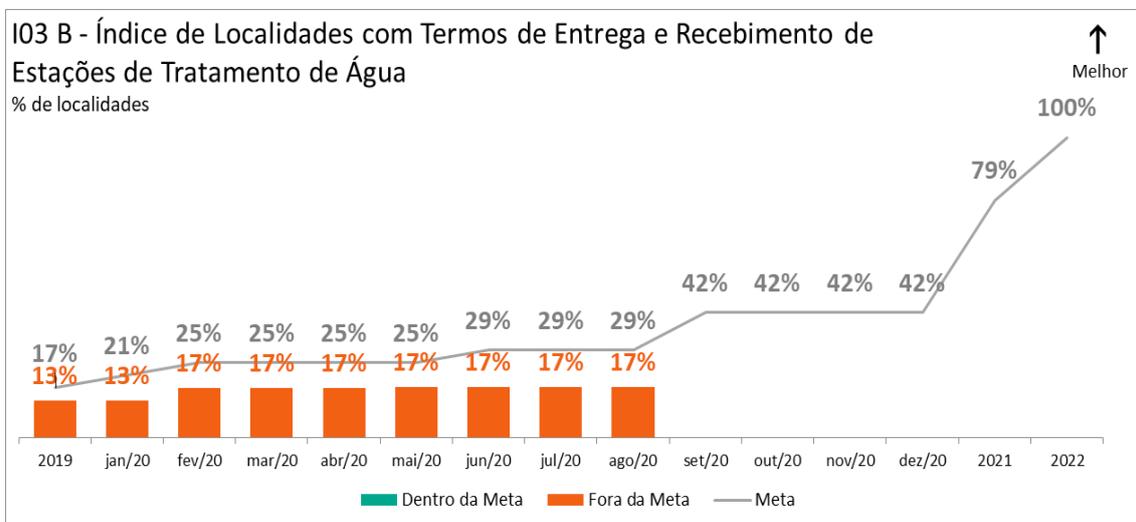


Gráfico 2. (%) de localidades com termo de entrega e recebimento de estações de tratamento de água (agosto/2020). Gráfico acumulado.

Curva S do programa

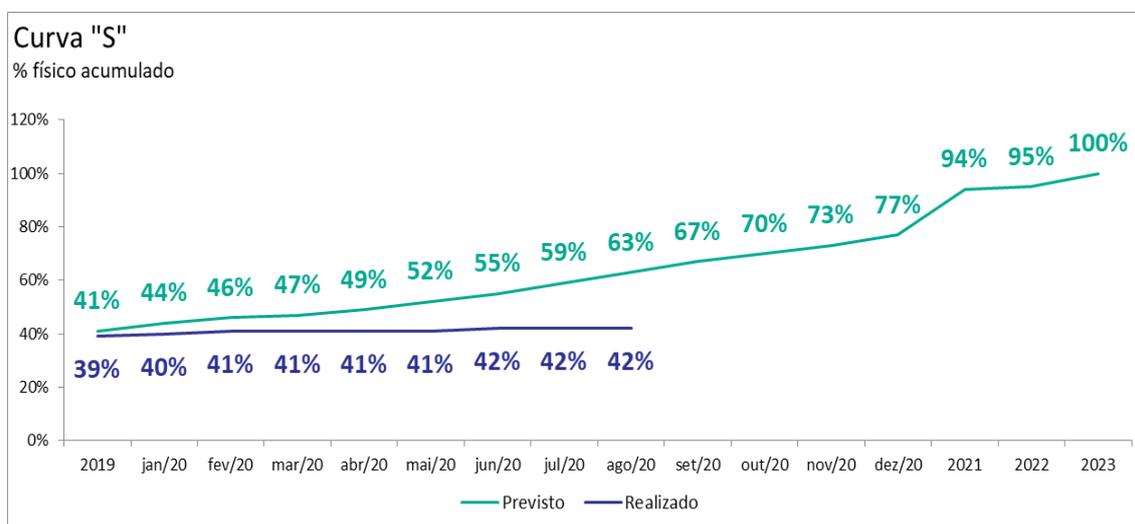


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo


Desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.

Cláusulas do TTAC: 172 - Caput 1 – Concluída internamente; 172 - Caput 2 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 136 - Item 1, 288 - Item 1, 343 - Item 1.4 – Concluídos internamente; 288 - Item 2, 240 - Item 1 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020

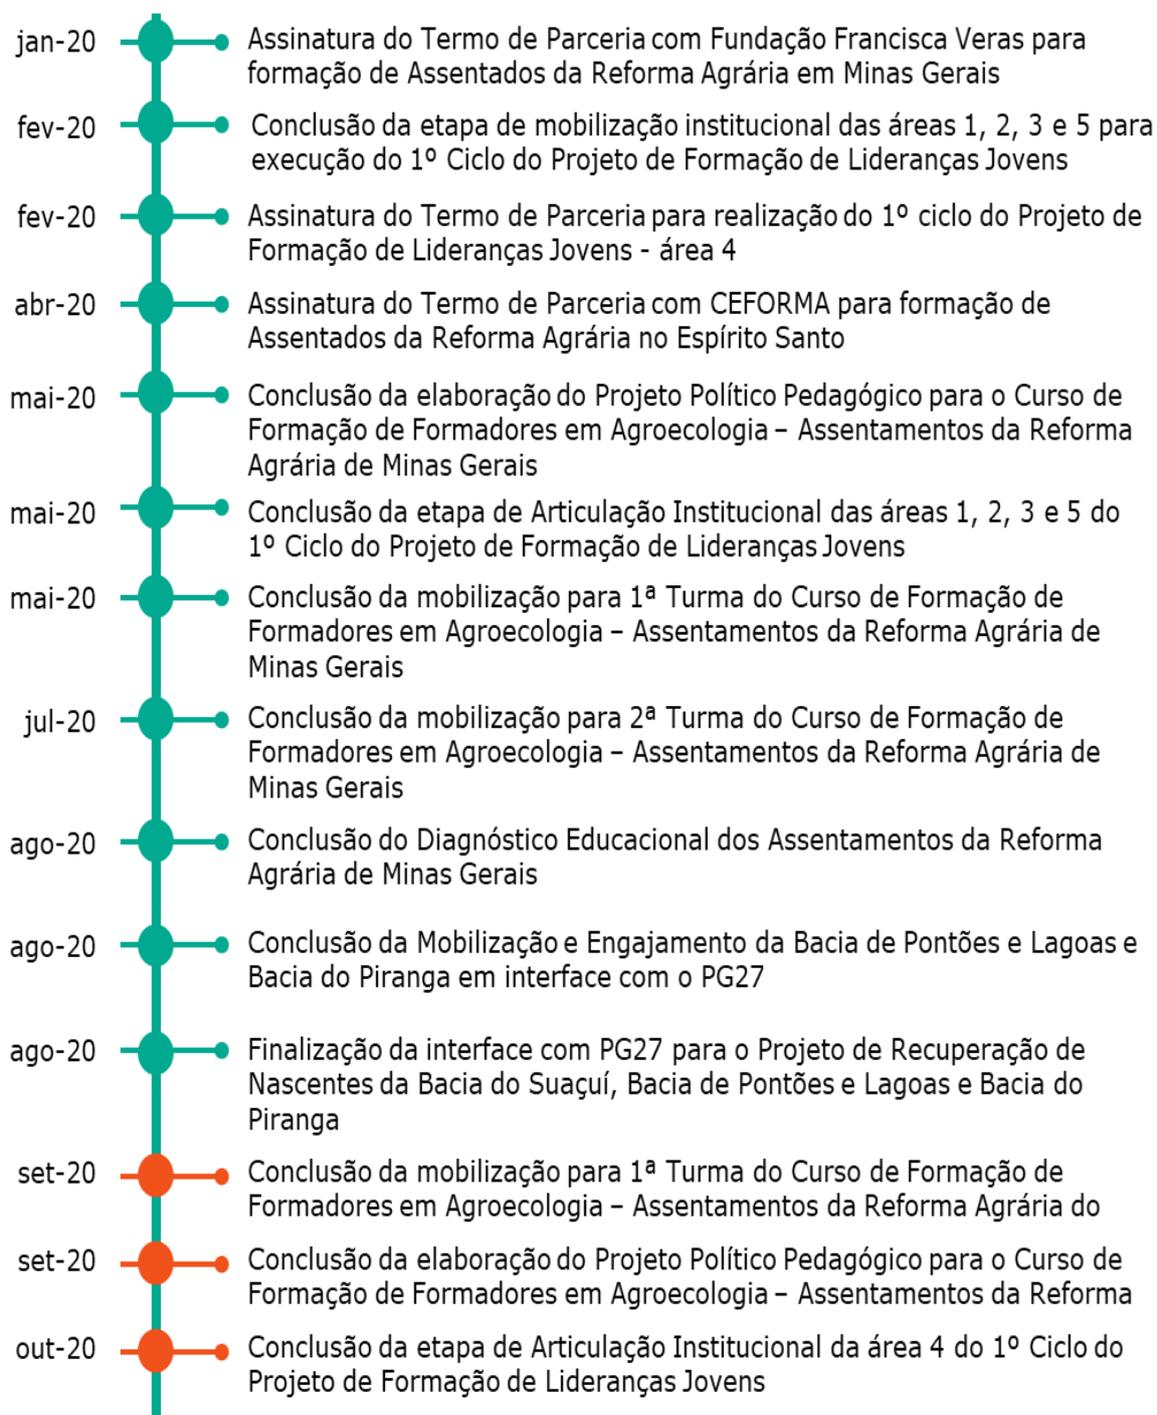

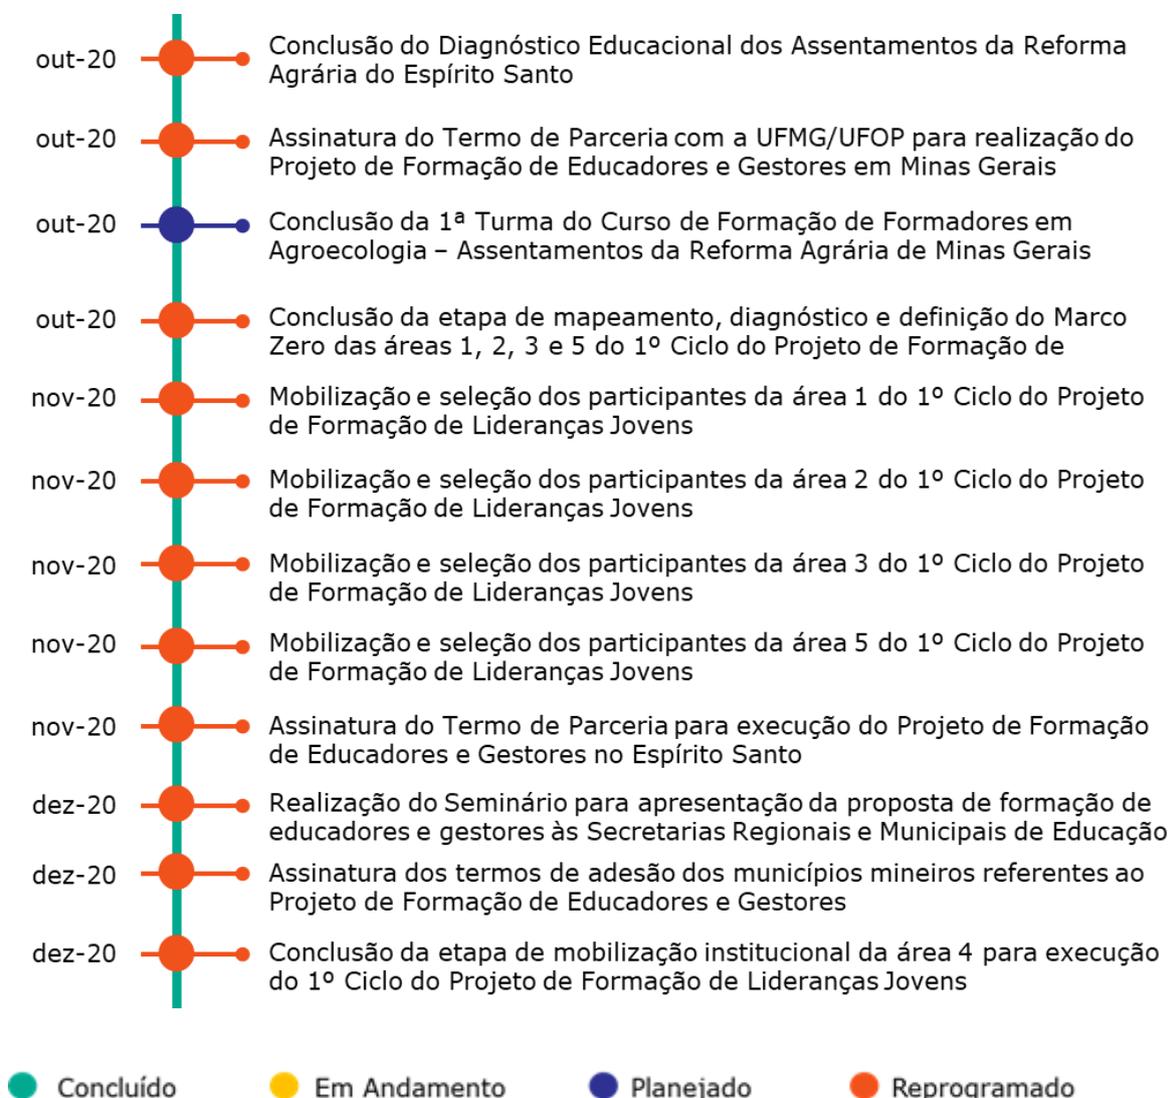

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Conclusão da etapa 1 da 2ª turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os Assentados (as) da Reforma Agrária de Minas Gerais.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

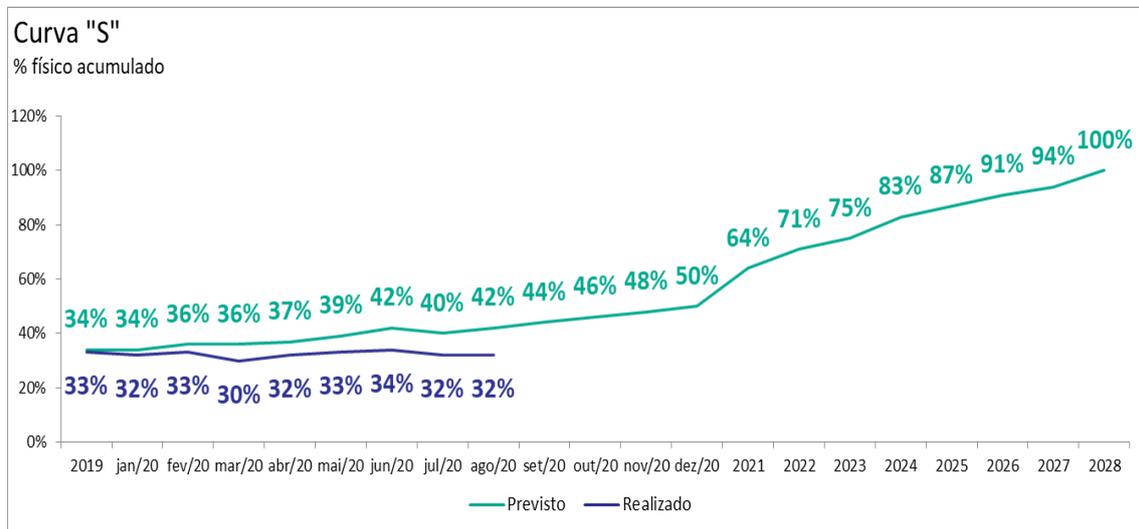


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 173 - Itens §1º, §2º e Caput 1- Concluídos internamente; 173 - Item Caput 2 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 128 - Item 2, 357 - Item 2 e 357 - Item 3 – Concluídas internamente; 303 - Item 2 – Reprogramado.

Entregas do ano de 2020



Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

- Conclusão da execução do cronograma de publicações de agosto/20 da Assessoria Técnica Remota às Defesas Civas, que envolve estratégias para acompanhamento e continuidade das atividades desenvolvidas de apoio às Defesas Civas (Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Comitê Gestor de Riscos), durante o período de isolamento social devido a pandemia de COVID-19.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	Total de indivíduos formados / Total de indivíduos inscritos	%	-	-	-
I02	Taxa de resposta às demandas de	Número de demandas atendidas / Total de	%	-	-	-

	Promoção à capacitação da Defesa Civil	solicitações de acordo com os critérios do Projeto				
I03	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	(Número de solicitações atendidas / Total de eventos solicitados dentro dos critérios)x0,333 + (Cobertura de áreas de risco realizada / Cobertura de áreas de risco prevista)x0,333 + (Número de Planos de Contingência elaborados / Total de Planos de Contingência previstos)x0,333	%	-	-	-
I04	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	Número de medidas cumpridas / Total de medidas planejadas	%	-	-	-

Curva S do programa

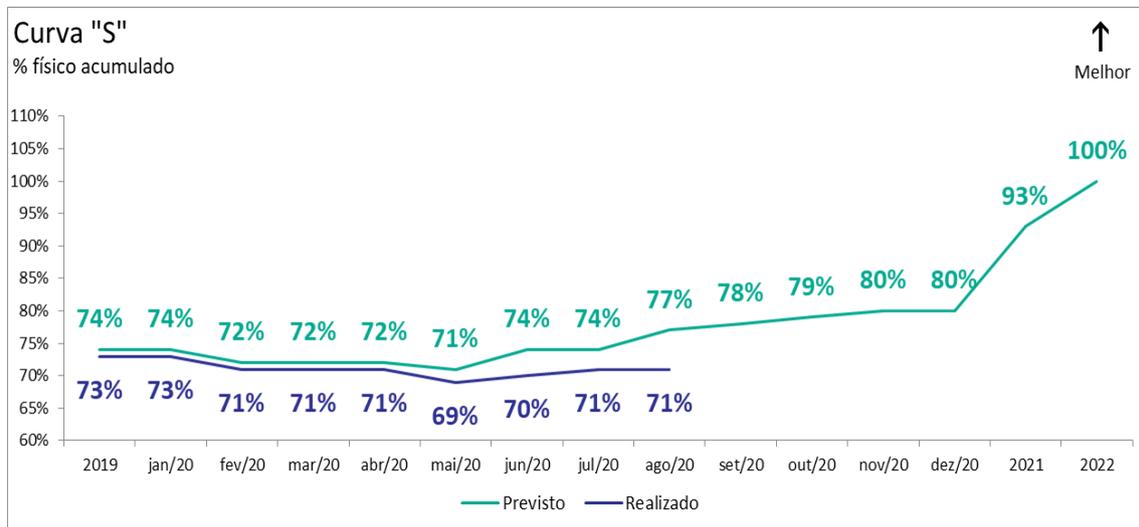


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Implantar um Centro de Informações Técnicas (CIT) da Área Ambiental 1 em Mariana, bem como, um CIT na cidade de Governador Valadares (MG) e um em Linhares (ES). Essas estruturas são destinadas a comunicar e informar a população quanto aos aspectos socioambientais e socioeconômicos, conforme cláusula 174 (Anexo II) do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusulas do TTAC: 174 – Concluída internamente; 174 §1º - Reprogramada.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 376 – Reprogramada.

Entregas do ano de 2020

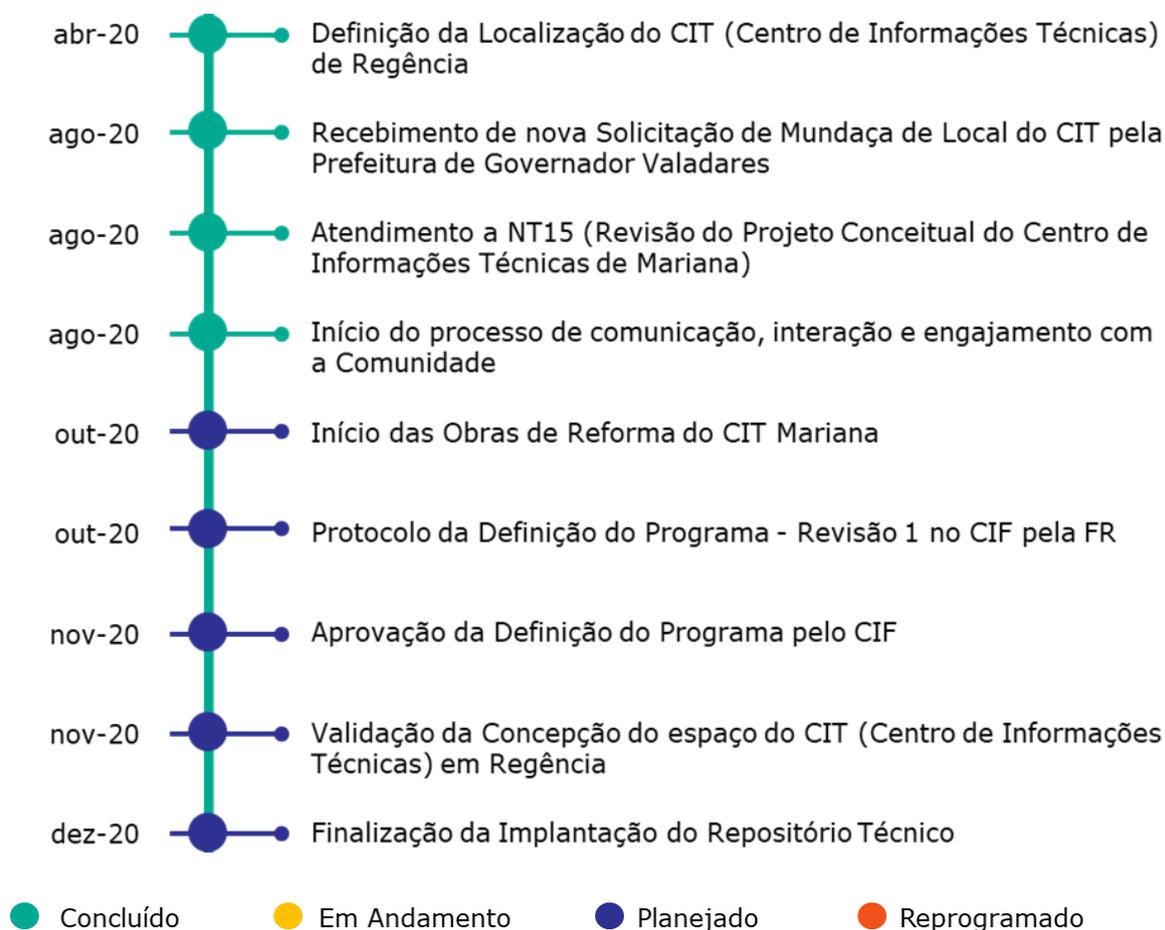

NOTA: TENDO EM VISTA A NOTA TÉCNICA 12/2018/CTPDCS/CIF, A DELIBERAÇÃO CIF Nº 376 E A CLÁUSULA 203 DO TTAC, QUE POSSIBILITOU A REVISÃO DOS PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO RENOVA, O CRONOGRAMA FOI ALTERADO E SERÁ ENVIADO À CT-PDCS (CÂMARA TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL) PARA AVALIAÇÃO. DEVIDO A ISSO, AS ATIVIDADES ESTÃO EM PROCESSO DE DETALHAMENTO.

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

- Realização da oficina participativa de elaboração da identidade visual dos três Centros de Informações Técnicas (Mariana, Governador Valadares e Regência);
- Realização da oficina participativa para definição dos critérios de curadoria e fluxo de informações para atendimento dos Centros de Informações Técnicas e também do Repositório de Informações Técnicas.

Nota.: Foi solicitado pela prefeitura de Governador Valadares nova mudança do local destinado ao Centro de Informações Técnicas - GV em 14/08/2020. Diante dessa alteração, foi cancelado a atividade "Realizar ajustes finais nos projetos conceituais" e será feito uma avaliação dos impactos desta solicitação no planejamento.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS,

por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa

A curva S do programa encontra-se em revisão.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer sítio eletrônico, em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e os programas desenvolvidos em função do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula do TTAC:175 – Concluída internamente.

Deliberação que impacta escopo e prazo: 230 – Concluída internamente.

Entregas do ano de 2020

dez-20  Execução do processo de manutenção do sítio eletrônico

 Concluído  Em Andamento  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números (agosto /2020).

INDICADOR	JULHO 2020	AGOSTO 2020	ACUMULADO 2020	ACUMULADO 2016 a 2020
Acessos ao site	136.570	111.120	832.083	3.029.907
Documentos no site	7	3	57	332
Vídeos	8	16	76	427
Notícias Publicadas	12	6	106	709

Fatos relevantes do mês

- Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos programas no relatório mensal do CIF e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente (agosto /2020).

INDICADOR	JULHO 2020	AGOSTO 2020
Tempo médio de resposta nas redes sociais*	4h54min	11h19min
Alcance orgânico LinkedIn (impressões)	72.435	83.942
Alcance orgânico Facebook (impressões)	20.460	36.673
Visualizações no Youtube (views)	20.460	6.186
Acessos das cidades prioritárias ao site**	49.947	49.061
Visualizações de páginas de serviço	293.333	113.026

*POR UMA LIMITAÇÃO DE ACESSO À API DO LINKEDIN, O TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA NÃO CONSIDERA DADOS DESTA FERRAMENTA. **OS NÚMEROS PODEM SOFRER VARIAÇÕES, TENDO EM VISTA QUE ALGUMAS LOCALIDADES NÃO SÃO MAPEADAS/AVALIADAS NO GOOGLE ANALYTICS.

Os indicadores reportados acima são mensurados mensalmente, entretanto, conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço físico do programa.

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água


Objetivo

Desenvolver e implementar um programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, área estuarina, costeira e marinha impactadas, gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para suportar a tomada de decisões dos demais programas da Fundação Renova, órgãos ambientais e agências de água.

Cláusulas do TTAC: 177 (Caput e §1º) e 178 – Concluídas internamente.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 76 (itens 3 e 5) e 310 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

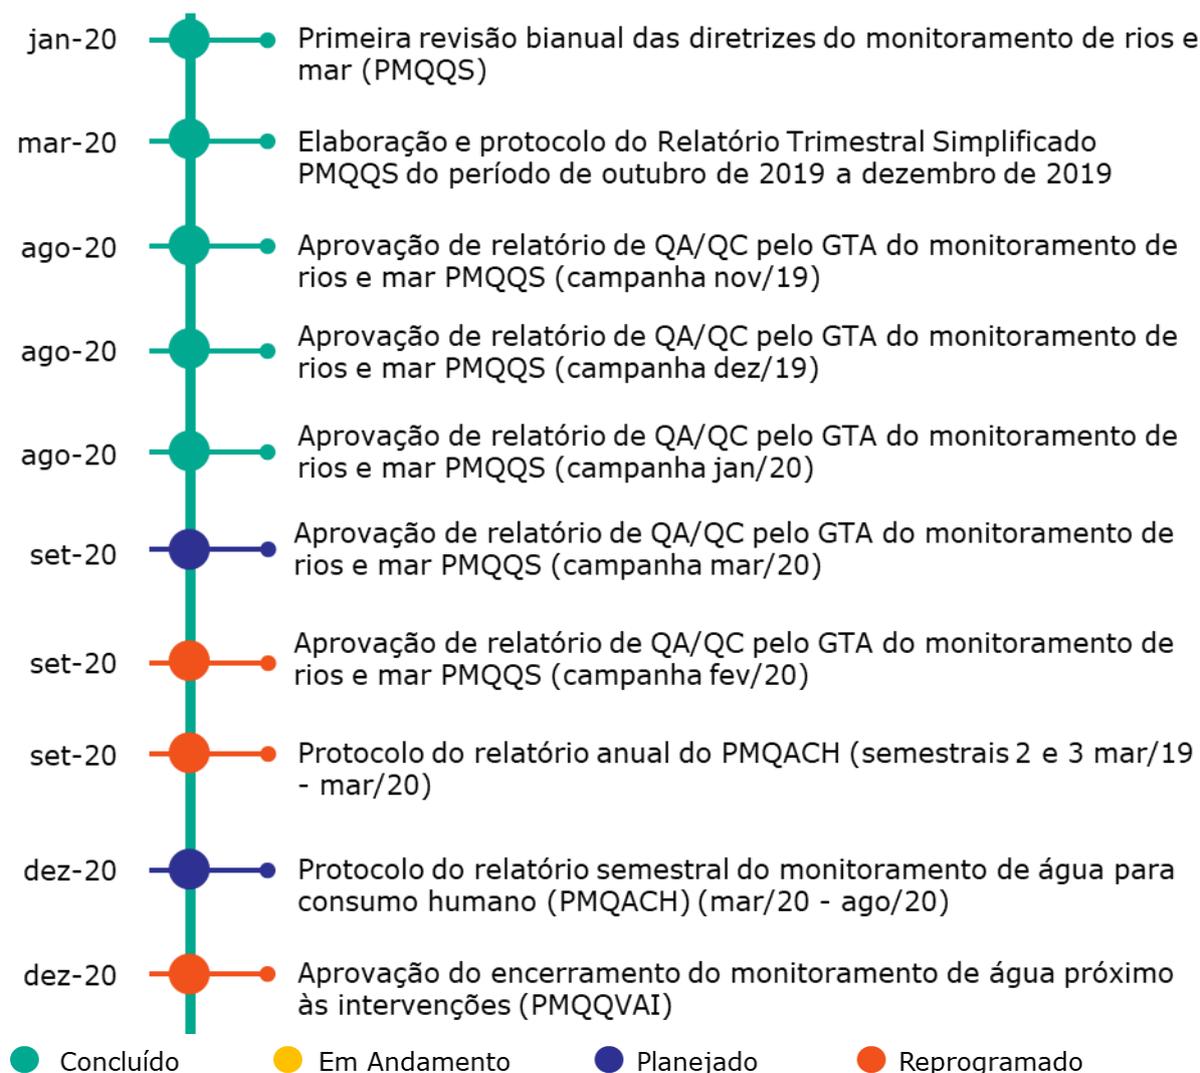

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Em 2020 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.859.233,00** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;
- **650 quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, **230 quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- **92 pontos de monitoramento** distribuídos no Rio Doce e na zona costeira indicam que a água bruta do Rio Doce pode ser consumida após tratamento convencional;
- Entre esses pontos estão **22 estações automáticas** que geram informações em tempo real;
- **80 parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e nos sedimentos.

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- São **302 pontos de monitoramento**, sendo 39 com tratamento e 263 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios entre Mariana – MG a São Mateus – ES;
- São monitorados mensalmente **78 parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados **82 parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados **23 parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

- Protocolo do Relatório Trimestral QAQC PMQQS referente ao trimestre FEV A ABR/20 em 07/08/2020.
- Protocolo do Relatório Mensal QAQC PMQQS referente ao mês de JUL/20 28/08/2020.

Indicadores

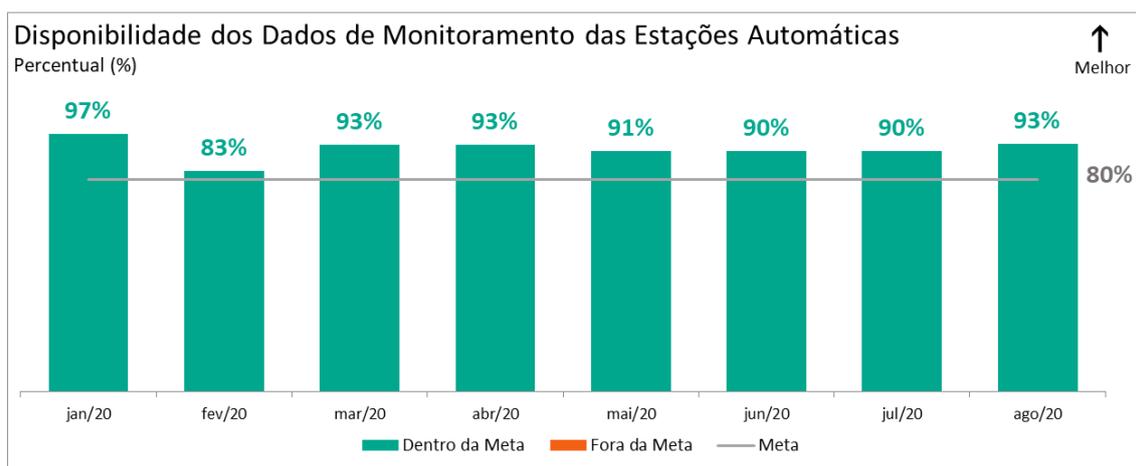


Gráfico 1. Disponibilidade dos dados de monitoramento das estações automáticas. (Agosto/2020).

O resultado do indicador de “Disponibilidade de Dados de Monitoramento das Estações Automáticas” apresentou resultado positivo no mês de agosto, assim como nos demais meses de 2020.

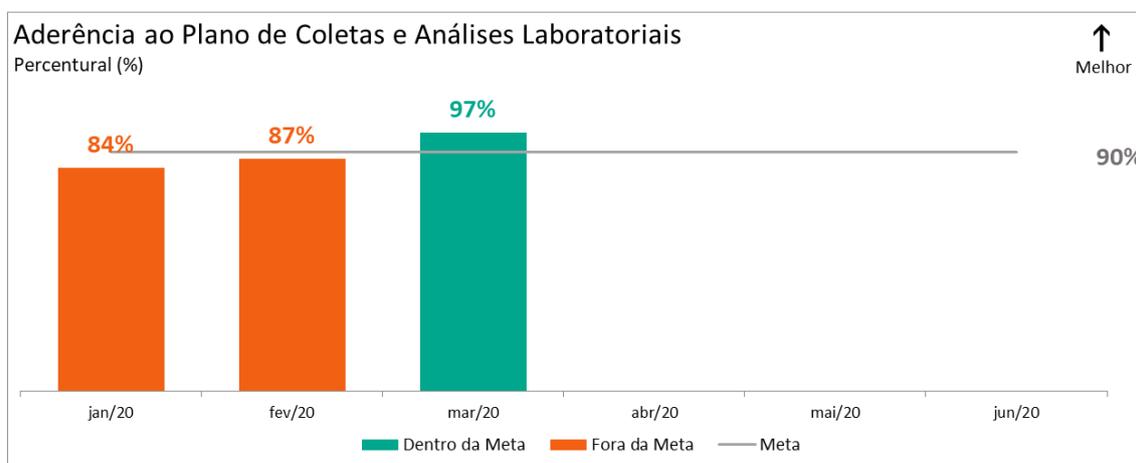


Gráfico 2. Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais. (Agosto/2020).

Com a paralisação das coletas em 19/3/2020, não foram realizadas coletas manuais no mês de Junho de 2020. Desta forma, não foi possível calcular o indicador de “Aderência ao plano de coleta e análises laboratoriais” para esse mês.

O indicador de “Aderência ao plano de coleta e análises laboratoriais” é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, de acordo com a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

Curva S do programa

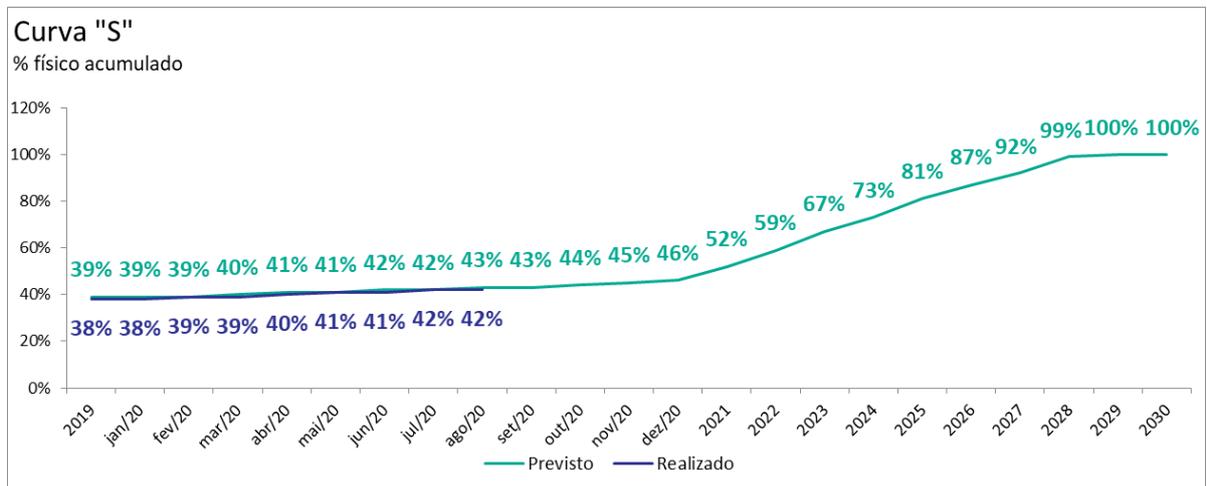


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico (Agosto/2020).

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água


Objetivo

O programa tem como objetivo custear estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação direta e indiretamente afetadas pelo rompimento da barragem e implementar ações de reparação. Além disso, custear em caráter compensatório, ações referentes à consolidação de duas Unidades de Conservação (UC), além de ações compensatórias na Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo Poder Público.

Cláusulas do TTAC: 181 e 182 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 36, 114 – Item 2, 138 – Item 2, 218 – Itens 3 e 4 e 221 – Item 1 – Concluídas internamente; 283 – Item 3 e 318 – Item 3 – Em andamento.

Entregas do ano de 2020

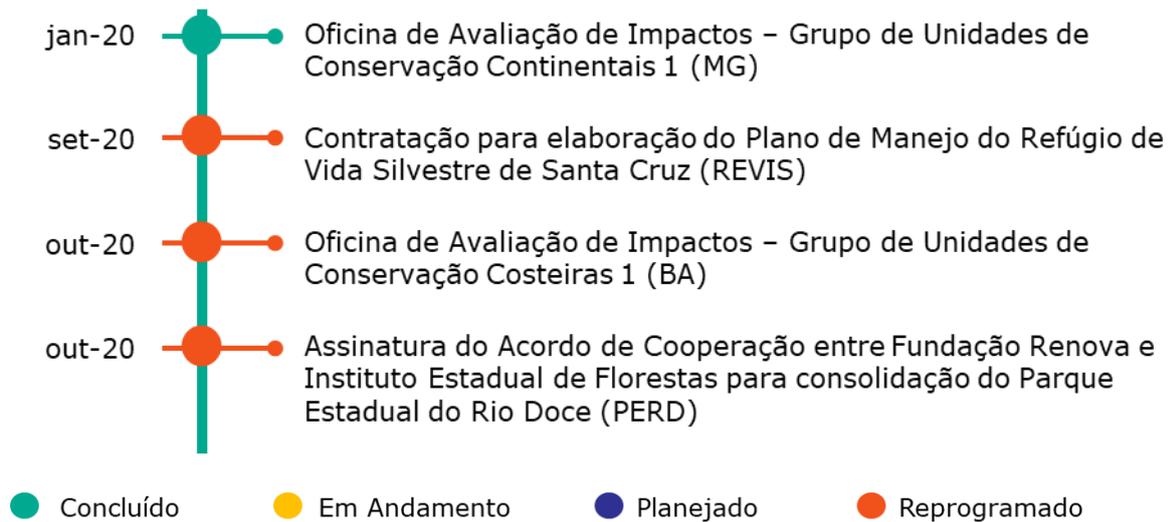

Grandes números do programa

- **5 Oficinas de Diagnóstico** realizadas para apresentar e debater o diagnóstico de linha de base dos meios físico, biótico e socioeconômico para as Unidades de Conservação e novas informações compartilhadas pelos participantes;
- **4 Oficinas de Avaliação** realizadas para apresentar e discutir os resultados das expedições a campo e analisar as propostas de novos estudos ou medidas reparatórias para as Unidades de Conservação avaliadas;
- Protocolo dos relatórios finais dos estudos de avaliação de impactos de **6 Unidades de Conservação** avaliadas.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no último mês.

Indicadores

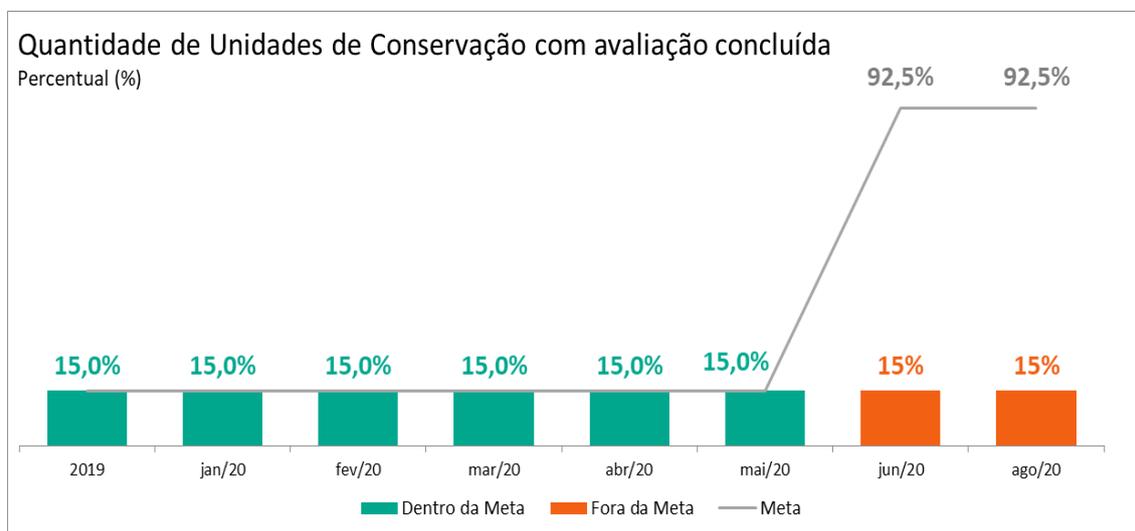


Gráfico 1. Quantidade de Unidades de Conservação com avaliação concluída (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

O cronograma de conclusão da avaliação de impactos das três Unidades de Conservação da Bahia está em definição, devido ao contexto atual e as medidas restritivas para enfrentamento da emergência causada pela pandemia do Covid-19.

Curva S do programa

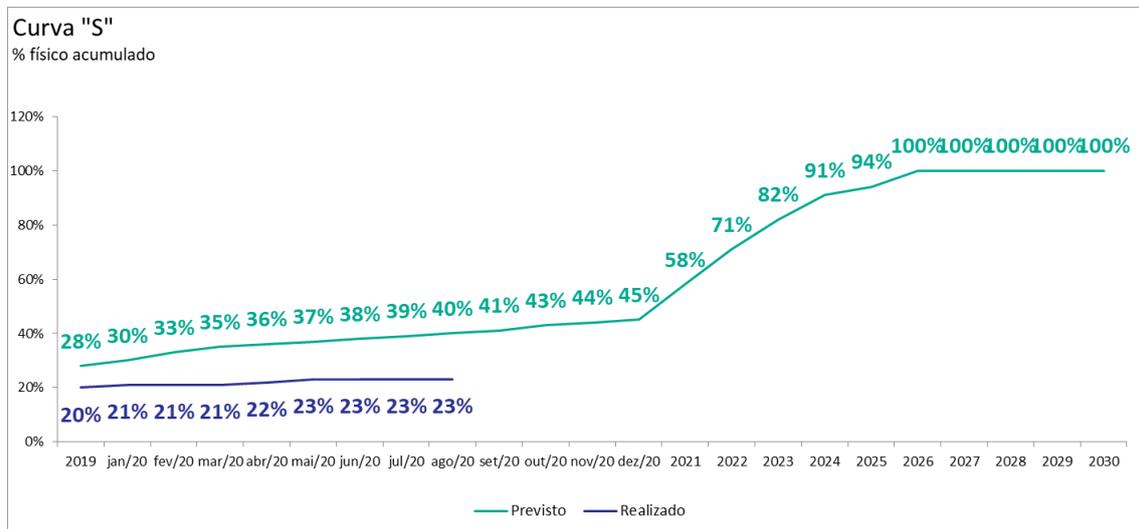


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água


Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusulas do TTAC: 183 – Em andamento.

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 28 – Concluída internamente.

Entregas do ano de 2020

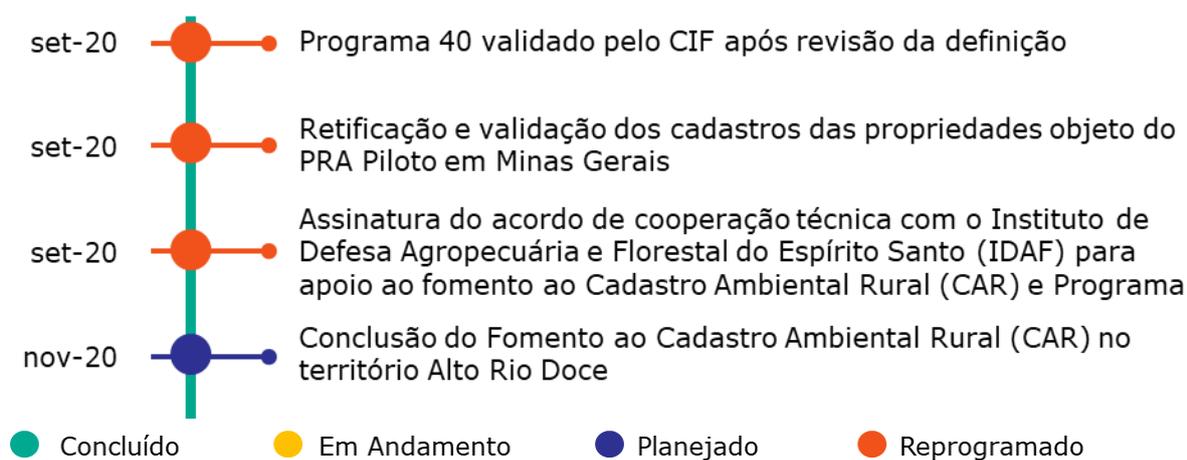

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Retorno das atividades de retificação do CAR pela empresa contratada no município de Mariana/MG. A empresa está atuando conforme os procedimentos adotados para o período de pandemia.
- As ações no Médio e Baixo Doce continuam paralisadas.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ 08/20		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%	-	-	-
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%	-	-	-

Curva S do programa



Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, devidamente comprovados por meio de documentos oficiais, dentre os quais notas de empenho de despesas e declaração de autoridade competente.

Cláusulas do TTAC: 141 – Em andamento.

Deliberações que impactam escopo e prazo: 49 – Item 2; 208 – Item 8; 254 - Item 2 – Em andamento; 49 – Item 1; 69; 78; 85 – Item 3; 171 – Item 2; 180 – Item 3; 208 – Item 5; 208 – Item 6; 291 – Item 2 – Concluídas internamente.

Entregas do ano de 2020

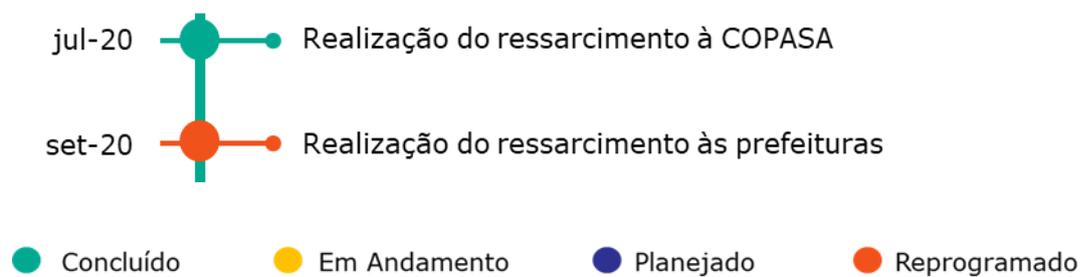

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Conclusão do ressarcimento à prefeitura de Tumiritinga.

Indicadores

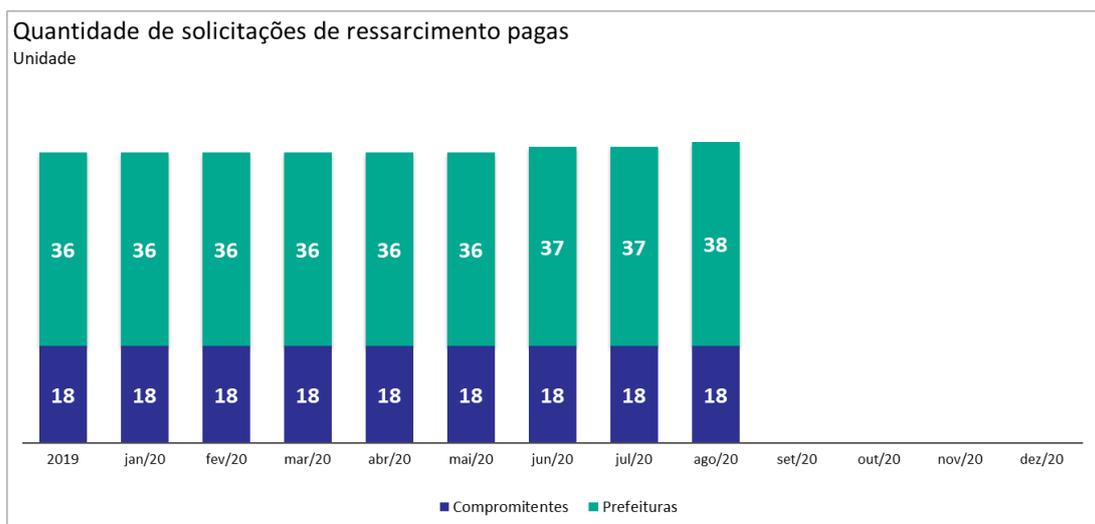


Gráfico 1. Quantidade de Solicitações de Ressarcimento Pagas (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

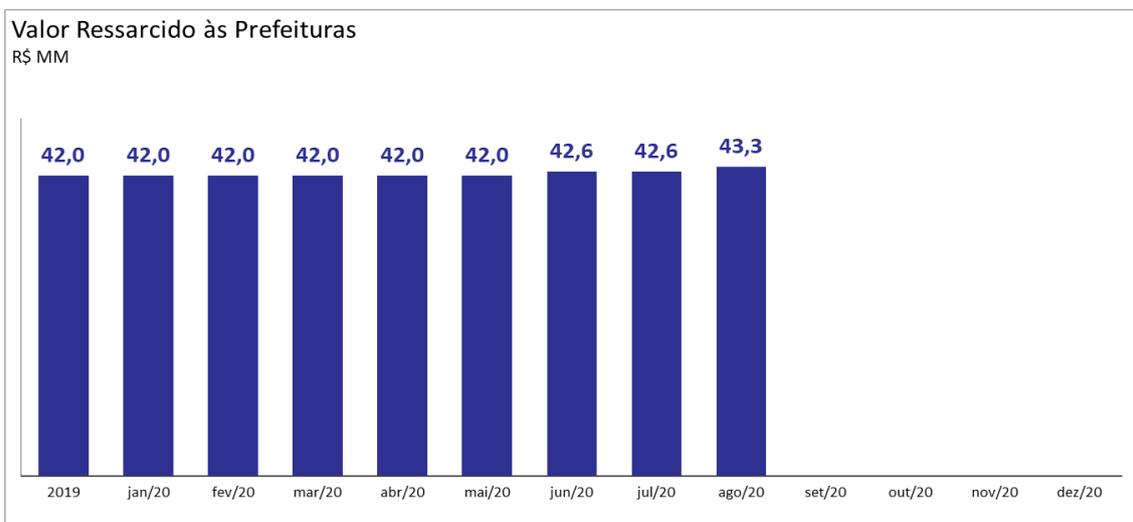


Gráfico 2. Valor Ressarcido às Prefeituras (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

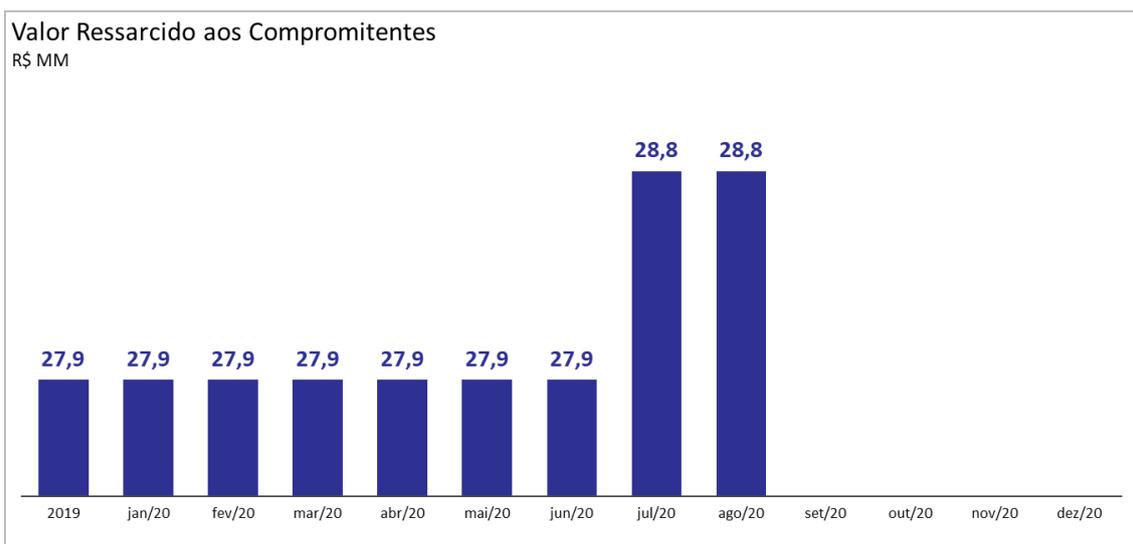


Gráfico 3. Valor Ressarcido aos Compromitentes (agosto/2020). Gráfico Acumulado.

Curva S do programa

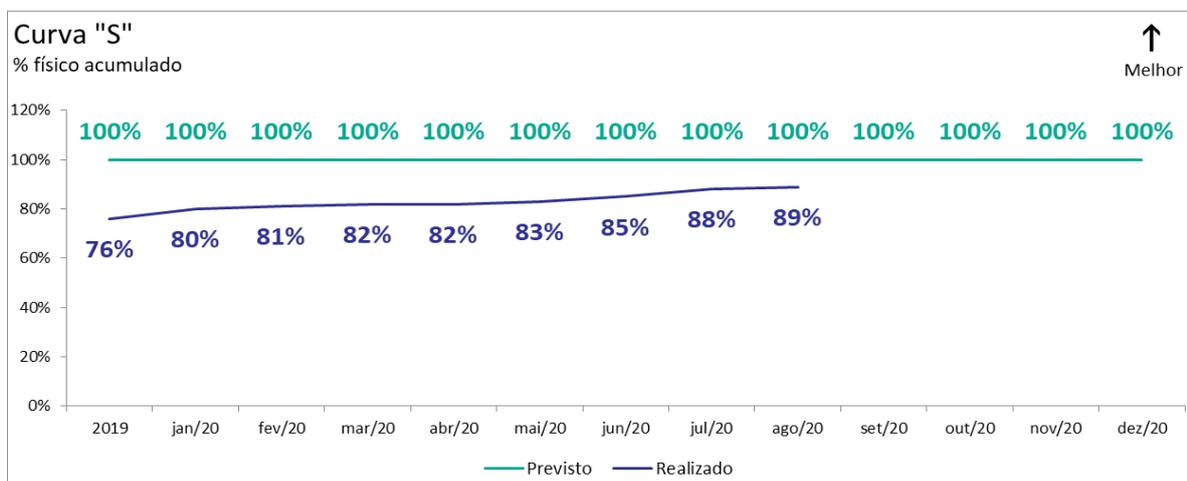


Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico (agosto/2020).

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;
 - i. danos à saúde física ou mental; e
 - j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. **ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. **MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. **MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. **PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais,

tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. **PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS:** compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições

socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.


XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

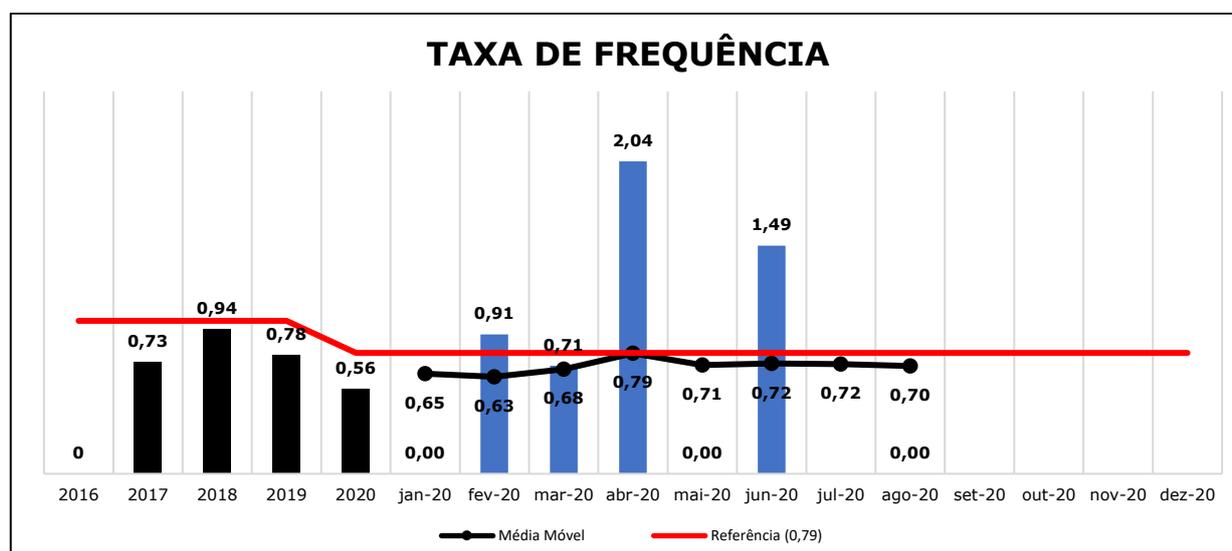

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

Programas	Plurianual			2020			
	Orçamen to	Realiza do	Tendênc ia	Orçamen to	Realiza do	Orçado Mês	Realizado Mês
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	-	-	-	-	-	-	-
PG08 - Reconstrução de vilas	15,00	-	15,00	-	-	-	-
PG09 - Recup Reservatório UHE Risoleta Neves	6,06	5,84	6,06	0,07	-	0,01	-
PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	3,46	-	3,46	3,5	-	0,32	-
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	110,03	4,33	109,95	20,38	2,03	1,60	0,51
PG15 - Tecnologias Socioeconômicas	57,92	0,77	57,92	5,4	0,16	0,48	0,01
PG18 - Diversificação da Economia Regional	101,10	54,19	101,10	13,52	3,52	1,11	0,14
PG20 - Estímulo à Contratação Local	10,17	6,23	10,17	3,9	0,84	0,39	0,01
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	4,39	4,39	4,39	-	-	-	-
PG26 – Recuperação de APPs	1.247,18	35,27	1.247,18	60,5	14,37	6,13	1,08
PG27 - Recuperação de nascentes	269,54	44,39	269,54	20,85	10,16	2,21	0,33
PG29 - Recuperação da fauna silvestre	10,60	1,44	10,60	3,0	0,51	0,22	0,11
PG31 - Coleta e tratamento de esgoto	665,78	19,94	665,78	109,72	12,44	11,26	2,57
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	101,37	60,00	101,37	38,6	6,22	3,04	0,46
PG33 - Educação Ambiental	141,54	13,34	141,54	23,17	1,70	2,21	0,17
PG34 - Emergência ambiental	48,14	29,87	48,14	8,5	3,88	0,71	0,72
PG35 - Informação para a população	19,83	4,04	19,83	4,64	0,32	0,51	0,07
PG36 - Comunic. nacional/internacional	38,03	5,64	38,03	2,5	0,76	0,21	-
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	-	-	-	-	-	-	-
PG39 - Unidades de conservação	151,74	0,10	151,74	10,3	0,03	1,06	-
PG40 - CAR e PRAs	37,66	1,43	37,66	2,46	0,31	0,25	0,08
Medidas Compensatórias	-	458,48	-	-	458,48	-	452,04
Saldo Compensatório	1.126,8	-	1.126,8	-	-	-	-
Total Compensatórios	4.166,4	749,7	4.166,3	331,0	515,7	31,7	458,3
Medidas mitigatórias emergenciais	202,39	202,39	202,39	-	0,00	-	-
PG01 - Cadastro dos Impactados	113,29	106,34	113,29	18,1	10,57	0,00	1,43
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	3.509,66	1.395,59	3.509,66	1.040,38	206,41	42,15	9,11
PG03 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	283,43	253,15	283,43	95,9	65,64	7,06	5,95
PG04 - Outros povos e comunidades tradicionais	54,48	43,30	54,48	13,17	6,12	1,13	1,09
PG05 - Proteção social	78,13	11,45	78,13	24,6	3,93	2,38	0,50
PG06 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	362,04	194,94	362,04	134,78	35,13	10,90	6,17

PG07 - Assistência aos Animais	35,52	31,25	35,52	8,6	4,32	0,74	0,16
PG08 - Reconstrução de vilas	1.642,99	920,85	1.642,99	889,32	407,25	77,36	94,63
PG09 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	1.128,66	781,15	1.128,66	290,0	65,70	44,19	8,59
PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	567,34	415,12	567,34	164,98	34,55	17,64	4,02
PG11 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	23,41	19,08	23,41	6,3	4,34	0,49	0,44
PG12 - Memória histórica, cultural e artística	105,02	42,18	105,02	24,75	6,03	2,52	0,56
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	31,95	15,15	32,03	17,7	1,15	1,92	0,04
PG14 - Saúde física e mental da população impactada	146,39	63,51	146,39	25,01	10,21	2,16	0,76
PG16 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	33,46	3,97	33,46	31,8	2,33	2,89	0,46
PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias	227,26	127,30	227,26	97,79	35,13	9,35	5,45
PG19 - Micro e Pequenos Negócios	21,61	7,32	21,61	10,5	1,28	1,07	0,09
PG21 - Auxílio Financeiro Emergencial	1.915,70	1.415,11	1.915,70	447,91	215,96	24,87	25,48
PG22 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	-	-	-	-	-	-	-
PG23 - Manejo dos rejeitos	334,21	98,36	334,21	152,09	31,41	11,41	6,74
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	1.034,60	1.110,78	1.034,60	56,7	89,88	4,63	1,27
PG25 - Recuperação área ambiental 1	462,93	350,66	462,93	34,71	12,92	3,12	1,43
PG28 - Conservação da biodiversidade	333,57	214,73	333,57	102,9	7,20	0,79	0,70
PG30 - Fauna e flora terrestre	56,65	24,68	56,65	15,98	6,63	1,35	0,24
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	257,52	234,58	257,52	71,1	48,15	4,63	2,66
PG37 - Gestão de riscos ambientais	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	442,45	203,19	442,45	47,9	12,38	5,01	1,39
PG39 - Unidades de conservação	8,97	4,88	8,97	4,88	0,79	0,18	0,00
PG41 Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	1.020,16	735,10	1.020,16	308,3	180,77	25,50	21,71
PG42 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	87,39	83,53	87,39	4,93	1,08	-	-
Total reparatórios	14.521,4	9.109,8	14.521,4	4.141,1	1.507,3	305,4	201,1
Total	18.687,7	9.859,5	18.687,7	4.472,1	2.023,0	337,1	659,4
