



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Outubro/2020

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>14</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>22</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>30</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>39</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>47</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>52</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>76</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>85</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>103</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>110</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>119</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>125</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>131</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>138</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>145</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>151</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>158</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>168</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>174</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>181</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>188</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>194</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>204</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>210</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>218</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>225</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>232</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>238</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>244</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>256</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>263</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>270</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>276</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>282</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>288</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>294</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>300</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>307</u>
Glossário	<u>314</u>
Gestão Econômica	<u>320</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em outubro de 2020, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em outubro foi protocolado o Relatório Mensal QAQC PMQQS referente ao mês de SET/20 em 26/10 e Entrega Final e Divulgação da Plataforma Online do PMQQS www.monitoramentoriodoce.org em atendimento à Deliberação CIF nº455 em 30/10. Houve ainda a retomada, em 23/10, da Operação da Estação Automática de Monitoramento RDO04 após interrupção de operação devido as chuvas ocorridas em janeiro de 2020 (PG038, pág. 288).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 194). Houve a apresentação sobre as ações do PG23 na reunião temática com representantes do Governo de MG, realizada pela área de RI da FR, houve também, o fórum de Prestação de Contas de Marilândia sobre as ações de reparação e compensação da Fundação Renova, com a presença dos programas Manejo de Rejeitos e Monitoramento da Bacia do Rio Doce e ocorreu a reunião com moradores de Resplendor sobre estudos realizados pelo Programa Manejo de Rejeitos. Ainda em outubro, houve início dos trabalhos de campo para caracterização e consolidação do Plano de Manejo do Trechos 13 e 14, em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA 13/2020.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 103) a qual, até o mês de outubro, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Buscando restabelecer as condições de operação da UHE, são contínuas as ações de infraestrutura como: Obras para reabilitação da UG1 em andamento, com avanço de 52%; Obras do Plano de Chuvas em andamento conforme cronograma. Houve ainda, protocolo das ICs do Licenciamento de Candonga junto a SUPPRI, o programa de Monitoramento de ruídos apresenta valores dentro do valor estabelecido pela lei estadual 10.100/90 para áreas de residência rural, realizada a Audiência Pública virtual para o processo de Licenciamento de Candonga e assinado o termo de cooperação entre a Fundação Renova e a Samarco.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 76), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 413 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.649 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito. Houve a conclusão do primeiro pomar dentro do âmbito do PASEA e a X semana Paulo Freire- 27/10 - Diagnóstico socioterritorial do alto rio Doce - Diálogo sobre o desenvolvimento rural sustentável a partir da agricultura familiar na região, com o professor Alair Ferreira de Freitas (UFV) (PG017, pág. 158). Na região do Médio e Baixo Rio Doce, houve o fornecimento de recursos financeiros para aquisição de silagem aos produtores rurais, localizados abaixo da Usina Risoleta Neves em Minas Gerais até o Espírito Santo, que estejam enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na manutenção de suas atividades produtivas, em atendimento à Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (SJMG) e retomada das atividades de campo, no Baixo Doce, pela Instituição responsável pelo ATES (Coopertrac), após liberação da Sala de Situação.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 210) e de Nascentes (pág. 218) —, que promoveu treinamento dos técnicos do CIAAT/INSTITUTO TERRA/PROGEN para mobilização, engajamento e validação das áreas para restauração florestal e no Baixo Doce, as-built das cercas realocadas nas nascentes do Ano 1, após o georreferenciamento realizado pelo Instituto Terra.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 16), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.398 famílias e 98.258 pessoas, desde o início do programa até setembro/2020.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 22). No mês de setembro, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 172 pessoas (97,7% dos 176 elegíveis). Destes, 172 receberam o pagamento das indenizações (100% dos atendidos). Em relação à campanha de Mariana, das 388 indenizações pagas até agora, 43 foram realizadas em setembro. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 188), atualmente existem 32.887 pessoas assistidas, com um total de 14.754 pagamentos. Em setembro, 4 novos auxílios foram incluídos, todos por decisão judicial.

Neste eixo de trabalho da Fundação Renova, muito tem sido feito em busca da retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016, pág. 151). Em outubro, dentre as ações realizadas pelo programa, houve a conclusão da análise do relatório de dados preliminares da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro e a formalização e constituição da Associação de Pescadores do Rio Doce – ASPERDOCE.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 30) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 39), o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.214 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 239 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 47) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 138) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a validação do plano integrado entre as áreas de Povos Indígenas e Tradicionais e o programa de Proteção Social para início da implantação das ações junto às famílias vulneráveis identificadas conforme atividades acordadas nos planos de trabalho. Ainda em outubro, houve o aceite do plano de reparação em proteção social pelo município de Rio Doce/MG e planejamento das capacitações dos operadores de proteção social com o município de Mariana/MG.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

A título de preparação para emergências ambientais (PG034, pág. 270), em outubro, houve a conclusão da execução do cronograma de publicações de outubro/20 da Assessoria Técnica Remota às Defesas Civas.

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente. Tais ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação econômica da região (PG018, pág. 168).

O programa de estímulo a contratação local (PG020, pág. 181) também merece destaque, dentre as ações realizadas pela Fundação Renova em outubro. Houve webinar para empresários locais de Mariana, sobre a utilização do SAP ARIBA e palestra para empresários do ES (Colatina, Linhares, Regência e Povoação) Tema: Produtividade nos Negócios para Reduzir Desperdícios e Aumentar os resultados.

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 52; PG035, pág. 276 e PG036, pág. 282), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros. O contato pode ser feito também pelos canais de relacionamento e ouvidoria disponíveis. A ouvidoria vem, desde a chegada do novo ouvidor-geral no final de 2019, passando por melhorias nos processos de gestão das manifestações, assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias recebidas.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Na frente de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032, pág. 256) dentre as ações realizadas pelo programa, pode-se citar conclusão da fabricação da balsa de captação do Rio Doce - Resplendor/MG, conclusão dos trabalhos de campo para refinamento da lista de beneficiários do abastecimento por pipas e água mineral e início do projeto de captação e

adução do poço novo de Regência/ES. No âmbito da Ação Civil Pública (ACP), houve a judicialização do Programa no contexto do Eixo Prioritário 9 da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. Muitos dos escopos das intervenções nas localidades estão sendo questionados judicialmente e, portanto, projetos e obras foram paralisados. Aguarda-se laudo pericial e consequente decisão judicial para revisão do escopo dos trabalhos e do cronograma de implantação de obras.

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 244), os repasses já realizados somam R\$ 15.755.637,25, contemplando os municípios de Alpercata/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Rio Casca/MG, Periquito/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 85) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos. A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de outubro:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em outubro, houve conclusão de 1 projeto conceitual e 2 projetos básicos; Conclusão de duas casas; Em andamento as atividades de construção dos Bens Públicos Escola, Posto de Serviços e Posto de Saúde;

Instalação, equipagem, lançamento de cabos e montagem de trafo de postes de iluminação urbana; ETE - Em andamento a sub-base, base, imprimação e drenagem do acesso e vias do entorno; corte, aterro e sarjeta das lagoas; e construção do prédio; Área 1 - Drenagem da S. Coração de Jesus (E. 18 a 20); drenagem da viela 18; esgoto da viela 13; execução de contenções das quadras E5, E6, I2, J, K e M; Área 2 - Execução de sub-base e base do acesso ao reservatório; contenção viela 25; terraplenagem da viela 23; drenagem da viela 26; solo grampeado e drenagem da viela 22; execução do abrigo da ETA; execução de contenções nas quadras C, D, E, F, G; Área 3 - Execução de rede enterrada do poço 4; aterro e escavação do acesso ao poço 5; execução de contenções na quadra O1.

Paracatu de Baixo — em outubro, houve a conclusão da montagem das fundações da escola; Conclusão do esgoto e drenagem profunda na Rua Monsenhor Horta; Conclusão do esgoto e drenagem profunda na Praça Santo Antônio; Conclusão de 1 projeto conceitual.

Gesteira — O processo referente ao Reassentamento de Gesteira foi judicializado. Aguardando decisão judicial para seguir com os atendimentos.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em outubro, houve a conclusão de 2 projetos conceituais e 2 projetos detalhados; 1 projeto básico protocolado na Prefeitura; Aquisição de 2 imóveis para atendimento, sendo 1 para nova construção de casa e 1 para reforma.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

Nota: *Informamos que, excepcionalmente esse mês, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação Renova, os tópicos de Timeline e Curva S de todos os programas não refletirão as informações do mês de outubro. No relatório de dezembro, enviaremos as atualizações referentes a outubro e novembro.*

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Em Andamento
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020*



Nota: * O pacote de trabalho "cadastro dos remanescentes de mariana" foi reestruturado. Com isso, foram unificadas as três subdivisões (Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e comunidades rurais) em um pacote único, contabilizando o avanço com o critério quantitativo a partir das bases de dados para melhorar o acompanhamento. Além disso o pacote de trabalho "cadastro dos remanescentes de mariana" teve prazo reprogramado para julho/21. Houve mudança também no pacote de trabalho "realizar devolutiva junto aos impactados", que teve nomenclatura alterada, adicionando as campanhas 1 e 2, que fazem parte do processo e que agora contam com avanço quantitativo no cronograma. Seu prazo foi também reprogramado para julho/21. O pacote de trabalho "atualização e correções dos cadastros realizados" teve prazo também reprogramado para julho/21. Nenhuma das alterações impacta orçamento ou prazo final de execução do programa e se devem ao atraso das atividades devido ao COVID-19.

** Por se tratar de um processo as demais atividades do cadastro não estão presentes na linha do tempo devido a data final da entrega (final dos processos) ser em 2021.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 60149 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30398 famílias e 98258 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Foram disponibilizados 26 dossiês pela Assessoria Técnica da Comissão de Atingidos de Mariana em setembro/2020.

Indicadores



Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado

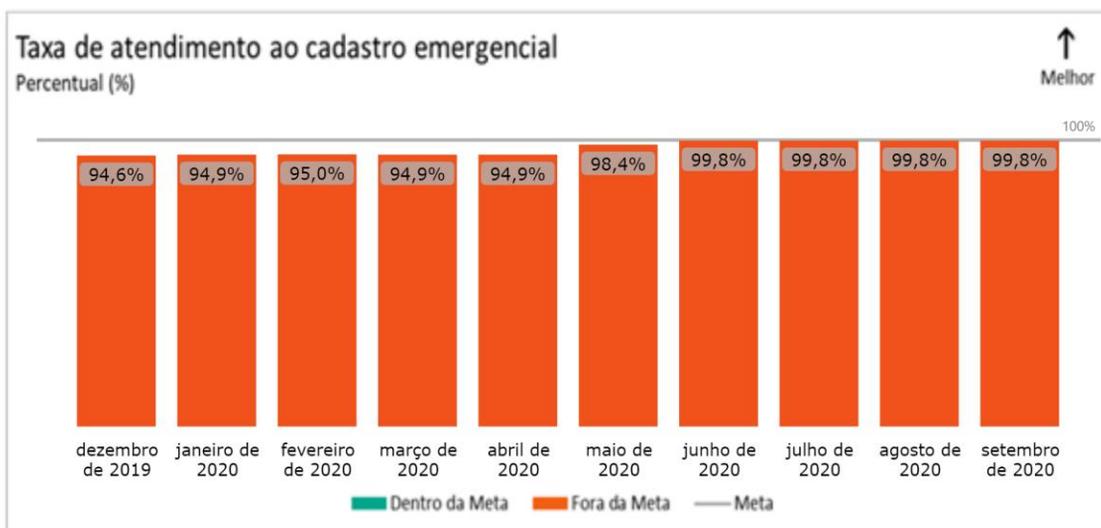


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado

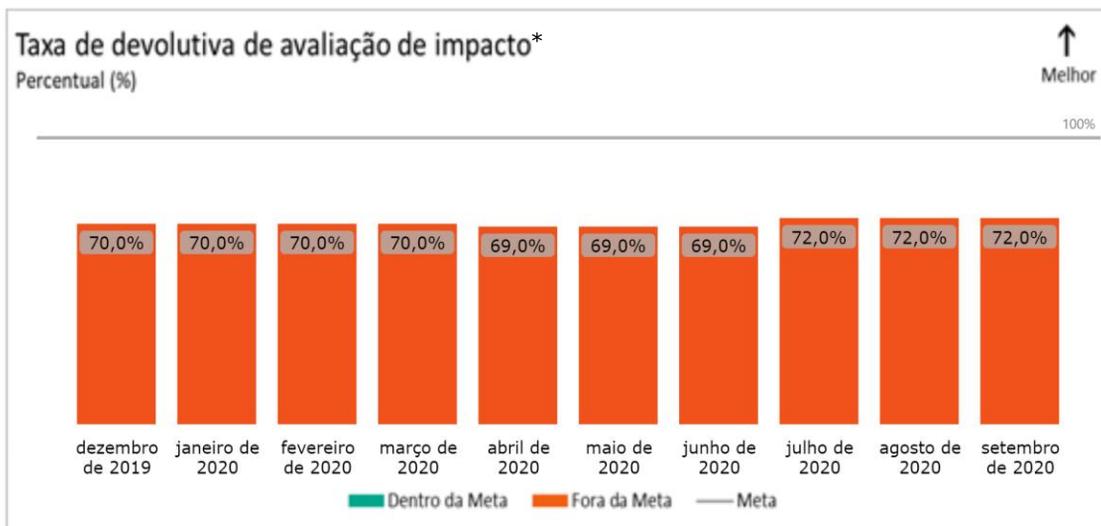


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.

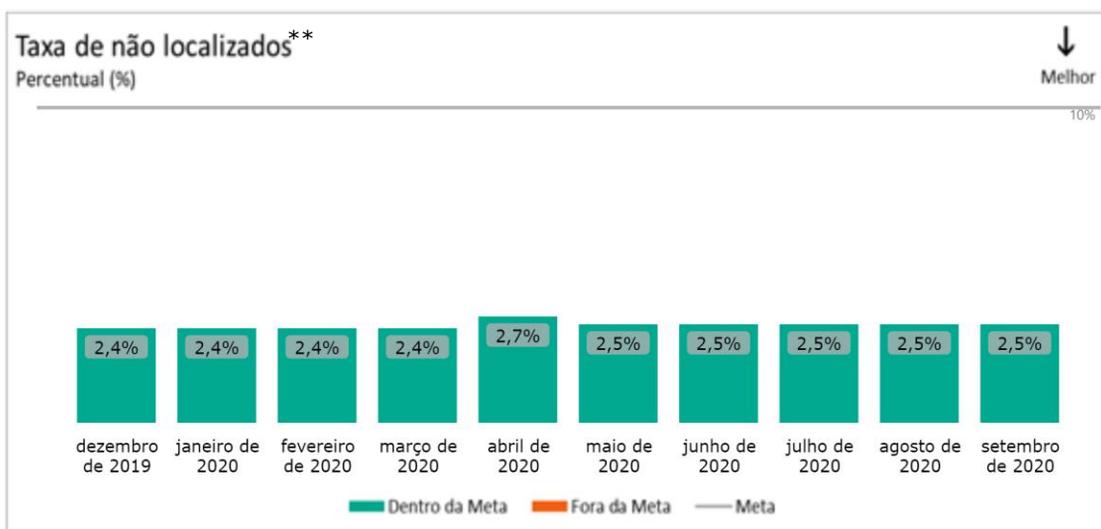


Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

Nota: * Contabilização da taxa de devolutivas dos meses de julho e agosto foi revisada. Foram identificadas duplicatas que haviam sido contabilizadas, sendo o valor corrigido para 72%.

** A meta da taxa de não localizados foi corrigida. De acordo com a definição do programa, a meta para o indicador taxa de não localizados, é 10%. Com isso, o valor foi alterado de 5% para 10%.

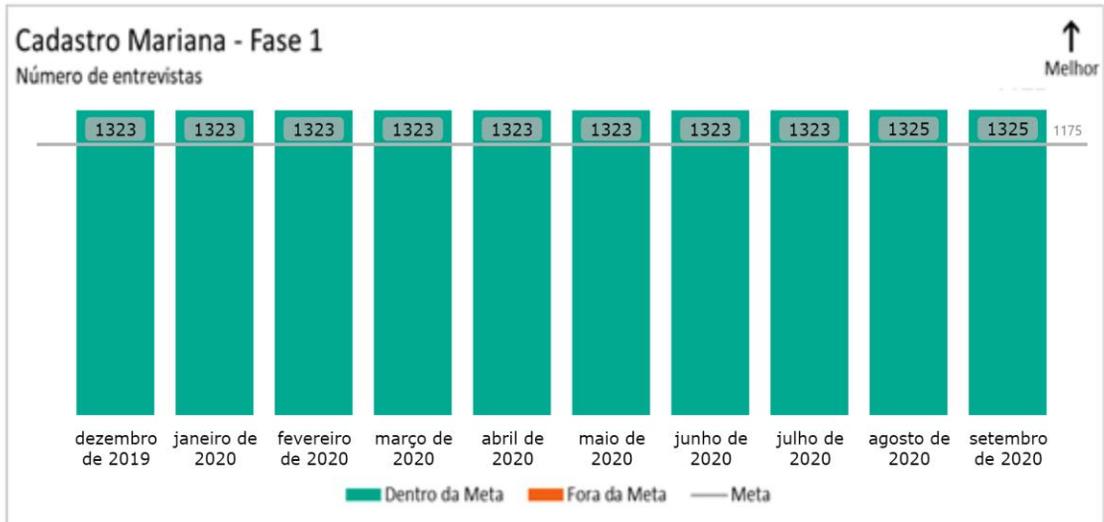


Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado

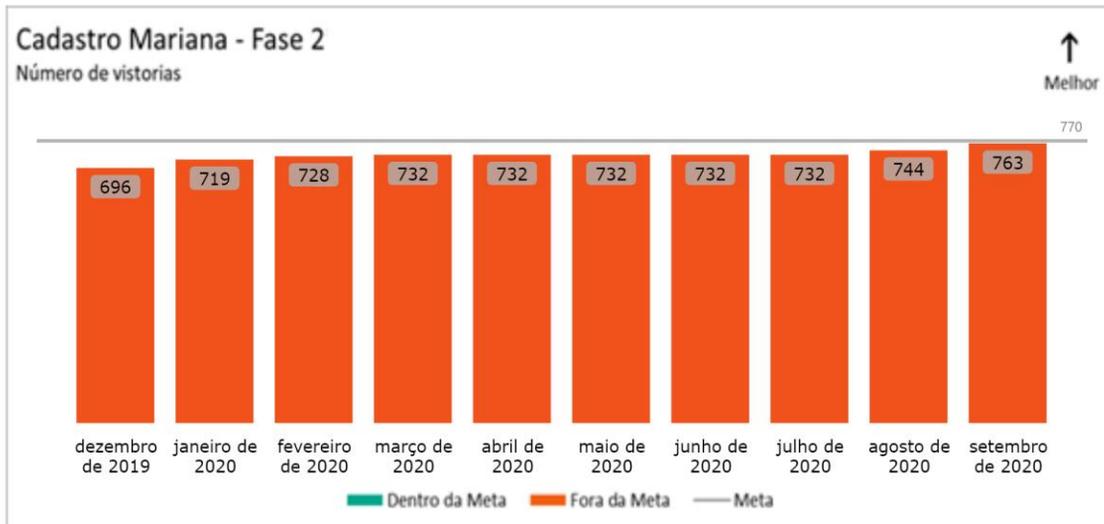


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa.

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput (ação 2)	Reprogramado

Deliberação	111	6	Em Andamento
Deliberação	118	2	Em Andamento
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	18	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- outubro de 2020 ● Finalização das pendências de lucro cessante 2018 (falecidos e agentes públicos)
- outubro de 2020 ● Finalização dos acordos para o pagamento do Lucro Cessante 2019
- dezembro de 2020 ● Finalização dos Atendimentos e Pagamentos de Indenizações de Dano Água
- dezembro de 2020 ● Finalização de atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas remanescentes (Fase 2) - Dano Geral
- dezembro de 2020 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis do Escritório Mariana
- dezembro de 2020 ● Finalização dos Atendimentos e pagamentos das famílias cadastradas elegíveis nos escritórios exceto Mariana (Campanha 3)
- dezembro de 2020 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos das famílias com pendências em todos os escritórios, exceto Mariana (Fase 1)
- dezembro de 2020 ● Finalização dos pagamentos das famílias cadastradas elegíveis em todos os escritórios exceto Mariana (Campanhas 1 e 2)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Para Dano Água, até o momento foram atendidas 320.178 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 270.312 propostas já foram pagas (99,9% das propostas aceitas). Além desse universo também foram pagas 8.487 indenizações referentes à Condenação Judicial e IRDR. Os pagamentos somam **R\$ 284,5 milhões**.
- Para Danos Gerais, 10.257 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.201 já foram pagos (99,5% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 938,5 milhões**.

Fatos relevantes do mês

- Pagamento de 43 indenizações de Mariana. Até o momento, foi realizado o pagamento de 388 indenizações, o que representa 91,1% do total das 426 propostas aceitas.
- Pagamento de 04 novos casos dos Camaroeiros da Enseada do Suá. Até o momento, foram atendidas 172 pessoas (97,7% dos 176 elegíveis). Destes, 172 receberam o pagamento das indenizações (100% dos atendidos).

Indicadores

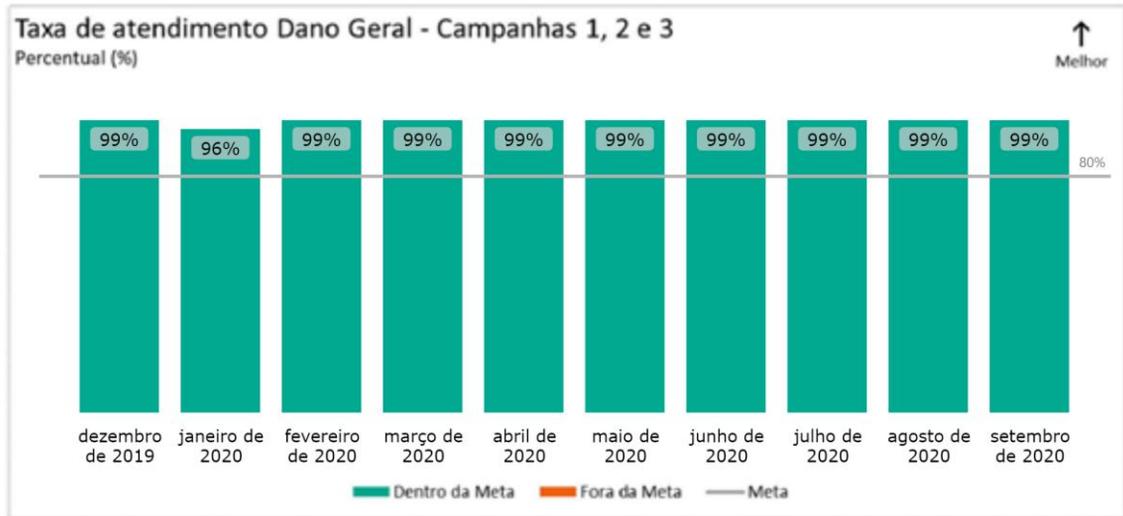


Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

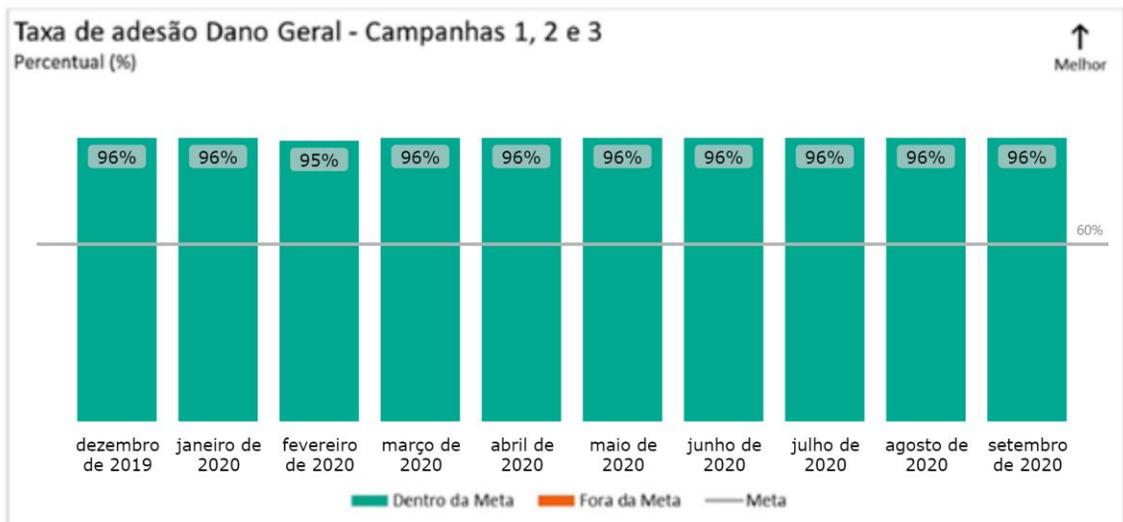


Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa.

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	39	Caput	Em Andamento
Cláusula	43	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado

Deliberação	155	2	Em Andamento
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Planejado
Deliberação	231	3	Planejado
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.2	Em Andamento
Deliberação	445	2.3	Em Andamento
Deliberação	445	2.4	Em Andamento
Deliberação	445	2.5	Em Andamento

Entregas do ano de 2020

fevereiro de 2020	●	Envio do Estudo de Componente Indígena Comboios para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e mantenedoras
fevereiro de 2020	●	Envio do Estudo de Componente Indígena Tupiniquim-Guarani para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e mantenedoras
abril de 2020	●	Finalização do Estudo de Componente Indígena de Comboios
abril de 2020	●	Finalização do Estudo de Componente Indígena Tupiniquim-Guarani
maio de 2020	●	Finalização de mapeamento de produtos com potencial de compra pela Fundação Renova na comunidade Comboios
maio de 2020	●	Finalização de mapeamento de produtos com potencial de compra pela Fundação Renova na comunidade Tupiniquim-Guarani
maio de 2020	●	Finalização da elaboração de material didático para apresentação do entendimento da Fundação Renova sobre o Estudo de Componente Indígena para as comunidade Comboios
maio de 2020	●	Finalização da elaboração de material didático para apresentação do entendimento da Fundação Renova sobre o Estudo de Componente Indígena para as comunidade Tupiniquim-Guarani
junho de 2020	●	Conclusão da Inclusão de famílias dos Povos Indígenas de Resplendor no Auxílio Subsistencia Emergencial
outubro de 2020	●	Finalização do mapeamento de interfaces com outros programas para revisão da definição do programa
outubro de 2020	●	Renovação de acordo sobre atuação da Fundação Renova no Território Indígena de Resplendor
dezembro de 2020	●	Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
dezembro de 2020	●	Conclusão da inclusão de famílias de Comboios no Auxílio Subsistencia Emergencial
dezembro de 2020	●	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
dezembro de 2020	●	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
dezembro de 2020	●	Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
dezembro de 2020	●	Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
dezembro de 2020	●	Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.586 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 147 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor.

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.573.696,23 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822.xxx-1; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIACAO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE IRAJÁ; ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE AREAL; ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM AITG; ASSOCIACAO TUPINIKIM GUARANY D ATUGUAA e ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1214 famílias indígenas das terras Tupiniquim-Guarani. As 1214 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 70 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ, 238 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM PAU BRASIL, 123 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE IRAJÁ, 51 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM DE AREAL, 700 famílias da ASSOCIACAO INDIGENA TUPINIKIM AITG, 32 famílias da ASSOCIACAO TUPINIKIM GUARANY D ATUGUAA. O total de R\$ 2.573.696,23 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.045,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água para a comunidade de Comboios – 43800 litros distribuídos entre 01/10/2020 até 31/10/2020 (total de 2.190 galões de 20 litros);



Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.288.485,00 nas contas bancárias números (Banco do Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; e 20.076.203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKAN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.288.485,00 compreende o pagamento mensal de R\$ 9.405,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – 5 litros por pessoa por dia de Água Mineral de 21/09/2020 até 20/10/2020 (total de 90.000 litros);

Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor – 2.268 sacos de 40 kg para 108 famílias de 21/09/2020 até 20/10/2020;

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/09/2020 até 20/10/2020;

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/09/2020 até 20/10/2020;

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa *

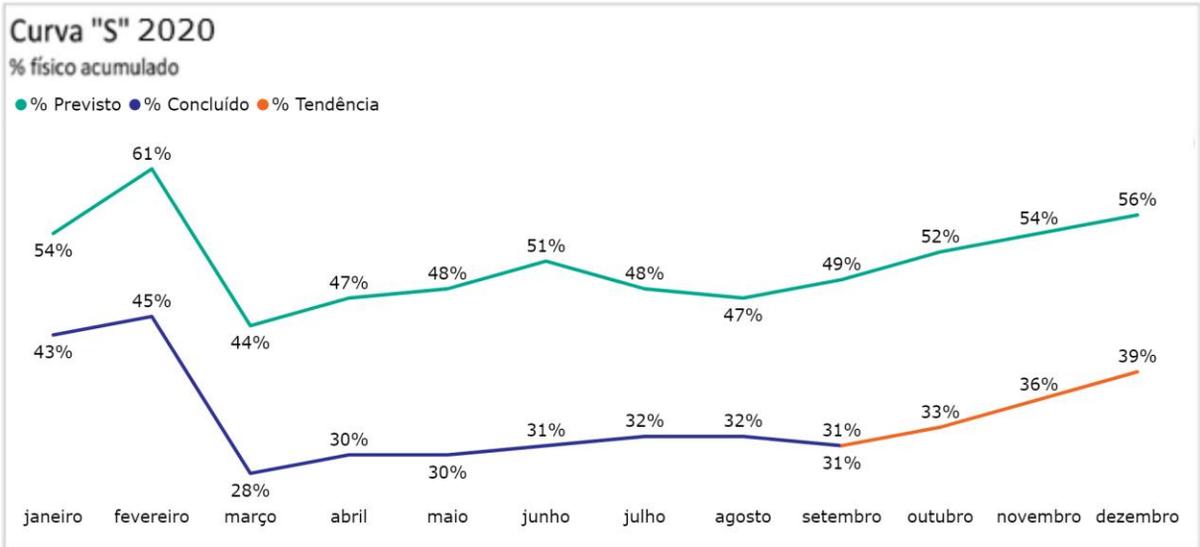


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

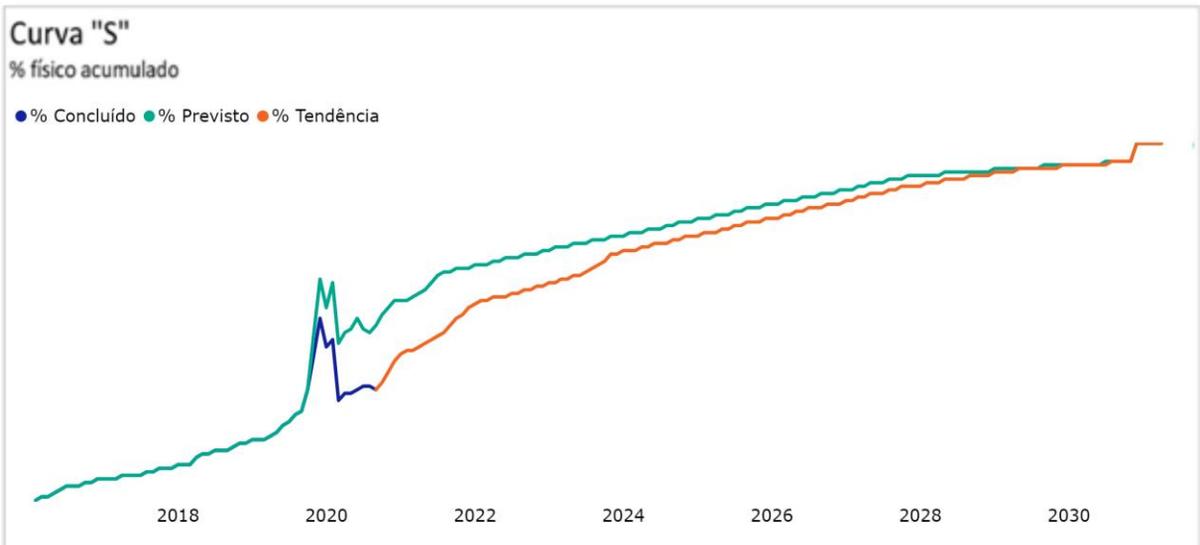


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	Caput	Em Andamento
Deliberação	155	2	Em Andamento
Deliberação	231	2	Planejado
Deliberação	231	3	Planejado
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	281	4	Planejado
Deliberação	298	2	Em Andamento
Deliberação	423	4	Planejado
Deliberação	430	1	Em Andamento
Deliberação	430	2	Em Andamento

Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Reprogramado
Deliberação	356	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Reprogramado

Entregas do ano de 2020

fevereiro de 2020	●	Finalização do levantamento de campo do estudo hidrogeológico de Degredo
fevereiro de 2020	●	Manifestação da Fundação Renova sobre o detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola entregue pela consultoria
abril de 2020	●	Finalização de acordo de proposta com a Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo (ASPERQD) para assessoria técnica para a comunidade de Degredo
julho de 2020	●	Finalização da consolidação do Estudo Ambiental Complementar de Degredo
setembro de 2020	●	Conclusão da contratação da Assessoria Técnica (ASPERQD) e do aditivo para equiparação dos benefícios
novembro de 2020	●	Finalização da realização das escutas para validação de escopo dos programas do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ)
novembro de 2020	●	Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
novembro de 2020	●	Devolutiva do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) no território de Degredo pela Fundação Palmares e Fundação Renova
dezembro de 2020	●	Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
dezembro de 2020	●	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
dezembro de 2020	●	Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF
dezembro de 2020	●	Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 386 **titulares** (177 quilombolas, 105 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 185 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas elegíveis de Degredo – 177 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo;

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo – 280.160 litros de 02/10/2020 até 30/10/2020

Fiscadores

Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos fiscadores elegíveis – 209 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

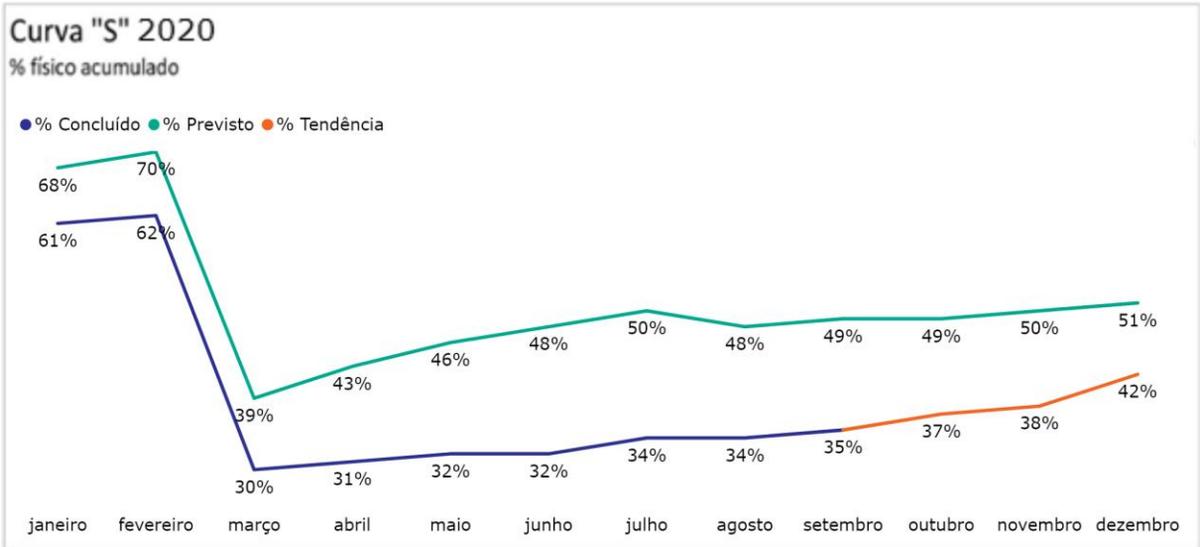


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

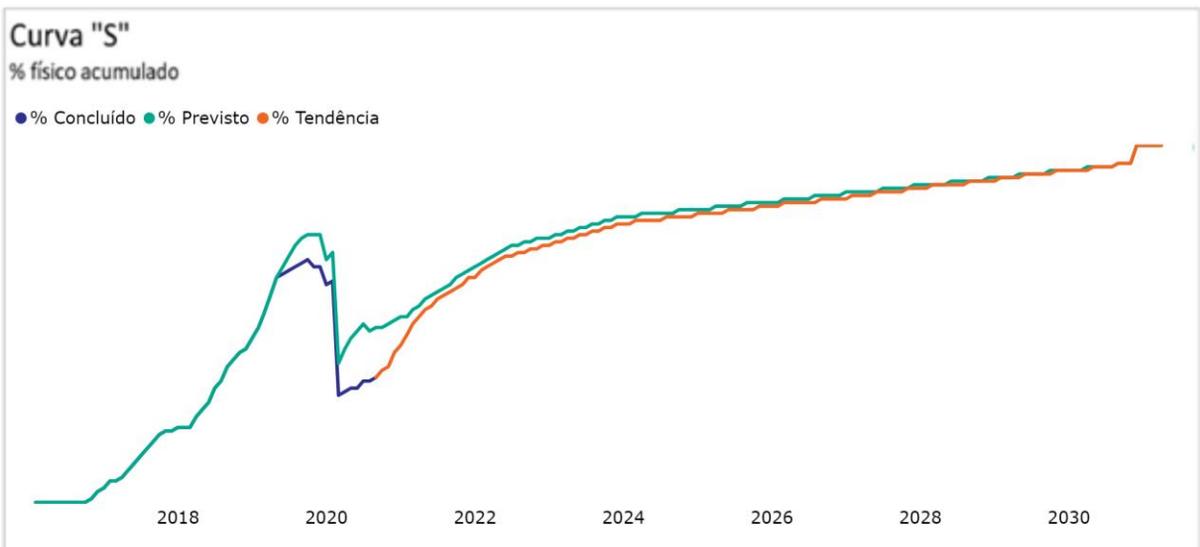


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com deslocamento físico.

Cláusula	54	Caput	Em Andamento
Cláusula	58	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

março de 2020	●	Conclusão da realização de oficinas de educação financeira nos municípios de Minas Gerais
março de 2020	●	Início do repasse financeiro do plano de reparação em Proteção Social para os demais municípios da calha
maio de 2020	●	Início do acompanhamento e monitoramento dos Planos Integrados entre o programa de Proteção Social e programas de interface da Fundação Renova
junho de 2020	●	Conclusão do processo de aditamento do contrato com fornecedor Contexto para suplementação de mão de obra em Barra Longa (Novo aditivo - Contexto)
junho de 2020	●	Conclusão do processo de aditamento do contrato com fornecedor Contexto para suplementação de mão de obra em Mariana (Novo aditivo - Contexto)
junho de 2020	●	Elaboração da proposta do nova estratégia de reparação em Proteção Social nos demais municípios da calha
agosto de 2020	●	Assinatura do termo jurídico do plano de reparação em Proteção Social junto ao município de Barra Longa pela Fundação Renova e município
outubro de 2020	●	Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado de Minas Gerais (MG)
outubro de 2020	●	Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado do Espírito Santo (ES)
outubro de 2020	●	Conclusão da assinatura dos termos jurídicos do plano de reparação dos demais municípios da Calha do Rio Doce
novembro de 2020	●	Entrega dos demais veículos locados para atendimento aos demais municípios da Calha do Rio Doce através de novo contrato
dezembro de 2020	●	Implementação da nova estratégia de reparação em Proteção Social
dezembro de 2020	●	Entrega de brinquedoteca para o município de Barra Longa
dezembro de 2020	●	Conclusão da elaboração dos Planos Integrados para promoção da Proteção Social junto aos programas de interface da Fundação Renova

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 22 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) atuaram nos municípios de **Mariana/MG** (20 profissionais) e **Barra Longa/MG** (2 profissionais) no período;

Fatos relevantes do mês

Planejamento das capacitações dos operadores de proteção social com o município de Mariana/MG.

Aceite do plano de reparação em proteção social pelo município de Rio Doce/MG

Curva S do programa

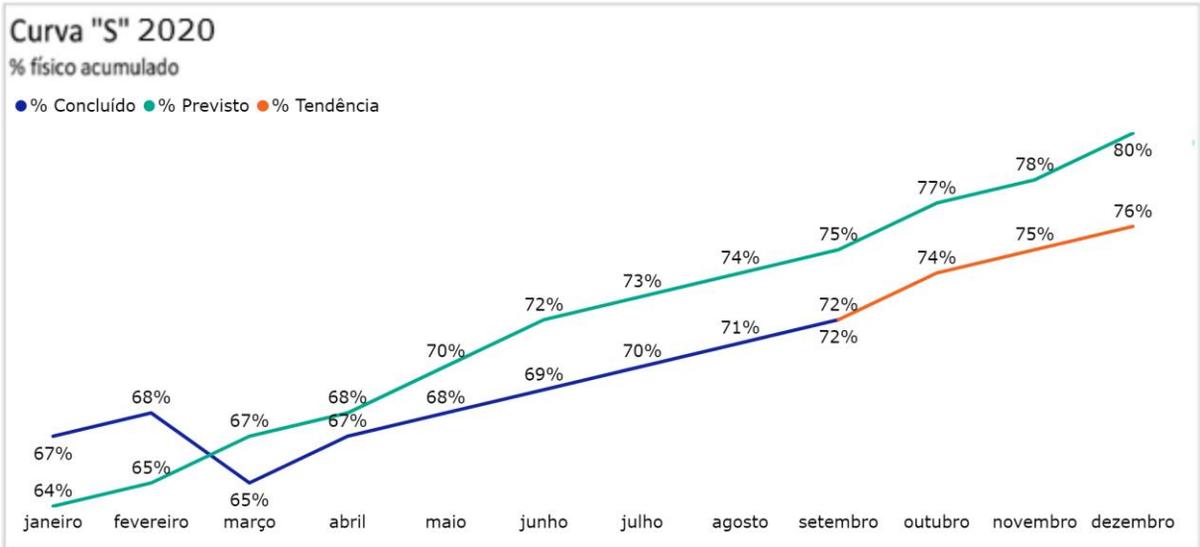


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

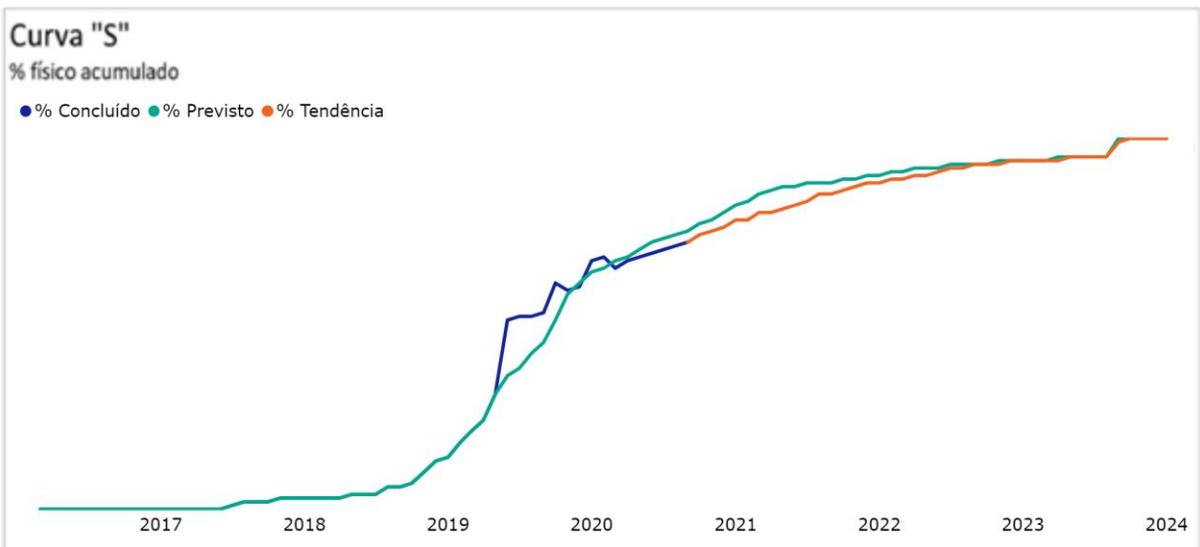


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Apoiar os demais programas da Fundação Renova, no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no TTAC. Sua transversalidade visa garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação, executadas pela Fundação Renova, sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe ressaltar ainda, o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	65	Caput	Planejado
Cláusula	66	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	67	b	Concluído Internamente
Cláusula	67	c	Concluído Internamente
Cláusula	67	a	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	69	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	70	Caput	Em Andamento
Cláusula	71	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

dezembro de 2020		Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2020		Execução do processo participação social
dezembro de 2020		Execução do processo análise de contexto
dezembro de 2020		Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2020		Execução do processo de canais de informação e interação com as comunidades
dezembro de 2020		Execução do processo de produção de conteúdo
dezembro de 2020		Execução do processo de gestão dos Canais de Relacionamento

 Concluído  Planejado  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números

INDICADOR*	Setembro/2020	Outubro/2020	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	39	43	3280
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	17	9	922
Reuniões Realizadas – Outras Localidades	-		14
Total de Participantes em Reuniões		-	113.766

* Em relação ao quantitativo reportado até o mês de setembro/20, identificamos uma inconsistência dos dados. As informações acima já incorporam as correções e incluem os quantitativos atualizados até o mês de outubro/2020.

Fatos relevantes do mês

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias e em atenção ao contexto da pandemia da Covid-19 (coronavírus) e seus desdobramentos, as equipes de Diálogo Social mantêm suas atividades em regime de teletrabalho, tendo sido suspensa a realização de ações presenciais de relacionamento, participação e controle social junto aos públicos de interesse. Nesse contexto, as principais atividades desenvolvidas foram:

Continuidade da implementação do Protocolo Social do Reassentamento, em conjunto com os programas de Reassentamento, Proteção Social e Saúde Física e Mental, para manutenção dos atendimentos às famílias em situação de deslocamento físico, no município de Mariana, durante o período de isolamento social. Neste mês, destaque para divulgação de materiais informativos sobre reassentamento; compartilhamento da 11ª Edição do Jornal Vozes da Comunidade; divulgação da plataforma de educação financeira, Informativo sobre a distribuição de madeira em Paracatu, divulgação das ações Proteção Social e Saúde, prorrogação do prazo para inscrições Inovando Futuro e Qualifica, voltado a qualificação profissional e Prestação de Contas das ações do Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13).

Continuidade da realização de reuniões com o Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo, a partir de ferramentas de comunicação remota, para discussões acerca do reassentamento coletivo da comunidade, como tratativas relacionadas à manutenção da área de origem e apresentação do panorama das obras em andamento e abastecimento de água bruta. Em Bento Rodrigues, o encontro do grupo de trabalho teve como objetivo a apresentação dos protocolos de Saúde e Segurança para realização da visita presencial da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues às obras do reassentamento.

Realização de reunião com grupo de manifestantes da estrada de acesso a UHE Risoleta Neves para escuta e acolhimento das reivindicações relacionadas às soluções indenizatórias e posterior encaminhamento às áreas responsáveis.

Em apoio a realização da Audiência Pública da etapa de licenciamento das obras da UHE Risoleta Neves, foram promovidos encontros remotos com moradores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado para orientações sobre objetivos, estrutura, e formato da Audiência, bem como esclarecimento das demais dúvidas.

Mobilização e realização de Fórum de Prestação de Contas nos municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. O encontro tratou sobre as ações de Restauro Florestal desenvolvidas pela Fundação Renova no território até o momento.

Em preparo para a retomada das obras no município de Barra Longa, foram realizadas reuniões com moradores da localidade para apresentação dos protocolos de Saúde e Segurança relacionados a prevenção do contágio por Covid-19 e ações para a Contratação Local.

Na Calha do Rio Doce, foram realizados os Fóruns de Prestação de Contas em São José do Golabal (MG), comunidade de Ipabinha (Santana do Paraíso), São Lourenço (Bugre) e Porto Seguro e Ilha do Rio Doce (Caratinga). Os encontros tiveram como objetivo apresentar os resultados das ações da Fundação Renova nas localidades até o momento.

Fatos relevantes do mês

Foi realizada reunião em parceria com o Parque Estadual do Rio Doce/IEF junto a moradores de Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) para esclarecimento de dúvidas sobre a pesca na zona de influência do Parque Estadual do Rio Doce. Na mesma localidade, foi realizada reunião para apresentação da estrutura da Política de Assistência Social e acolhimento de eventuais dúvidas. Em Baixa Verde (Dionísio) foi realizada reunião com grupo de costureiras para orientação sobre o processo de cadastramento para se tornarem fornecedores de máscaras para a Fundação Renova e demais atividades da área de Economia e Inovação.

Continuidade das Oficinas Temáticas sobre os programas da Fundação Renova no território do Médio Rio Doce: em Tumiritinga (MG), foram apresentadas as ações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras; em Conselheiro Pena (MG) e Galileia (MG) o encontro tratou sobre os Programas de Recuperação de Nascentes (PG27) e Recuperação de Áreas de Preservação Permanentes (PG26); e em Ilha Brava (Governador Valadares) foram discutidas as ações do Programa de Manejo de Rejeitos (PG23).

Destaque para os Fóruns de Prestação de Contas, no Médio Rio Doce realizados em Tumiritinga (MG) e Cachoeira Escura (Belo Oriente) para apresentação geral sobre as ações realizadas pelos programas da Fundação Renova até o momento.

Contato com moradores e lideranças de todo o território do Médio Rio Doce para esclarecimentos e acolhimento de dúvidas sobre o novo processo indenizatório - Fluxo Ágil -; divulgação da Plataforma Qualifica de cursos de qualificação à distância; informativo sobre as próximas ações do Projeto "Formação de Lideranças jovens", promovido pelo Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG33) e divulgação do Portal da Transparência da Fundação Renova.

No Baixo Rio Doce, foram realizados de Fóruns de Prestação de Contas em Itueta e Resplendor (MG), Colatina e Marilândia (ES) para apresentação das ações realizadas pelos Programas Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (PG31), Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38), Recuperação de Nascentes (PG27), Recuperação Áreas de Preservação Permanente (PG26), Manejo de Rejeitos (PG23), Proteção Social (PG05) e da área de Infraestrutura.

Em Santo Antônio do Rio Doce (Aimorés) foi realizada reunião para apresentação de propostas e escopo do Programa de Retomada Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16) e sobre o TAC Governança.

Em Baixo Guandu, foi realizado contato com moradores e lideranças para esclarecimentos e acolhimento de dúvidas sobre o processo indenizatório de Fluxo Ágil.

No território da Foz/Litoral ES, em Povoação (Linhares), foi realizada reunião com Associação de comerciantes e empreendedores de Povoação, para validar o orçamento de compra dos materiais para realização da feira comunitária. Em Patrimônio da Lagoa (Sooretama), foram realizadas reuniões para alinhamento sobre a retomada das atividades no local e validação da solução para readequação do sistema de bombeamento da água para o brejo da lagoa Trinaraná.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2019).

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2019)	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2019)
8.014*	133,56

* PARA A OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO "MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO", HOVE UMA MODIFICAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE CÁLCULO, DEVIDO À VERIFICAÇÃO DE UMA INCONSISTÊNCIA NA CONTABILIZAÇÃO DOS DADOS.

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS DE REFERÊNCIA	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
Janeiro/2020	249	282,33
Fevereiro/2020	321	
Março/2020	277	
Abril/2020	94	79,66
Mai/2020	64	
Junho/2020	81	
Julho/2020	125	229,67
Agosto/2020	293	
Setembro/2020	271	
Outubro/2020	111	111
Novembro/2020		
Dezembro/2020		

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao [compliance](#), podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Indicadores.

INDICADOR (Valores Acumulados) *	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020
Total de manifestações	676.860	683.369
Manifestações em tratamento	58.918	60.079
Manifestações respondidas	617.942	623.290
Manifestações registradas pelo 0800	538.474	543.630
Manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	119.046	119.628
Manifestações registradas pelo Fale Conosco	12.816	12.878
Manifestações registradas pelo Portal do Usuário	6.524	7.233
Total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	155.117	155.117
Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	7	11

*Os Indicadores relativos ao total de manifestações do Fale Conosco e do Portal do Usuário podem sofrer alterações, na comparação com relatórios passados, em função de ações de revisão da base, de forma a corrigir duplicidades de protocolos.

Em função do contexto de restrição às atividades presenciais e da orientação de isolamento social, devido aos riscos gerados pela pandemia do Coronavírus, não foi possível apurar os dados da Pesquisa de Satisfação das unidades dos CIAs. A seguir, segue resultado da pesquisa do 0800.

Por sugestão do GT da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social – CT-PDCS, e na intenção de aprofundar na análise qualitativa das respostas às perguntas da Pesquisa de Satisfação, desde o 1º de outubro de 2020, a Fundação Renova apresentará novo formato para pesquisa de satisfação do Canal 0800, a partir deste relatório como veremos logo abaixo:

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Pesquisa de Opinião 0800 (Outubro/20)

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1 (outubro/2020).

Pesquisa de Opinião 0800 (Outubro/20)

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2 (outubro/2020).

Pesquisa de Opinião 0800 (Outubro/20)

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1=Sim (outubro /2020).

Pesquisa de Opinião 0800 (Outubro/20)

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q2=Parcialmente (outubro/2020).

Fatos relevantes do mês

Acompanhamento diário e tratativa de solicitações referentes ao Portal do Advogado, conforme decisão judicial da 12ª Vara, disponível neste momento para Baixo Guandu e Naque. O objetivo é o esclarecimento de dúvidas e direcionamento de demandas relacionadas ao tema, tanto por parte dos atingidos, quanto de seus advogados.

Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes. No período, destaca-se a realização de mobilização para análise e tratativas das manifestações relacionadas aos Programas de Saúde Física e Mental da População Impactada (PG14), Manejo de Rejeitos (PG23) e Abastecimento de Água (PG32) no território do Médio Rio Doce; Cadastro Integrado no território do Alto Rio Doce; retorno de manifestações referente aos imóveis judicializados nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce.

Continuidade da capacitação dos atendentes das unidades dos CIAs em Língua Portuguesa, como forma de qualificar e aperfeiçoar os registros das solicitações acolhidas por esses profissionais, junto aos públicos de atendimento da Fundação Renova.

Continuidade do treinamento "Atendimento em Foco", que busca abordar as dimensões teóricas e práticas de atendimento, diálogo e relacionamento com os públicos atingidos, com foco no Diálogo Cooperativo, Mediação de Conflitos e Comunicação Não Violenta.

Realização de treinamento com atendentes (Fale Conosco, Central 0800 e CIAs) para melhor compreensão e aplicação do documento de Perguntas e Respostas (Q&As) sobre árvore de registro do SGS dos temas Cadastro Integrado e Indenização Mediada.

Fatos relevantes do mês

Apoio à mobilização dos públicos de relacionamento de para participação em Fóruns de Prestação de Contas: em Itueta e Resplendor a reunião tratou sobre os temas Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos, Monitoramento da Bacia do Rio Doce e ações da frente de Infraestrutura. Em Colatina e Marilândia, o encontro apresentou as ações realizadas pelos programas de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs), Recuperação de Nascentes e Monitoramento da Bacia do Rio Doce. Na Calha do Rio Doce, foram realizados encontros em São Lourenço (Bugre), Bom Jesus do Galho (MG) e Caratinga (MG).

Contato ativo com moradores de Bajxo Guandu para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo indenizatório do Fluxo Ágil, conforme decisão da 12ª Vara Federal.

Continuidade do recebimento, análise e encaminhamento de documentos físicos, nas unidades dos CIAs de Tumiritinga (MG), Naque (MG), Governador Valadares (MG), Belo Oriente (MG) e Periquito (MG), referentes às solicitações de atendimento pelo Cadastro Integrado Fase 2, como alternativa ao envio digitalizado por meio do Portal do Usuário no período de isolamento social.

Análise de manifestações sobre os assuntos Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG04), na Foz/Litoral ES, e Reconstrução de Vilas (PG08), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas (PG10), Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) e Diálogo, Comunicação e Participação Social (PG06) no Médio Rio Doce, buscando qualificar as demandas pendentes de tratamento pelos Programas.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

O pilar Comunicação não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

[Alto Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Barra Longa para o segundo Fórum de Prestação de Contas do município, tendo como a Agenda Juventudes como tema.

[Alto Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp com algumas orientações necessárias para o período posterior à Audiência Pública de Regularização Ambiental das obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores (UHE Risoleta Neves).

[Alto Rio Doce] Produção de pílulas de WhatsApp convidando moradores de Barra Longa para encontro virtual sobre TAC Governança, no dia 15/10; e moradores de Santa Cruz do Escalvado para encontro virtual sobre o mesmo tema, no dia 22/10.

[Alto Rio Doce] Produção e distribuição digital da 5ª edição do Boletim Jornada para a população de Barra Longa.

[Alto Rio Doce] Produção e distribuição digital da 5ª edição do Boletim Jornada para a população de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

[Baixo Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp e programa da Rádio Renova para informar a população de Resplendor sobre a obra de pavimentação em via no acesso norte do município.

[Baixo Rio Doce] Produção de pílulas de WhatsApp convidando moradores para reuniões do Fórum de Prestação de Contas em Itueta, no dia 06/10; e em Resplendor, no dia 08/10.

[Baixo Rio Doce] Produção e distribuição digital da 8ª edição do Boletim Jornada para a população dos municípios de Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia.

[Foz Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp para informar moradores sobre as obras de manutenção da enseadeira localizada no rio Pequeno.

[Foz Rio Doce] Produção e distribuição digital da 12ª edição do Boletim Jornada para a população de Linhares.

[Foz Rio Doce] Produção e distribuição digital da 12ª edição do Boletim Jornada para as comunidades do entorno da Lagoa Juparanã.

[Mariana] Produção e distribuição digital da 13ª edição do Boletim Jornada para a população de Mariana.

Fatos relevantes do mês

[Médio Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp mobilizando moradores de Tumiritinga para Fórum de Prestação de Contas, encontro realizado de forma virtual.

[Médio Rio Doce] Elaboração de pílulas de WhatsApp para convidar moradores de Conselheiro Pena, Galileia, Ilha Brava e Tumiritinga para Oficinas Temáticas on-line. As reuniões apresentaram ações da Renova em andamento nas comunidades dentro de temas como Monitoramento da Água, Manejo de Rejeitos e Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras.

[Médio Rio Doce] Apoio na organização da primeira edição do "Resulta: transparência e prestação de contas da reparação do Rio Doce", realizado no dia 29/10, em Cachoeira Escura (Belo Oriente). O evento híbrido, com transmissão e interatividade junto aos participantes sem condições de acesso virtual, contou com pílula de WhatsApp para a mobilização.

[Calha Rio Doce] Produção e distribuição digital da 4ª edição do Boletim Jornada para a população dos municípios do território Calha do Rio Doce.

[Calha Rio Doce] Produção de pílulas de WhatsApp sobre os Fóruns de Prestação de Contas para moradores das comunidades de São Lourenço (em Bugre), no dia 20/10; de Ipaba do Paraíso (em Santana do Paraíso), no dia 22/10; e de Porto Seguro e Ilha do Rio Doce (em Caratinga), no dia 29/10, com objetivo de apresentar as ações de reparação desenvolvidas pela Fundação Renova nesses municípios e região.

[Calha Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Revés do Belém, comunidade de Bom Jesus do Galho, para Oficina Temática sobre Assistência Social, no dia 13/10.

[Calha Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com um resumo dos assuntos apresentados no Fórum de Prestação de Contas para moradores de São Lourenço, comunidade de Bugre, no dia 20/10, e informações sobre a segunda parte do encontro virtual, previsto para novembro.

Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG08 - Reconstrução de Vilas (Gesteira)] Criação de duas newsletters para envio por WhatsApp sobre os acordos homologados no Reassentamento Familiar de Gesteira, sendo um conteúdo específico para as famílias contempladas pelo acordo e outro para as demais famílias da comunidade. Também foram produzidos um vídeo sobre o assunto e matéria para a Rádio Renova.

[Suporte aos Programas: PG08 - Reconstrução de Vilas (Bento Rodrigues)] Elaboração de cartilha sobre ampliação dos atendimentos remotos e retomada dos atendimentos presenciais no Reassentamento.

[Suporte aos Programas: PG08 - Reconstrução de Vilas (Bento Rodrigues)] Divulgação da 17ª e 18ª edição do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues, com informações atualizadas sobre o andamento das obras.

[Suporte aos Programas: PG07 - Assistência aos Animais] Publicação de post em rede social informando que animais resgatados estão disponíveis para adoção via redes sociais.

[Suporte aos Programas: PG07 - Assistência aos Animais] Produção de pílula de WhatsApp explicando o atendimento remoto aos tutores dos animais nas fazendas, uma vez que as visitas estão suspensas em razão das regras de distanciamento social impostas pela pandemia.

[Suporte aos Programas: PG02 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de pílula de WhatsApp informando que a 12ª Vara prorrogou o prazo para adesão de atingidos de Baixo Guandu e Naque ao fluxo ágil de indenização.

[Suporte aos Programas: PG02 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de newsletter para envio por WhatsApp e programa de rádio com informações sobre fluxo ágil, Portal do Advogado e atendimento do Programa de Indenização Mediada (PIM).

[Suporte aos Programas: PG02 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de newsletter e arquivo de áudio, para distribuição via WhatsApp, apresentando informações sobre o processo indenizatório implementado a partir de decisão da 12ª Vara Federal.

[Suporte aos Programas: PG02 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp e programa da Rádio Renova sobre o prazo final para atingidos de Baixo Guandu e Naque aderirem ao novo sistema indenizatório.

[Suporte aos Programas: PG02 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp e programa da Rádio Renova divulgando que a Fundação Renova superou a marca de 100 pagamentos de indenização para casos de difícil comprovação de danos para atingidos de Baixo Guandu e Naque, a partir do fluxo ágil implementado pela decisão judicial.

[Suporte aos Programas: PG02 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre o novo sistema indenizatório e continuidade dos pagamentos de indenização.

Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG18 - Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Divulgação dos resultados do Projeto Feijão por meio de posts nas redes sociais da Renova, contendo a videorreportagem sobre a ação realizada em Rochedo, Córrego Preto e Leonel, comunidades de Rio Casca.

[Suporte aos Programas: PG16 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras] Elaboração de pílula de WhatsApp divulgando o início do Mapeamento da Cadeia Produtiva da Pesca, que levantará informações com pescadores e pescadoras de todos os territórios atingidos.

[Suporte aos Programas: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves] Produção de pílula de WhatsApp mobilizando atingidos para a Audiência Pública da UHE Risoleta Neves, além de faixa, banner, spot para rádio e spot para carro de som.

[Suporte aos Programas: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves] Organização da audiência pública UHE Risoleta Neves, em 15/10, para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) das obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores de Candonga. A audiência foi transmitida virtualmente e em espaços físicos, em Rio Doce, Belo Horizonte e Santa Cruz do Escalvado. Todo conteúdo gerado foi disponibilizado no site da Fundação Renova.

[Suporte aos Programas: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves] Elaboração de pílulas de WhatsApp para comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, contendo informações sobre os monitoramentos feitos nas obras no entorno da UHE Risoleta Neves.

[Suporte aos Programas: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves] Ainda sobre a Audiência Pública da UHE Risoleta Neves, houve a criação de vídeo sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

[Suporte aos Programas: PG08 - Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Produção de pílula de WhatsApp sobre os trabalhos de manutenção nas áreas de origem (comunidades atingidas).

[Suporte aos Programas: PG08 - Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Elaboração da 7ª e 8ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

[Suporte aos Programas: PG08 - Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)] Divulgação da 17ª e 18ª edição do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com informações atualizadas sobre o andamento das obras.

[Suporte aos Programas: PG08 - Reconstrução de Vilas (Gesteira)] Produção de pílula de WhatsApp orientando as famílias de Gesteira para audiência de homologação do acordo.

Fatos relevantes do mês

[Suporte aos Programas: PG35 - Informação à População] Produção de matéria no programa da Rádio Renova divulgando a Audiência Pública para apresentação das propostas de revisão do Plano Diretor, realizada em 27/10, em Mariana. (EVIDÊNCIA 42)

[Suporte aos Programas: PG35 - Informação à População] Elaboração de pílula de WhatsApp, matéria na Rádio Renova e post em rede social da Fundação Renova divulgando a votação para a escolha da cor do coreto da Praça Gomes Freire, em Mariana. Posteriormente, o resultado da votação foi publicado no site.

[Suporte aos Programas: PG18 - Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Produção de pílula de WhatsApp sobre a prorrogação do prazo para inscrição nos cursos gratuitos da Plataforma Qualifica para jovens que fazem parte do Cadastro de Atingidos da Fundação Renova.

[Suporte aos Programas: PG18 - Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Produção de convite e matéria na Rádio Renova divulgando a palestra on-Line do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores sobre "Produtividade nos negócios para reduzir desperdícios e aumentar resultados", no dia 07/10, para empreendedores de Colatina, Linhares, Regência e Povoação.

[Comunicação com Territórios] Veiculação de oito diferentes programas da Rádio Renova (Momento Renova) para os territórios Mariana, Alto Rio Doce, Calha, Médio, Baixo e Foz, na programação semanal de diversas rádios dessas áreas de abrangência. O Momento Renova contou com um total de 54 programas em outubro, com 162 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

[Comunicação com a Imprensa] Pagamento de indenização para casos de difícil comprovação ultrapassa marca de 100 acordos.

[Comunicação com a Imprensa] Marianenses decidirão a cor do coreto da Praça Gomes Freire em votação on-line.

[Comunicação com a Imprensa] Marianenses decidem cor do coreto da praça Gomes Freire.

[Comunicação com a Imprensa] Fundação Renova realiza manutenção na ensecadeira no rio Pequeno em Linhares.

[Comunicação com a Imprensa] Finanças e custos empresariais é tema de palestra para empreendedores de MG e ES.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social), por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	Caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

julho de 2020  Conclusão do acompanhamento das adoções de animais realizadas na primeira campanha de adoção de 2019

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.078 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 154 adoções, 321 devoluções, 148 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 413 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 286 bovinos, 67 equinos, 38 caninos, 18 suínos, 3 muaras, 1 felino sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1.649 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Adoção de mais 5 animais na campanha virtual. Totalizam-se até o momento 12 animais adotados, e em fase de acompanhamento de 180 dias. 9 Animais continuam disponíveis para adoção responsável

Indicadores

Foi concluída a verificação do indicador de conformidade em bem-estar animal no mês de agosto/2020, sendo o resultado apresentado no Gráfico 1. A aplicação deste indicador se encontrava suspensa em função da pandemia de COVID19, e foi retomada entre os meses de julho e agosto, com uma avaliação total de 133 espécimes – amostragem com representação de 32,7% de todos os animais que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova.

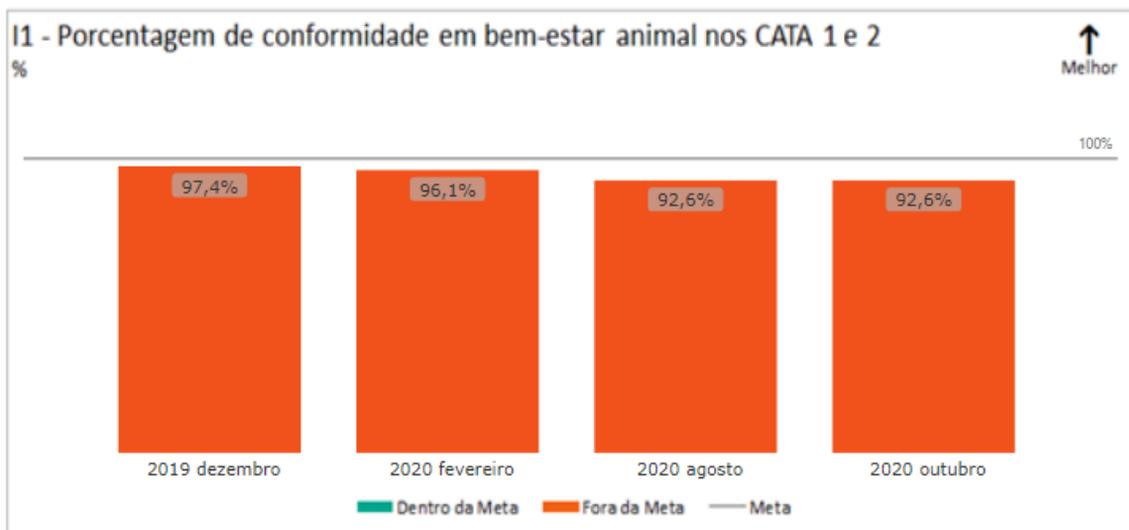


Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2.

Nova aferição do indicador em andamento, com conclusão para novembro de 2020. Reporte de resultados da atividade previsto para início de dezembro de 2020;

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

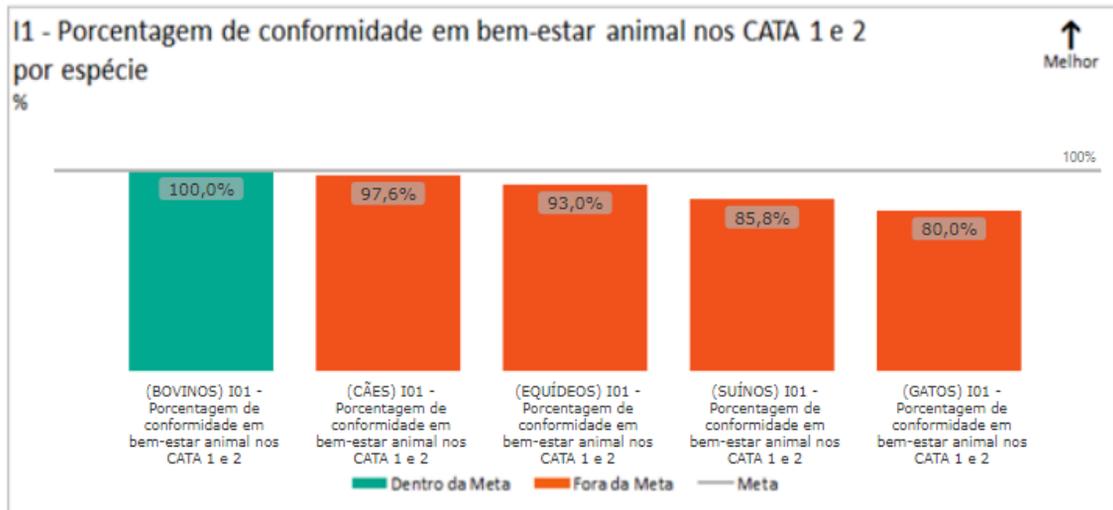


Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente, não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

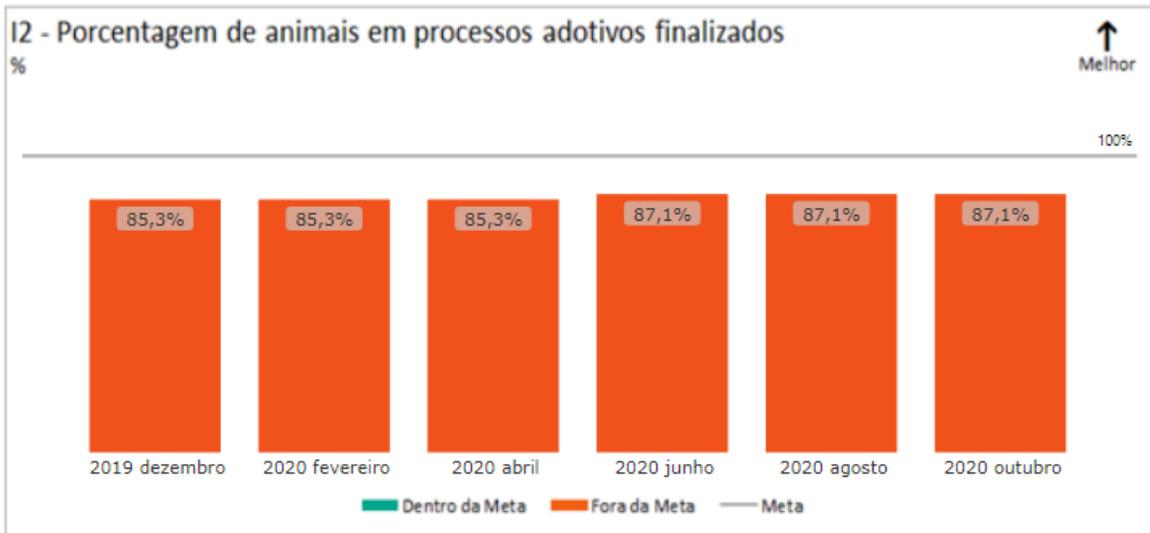


Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados.

Para o período vigente, não houve atualização do indicador que verifica a finalização dos processos adotivos realizados.

Até o dia 15 de outubro, data corte de dados deste relatório, mais 5 (cinco) cães foram adotados durante a campanha virtual. Estas adoções, conforme metodologia da Definição do Programa, somente passarão a compor o indicador após a finalização do acompanhamento de 6 meses do processo.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%	-	-	-
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%	-	-	-

Curva S do programa

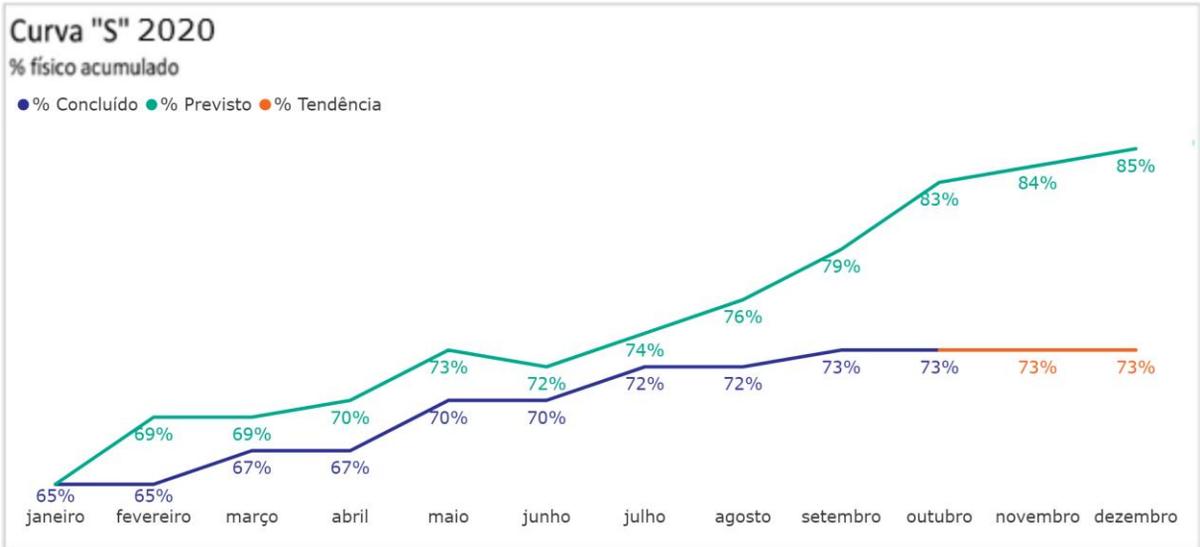


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

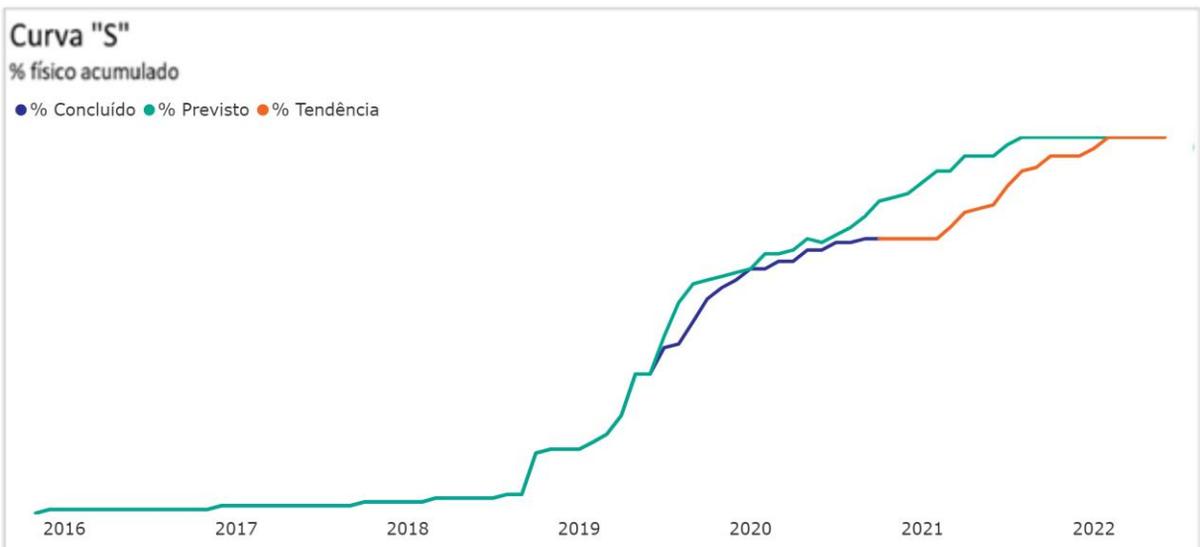


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	Caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2020

- Em repactuação devido impacto das ações de contenção do COVID-19 no cronograma e nas metas.

Grandes Números do Projeto*

- 213 famílias atendidas.
- Construção de 35 casas e 3 bens públicos (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde) iniciadas;
- Projetos conceituais concluídos para 144 casas, 18 lotes e 6 de bens públicos;
- Projetos básicos concluídos para 140 casas, 19 lotes e 4 bens públicos;
- 124 casas com projetos básicos e 19 lotes vagos protocolados na prefeitura;
- Alvarás para 111 casas e 3 de bens públicos emitidos (escola e posto de serviços, unidade básica de saúde) e 19 licenças de autorização de construção de casas emitidas para os lotes sem edificação;
- Projetos de contenção concluídos para 130 casas e 15 lotes;
- Projetos de fundação concluídos para 135 casas.

* Os grandes números em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade das famílias migrarem entre as modalidades de atendimento ou estarem com atendimento interrompido – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação;

Fatos Relevantes do mês

ETE - Em andamento a sub-base, base, imprimação e drenagem do acesso e vias do entorno; corte, aterro e sarjeta das lagoas; e construção do prédio.

Área 1 - Drenagem da S. Coração de Jesus (E. 18 a 20); drenagem da viela 18; esgoto da viela 13; execução de contenções das quadras E5, E6, I2, J, K e M.

Área 2 - Execução de sub-base e base do acesso ao reservatório; contenção viela 25; terraplenagem da viela 23; drenagem da viela 26; solo grampeado e drenagem da viela 22; execução do abrigo da ETA; execução de contenções nas quadras C, D, E, F, G.

Área 3 - Execução de rede enterrada do poço 4; aterro e escavação do acesso ao poço 5; execução de contenções na quadra O1.

Instalação, equipagem, lançamento de cabos e montagem de trafo de postes de iluminação urbana.

Conclusão de duas casas.

Em andamento as atividades de construção dos Bens Públicos Escola, Posto de Serviços e Posto de Saúde.

Conclusão de 1 projeto conceitual e 2 projetos básicos.

Curva S do projeto

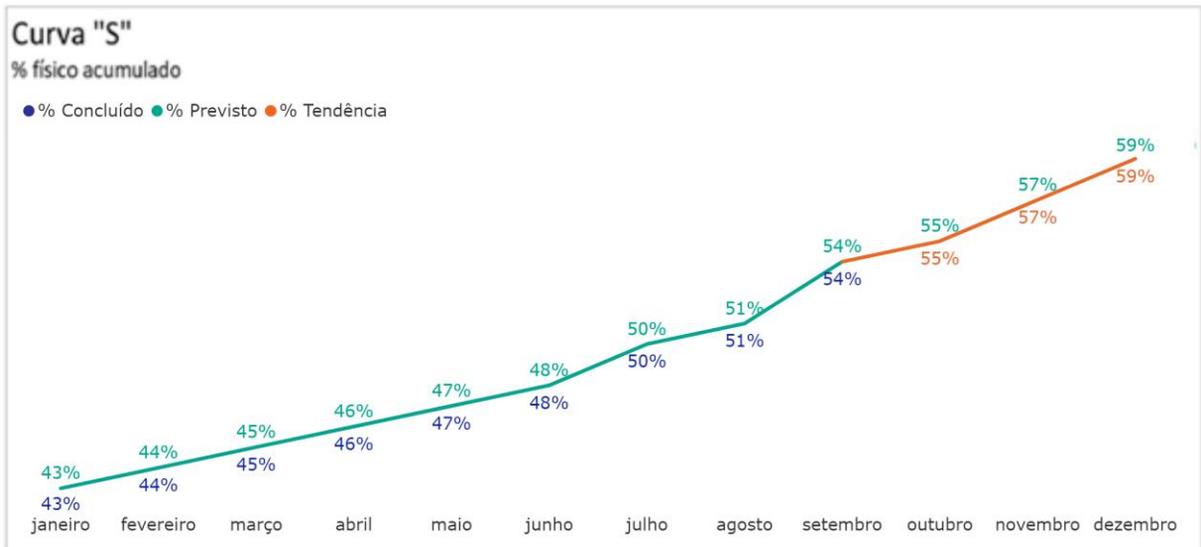


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Bento Rodrigues

Para os anos seguintes a 2020, estão sendo elaborados estudos com o objetivo de mitigar os impactos do COVID-19 no cronograma.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2020

- Em repactuação devido impacto das ações de contenção do COVID-19 no cronograma e nas metas.

Grandes Números do Projeto*

- 99 famílias atendidas.
- Construção de 8 casas iniciadas;
- Projetos conceituais concluídos para 62 casas, 3 lotes e 5 de bens públicos;
- Projetos básicos concluídos para 60 casas, 3 lotes e 4 bens públicos;
- 7 casas com projetos básicos protocolados na prefeitura;
- Licenças simplificadas emitidas para 24 edificações;
- Alvarás para 6 casas e 3 de bens públicos emitidos (2 escolas e 1 posto de saúde e serviços)
- Projetos de fundação concluídos para 46 casas e 5 bens públicos.

* Os grandes números em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade das famílias migrarem entre as modalidades de atendimento ou estarem com atendimento interrompido – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação;

Fatos Relevantes do mês

Conclusão da montagem das fundações da escola.

Retomada das atividades de execução do Solo Grampeado no Trecho A.

Conclusão do esgoto e drenagem profunda na Rua Monsenhor Horta.

Conclusão do esgoto e drenagem profunda na Praça Santo Antônio.

Assinatura de 2 Termos de Adesão ao Reassentamento.

Conclusão de 1 projeto conceitual.

Curva S do projeto

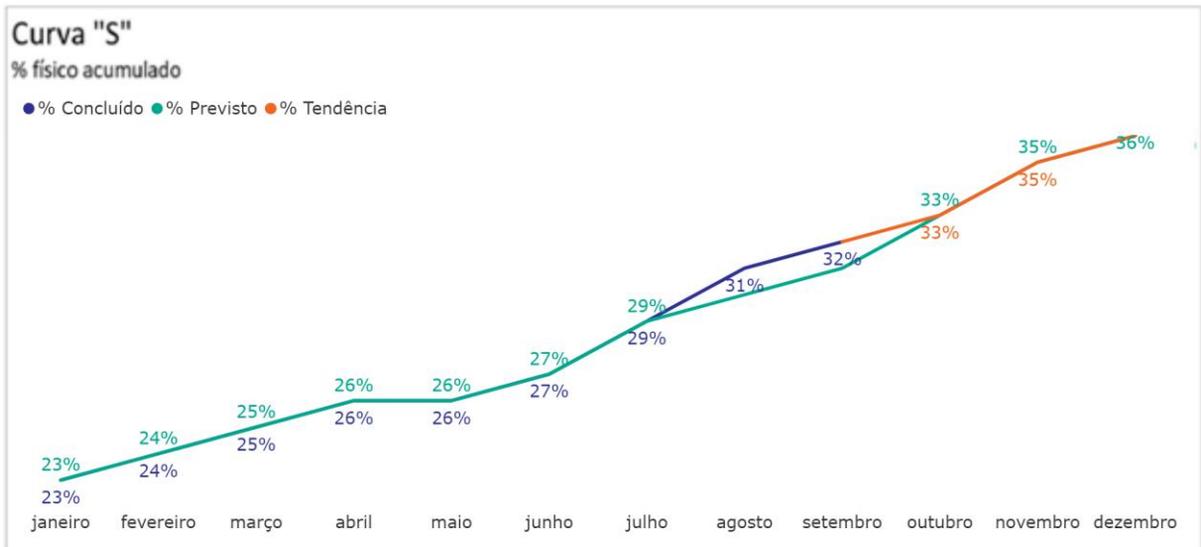


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Paracatu de Baixo

Para os anos seguintes a 2020, estão sendo elaborados estudos com o objetivo de mitigar os impactos do COVID-19 no cronograma.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2020



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números do Projeto*

- 26 famílias atendidas.

* Os grandes números em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade das famílias migrarem entre as modalidades de atendimento ou estarem com atendimento interrompido – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação;

Fatos Relevantes do mês

O processo referente ao Reassentamento de Gesteira foi judicializado. Aguardando decisão judicial para seguir com os atendimentos.

Curva S do projeto


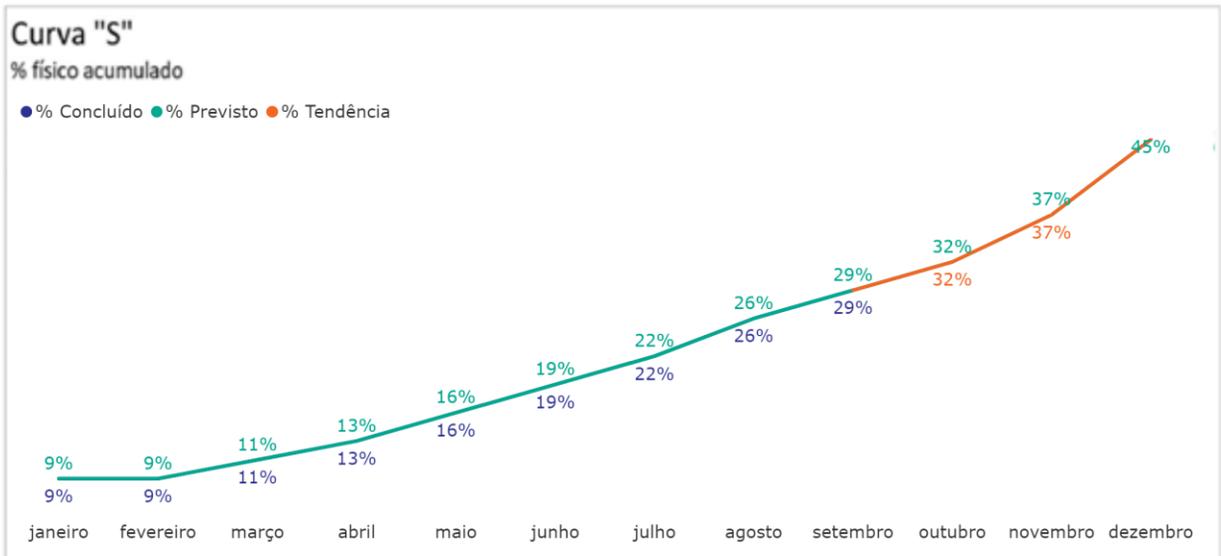


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento de Gesteira

Para os anos seguintes a 2020, estão sendo elaborados estudos com o objetivo de mitigar os impactos do COVID-19 no cronograma.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2020

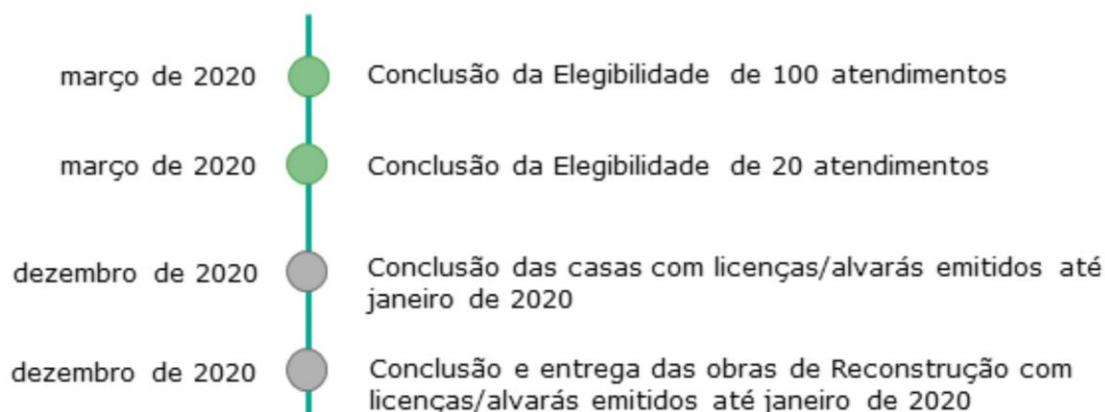

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes Números do Projeto*

- 149 famílias atendidas, sendo 135 do Reassentamento Familiar e 14 das Reconstruções;
- 51 imóveis foram adquiridos para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia, sendo 19 imóveis para reformar, 28 imóveis para construir e 4 lotes vagos;
- 39 projetos conceituais finalizados, 22 para construção e 13 para reforma e 4 lotes;
- Para construção, 12 projetos básicos e 12 licenças simplificadas/dispensas protocolados na Prefeitura. Destes, 2 dispensas de licença foram emitidas.
- Para reformas, 7 licenças simplificadas/dispensas protocolados na Prefeitura. Destas, 6 licenças simplificadas foram emitidas.
- Comunidades rurais: 8 casas da modalidade de reconstrução entregues do total de 15.

* Os grandes números em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade das famílias migrarem entre as modalidades de atendimento ou estarem com atendimento interrompido – de reassentamento coletivo para reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de reparação;

Fatos Relevantes do mês

Conclusão de 2 projetos conceituais e 2 projetos detalhados.

Protocolado 1 projeto básico na Prefeitura.

Aquisição de 2 imóveis para atendimento, sendo 1 para nova construção de casa e 1 para reforma.

Indicadores

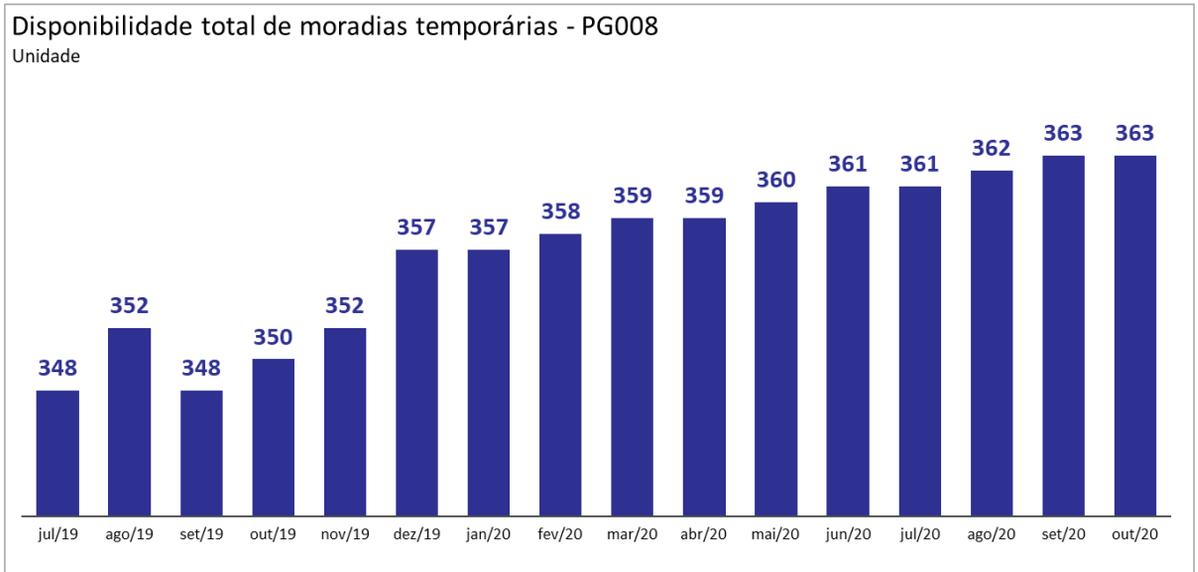


Gráfico 4. Disponibilização de moradias temporárias PG008. Gráfico Mensal.

Curva S do projeto

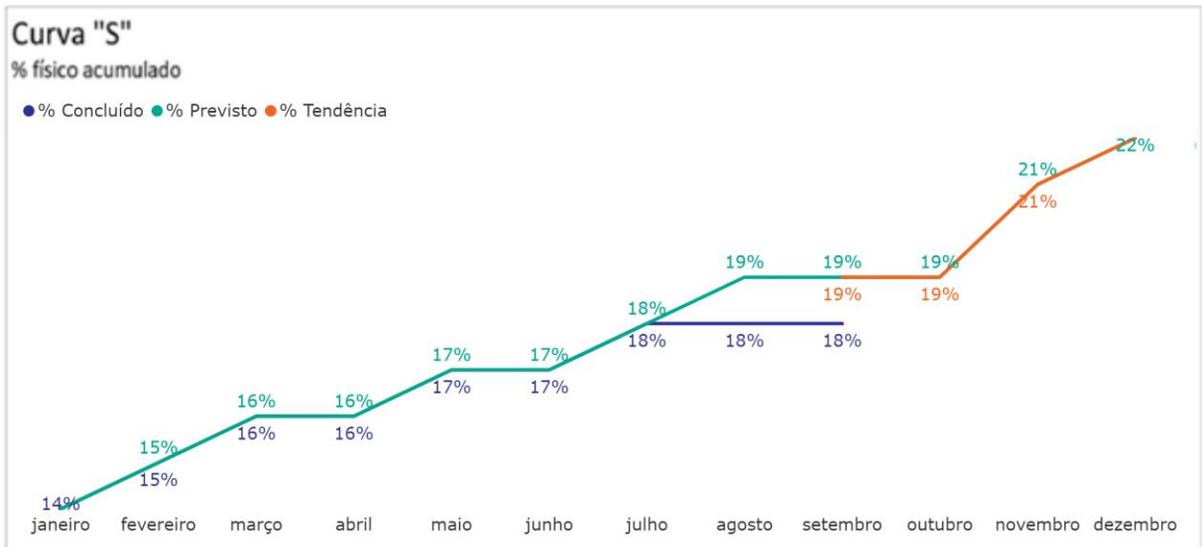


Gráfico 5. Curva "S" de avanço físico do Reassentamento Familiar

Para os anos seguintes a 2020, estão sendo elaborados estudos com o objetivo de mitigar os impactos do COVID-19 no cronograma.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	150	§3º	Reprogramado
Cláusula	79	Caput	Judicializado
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído Internamente
Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020



fevereiro de 2020	●	Conclusão dos reforços das bacias
fevereiro de 2020	●	Conclusão do descomissionamento do setor 8
fevereiro de 2020	●	Protocolo do Processo de Licenciamento Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
março de 2020	●	Conclusão das obras do período chuvoso 2019/2020
outubro de 2020	●	Limpeza dos dutos de sucção na Máquina 1
dezembro de 2020	●	Emissão da Licença Operação Corretiva (LOC) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grande número do programa

- 959 **mil m³ de material foi bombeado** do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Fatos relevantes do mês

Assinado o termo de cooperação entre a Fundação Renova e a Samarco.

Obras do Plano de Chuvas em andamento conforme cronograma.

Obras para reabilitação da UG1 em andamento, com avanço de 52%.

Programa de Monitoramento de ruídos apresenta valores dentro do valor estabelecido pela lei estadual 10.100/90 para áreas de residência rural.

Protocolada as ICs do Licenciamento de Candonga junto a SUPPRI

Realizada a Audiência Pública virtual para o processo de Licenciamento de Candonga.

Indicadores

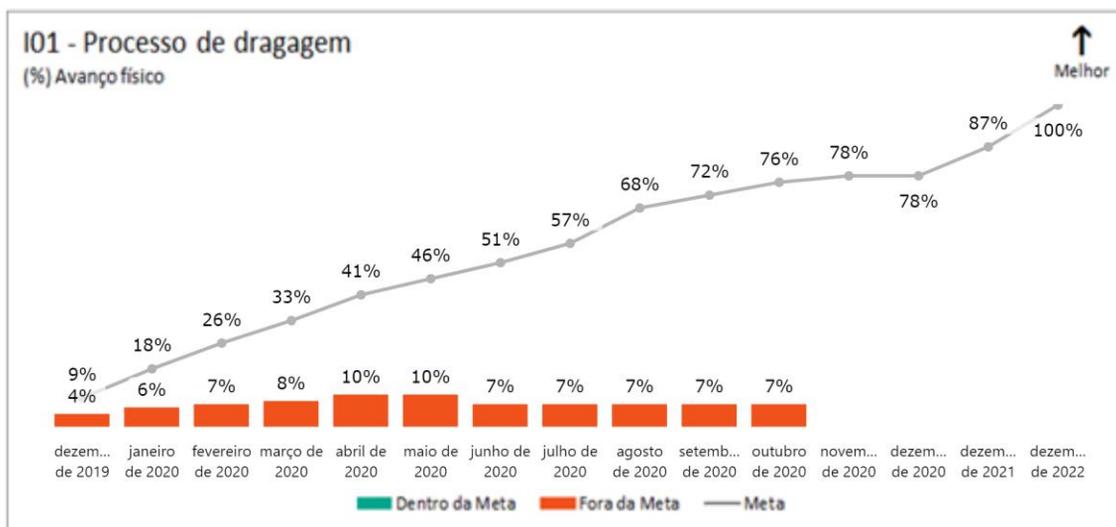


Gráfico 1. (%) Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado

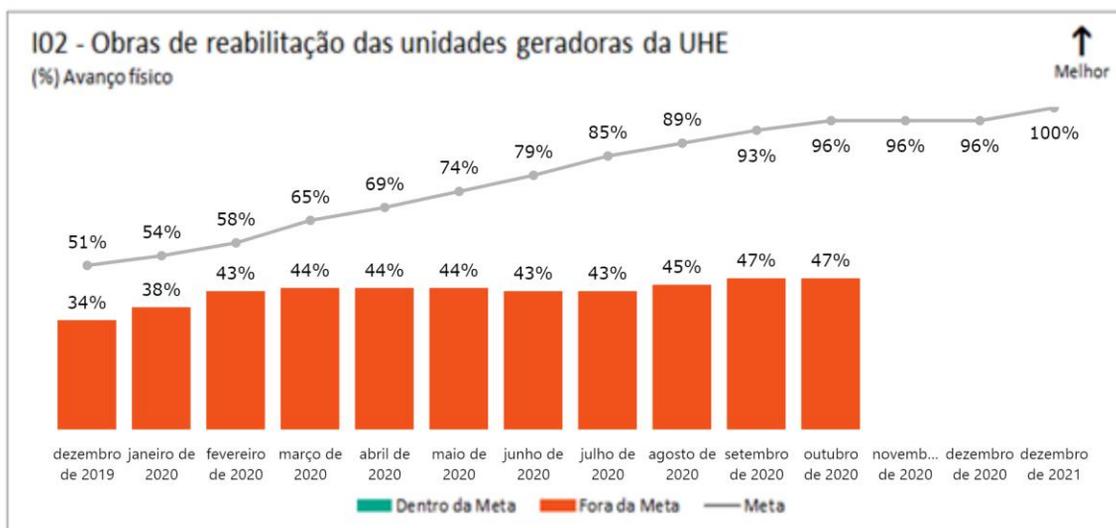


Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado

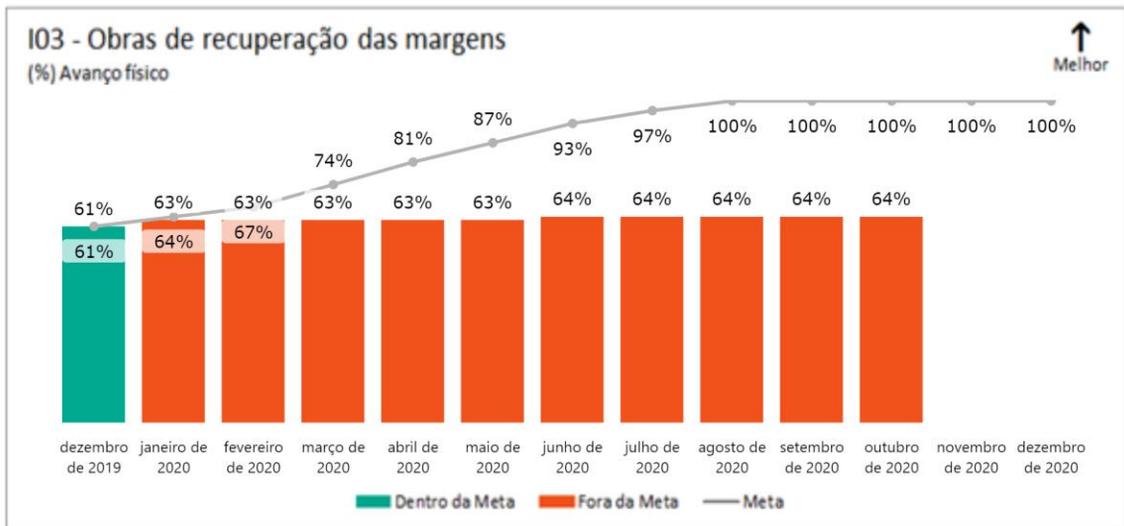


Gráfico 3. (%) Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado

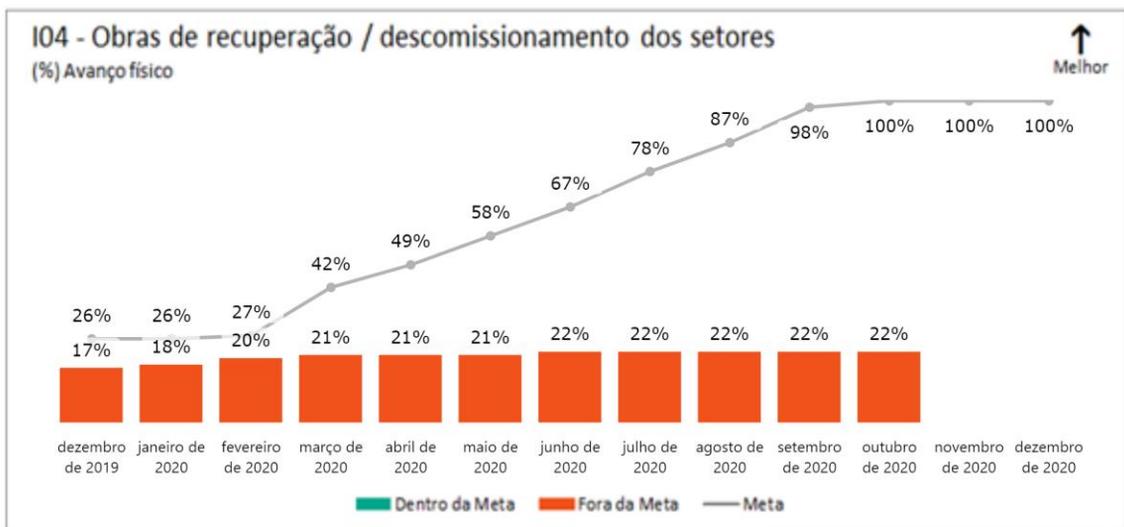


Gráfico 4. (%) Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado

Curva S do programa

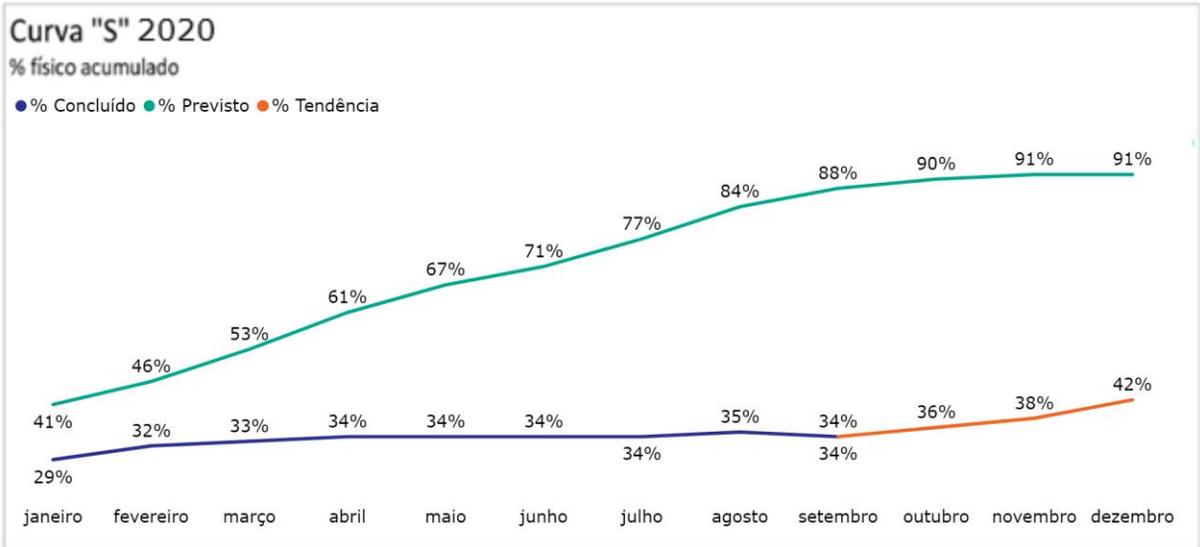


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

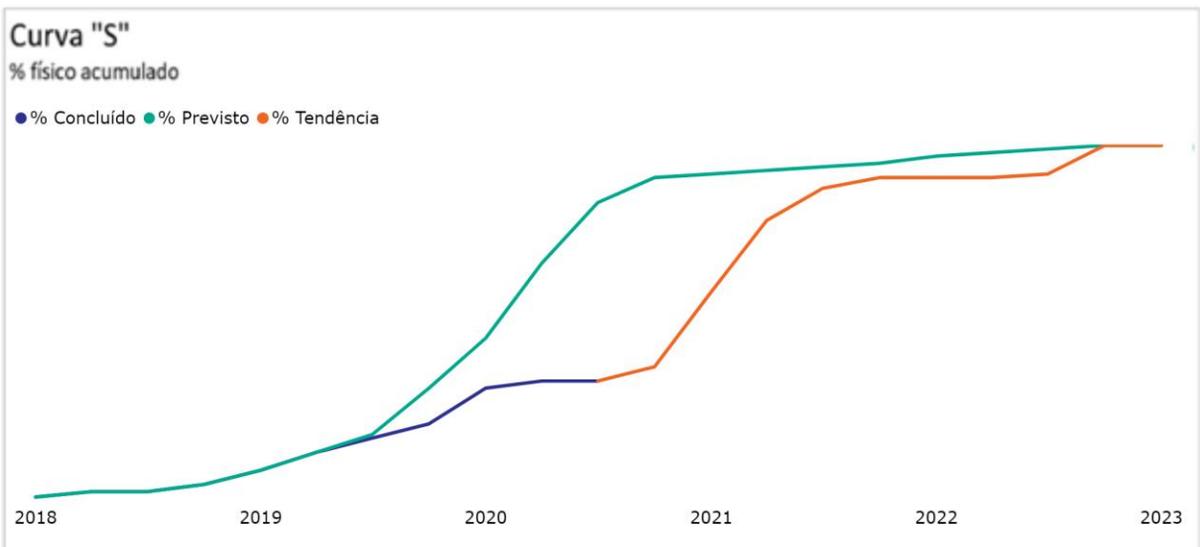


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

| Cláusula

82

Caput

Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Concluído Internamente
Deliberação	217	3	Concluído Internamente
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2020

No relatório do último mês foi informada a previsão de entrega do pacote Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) no mês de outubro de 2020. Porém, essa entrega foi postergada para 2021 e com isso, o Programa não apresenta entregas previstas para 2020.

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1560 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 875 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1440 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 103 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 15 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 100 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 3 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro.

Indicadores

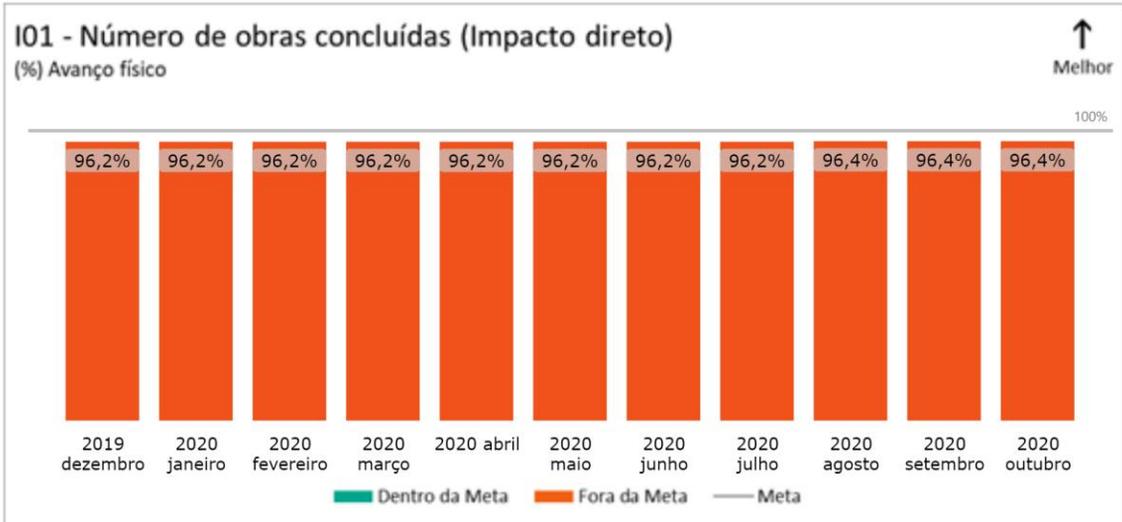


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

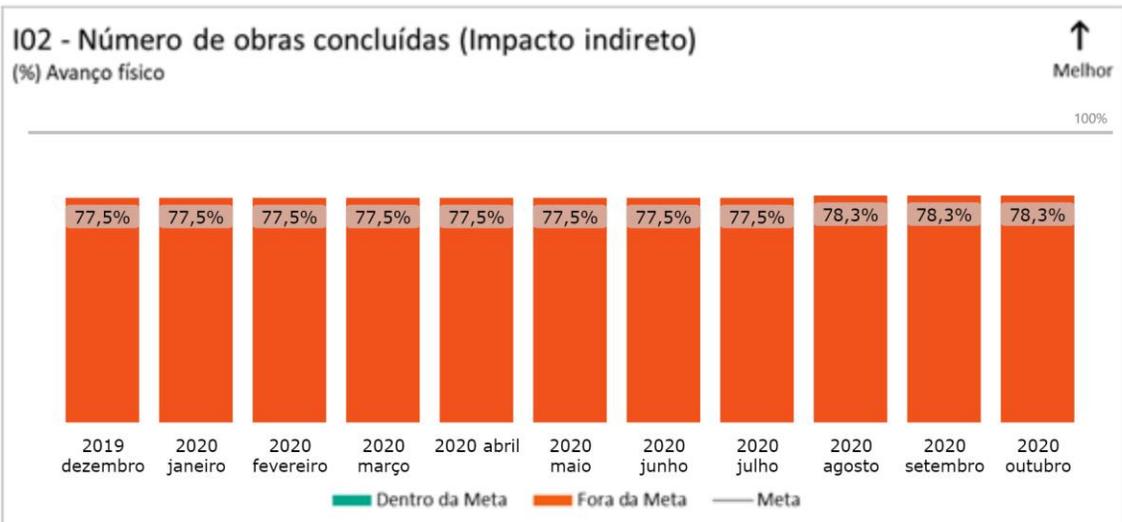


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

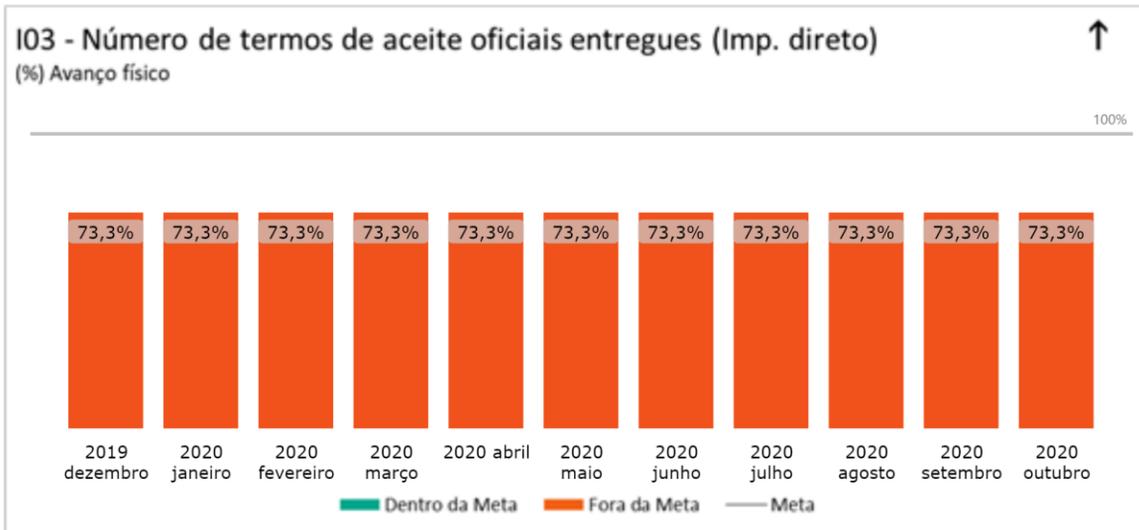


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

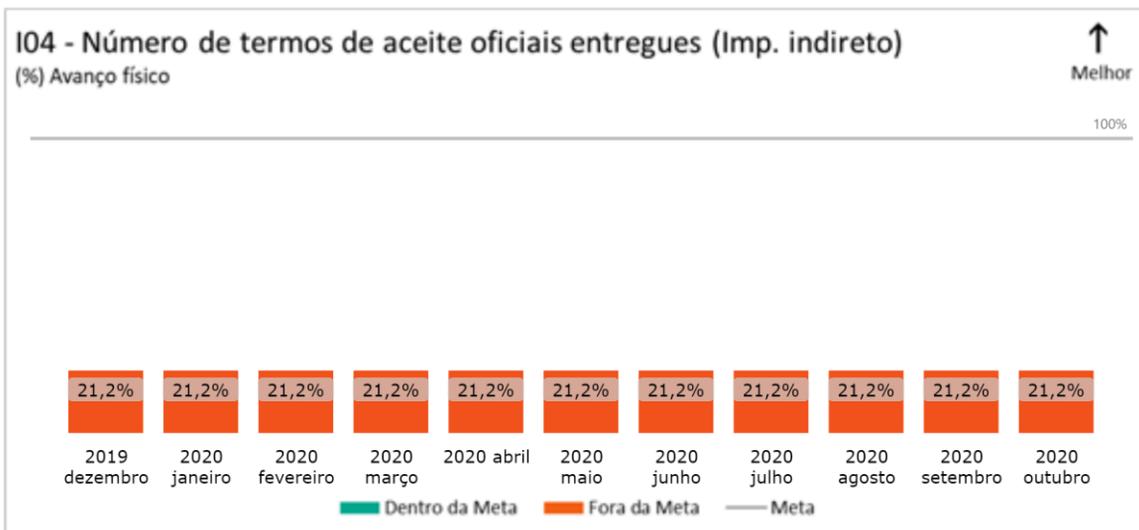


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

Curva S do programa

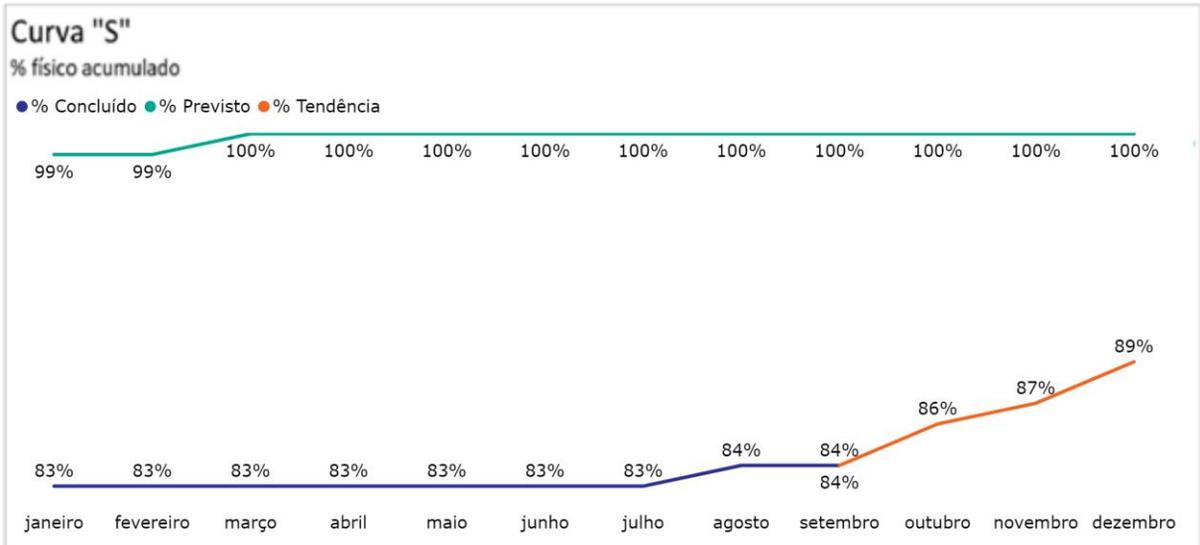


Gráfico 5. Curva "S" de avanço físico

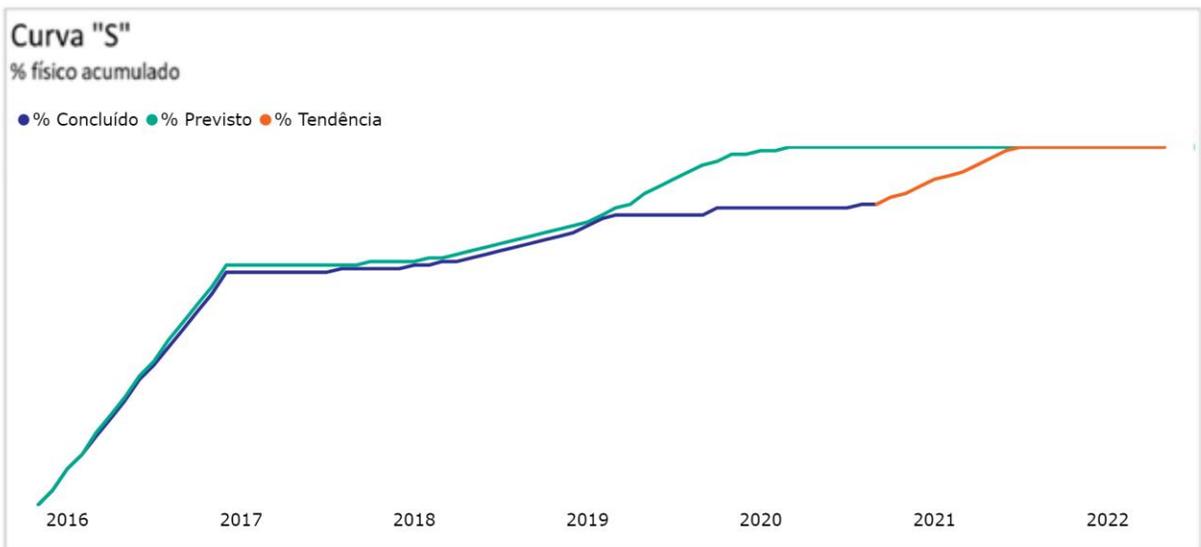


Gráfico 6. Curva "S" de avanço físico

PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	Caput	Em Andamento
Cláusula	91	Caput	Em Andamento
Cláusula	92	Caput	Em Andamento
Cláusula	93	Caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

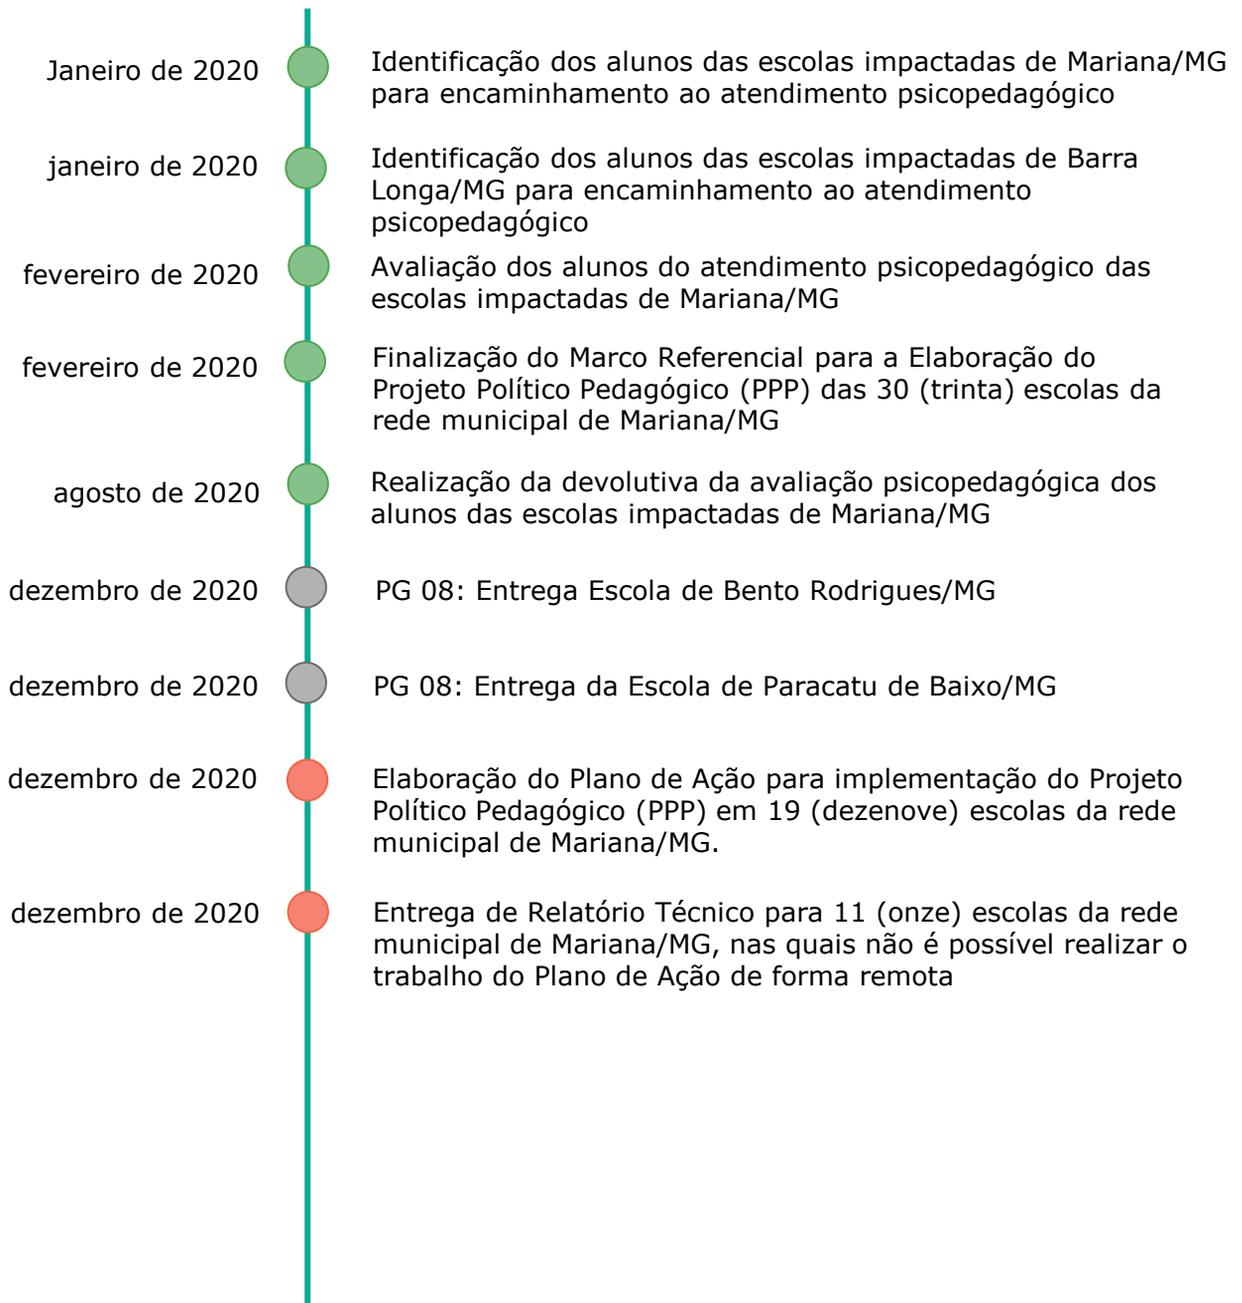

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos Relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I1	Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias	Demandas Escolares Atendidas / Total de Demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo	%	-	-	-
I2	Cumprimento das normas de infraestrutura escolar para as escolas temporárias	Normas cumpridas / Total de normas exigidas	%	-	-	-
I3	Disponibilidade de vagas para transportar alunos	Número de vagas disponibilizadas / Número de alunos que solicitaram transporte	%	-	-	-
I4	Cumprimento das atividades de convivência	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	%	-	-	-
I5	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Número de escolas que receberam Apoio Pedagógico / Número de escolas que demandaram Apoio Pedagógico	%	-	-	-
I6	Percentual de implantação do Apoio Psicopedagógico	Número de avaliações psicopedagógicas com devolutiva / Número de encaminhamentos para o apoio psicopedagógico	%	-	-	-

Curva S do programa

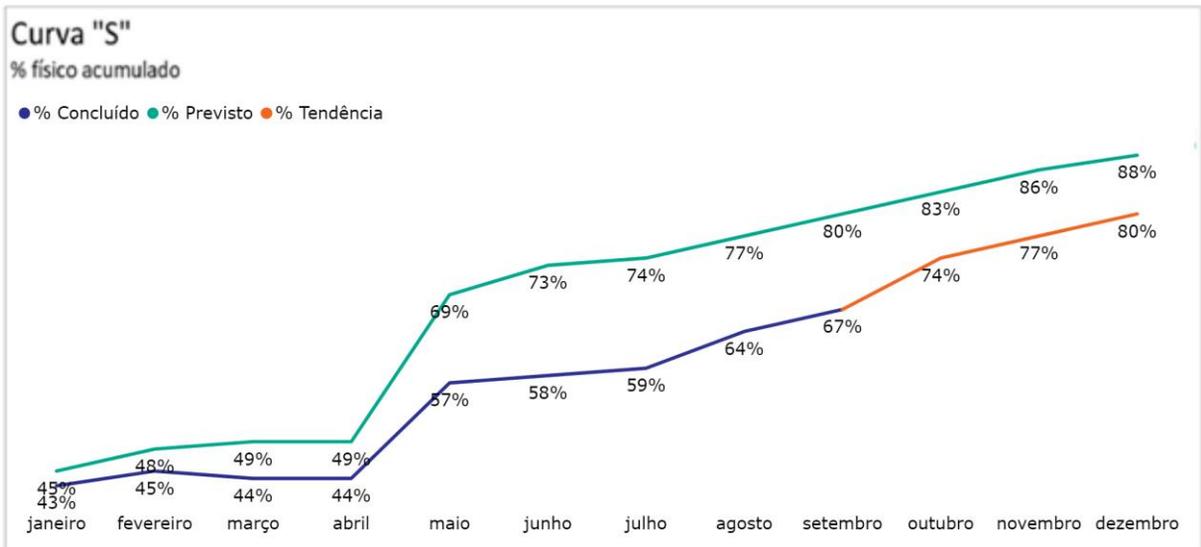


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico

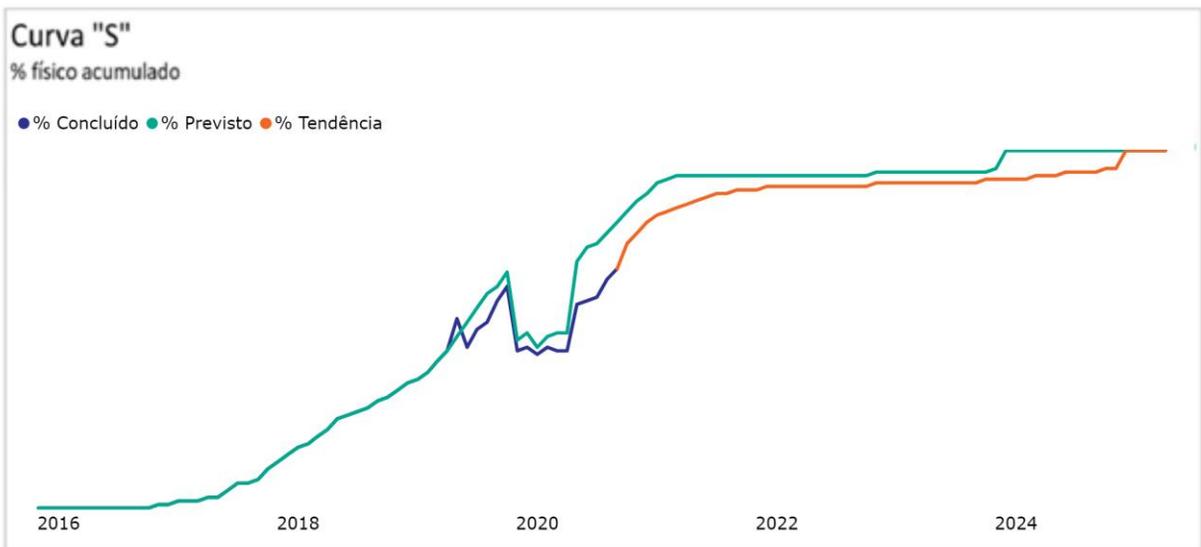


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é implantar medidas socioeducativas para preservação, manutenção e fortalecimento do patrimônio cultural, histórico e artístico na região impactada, e em parceria com as comunidades e poder público, conforme determinações das Cláusulas 95 a 100 do TTAC.

Cláusula	95	Caput	Em Andamento
Cláusula	99	Caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

janeiro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel tombado no município de Barra Longa - Estrutura 6
agosto de 2020		Conclusão do diagnóstico de bens arqueológicos nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova em Minas Gerais
outubro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 7
outubro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel tombado no município de Barra Longa - Estrutura 3
outubro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 12
novembro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 8
novembro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 9
novembro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 4
dezembro de 2020		PG 10: Início da execução da obra de restauro em imóvel inventariado no município de Barra Longa - Estrutura 10
dezembro de 2020		Conclusão do calendário 2020 de apoio às manifestações culturais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro.

Indicadores

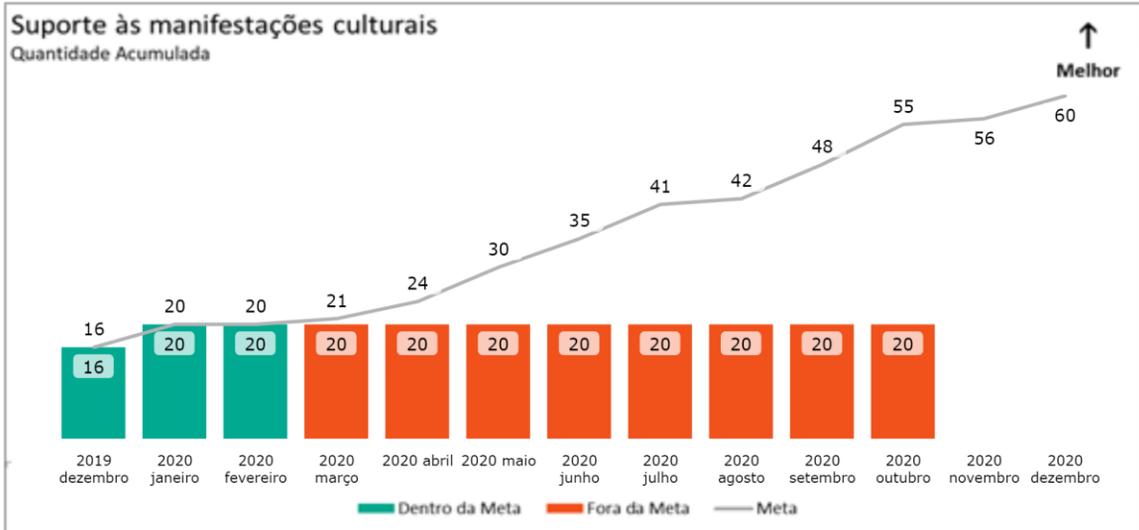


Gráfico 1. Suporte às manifestações culturais. Gráfico acumulado

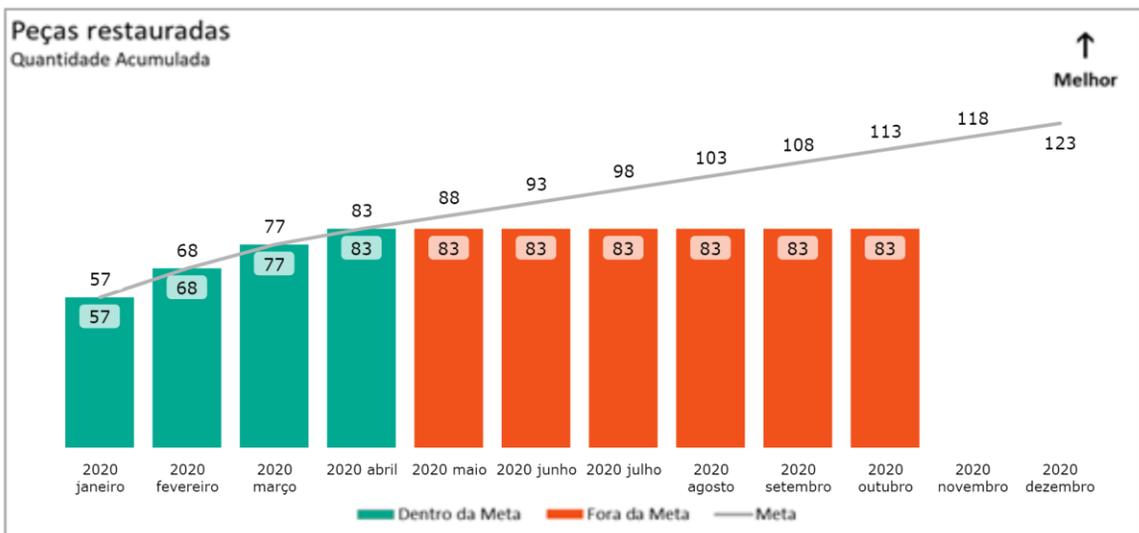


Gráfico 2. Projetos restaurados. Gráfico acumulado

Curva S do programa

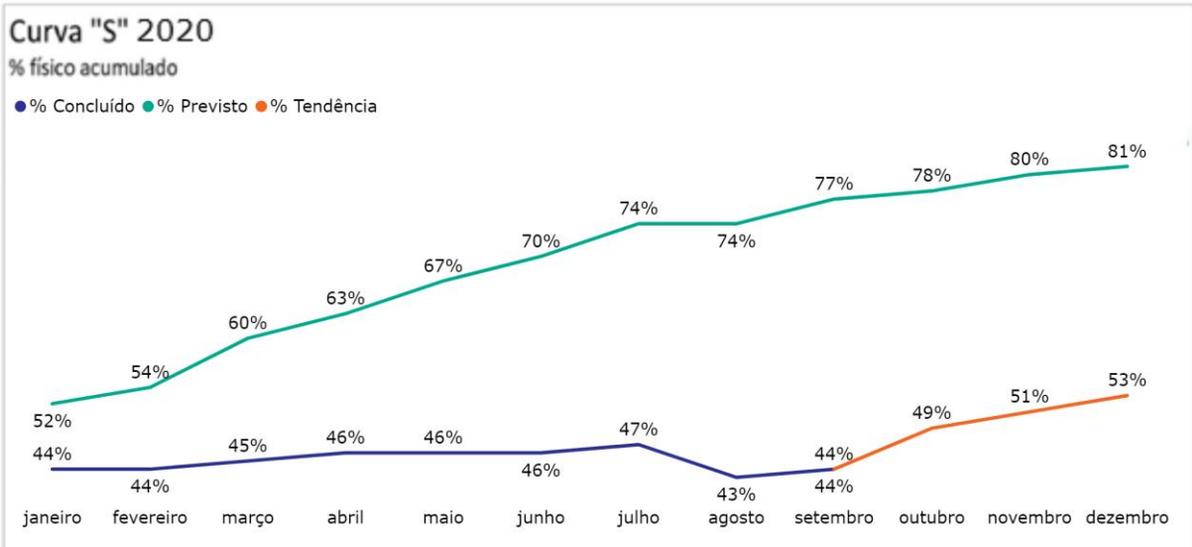


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

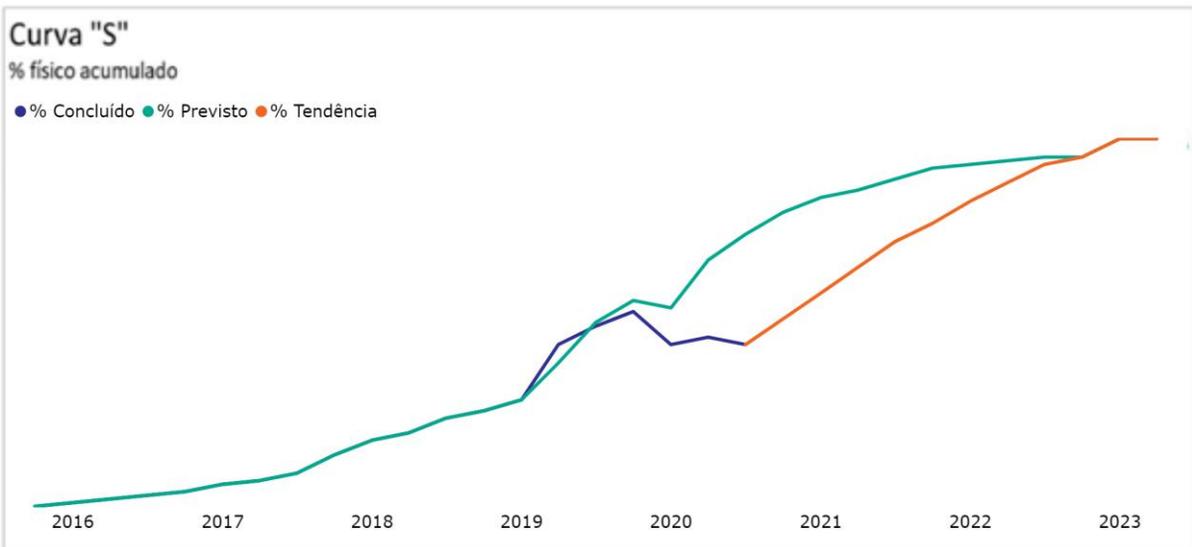


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

Curva S sujeita a alterações devido às revisões no escopo do programa e consequente adequação do cronograma.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, a partir de um diagnóstico de impacto do rompimento na área de abrangência socioeconômica, fomentar ações conjuntas para o fortalecimento das políticas públicas de gestão da cultura, turismo, lazer e esporte, através de um apoio técnico e material das estruturas necessárias para um melhor desenvolvimento dessas atividades nas regiões impactadas, de acordo com o grau de severidade sofrido por cada localidade, conforme determinação das Cláusulas 101 a 105 do TTAC.

Cláusula	101	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	a	Em Andamento
Cláusula	103	g	Em Andamento
Cláusula	103	b	Planejado
Cláusula	103	c	Planejado
Cláusula	103	d	Planejado
Cláusula	103	e	Planejado
Cláusula	103	f	Planejado
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	321	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

janeiro de 2020		Publicação do Edital Doce para o estado do Espírito Santo
janeiro de 2020		Divulgação das propostas aprovadas na análise técnica do Edital Doce MG
fevereiro de 2020		Conclusão do apoio ao calendário de eventos turísticos em Mariana 2019
março de 2020		Conclusão do apoio ao calendário de eventos turísticos na Foz do Rio Doce 2019
julho de 2020		Execução das ações de divulgação no site da Foz do Rio Doce
novembro de 2020		Conclusão da infraestrutura da Praça Gomes Freire em Mariana
novembro de 2020		Formalização de contratos para apoio aos projetos aprovados no Edital Doce nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo
dezembro de 2020		Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

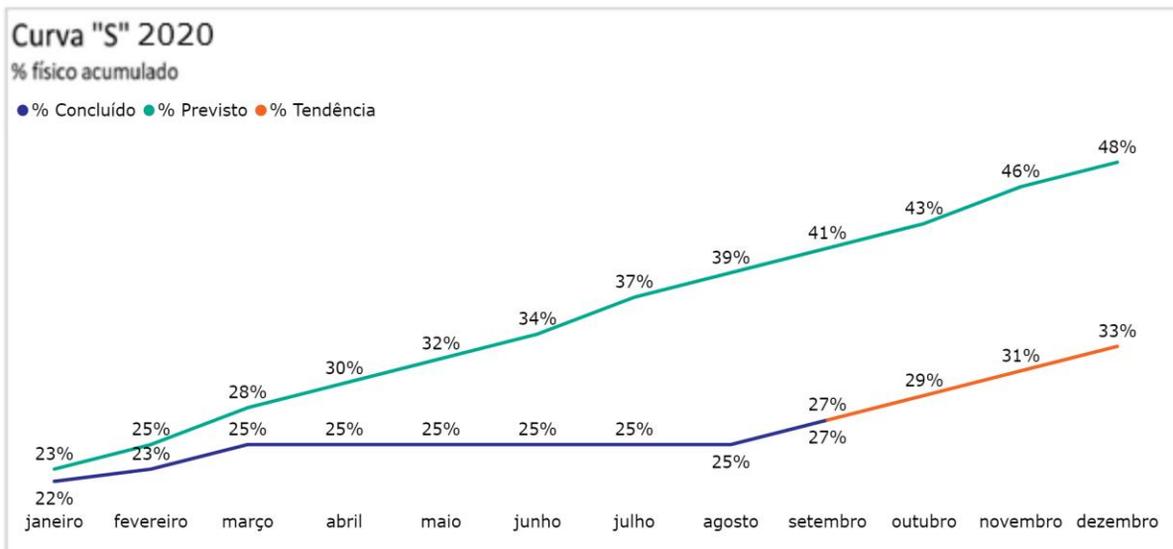


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

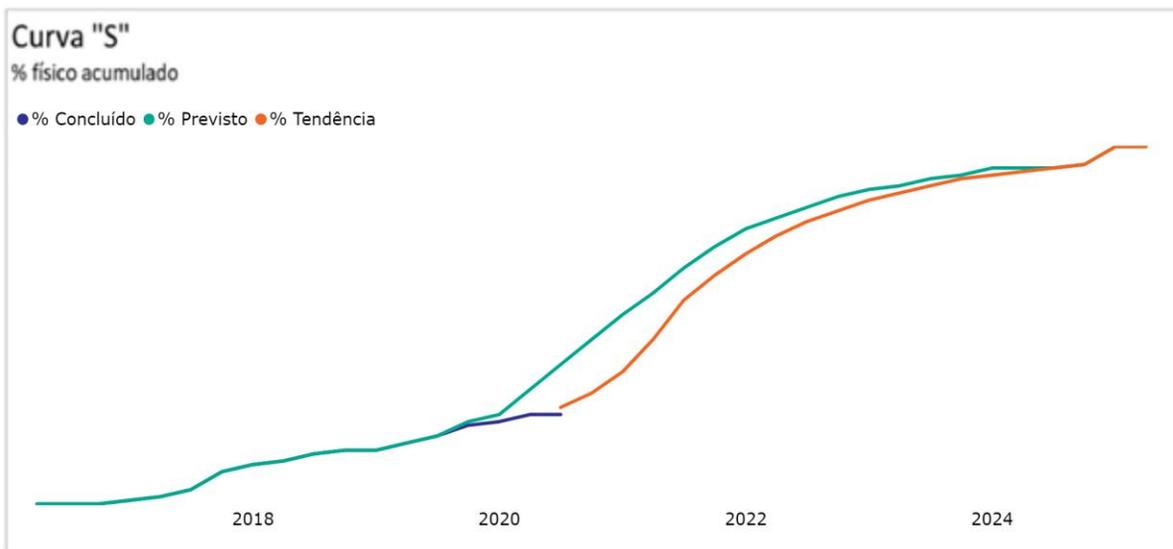


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Identificar alterações no perfil de saúde da população atingida, em decorrência do rompimento. Com base em evidências de correlação, desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados.

Cláusula	106	Caput	Planejado
Cláusula	107	Caput	Em Andamento
Cláusula	109	Caput (a-f)	Em Andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializado
Cláusula	112	§único	Judicializado

Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Reprogramado
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- maio de 2020  Entrega da reforma do Centro de atenção psicossocial infantojuvenil (CAPSIJ) para o município de Mariana
- junho de 2020  Conclusão do 2º aditivo contratual para atendimento à população de Barra Longa pela equipe suplementar de saúde contratada
- junho de 2020  Conclusão do 2º aditivo contratual para atendimento à população de Mariana pela equipe suplementar de saúde contratada
- setembro de 2020  Assinatura do Acordo Judicial pela Fundação Renova e município de Barra Longa para execução do Plano de Reparação e Saúde
- dezembro de 2020  Publicação e divulgação do edital dos estudos epidemiológicos e toxicológicos - FAPES/FAPEMIG

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (28 **profissionais**) e Barra Longa/MG (20 **profissionais**).

Fatos relevantes do mês

Aditivo de prazo do Convênio com a FAPES para lançamento do Edital dos estudos. O processo sofreu atraso, pois a FAPES pediu suspensão temporária das atividades devido à pandemia do Covid-19. As atividades já foram retomadas. Previsão de publicação do edital para 30 de novembro de 2020

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

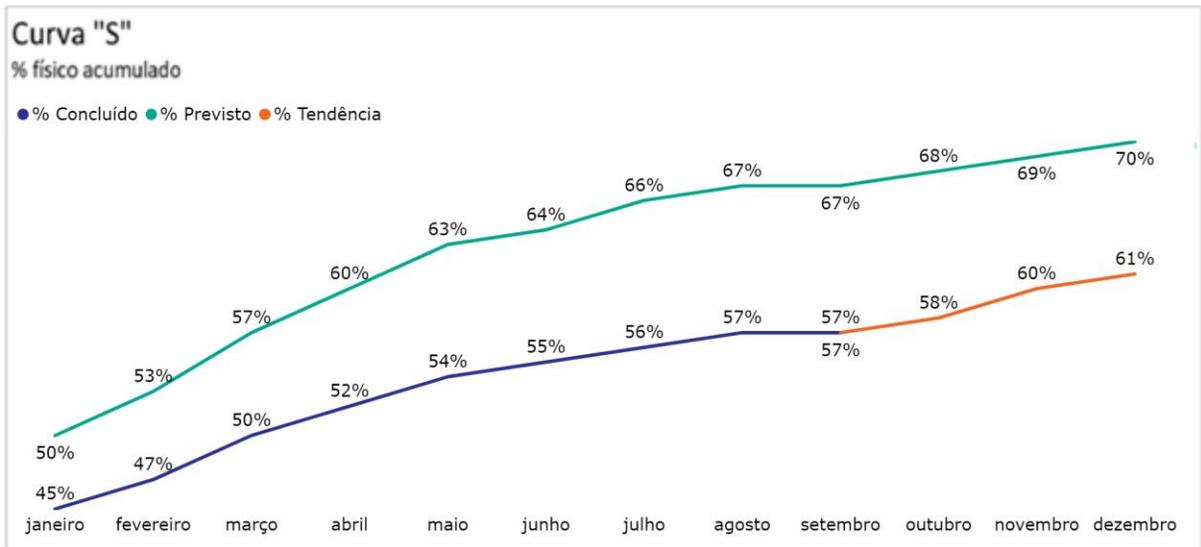


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico

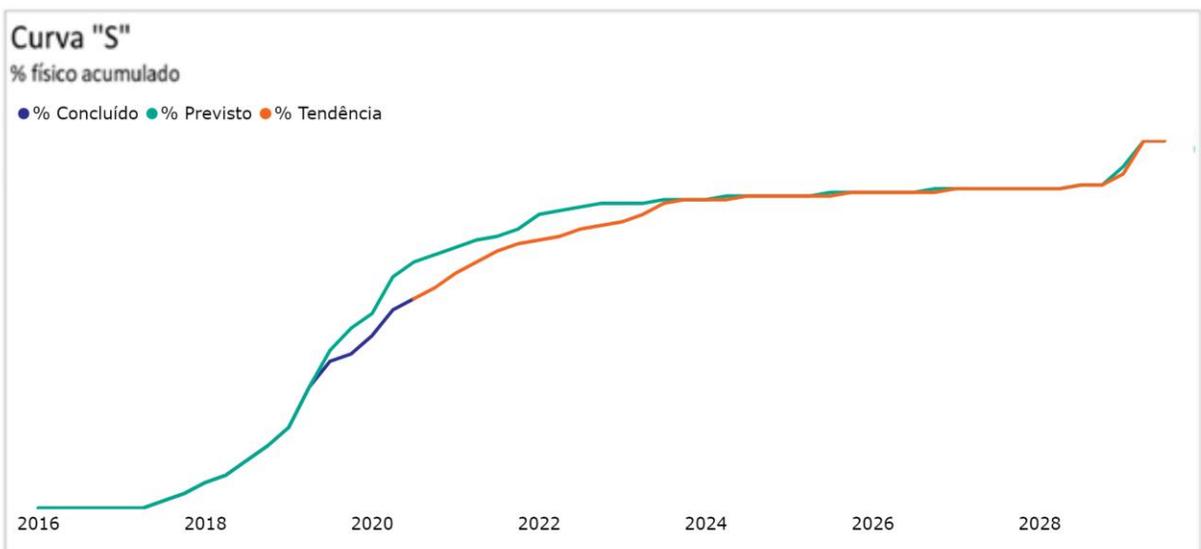


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar a inovação e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação.

Cláusula	113	Caput	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- outubro de 2020 ● Finalização da Execução do projeto "Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos" para o uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio
- outubro de 2020 ● Estabelecimento do Convênio com Instituições selecionadas (chamada FAPEMIG/FAPES/RENOVA) referente à geração de conhecimento nos campos socioeconômico e socioambiental
- outubro de 2020 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica (FAPES)
- dezembro de 2020 ● Estabelecimento do Convênio com FAPES para Chamada FAPEMIG/FAPES/RENOVA referente à geração de conhecimento nos campos socioeconômico e socioambiental

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Celebração de 12 convênios de pesquisa com instituições mineiras, selecionadas por meio da Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA).

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

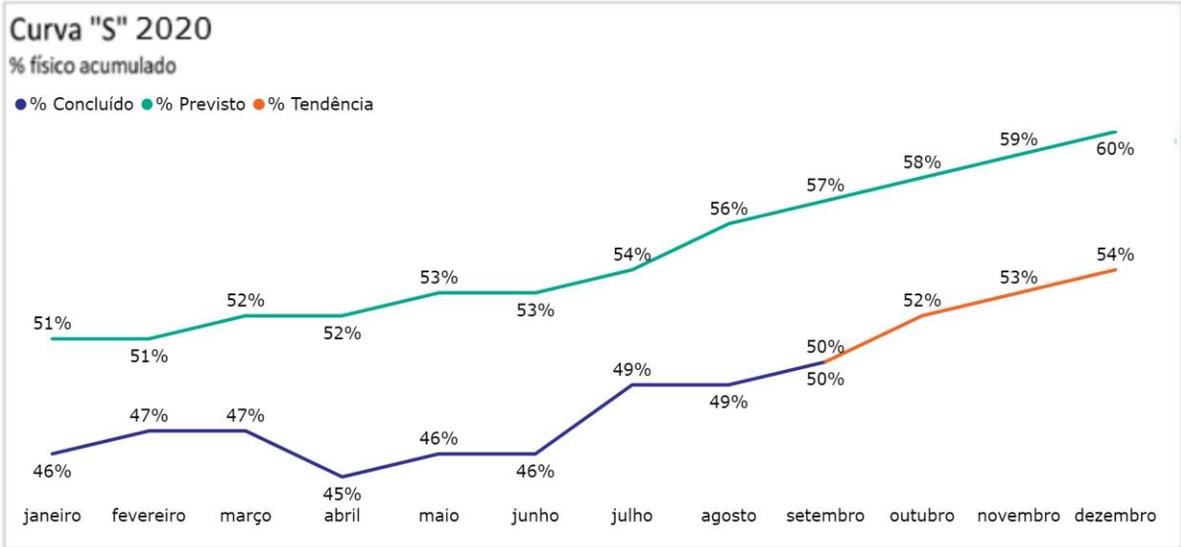


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

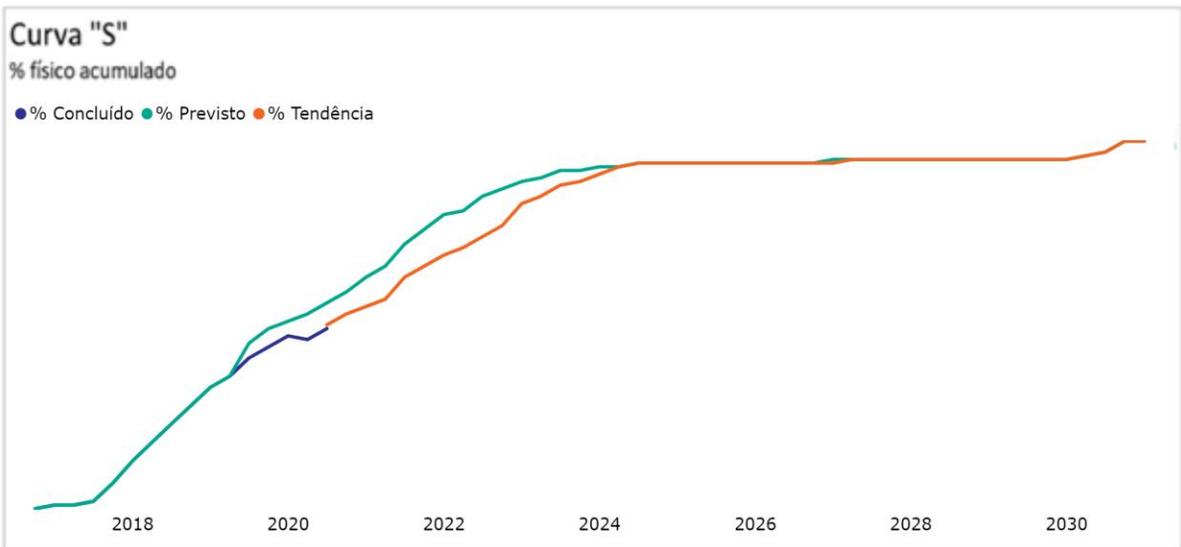


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido de acordo com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: um para superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e aquicultura e outro para reestruturação produtiva, alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	Caput	Em Andamento
Cláusula	117	Caput	Em Andamento
Cláusula	118	Caput	Em Andamento
Cláusula	119	único	Em Andamento
Cláusula	120	Caput	Em Andamento
Cláusula	123	Caput	Em Andamento

Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- abril de 2020  Conclusão da contratação da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro
- outubro de 2020  Conclusão da análise dos relatórios com dados preliminares referente à Caracterização Socioeconômica da pesca e aquicultura e Monitoramento Pesqueiro
- outubro de 2020  Início da coleta de dados em campo da Caracterização socioeconômica da pesca e aquicultura da atividade pesqueira marinha e continental
- dezembro de 2020  Implantação dos sistemas de aquaponia do projeto Cultivando para Pescar
- dezembro de 2020  Realização das oficinas devolutivas de resultados sobre a recuperação ambiental do Rio Doce

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Formalização e constituição da Associação de Pescadores do Rio Doce – ASPERDOCE

Conclusão da análise do relatório de dados preliminares da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

Indicadores*

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
101	Índice de atendimento aos pescadores (as) / aquicultores (as) em atividades alternativas	<p>Quantidade de pescadores (as) aquicultores (as) atendidos (as) pela assistência técnica /</p> $\frac{\Sigma \text{Quantidade de pescadores profissionais (SGS) + Pescadores de fato a serem validados pelo sistema CIF} + \text{Aquicultores} - \text{N}^\circ \text{ de registros de "não interesse" ou "não aplicável"}}{\text{Quantidade de pescadores (as) que atuam ou retornaram à pesca extrativista /}}$	%	-	-	-
102	Índice de pescadores que atuam ou retornaram à pesca extrativista	<p>Quantidade de pescadores (as) que atuam ou retornaram à pesca extrativista /</p> $\frac{\Sigma \text{Quantidade de pescadores profissionais (SGS) + Pescadores de fato a serem validados pelo sistema CIF} - \text{N}^\circ \text{ de registros de "não interesse"}}{\text{Quantidade de aquicultores (as) que atuam ou retornaram à atividade produtiva /}}$	%	-	-	-
103	Índice de aquicultores(as) que atuam ou retornaram à atividade produtiva	<p>Quantidade de aquicultores (as) que atuam ou retornaram à atividade produtiva /</p> $\frac{\Sigma \text{Quantidade de aquicultores profissionais (SGS) - N}^\circ \text{ de registros de "não interesse"}}{\text{Quantidade de aquicultores (as) que atuam ou retornaram à atividade produtiva /}}$	%	-	-	-

NOTA: *OS INDICADORES ACIMA FORAM PROPOSTOS NA REVISÃO DA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA E SERÃO AVALIADOS PELA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO (CT-EI).

Curva S do programa

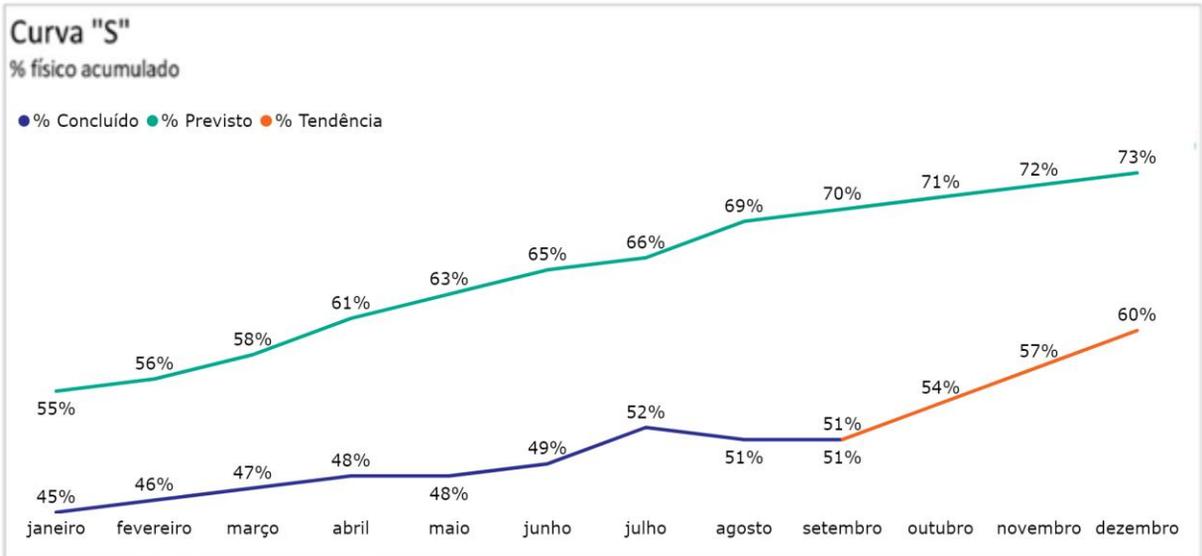


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico

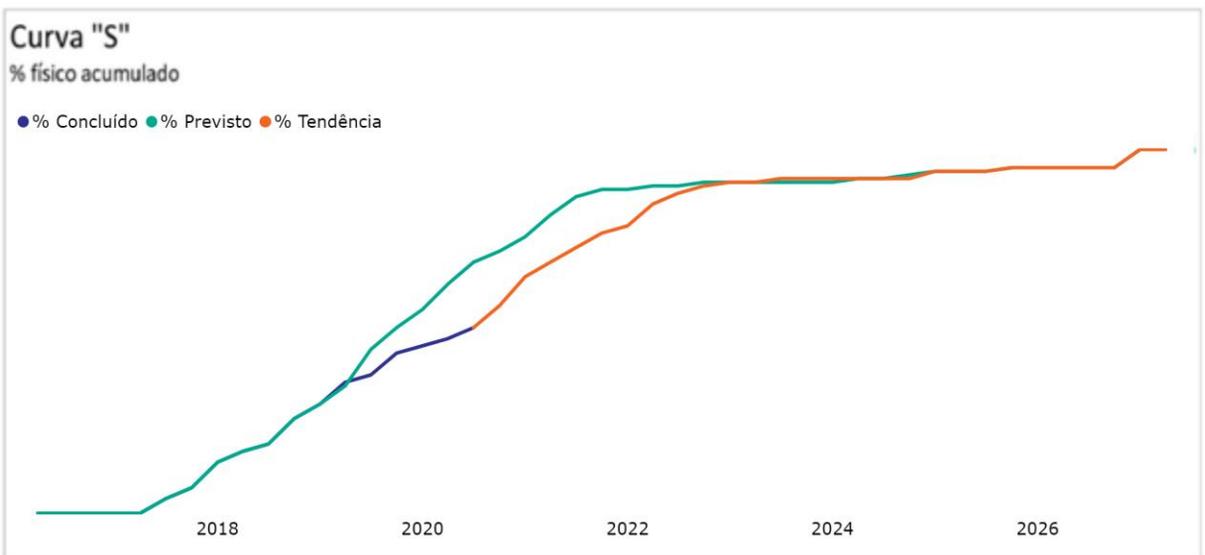


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a garantir o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento, incluindo ações relacionadas ao incremento de alternativas para manejo de solo e água. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis, visando à agregação de valor, diversificação econômica inclusiva e alternativa aos produtores rurais que também atuam em atividades pesqueiras no rio Doce.

Cláusula	124	Caput	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

março de 2020		Realização da reunião de kick-off com a contratada responsável pelas hortas e pomares em Barra Longa/MG e demais municípios
março de 2020		Realização da reunião de kick-off com a contratada responsável pelas hortas e pomares em Mariana/MG
outubro de 2020		Realização da reunião de Kick-off com a contratada responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lote 10 (Conselheiro Pena/MG e Galiléia/MG)
outubro de 2020		Realização da reunião de kick-off com a contratada responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lote 11 (Resplendor, Itueta e Aimorés)
outubro de 2020		Realização da reunião de kick-off com a contratada responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lote 12 (Baixo Guandu/ES, Colatina/ES e Marilândia/ES)
outubro de 2020		Realização da reunião de kick-off com a contratada responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lote 13 (Linhares/ES)
outubro de 2020		Realização da reunião de kick-off com a contratada responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lote 6 MG (Ipatinga, Iapu, Fernandes Tourinho, Santana do Paraíso, Ipaba, Bugre, Sobrália e Timóteo)
outubro de 2020		Realização da reunião de Kick-off com a contratada responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lote 7 (Belo Oriente/MG, Alpercata/MG, Naque/MG, Periquito/MG)
outubro de 2020		Realização da reunião de Kick-off com a contratada responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lote 8 (Governador Valadares/MG)
outubro de 2020		Programa 17 validado pelo CIF após revisão da definição
dezembro de 2020		Conclusão da reparação e adequação de infraestruturas rurais simples (entregas do PG 10)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 205 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 48 direcionados ao reassentamento e 186 ao PASEA. Dos 186, 186 são PASEA planejados sendo que 180 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 19 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 154 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 14 não aderiram e 12 estão em análise pelo produtor;
- 44626.79 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 957.65 toneladas no mês;
- 2552.39 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 117 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 435 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 649 infraestruturas rurais simples concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1370.26 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 1637 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 3404 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade).

Baixo Rio Doce

- 1005 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1136 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus).

Parcerias

- 33 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 16 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas nos territórios Mariana e Alto Rio Doce. As Unidades Demonstrativas foram implantadas em parceria com o *World Resources Institute* (WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

X semana Paulo Freire- 27/10 - Diagnóstico socioterritorial do alto rio Doce - Diálogo sobre o desenvolvimento rural sustentável a partir da agricultura familiar na região, com o professor Alair Ferreira de Freitas (UFV)

Continuidade da entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito.

Conclusão do primeiro pomar dentro do âmbito do PASEA.

Médio e Baixo Rio Doce

Fornecimento de recursos financeiros para aquisição de silagem aos produtores rurais, localizados abaixo da Usina Risoleta Neves em Minas Gerais até o Espírito Santo, que estejam enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na manutenção de suas atividades produtivas, em atendimento à Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (SJMG)

Retomada das atividades de campo pela Instituição responsável pelo ATES (Coopertrac), após liberação da Sala de Situação.

Indicadores

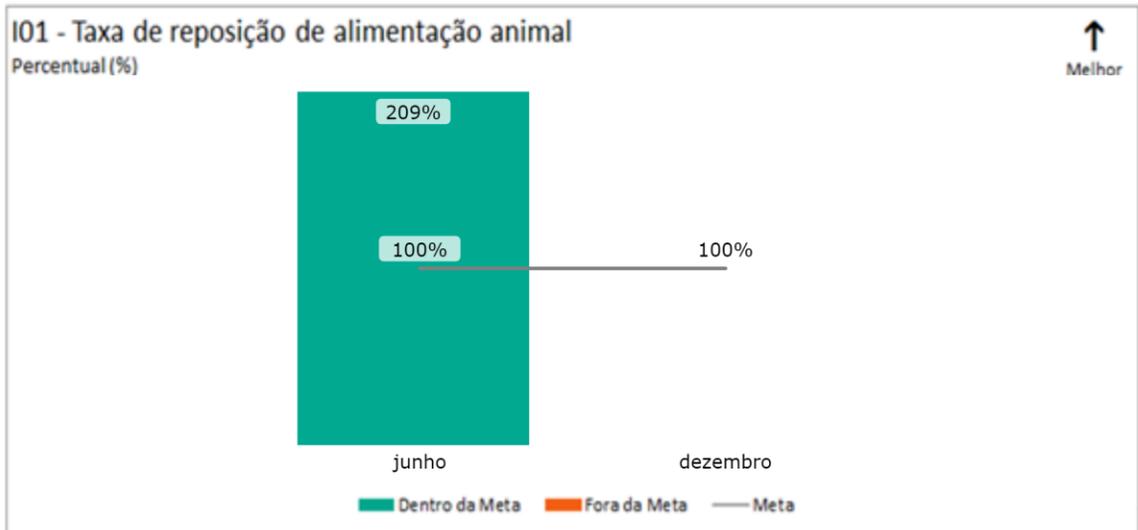


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas) / (Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)	%	-	-	-
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	-
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	Nº de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / nº de produtores participantes do Programa	%	-	-	-
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	-
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano	-	-	-
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	Nº de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%	-	-	-
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas) / (Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)	%	-	-	-

Curva S do programa

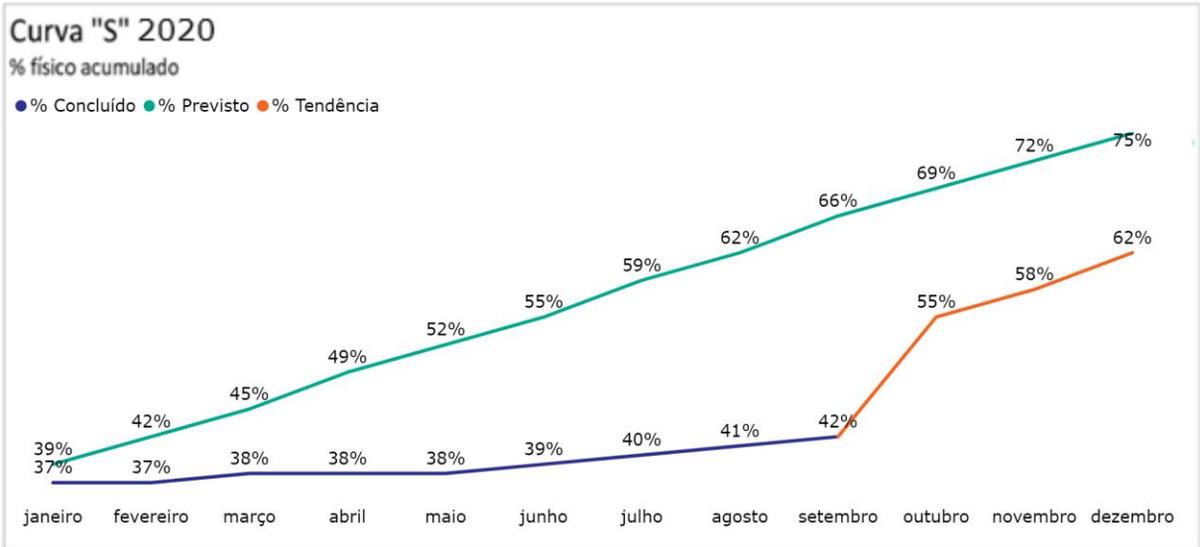


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

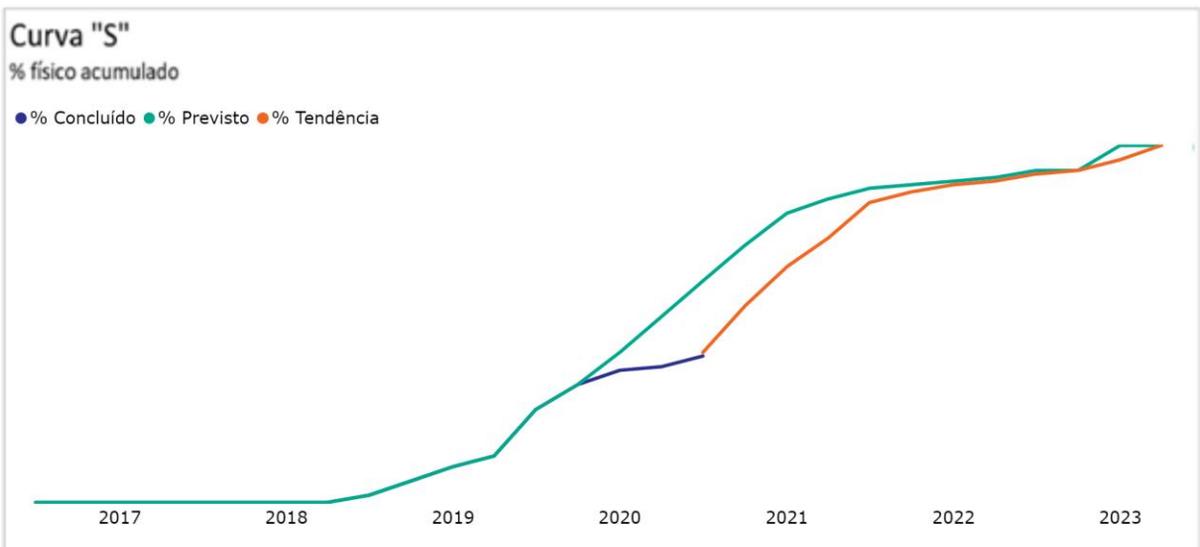


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Adotar estratégias que contribuam para o desenvolvimento econômico da região e a redução da dependência da atividade minerária, estimulando o surgimento de novas indústrias/negócios baseadas em alternativas tecnológicas e sustentáveis, promovendo uma maior integração produtiva da população, conforme cláusulas 129 e 130 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Cláusula	129	Caput	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020



janeiro de 2020	●	Realização da entrega da metodologia da inteligência de negócio para a Prefeitura de Mariana
novembro de 2020	●	Conclusão do serviço de georreferenciamento e plano diretor em Mariana
novembro de 2020	●	Encerramento do 1º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
dezembro de 2020	●	Conclusão do projeto de estruturação da área de TI da prefeitura de Mariana
dezembro de 2020	●	Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 51 milhões** emprestados para negócios em Minas Gerais e no Espírito Santo.
- **R\$ 40 milhões** em linhas de crédito.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

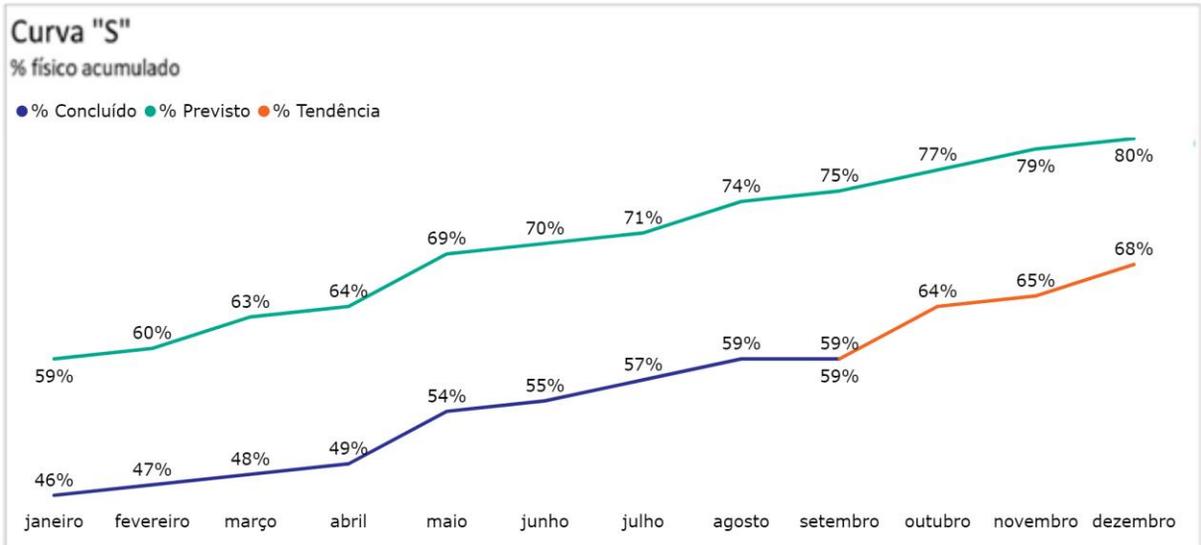


Gráfico 1. Curva "S" de avanço físico

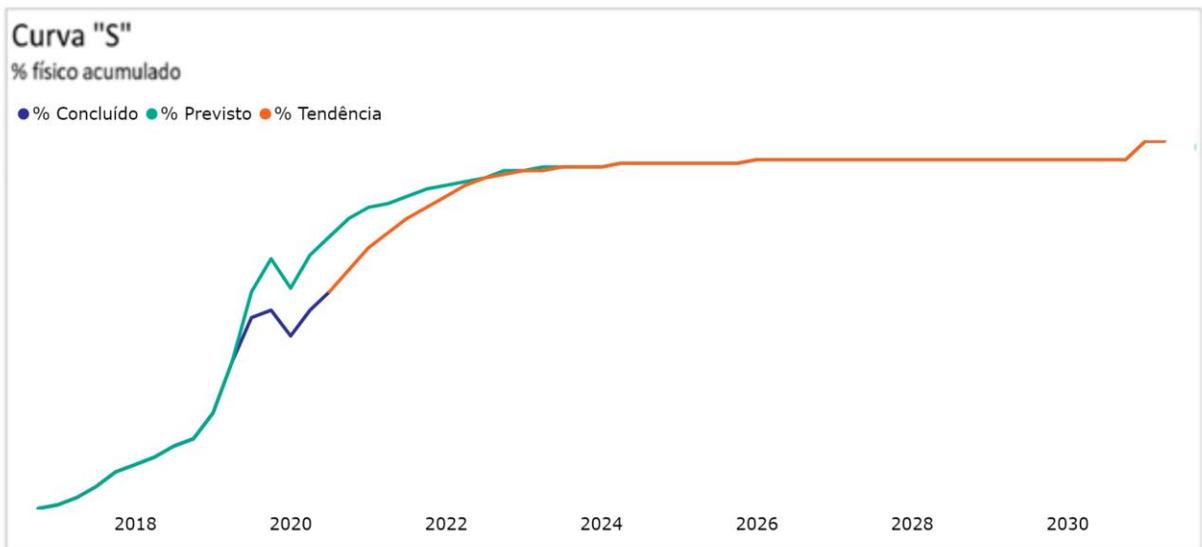


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	132	Item 2	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento

Entregas do ano de 2020

janeiro de 2020	●	Realização do estudo de avaliação de impacto econômico nas novas áreas - São Matheus, Aracruz, Serra, Linhares, Conceição da Barra e Fundão
fevereiro de 2020	●	Encerramento do Projeto de Assessoria Técnica para Recuperação de Micro e Pequenos Negócios SEBRAE/MG
junho de 2020	●	Finalização da Etapa 'Análise do Potencial Mercadológico e Empreendedor do Território' realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
setembro de 2020	●	Finalização da Etapa 'Empreendedorismo em Ação' para as turmas 1 e 2 realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
novembro de 2020	●	Aprovação da Definição do PG019 pelo CIF
dezembro de 2020	●	Finalização dos atendimentos para reposição de insumos e equipamentos para negócios em operação

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Finalização da Etapa 'Empreendedorismo em Ação' para as turmas 1 e 2 realizada pelo Instituto Criare Rio na Assessoria para Desenvolvimento da Cultura Empreendedora

Indicadores

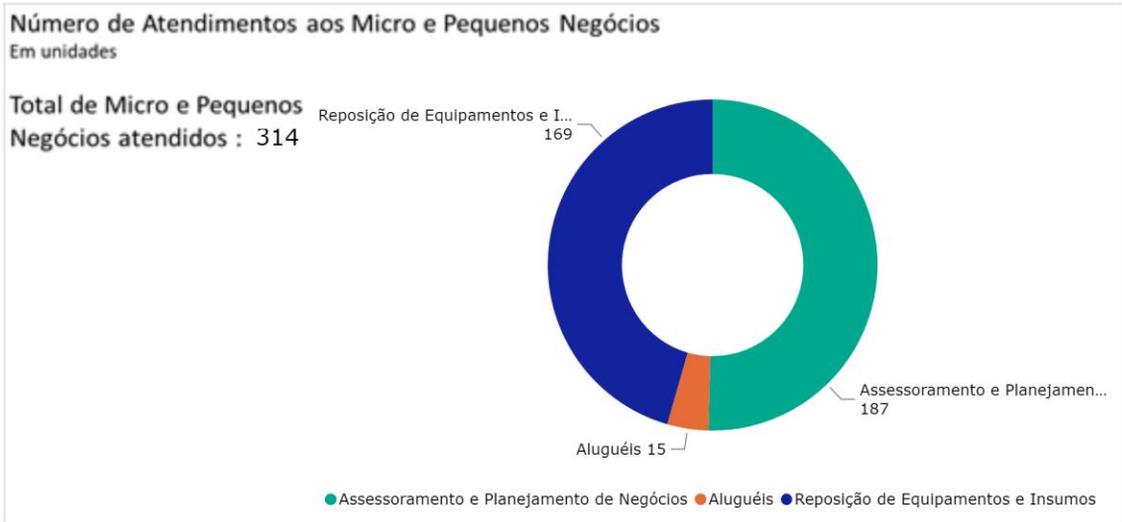


Gráfico 1. Número de atendimentos aos Micro e Pequenos Negócios. Gráfico Acumulado

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
11	% de negócios impactados com condições de produção recuperadas	Total de empreendedores que tiveram o reestabelecimento das condições produtivas - equipamentos, insumos e estrutura física - para mesma atividade econômica / Número de empreendedores atingidos elegíveis que desejam retomar sua atividade comercial	%	-	-	-
12	% de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada	Quantidade de empreendedores que desejam migrar para novo negócio e que foram atendidos por assessoria técnica ou consultoria / Quantidade de empreendedores que desejam migrar para um novo negócio e que solicitaram assessoria ou consultoria	%	-	-	-

Curva S do programa

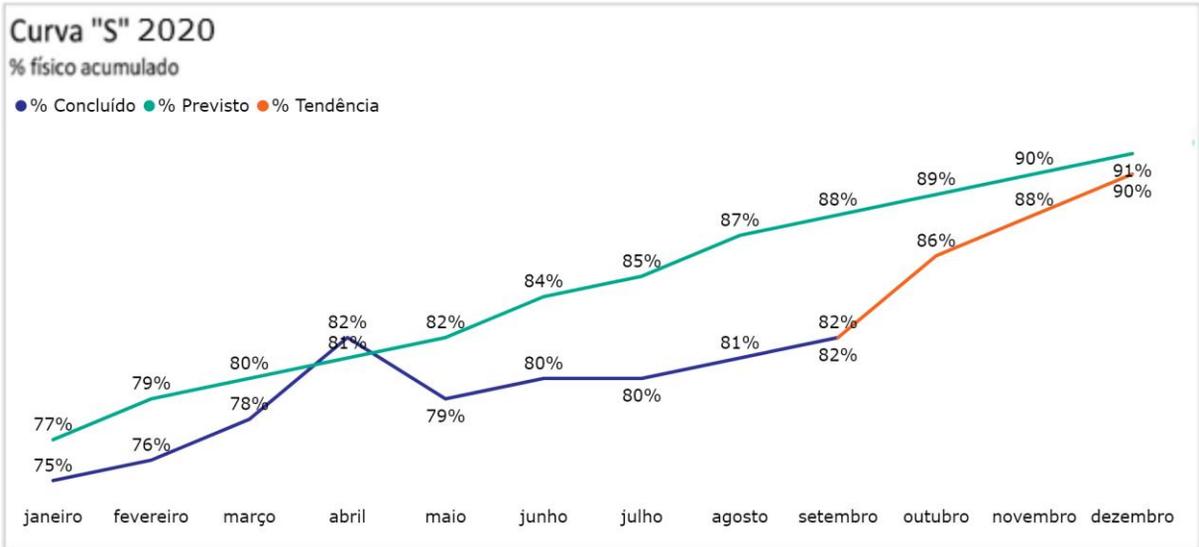


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

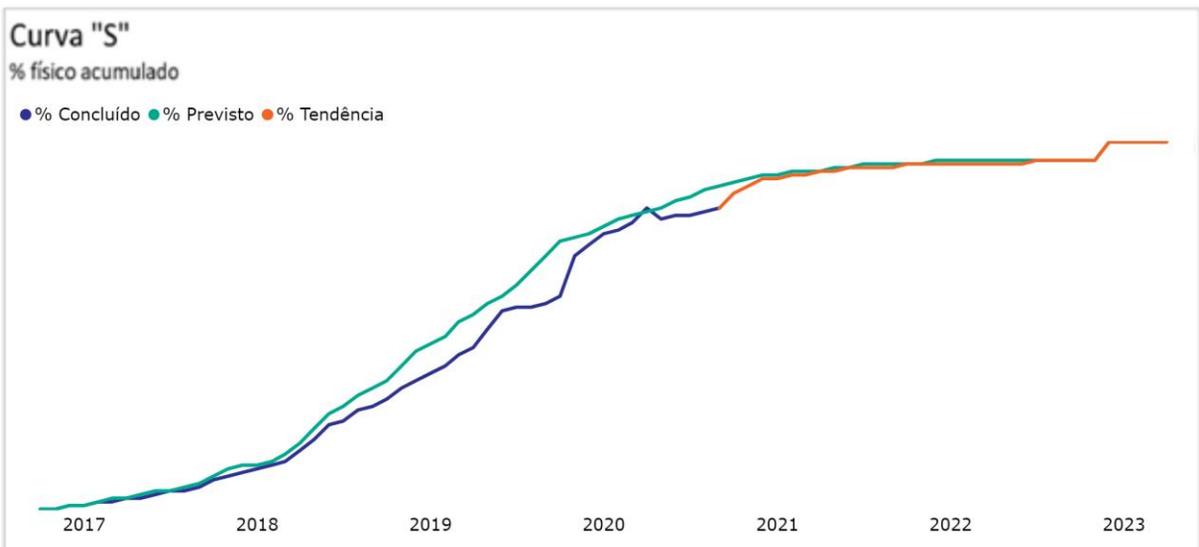


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso da força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	Caput	Em Andamento
Cláusula	136	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	84	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

janeiro de 2020	●	Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Governador Valadares/MG
maio de 2020	●	Contratação do Projeto de Qualificação Profissional 2020 ES
junho de 2020	●	Contratação do Projeto de Qualificação Profissional 2020 MG
junho de 2020	●	Início do Projeto de Qualificação Profissional 2020
julho de 2020	●	Protocolo da Definição do PG020 no CIF
agosto de 2020	●	Início do Projeto Desenvolvimento de Fornecedores Atingidos
outubro de 2020	●	Aprovação da Definição do PG020 pelo CIF
novembro de 2020	●	Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 de Minas Gerais e Espírito Santo
novembro de 2020	●	Conclusão dos projetos do SENAI/MG de Qualificação Profissional 2018-2019
novembro de 2020	●	Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019
novembro de 2020	●	Finalização do Projeto de Qualificação Profissional 2019 de Candonga
novembro de 2020	●	Finalização dos cursos de qualificação profissional do ciclo 2018-2019 em Mariana/MG
dezembro de 2020	●	Identificação dos cursos de qualificação para 2020 de acordo com as demandas locais

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.808 **profissionais qualificados**, dentre os quais: 960 qualificados em Mariana, 564 no Espírito Santo e 282 em outras cidades de Minas Gerais de setembro/2017 até outubro de 2020 meta é qualificar 2.000 profissionais até dezembro/2030.

Fatos relevantes do mês

Webinar para empresários locais de Mariana, sobre a utilização do SAP ARIBA.

Palestra para empresários do ES (Colatina, Linhares, Regência e Povoação) Tema: Produtividade nos Negócios para Reduzir Desperdícios e Aumentar os resultados.

Indicadores



Gráfico 1. Quantidade de alunos qualificados nos cursos de qualificação profissional. Gráfico Acumulado

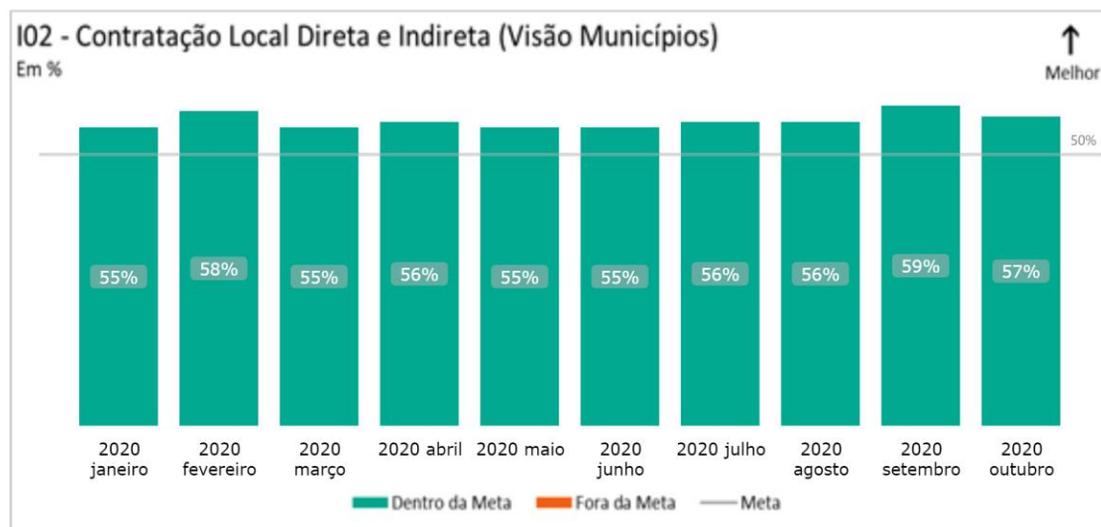


Gráfico 2. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Municípios). Gráfico Mensal

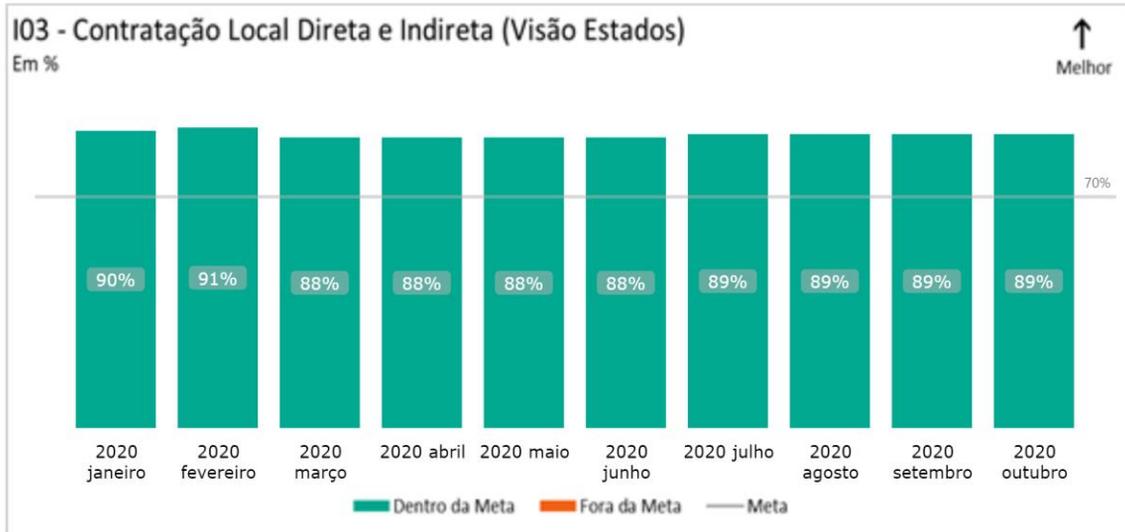


Gráfico 3. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Estados). Gráfico Mensal

Curva S do programa

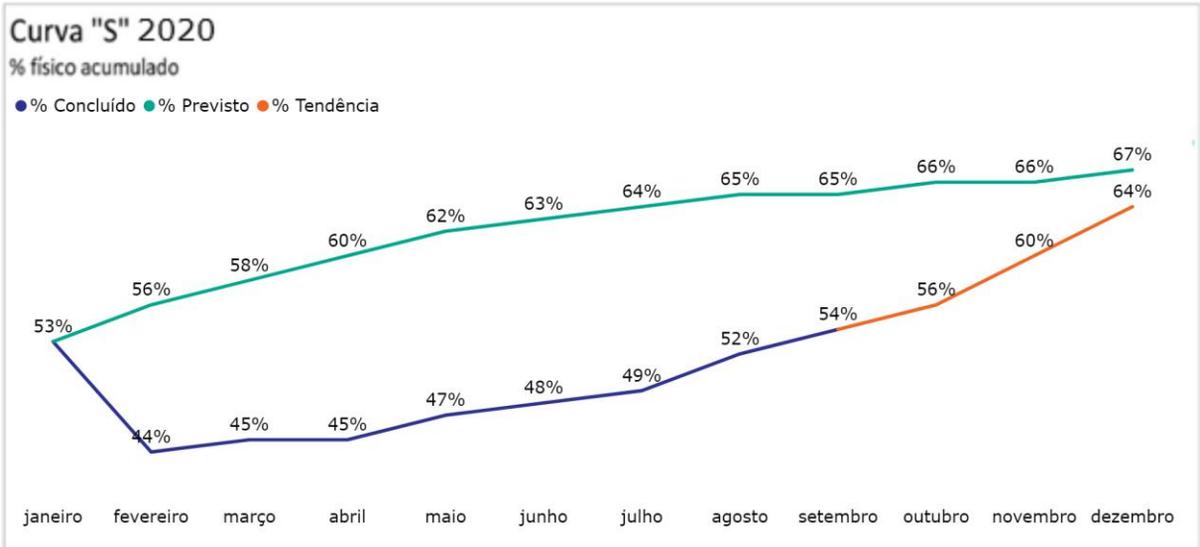


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

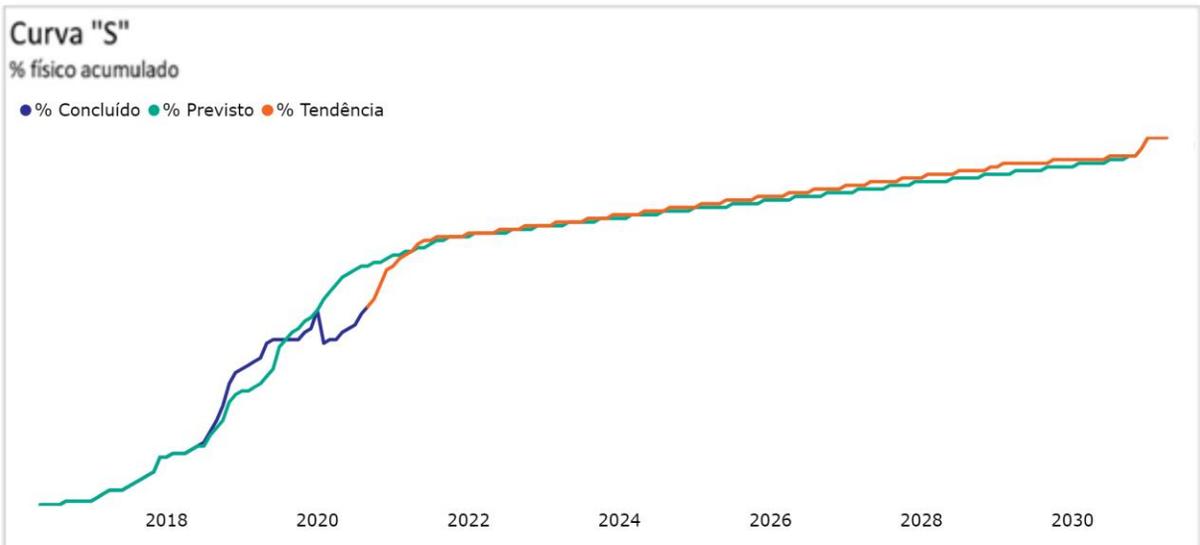


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	Caput	Em Andamento
Deliberação	111	6	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Reprogramado
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	48	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- Dezembro de 2020 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Auxílio Financeiro Emergencial Campanha 3)
- Dezembro de 2020 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Campanhas 1 e 2)
- Dezembro de 2020 ● Finalização dos atendimentos e pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial (Mariana)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.754 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (18.133), são 32.887 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.428,91 milhões**.

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 4 auxílios, todos por decisão judicial.

Indicadores

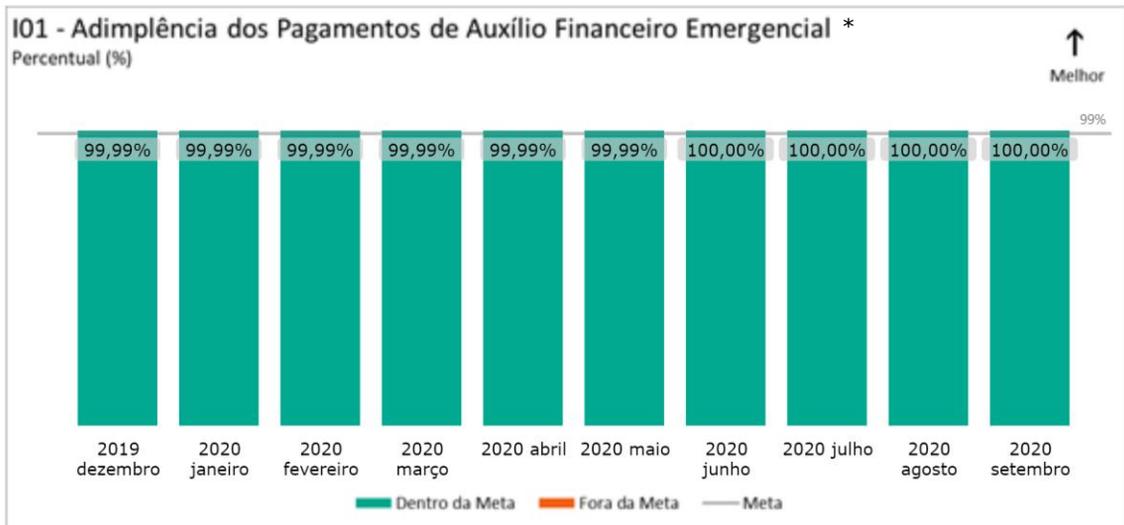


Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

* Foi realizado ajuste do gráfico, considerando as casas decimais do resultado do indicador.

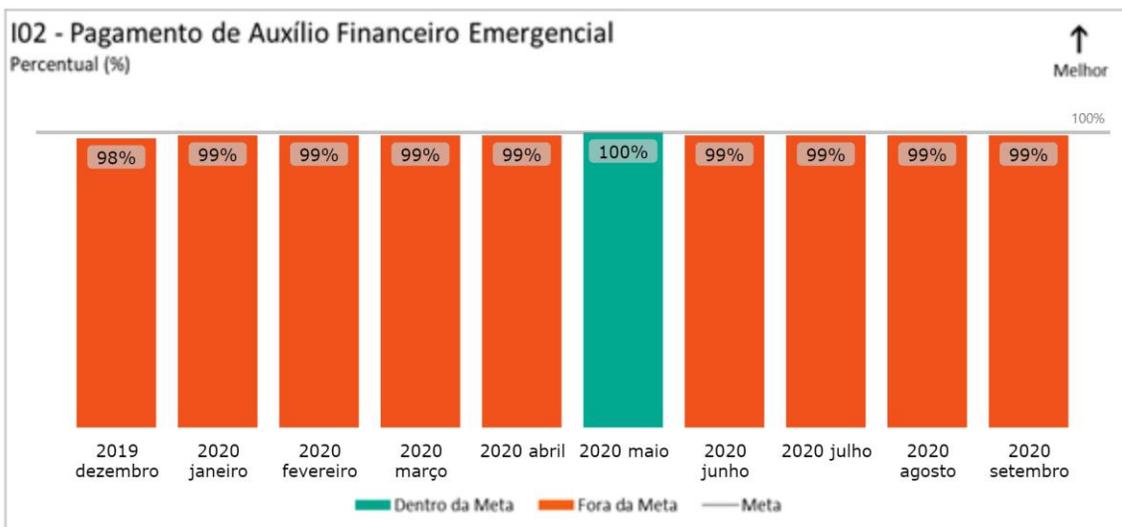


Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.


Cláusula	150	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	Caput	Em Andamento
Cláusula	180	Caput	Concluído Internamente

Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente

Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	362	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	45	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Em Andamento
Deliberação	222	1.5	Em Andamento
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	378	5	Em Andamento

Entregas do ano de 2020

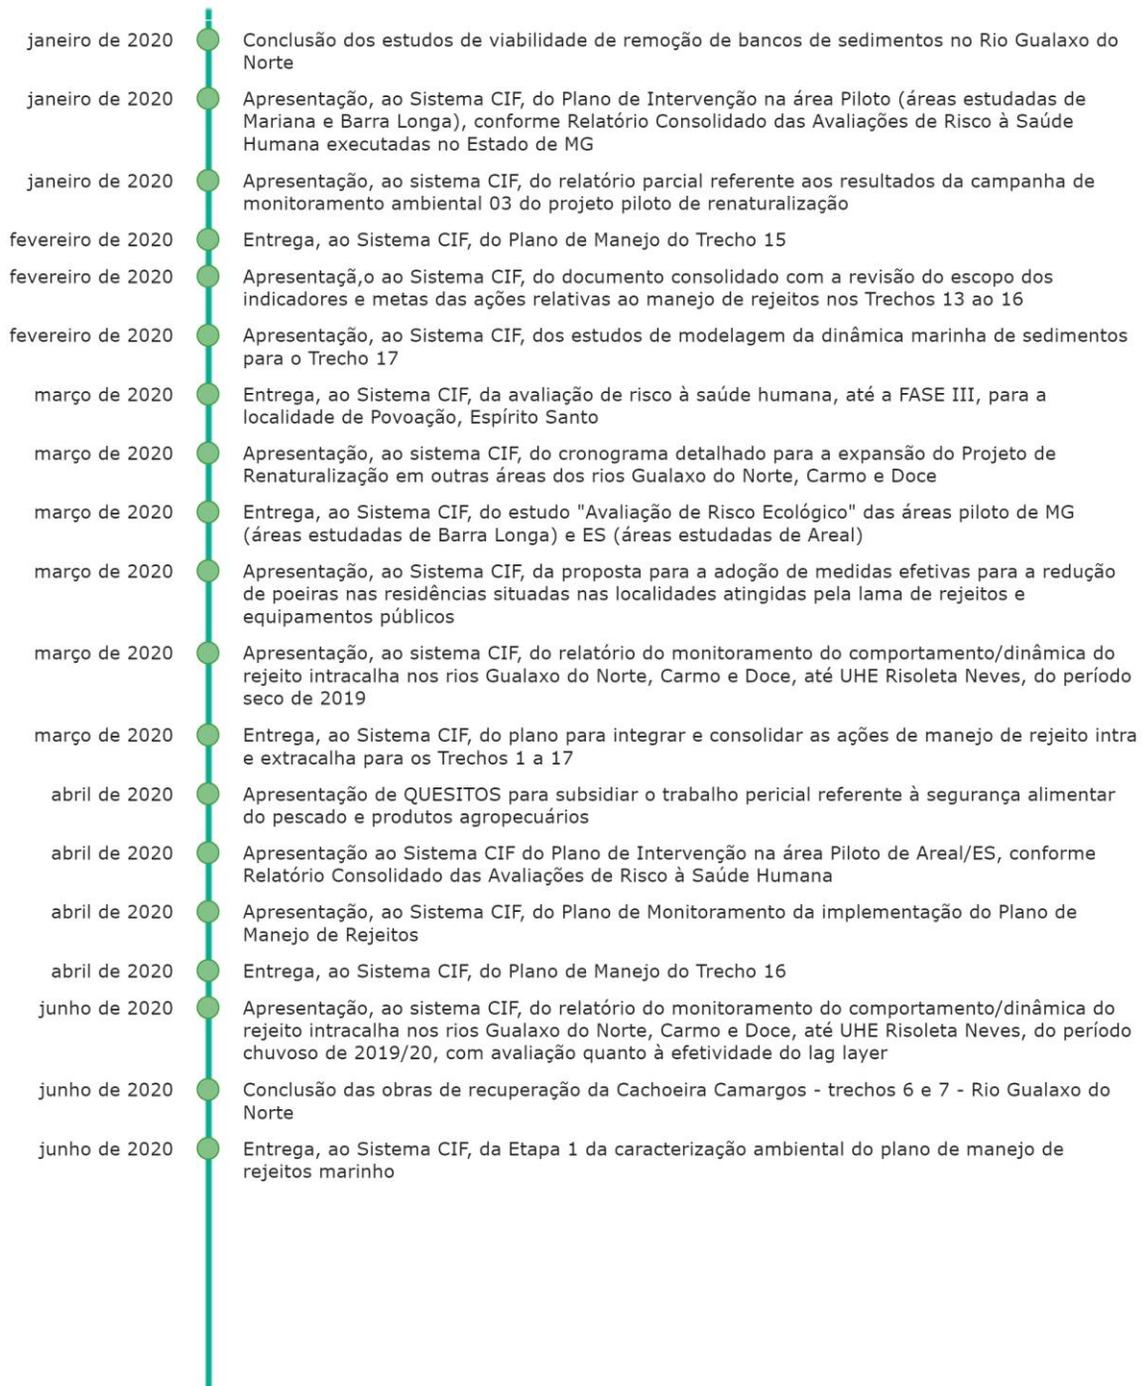

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2020

- agosto de 2020 ● Conclusão da implantação da Estação de Tratamento Natural da intracalha do trecho 8 - Mariana
- setembro de 2020 ● Apresentação, ao Sistema CIF, dos estudos de balanço e transporte de sedimentos intra e extracalha dos Trechos 1 a 16
- setembro de 2020 ● Entrega, ao Sistema CIF, do estudo geomorfológico do trecho do rio Doce a jusante da UHE Risoleta Neves, previsto no escopo dos estudos de transporte de sedimentos
- outubro de 2020 ● Conclusão da implantação da modelagem 2D no trecho 12 - Candonga
- outubro de 2020 ● Apresentação do contrato assinado com a empresa que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do plano de manejo de rejeitos marinho
- outubro de 2020 ● Mobilização da empresa que irá realizar a Etapa 2 da caracterização do Trecho 17 do Plano de Manejo de Rejeitos
- outubro de 2020 ● Conclusão do monitoramento de parcelas de controle de erosão do 2º ano hidrológico (Ago/19 a Jul/20)
- novembro de 2020 ● Início do envio dos relatórios da estação fixa de monitoramento de qualidade do ar de Novo Soberbo (Santa Cruz do Escalvado) para a Fundação Estadual de Meio Ambiente
- novembro de 2020 ● Apresentação, ao sistema CIF, dos estudos complementares das Lagoas Marginais do Rios Gualaxo do Norte e Carmo
- dezembro de 2020 ● Conclusão dos serviços de topobatimetria dos transectos (Rio Gualaxo do Norte) - trechos 6 a 12
- dezembro de 2020 ● Protocolo, perante os órgãos ambientais competentes, os pedidos de obtenção das correspondentes autorizações/licenças ambientais para intervenção/recuperação das lagoas marginais

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Reunião com moradores de Resplendor sobre estudos realizados pelo Programa Manejo de Rejeitos

Início dos trabalhos de campo para caracterização e consolidação do Plano de Manejo do Trechos 13 e 14, em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA 13/2020

Fórum de Prestação de Contas de Marilândia sobre as ações de reparação e compensação da Fundação Renova, com a presença dos programas Manejo de Rejeitos e Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Apresentação sobre as ações do PG23 na reunião temática com representantes do Governo de MG, realizada pela área de RI da FR

Indicadores

Tabela 1. Indicadores.

CONCENTRAÇÃO DE POEIRA INALÁVEL – PM10 Limite superior: 40 µg/m ³ (CONAMA 491/2018)	MÉDIA PERÍODO [µg/m³]
Mariana/MG – Paracatu	26
Barra Longa/MG – Centro	21
Barra Longa/MG – Volta da Capela	19
Barra Longa/MG – Gesteira	19
Rio Doce/MG – Santana do Deserto	15
Rio Doce/MG - Centro	35

Curva S do programa

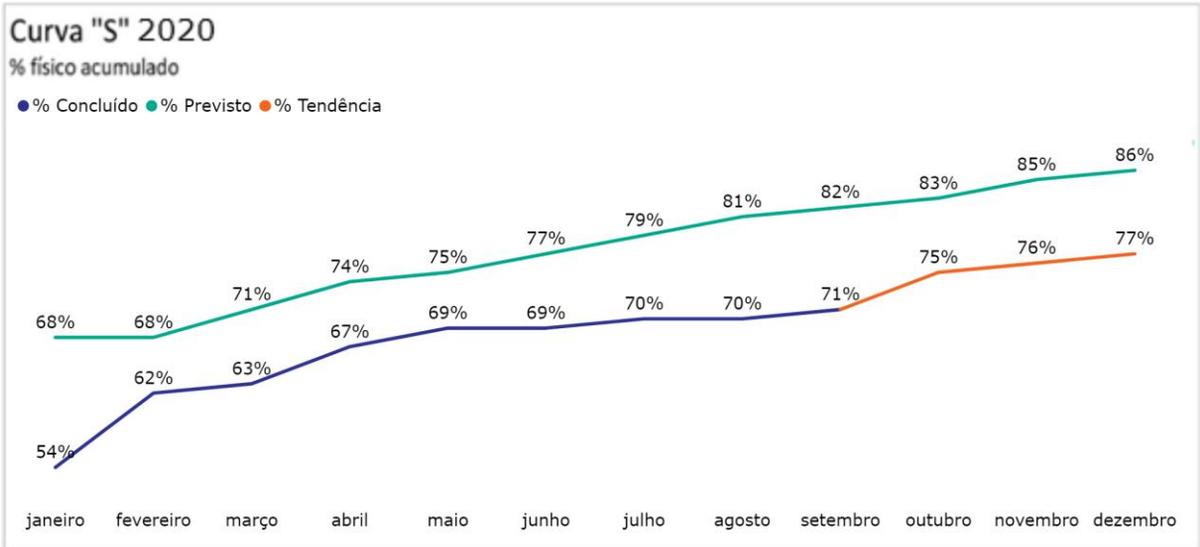


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

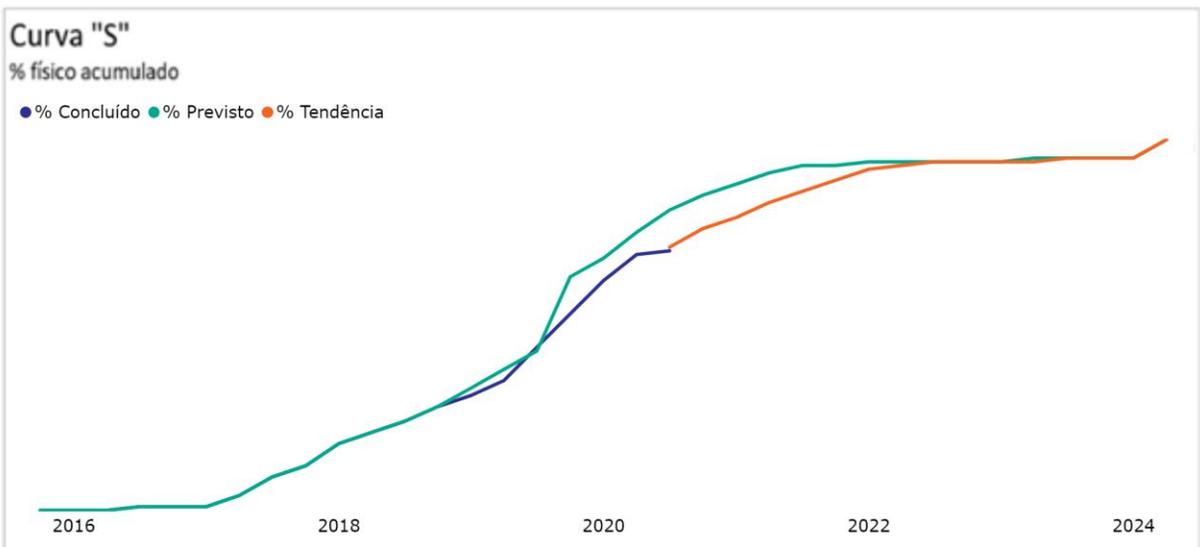


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperar a área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado.

Cláusula	158	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	159	Caput (manutenção)	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Reprogramado
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- outubro de 2020 Aprovação da Cláusula 158 e 160 obtida junto ao CIF (Comitê Interfederativo)
- outubro de 2020 Restauo florestal em área impactada em todos os municípios finalizado
- dezembro de 2020 Conclusão do convênio UFV-FUNARBE - Prof. Maria Catarina Kasunya (Pesquisa e seleção de microrganismos fixadores de nitrogênio sobre rejeitos e produção massal de substrato inoculado para produção de mudas florestais)
- dezembro de 2020 Finalização da manutenção do restauo florestal em área impactada executado pela EGIS - Barra Longa- 2020
- dezembro de 2020 Finalização da manutenção do restauo florestal em área impactada executado pela EGIS - Ponte Nova - 2020
- dezembro de 2020 Finalização da manutenção do restauo florestal em área impactada executado pela EGIS - Rio Doce - 2020
- dezembro de 2020 Finalização da manutenção do restauo florestal em área impactada executado pela EGIS - Santa Cruz do Escalvado- 2020
- dezembro de 2020 Finalização da manutenção do restauo florestal em área impactada executado pelo CONSÓRCIO ERG/STCP - Mariana - 2020

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

Fatos relevantes do mês

Retomada das atividades de restauro em Barra Longa

Retomada das atividades de cercamento em Barra Longa

Início das atividades de plantio florestal em Mariana

Execução de preparo do solo para o plantio no próximo período chuvoso (outubro/2020 à março/2021)

Execução de manutenção da área efetivamente plantada com mudas nativas até março de 2020

Comercialização de mudas dos viveiristas familiares - O cliente dessa vez foi a empresa consórcio MRF que promoveu um evento ambiental e distribuiu cerca de 400 mudas florestais nativas para seus colaboradores, incentivando seu plantio e cuidado com o meio ambiente. O objetivo principal do projeto ater viveiros familiares é "promover a integração dos agricultores na cadeia produtiva de sementes e mudas para estimular o empreendedorismo no ramo, diversificar a renda das propriedades rurais, fomentar a troca de saberes entre as universidades e os agricultores e ainda a criação de viveiros florestais na região, que carece desse mercado".

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Índice de Cobertura Vegetal	(Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva/Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%	>=80	-	*
I02	Índice de Solo Exposto	(Área total com solo exposto/Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%	<=20	-	*
I03	Biomassa Total da Vegetação	(0,011*banda 2*NDVI2) + (-0,008 x Banda 3*NDVI2)	t/ha	>=6	-	*
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	(Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia/Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle) * 100	%	>=80	-	*
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	-

Curva S do programa

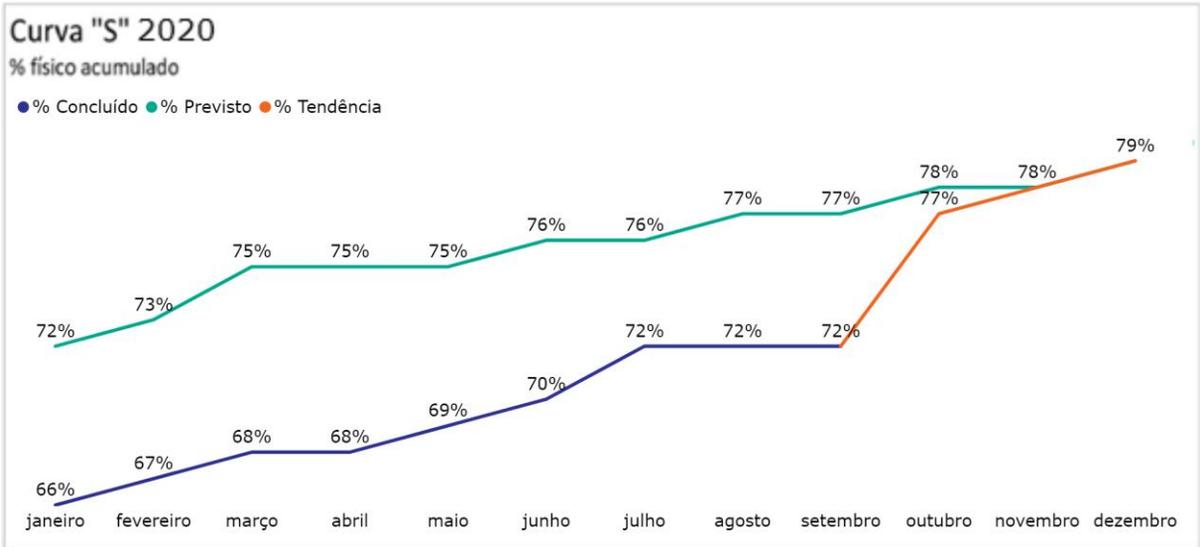


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

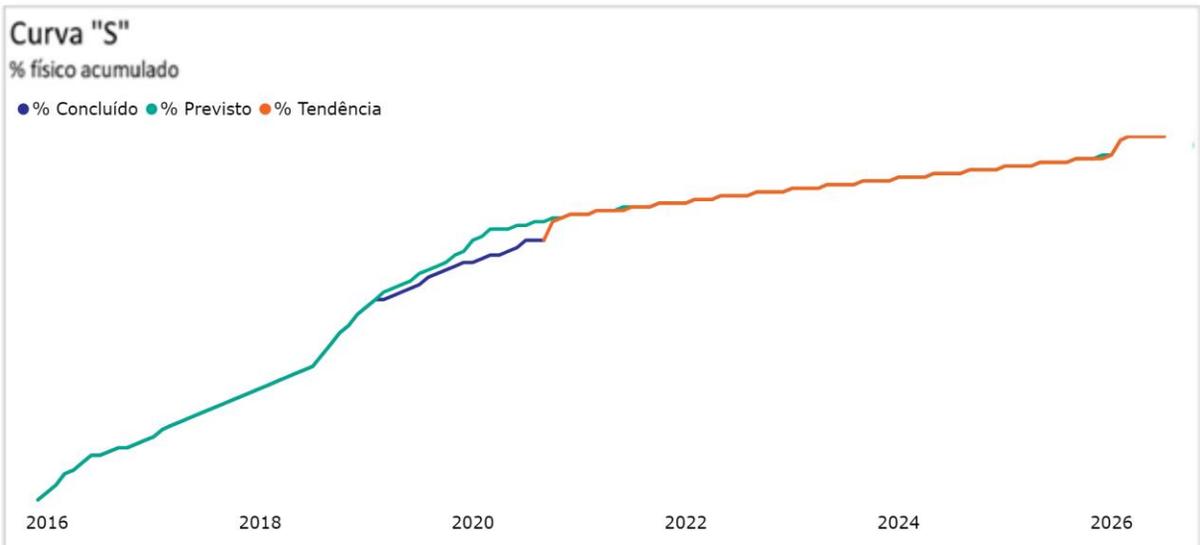


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

janeiro de 2020		Realização do kickoff com a empresa Emflora que implantará restauro florestal na sub-bacia de Pontões e Lagoas no Piloto
janeiro de 2020		Conclusão da coleta de 4 toneladas de sementes de espécies nativas junto aos grupos de coletores para áreas demonstrativas de plantio direto com sementes (objetivo específico 2)
janeiro de 2020		Provisão de suporte técnico para implantação nas áreas do Piloto (objetivo específico 2)
março de 2020		Conclusão do restauro florestal pela EGIS em Coimbra
julho de 2020		Concepção e elaboração do plano de gestão e monitoramento do funcionamento das Casas de Sementes (objetivo específico 11)
outubro de 2020		Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
novembro de 2020		Conclusão da elaboração da 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
dezembro de 2020		Conclusão da implantação florestal nas propriedades da sub-bacia de Pontões e Lagoas no Piloto (18/19)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

Não houve fatos relevantes.

Médio Rio Doce

Treinamento dos técnicos do CIAAT/INSTITUTO TERRA/PROGEN para mobilização, engajamento e validação das áreas para restauração florestal

Baixo Rio Doce

Treinamento dos técnicos do CIAAT/INSTITUTO TERRA/PROGEN para mobilização, engajamento e validação das áreas para restauração florestal

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	-
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	-
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-

Curva S do programa

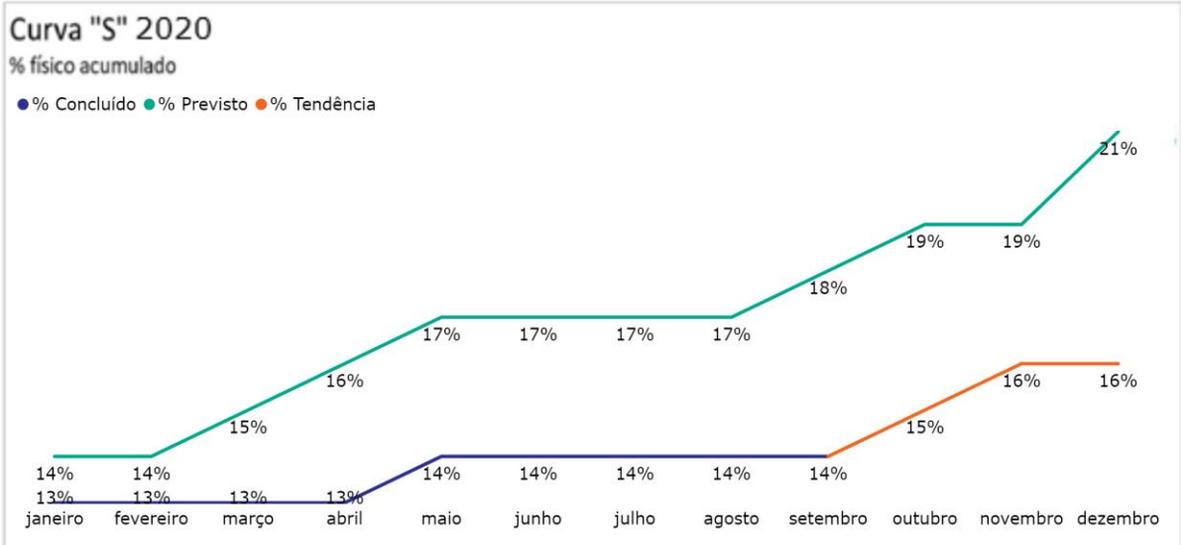


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

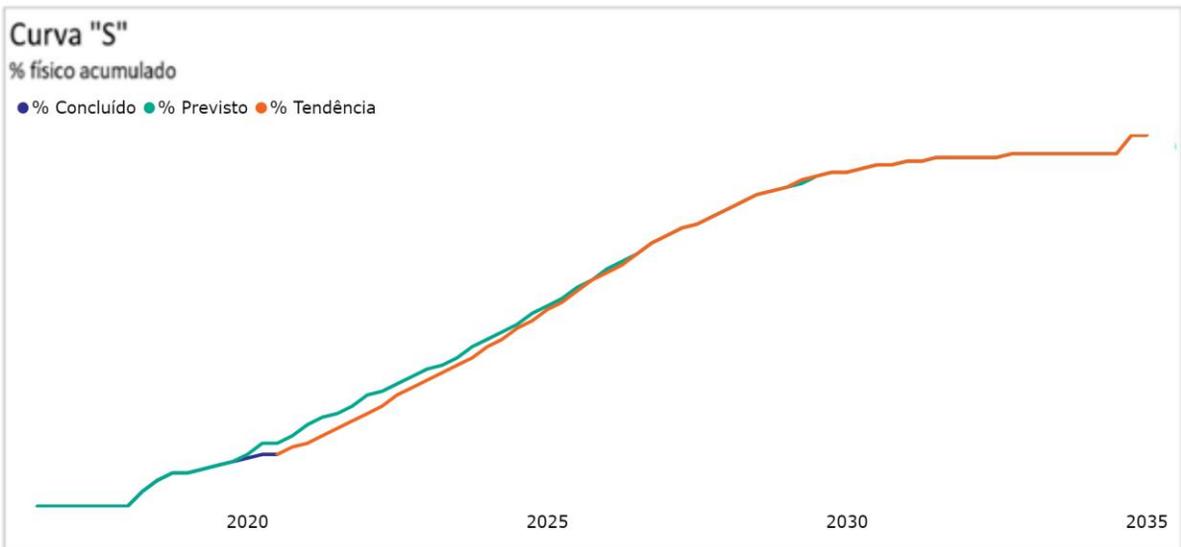


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperar 5.000 nascentes na bacia do rio Doce em um período máximo de 10 anos em atendimento à cláusula 163 (Recuperação de 5 mil nascentes) do TTAC.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	163	Caput (ação 2)	Reprogramado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

fevereiro de 2020		Conclusão da mobilização das contratadas para realizar restauro florestal na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 02 (2017/2018)
março de 2020		Conclusão do restauro florestal pela EGIS em Coimbra
março de 2020		Conclusão da mobilização e engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas para o ano 03 (2018/2019)
março de 2020		Obtenção das assinaturas dos termos de adesão dos proprietários participantes do Programa 27 na sub-bacia de Pontões e Lagoas do ano 03 (2018/2019)
abril de 2020		Mobilização da contratada para execução do restauro florestal e manutenção em Ponte Nova
dezembro de 2020		Conclusão da implantação da restauração florestal do ano 02 (2017/2018) na sub-bacia de Pontões e Lagoas
dezembro de 2020		Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
dezembro de 2020		Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia do Suaçuí

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

Retomada do engajamento dos produtores e o mapeamento das nascentes no município de Paula Cândido.

Médio Rio Doce

Treinamento dos técnicos do CIAAT/INSTITUTO TERRA/PROGEN para mobilização, engajamento e validação das áreas para restauração florestal

As-built das cercas realocadas nas nascentes do Ano 1, após o georreferenciamento realizado pelo Instituto Terra

Baixo Rio Doce

Treinamento dos técnicos do CIAAT/INSTITUTO TERRA/PROGEN para mobilização, engajamento e validação das áreas para restauração florestal

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%	-	-	-
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos/ área amostral	Nº de indivíduos/ha	-	-	-
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%	-	-	-

Curva S do programa

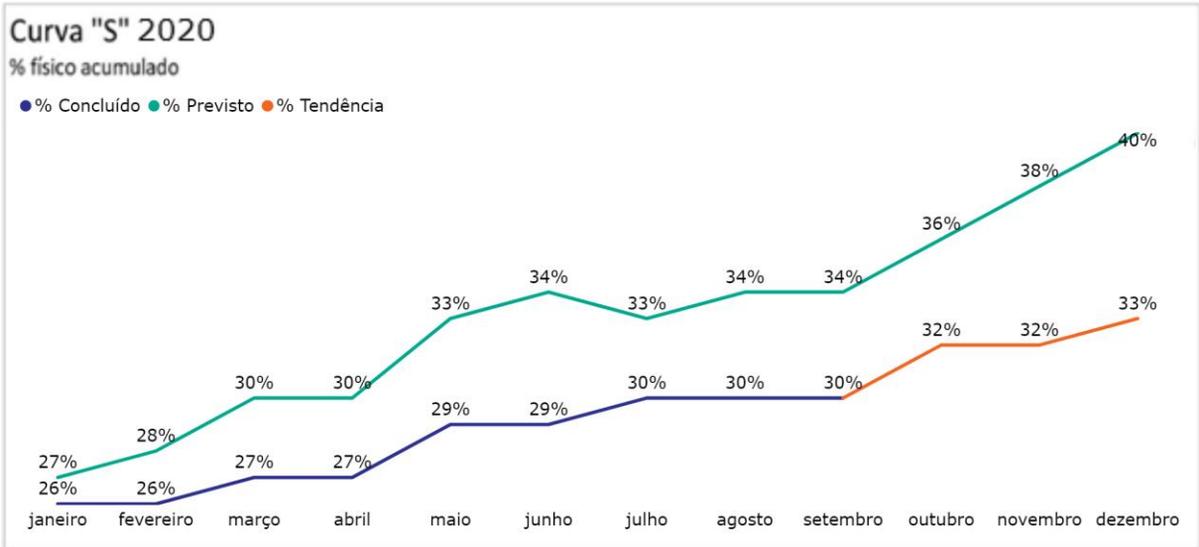


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

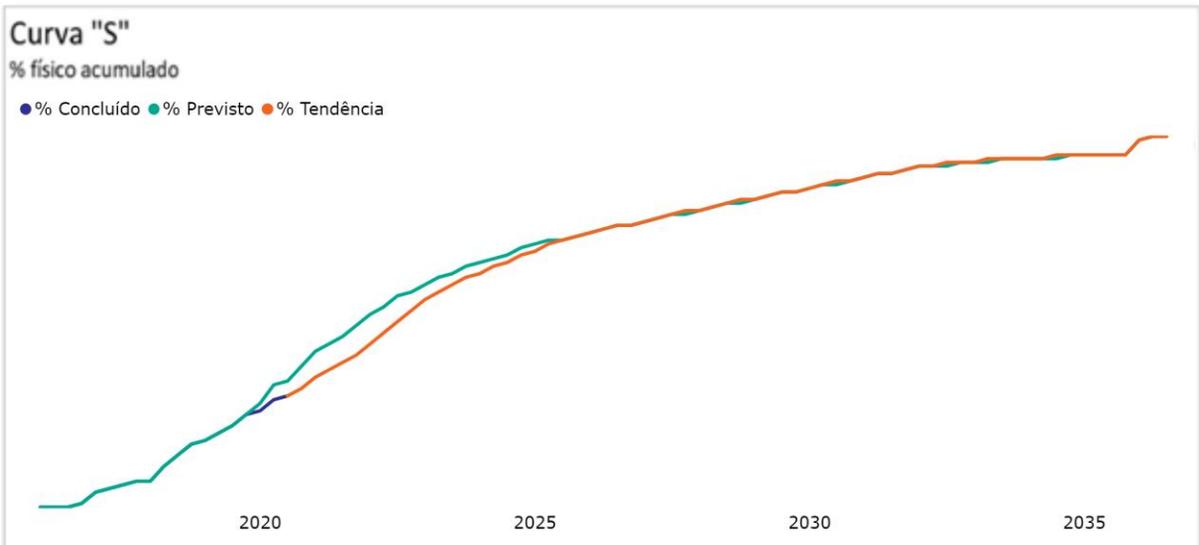


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, bem como realizar o monitoramento e implementar eventuais ações de contingência da fauna aquática da foz do Rio Doce, dos ambientes estuarinos e marinho impactados.

Cláusula	164	a (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 3)	Concluído Internamente
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Em Andamento
Cláusula	166	§1º	Em Andamento
Cláusula	166	§2º	Planejado

Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	Item 2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

janeiro de 2020	●	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 2 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
janeiro de 2020	●	Conclusão da Etapa de Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce
abril de 2020	●	Conclusão da Validação da Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas da bacia do Doce
abril de 2020	●	Protocolo, junto à CT-Bio, do relatório final da avaliação do estado de conservação de peixes e invertebrados aquáticos nativa do Rio Doce
maio de 2020	●	Contratação de Fornecedor para Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática
maio de 2020	●	Protocolo, junto à CT-Bio, do Relatório Semestral do 2º ciclo de Monitoramento da Biota Aquática em Ambientes Dulcícolas (Ictiofauna, Ictioplâncton e Macroinvertebrados Bentônicos) - Anexo 2 do TR4
agosto de 2020	●	Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 2 de Monitoramento da biodiversidade aquática do Rio Doce no Espírito Santo - Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) junto à CT-Bio
outubro de 2020	●	Celebração dos Convênios de parceria do edital em parceria com a FAPEMIG para monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais - conforme Nota Téc. DFAU/IEF/SISEMA nº 007/2017

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Início das atividades noturnas e diurnas do monitoramento reprodutivo das tartarugas marinhas, na planície costeira do rio doce.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF e começarão a ser medidos após o retorno dos especialistas e revisão da metodologia do monitoramento prevista para 2020.

Curva S do programa

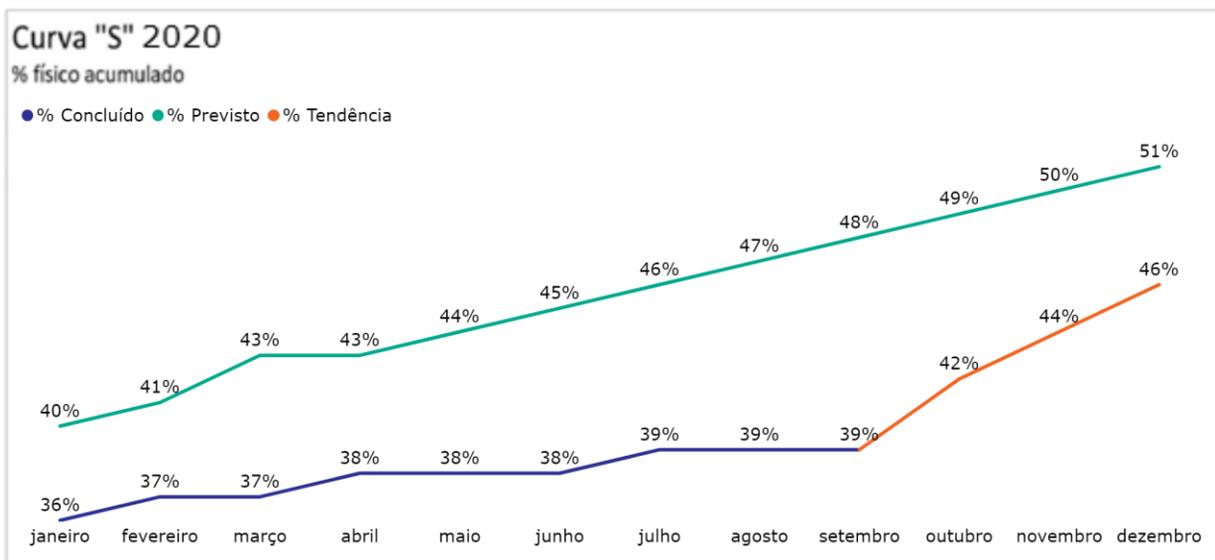


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

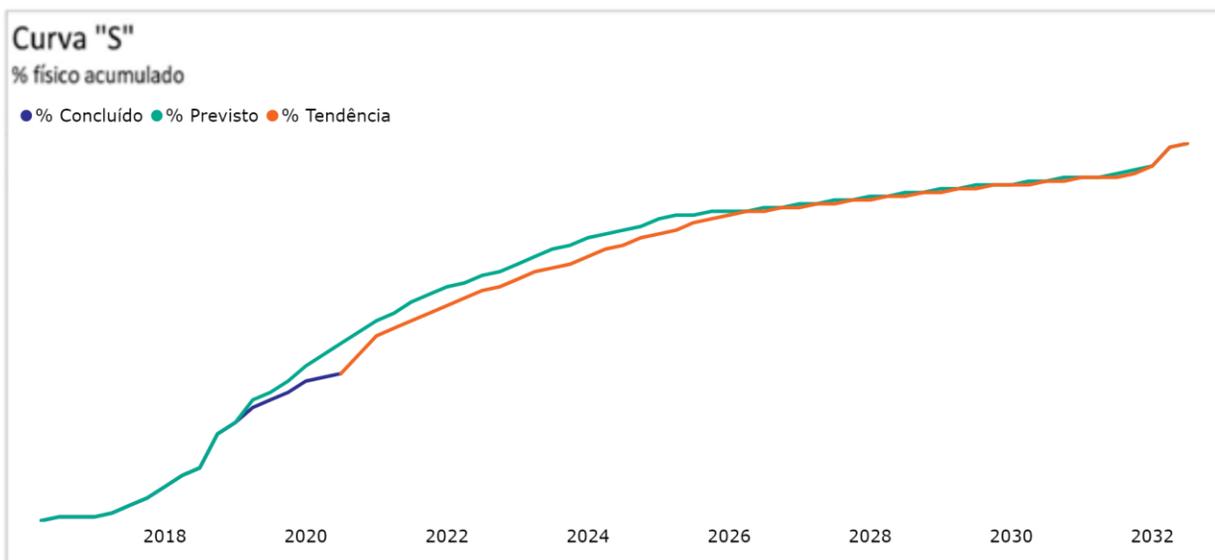


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG029 Recuperação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	Caput	Em Andamento
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

março de 2020		Conclusão do Projeto Conceitual do CETRAS MG
agosto de 2020		Conclusão da Elaboração do Projeto Conceitual do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do Espírito Santo
setembro de 2020		Conclusão do Projeto Arquitetônico Básico / Complementares para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres Minas Gerais
dezembro de 2020		Aprovação do orçamento do CETRAS MG pela CTBio e CIF

A conclusão do Projeto Básico do CETRAS MG e a conclusão do Projeto Conceitual do CETRAS ES desconsideraram a aprovação do orçamento do programa.

As entregas previstas para 2020 sofreram alterações em relação aos meses anteriores devido ao fato de que o cronograma passou pelo processo de gestão da mudança. Esse procedimento foi necessário para adequar ao novo planejamento de entregas definido pela equipe técnica do programa juntamente com as áreas suporte da Fundação Renova.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro

Indicadores

Os indicadores do programa, apresentados na Definição, ainda não foram aprovados pelo CIF e começarão a ser medidos a partir do início da execução das obras do CETRAS-MG e CETRAS-ES que tem início previsto, respectivamente, em 2021 e 2022.

Curva S do programa

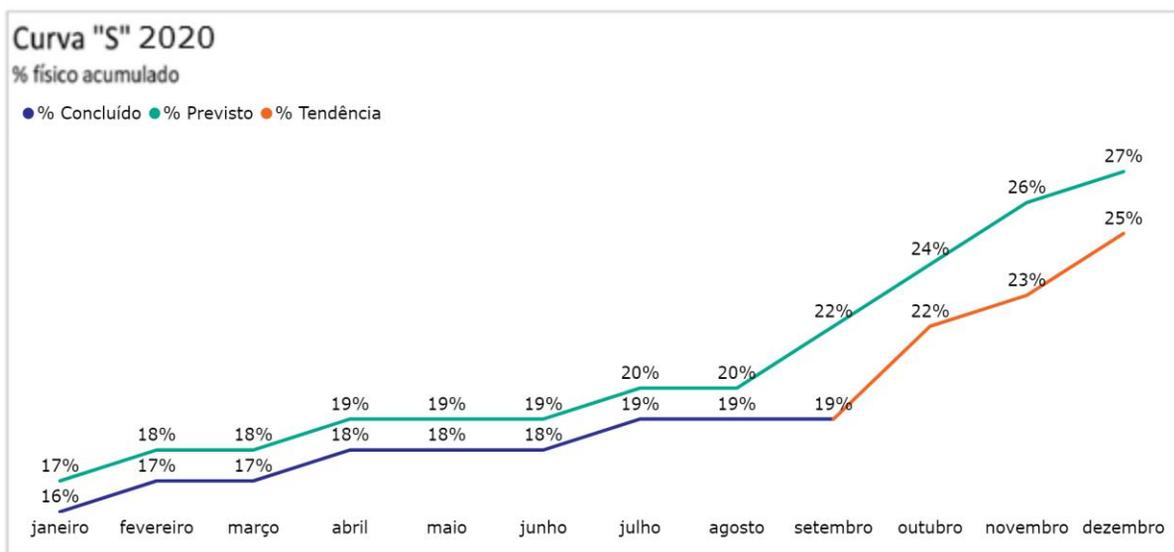


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

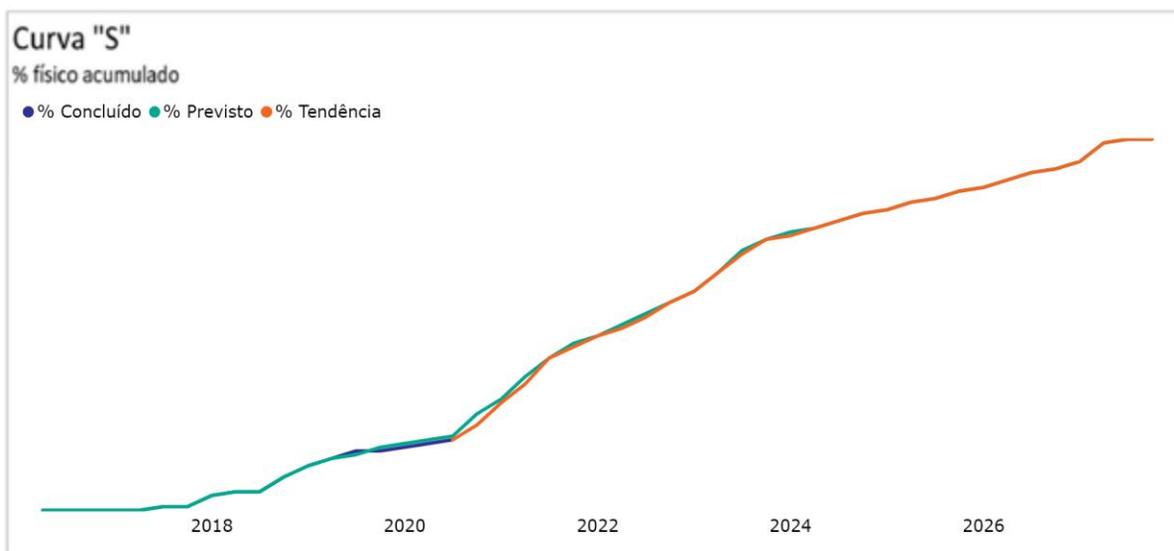


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

A Curva "S" sofreu alterações em relação aos meses anteriores devido ao fato de que o cronograma passou pelo processo de gestão da mudança. Esse procedimento foi necessário para adequar ao novo planejamento de entregas definido pela equipe técnica do programa juntamente com as áreas suporte da Fundação Renova.

PG030 Fauna e Flora terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo. Os resultados desta avaliação de impacto servirão de subsídios para a elaboração do Plano de Ação para conservação desta biota.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020



Anteriormente constava na linha do tempo a entrega "Oficina de Monitoria do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre – Ano 1", mas, após alinhamentos internos, foi definido que no mês de junho houve reuniões já suficientes para atualização da matriz do Plano de Ação, com previsão de protocolo em agosto/20 junto à CT-Bio.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 14 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 108 **parcelas de monitoramento de fauna e flora terrestres** delimitadas ao longo da calha do Rio Doce;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.**

Anteriormente era reportado neste tópico que o programa havia definido 92 ações para Conservação da Biodiversidade Terrestre, porém, no mês de agosto, elas foram revistas e otimizadas chegando a um número de 49 ações.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CT-Bio/CIF e começarão a ser medidos após a revisão da metodologia do monitoramento prevista para 2020.

Curva S do programa

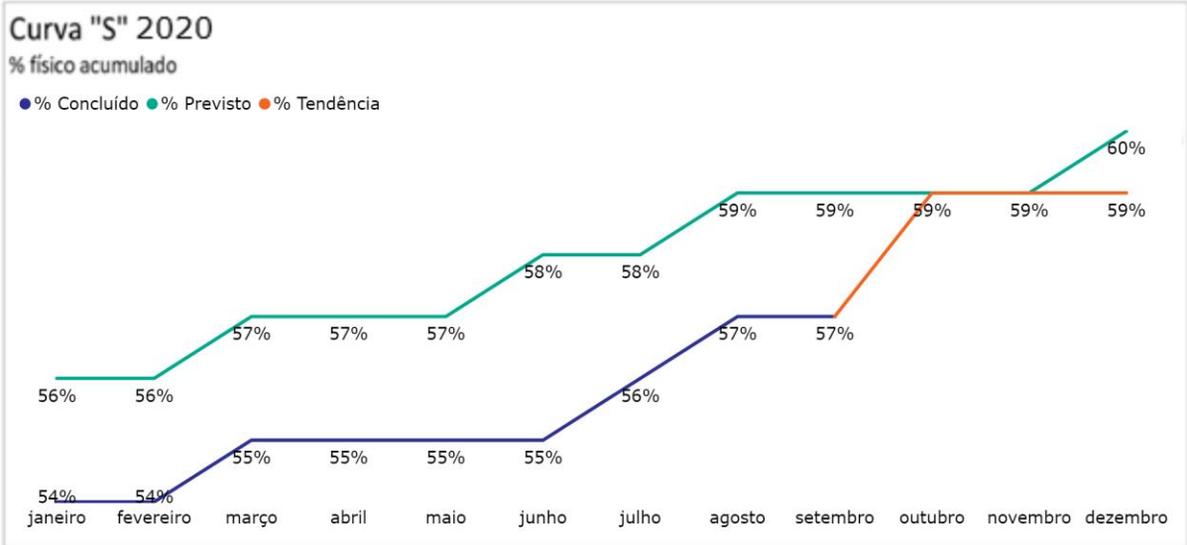


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

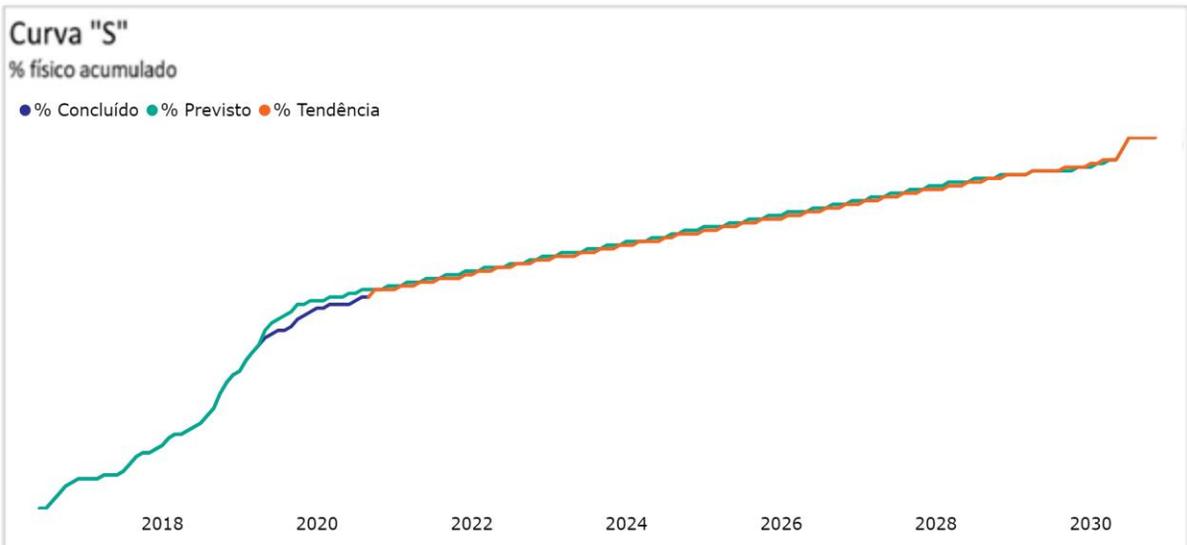


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos


Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	Caput	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Deliberação	122	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

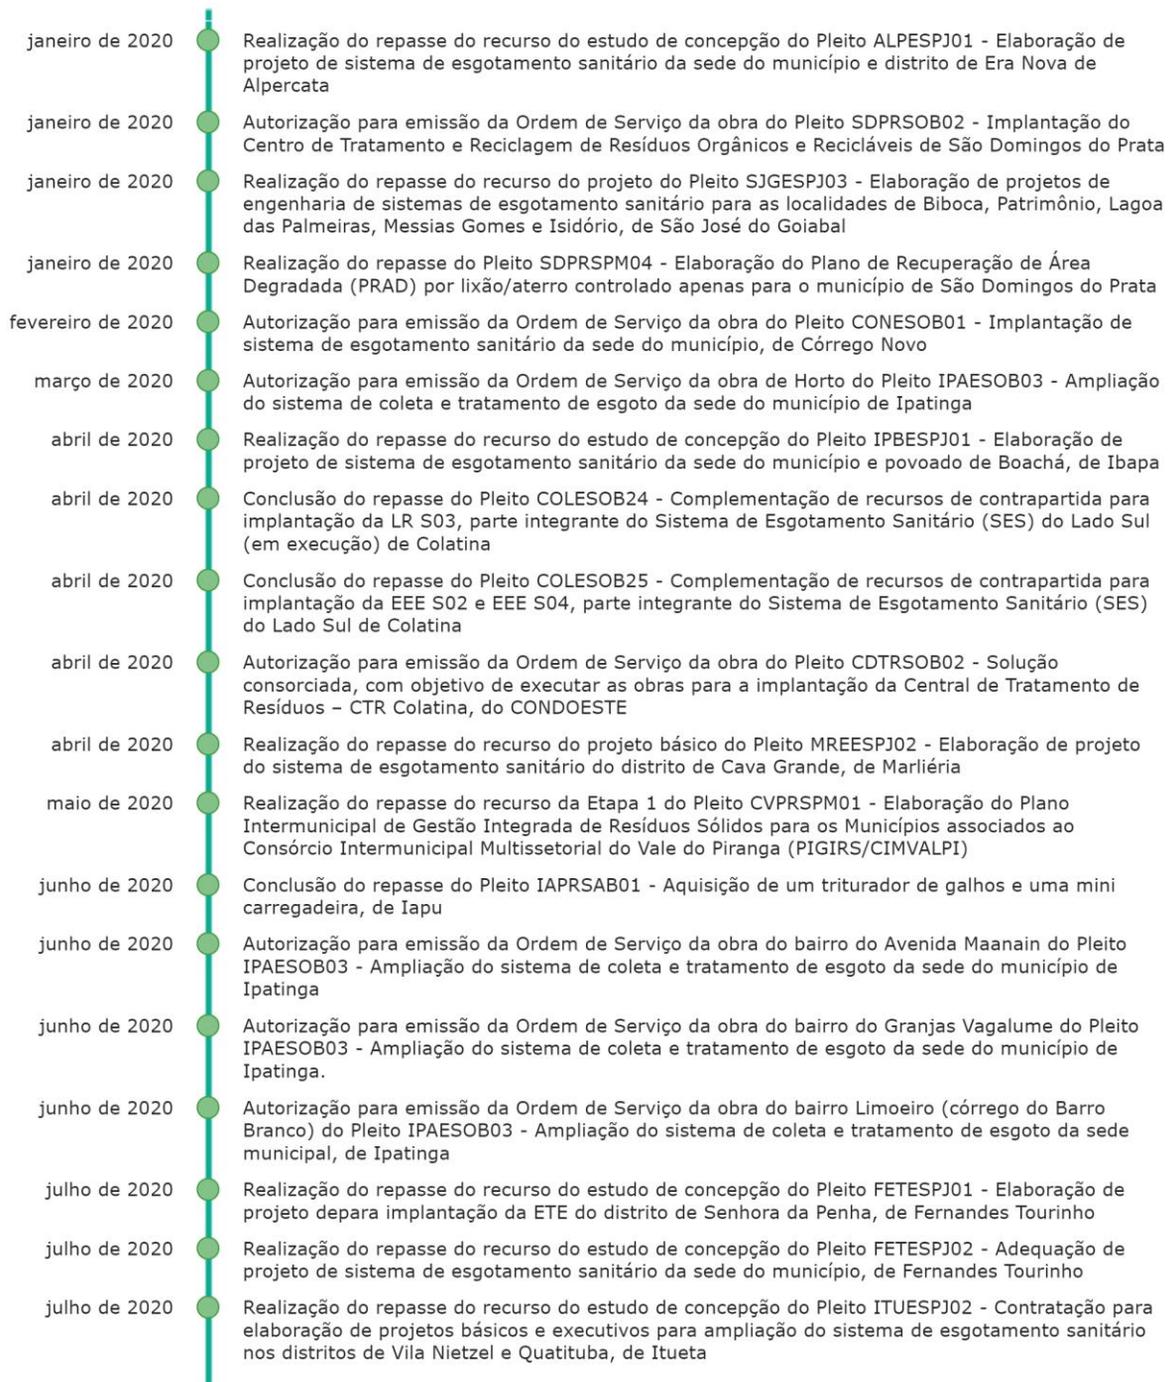

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2020



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2020

dezembro de 2020		Realização do repasse de 50% do valor do imóvel do Pleito SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão, de São Domingos do Prata
dezembro de 2020		Realização do repasse do estudo de concepção do Pleito CARESPJ01 - Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município de Caratinga
dezembro de 2020		Realização do repasse do recurso do estudo de concepção do Pleito RASESPJ02 - Elaboração de proj. de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a sede municipal, distritos de S. Vicente da Estrela, S. Sebastião do Óculo, Santana do Tabuleiro
dezembro de 2020		Realização do repasse do recurso do projeto básico do Pleito IPBESPJ01 - Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá, de Ibapa
dezembro de 2020		Realização do repasse do recurso do estudo de concepção do Pleito MRLESPJ07 - Adequação e elaboração de projetos dos sistemas de esgotamento sanitário de São Marcos, Monte Sinai, Patrão Mor, Brejal, Alto Liberdade e da Sede Municipal, de Marilândia
dezembro de 2020		Autorização para emissão da Ordem de Serviço da obra do Pleito SDPESOB05 - Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município, de São Domingos do Prata
dezembro de 2020		Conclusão do repasse de 50% do valor do Pleito SDPESCT02 - Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão, de São Domingos do Prata
dezembro de 2020		Autorização para emissão da Ordem de Serviço da obra do Pleito RESRSOB02 - Obras emergenciais no aterro do CIGIRS, de Resplendor

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

Fatos relevantes do mês

No dia 16/10 foram autorizados início das obras no município de Rio Doce, referente aos pleitos de Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES para os distritos de Matadouro, Jorge e São José de Entre Montes.

No dia 19/10 foi repassado ao município de Rio Casca o valor de R\$ 6.492,60 referente ao pleito de assessoria técnica para acompanhamento das obras.

No dia 20 foi autorizado o início das obras do pleito de construção do SES do município de Conselheiro Pena.

No dia 20/10 foi repassado ao município de Linhares o valor de R\$ 84.371,83 referente ao pleito de execução de obra.

No dia 20/10 foi repassado ao município de São José do Goiabal o valor de R\$ 251.095,18 referente ao pleito de execução de obra.

No dia 22/10 foi repassado ao município de Periquito o valor de R\$ 49.966,90 referente ao pleito de elaboração de projeto.

No dia 22/10 foi repassado ao município de Sem Peixe o valor de R\$ 200.065,19 referente ao pleito de execução de obra.

No dia 23/10 foi repassado ao município de Rio Casca o valor de R\$ 6.492,60 referente ao pleito de Assessoria Técnica para acompanhamento técnico das obras.

No dia 27/10 foi repassado ao município de Córrego Novo o valor de R\$ 297.664,89 referente ao pleito de execução de obra.

Grandes números do programa

- Foram repassados **R\$ 15.755.637,25** para **ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos**, aos municípios de Alpercata/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Periquito/MG Rio Casca/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga);
- Foram realizadas **727 horas de capacitação**, com os servidores públicos dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2. Foram ofertadas oficinas de capacitações de: Elaboração de projetos referentes à esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo licitatório e acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo IV);
- A equipe técnica realizou **1.523 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais.

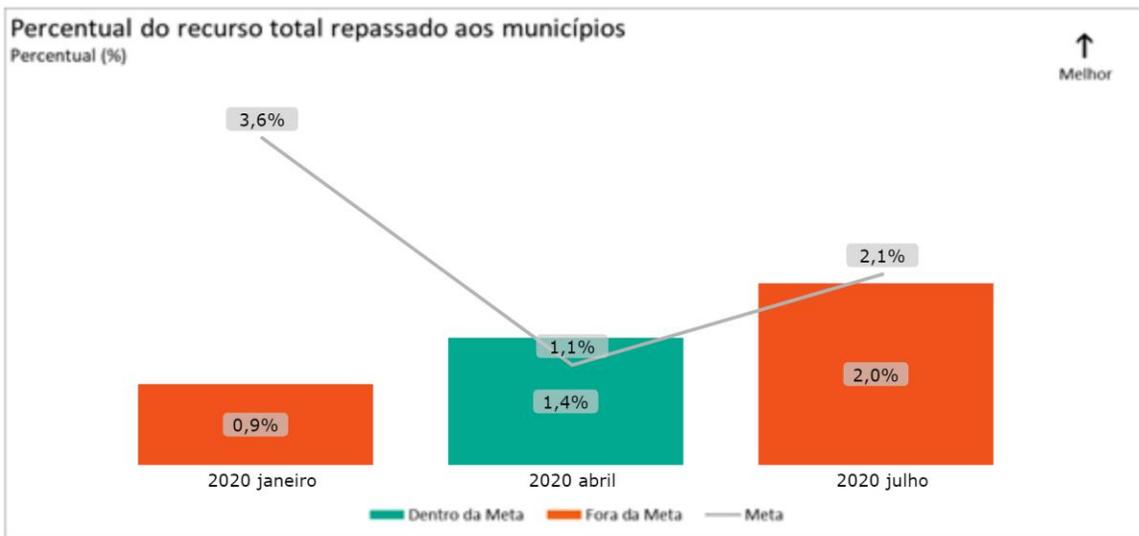


Gráfico 1. Percentual do recurso repassado.

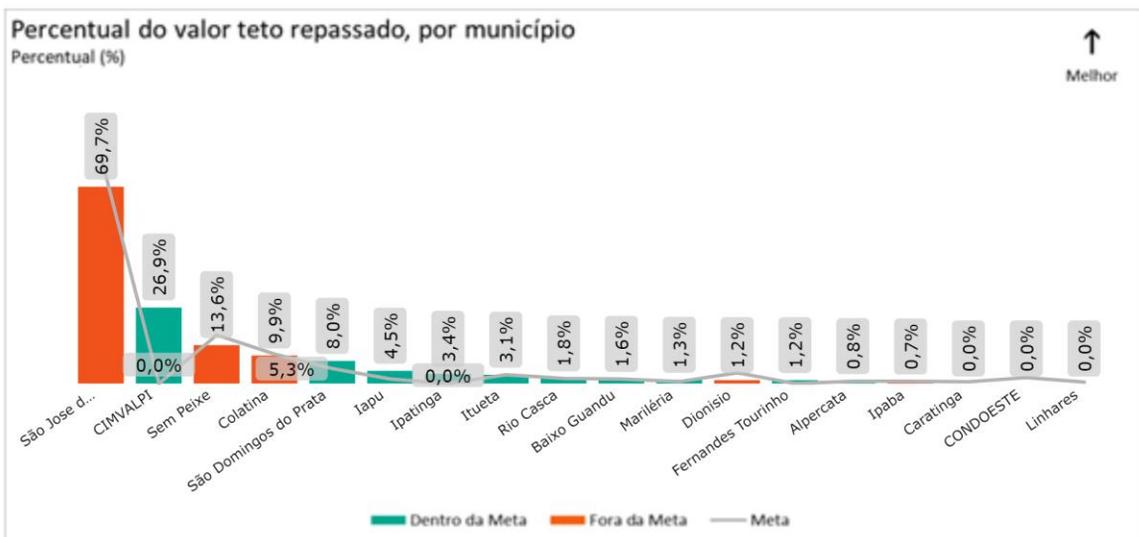


Gráfico 2. Percentual do valor teto repassado, por município.

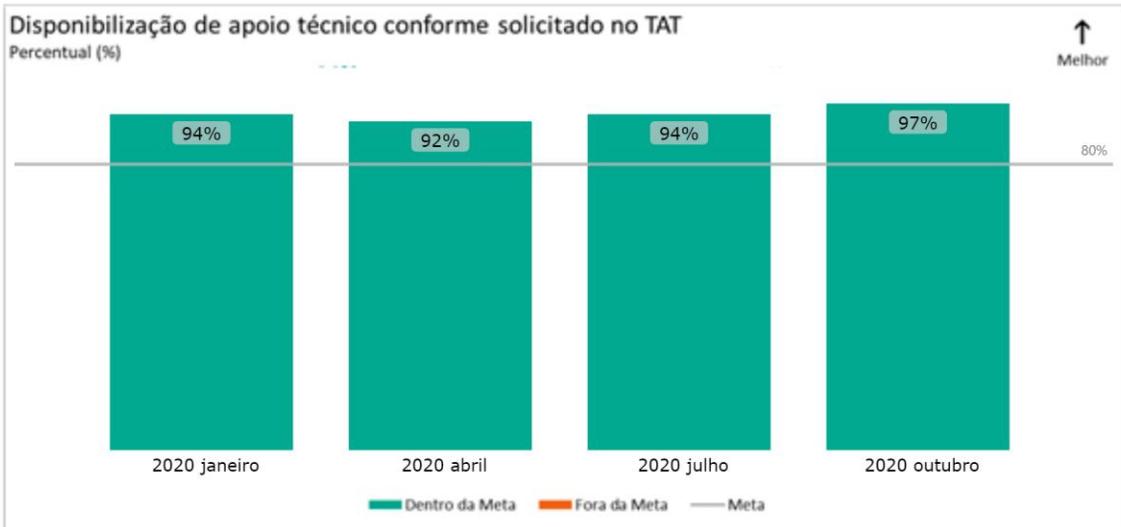


Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).

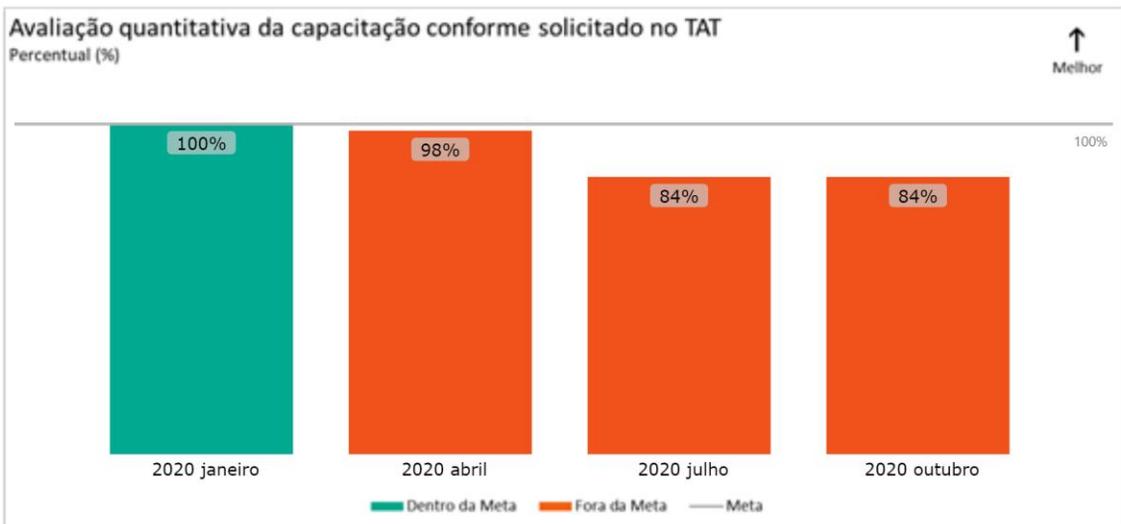


Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.

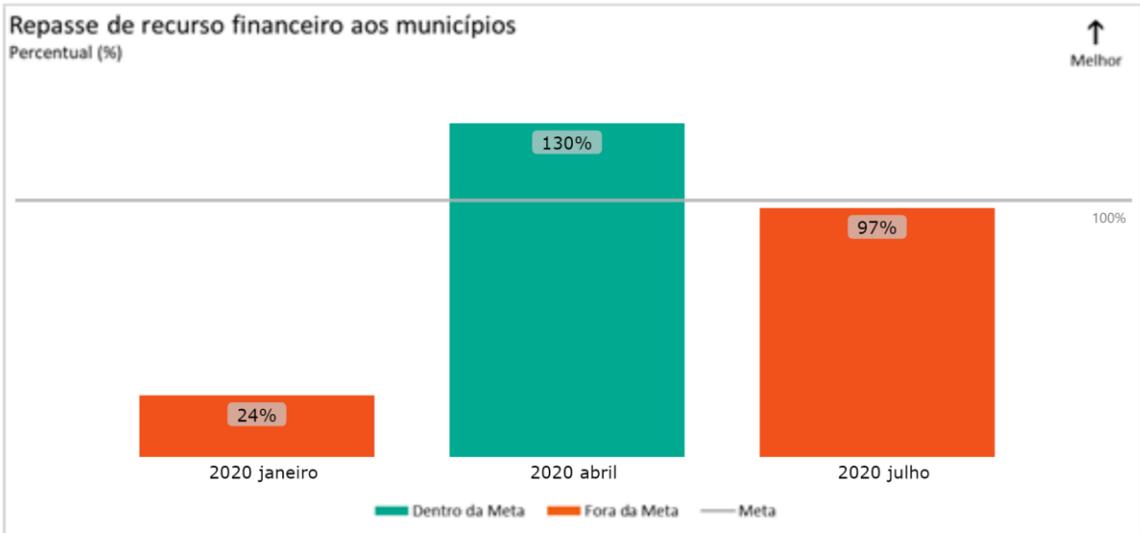


Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios.

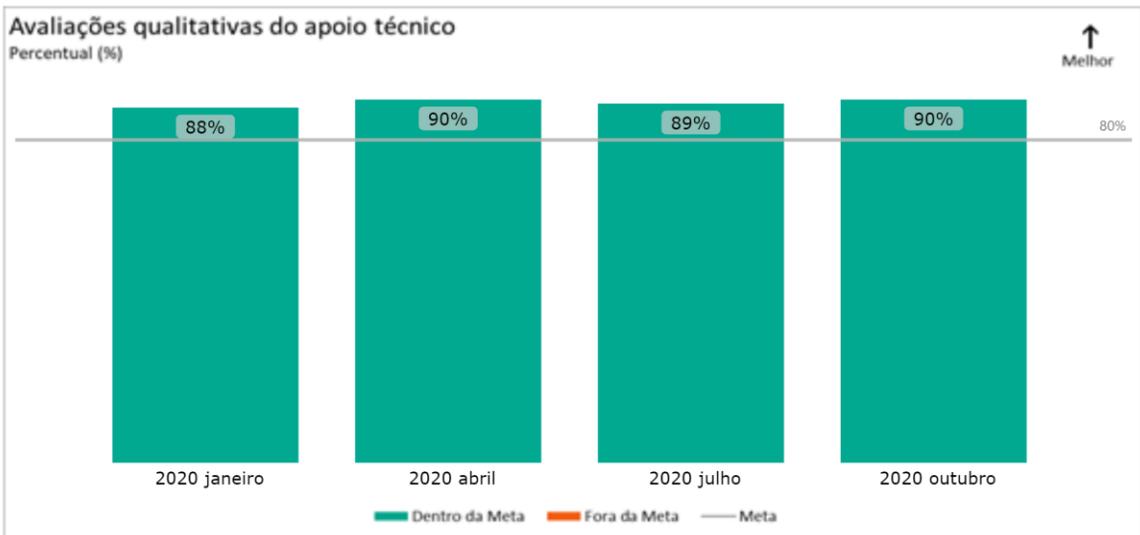


Gráfico 6. Avaliações qualitativas do apoio técnico.

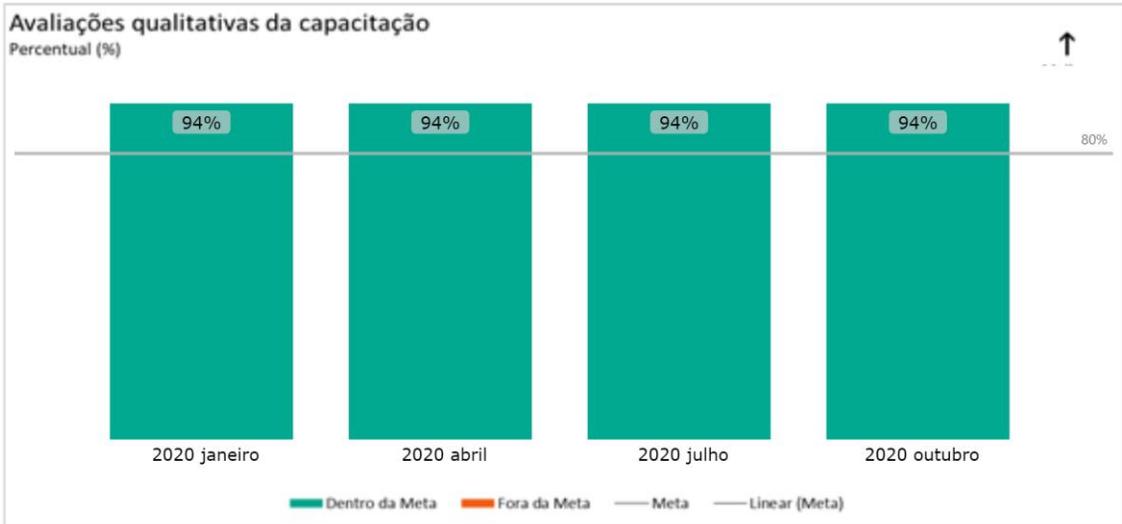


Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação.

Curva S do programa

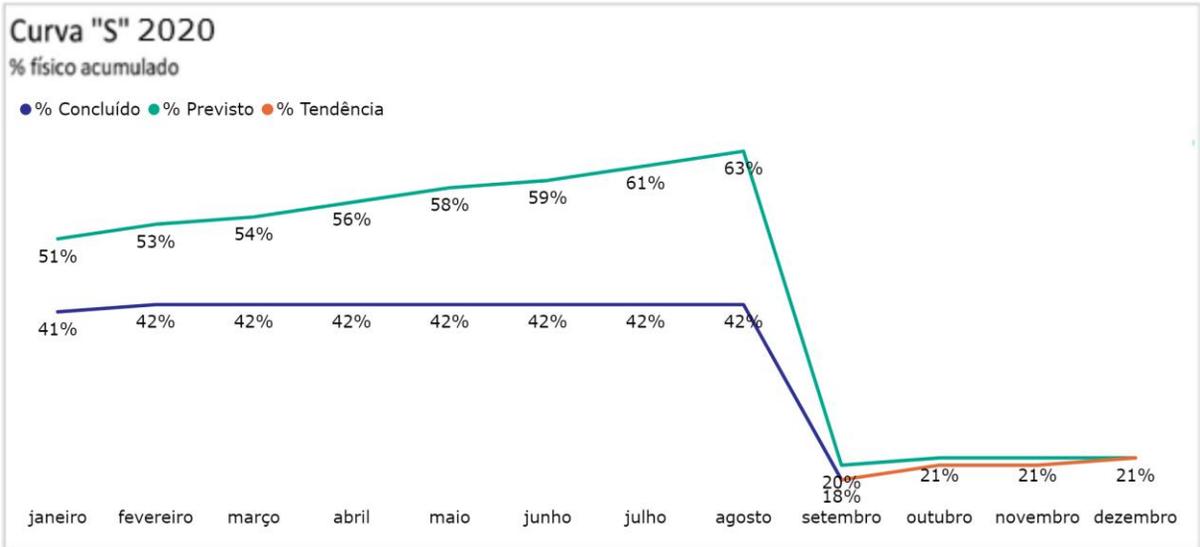


Gráfico 8. Curva "S" 2020 de avanço físico

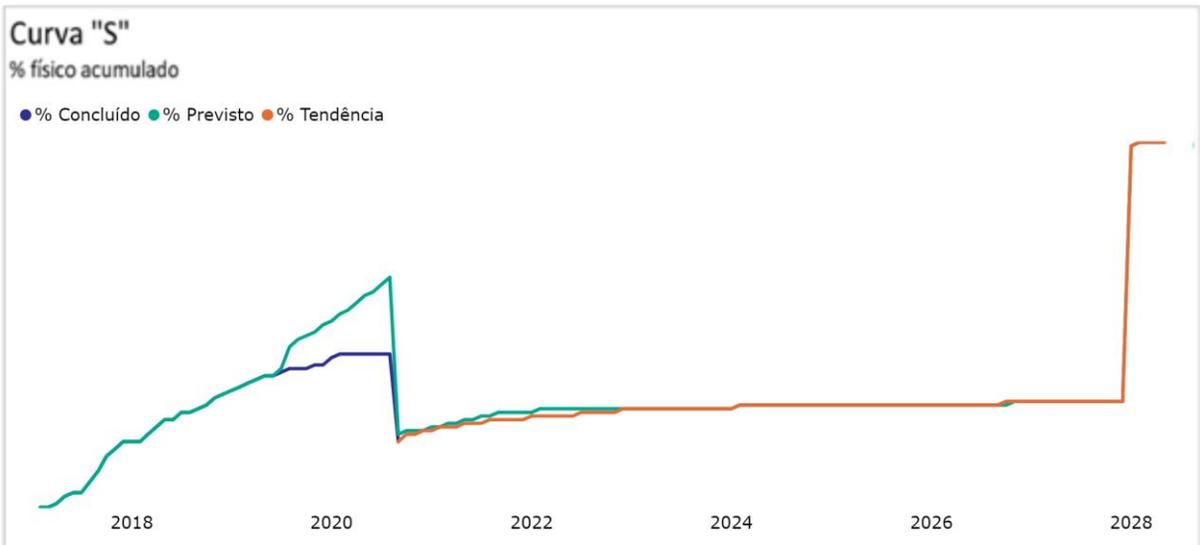


Gráfico 9. Curva "S" de avanço físico

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado

Deliberação	10	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	2	Concluído Internamente
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i;ii	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Reprogramado
Deliberação	4	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	443	a	Em Andamento
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

setembro de 2020	●	Elaboração do Projeto Básico - Captação Alternativa e ETA -Itueta/MG
setembro de 2020	●	Retomada das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Vila Isa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG
outubro de 2020	●	Conclusão das Obras de Captação Alternativa - Pedra Corrida/MG
novembro de 2020	●	Retomada das Obras (Estruturação Rede Elétrica) de Captação Alternativa (Poço C1 e C2) - Resplendor/MG
novembro de 2020	●	Conclusão das Obras de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água ETA Vila Isa - ETA Vila Isa - Governador Valadares/MG
novembro de 2020	●	Conclusão das obras de recuperação da pavimentação do Acesso Norte - Resplendor/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão das Obras da Captação Alternativa (Reestruturação da Rede Elétrica - Poço C1 e C2) - Resplendor/MG

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do Programa

- 13 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 10 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- 15 estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes do mês

Judicialização do Programa no contexto do Eixo Prioritário 9 da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. Muitos dos escopos das intervenções nas localidades estão sendo questionados judicialmente e, portanto, projetos e obras foram paralisados. Aguarda-se laudo pericial e conseqüente decisão judicial para revisão do escopo dos trabalhos e do cronograma de implantação de obras.

Início do projeto de captação e adução do poço novo de Regência/ES.

Conclusão dos trabalhos de campo para refinamento da lista de beneficiários do abastecimento por pipas e água mineral.

Conclusão da fabricação da balsa de captação do Rio Doce - Resplendor/MG.

Indicadores

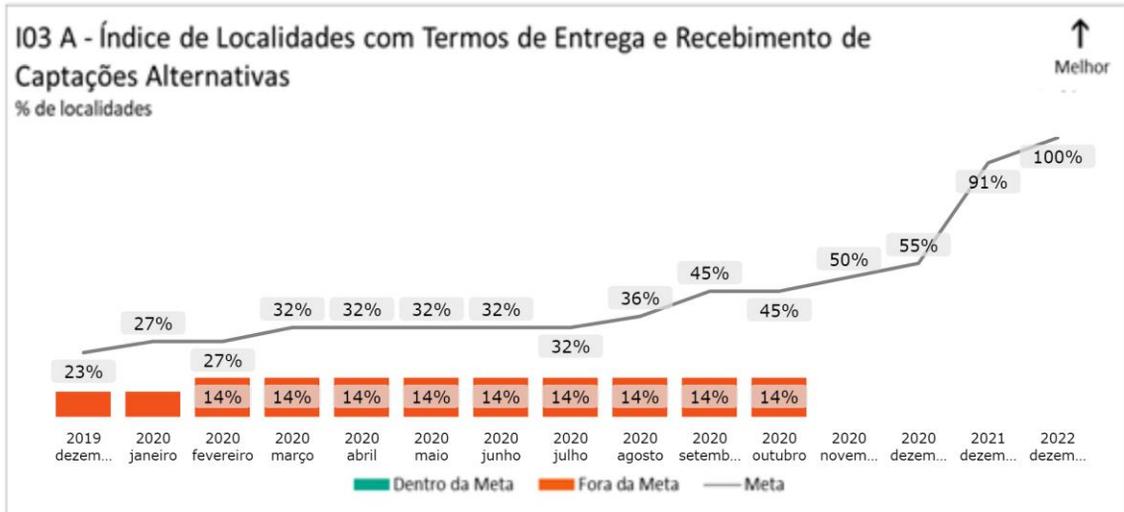


Gráfico 1. (%) de localidades com termo de entrega e recebimento de captações alternativas. Gráfico acumulado.

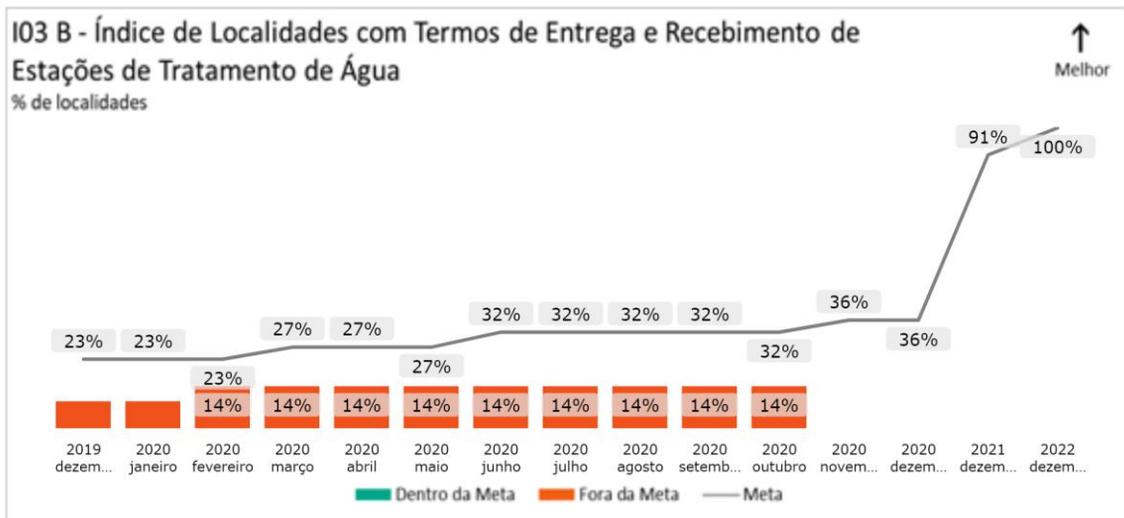


Gráfico 2. (%) de localidades com termo de entrega e recebimento de estações de tratamento de água. Gráfico acumulado.

Curva S do programa

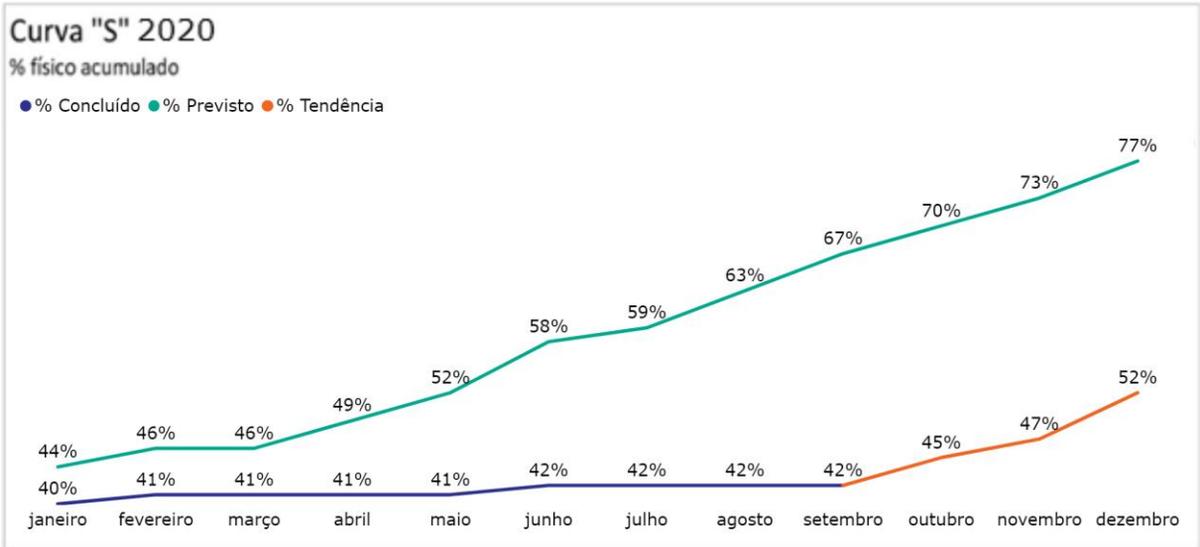


Gráfico 3. Curva "S" 2020 de avanço físico

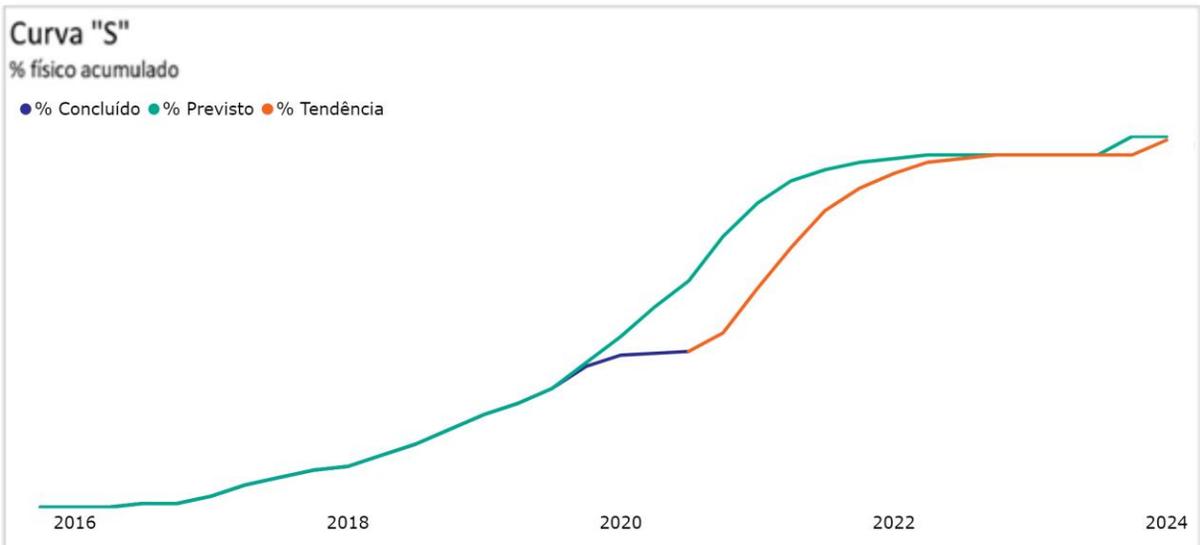


Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.


Cláusula	172	§1º (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	172	§1º (ação2)	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2020

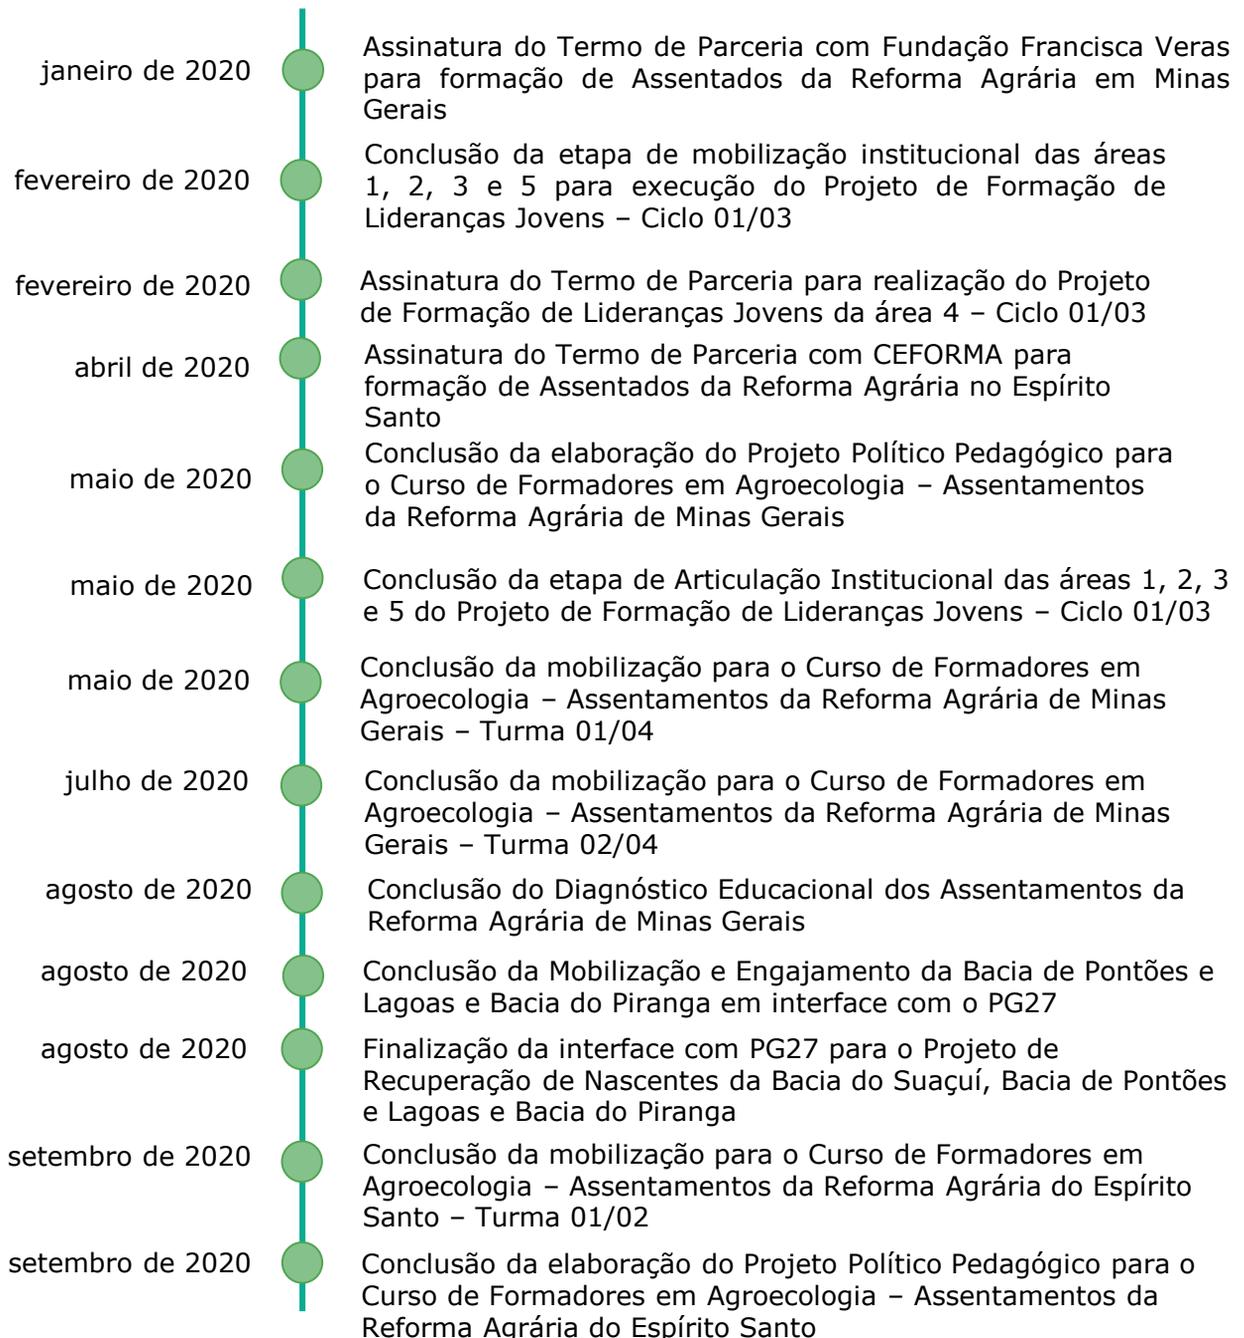

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Entregas do ano de 2020

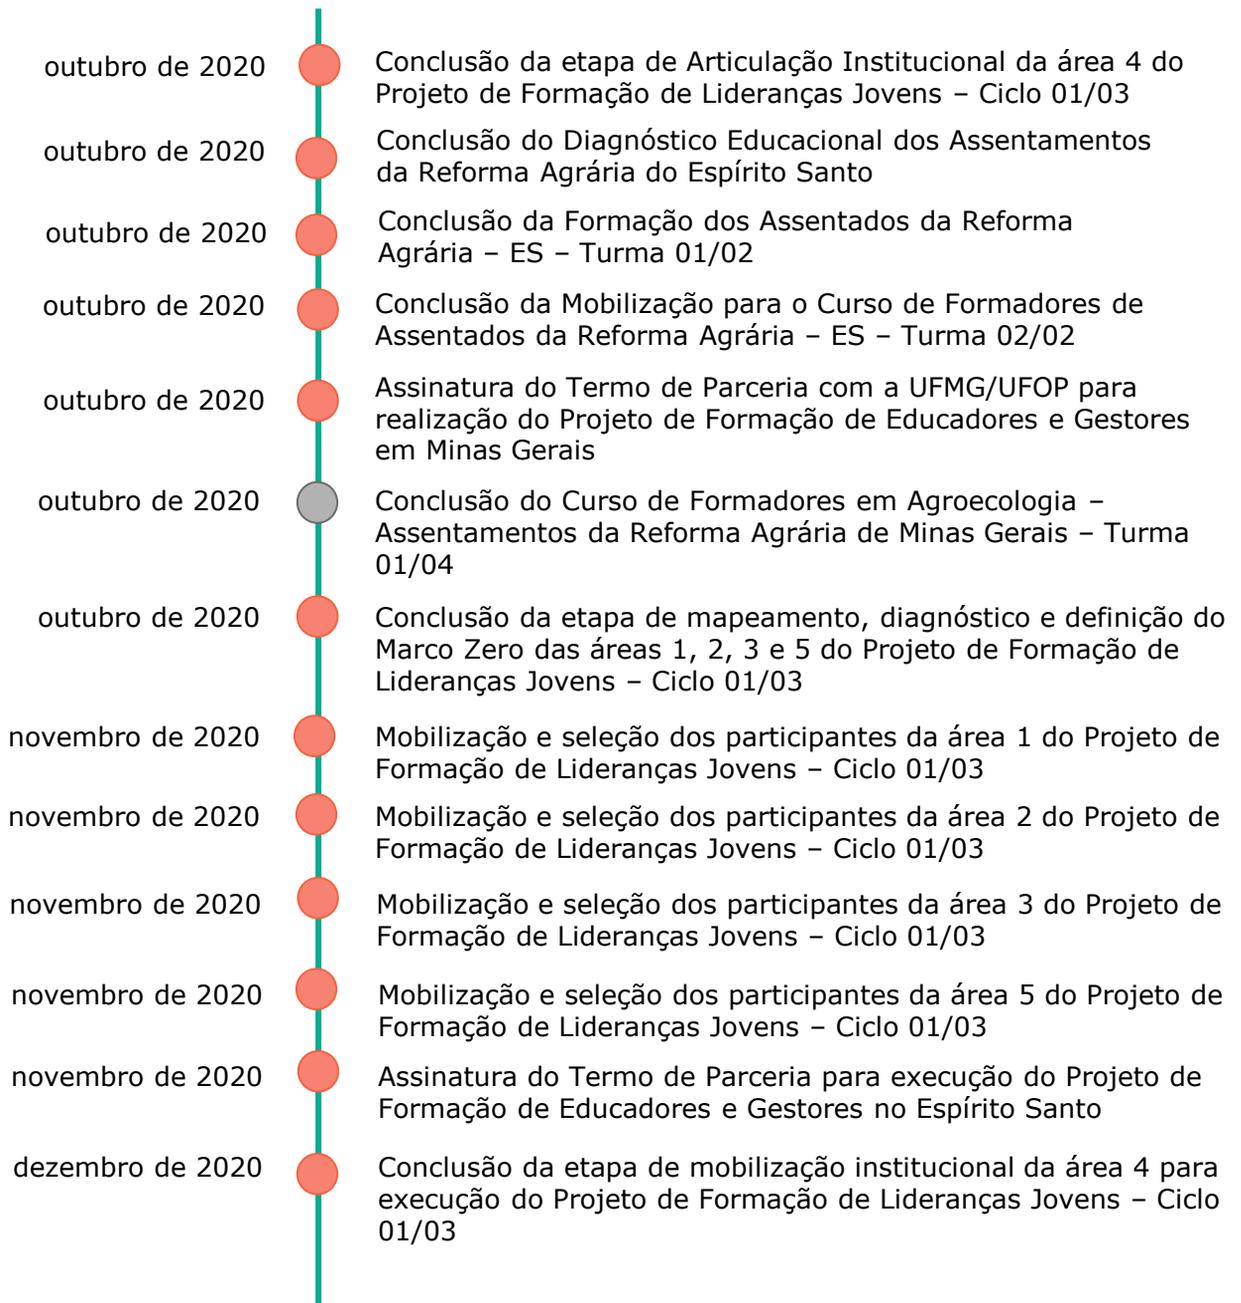

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos Relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

Curva S do programa

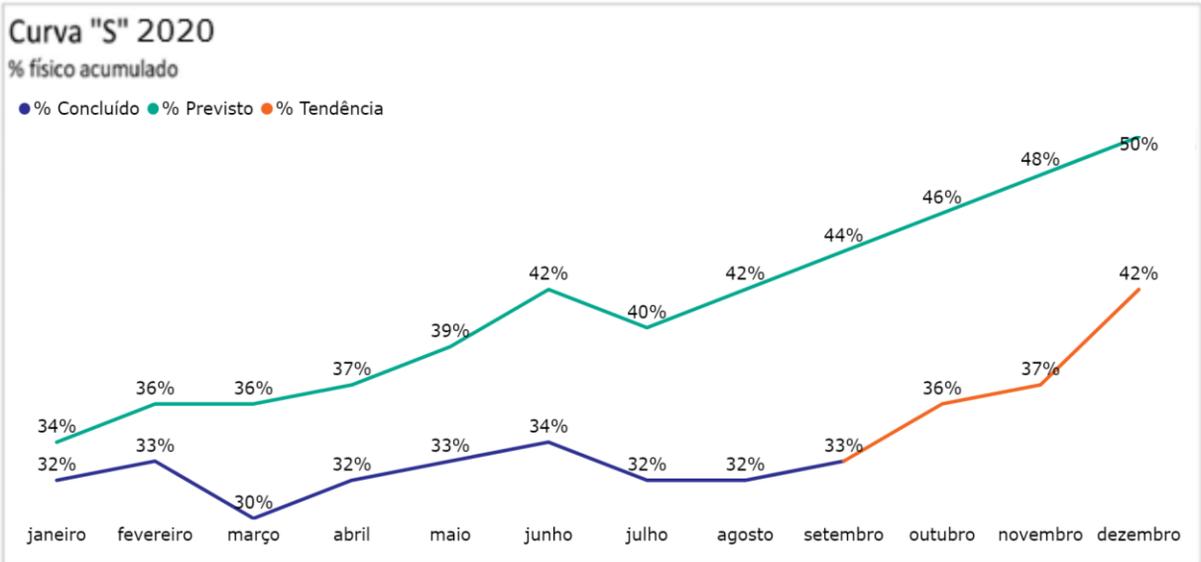


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

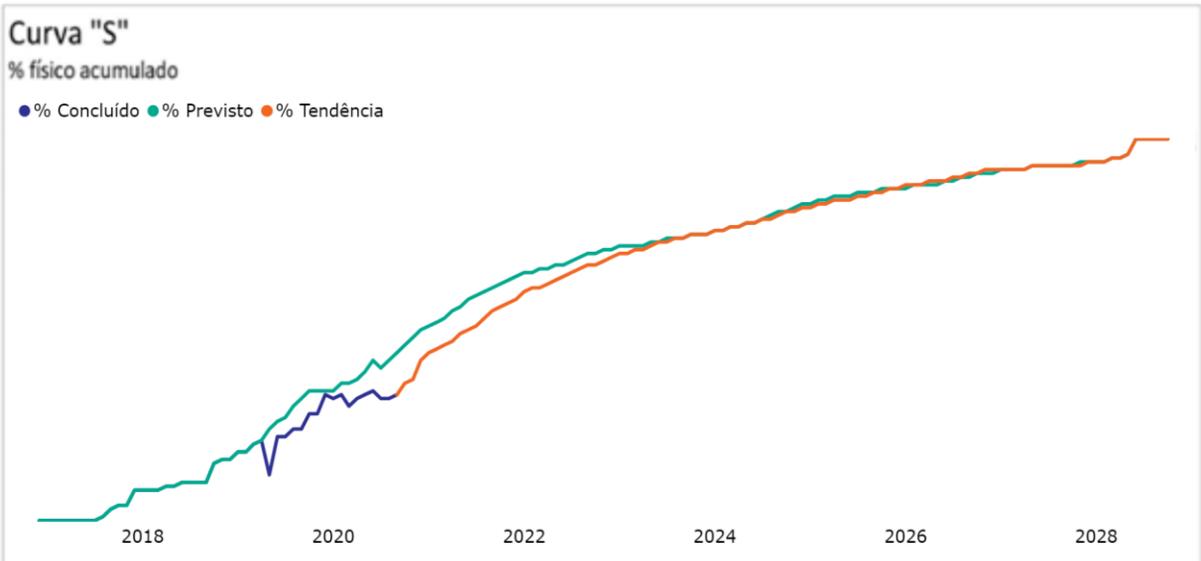


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Reprogramado
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

fevereiro de 2020	●	Atualização do Censo 2019 em Mariana/MG e Barra Longa/MG (área Dam Break e buffer de 15m)
março de 2020	●	Contratação da reposição de material da rádio para Digitalização da rede de rádio para a Defesa Civil de Mariana
abril de 2020	●	Entrega da proposta do Ciclo de Capacitação e Formação Continuada as Defesas Civis dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
outubro de 2020	●	Assinatura do Termo de Parceria com a Unisul para execução da Formação Continuada do Projeto de Capacitação das Defesas Civis
novembro de 2020	●	Realização do Apoio ao Simulado de resposta às situações de emergência de 2020 em Mariana/MG e Barra Longa/MG
novembro de 2020	●	Contratação da empresa responsável pelo Mapeamento das áreas de risco alto e muito alto dos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2020 nas 8 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão da Capacitação de 2020 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão da Digitalização da rede de rádio para Defesa Civil de Mariana/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão da Capacitação 2020 do Projeto Escola Segura nas 8 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão do Acompanhamento, monitoramento e avaliação das atividades executadas do projeto Escola Segura em 2020 nas 8 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2020 com a COMPDEC nas 8 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2020	●	Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2020 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos Relevantes do mês

Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil:

- Conclusão da execução do cronograma de publicações de outubro/20 da Assessoria Técnica Remota às Defesas Civis, que envolve estratégias para acompanhamento e continuidade das atividades desenvolvidas de apoio às Defesas Civis (Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Comitê Gestor de Riscos), durante o período de isolamento social devido a pandemia de COVID-19.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
101	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	Total de indivíduos formados / Total de indivíduos inscritos	%	-	-	-
102	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	Número de demandas atendidas / Total de solicitações de acordo com os critérios do Projeto	%	-	-	-
103	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	(Número de solicitações atendidas / Total de eventos solicitados dentro dos critérios) x 0,333 + (Cobertura de áreas de risco realizada / Cobertura de áreas de risco prevista) x 0,333 + (Número de Planos de Contingência elaborados / Total de Planos de Contingência previstos) x 0,333	%	-	-	-
104	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	Número de medidas cumpridas / Total de medidas planejadas	%	-	-	-

Curva S do programa

Em revisão, para adequação das alterações protocoladas na revisão da definição do programa.

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantar um Centro de Informações Técnicas (CIT) da Área Ambiental 1 em Mariana, bem como, um CIT na cidade de Governador Valadares (MG) e um em Linhares (ES). Essas estruturas são destinadas a comunicar e informar a população quanto aos aspectos socioambientais e socioeconômicos, conforme cláusula 174 (Anexo II) do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	174	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	174	§1º (Histórico 2016)	Concluído Internamente
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Em Andamento
Deliberação	437		Em Andamento

Entregas do ano de 2020

abril de 2020		Definição da Localização do CIT (Centro de Informações Técnicas) de Regência
agosto de 2020		Recebimento de nova Solicitação de Mundaça de Local pela Prefeitura
agosto de 2020		Atendimento a NT15 (Revisão do Projeto Conceitual do Centro de Informações Técnicas de Mariana)
agosto de 2020		Início do processo de comunicação, interação e engajamento com a Comunidade
outubro de 2020		Início das Obras de Reforma do CIT Mariana
outubro de 2020		Protocolo da Definição do Programa - Revisão 1 no CIF pela FR
novembro de 2020		Aprovação da Definição do Programa pelo CIF
novembro de 2020		Validação da Concepção do espaço do CIT (Centro de Informações Técnicas) em Regência
dezembro de 2020		Finalização da Implantação do Repositório Técnico

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

Aprovação do projeto conceitual para Construção do CIT de Regência pelo ICMbio.

Aprovação da identidade visual dos espaços dos três CIT's – Mariana, Governador Valadares e Regência.

Apresentação do projeto conceitual aprovado do CIT de Regência na reunião realizada no dia 15/10/20 na CT-PDCS.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a CT-PDCS, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa

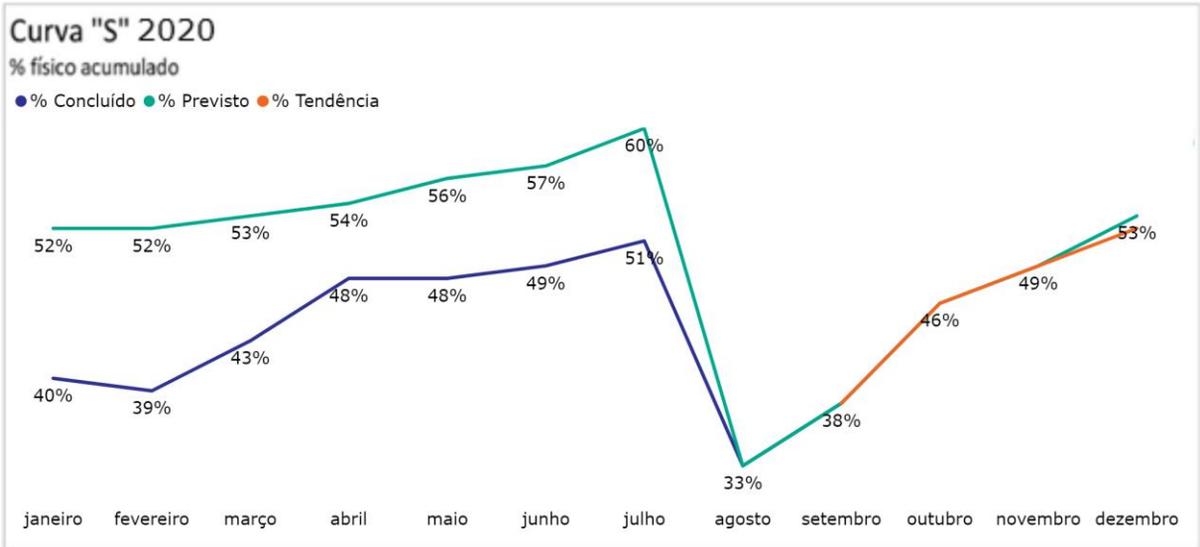


Gráfico 1. Curva "S" 2020 de avanço físico

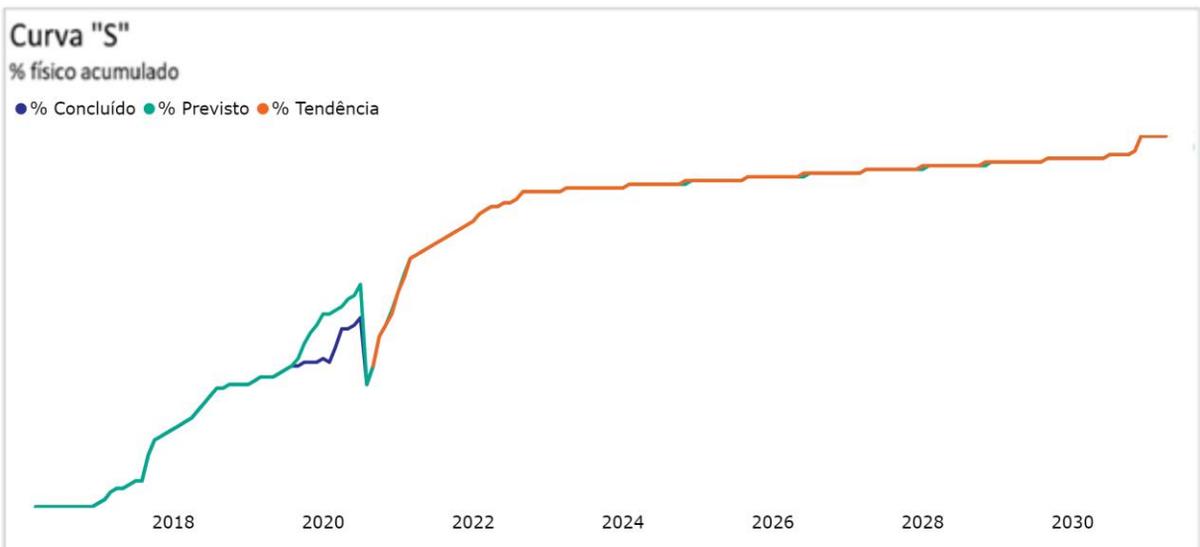


Gráfico 2. Curva "S" de avanço físico

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer sítio eletrônico, em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e os programas desenvolvidos em função do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

Entregas do ano de 2020

dezembro de 2020



Execução do processo de manutenção do sítio eletrônico

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	ACUMULADO 2020	ACUMULADO 2016 a 2020
Acessos ao site	105.128	136.411	1.073.622	3.271.446
Documentos no site	12	8	77	352
Vídeos	3	9	88	439
Notícias Publicadas	5	10	121	724

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

INDICADOR	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020
Tempo médio de resposta nas redes sociais*	24h	24h
Alcance orgânico LinkedIn (impressões)**	215.093	50.253
Alcance orgânico Facebook	31.100	36.234
Visualizações no Youtube (views)	6.573	12.278
Acessos das cidades prioritárias ao site***	65.742	85.230
Visualizações de páginas de serviço	99.707	127.292

*POR UMA LIMITAÇÃO DE ACESSO À API DO LINKEDIN, O TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA NÃO CONSIDERA DADOS DESTA FERRAMENTA. **O LINKEDIN DISPONIBILIZA APENAS DADOS DE IMPRESSÕES, NÃO DE ALCANCE. ***OS NÚMEROS PODEM SOFRER VARIAÇÕES, TENDO EM VISTA QUE ALGUMAS LOCALIDADES NÃO SÃO MAPEADAS/AVALIADAS NO GOOGLE ANALYTICS.

Os indicadores reportados acima são mensurados mensalmente, entretanto, conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Esse processo encontra-se em andamento.

Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço físico do programa.

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Desenvolver e implementar um programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, área estuarina, costeira e marinha impactadas, gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para suportar a tomada de decisões dos demais programas da Fundação Renova, órgãos ambientais e agências de água.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	178	Caput	Em Andamento
Deliberação	310	1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.1	Em Andamento
Deliberação	310	3.2	Planejado
Deliberação	383	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2020

março de 2020		Protocolo do 1º Relatório Mensal de QA/QC (campanha nov/2019)
abril de 2020		Protocolo do 2º Relatório Mensal de QA/QC(campanha dez/19)
maio de 2020		Protocolo do 3º Relatório Mensal de QA/QC(campanha jan/20)
maio de 2020		Protocolo do 4º Relatório Mensal de QA/QC(campanha fev/20)
junho de 2020		Protocolo do 5º Relatório Mensal de QA/QC(campanha mar/20)
dezembro de 2020		Primeira revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
dezembro de 2020		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Em 2020 está aprovado um orçamento de **R\$ 35.000.000** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;
- **650 quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, **230 quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- **92 pontos de monitoramento** distribuídos no Rio Doce e na zona costeira indicam que a água bruta do Rio Doce pode ser consumida após tratamento convencional;
- Entre esses pontos estão **22 estações automáticas** que geram informações em tempo real;
- **80 parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e nos sedimentos.

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- São **302 pontos de monitoramento**, sendo 39 com tratamento e 263 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios entre Mariana – MG a São Mateus – ES; Sendo que, em função do Covid-19 o monitoramento está sendo realizado apenas em 56 pontos.
- São monitorados mensalmente **78 parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados **82 parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados **23 parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Retomada da Operação da Estação Automática de Monitoramento RDO04 após interrupção de operação devido as chuvas ocorridas em janeiro de 2020 em 23/10

Protocolo do Relatório Mensal QAQC PMQQS referente ao mês de SET/20 em 26/10

Entrega Final e Divulgação da Plataforma Online do PMQQS www.monitoramentoriodoce.org em atendimento à Deliberação CIF nº455 em 30/10

Indicadores

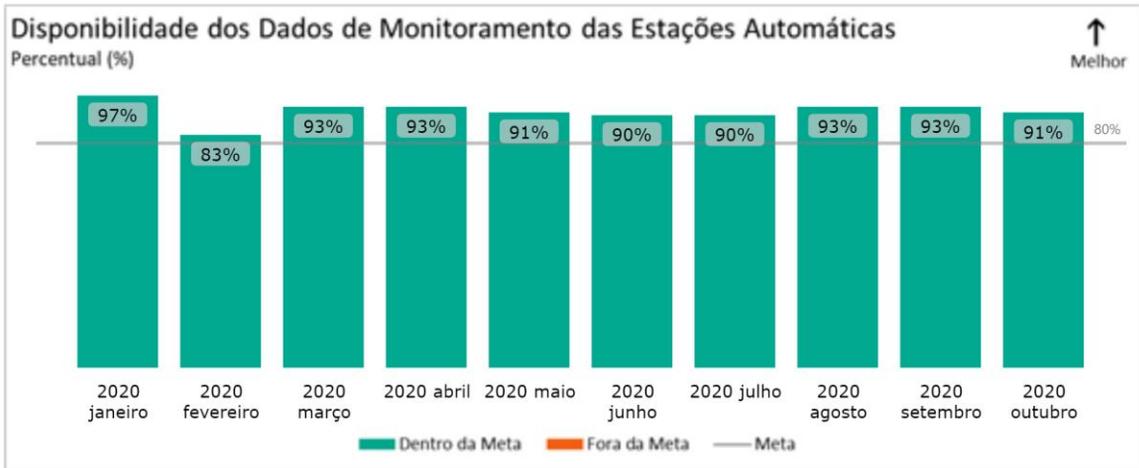


Gráfico 1. Disponibilidade dos dados de monitoramento das estações automáticas.

O resultado do indicador de “Disponibilidade de Dados de Monitoramento das Estações Automáticas” apresentou resultado positivo no mês de outubro, assim como nos demais meses de 2020.

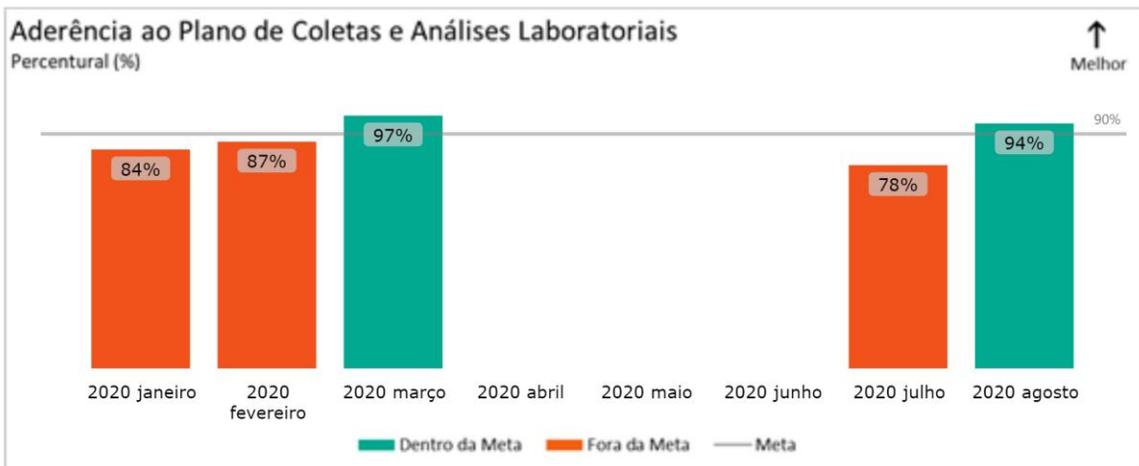


Gráfico 2. Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais.

O indicador de “Aderência ao plano de coleta e análises laboratoriais” é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, de acordo com a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

Curva S do programa

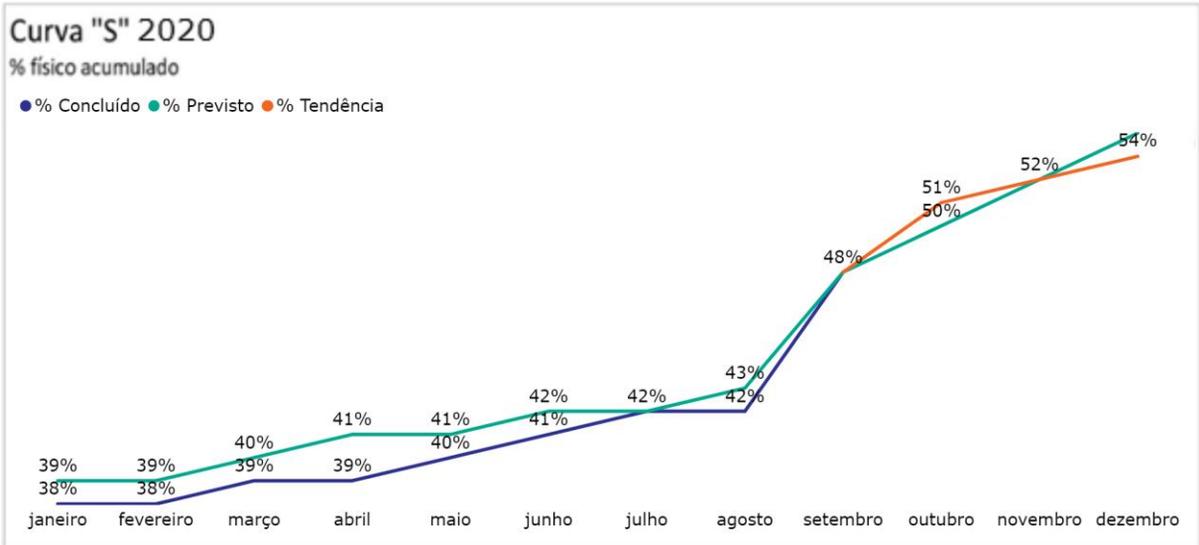


Gráfico 3. Curva "S" 2020 de avanço físico

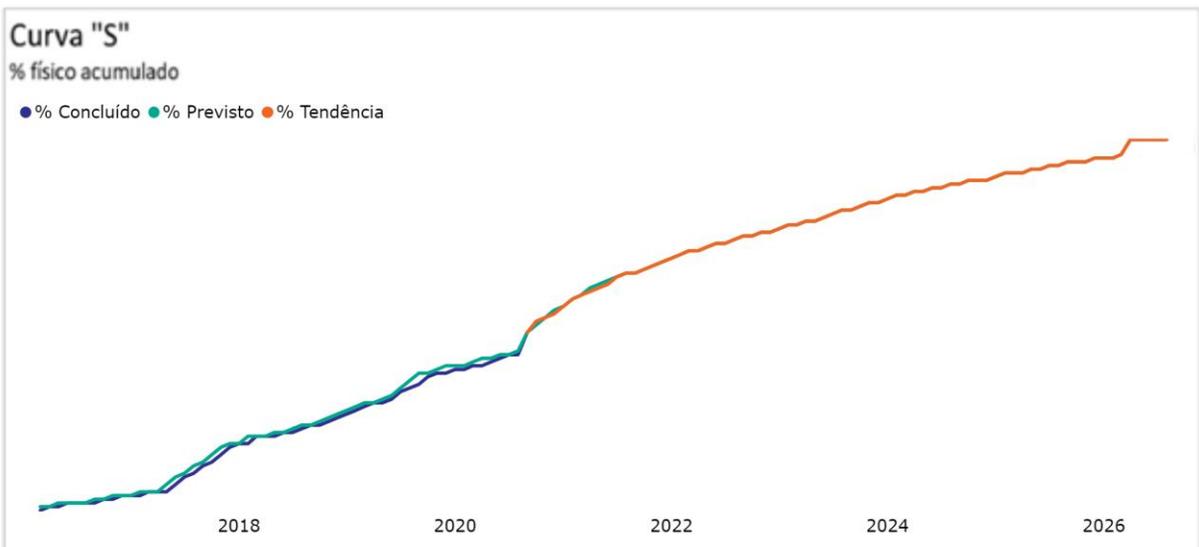


Gráfico 4. Curva "S" de avanço físico

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo custear estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação direta e indiretamente afetadas pelo rompimento da barragem e implementar ações de reparação. Além disso, custear em caráter compensatório, ações referentes à consolidação de duas Unidades de Conservação (UC), além de ações compensatórias na Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo Poder Público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Reprogramado
Deliberação	36	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- janeiro de 2020  Realizar Oficina de Avaliação dos impactos ambientais e medidas reparatórias das Unidades de Conservação do grupo Continentais 1
- outubro de 2020  Contratação para elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
- novembro de 2020  Assinatura do Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto Estadual de Florestas para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
- novembro de 2020  Realizar Oficina de Avaliação dos impactos ambientais e medidas reparatórias nas Unidades de Conservação da Bahia do grupo Costeiras 1

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 5 **Oficinas de Diagnóstico** realizadas para apresentar e debater o diagnóstico de linha de base dos meios físico, biótico e socioeconômico para as Unidades de Conservação e novas informações compartilhadas pelos participantes;
- 4 **Oficinas de Avaliação** realizadas para apresentar e discutir os resultados das expedições a campo e analisar as propostas de novos estudos ou medidas reparatórias para as Unidades de Conservação avaliadas;
- Protocolo dos relatórios finais dos estudos de avaliação de impactos de 6 **Unidades de Conservação** avaliadas.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro

Indicadores

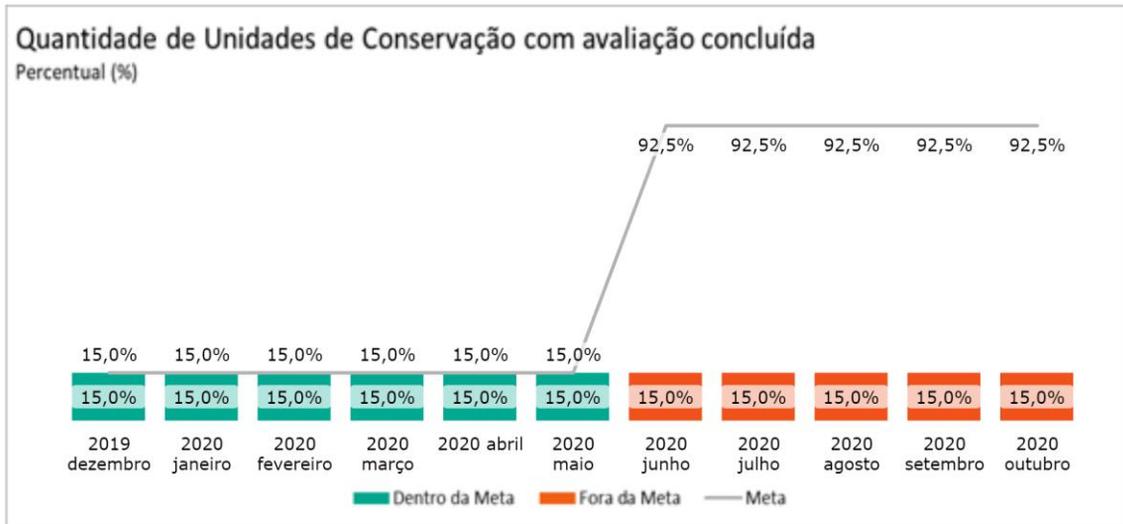


Gráfico 1. Quantidade de Unidades de Conservação com avaliação conduzida. Gráfico Acumulado.

O cronograma de conclusão da avaliação de impactos das três Unidades de Conservação da Bahia está em definição, devido ao contexto atual e as medidas restritivas para enfrentamento da emergência causada pela pandemia do Covid-19.

Curva S do programa

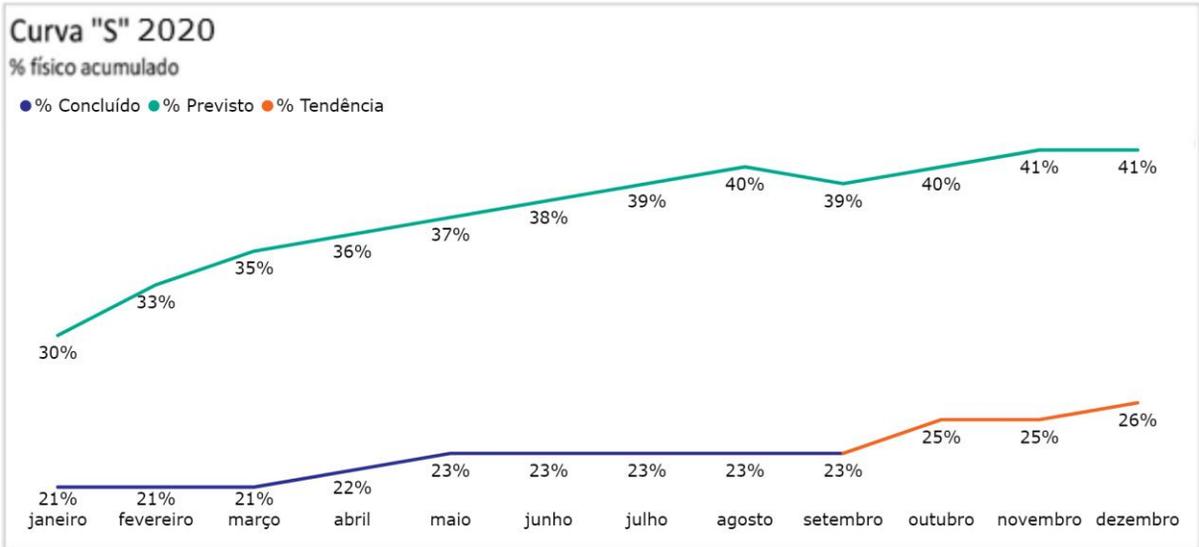


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

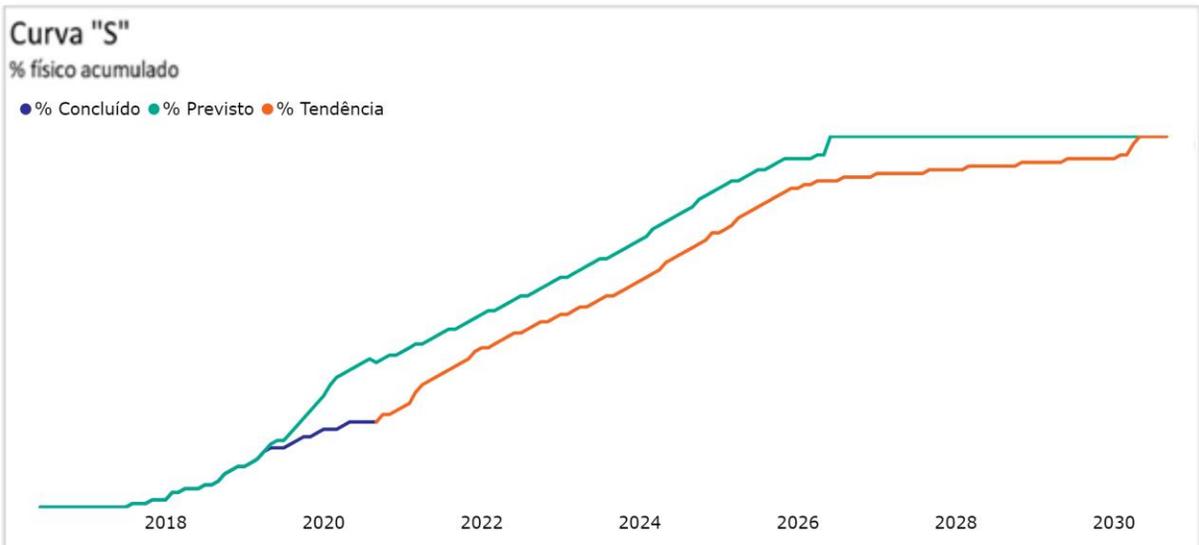


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	Caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- agosto de 2020 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- agosto de 2020 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- setembro de 2020 ● Programa 40 validado pelo CIF após revisão da definição

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Continuação das atividades de retificação do CAR pela empresa contratada no município de Mariana/MG. A empresa está atuando conforme os procedimentos adotados para o período de pandemia.

As ações no Médio Rio Doce ainda não se iniciaram.

As ações no Baixo Rio Doce ainda não se iniciaram.

Indicadores

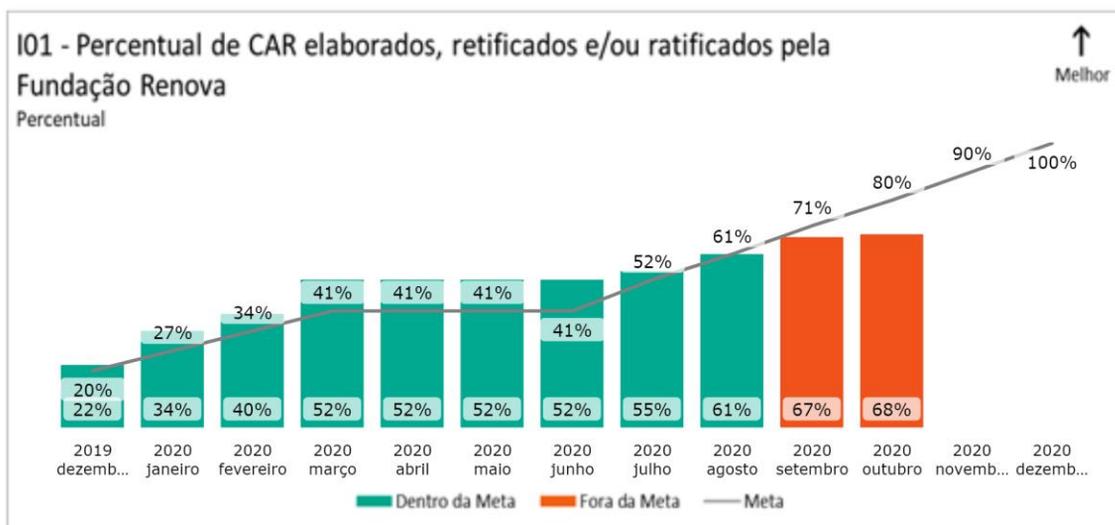


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Nota: A meta do indicador é elaborar, retificar e/ou ratificar os cadastros de todos os proprietários que aderirem ao programa. Atualmente, o programa possui 244 proprietários aderidos. Destes, 166 já foram retificados durante a 2ª Campanha de Re-ratificação do CAR.

Aproximadamente 28 proprietários/posseiros declinaram ao Fomento ao CAR e PRA. A Fundação Renova fará uma nova visita aos declinados para apresentar as ações do programa e sanar dúvidas existentes, entregando um comunicado dando prazo para retorno sobre a adesão ou não ao programa.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	STATUS ATÉ outubro de 2020		
				PREVISTO	REALIZADO	FAROL
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%	-	-	-
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%	-	-	-

Curva S do programa

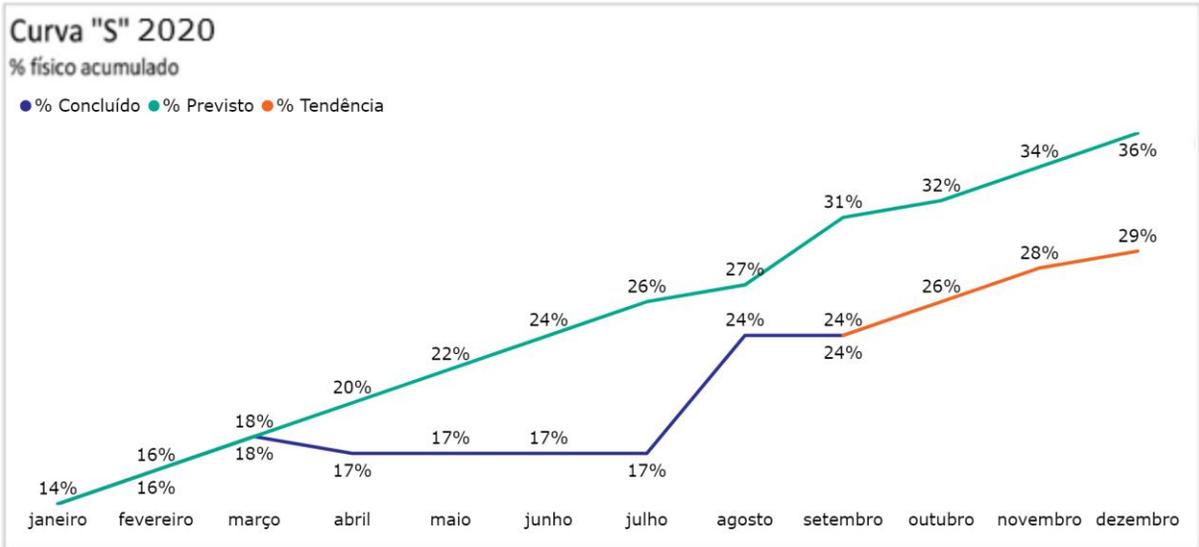


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

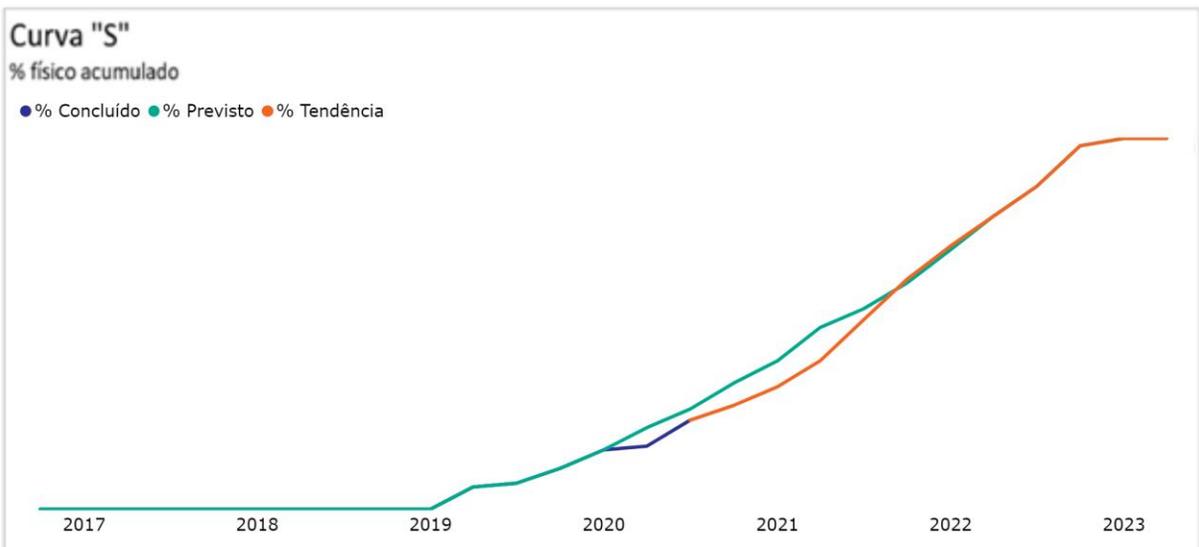


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, devidamente comprovados por meio de documentos oficiais, dentre os quais notas de empenho de despesas e declaração de autoridade competente.

Cláusula	141	Caput	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Em Andamento
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	49	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	78	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2020

- julho de 2020 Realização do ressarcimento à COPASA
- outubro de 2020 Realização do ressarcimento às prefeituras

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de outubro.

Indicadores

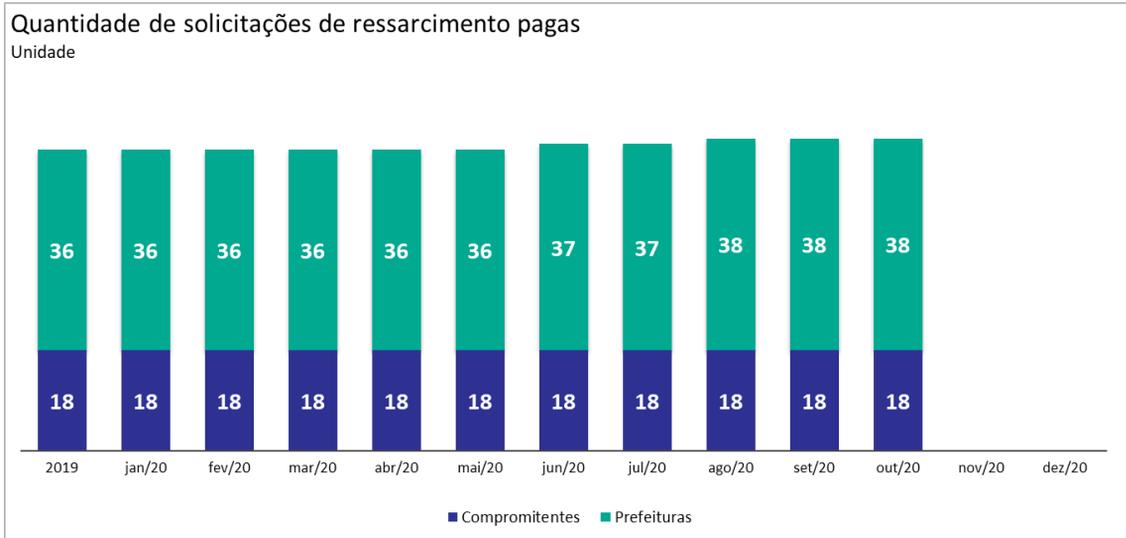


Gráfico 1. Quantidade de Solicitações de Ressarcimento Pagas. Gráfico Acumulado.

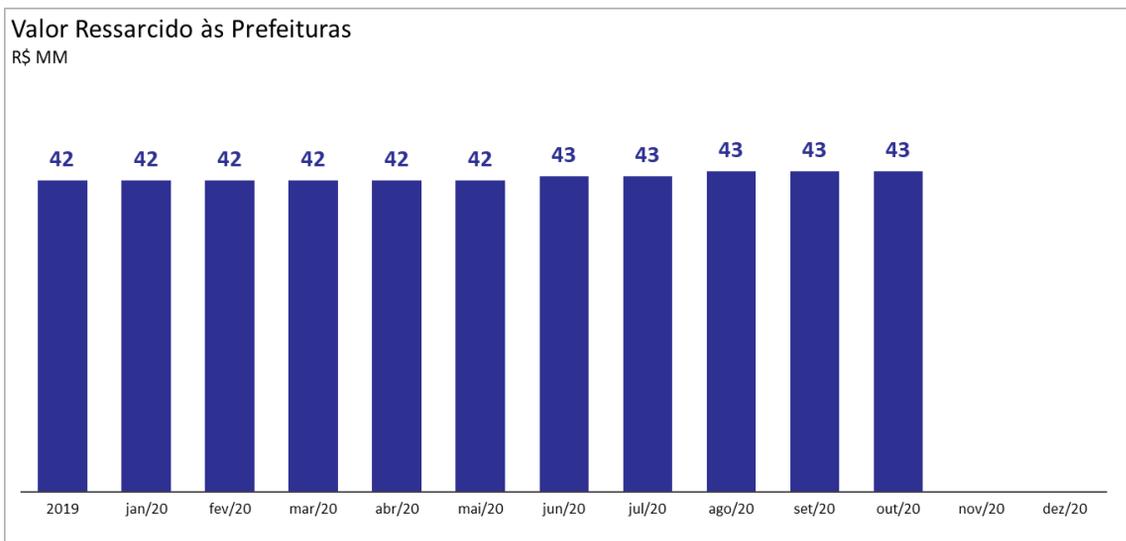


Gráfico 2. Valor Ressarcido às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

Indicadores

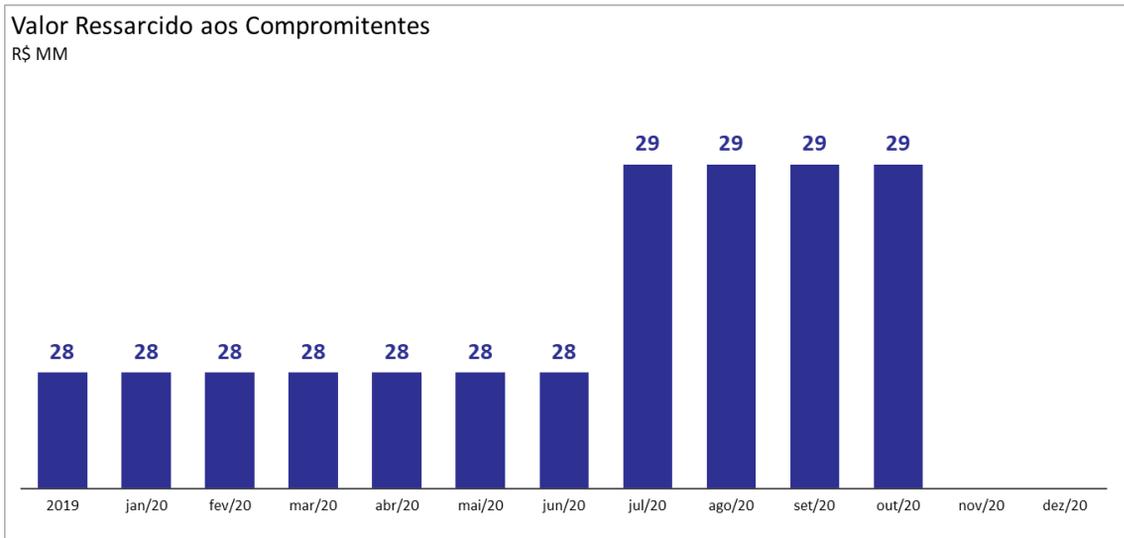


Gráfico 3. Valor Ressarcido aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

Curva S do programa

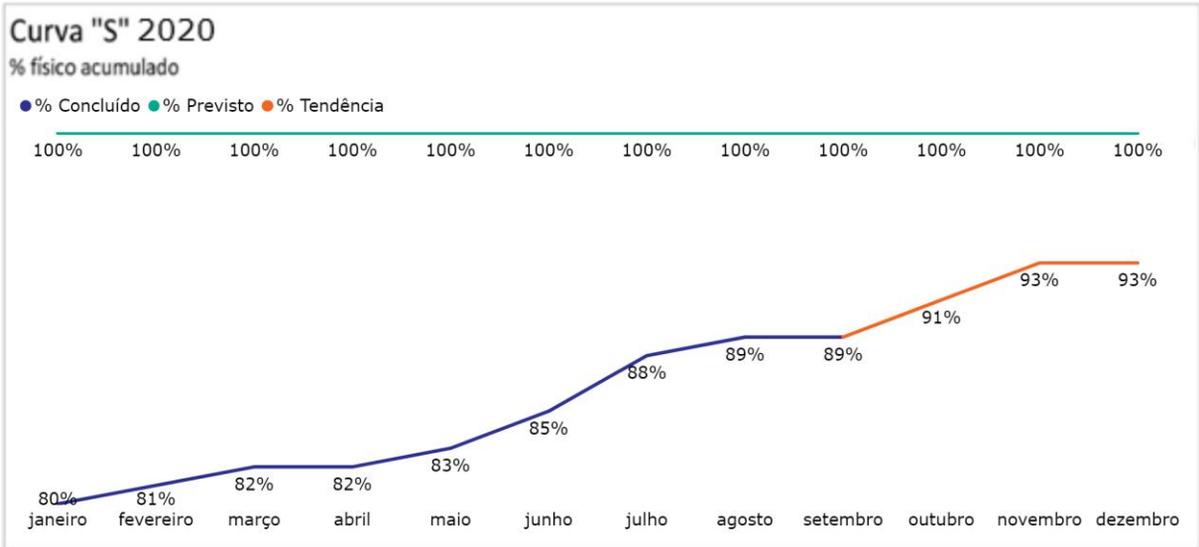


Gráfico 2. Curva "S" 2020 de avanço físico

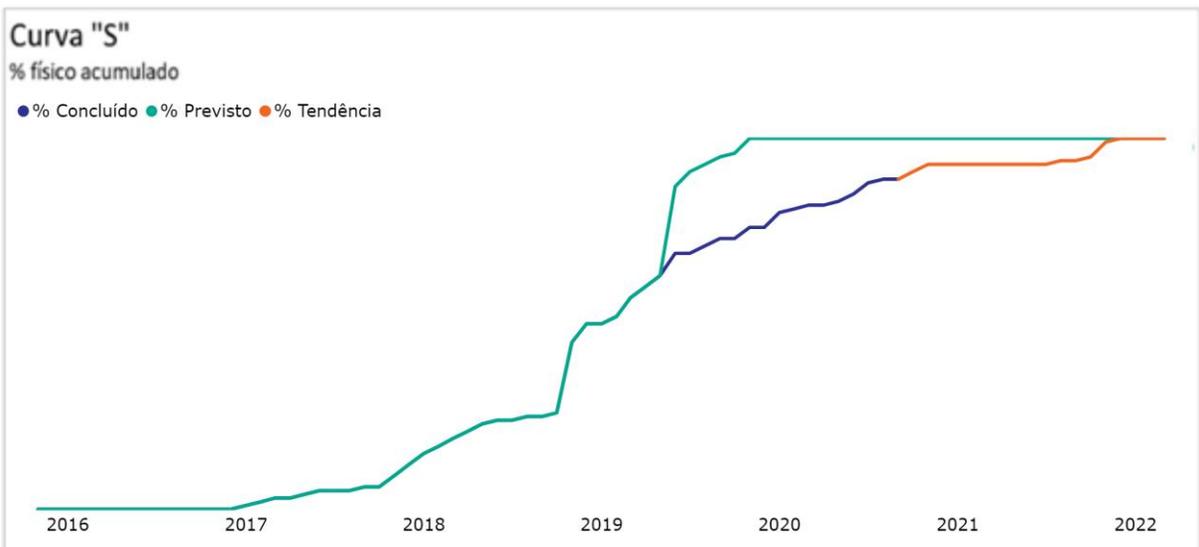


Gráfico 3. Curva "S" de avanço físico

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados

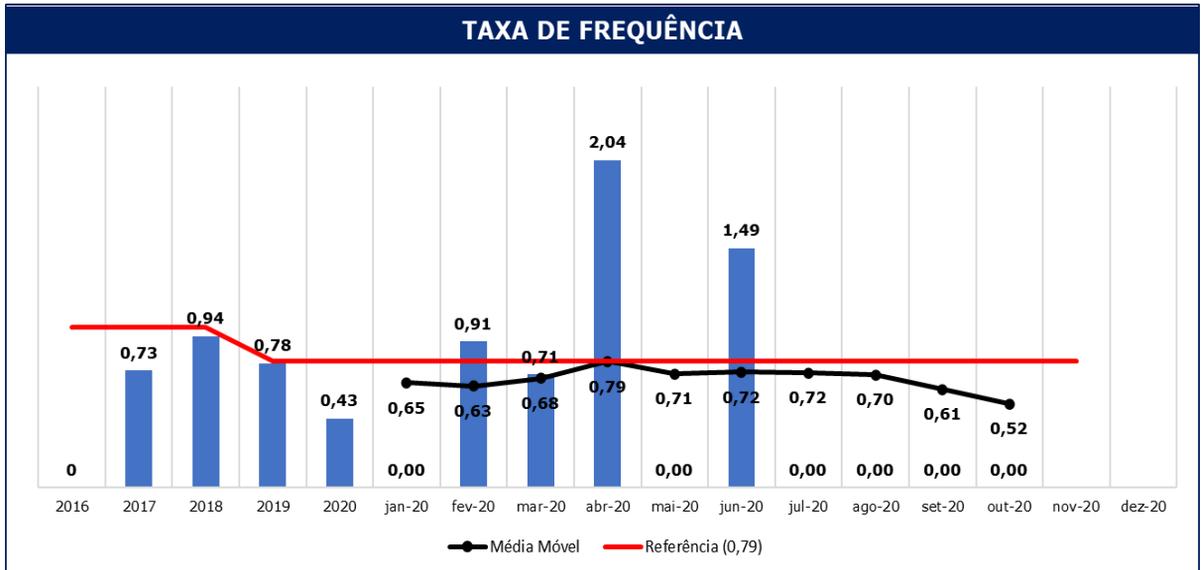

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

Programas	Plurianual			2020			
	Orçamento	Realizado	Tendência	Orçamento	Realizado	Orçado Mês	Realizado Mês
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	-	-	-	-	-	-	-
PG08 - Reconstrução de vilas	-	-	-	-	-	-	-
PG09 - Recup Reservatório UHE Risoleta Neves	-	-	-	-	-	-	-
PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	-	-	-	-	-	-	-
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	109,97	3,65	109,97	4,46	2,57	0,56	0,00
PG15 - Tecnologias Socioeconômicas	46,02	0,86	46,02	2,2	0,24	0,26	0,08
PG18 - Diversificação da Economia Regional	119,17	55,80	119,17	8,40	5,13	0,55	1,30
PG20 - Estímulo à Contratação Local	20,81	6,26	20,81	2,0	0,88	0,19	0,03
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	-	-	-	-	-	-	-
PG26 - Recuperação de APPs	1.273,90	38,95	1.273,90	38,9	18,05	4,73	1,09
PG27 - Recuperação de nascentes	212,26	46,10	212,26	20,84	11,87	2,07	0,57
PG29 - Recuperação da fauna silvestre	10,61	1,64	10,61	1,3	0,71	0,14	0,07
PG31 - Coleta e tratamento de esgoto	680,58	24,74	680,58	35,71	17,24	4,79	2,72
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	109,51	62,93	109,51	12,8	9,14	1,34	1,05
PG33 - Educação Ambiental	141,48	6,70	141,48	8,28	0,57	1,54	0,23
PG34 - Emergência ambiental	34,26	24,20	34,26	8,5	1,21	3,45	5,17
PG35 - Informação para a população	23,07	4,15	23,07	3,09	0,44	0,79	0,88
PG36 - Comunic. nacional/internacional	38,03	6,15	38,03	2,5	1,27	0,30	0,31
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	-	-	-	-	-	-	-
PG39 - Unidades de conservação	126,01	0,10	126,01	5,1	0,04	0,80	-
PG40 - CAR e PRAs	9,47	1,55	9,47	0,71	0,43	0,07	0,03
Medidas Compensatórias	1.306,18	472,79	1.306,18	770,6	462,57	1,90	0,13
Saldo Compensatório	483,7	-	483,7	-	-	-	-
Total Compensatórios	4.745,1	756,6	4.745,1	908,4	528,8	16,6	1,6

Medidas mitigatórias emergenciais	202,39	202,39	202,39	0,00	-	-	-
PG01 - Cadastro dos Impactados	160,62	110,10	160,62	28,4	14,88	3,77	2,16
PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	3.509,66	1.496,85	3.509,66	1.377,62	310,52	242,30	80,15
PG03 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	440,35	265,77	440,35	101,7	78,27	8,22	6,19
PG04 - Outros povos e comunidades tradicionais	84,55	44,86	84,55	13,17	7,68	1,30	1,19
PG05 - Proteção social	70,93	12,03	70,93	11,6	4,51	1,00	0,31
PG06 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	438,79	202,20	438,79	81,07	42,38	7,58	3,34
PG07 - Assistência aos Animais	44,10	32,31	44,10	7,3	5,38	0,67	0,50
PG08 - Reconstrução de vilas	1.933,63	1.063,21	1.933,63	682,19	549,60	73,46	52,28
PG09 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	1.270,92	810,01	1.270,92	142,2	94,57	14,85	11,84
PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	622,09	425,73	622,09	87,62	45,16	7,06	5,67
PG11 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	32,32	19,73	32,32	6,3	5,00	0,34	0,27
PG12 - Memória histórica, cultural e artística	103,01	43,33	103,01	9,51	7,19	0,69	0,66
PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer	55,57	17,54	55,57	6,0	2,31	0,73	1,09
PG14 - Saúde física e mental da população impactada	147,08	65,27	147,08	25,01	11,97	3,21	0,91
PG16 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	155,97	4,35	155,97	17,7	2,70	1,85	0,18
PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias	336,24	143,61	336,24	65,08	51,44	6,79	11,59
PG19 - Micro e Pequenos Negócios	35,33	7,60	35,33	5,7	1,56	0,38	0,11
PG21 - Auxílio Financeiro Emergencial	1.915,70	1.467,38	1.915,70	334,28	268,23	29,27	25,97
PG22 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	-	-	-	-	-	-	-
PG23 - Manejo dos rejeitos	585,09	231,50	585,09	134,72	78,45	10,53	10,22
PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU	1.039,02	1.009,16	1.039,02	94,3	66,58	10,85	0,23
PG25 - Recuperação área ambiental 1	462,93	354,15	462,93	22,39	16,42	2,04	1,44
PG28 - Conservação da biodiversidade	417,32	239,86	417,32	64,5	32,33	0,97	24,63
PG30 - Fauna e flora terrestre	57,08	25,52	57,08	9,92	7,47	0,81	0,08
PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água	450,93	251,61	450,93	96,2	65,19	13,13	7,15
PG37 - Gestão de riscos ambientais	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-
PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	444,16	217,29	444,16	41,8	25,90	13,62	11,80
PG39 - Unidades de conservação	30,98	4,89	30,98	2,94	0,81	0,26	0,02
PG41 Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	1.084,12	776,90	1.084,12	277,2	222,58	21,25	20,01
PG42 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	87,46	83,53	87,46	3,37	1,08	0,52	-
Total reparatórios	16.218,5	9.628,9	16.218,5	3.749,7	2.020,2	477,4	280,0
Total	20.963,6	10.385,4	20.963,6	4.658,0	2.549,0	494,0	281,6
