

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES_R01

Maio/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>19</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>25</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>33</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>41</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>47</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>78</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>87</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>103</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>117</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>123</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>128</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>133</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>139</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>146</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>152</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>158</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>166</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>171</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>176</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>183</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>188</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>196</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>201</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>207</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>212</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>219</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>224</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>229</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>238</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>244</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>249</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>254</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>259</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>264</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>273</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>278</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>283</u>
Glossário	<u>290</u>
Gestão Econômica	<u>296</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em maio de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em maio houve o protocolo da Revisão Bianual do PMQQS em atendimento à NT78 GTA-PMQQS, protocolo da resposta à NT82 GTA-PMQQS sobre o Plano de Capacitação do PMQQS e protocolo da 2ª remessa dos laudos da Segunda Campanha do Coloides, em atendimento à deliberação CIF 310 (PG038, pág. 264).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 188). Em maio ocorreu o protocolo realizado na 12ª Vara Federal Cível e Agrária, informando o atendimento dos itens 1, 2, 7, 8, 10, 10.1, 11.1, 12, 13 e 14, do Eixo Prioritário 1 da ACP, em 10 de maio de 2021, além das aprovações do novo cronograma da Mancha de Inundação Pós Candonga – Deliberação CIF nº 497, de 05 de maio de 2021 e da a NT nº 10/2021 sobre o Estudo de Mapeamento de Habitats Físicos (Eixo 1, item 1 - Indicadores), em 11 de maio de 2021.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 103) a qual, até o mês de maio, bombeou cerca de 959 mil m3 de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 78), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 433 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.672 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito, além disso houve a conclusão da implantação da Unidade Demonstrativa de Horta Agroecológica do senhor Rafael Arcanjo na Fazenda Ocidente localizada na cidade de Barra Longa. Um projeto junto às Empresas EPAMIG e Biokratos. (PG017, pág. 158). Na região do Baixo e Médio Rio Doce, ocorreu a retomada das atividades de campo de ATER mediante liberação pela sala de situação.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 201) e de Nascentes (pág. 207) — em maio, no território do Baixo Rio Doce, houve a finalização da contratação de 4/5 empresas do edital para atividades de restauração florestal.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.172 pessoas, desde o início do programa até maio/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 19). No mês de maio, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 174 pessoas (99% dos 176 elegíveis). Destes, 172 receberam o pagamento das indenizações (98,8% dos atendidos). Em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 607 indenizações, o que representa 95% do total das 637 propostas aceitas. 33 indenizações foram pagas em maio/21. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 183), atualmente existem 21.698 pessoas assistidas, com um total de 11.168 pagamentos. Em maio, 12 novos auxílios foram incluídos, reativação de 4 auxílios e 595 auxílios excluídos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 25) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 33). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.342 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 175 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 198 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 41) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 139) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve o início da capacitação para os operadores de proteção social dos municípios do estado do ES e assinaturas dos acordos de cooperação técnica do Programa de Proteção Social com os seguintes municípios: Marilândia, São Domingos do Prata, Sooretama e Timóteo.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 47; PG035, pág. 254 e PG036, pág. 259), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 229), em maio de 2021 foram repassados R\$ 3.656.092,21 para ações dos municípios de Bugre, Conselheiro Pena, Ipatinga, Rio Casca, Córrego Novo, São José do Goiabal e Dionísio.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 87) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de maio:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em abril, está em andamento a construção de 69 casas;

Paracatu de Baixo — em maio, houve a conclusão montagem da estrutura pré-moldada das escolas infantil e fundamental.

Gesteira — em maio, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em maio, aquisição de dois imóveis.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	172	§1º (Iniciar em 6 me...	Status Desconhecido
Cláusula	172	§1º (Manter por 10 a...	Status Desconhecido
Cláusula	172	§2º	Status Desconhecido
Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	178	n/a	Status Desconhecido
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	240	2	Status Desconhecido
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- 
- Julho de 2021 ● Comunicação de Devolutivas aos solicitantes de cadastro das campanhas 1, 2 e 3 e remanescentes (Todos os territórios, exceto Mariana)
 - Setembro de 2021 ● Finalização das Atualizações e correções dos cadastros dos impactados
 - Outubro de 2021 ● Disponibilização do Cadastro dos impactados remanescentes de Mariana e dos laudos no sistema
 - Outubro de 2021 ● Finalização do universo de cadastros de impactados remanescentes de Mariana

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 81.035 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.172 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Enviado posicionamento à Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) estabelecendo o marco temporal de 30/04/2020 como teto máximo para recebimento dos pleitos de solicitação de cadastro.

Indicadores

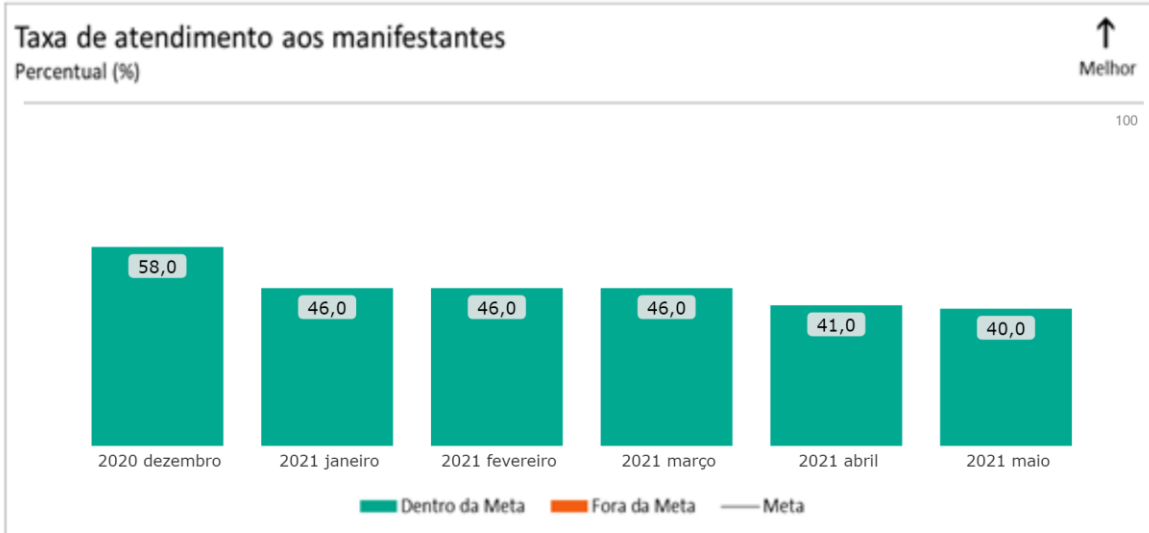


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado

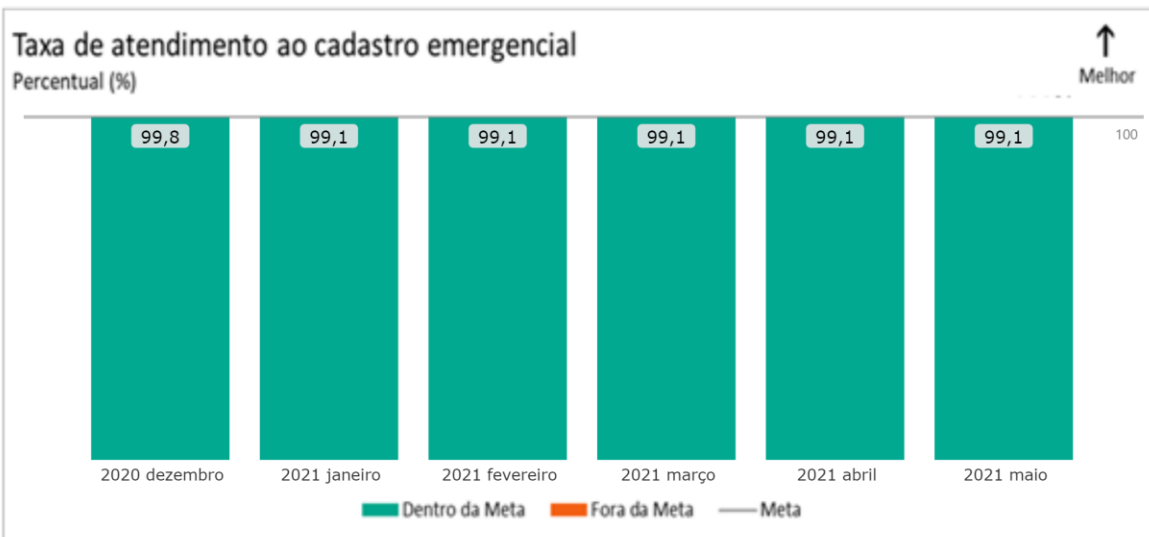


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado

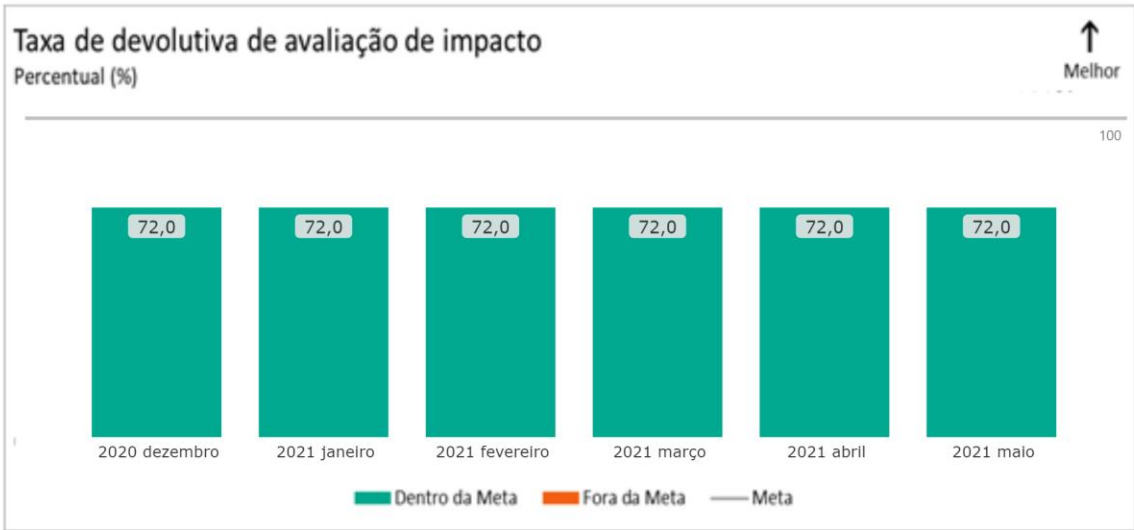


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.

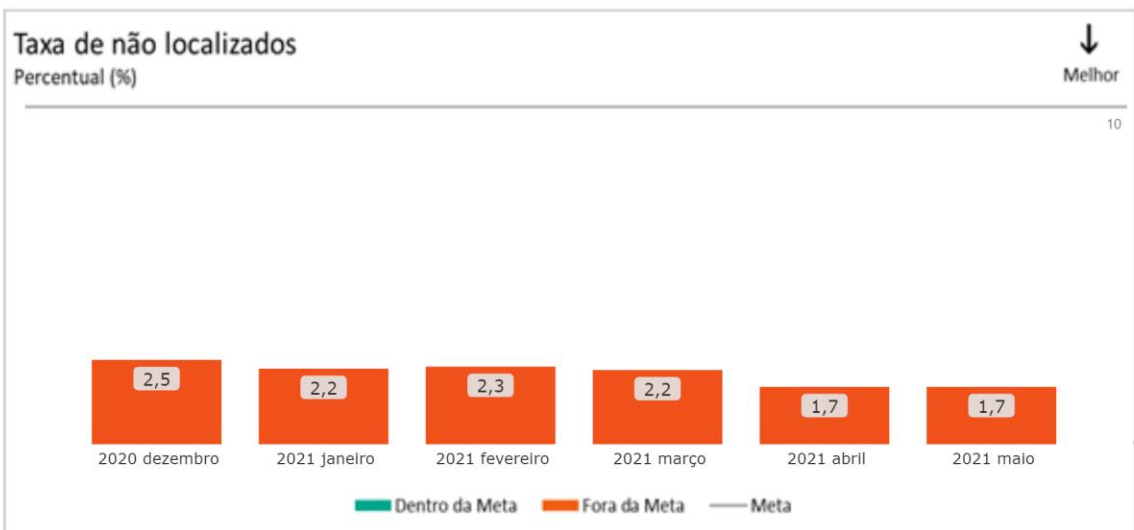


Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

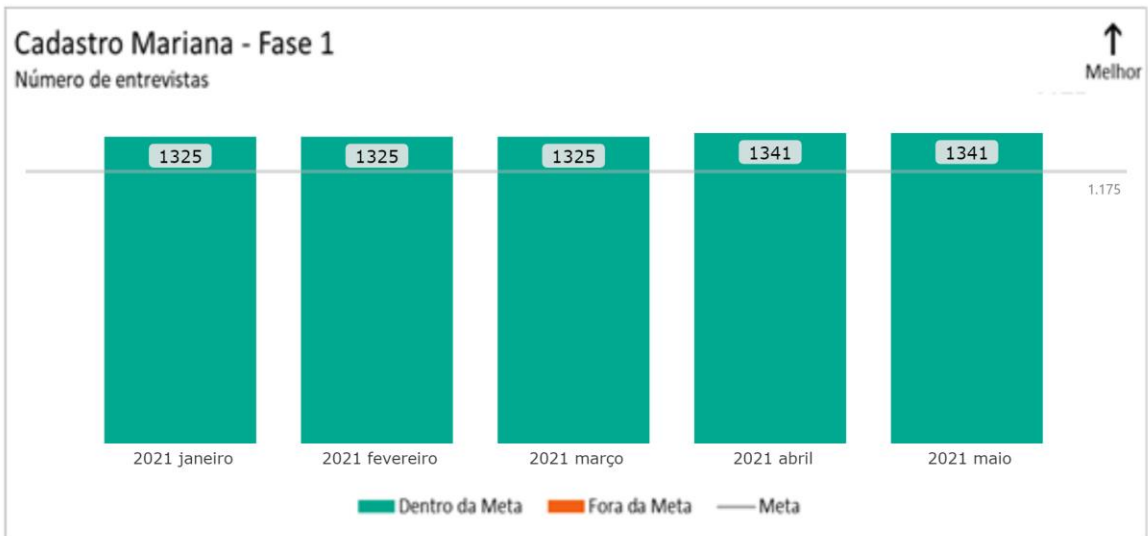


Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado

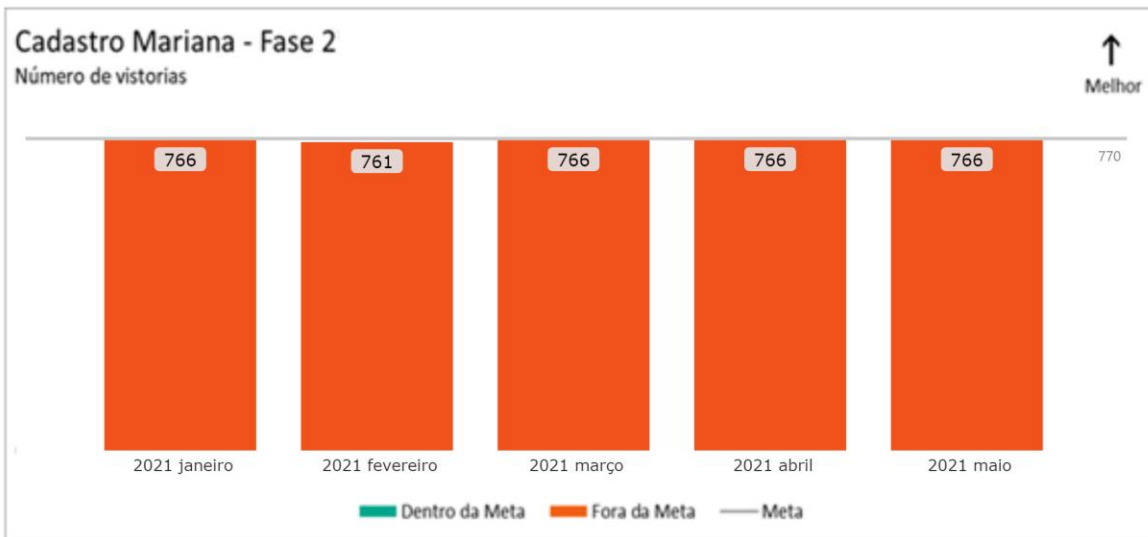


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput (ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	18	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	35	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.371 aceitaram propostas. Destas, 264.959 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 294,42 Mi** .
- **Para Danos Gerais**, 10.515 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.488 já foram pagos (99,7% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.149,47 Mi** .
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 607 indenizações, o que representa 95% do total das 637 propostas aceitas.
- **Para os Camaroeiros da Enseada do Suá**, até o momento foram atendidos 174 pessoas (99% do 176 elegíveis). 172 já receberam o pagamento das indenizações.

Fatos relevantes do mês

Pagamento de 33 indenizações de Mariana.

Indicadores

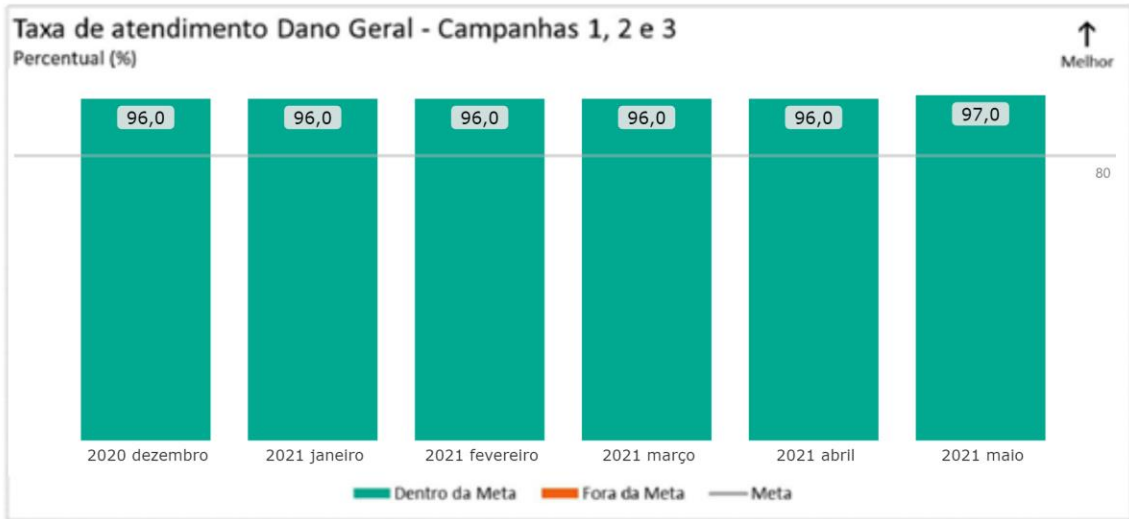


Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

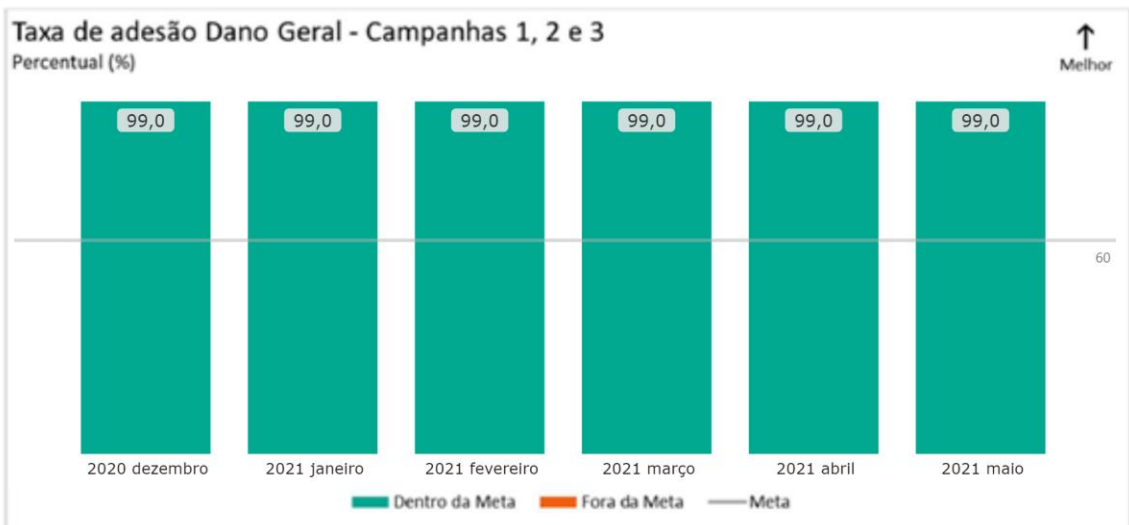


Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

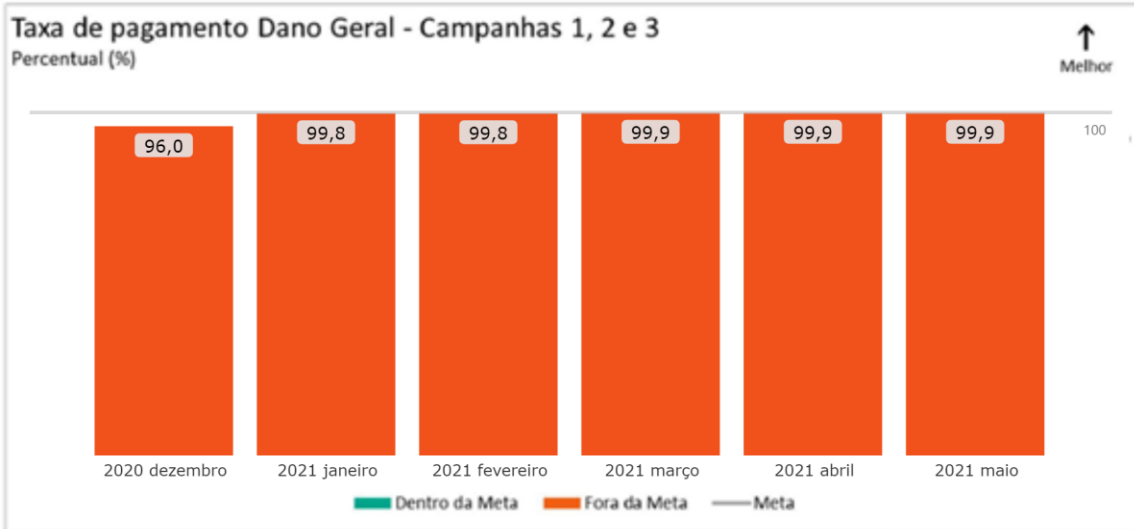


Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	39	Caput	Em Andamento
Cláusula	43	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	1	Concluído Internamente
Deliberação	187	2	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	2	Concluído Internamente
Deliberação	205	3	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Pendente
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- November de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- November de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- November de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- December de 2021 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- December de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- December de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- December de 2021 ● Finalização de pagamento do auxílio subsistência emergencial (ASE), no território Tupiniquim - Guarani - 2021
- December de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1772 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 138 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor. (total de 4.007,72 m³);
- 84 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.873,82 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.014.187,54 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1342 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1342 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 275 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 715 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 3.014.187,54 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 43.080 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de Abril de 2021 e 06, 13 e 20 de Maio de 2021 (total de 2154 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.175.120,75, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números (Banco de Brasil, agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/04/2021 até 20/05/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/04/2021 até 20/05/2021.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/04/2021 até 20/05/2021.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 256,8 toneladas para 107 famílias de 21/04/2021 até 20/05/2021.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	Caput	Em Andamento
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	281	4	Planejado
Deliberação	298	2	Em Andamento
Deliberação	423	3	Reprogramado
Deliberação	423	4	Planejado

Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente

Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	356	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

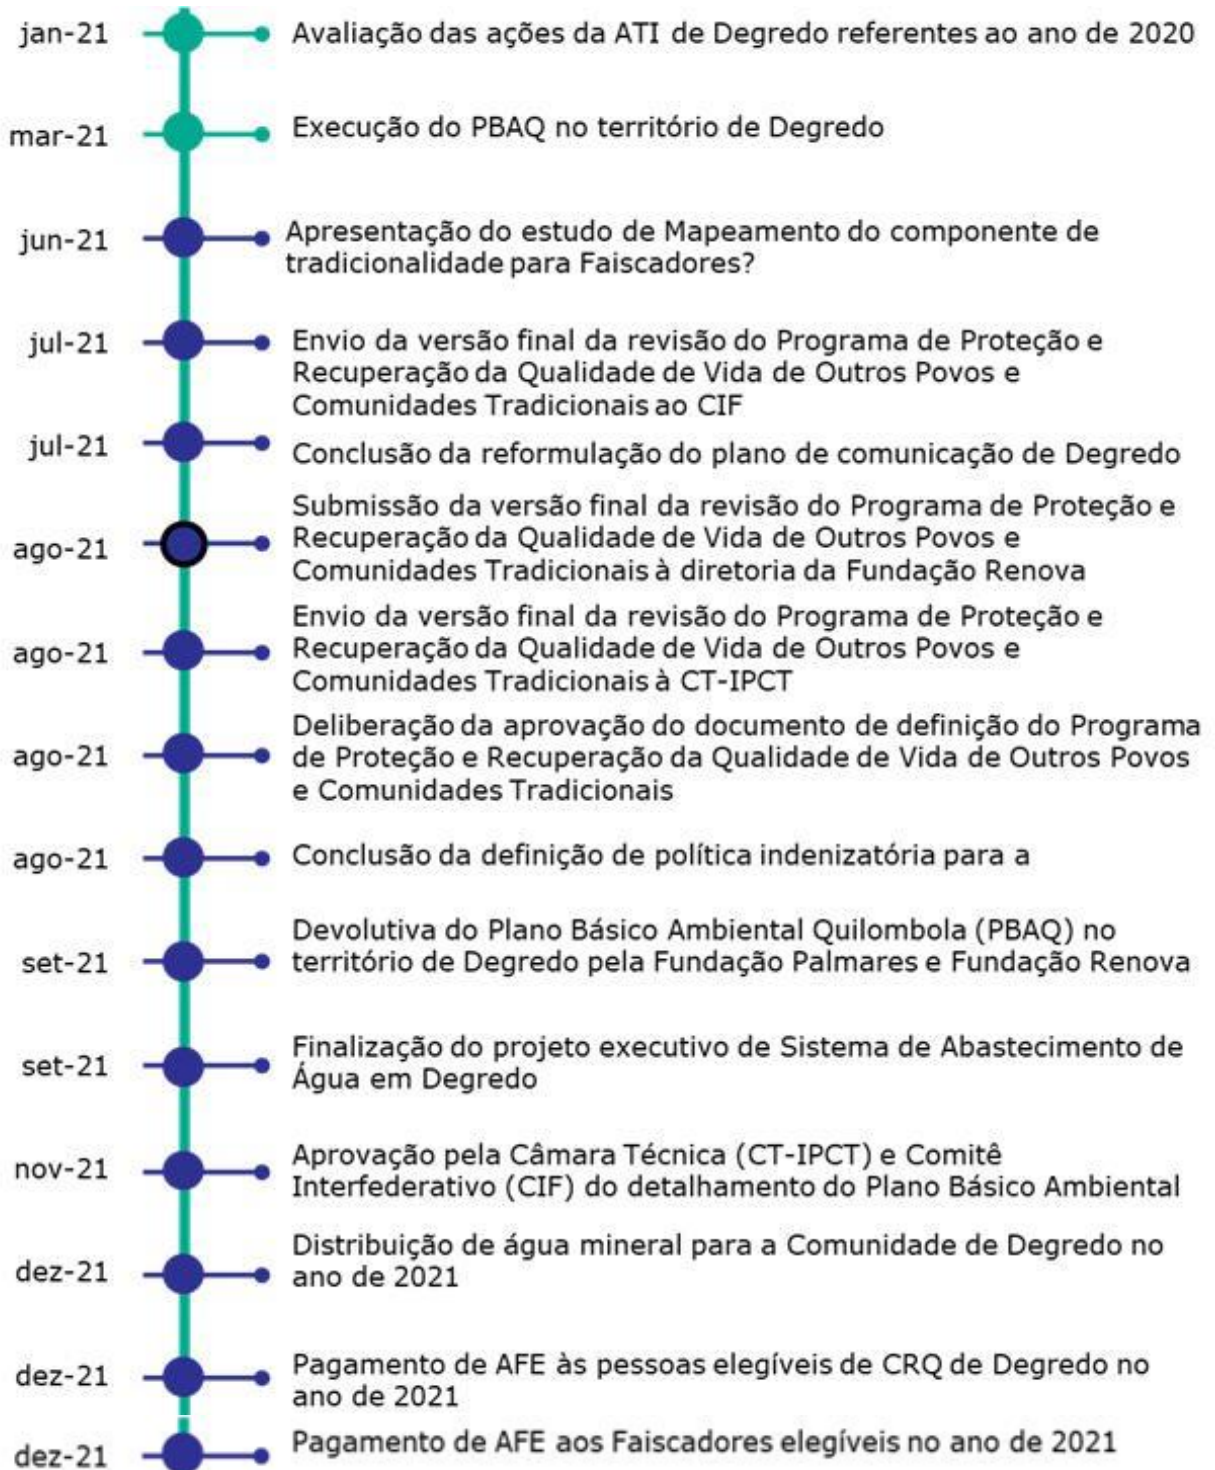

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 373 **titulares** (175 quilombolas, 94 fiscoadores de Rio Doce e 104 fiscoadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Não houve fatos relevantes no mês.

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	465	N/A	
Deliberação	495	N/A	

Entregas do ano de 2021

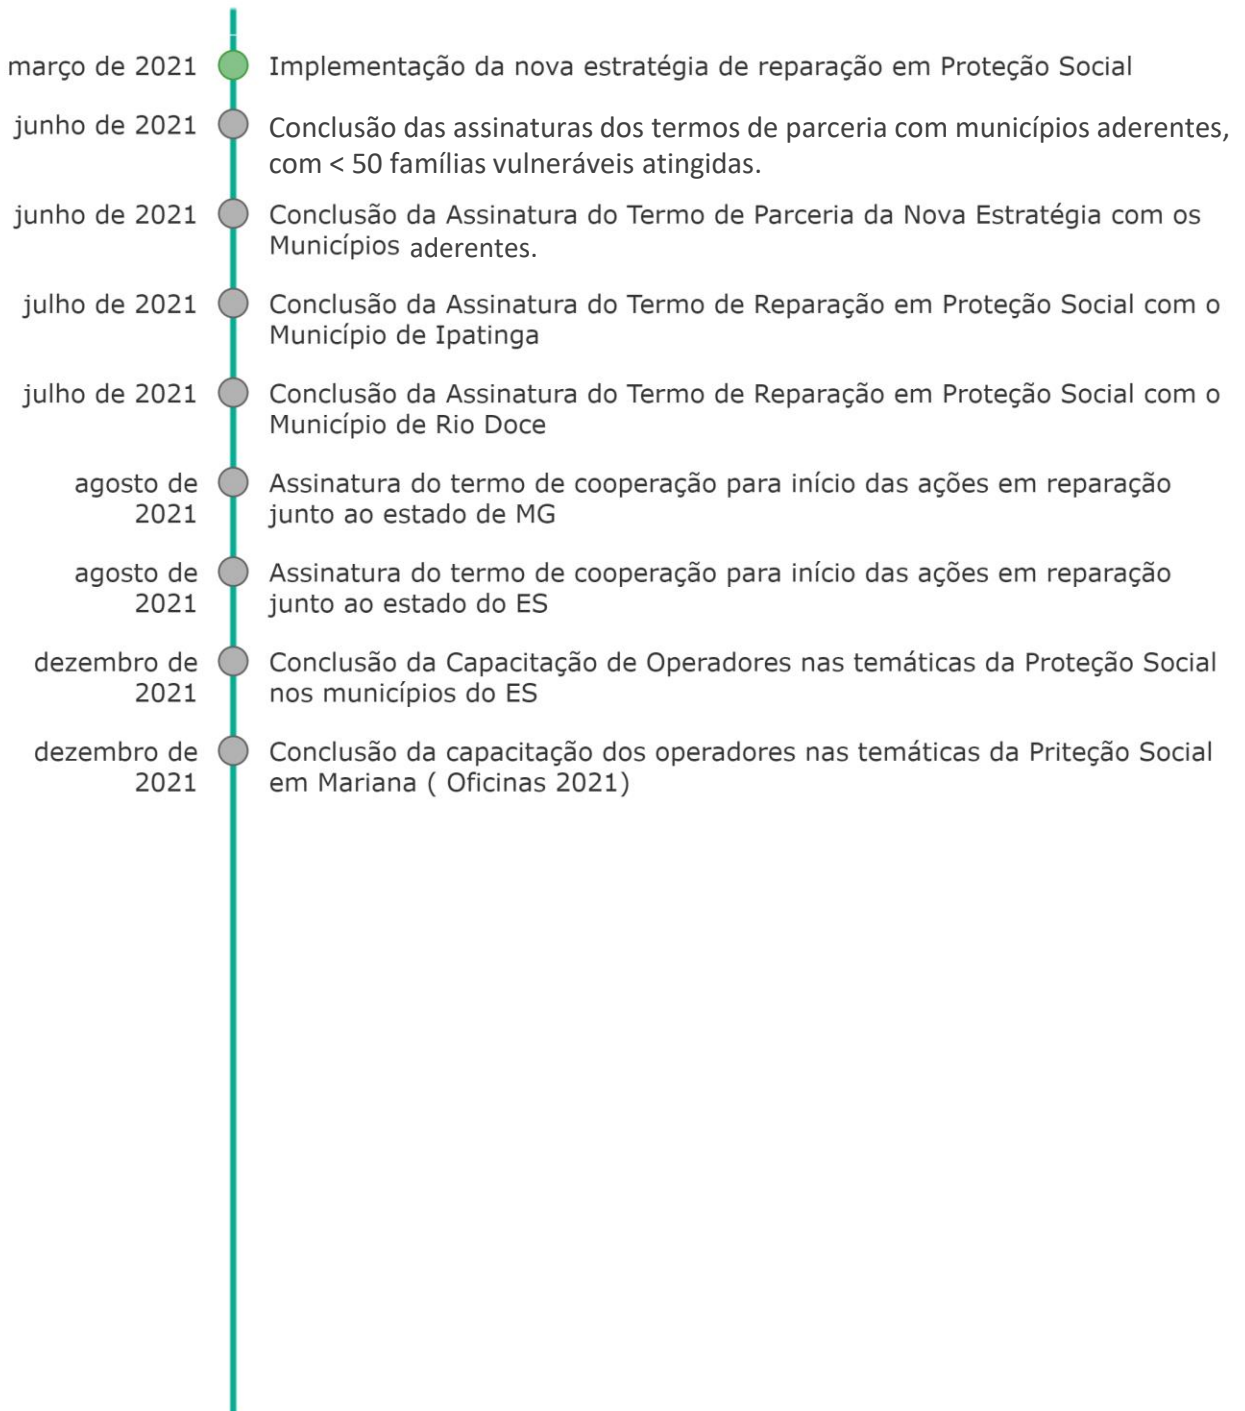

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de 17 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de Mariana/ MG, no período .
- Atuação de 58 **profissionais** (entre assistentes sociais, psicólogos, oficineiros e motoristas) nos demais municípios² da Calha, no período .
- Disponibilização de 18 **veículos para transporte das equipes** suplementadas nos municípios atenderem às famílias vulneráveis atingidas.
- 14,2 Mil **famílias** no banco do Cadastro Integrado da Fundação Renova identificadas **vulneráveis** a partir de informações autodeclaradas.

Nota: Ressaltamos que no ciclo passado informamos atuação de 55 profissionais (entre assistentes sociais, psicólogos e motoristas) nos municípios de Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares, Naque, Periquito e Santana do Paraíso, contratados pelos municípios a partir de repasses financeiros anteriormente realizados pela Fundação Renova. Porém, o correto são 40 profissionais.

Fatos relevantes do mês

Início da capacitação para os operadores de proteção social dos municípios do estado do ES.

Assinaturas dos acordos de cooperação técnica do Programa de Proteção Social com os seguintes municípios: Marilândia, São Domingos do Prata, Sooretama e Timóteo.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021		Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021		Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021		Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021		Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021		Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021		Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021		Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021		Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021		Realização do mapeamento de stakeholders e manutenção de contato proativo
dezembro de 2021		Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021		Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021		Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021		Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR MÊS	abril de 2021	maio de 2021	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	7	8	11
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	16	34	991
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	3.491
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	118.594

Fatos relevantes do mês

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) permanecem como pauta importante das ações de Diálogo Social no período: na Calha do Rio Doce, foram realizadas reuniões em Baixa Verde (Dionísio), Revés do Belém (Bom Jesus do Galho), Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso), Rio Casca, Ipaba e Caratinga para resolução de dúvidas sobre o novo sistema.

Com foco em ações para incentivo à retomada das atividades agropecuárias no território da Calha do Rio Doce, foram realizadas reuniões com moradores de Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) para levantamento de interessados em participar do projeto para suporte à criação de Quintais Produtivos. Ainda na comunidade, foi realizada reunião com integrantes da Associação dos Agricultores Familiares do Distrito de Revés do Belém (Afareves) para esclarecimentos sobre os critérios usados para seleção das propriedades contempladas pela Ater.

Continuidade da realização dos Fóruns de Prestação de Contas: em Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado foram realizados encontros para apresentação das ações de reparação e compensação com foco nos projetos da área de Economia e Inovação voltados à capacitação profissional e recolocação no mercado de trabalho e reuniões para apresentação do Fundo Desenvolve Rio Doce, voltado à promoção do desenvolvimento local por meio da concessão de crédito para micro e pequenos empreendedores dos municípios atingidos.

Em Aimorés (MG) e Resplendor (MG) foram realizadas reuniões com pescadores profissionais para apresentação do escopo da pesquisa de Avaliação da Evolução da interferência do rompimento da barragem de Fundão sobre as atividades de pesca, promovida pelo Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras.

Em Mariana (MG) foi realizada reunião do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussões sobre o reassentamento. Durante o encontro foi realizada apresentação do andamento das obras e data para construção da primeira casa do reassentamento, agendamento da visita fiscalizadora das obras e atualizações sobre a elaboração do projeto do Salão Comunitário de Paracatu de Baixo à Prefeitura. Ainda no município, destaque para reunião com Comunidades Rurais para discussão sobre demandas de reparação e compensação e realização do Protocolo Social de envio de informes à população atingida: no período, foram enviados materiais informativos sobre os reassentamentos coletivos e familiar e o informativo “Voz da Comunidade”.

Foram realizadas reuniões com moradores de Conselheiro Pena, Naque, Periquito, Tumiritinga e Itueta para esclarecimentos sobre o Plano Municipal de Reparação em Proteção Social e informações sobre a formação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social.

Na comunidade quilombola de Degredo foram realizadas reuniões com o Comitê Gestor do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), Comissão Quilombola de Degredo e Assessoria Técnica para discussão das ações do Eixo Cultura do PBAQ, informações sobre a implementação do programa de Formação de Lideranças Quilombolas e informes sobre o processo de fornecimento de água a comunidade.

Fatos relevantes do mês

Em Povoação (Linhares) foi realizada reunião com a Associação de Comerciantes e Empreendedores de Povoação para discussão sobre as ações de apoio da Fundação Renova na construção de ferramentas de gestão e implementação da Feira Comunitária. No Assentamento Sezínio Fernandes (Linhares) foi realizada reunião para apresentação da frente de Uso Sustentável da Terra, construção do Plano de Assistência Técnica e apresentação do Plano de Recuperação Ambiental em áreas degradadas (Prad).

Indicadores

Os indicadores do Programa, especificamente para o Pilar Diálogo Social e Canais de Relacionamento, foram produzidos a partir de um processo participativos juntos a CTPDCS e atingidos ao longo de 2019 e 2020.

Os dados fornecidos pelo programa neste documento, referem-se a números gerais, de acompanhamento dos pilares. Embora alguns dos indicadores já são mensurados, aguarda-se uma aprovação formal do programa pelo CIF para que estes possam ser reportados neste documento.

Quando aprovado o documento de definição do programa, para aqueles indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos a janeiro de 2021 de forma acumulados.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2020).

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO (2015 a 2020)	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2020)
10.087,00	148,33

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	307,50
abril de 2021	157	
maio de 2021	458	-
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. As primeiras ondas de mensuração serão realizadas a partir do início de 2021 e, quando aprovado o documento de definição do programa, para os indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos desde o início da medição.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	abril de 2021	maio de 2021
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	179.791	181.742
Canais: Número total de manifestações	775.225	786.682
Canais: Número de manifestações respondidas	704.838	717.776
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	131.311	131.558
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	13.915	16.115
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.127	13.164
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	616.872	625.845
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	1	10
Canais: Número de manifestações em tratamento	70.837	68.906

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos relevantes do mês

Contato ativo com solicitantes de Cadastro Integrado após 30/04/2020 (data limite de solicitação de cadastro para ingresso no Sistema Indenizatório Simplificado, conforme definido pela 12ª Vara de Justiça Federal) para orientação quanto a viabilidade de sua inclusão como dependente, caso algum outro membro do núcleo familiar tenha registrado solicitação de cadastramento antes da data estipulada.

Análise de informação de manifestações, em conjunto com a equipe de Diálogo Social, sobre requerentes do Fluxo Ágil para apoiar a atuação dos advogados e dar celeridade às tratativas e dúvidas sobre o novo sistema de pagamento de indenizações.

Análise qualitativa dos protocolos em tratamento referente a Indenização por perda de produção e/ou lucro cessante, para realização de contatos ativos para devolutiva referente ao pagamento de Lucro Cessante a moradores das Novas Áreas.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto à equipe do Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução das solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas de Moradia Temporária e Reassentamento em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, no município de Mariana (MG).

Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e pendentes de retorno em função do contexto de coronavírus para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos solicitantes, pelos atendentes CIAs.

Monitoramento e análise de manifestações de solicitações de envio do Informe de Rendimentos para articulação com a área responsável e celeridade nas devolutivas aos manifestantes.

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação dos processos de trabalho deste Canal no processo reparação e compensação: Treinamento para tratamento de protocolos de solicitação de Cadastro após 30/04 (18/05) e alinhamento sobre pagamento de indenização por Fluxo Ágil para falecidos (26/05).

Indicadores

Os indicadores do Programa, especificamente para o Pilar Diálogo Social e Canais de Relacionamento, foram produzidos a partir de um processo participativos juntos a CTPDCS e atingidos ao longo de 2019 e 2020.

Os dados fornecidos pelo programa neste documento, referem-se a números gerais, de acompanhamento dos pilares. Embora alguns dos indicadores já são mensurados, aguarda-se uma aprovação formal do programa pelo CIF para que estes possam ser reportados neste documento.

Quando aprovado o documento de definição do programa, para aqueles indicadores já possíveis de mensuração, estes serão reportados retroativos a janeiro de 2021 de forma acumulados.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021


DADO	jan	fev	mar	abr	mai	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	1
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	31
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	2
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	2
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	12
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	14
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	45
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	130
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	9
Newsletter produzidos	6	4	6	3	5	24
Outros itens produzidos	2	0	9	8	11	30
Pílulas de whatsapp produzidos	27	26	51	46	67	217
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	31
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	12
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0
Total	68	70	139	141	142	560

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território

Canais: ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail Mar... ● Informe do ... ● Jornal da ... ● Matéria - B... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo




Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Principais Temas Veiculados

Canais: ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail Marketing ● Informe do Reasse... ● Jornal da Comuni... ● Matéria - Bol... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção e distribuição digital da 15ª edição do jornal Terra da Gente, informativo com as comunidades de Barra Longa, Gesteira e Barreto.

Baixo Rio Doce

Produção de pílula para convidar a comunidade escolar de Aimorés para reunião de apresentação do projeto Doce Vivo, com o objetivo de ofertar o projeto para ser trabalhado nas escolas do município.

Produção de pílula para convidar a comunidade escolar de Itueta para reunião de apresentação do projeto Doce Vivo, com o objetivo de ofertar o projeto para ser trabalhado nas escolas do município.

Produção de pílula para convidar a comunidade escolar de Resplendor para reunião de apresentação do projeto Doce Vivo, com o objetivo de ofertar o projeto para ser trabalhado nas escolas do município.

Calha do Rio Doce

Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre reunião com moradores de Rio Casca, no dia 12/05, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Caratinga para reunião virtual no dia 13/05 sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Ipaba do Paraíso, comunidade de Santana do Paraíso, para reunião virtual no dia 25/05 sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de Ipaba para reunião virtual no dia 12/05 sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Calha do Rio Doce

Elaboração de pílula de WhatsApp convidando atingidas de comunidades do território para participarem de Oficina de Capacitação para o Uso de Ferramentas de Interação à Distância.

Produção de matéria para a Rádio Renova com informações atualizadas sobre o Projeto Feijão, desenvolvido com produtores rurais de Rio Casca.

Produção de pílula convidando moradores de Revés do Belém, comunidade de Bom Jesus do Galho, para reunião temática sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Comunicação com Territórios

Veiculação de oito programas (Momento Renova) em cinco territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou com um total de 48 programas em maio, com 144 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

Foz Rio Doce

Produção e distribuição digital da 16ª edição do jornal Voz da Foz, informativo com as comunidades de Areal, Povoação, Entre Rios e Regência.

Produção e distribuição digital da 9ª edição do Boletim Jornada para a população do entorno da Lagoa Juparanã.

Mariana

Produção de matéria no programa da Rádio Renova sobre as obras em andamento, suspensas e cuidados para a prevenção da Covid-19.

Produção de pílula convite para reunião do diálogo com a zona rural de Mariana para abordar sobre o acompanhamento das ações de reparação coletiva.

Produção e distribuição digital da 16ª edição do Boletim Jornada para a população de Mariana.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Centro cultural oferece oficinas gratuitas e online para crianças e adultos do Espírito Santo.

Comerciantes de Linhares vão receber consultoria para negócios.

Defesa Civil do ES recebe equipamentos para fortalecer ações de contingência.

Defesas Civas de Linhares e Sooretama recebem equipamentos para fortalecer ações.

Linhares recebe veículos para fortalecer serviços de assistência social.

Pagamentos de indenizações e auxílios financeiros emergenciais ultrapassam R\$ 4 bilhões.

Parceria com BrazilFoundation beneficia mais de mil pessoas na bacia do rio Doce.

Parceria entre Recoloca Rio Doce e Sine em Mariana facilita de contratação de atingidos.

Prazo de adesão ao Sistema Indenizatório é prorrogado em 11 localidades de MG e ES.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de audiozap com informações sobre a entrada de Galileia, São José do Goiabal e Pingo-d'Água no Sistema Indenizatório Simplificado e a prorrogação do prazo para dez localidades.

Produção de audiozap com informações sobre o envio de contestações no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de audiozap divulgando o balanço com os valores de indenizações pagos pelo Sistema Indenizatório Simplificado em Minas Gerais.

Produção de audiozap divulgando o balanço com os valores de indenizações pagos pelo Sistema Indenizatório Simplificado no Espírito Santo.

Produção de pílula de WhatsApp para advogados com informações sobre envio e correção de documentos no Sistema Indenizatório em localidades com prazo até 31 de julho.

Produção de pílula de WhatsApp para advogados com informações sobre envio e correção de documentos no Sistema Indenizatório em localidades com prazo encerrado em 30 de abril.

Produção de pílula de WhatsApp para advogados esclarecendo que declaração de posto de saúde não serve como comprovante de endereço no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando que o município de Galileia passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de vídeo sobre o andamento do Sistema Indenizatório Simplificado e valores pagos em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Produção de pílula informando que o município de São José do Goiabal passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando que o município de Pingo-d'Água passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp esclarecendo como podem ser enviadas contestações no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula com informações sobre a prorrogação do prazo, até 31 de julho, para dez localidades aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria no programa de rádio Momento Renova sobre o pagamento do Lucro Cessante 2020 e continuidade do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria de rádio sobre a entrada de Galileia, São José do Goiabal e Pingo-d'Água no Sistema Indenizatório Simplificado e a prorrogação do prazo para dez localidades.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de São Mateus que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Revés do Belém que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Aimorés informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Pedra Corrida que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Naque que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Linhares que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Itueta que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Ipaba do Paraíso que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Conceição da Barra que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Baixo Guandu que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Baguari que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Aracruz que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Divulgação de áudiozap sobre o pagamento do Lucro Cessante 2020 e continuidade do Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Bugre informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Marilândia informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Periquito informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Sem-Peixe informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Senhora da Penha informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para divulgar a alteração de endereço do escritório do Centro de Indenização Mediada em Mariana.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Cachoeira Escura que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Elaboração de pílula para informar aos atingidos de Colatina que o prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 31 de julho.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Caratinga informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Ipaba informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Resplendor informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos de Rio Doce informando que o prazo de adesão no Sistema Indenizatório Simplificado vai até 31 de julho.

Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Produção de pílula para divulgação de vaga de emprego para atuação no Plano Básico Ambiental de Degredo.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Elaboração de matéria para a Rádio Renova sobre a entrega de veículos à Prefeitura de Linhares para suporte às ações de Proteção Social.

Produção de pílula de agradecimento aos participantes da reunião de apresentação, dúvidas e status do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social em Periquito.

Produção de pílula de convite à população de Conselheiro Pena para reunião de apresentação, dúvidas e status do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Produção de pílula de convite à população de Naque para reunião de apresentação, dúvidas e status do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Elaboração de pílula convidando moradores de Bom Jesus do Galho para reunião sobre o Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Elaboração de pílula convidando moradores de Caratinga para reunião sobre o Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Elaboração de pílula convidando moradores de Ipaba para reunião sobre o Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Elaboração de pílula convidando moradores de Santana do Paraíso para reunião sobre o Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Produção de pílula de agradecimento aos participantes da reunião de apresentação, dúvidas e status do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social em Conselheiro Pena.

Produção de pílula de agradecimento aos participantes da reunião de apresentação, dúvidas e status do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social em Naque.

Produção de pílula de convite à população de Periquito para reunião de apresentação, dúvidas e status do Comitê de Avaliação do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Suporte ao PG007 Programa de Assistência aos Animais

Produção de pílula para organizar a retomada das visitas dos atingidos aos seus animais nas fazendas da Fundação Renova.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Envio de Panorama da Obra exclusivamente à comissão de atingidos de Bento Rodrigues com informações, em primeira mão, sobre os avanços das obras no mês corrente.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Elaboração da 26ª edição do Informe do reassentamento de Bento Rodrigues com informações atualizadas sobre as obras.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Elaboração da 19ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Elaboração da 20ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Elaboração da 26ª edição do Informe do reassentamento de Paracatu de Baixo com informações atualizadas sobre as obras.

Elaboração da 27ª edição do Informe do reassentamento de Paracatu de Baixo com informações atualizadas sobre as obras.

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de matéria no programa da Rádio Renova sobre interdição de via devido a manutenção de ponte em Borba, em Mariana.

Produção de pílula sobre interdição de via devido a manutenção de ponte em Borba, em Mariana.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de pílula de WhatsApp divulgando o resultado das instituições selecionadas para participarem do Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Produção de programa de rádio divulgando o resultado das instituições selecionadas para participarem do Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Produção de pílula divulgando o início do trabalho de consultoria junto aos comerciantes de Regência, Povoação e Entre Rios.

Produção de pílula informando sobre a alteração nos trabalhos da consultoria aos comerciantes de Regência, Povoação e Entre Rios, devido à nova classificação de risco alto para a Covid no município de Linhares.

Produção de programa de Rádio sobre o trabalho de consultoria junto aos comerciantes de Regência, Povoação e Entre Rios.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Elaboração de pílula de WhatsApp sobre a realização do treinamento virtual da plataforma Recoloca Rio Doce com o tema “Como elaborar um currículo e se preparar para entrevistas de emprego”.

Elaboração de pílula de WhatsApp sobre treinamento virtual da plataforma Recoloca Rio Doce com o tema “Mulheres e o mercado de trabalho”.

Elaboração de pílula de WhatsApp sobre vagas de emprego no Alto Rio Doce pela plataforma Recoloca Rio Doce.

Suporte ao PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Criação e produção de placas nos pontos de monitoramento de ar entre Mariana e Candonga.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de pílula para informar aos moradores do trecho da obra urbana que a Fundação Renova está implementando medidas para dar continuidade à construção da adutora utilizando empresas com contratos vigentes até a conclusão do processo de contratação das empresas que finalizarão a construção.

Produção de programa de rádio para informar a sociedade valadarense que a Fundação Renova está implementando medidas para dar continuidade à construção da adutora utilizando empresas com contratos vigentes até a conclusão do processo de contratação das empresas que finalizarão a construção.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Economia e Inovação

Produção de vídeo contando a história da Associação de Mulheres Artesãs de Itueta (AMAI), grupo formado por mulheres apoiado pela Fundação Renova e BrazilFoundation.

Produção de vídeo sobre o projeto Loja Mãos e Arte, da Fundação Monique Leclercq, em São Domingos do Prata. O projeto foi apoiado pela parceria entre Fundação Renova e BrazilFoundation.

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Produção de matéria sobre as novas edições do Boletim das Águas.

Produção de pílula para divulgação das 4a e 5a edições do Boletim das Águas - Edição Rios.

Produção de pílula para divulgar a segunda edição do Boletim Trimestral das Águas: lagoas, estuários e zona costeira do Espírito Santo.

Produção de vídeo tutorial, explicando como navegar pelos conteúdos dos Boletins das Águas.

Indicadores

Durante o último trimestre de 2020, a CT-PDCS aprovou grande parte das medidas previstas no quadro de indicadores do PG06, que foi construído ao longo do ano de maneira colaborativa. A pesquisa com os atingidos e atingidas será realizada até o fim do primeiro semestre de 2021. Caso o documento de definição do programa seja aprovado após a realização da pesquisa, os indicadores mensurados serão apresentados de forma retroativa desde o início da pesquisa.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	Caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento

Deliberação	226	1	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1127 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 154 adoções, 1338 restituições, 160 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 433 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 310 bovinos, 63 equinos, 38 caninos, 18 suínos, 3 muaras, 1 felino sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1672 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

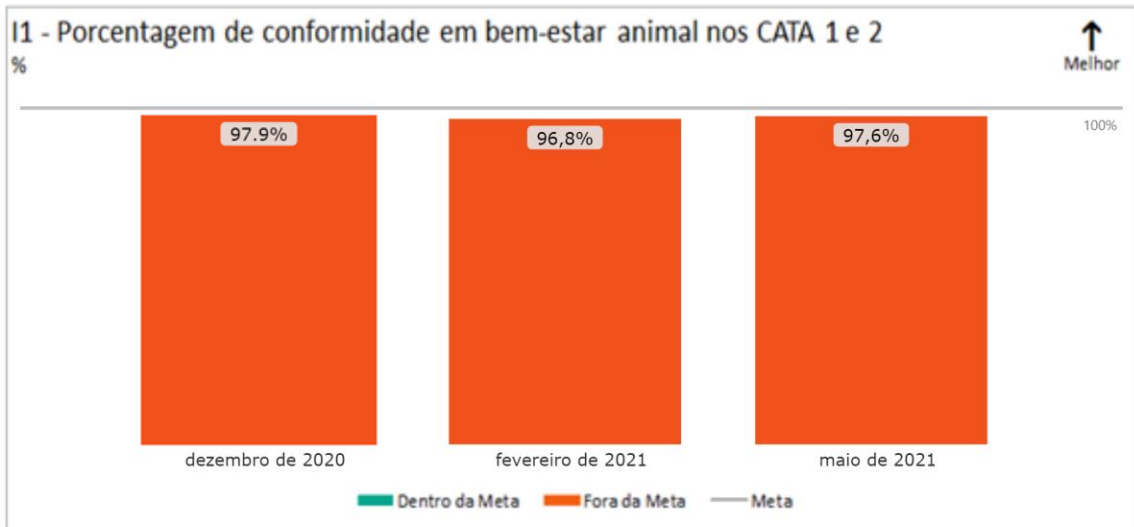


Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2.

A aplicação deste indicador, em função da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), vem sendo realizada em caráter trimestral. Conforme apontado em relatórios anteriores, esta ampliação entre os períodos de aferição (de bimestral para trimestral) tem por objetivo reduzir o risco de exposição dos colaboradores em atividades conjuntas, e minimizar possibilidade de acidentes de trabalho em período de intensa ocupação de leitos causada pelo avanço da pandemia. Não obstante, esta frequência está adequada à proposta apresentada de revisão da Definição Do Programa, e já validada pela CT-OS em Janeiro de 2020.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

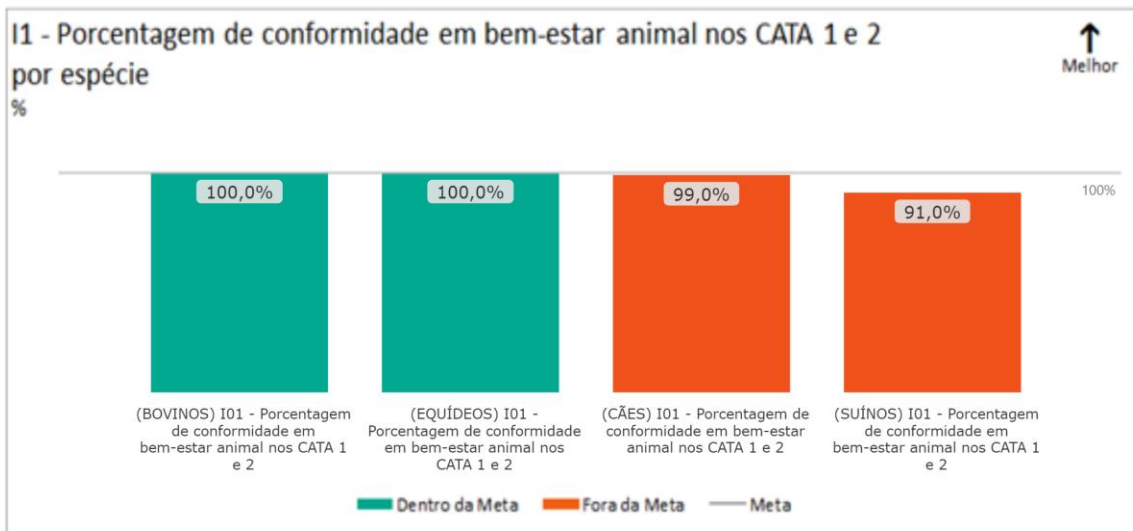


Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie.

O felino que se encontra sob guarda temporária não passou por avaliação de bem-estar no período vigente por se encontrar internado para tratamento de enfermidade.

Os demais desvios apresentados em relação a meta vigente, não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

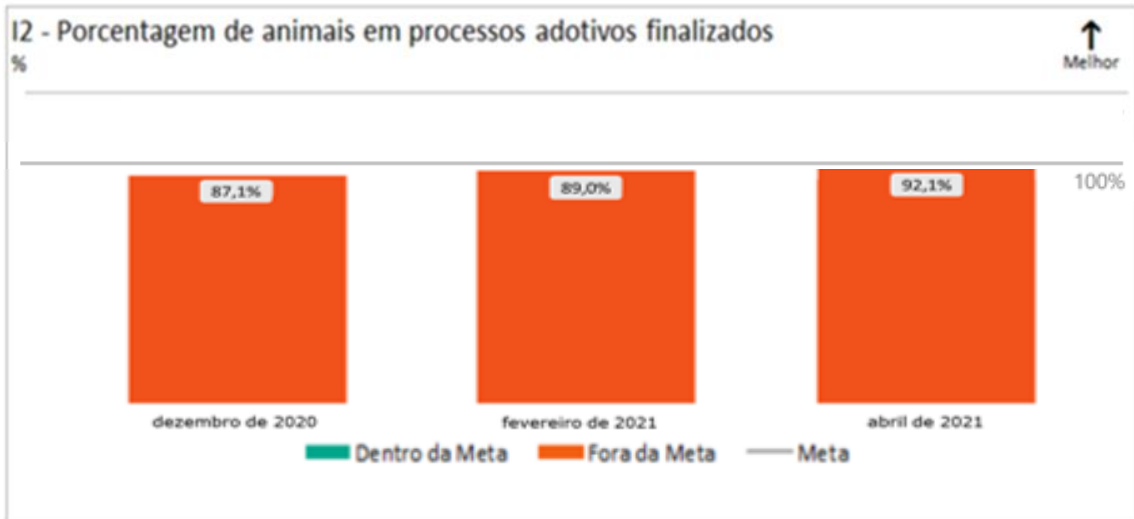


Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados.

Em relação a finalização de processos adotivos, a próxima atualização está prevista para o relatório do mês de julho de 2021.

As adoções que ocorreram durante a referida campanha, conforme metodologia da Definição do Programa, somente passarão a compor o indicador após a finalização do acompanhamento de cada processo adotivo.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	$\frac{\text{Número de restituições no reassentamento}}{\text{Número de animais acolhidos nos CATA's}}$	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	$\frac{\text{Número de acompanhamentos finalizados}}{\text{Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação}}$	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

| Cláusula

76


Caput

Judicializado

Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021  Concluir 54 casas

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Fatos relevantes do mês

Social: Continuação dos atendimentos remotos às famílias dos reassentamentos;

Atividades comum para todos os Reassentamentos

Logística e gestão dos materiais para estoques;

Recebimento de Agregados e alguns materiais tais como: Brita, Areia, Bloco Estrutural, Bloco de concreto, Meio Fio, intertravado;

Continuação de elaboração de projetos possíveis de serem realizados em home office;

Elaboração de estudos referente aos impactos da pandemia COVID 19;

Tratativas de processos de suprimentos/APRO's;

Tratativas e alinhamento junto aos stakeholders das ações para garantia do retorno das atividades de maneira segura;

Treinamentos com funcionários e colaboradores em home office;

Estamos tendo em média 10% de faltas no efetivo das contratadas.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

- Atendimento para 200 **famílias**;
- Em andamento construção de 69 **casas**;
- Conclusão de 10 **casas**;
- Conclusão de 3 **bens públicos** (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde);
- **Projetos conceituais** concluídos para 166 casas, 21 lotes e 16 de bens públicos;
- **Projetos básicos** concluídos para 166 casas, 20 lotes e 11 bens públicos;
- **Projetos básicos de 152 casas e de 19 lotes vagos** protocolados na prefeitura;
- **Alvarás** para 121 casas e 4 de bens públicos emitidos (escola e posto de serviços, unidade básica de saúde) e 18 **licenças de autorização de construção** de casas emitidas para os lotes sem edificação;
- Total de 1 **contratos assinados** para construção de casas;
- Licenças simplificadas para 18 **lotes**;
- **Projetos de contenção** concluídos para 136 casas e 14 lotes;
- **Projetos de fundação** concluídos para 151 casas.


Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Conclusão dos IDs 1 e ID 59.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir 20 Fundações de casas
dezembro de 2021	●	Concluir 05 Estruturas
dezembro de 2021	●	Concluir 02 Alvenaria
dezembro de 2021	●	Concluir 75% da Infraestrutura

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

- Atendimento para 83 **famílias.**
- Em construção 6 **casas.**
- **Projetos conceituais** concluídos para 64 **casas**, 5 **lotes** e 11 **bens públicos.**
- **Projetos básicos** concluídos para 63 **casas**, 3 **lotes** e 8 **bens públicos.**
- **Projetos básicos** protocolados na prefeitura para 39 **casas**, 8 **bens públicos** e 3 **lotes vagos.**
- **Licenças simplificadas** emitidas para fundações de 23 **edificações** e de 1 **bens públicos** e 0 **lotes;**
- **Projetos de fundação** concluídos para 56 **casas** e 5 **bens públicos.**
- Projetos conceituais concluídos para 6 **casas em andamento.**

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Início da rede de drenagem profunda área 2 e 4.

Conclusão montagem da estrutura pré-moldada das escolas infantil e fundamental.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

- Atendimento para 14 **famílias**.
- Acordos homologados com 23 **famílias**.
- Total de 8 **imóveis** adquiridos para famílias que possuem acordo homologado.


Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021

- 
- dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
 - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).
 - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 construções de casas novas em área rural (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura).

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

- Atendimento para 138 **famílias**;
- Aquisição de 62 **imóveis** para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia.
- Construção de 39 **imóveis**.
- Reforma de 19 **imóveis**.
- Entregas de 4 **lotes vagos**.
- **Projetos conceituais** finalizados para 45 **imóveis**.
- **Projetos para construção** de 25 **casas novas**.
- **Projetos básicos** para reformas de 16 **imóveis**.
- **Projetos básicos** para construção de 43 **imóveis**.
- Licenças, alvarás/dispensa rural protocolados na Prefeitura ou não necessário para 22 **construções de casas novas**.
- Licenças simplificadas protocolados na Prefeitura ou não necessário para reforma de 15 **casas**.
- Licenças ou não protocolados na Prefeitura para 3 **lotes vagos**;
- Dispensas de licença emitidas ou não necessário para 4 **lotes vagos**.
- Licenças emitidas para 10 **casas Novas**.
- Licenças simplificada de reforma emitidas para 7 **casas**.
- Comunidades rurais: 9 **famílias atendidas** na modalidade de Reconstruções.
- Comunidades rurais: 12 **casas** na modalidade de reconstrução.
- Comunidades rurais: 6 **casas** (edificação principal) da modalidade de reconstrução entregues.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Suprimentos: Concluído processo de contratação da Dinâmica (Lage & Gomes), para execução de 5 reformas urbanas e 10 casas rurais.

Implantação RMC: Conclusão das obras do aviário ID 247. Check list de recebimento final de obra em andamento.

Implantação - Vina:

Emitidas as OS's referentes as execuções dos IDs 767, 7, 31, 58, 307 e 83.

Em andamento as atividades dos ID 767, 58 e 307.

Em elaboração cronogramas detalhados dos IDs 767, 7, 31, 58, 307 e 83.

Implantação - Tecnosonda:

Execução dos serviços de solo grampeado (IDs 202 e NN.66).

Realizada reunião de Kick Off em 03/05/21.

Continuidade no processo de mobilização.

Implantação - Dinâmica

Conclusão da segunda fase da reforma do ID 258. Check list de recebimento final de obra em andamento.

Aquisição de imóvel para o ID SGC 42605, em 06/05/21, Família oriunda de Bento Rodrigues.

Aquisição de imóvel para o ID SGC 42759, em 10/05/21, Família oriunda de Pedras.

Aquisição de imóvel para o ID SGC 37616, em 04/05/21, Família oriunda de Gesteira.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Indicadores

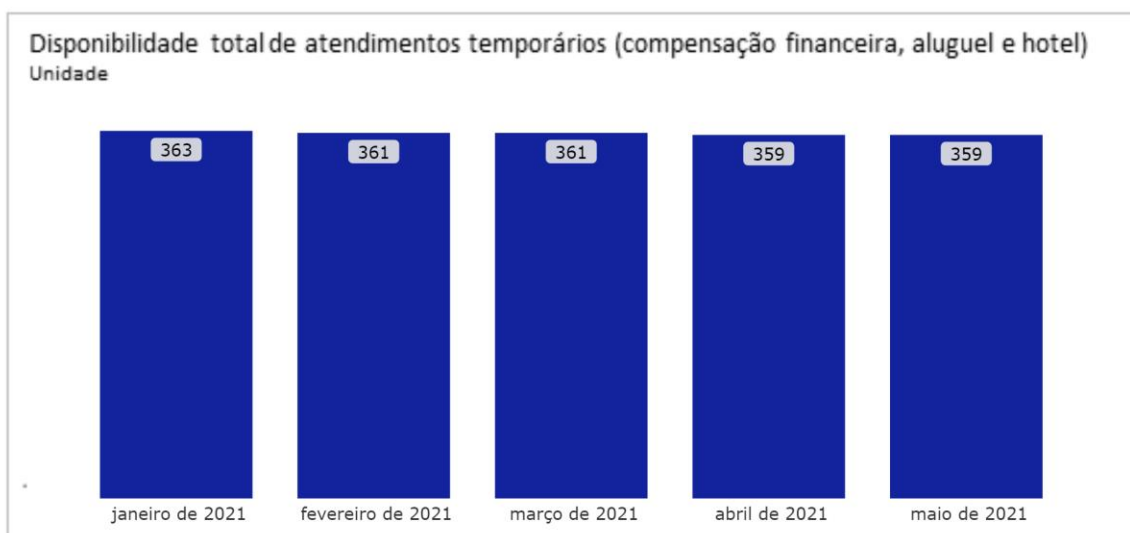


Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Concluída internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Concluída parcialmente /Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluída internamente
Deliberação	80	4.1	Concluída internamente
Deliberação	80	4.2	Concluída internamente
Deliberação	225	2	Concluída internamente /em andamento/ Judicializado
Deliberação	286	3	Concluída internamente

Entregas do programa



● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Fatos relevantes do mês

- **Obras preliminares para descomissionamento do dique do setor 4**
- Regularização área de depósito temporário - jusante dique do setor 4



- Conclusão do sistema temporário de condução das vazões do córrego dos Borges.



Fatos relevantes do mês

- Retirada de aduela da crista do dique do Setor 4



- Em andamento a mobilização da empresa contratada para a execução do pacote de Descomissionamento do Setor 4, iniciado em 19/04/21.



- Em fase de finalização os projetos de engenharia para o Descomissionamento do Setor 4: Sistema temporário de condução de vazões do Córrego dos Borges, Passagem Molhada, Remoção do Dique do Setor 4, Remoção dos Sedimentos, Adequação definitiva do Córrego dos Borges e Proteção para restituição de vazão.

Fatos relevantes do mês

➤ Obras de Recuperação das margens

- Execução de recuperação do ponto de margem 42



- Execução de recuperação do ponto de margem 120



- Execução de recuperação do ponto de margem 144/55



Fatos relevantes do mês

➤ UHE - Risoleta Neves – Reabilitação das UGs

Atividades desenvolvidas no período: desmontagem do rotor da ogiva da UG1, retirada do eixo da UG1, ligação e teste dos itens de jateamento do vertedouro, retirada da instrumentação da turbina, finalizada a pintura da caixa espiral, instalados os filtros novos no sistema de filtragem, recuperadas as comportas vagão da tomada d'água (UG1, UG12, UG3), iniciada a desmontagem da UG2.



- Contratação dos Serviços de limpeza do canal de fuga em andamento.
- Reprogramada a mobilização da equipe de mergulho - previsão 15/06/21.

Fatos relevantes do mês

- **UHE - Investigações para análise das condições do Barramento Prin**
- Status das sondagens das Galerias da UHE Risoleta Neves:
 - ✓ Sondagem: Avanço geral de 100%

Dreno	Perfuração	Ensaio Perda d água	Avanço (Em %)
	Executada		
SRBP-501	41,50	13	100%
SRBP-502	39,50	11	100%
SRBP-503	31,50	10	100%
SRBP-505	42,30	14	100%
SRBP-504	35,90	13	100%
SRBP-507	38,31	14	100%
SRBP-506	38,40	16	100%

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

- ✓ **Monitoramento de Efluentes**
- Lançamentos Bacia 1 - Montante e jusante: Pontos não monitorados em atendimento aos compromissos legais, haja vista que não houve efluente bombeado para as Bacias 2A e 2B ou para a Bacia 1 no período;
- Realizado monitoramento para linha de base do rio Doce: sem desvios identificados no período de reporte;

SISTEMA FOSSA FILTRO



Biodigestor desativado



Utilização temporária de banheiros hidráulicos

Fatos relevantes do mês



Implantação de Caixa de Efluentes com Baia de Contenção
– limpeza com Caminhão Limpa-Fossa com frequência semanal

➤ **Monitoramento Qualidade do Ar**

Desde o início do monitoramento da qualidade do ar nas comunidades de Rio Doce, Santana do Deserto e Novo Soberbo, nunca houve a ultrapassagem dos limites legais dos parâmetros monitorados (PM10 e PM2,5), mesmo no período seco. Caso venha ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ **Monitoramento de Fumaça Preta**

Todas as áreas da Samarco e contratadas, responsáveis pela operação de equipamentos e veículos a diesel, realizam o monitoramento periódico de emissão de fumaça preta através do Opacímetro.

A periodicidade do monitoramento é semestral após a data de mobilização do veículo/equipamento. Em caso de identificação de desvios fora dos parâmetros é realizada correção através de manutenção dos equipamentos que apresentarem falha. Na eventualidade de ocorrência futura, o evento será relatado no relatório CIF.

Fatos relevantes do mês

✓ **Monitoramento Hídrico**

Realizado monitoramento no curso d'água da Fazenda Gerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe, e foram identificados desvios associados a elementos naturais (background) da região. Monitoramento hídrico realizado no córrego Micaela apontou distorções na medição de PH e turbidez, provavelmente ligados à dinâmica do curso d'água e chuvas no período.

Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de *background*.

✓ **Hidrogeologia**

- o Foi apresentada proposta de Locação dos Poços de Monitoramento na Fazenda Gerônimo e Setor 8, sendo previstos 4 poços para Fazenda Gerônimo e 4 poços para o Setor 8.
- o Encontram-se em andamento estudos de mapeamento geológico/estrutural nas 3 regiões (Fazenda Floresta, Fazenda Gerônimo e Setor 8).
- o Também se encontra em andamento a Geofísica na Fazenda Floresta.

✓ **Monitoramento de Ruído e Vibração**

Realizado monitoramento de vibração nas regiões de Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal e não foram identificados quaisquer desvios. As análises seguiram as definições estabelecidas na ABNT 10151/2019.

Fatos relevantes do mês

➤ **Gestão Ambiental**

- Se mantém em andamento a atividade remoção da sucata metálica nas margens do reservatório;



➤ **Licenciamento Ambiental**

- Evolução em maio /2021:
 - o 11/05/2021: CT-GRSA (Rejeitos) com participação da Samarco para atualização de informações sobre o licenciamento de Candonga e obras em andamento (recuperação das margens, atividades de recuperação da UHE e obras compensatórias);
 - o 12/05/2021: CT-Infra com participação da Samarco para atualização de informações sobre o licenciamento de Candonga e obras em andamento (recuperação das margens e atividades de recuperação UHE).
 - o 14/05/2021: Protocolo do Of. GMA-C 283/2021 formalizando novamente a entrega da documentação necessária ao licenciamento ambiental da ETE de Santana do Deserto;

Fatos relevantes do mês

- o 26/05/2021: Protocolo do Of. GMA-C 323/2021 comunicando o início das atividades para instalação dos equipamentos de monitoramento da integridade dos barramentos metálicos;
- o 26/05/2021: Retorno de vistas do recurso administrativo ocorreu na 154ª Reunião Ordinária da CNR com indeferimento por completo do recurso.
- o A votação ocorreu de forma separada: i) cenário 1, ii) exclusão das condicionantes e iii) alteração de redação das condicionantes requeridas.
- o 02/06/2021: Previsão de início das amostragens para caracterização da CONAMA 454/2012.

Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Indicadores

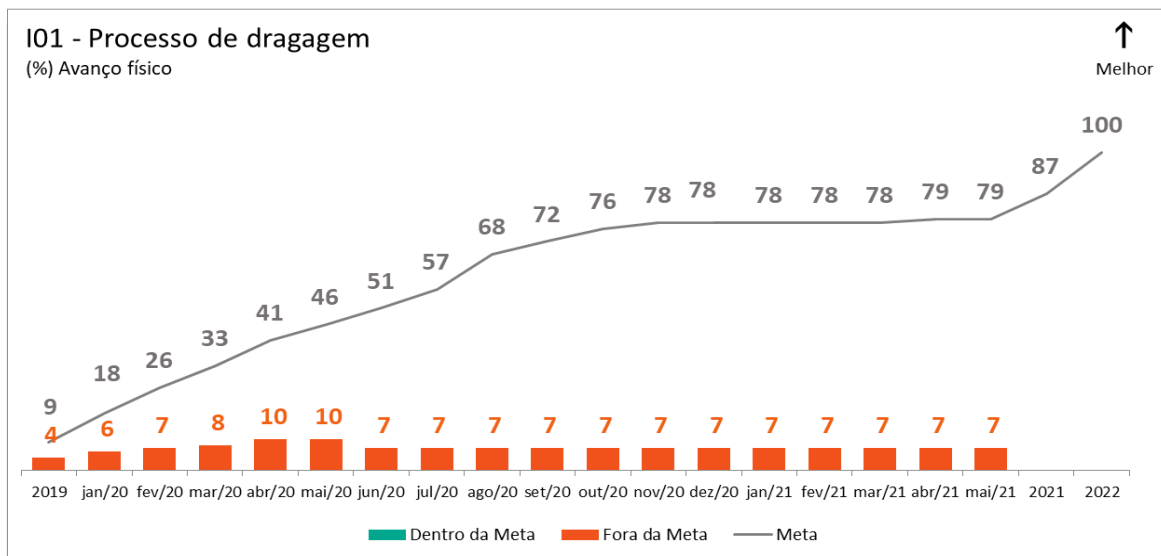


Gráfico 1. (%) Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado

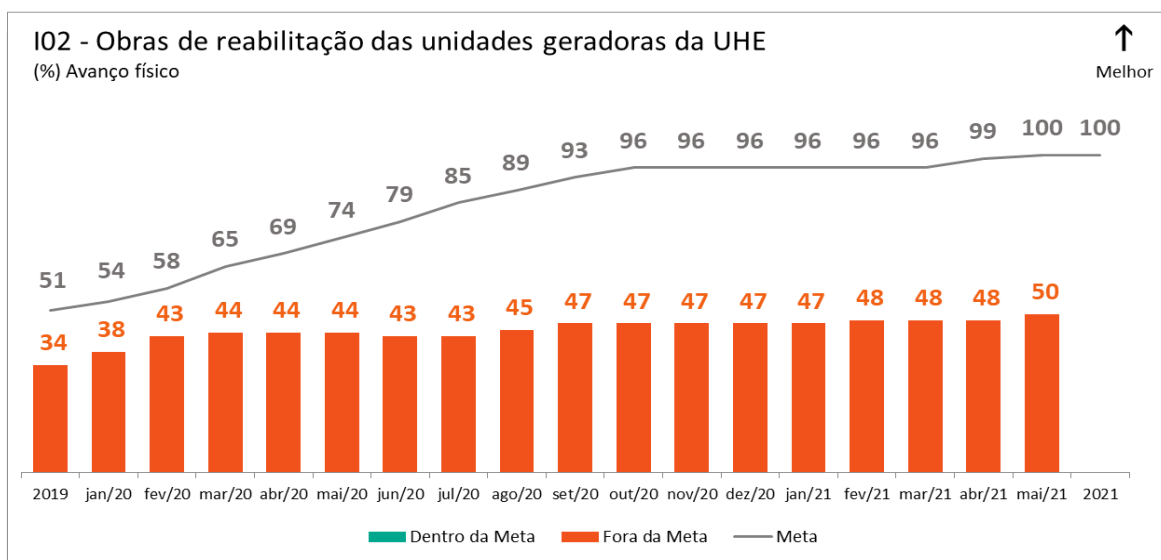


Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado

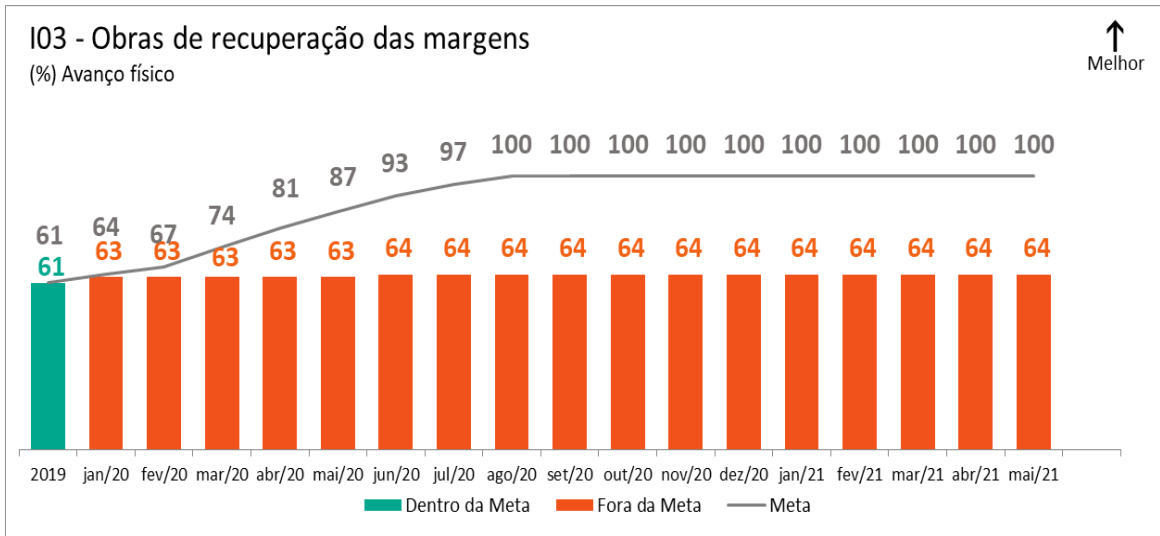


Gráfico 3. (%) Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado

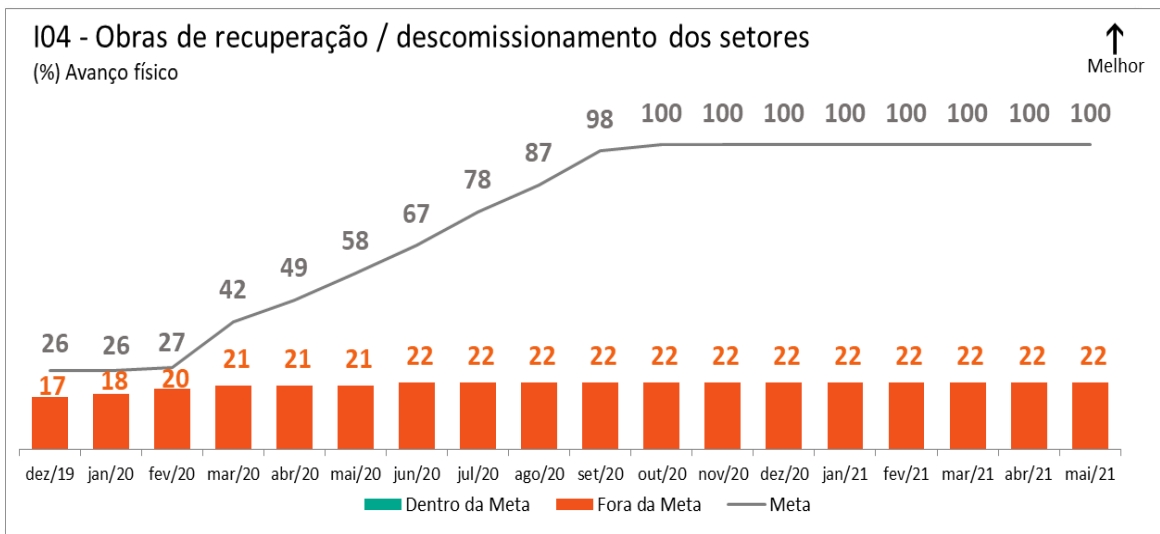


Gráfico 4. (%) Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.625 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 910 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.610 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 209 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 103 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 15 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 100 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 3 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Fatos relevantes do mês

Obras paralisadas pela PMLB através dos Ofícios 55/2021 E 58/2021 recebidos em 25/05/2021 e 27/05/2021 por um período de 10 dias, diante do surto de COVID-19 no município e possível colapso do sistema de saúde. A FR solicitou que sejam seguidas as diretrizes informadas no ofício 55-2021-SEMSA e que o efetivo alojado permaneça na localidade, tendo em vista a necessidade de cumprimento de quarentena caso haja deslocamento.

Elaborados e concluídos os projetos das pontes Bueno, Juca Ponciano, Tiara, Tomador de Água, Ouro Fino (Novo Bento) e Santa Rita e da Passarela Campinas Barreto. Projetos das Pontes Curvinas e Borba previstos para 15/06/2021.

Conclusão das obras de todas estruturas simples.

Conclusão das obras de 12 estruturas complexas.

Conclusão da obra do Transbordo de Lixo do Município de Barra Longa

Aprovado pelo DER-MG o projeto do acesso ao Complexo do Parque de Exposições de Barra Longa.

Indicadores

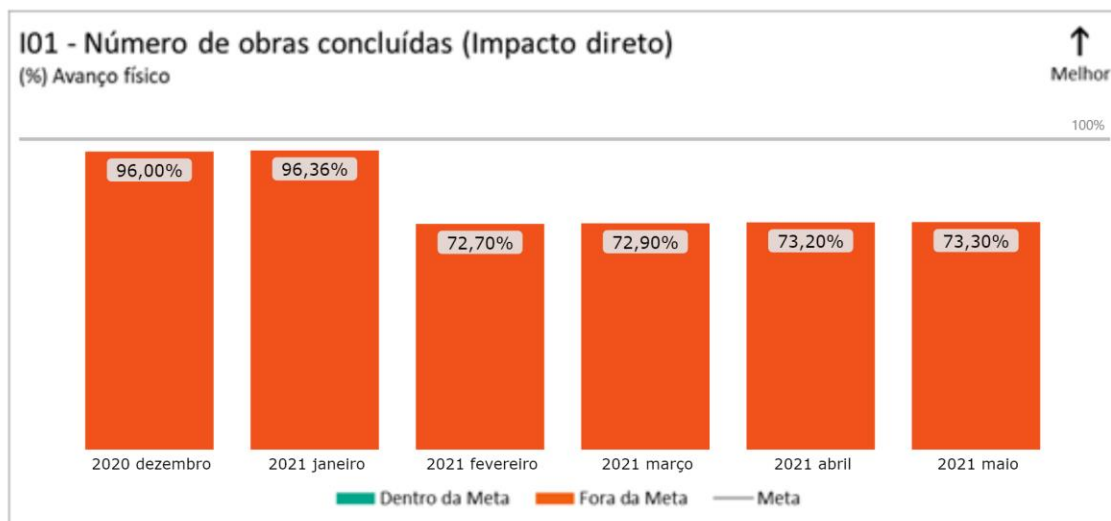


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

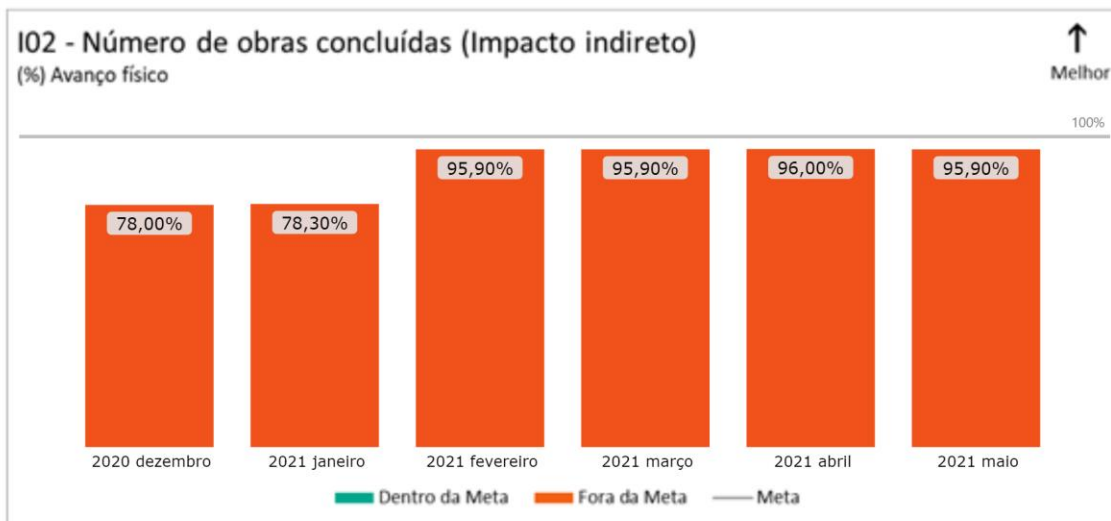


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

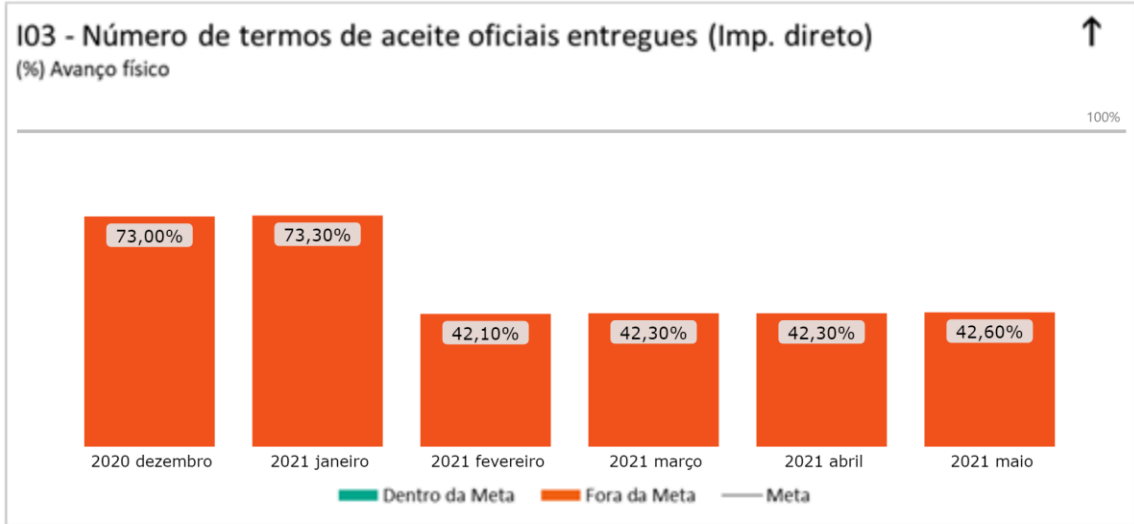


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

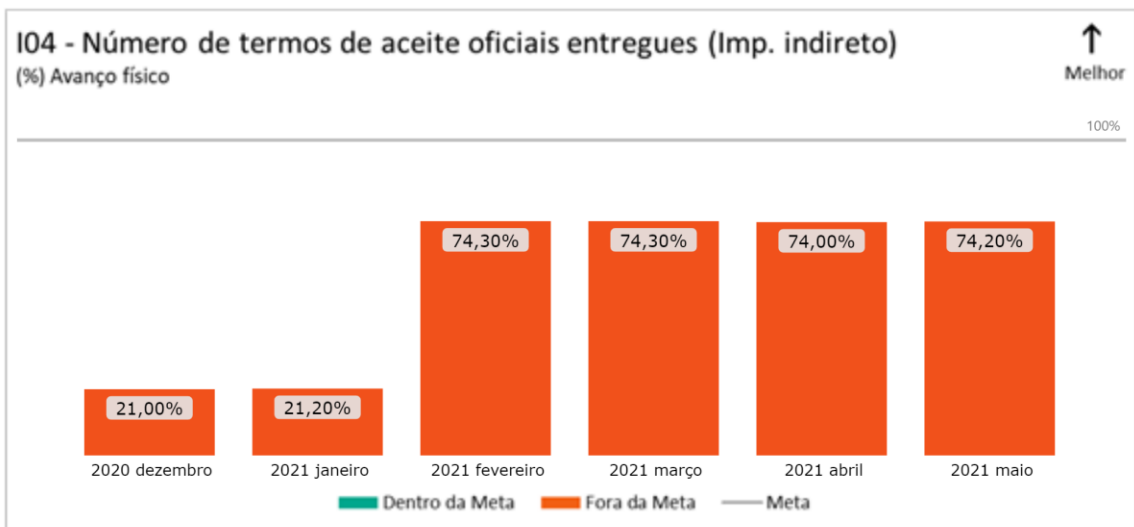


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
- dezembro de 2021 ● Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional
- dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Mariana e Barra longa

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realizado kickoff com a empresa CPCD e reunião para início da execução do novo contrato no projeto Apoio Pedagógico na rede Municipal de Mariana.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I1	Atendimento às solicitações/demandas das escolas temporárias	Demandas Escolares Atendidas / Total de Demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo	%
I2	Cumprimento das normas de infraestrutura escolar para as escolas temporárias	Normas cumpridas / Total de normas exigidas	%
I3	Disponibilidade de vagas para transportar alunos	Número de vagas disponibilizadas / Número de alunos que solicitaram transporte	%
I4	Cumprimento das atividades de convivência	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	%
I5	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Número de escolas que receberam Apoio Pedagógico / Número de escolas que demandaram Apoio Pedagógico	%
I6	Percentual de implantação do Apoio Psicopedagógico	Número de avaliações psicopedagógicas com devolutiva / Número de encaminhamentos para o apoio psicopedagógico	%

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- August de 2021 ● Início das ações de reparação das Referências Culturais
- August de 2021 ● Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- August de 2021 ● Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
- August de 2021 ● Entrega do sistema básico de monitoramento da Reserva Técnica
- December de 2021 ● Restauração de 85 peças na Reserva Técnica
- December de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
- December de 2021 ● Oficinas sobre Educação Patrimonial
- December de 2021 ● Conclusão do calendário 2021 de apoio às manifestações culturais
- December de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário esportivo 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Retomada do contrato da Casa dos Saberes e Horta Comunitária para serviços de estruturação, conservação, manutenção e administração, bem como a construção de um calendário de atividades para esses espaços.

Finalização da entrega de uniformes e materiais esportivos para times de futebol.

Conclusão de 18 projetos de restauro na Reserva Técnica.

Indicadores



Gráfico 1 - Percentual de restituição de bens materiais culturais. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

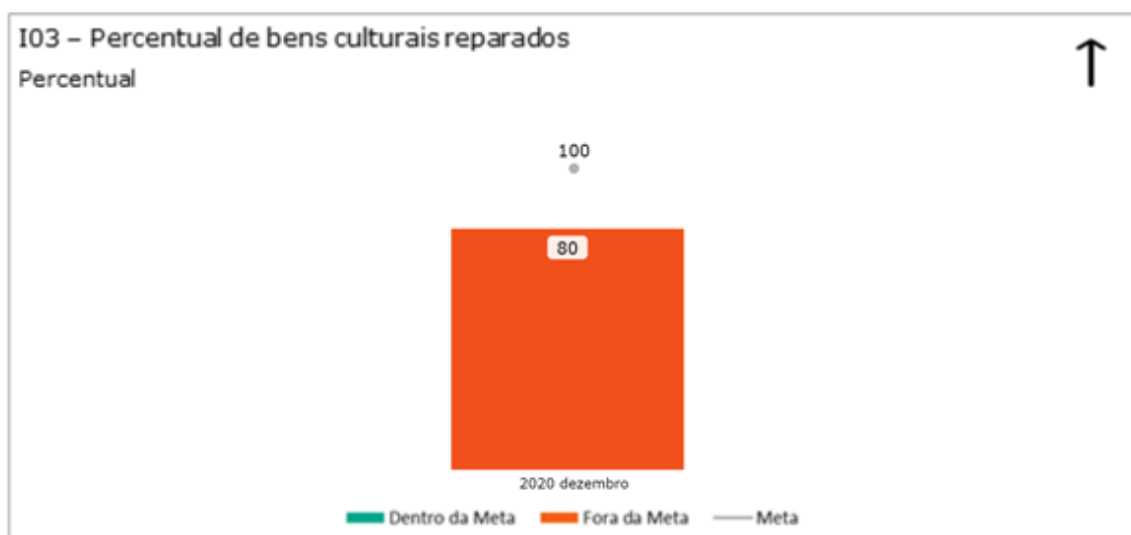


Gráfico 2 - Percentual de bens culturais reparados. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

* Indicadores atualizados conforme revisão do documento Definição do Programa efetuada em nov/20 aguardando aprovação da CTECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	a	Em Andamento
Cláusula	103	b	Planejado
Cláusula	103	c	Planejado
Cláusula	103	d	Planejado
Cláusula	103	e	Planejado
Cláusula	103	f	Planejado
Cláusula	103	g	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente

Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	321	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- dezembro de 2021 ● Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade
- dezembro de 2021 ● Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realizada aula inaugural do Programa de Fortalecimento das Organizações Locais com 118 participantes.

Realização do workshop Inaugural com empresariado de Governador Valadares com objetivo de viabilizar o arranjo produtivo local para o desenvolvimento turístico.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Cláusula	112	§único	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente

Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

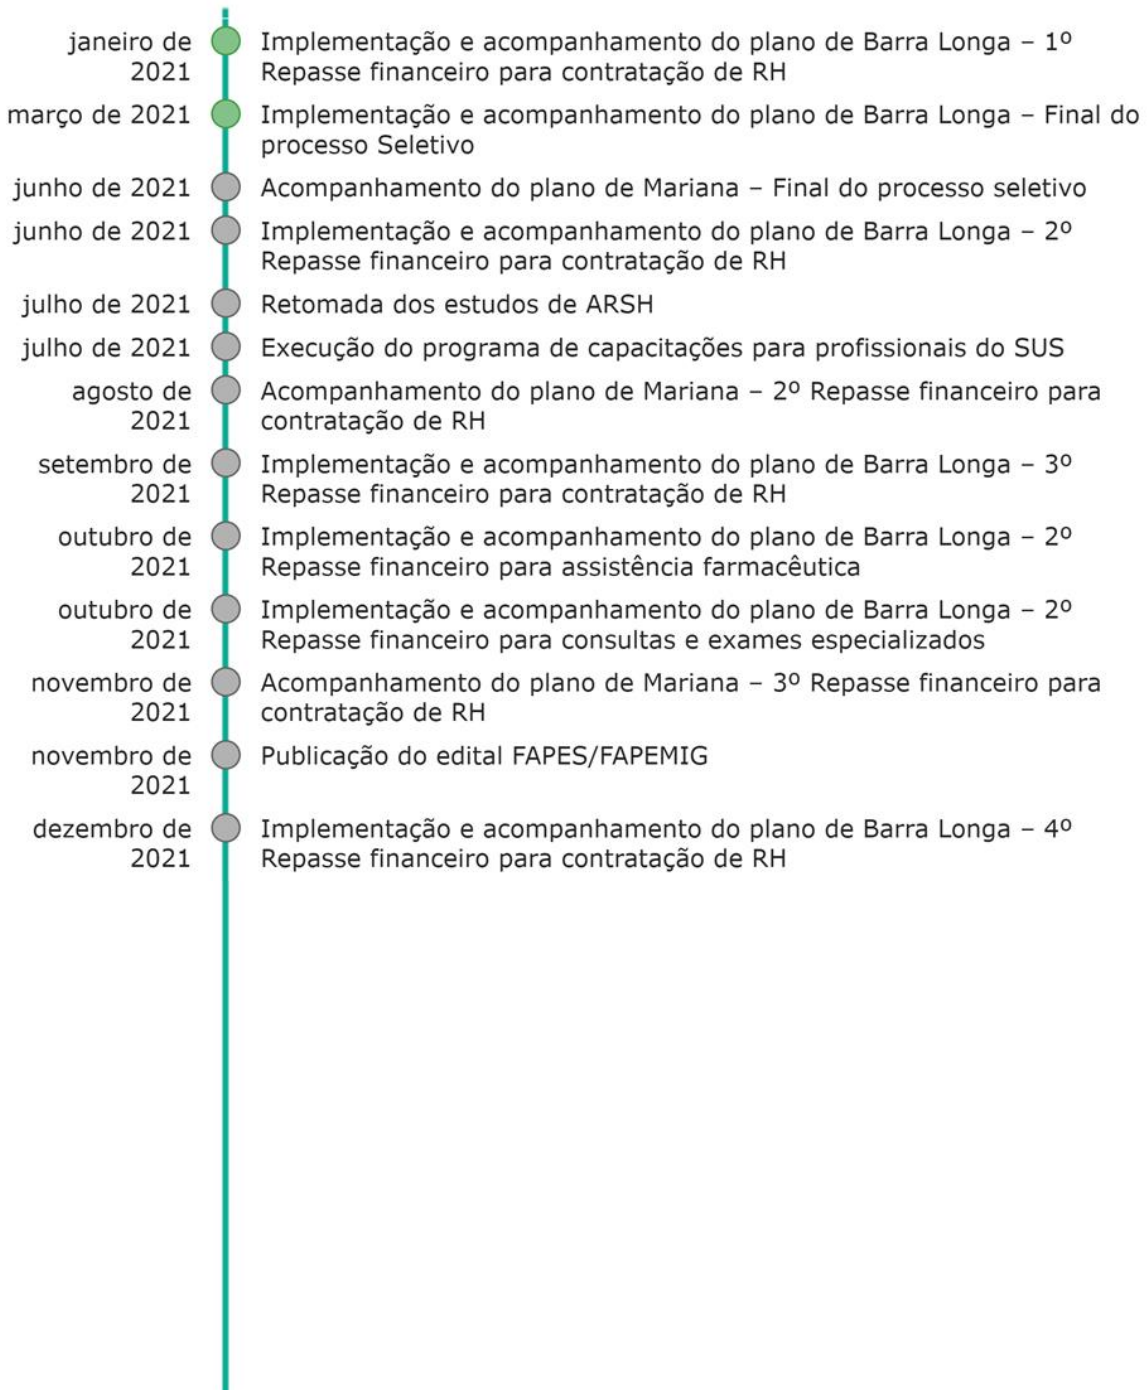

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 33 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (17 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

Fatos relevantes do mês

Assinatura dos Acordos de Cooperação com 100% dos municípios atingidos para realização do Programa de Capacitação para os profissionais do SUS. Mariana e Barra Longa não precisam assinar o acordo de cooperação, haja vista que a capacitação está definida em ACP.

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Barra Longa vem recebendo apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos médicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Quanto ao atendimento em saúde mental, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova têm sido utilizados para o transporte de pacientes, atendimento no transporte da Estratégia da Saúde da Família, transporte da equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializados, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Mariana vem recebendo apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologado pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 17 profissionais de saúde atuando no fortalecimento do SUS. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, na qual são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (17 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de maio/21):

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Enfermeiro – 2 (40h/semana) – Atuação: 1 ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no CAPSAD;
Odontóloga – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;
Psicólogo – 8 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 1 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 1 no Conviver;
Terapeuta Ocupacional – 2 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS e 1 no CAPSij;
Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando reforçar o trabalho das áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	Caput	Em Andamento
Cláusula	114	Item A	Concluído Internamente
Cláusula	114	Item B	Em Andamento
Cláusula	115	Caput	Em Andamento
Deliberação	100	Item 1	Concluído Internamente
Deliberação	126	Item 2	Concluído Internamente
Deliberação	126	Item 3	Concluído Internamente
Deliberação	137	Item 1	Em Andamento
Deliberação	170	Item 1	Em Andamento
Deliberação	31	Item A	Concluído Internamente
Deliberação	338	Item 1	Concluído Internamente
Deliberação	463	Caput	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- 
- junho de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica no ES
 - julho de 2021 ● Início da execução do projeto de pesquisa para desenvolvimento e registro de herbicida orgânico
 - agosto de 2021 ● Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
 - setembro de 2021 ● Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica em MG
 - setembro de 2021 ● Início do Projeto Empreende Rio Doce
 - novembro de 2021 ● Lançamento da Chamada do Programa de Incentivo à Inovação
 - novembro de 2021 ● Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural
 - dezembro de 2021 ● Homologação do resultado final da chamada de Agroecologia e Produção Orgânica do ES

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Aprovação do Documento de Definição do Programa de Promoção à Inovação (PG15), por meio da NT 88/2021 durante a 53ª Reunião Ordinária da CTEI, no dia 12/05/2021.

Indicadores

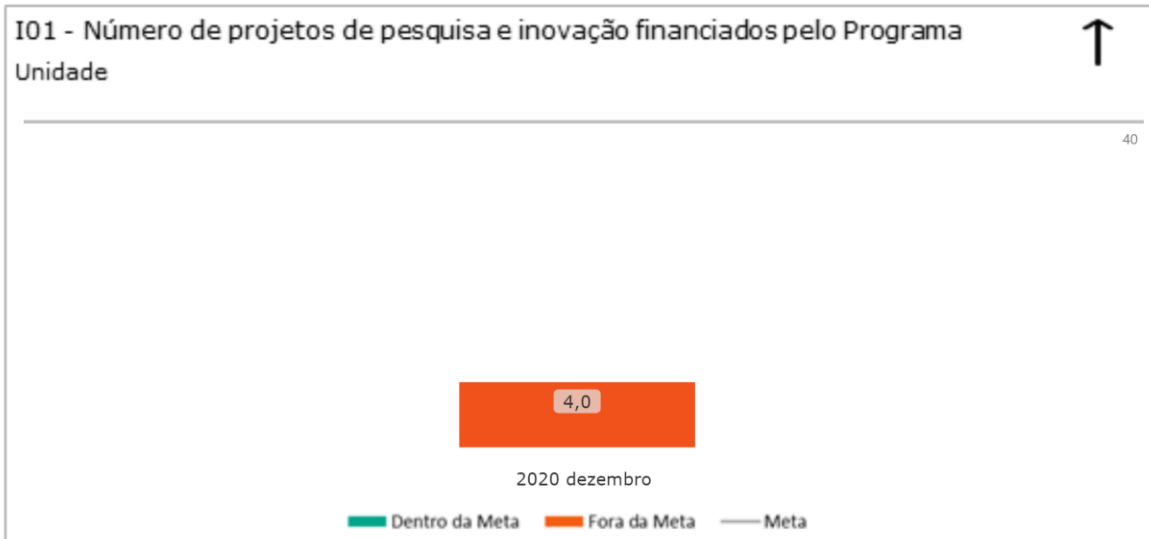


Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.




Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianual.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Pendente
Cláusula	119	único	Em Andamento
Cláusula	120	caput	Pendente
Cláusula	121	caput	Pendente
Cláusula	122	caput	Pendente
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121		Concluído Internamente
Deliberação	480		Em Andamento

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
agosto de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Book do Município de Linhares
setembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
setembro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Book do Município de São Mateus
outubro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
outubro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Book do Município de Bugre
novembro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial I - Foz do Rio Deoce - Litoral
dezembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (98 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA e APAP no ES (98 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 163 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 05/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 122 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar.

Nota: Grandes número apresentados de forma acumulada. Devido as restrições da pandemia do COVID não estamos realizando atividades em Campo.

Fatos relevantes do mês

Aplicação de aproximadamente 1500 formulários de coleta de dados primários de forma remota com pescadores e aquí cultores, sendo cerca de 40% sobre a pesca continental e monitoramento de 18 pontos de desembarque pesqueiro pelo Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro.

Entrevistas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a 13 Instituições Governamentais (5 Estaduais e 8 Municipais), a 23 Instituições de Pesquisa e Ensino e, 38 Estabelecimentos Comerciais (36 Insumo e 2 Distribuidores/Frigoríficos).

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as) /aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aquicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar', 'Associativismo e Cooperativismo' e de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas.	100%	Dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER.	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias


Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	172	§1º (Iniciar em 6 me...	Status Desconhecido
Cláusula	172	§1º (Manter por 10 a...	Status Desconhecido
Cláusula	172	§2º	Status Desconhecido
Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	178	n/a	Status Desconhecido
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	240	2	Status Desconhecido
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- 
- outubro de 2021 ● Cursos de capacitação da EMATER concluídos
 - dezembro de 2021 ● Entrega do relatório final do contrato 4800019735 UFV-SIF - Pró-ATER

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao PASEA. Dos 202, 188 são PASEA planejados sendo que 184 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 14 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 148 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 34 não aderiram e 2 estão em análise pelo produtor;
- 50.721,9 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 690,2 toneladas no mês;
- 6.439,6 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 425 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 860 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.738 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 3.065 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 5.530 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 27.451 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 1.892 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 2.716 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 190 toneladas no mês.

Parcerias

- 33 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 16 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas nos territórios Mariana e Alto Rio Doce. As Unidades Demonstrativas foram implantadas em parceria com o *World Resources Institute* (WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF).

Nota Explicativa: Em maio de 2021 houve retificação das horas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) individuais (de 1.005 para 1.000) e coletivas (de 1.136 para 1.051), prestadas no Lote 4, em relação a abril de 2021, após apuração em ocasião da auditoria da Ernst Young.

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Retorno das atividades de campo de ATER/ATES.

Baixo Rio Doce

Retomada das atividades de campo de ATER mediante liberação pela sala de situação.

Alto Rio Doce

Paralisação das atividades do programa a pedido da prefeitura de Barra Longa (COVID-19).

Em 11/05/2021 foi dada como implantada a Unidade Demonstrativa de Horta Agroecológica do senhor Rafael Arcanjo na Fazenda Ocidente localizada na cidade de Barra Longa. Um projeto junto às Empresas EPAMIG e Biokratos.

Indicadores

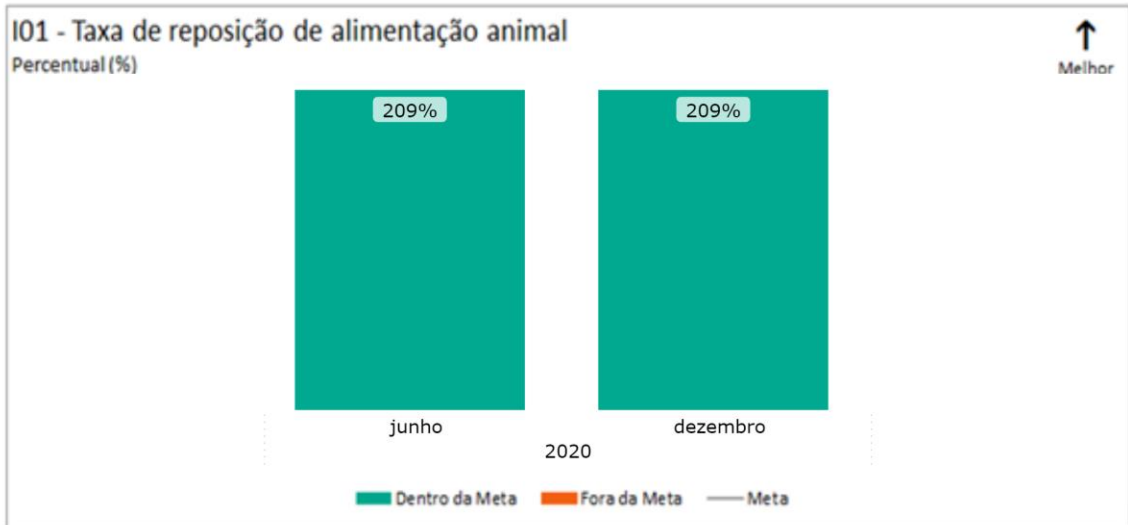


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de produtores com ISA maior ou igual a } 0,7 / \text{n}^\circ \text{ de produtores participantes do Programa}$	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de áreas produtivas reparadas e ou adequadas} / \text{Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação}$	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130		Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- January de 2021 ● Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
- May de 2021 ● Encerramento do Fundo Compete MG
- September de 2021 ● Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF
- December de 2021 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 54.29 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 44 milhões foram **desembolsados** para 1358 contratos e 1078 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 10 milhões foram **desembolsados** para 406 contratos e 395 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Fatos relevantes do mês

Divulgação dos vídeos dos ciclos 1 e 2 do projeto Promoção de Negócios Coletivos e Individuais, em parceria com a Brazil Foundation. Continua uma boa divulgação, inclusive na TV Gazeta (Globo/ES).

Indicadores

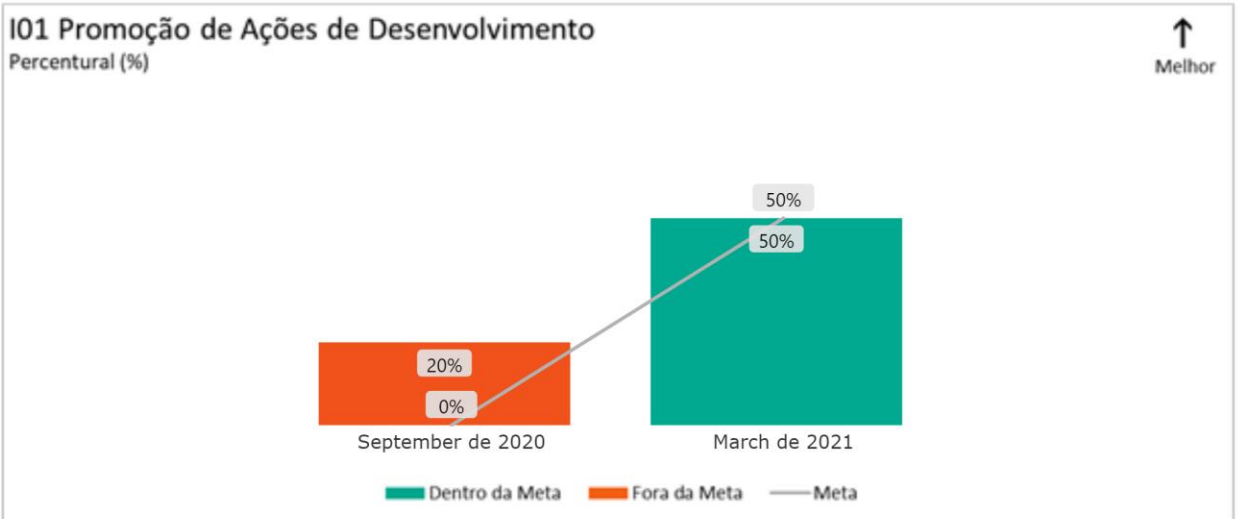


Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Gráfico Acumulado

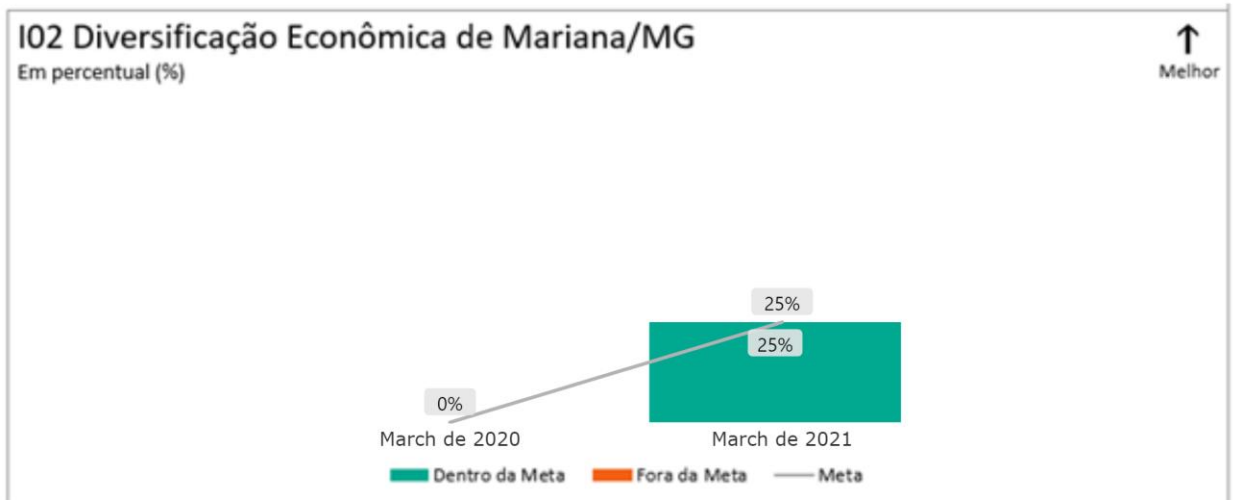


Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Gráfico Acumulado

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	342	Item 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 ● Finalização da assessoria técnica pelo IEPT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 ● Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- setembro de 2021 ● Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- novembro de 2021 ● Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 ● Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

321 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 230 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis** e 167 o número de **reposições de equipamentos e insumos**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (412) ultrapassa a quantidade total de atendidos (321). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Abertura de mercados Minha Casa em Mim - Loja Semana Criativa - Tiradentes/MG e FARM/ Rio - Nova Lima em Maio de 2021.

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em junho/21.

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em junho/21.

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 132 turmas ofertadas, abertura de 3.705 vagas, 9.175 pessoas matriculadas, 3.257 concluintes, 1.474 reprovados e 2.587 evadidos.
- **R\$ 1.556.209** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização de workshop on-line com o tema Qualificação Profissional e a participação de 11 pessoas.

Conclusão do diagnóstico inicial em Governador Valadares e início em Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado nas empresas participantes do 3º Ciclo do Programa de Desenvolvimentos de Fornecedores em Minas Gerais.

Conclusão do 1º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Espírito Santo, para 5 empresas em Linhares e 4 em Colatina.

Indicadores

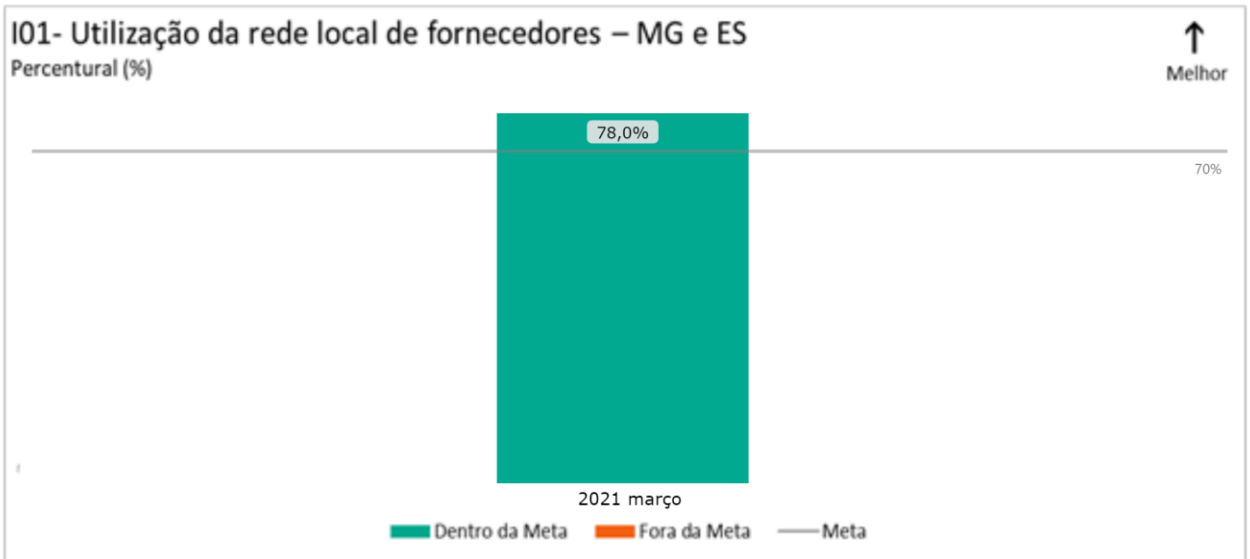


Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

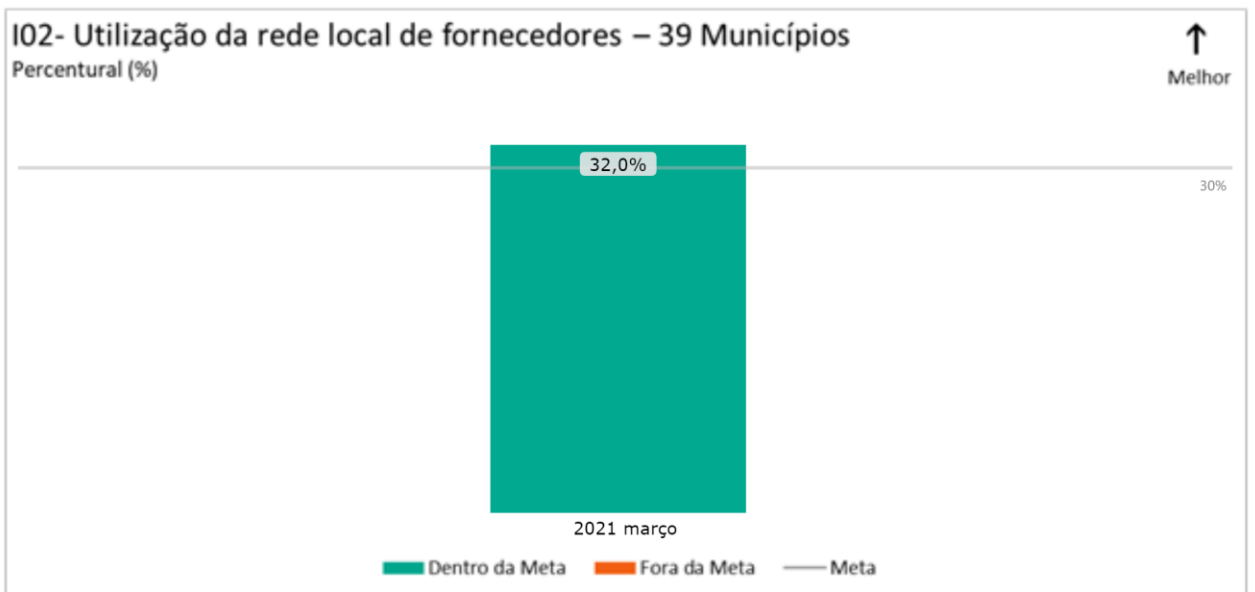


Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.

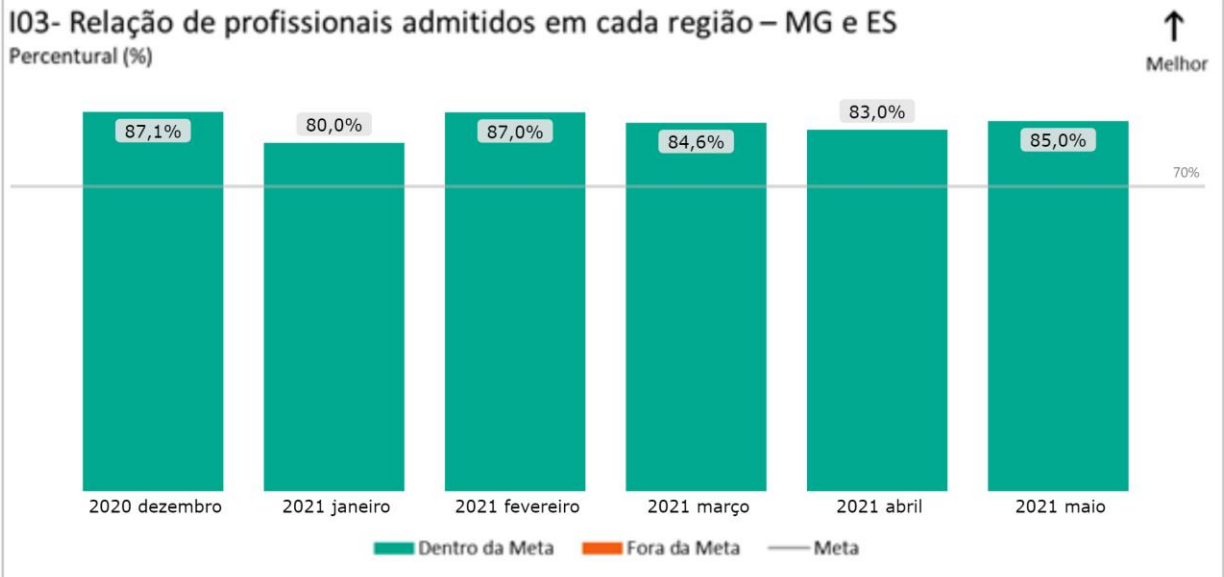


Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

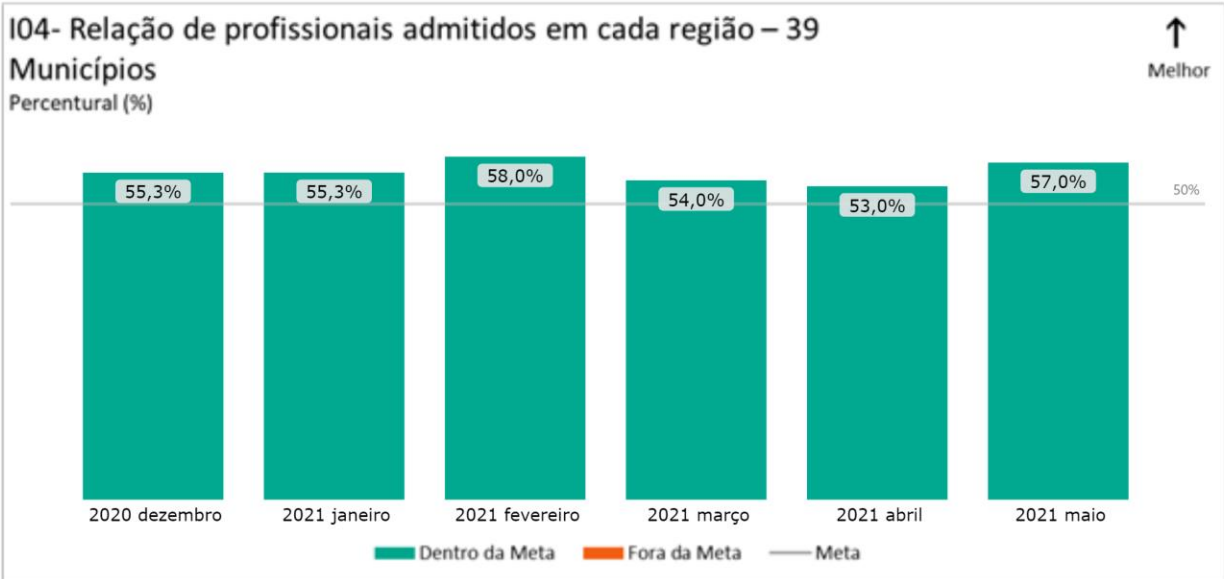


Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.




Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

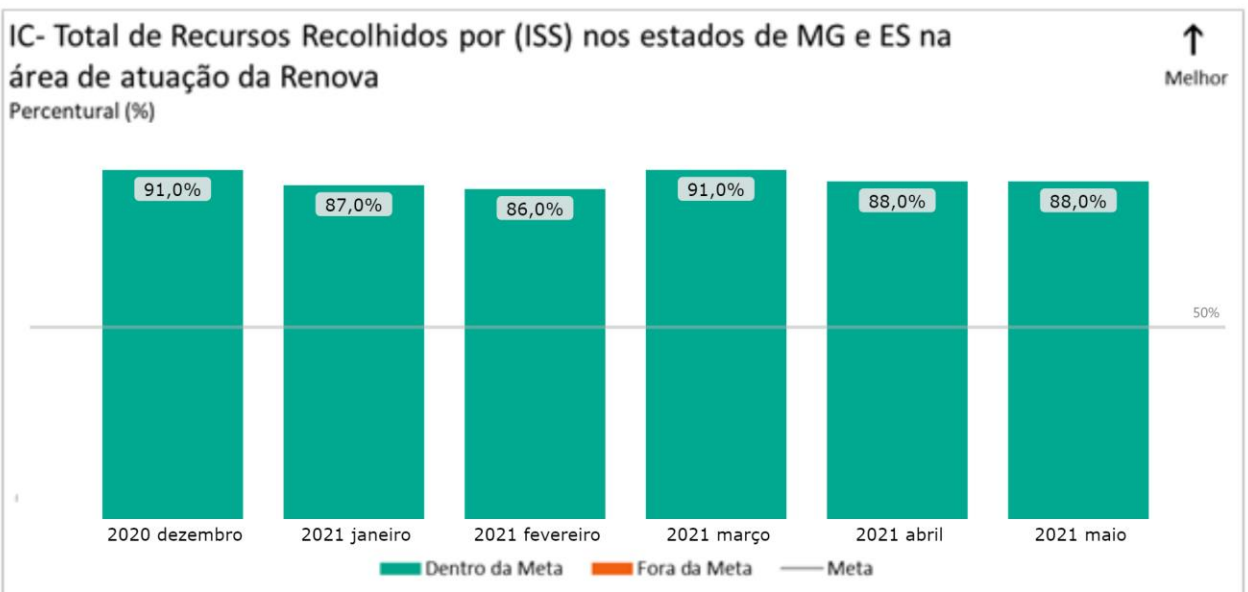


Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

Data de corte 31/05/2021

*Valor sujeito a alterações

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Em Andamento
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Concluído Internamente

Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- Atualmente há **10.530 titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes **(11.168)** , são **21.698** pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.599,7 milhões**.

Fatos relevantes do mês

- Inclusão de **12** auxílios por Decisão Judicial e reativação de **4** auxílios;
- Exclusão de **595** auxílios;
- Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

Indicadores

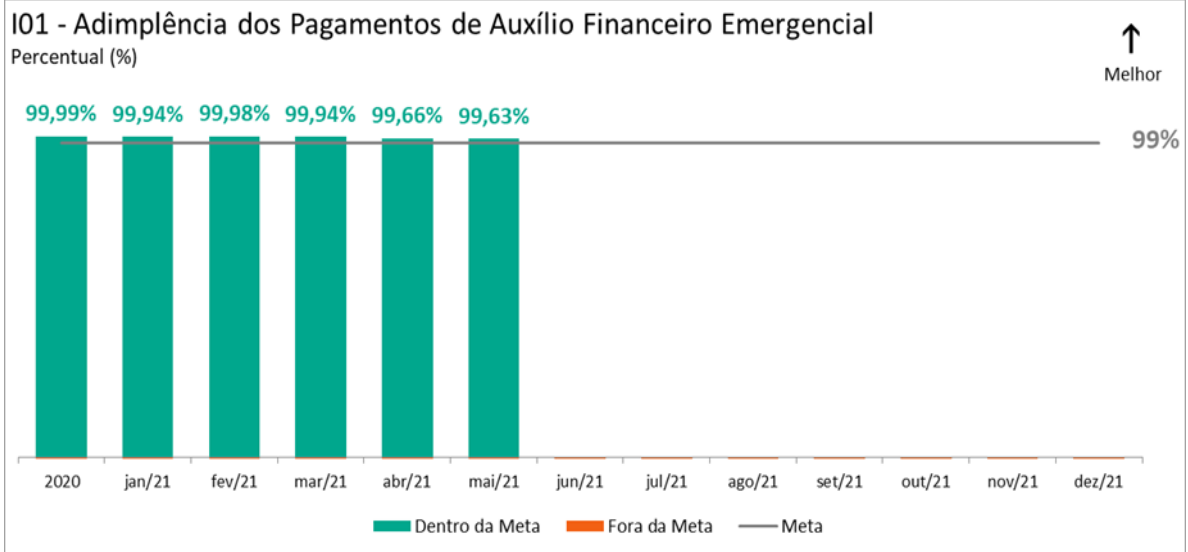


Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Pendente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento

Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	4	Em Andamento

Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



Nota: A "Conclusão da execução do plano de controle de emissões atmosféricas" foi reprogramada para 2022.

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Protocolo realizado na 12ª Vara Federal Cível e Agrária, informando o atendimento dos itens 1, 2, 7, 8, 10, 10.1, 11.1, 12, 13 e 14, do Eixo Prioritário 1 da ACP, em 10 de maio de 2021.

Aprovação do novo cronograma da Mancha de Inundação Pós Candonga – Deliberação CIF nº 497, de 05 de maio de 2021.

Aprovação da NT nº 10/2021 sobre o Estudo de Mapeamento de Habitats Físicos (Eixo 1, item 1 - Indicadores), em 11 de maio de 2021.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	159	Caput (manutenção)	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Reprogramado
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- April de 2021 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- July de 2021 Conclusão do monitoramento terrestre executado pela empresa Golder
- October de 2021 Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Ponte Nova - 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Rio Doce - 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada executado pela EGIS - Santa Cruz do Escalvado- 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
- December de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

Fatos relevantes do mês

Estratégica: No dia 06/05/2021 através da deliberação CIF nº502 foi dada como encerrada a cláusula 158 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), referente ao Projeto de Plantio Emergencial, do Programa de Recuperação da Área Ambiental 1, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado – MG.

Alto: As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo











Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021		Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
julho de 2021		Conclusão da elaboração da 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
julho de 2021		Desenvolvimento de software para gestão e acompanhamento da produção de sementes da rede (objetivo específico 13)
agosto de 2021		Conclusão da elaboração do 2ª versão do Plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
outubro de 2021		Conclusão do engajamento nos Assentamentos (ES) no ano 02 (2020/2021)
outubro de 2021		Entrega dos programas computacionais para a gestão e acompanhamento dos processos de produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce (objetivo específico 13)
novembro de 2021		Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8)
novembro de 2021		Elaboração do plano de monitoramento da produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudanças da Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Doce (objetivo específico 6)
dezembro de 2021		Desenvolvimento dos processos e sistemas para a precificação das sementes produzidas (objetivo específico 7)

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

Finalização da contratação de 4/5 empresas do edital para atividades de restauração florestal.

Médio Rio Doce

Autorização para retomada das atividades nos assentamentos do MST (800 hectares)- Francisca Veras.

Autorização para retomada das atividades em Mutum, Laginha (500 hectares) – Instituto Terra.

Parcerias

As iniciativas de SAF inscritas no Concurso "Ideias Renovadoras: Plantando Árvores e Colhendo Alimentos" foram lançadas em uma publicação da Fundação Renova em conjunto com WWF. O concurso premiou 5 das iniciativas e em conjunto com diversos atores houve a elaboração de 5 novos arranjos de SAF para a bacia do rio Doce.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água







Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Cláusula	163	Caput (ação 2)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

setembro de 2021		Conclusão do engajamento na sub-bacia do Rio EME no ano 04 (2019/2020)
outubro de 2021		Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
novembro de 2021		Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
dezembro de 2021		Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
dezembro de 2021		Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
dezembro de 2021		Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Alto Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

Finalização da contratação de 4/5 empresas do edital para atividades de restauração florestal.

Médio Rio Doce

Autorização para retomada das atividades na Bacia do Itambacuri (140 nascentes) – Instituto Terra.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) \times 100$	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	$(\text{Total da área amostral com espécie invasora} / \text{Total da área amostral}) \times 100$	%
I04	Solo exposto	$(\text{Total da área amostral com solo exposto} / \text{Total da área amostral}) \times 100$	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 3)	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Em Andamento
Cláusula	166	§1º	Pendente
Cláusula	166	§2º	Planejado

Cláusula	164	a (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	a (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	5	Planejado
Deliberação	461	3	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente

| Deliberação

450

2

Judicializado

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 3 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2021	●	Protocolo do relatório final da Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce
julho de 2021	●	Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
setembro de 2021	●	Relatório do Monitoramento da Linha Temática I - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1
setembro de 2021	●	Relatórios do Monitoramento da Linha Temática II - Dinâmica do Sedimento e Hidrogeomorfologia - Ciclo 1
setembro de 2021	●	Relatórios do Monitoramento da Linha Temática III - Biota Aquática - Estrutura do Habitat - Ciclo 1
setembro de 2021	●	Relatórios do Monitoramento da Linha Temática V - Ecotoxicidade - Ciclo 1
setembro de 2021	●	Relatórios do Monitoramento da Linha Temática VI - Matas ciliares - Ciclo 1
novembro de 2021	●	Protocolo, junto à CT-Bio, do relatório consolidado do plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática
dezembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 31/05/2021, foi protocolado o relatório mensal de atividades da Fundação PRÓ-TAMAR, referente à cláusula 165 do TTAC bem como o comprovante de protocolo no SEI/CIF.

Em 26/05/2021, a Fundação Renova apresentou a avaliação em formato de peer review do Segundo Relatório Anual do Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/RRDM-FEST), elaborada pelo grupo de pesquisadores independentes do Instituto Ekos Brasil, conforme programação exposta no FR.2020.2105 de 18 de dezembro de 2020.

Em 21/05/2021, A Fundação Renova apresentou o relatório final do processo de “Avaliação do Estado de Conservação de Espécies da Biota Aquática do Rio Doce”, em resposta ao ofício SEI 21.2021/CTBio, referente a alínea b da cláusula 164 do TTAC.

Em 20/05/2021, a Fundação Renova apresentou a proposta de elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática (cláusulas 164, 165, 168 e 181) em atendimento ao Item 5 da Deliberação no 450 de 22 de outubro de 2020.

Em 14/05/2021, a Fundação Renova apresentou o Ofício FR.2021.1103-03 contendo a nova versão final do documento de Proposta do “Plano de Ação para Conservação e Recuperação da Biodiversidade Aquática do rio Doce”.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Cláusula	167	caput	Em Andamento
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Básico ES
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre


Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- 
- fevereiro de 2021 ● Protocolo do Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
 - setembro de 2021 ● Finalização das amostragens em campo do monitoramento da Fauna Terrestre, realizada em período seco

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Em 28/05/21, foi realizada uma reunião entre CTBio e Renova para discussão do documento de Definição do Programa 30.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos


Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Deliberação	122	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente
Cláusula	169	Caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- 
- mai-21 Conclusão do repasse do recurso do Pleito COLESOB26 - Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE, de Colatina.
 - mai-21 Conclusão do repasse do pleito RICESOB05 - Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município (EEE02, LR 02, Interceptor 01 da margem direita do Rio Casca, muros de contenção em gabião nas EEE 01 e Final, ligações prediais de esgoto, demolição e recomposição de pavimento poliédrico com reaproveitamento, em parte do Interceptor Roma, entre outros serviços), de Rio Casca.
 - out-21 Conclusão do repasse do pleito SJGESOB02 - Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São José do Goiabal.
 - nov-21 Conclusão do repasse do pleito SEPESOB01 - Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14, de Sem-Peixe.

Fatos Relevantes

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 1.675.617,06 , referente ao pleito da ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca , no valor de R\$ 12.985,20 , referente ao pleito da contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Bugre , no valor de R\$ 38.400,21 , referente ao pleito da elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo , no valor de R\$ 803.739,44 , referente ao pleito da implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Conselheiro Pena , no valor de R\$ 88.963,73 , referente ao pleito da construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca , no valor de R\$ 683.832,02 , referente ao pleito da complementação de obras do sistema de esgotamento sanitário na sede do município;

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal , no valor de R\$ 104.650,53 , referente ao pleito da ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em maio de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio , no valor de R\$ 247.904,02 , referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde.

Grandes números do programa

- No mês de maio de 2021 foram **repassados R\$ 3.656.092,21** para ações dos municípios de Bugre, Conselheiro Pena, Ipatinga, Rio Casca, Córrego Novo, São José do Goiabal e Dionísio;
- No mês de maio de 2021 foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês de maio de 2021 a equipe técnica realizou **74** visitas e/ou reuniões de **apoio técnico aos municípios.**

Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são todos trimestrais.

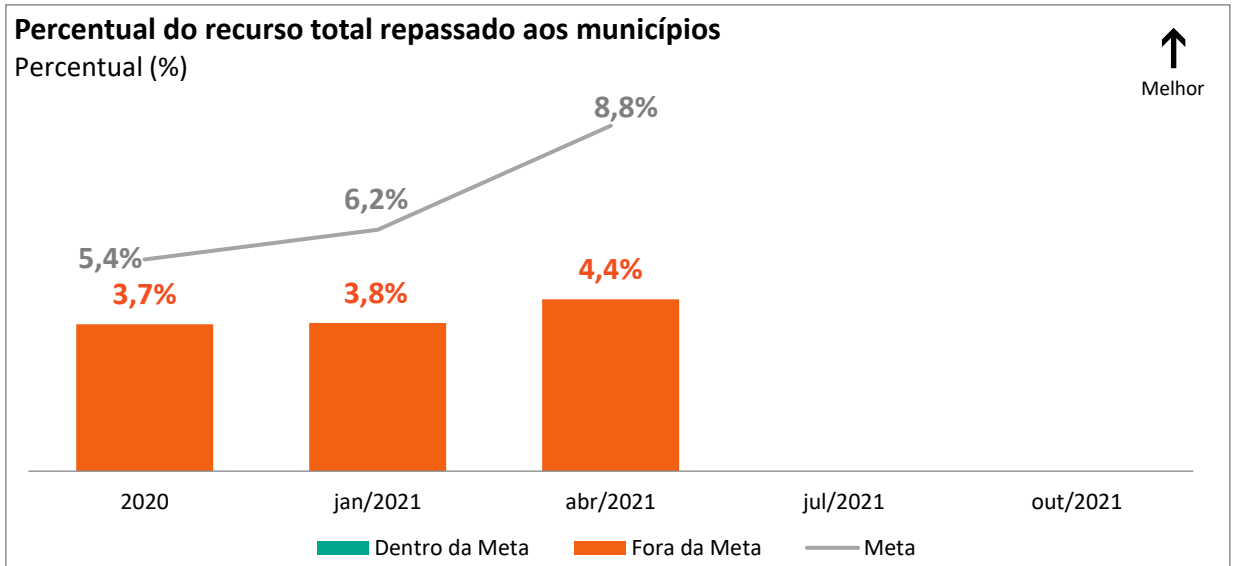


Gráfico 1. Percentual do recurso repassado.

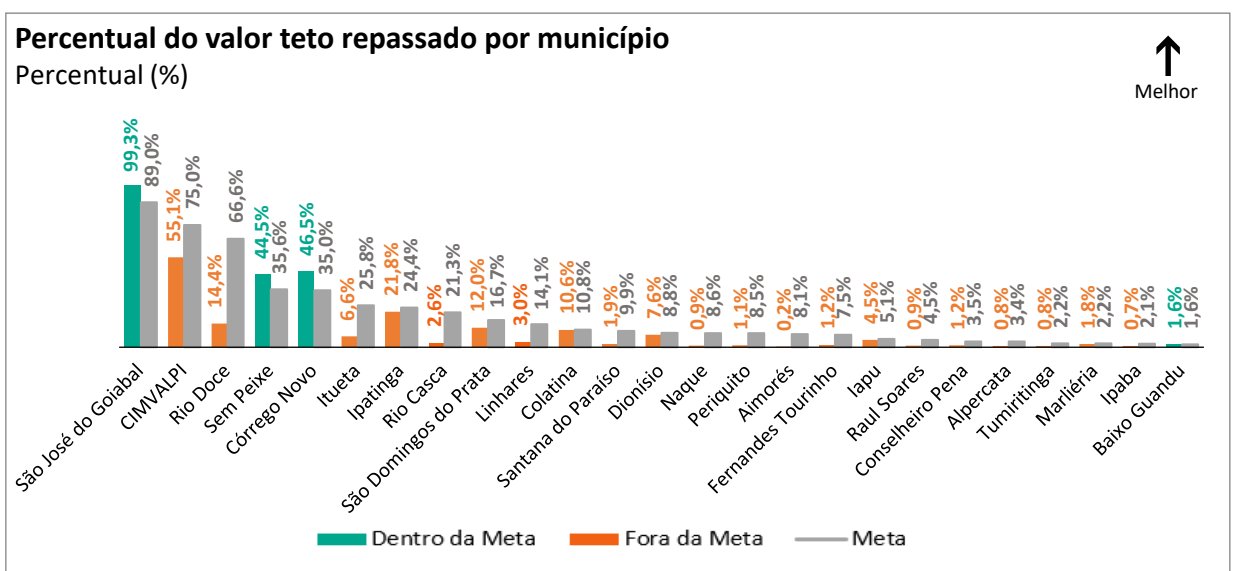


Gráfico 2. Percentual do valor teto repassado, por município.

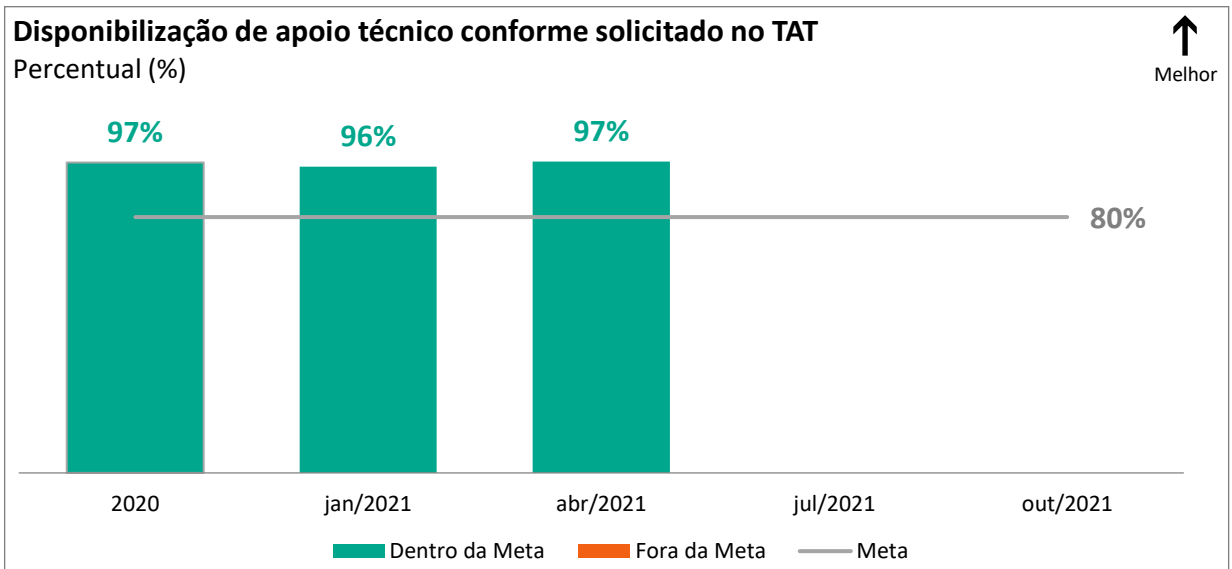


Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).

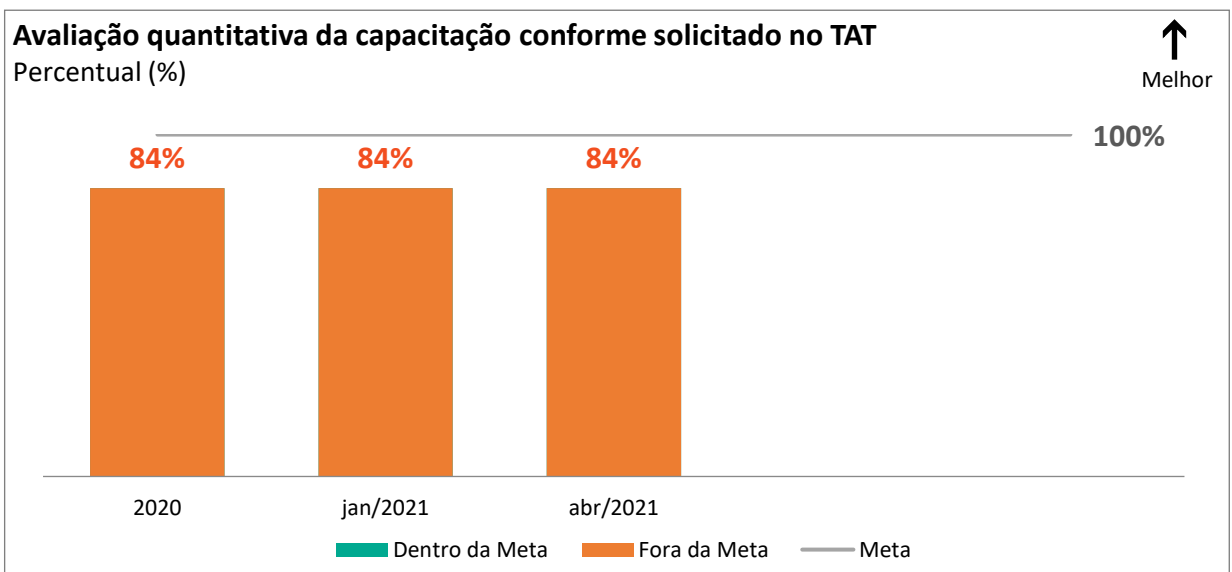


Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.

Repasse de recurso financeiro aos municípios

Percentual (%)

↑
Melhor

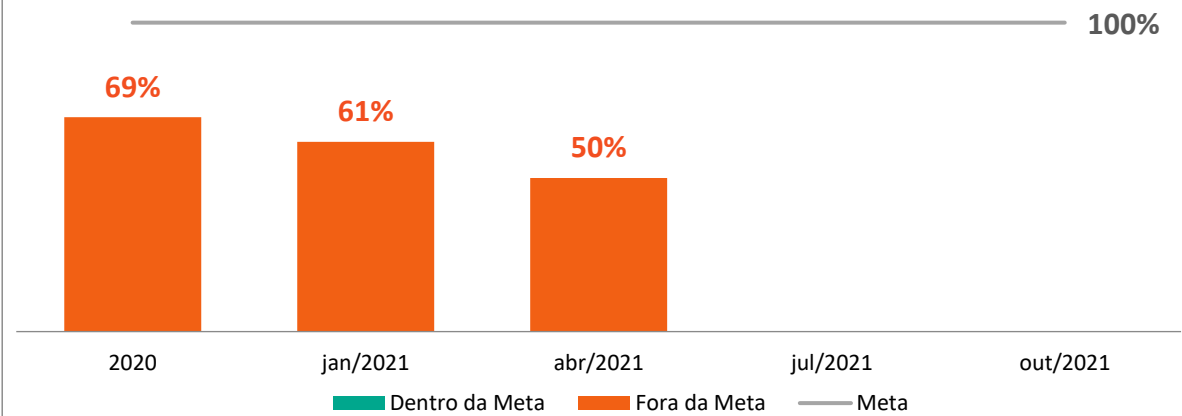


Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios.

Avaliações qualitativas do apoio técnico

Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 6. Avaliações qualitativas do apoio técnico.

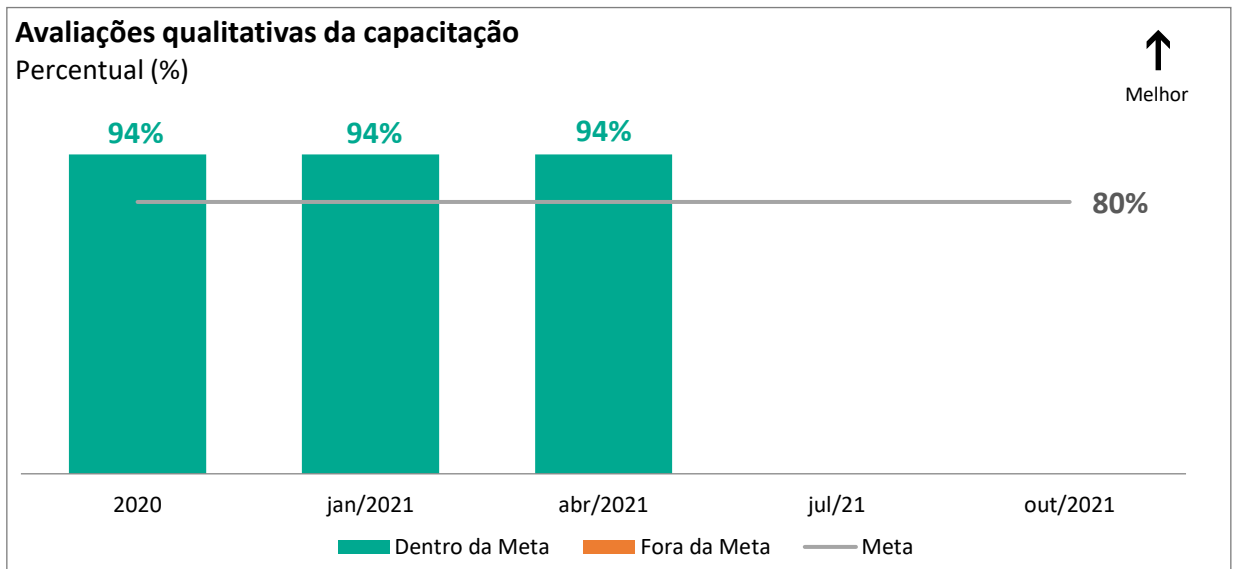


Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	2	n/a	n/a
Deliberação	4	n/a	Judicializado

Deliberação	7	n/a	n/a
Deliberação	10	n/a	Concluído internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	33	1	Concluído internamente
Deliberação	33	i e ii	Em andamento
Deliberação	95	n/a	n/a
Deliberação	98	1	Concluído internamente
Deliberação	123	2	Concluído internamente
Deliberação	124	2	Concluído internamente
Deliberação	124	4	Concluído internamente
Deliberação	185	2	Concluído internamente
Deliberação	185	3	Concluído internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído internamente
Deliberação	258	5	Concluído internamente
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído internamente
Deliberação	325	único	n/a
Deliberação	368	n/a	n/a
Deliberação	379	2	Concluído internamente
Deliberação	379	1	Reprogramado
Deliberação	379	3	Concluído internamente
Deliberação	441	n/a	n/a
Deliberação	443	n/a	Concluído internamente
Deliberação	378	n/a	Informativa

Entregas do ano

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Grandes números do Programa

- **13** sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- **10** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- **15** estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes

Os Fatos relevantes não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

Indicadores

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	§1º (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	172	§1º (ação2)	Em Andamento
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Conclusão da Mobilização para a 2ª turma do Curso de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - ES.

Conclusão da etapa 3 da 3ª Turma do Curso de Formadores em Agroecologia para os Assentamentos da Reforma Agrária em Minas Gerais.

Realização da oficina de formação de base - Ervas Medicinais e Agroecologia – para os Assentamentos da Reforma Agrária em Minas Gerais.

Indicadores



Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente
Deliberação	460	N/A	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- março de 2021
●
 Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
- novembro de 2021
●
 Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471
- dezembro de 2021
●
 Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
- dezembro de 2021
●
 Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
- dezembro de 2021
●
 Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
- dezembro de 2021
●
 Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
- dezembro de 2021
●
 Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

● **Concluído**
● **Planejado**
● **Reprogramado**

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Em Definição
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Em Definição
I03	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Em Definição
I04	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Em Definição

I01: O indicador será medido ao final dos ciclos de graduação e pós-graduação.

I02: Em virtude do período de isolamento social, não estão ocorrendo demandas por parte da Defesa Civil.

I03: Não tivemos solicitações por parte da Defesa Civil para apoio a eventos. Mapeamento em andamento.

I04: De um total de 5 medidas planejadas, 3 já foram atendidas.

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	●	Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
julho de 2021	●	Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
julho de 2021	●	Finalização da Implantação do Repositório Técnico
agosto de 2021	●	Aprovação da Definição do Programa pelo CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

Revisão dos indicadores do Programa 35 e apresentação à CT-PDCS.

Realização de cinco reuniões/oficinas de formação das equipes de todos os territórios (Diálogo e CIAs) para ações de descentralização e itinerância.

Envio de posicionamento/resposta e evidências ao CIF referente à Deliberação 500;

Articulação com a equipe de comunicação para planejamento do lançamento do repositório técnico de informações.

Ajustes e complementações no material de Curadoria e órgão Colegiado de Curadoria – Envio e apresentação à CT-PDCS.

Abertura de SR no SAP para contratação de fornecedor de desenvolvimento para o Repositório Técnico de Informações.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa encontram-se em revisão junto à CT-PDCS, após realização de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas e equipe do programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	abril de 2021	maio de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	353.940	238.530	1.794.937	5.391.963
Documentos no site (mês)	6	9	41	407
Notícias Publicadas (mês)	14	7	52	792
Vídeos (mês)	12	14	48	494

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

▲	INDICADOR	abril de 2021	maio de 2021
	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	269.504	174.316
	I02 – Visualizações de páginas de serviço	637.634	278.308
	I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	55.263	46.237
	I05 – Alcance Orgânico Facebook	32.707	27.942
	I06 – Visualizações no Youtube	12.104	11.427
	I03 – Tempo de resposta	33,86 Horas	5,95 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água


Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	§2º	Pendente
Cláusula	177	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	178	Caput	Pendente
Cláusula	179	Caput	Em Andamento
Deliberação	125		Pendente
Deliberação	17		Pendente
Deliberação	248	1.b	Pendente
Deliberação	275	1	Pendente
Deliberação	310	1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.1	Em Andamento
Deliberação	310	3.2	Em Andamento
Deliberação	310	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	339	1	Pendente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente


Deliberação	383	1	Pendente
Deliberação	409		Concluído Internamente
Deliberação	432	1	Concluído Internamente
Deliberação	432	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	3	Concluído Internamente
Deliberação	444		Pendente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458		Em Andamento
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	53		Concluído Internamente
Deliberação	77		Pendente
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

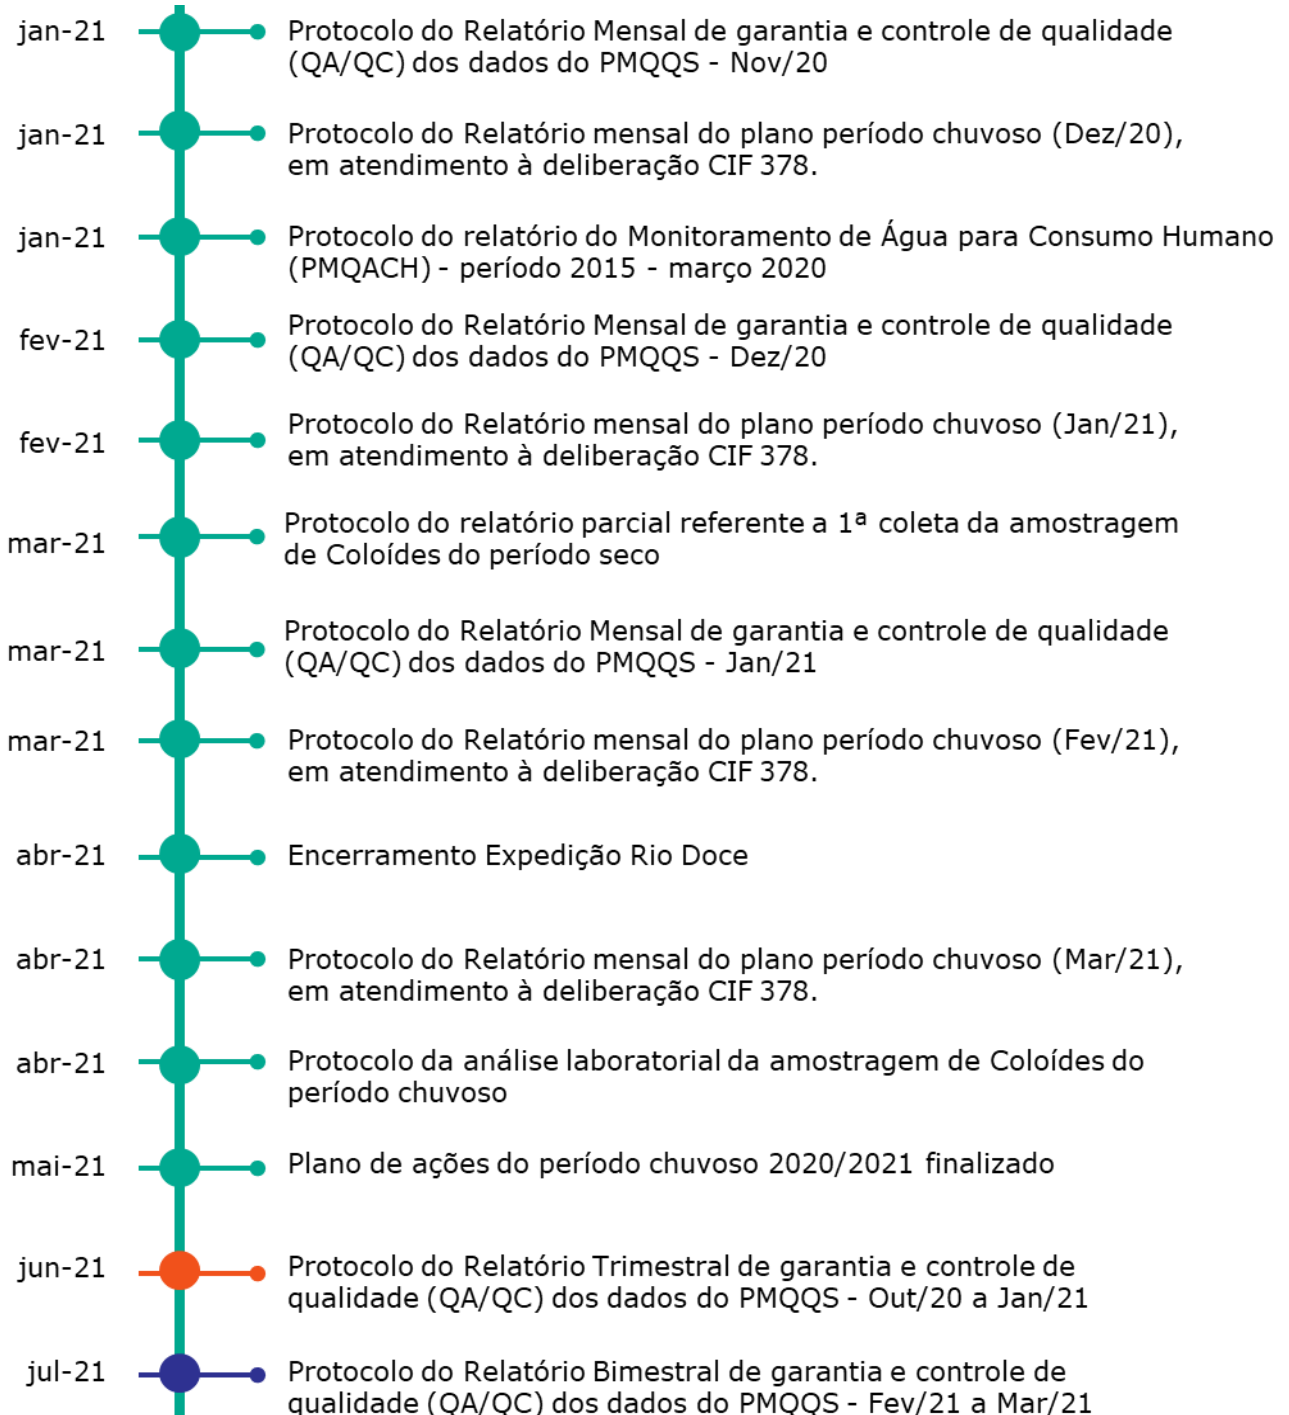

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Entregas do ano de 2021

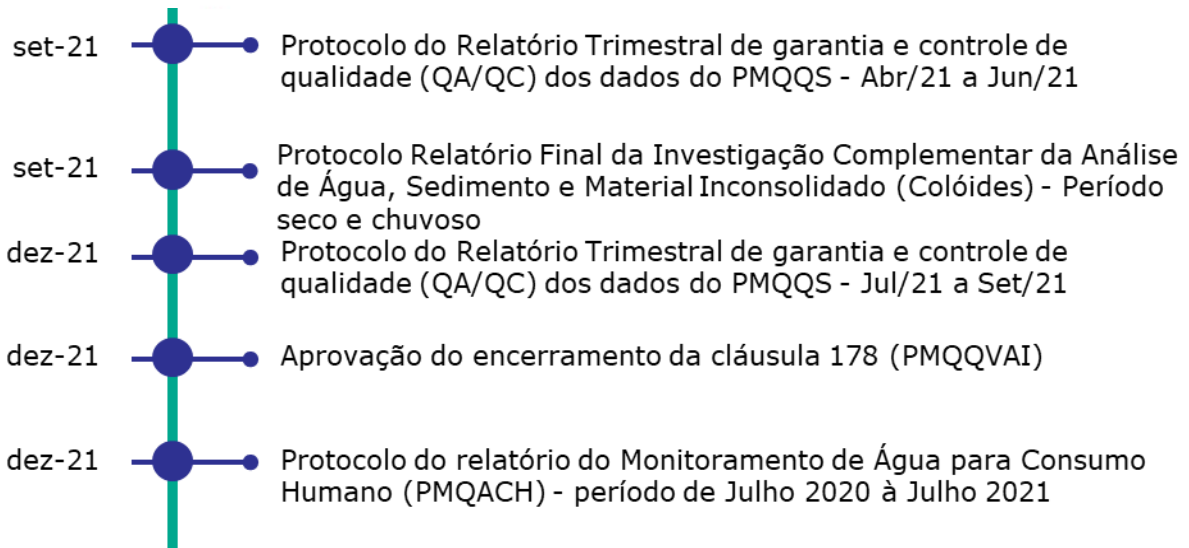

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriadoce.org;
- 650 **quilômetros** de monitoramento de **rios e lagoas**, 215 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- São 56 **pontos de monitoramento**, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios entre Mariana – MG a São Mateus – ES; Sendo que, em função do Covid-19 o monitoramento está sendo realizado apenas em 56 pontos.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 23 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Protocolo da Revisão Bianual do PMQQS em atendimento à NT78 GTA-PMQQS

Protocolo da resposta à NT82 GTA-PMQQS sobre o Plano de Capacitação do PMQQS

Protocolo da 2ª remessa dos laudos da Segunda Campanha do Coloides, em atendimento à deliberação CIF 310

Indicadores

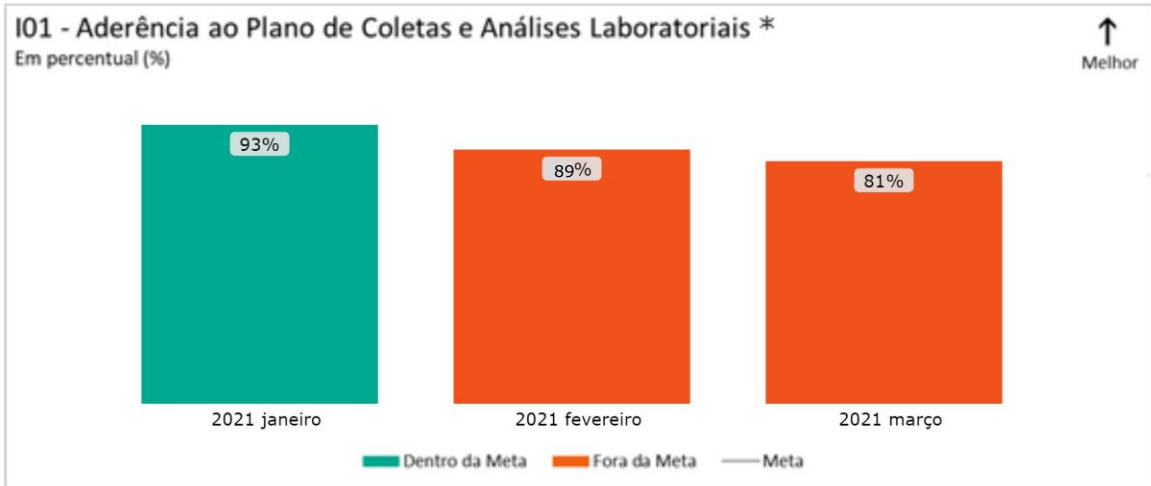


Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

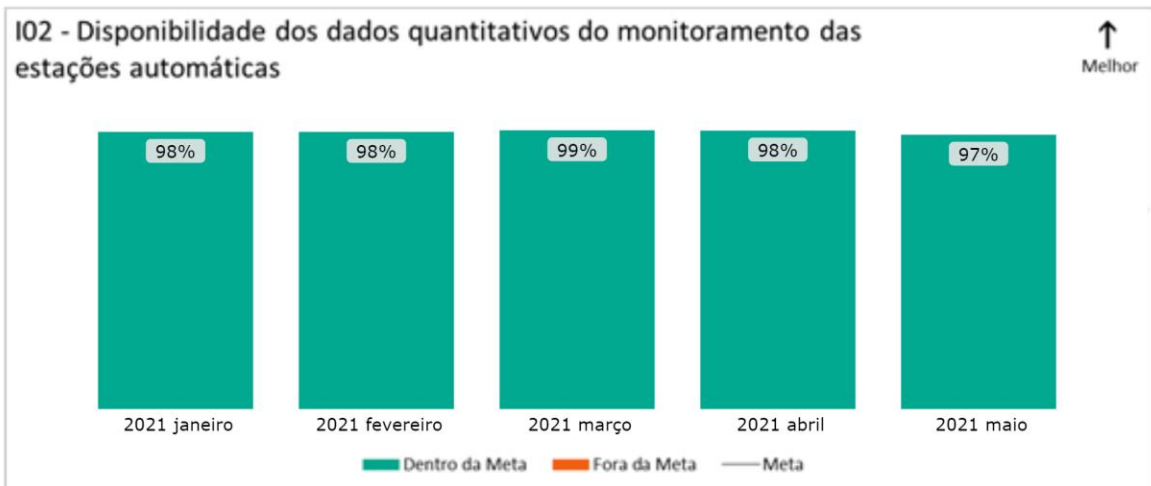


Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores

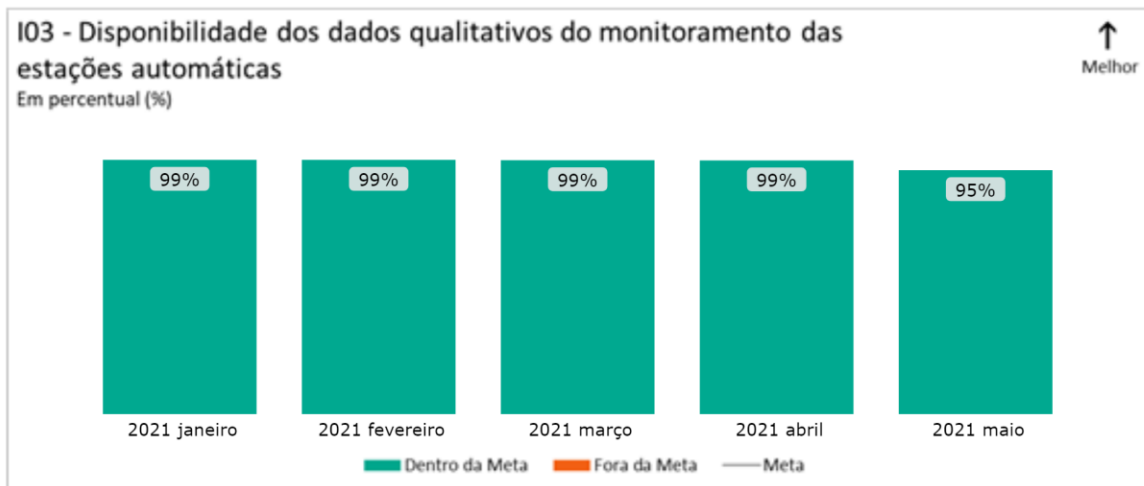


Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

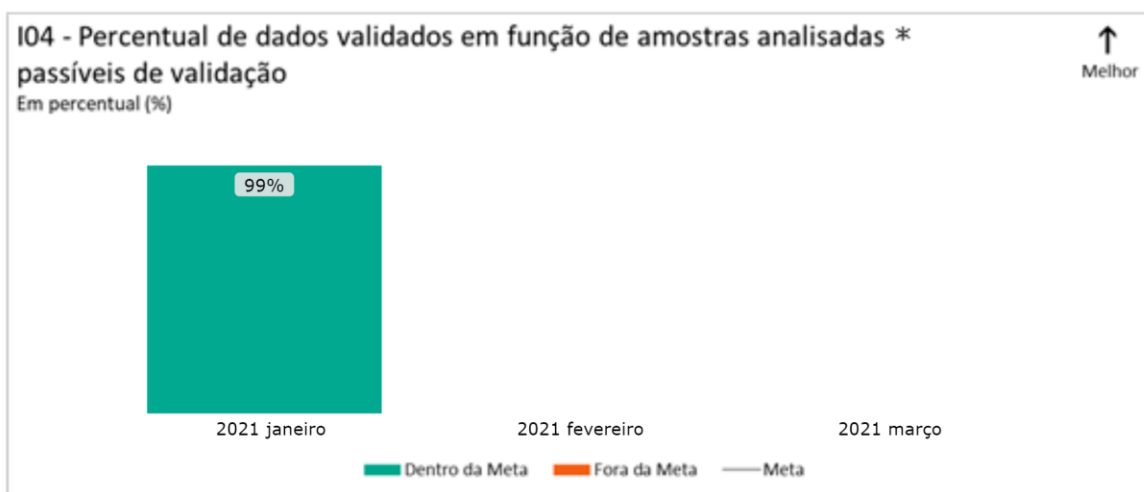


Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

Nota 2: Não foi possível apurar o IND04- Percentual de dados validados, referente ao mês Fev/2021 E Mar/21, devido aos ajustes nos cálculos dos validadores do MP5, que serão feitos para atender a revisão do PMQQS, que iniciou em Fevereiro/2021. A apuração segue em ajuste no mês de Junho e será informada no próximo CIF.

PG039 Unidades de Conservação















Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexos causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.


Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Pendente
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Reprogramado
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021		Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
abril de 2021		Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano I - Consolidação PERD
junho de 2021		Protocolo do Relatório Preliminar AIA PERD
julho de 2021		Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
julho de 2021		Realização da Reunião Devolutiva AIA PERD
julho de 2021		Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Final AIA PERD
outubro de 2021		Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
outubro de 2021		Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
novembro de 2021		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Preliminar AIA APA Costa das Algas
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Preliminar AIA REVIS Santa Cruz
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 25/05/2021, foi protocolado o Ofício FR2021.0175-01 com as evidências de transferência da 1ª parcela do acordo de cooperação entre IEF/MG e a Fundação Renova, em cumprimento à deliberação CIF 472 e à cláusula 182 do TTAC.

Em 07/05/2021, foi protocolado o Ofício FR.2021.0704 com o cronograma de entrega e as metodologias utilizadas pelo Instituto Ekos e Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável - FBDS para a reelaboração dos relatórios de Avaliação de Impacto Ambiental e Proposição de Medidas Reparatórias, para as Unidades de Conservação listadas na cláusula 181 do TTAC, assim como para as devolutivas às UCs apontadas como potencialmente impactadas pelas Deliberações nº 36/2016 e nº 149/2018, em substituição aos relatórios preliminares elaborados pela CEPEMAR.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- julho de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

276 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 23 (8,3%) imóveis declinaram e 244 (88,4%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 188 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Baixo Rio Doce

- Retomada das atividades de campo mediante liberação pela sala de situação.

Médio Rio Doce

- Liberação para retomada das atividades de campo, pela sala de situação.

Indicadores

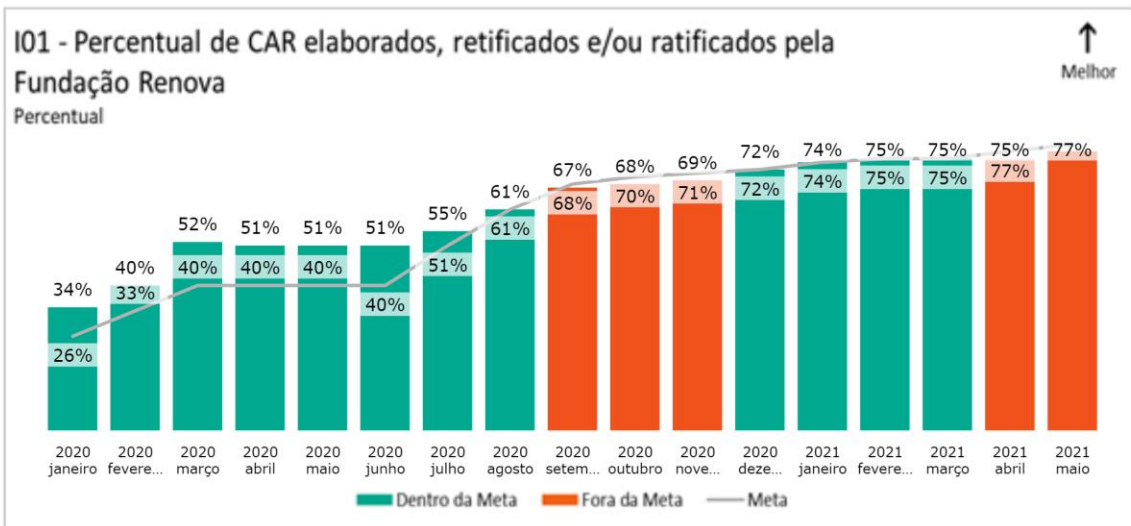


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de Imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Em Andamento
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Pendente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente

| Deliberação

85

3

Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- agosto de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.
- agosto de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana

* A realização do ressarcimento à prefeitura de Colatina foi concluída em Janeiro/21, e o município de Mariana aguarda trâmites do processo de judicialização.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 39 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 47,6** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 28,8** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

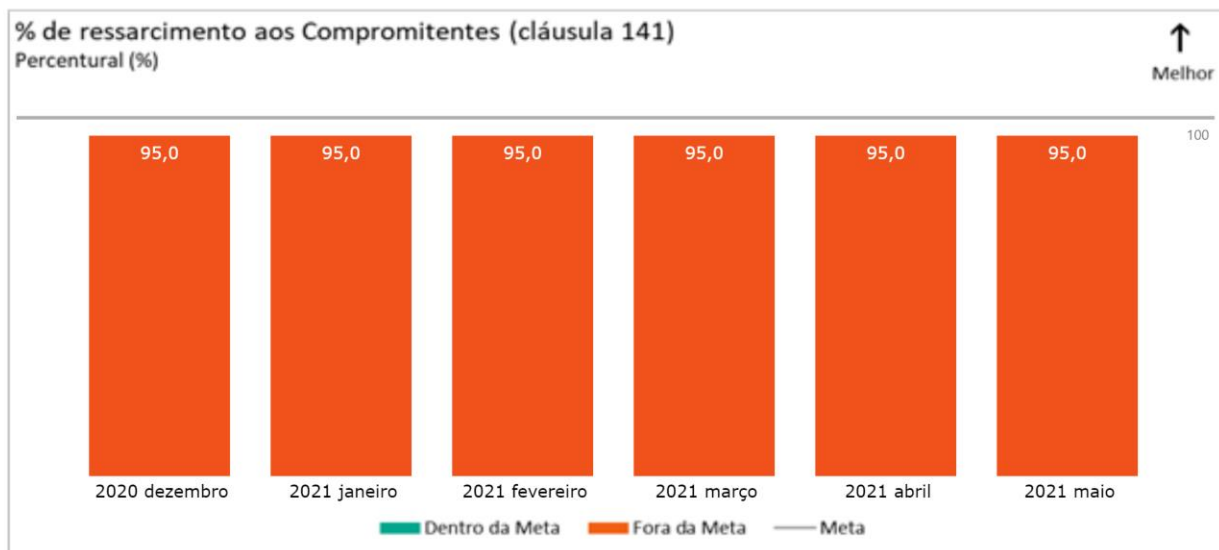


Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

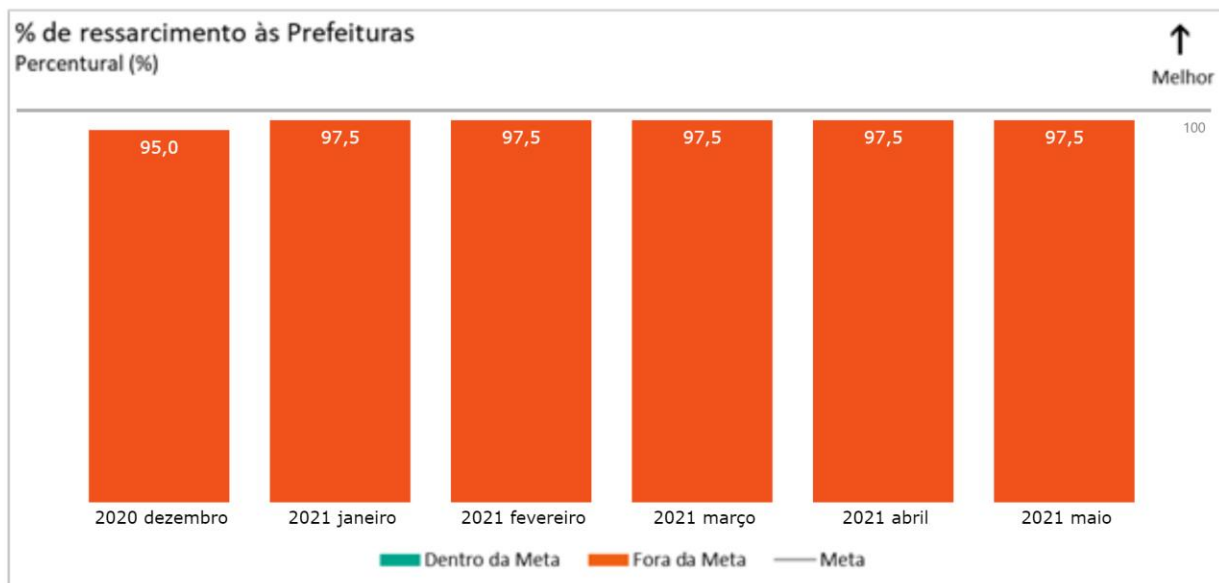


Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.

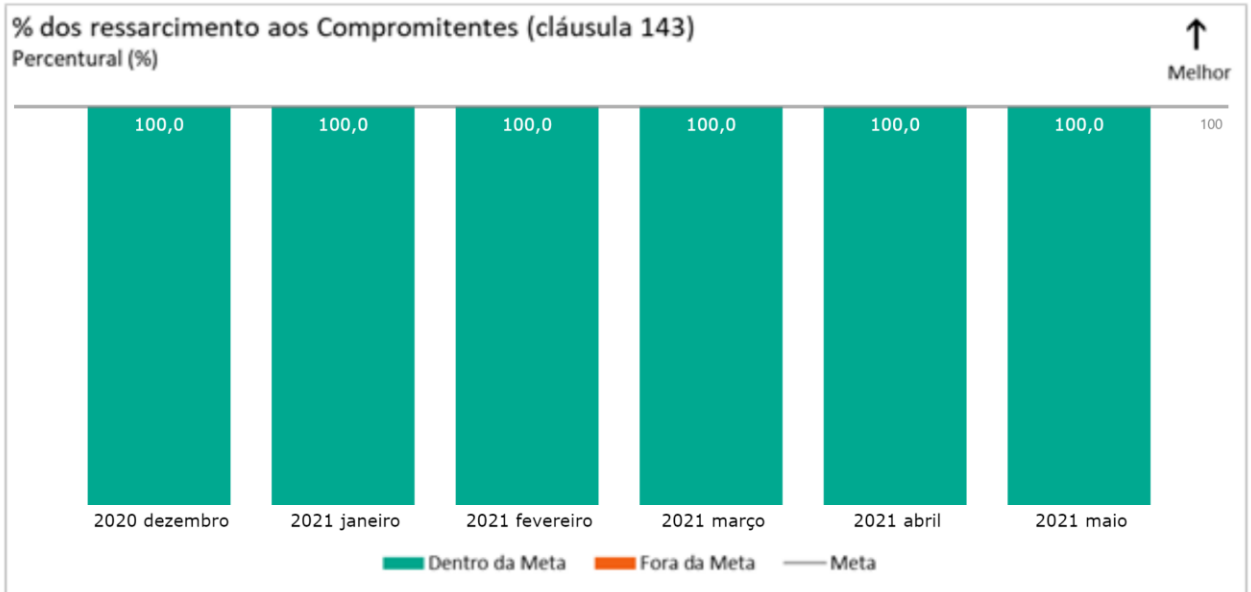


Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas até maio de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados

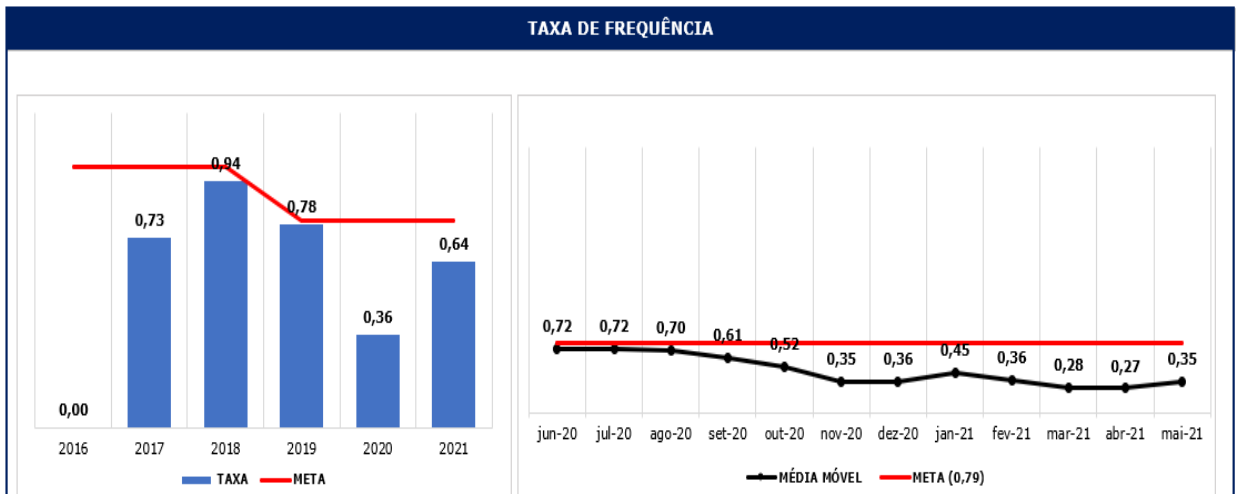

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	1,5 -	13,7	-90%	4,7	1,5 -	3,2	-68%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,4 -	4,6	-93%	2,4	0,4 -	2,1	-85%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	1,5 -	13,1	-90%	7,4	1,5 -	5,9	-80%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	0,6 -	6,1	-91%	2,0	0,6 -	1,4	-68%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	5,5 -	46,1	-89%	20,4	5,5 -	14,9	-73%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	3,5 -	17,1	-83%	7,5	3,5 -	4,0	-53%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	0,4 -	12,7	-97%	4,0	0,4 -	3,7	-91%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	6,2 -	50,3	-89%	19,1	6,2 -	12,8	-67%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	9,2 -	53,8	-85%	26,5	9,2 -	17,3	-65%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	1,9 -	16,2	-89%	9,3	1,9 -	7,4	-79%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	1,4 -	14,5	-91%	5,6	1,4 -	4,2	-75%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,1 -	6,9	-98%	4,2	0,1 -	4,1	-97%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,6 -	1,7	-75%	1,1	0,6 -	0,6	-51%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	19,4	18,1 -	1,3	-7%	3,0	18,1	15,2	513%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,2 -	2,4	-92%	0,5	0,2 -	0,3	-58%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	259,4 -	190,5	-42%	288,3	259,4 -	28,9	-10%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	310,6 -	451,0	-59%	405,9	310,6 -	95,3	-23%

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,1	0,2	0,8	-77%	- Edital Rio Doce: estava paralisado em função da pandemia, porém está ocorrendo o retorno gradual desde 12/2020. - Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021.
PG15	INOVAÇÃO	0,2	0,1	0,1	-60%	- Aguardando aprovações para início da Pesquisa e desenvolvimento do Herbicida Orgânico. A nova previsão de repasse é junho/21, com prestação de contas trimestral. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Previsão de execução do Empreende Rio Doce para agosto/21. - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17, pendente de aprovação, gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%).
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	6,5	0,0	6,5	-100%	- O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado no CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21). Está em fase de atualização de valores por parte da Prefeitura de Mariana para seguir com a aprovação do CC.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,6	0,2	0,4	-72%	- Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais. - Cancelamento do Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores. - Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 e impede a maior parte das atividades presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17, pendente de aprovação, é de R\$ 3,3 milhões (redução de 51%).
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS	4,0	2,3	1,7	-43%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,5	0,8	0,7	-49%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,3	0,1	1,2	-95%	- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	3,8	0,4	3,4	-91%	- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	5,9	1,3	4,6	-78%	- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequencias construtivos
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,5	0,4	0,2	-35%	- Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. Os custos serão reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato. - Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,1	0,4	0,7	-61%	Construção das sedes das Defesas Civas e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,2	0,0	0,2	-96%	- CIT Mariana: atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da Cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. - CIT GV: atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Atualmente em análise técnica (legislação municipal e levantamento topográfico) a oferta da Pça. Getúlio Vargas para implantação do CIT em GV. - CIT Linhares: atraso das obras devido a alteração do projeto executivo e orçamento (inclusão de reforma dos banheiros e auditório) gerando atraso na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMBio.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,1	0,1	-41%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,3	-	0,3	-100%	- 1º Repasse do Acordo de Cooperação com o IEF para a consolidação do PERD – Parque Estadual do Rio Doce; no âmbito da cláusula 182 TTAC. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,2	0,1	0,1	-55%	- Encerramento do contrato com a JM Reflorestamento, que realizava a retificação dos CARs no Alto Doce, devido à baixa demanda atual. As retificações que restaram serão realizadas por demanda, uma vez que restaram aquelas com pendências fundiárias da família ou de documentação. - Atividades de análise do tratamento CAR no Médio e Baixo sofreram um replanejamento de cronograma, pois, devido a pandemia o início do Projeto precisou ser postergado.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	3,0	1,3	1,6	-55%	- PRA não iniciado: Aguardando celebração de parceria com o IDAF (ES) e publicação. - Decreto estadual que regulamenta o PRA MG foi publicado em 26/01/2021 - Antecipação da Agenda Integrada: realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021. - Novas áreas Agenda Integrada e Gestão Pública em discussão 12ª vara. - Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUS).
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	
Total Compensatórios		30,2	7,6	22,6	-75%	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	1,5	-	13,7	-90%	4,7	1,5	-	3,2	-68%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,4	-	4,6	-93%	2,4	0,4	-	2,1	-85%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	1,5	-	13,1	-90%	7,4	1,5	-	5,9	-80%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	5,3	-	20,0	-79%	19,1	5,3	-	13,9	-72%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	872,4	-	553,4	-39%	652,3	872,4	-	220,1	34%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	39,0	-	88,8	-69%	52,9	39,0	-	13,9	-26%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	3,5	-	42,5	-92%	8,9	3,5	-	5,4	-61%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	2,4	-	14,2	-86%	5,5	2,4	-	3,1	-57%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	23,0	-	103,1	-82%	57,4	23,0	-	34,3	-60%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	2,7	-	4,2	-60%	2,9	2,7	-	0,1	-4%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	238,1	-	774,5	-76%	324,3	238,1	-	86,2	-27%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	55,8	-	146,6	-72%	60,1	55,8	-	4,4	-7%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	28,6	-	110,6	-79%	63,2	28,6	-	34,6	-55%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	0,4	-	8,0	-95%	3,3	0,4	-	2,8	-86%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	1,5	-	27,4	-95%	10,6	1,5	-	9,1	-86%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	0,5	-	17,8	-97%	5,7	0,5	-	5,2	-91%
PG14	SAÚDE	19,7	2,8	-	16,9	-86%	7,7	2,8	-	5,0	-64%
PG16	PESCA	53,4	1,9	-	51,5	-96%	19,5	1,9	-	17,6	-90%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	27,9	-	97,7	-78%	55,8	27,9	-	27,9	-50%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	0,8	-	4,6	-85%	1,4	0,8	-	0,6	-40%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	98,5	-	118,2	-55%	120,7	98,5	-	22,2	-18%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	39,1	-	112,9	-74%	70,4	39,1	-	31,2	-44%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	0,2	-	0,6	-72%	0,3	0,2	-	0,1	-32%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	10,1	-	24,3	-71%	16,5	10,1	-	6,3	-38%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	40,4	-	28,0	-41%	26,4	40,4	-	14,0	53%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	0,4	-	11,3	-97%	2,8	0,4	-	2,4	-87%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	38,0	-	139,3	-79%	79,5	38,0	-	41,5	-52%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	11,8	-	35,7	-75%	25,7	11,8	-	13,9	-54%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	3,8	0,0	-	3,8	-99%	2,4	0,0	-	2,3	-98%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	91,9	-	207,4	-69%	128,1	91,9	-	36,2	-28%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	0,1	-	3,9	-98%	2,4	0,1	-	2,3	-97%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1	-100%	205,0	-	-	205,0	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	1.637,1	-	3.259,1	-67%	2.030,5	1.637,1	-	393,4	-19%
Total Programas		5.657,8	1.947,7	-	3.710,1	-66%	2.436,4	1.947,7	-	488,7	-20%

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%		
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	47,8	-	126,7	-73%	73,4787	47,8045	-	25,6742	-35%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	2,0	-	26,4	-93%	12,1	2,0	-	10,1	-83%
Total Despesas Administrativas		202,9	49,8	-	153,1	-75%	85,6	49,8	-	35,7	-42%
Total Geral		5.860,7	1.997,6	-	3.863,1	-66%	2.522,0	1.997,6	-	524,4	-21%

PG	Programas	Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,1	0,2	0,8	-77%	<ul style="list-style-type: none"> - Edital Rio Doce: estava paralisado em função da pandemia, porém está ocorrendo o retorno gradual desde 12/2020. - Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021.
PG15	INOVAÇÃO	0,2	0,1	0,1	-60%	<ul style="list-style-type: none"> - Aguardando aprovações para início da Pesquisa e desenvolvimento do Herbicida Orgânico. A nova previsão de repasse é junho/21, com prestação de contas trimestral. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Previsão de execução do Empreende Rio Doce para agosto/21. - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17, pendente de aprovação, gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%). - O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado no CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21). Está em fase de atualização de valores por parte da Prefeitura de Mariana para seguir com a aprovação do CC.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	6,5	0,0	6,5	-100%	<ul style="list-style-type: none"> - O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado no CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21). Está em fase de atualização de valores por parte da Prefeitura de Mariana para seguir com a aprovação do CC.
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	3,7	1,1	2,6	-70%	<ul style="list-style-type: none"> - Variação devido ao atraso no início do cadastro com a Cáritas e mudança de estratégia/planejamento dos laudos e cadastros da Fase 2 (decisão judicial).
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	154,5	17,5	137,0	-89%	<ul style="list-style-type: none"> - Variação decorrente do grande número de municípios sentenciados e prorrogação do prazo de término para adesões em todos os municípios, gerando aceleração da curva de pagamentos no Novel. - Somando os valores acumulados do programa e da contingência em 2021, a variação total é de 15,0 MM. - Monitoramento social, revisão do programa, atividades SAA em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impacto da pandemia; - Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim) encerrando em junho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021; - Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid, ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,4	8,2	2,2	-21%	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE e modalidade de pagamento.. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios (pandemia). - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em setembro/21. - Plano Mariana: insumos para oficinas não foram fornecidos devido à paralisação das atividades coletivas (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado (fornecedor Contexto); - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17). - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios). - Diálogos e Canais – Economia(R\$ 5MM): Permanência dos escritórios CIAS fechados. Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social e Atendimento dos CIAs em decorrência das atividades remotas.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,4	0,6	0,9	-60%	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE e modalidade de pagamento.. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios (pandemia). - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em setembro/21. - Plano Mariana: insumos para oficinas não foram fornecidos devido à paralisação das atividades coletivas (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado (fornecedor Contexto); - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17). - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios). - Diálogos e Canais – Economia(R\$ 5MM): Permanência dos escritórios CIAs fechados. Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social e Atendimento dos CIAs em decorrência das atividades remotas.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,0	0,4	0,6	-62%	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE e modalidade de pagamento.. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios (pandemia). - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em setembro/21. - Plano Mariana: insumos para oficinas não foram fornecidos devido à paralisação das atividades coletivas (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado (fornecedor Contexto); - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17). - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios). - Diálogos e Canais – Economia(R\$ 5MM): Permanência dos escritórios CIAs fechados. Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social e Atendimento dos CIAs em decorrência das atividades remotas.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	8,0	4,1	4,0	-50%	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE e modalidade de pagamento.. - Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios (pandemia). - Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de execução do PBAQ. - Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em setembro/21. - Plano Mariana: insumos para oficinas não foram fornecidos devido à paralisação das atividades coletivas (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado (fornecedor Contexto); - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17). - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios). - Diálogos e Canais – Economia(R\$ 5MM): Permanência dos escritórios CIAs fechados. Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social e Atendimento dos CIAs em decorrência das atividades remotas.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,9	0,3	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicação - Economia (R\$2,0MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 23,4MM): pagamentos judicializados, aguardando parecer. - Atraso na apresentação da medição por parte da contratada ERG Engenharia (Contrato 4800020125). - Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadora de saúde e segurança (EBJ Assessoria - Contrato 4800003657)

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG08	REASSENTAMENTO	70,3	53,1	17,2	-24%	<ul style="list-style-type: none"> - Custos Covid (-41,1): Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Novas Moradias Bento (+30,5): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Infraestrutura, Contêntes e instalações proviórias Paracatu (-26,5): Medições pendentes do Consorcio RPAR - 22 (reajuste), 23, 24 e 25, serviços remanescentes que serão contabilizados até jul/21, e novo Contrato AG de acordo com cronograma (linha de base fev/21) - previsão até jan/22; - Infraestrutura e Bens Públicos Bento (+17,3): Pagamento a maior no período em função de medições pendentes anteriores que aguardavam evidências; Conclusão dos 3 bens públicos previstos para 2021 (Aguardando alvarás para os demais bens públicos); - Engenharia (-14,4): Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas à preço global; - Equipamentos Públicos Paracatu (-11,3): Postergação do início das atividades: Escola - previsão de montagem até jul/21, custos serão contabilizados até ago/21. Demais equipamentos públicos, conforme Cronograma LB fev/21 - previsão ago/21; - Contêntes Bento (-10,9): Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contêntes e não iniciada a mobilização da segunda empresa de contêntes; - Aquisição de Terras, Benfeitorias, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sitiantes Paracatu (-9,4): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Adutora ETE/ETA Bento (-7,9): Aguardando aprovação da APRO para medição final dos serviços; - Aterro Sanitário Bento (-4,3): Aguardando definições de projeto e aprovação da APRO (Aditivo Vina) - Adutora ETE/ETA Paracatu (-1,8): Revisão Escopo da Adutora e revisão do cronograma (linha de base fev/21) - previsão de início ago/21; ETE e ETA - Novo Processo - previsão ago/21; - Gesteira (-4,2): Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Iluminação pública Bento e Construção do Trevo MG-129 (-4,0): Escopo com execução reprogramada para 2022.
PG09	UHE CANDONGA	14,3	15,0	0,7	5%	<ul style="list-style-type: none"> - Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	13,4	3,6	9,8	-73%	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstrução das casas e propriedades rurais paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Impacto da pandemia nas atividades do programa.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,7	0,1	0,6	-87%	<ul style="list-style-type: none"> - Transporte e Equipamentos: Não execução devido a suspensão das aulas presenciais; - Apoio Psicopedagógico e Projeto de Arte, Cultura, Sociabilidade e Prod. Saberes: Paralisação por conta do Covid-19 (contratações estão sendo adaptadas para atendimento no modelo remoto).
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,3	0,3	2,0	-85%	<ul style="list-style-type: none"> - Engenharia de Restauo de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. - Restauo de Igrejas: parceria para restauo em processo de contratação - Obras de Restauoção Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido à judicialização. - Reserva Técnica - Conservação e Restauoção: paralisação temporária, com retomada parcial das atividades em função da pandemia; - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação dos órgãos competentes e em revisão - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a conclusão do plano de trabalho da UNESCO. Orçamento foi ajustado no draft 17
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,5	0,3	1,2	-81%	<ul style="list-style-type: none"> - Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais. - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais.
PG14	SAÚDE	1,3	0,3	1,0	-77%	<ul style="list-style-type: none"> - Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: aguardando decisão judicial da 12ª vara. - Plano de Reparação de Saúde em Barra Longa: previsão orçamentária foi maior que o acordo firmado com o município; locação imóvel e aquisição de mobiliário saúde mental não realizada, devido ação impetrada pelo município de ajuste na ACP. - Plano de Reparação de Saúde em Mariana: não apresentação de demanda por parte do município à Fundação Renova quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP; - Plano de Capacitação SUS em Mariana: solicitação do município para aguardar a posse da nova gestão municipal e atraso na realização das capacitações previstas na ACP Mariana em decorrência da Covid 19. Em maio/2021, o Município peticionou revisão do acordo judicial - Plano reparação demais municípios (capacitações): Capacitação postergada em decorrência da Covid e adequada para modalidade de educação a distância. - Ações de mitigação de possíveis impactos nos municípios atingidos: a realização das ações depende dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico com definição de correlação com o rompimento. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) - aguardando decisão judicial da 12ª vara.
PG16	PESCA	7,4	0,6	6,8	-92%	<ul style="list-style-type: none"> - Baixa execução das ações referente a Caminhos da Retomada. - Eixo 1: restrição de atividades em campo devido à pandemia de Covid. - Eixo 2: necessidade do posicionamento da CTEI /GTP16 quanto à definição do Programa

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	10,8	5,9	4,9	-45%	<ul style="list-style-type: none"> - Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento). - Postergação de contratos devido à pandemia. - Medições apresentadas fora do prazo de fechamento contábil. - Atraso na aprovação da CEMIG dos projetos de instalações elétricas das infra rurais, devido a pandemia. - Postergação do débito da silagem e atraso no início ATER Território pós Candonga a Foz. - Redução no fornecimento de pipas, devido a implantação de ações pela FR de alternativas de acesso à água. - Início da redução do fornecimento de silagem no Território Alto Doce (após evidenciada a recuperação dos pastos impactados), mudança de estratégia de monitoramento de pastagens (agora realizado com equipe já mobilizada) e encerramento de contratos. - A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrato comercial; sendo que os contratos que vão dar continuidade ao escopo de reestruturação produtiva, embora já estejam contratados estão em fase inicial de execução com baixa produção (curva de mobilização).
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,4	0,2	0,2	-47%	<ul style="list-style-type: none"> - O previsto mês a mês no Draft 16 não está refletindo o planejamento financeiro do Programa.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	24,1	17,4	6,7	-28%	<ul style="list-style-type: none"> - Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novo Sistema, não previstos no orçamento.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	13,8	5,4	8,4	-61%	<ul style="list-style-type: none"> - Postergação: Execução abaixo do previsto nas rubricas: - Barramento Linhares, em função do período chuvoso e a redução das atividades medidas (alteamento) para engenharia houve menos demanda do que planejado para o período - Gestão das Áreas Contaminadas, em função do atraso no início das atividades de campo devido aos embargos impostos pela 12a Vara - Plano de Manejo de Rejeito, em função de atrasos nas contratações da empresa responsável pela manutenção da bioengenharia, assim como as contratações para recomposição de taludes e aditivo do projeto de renaturalização. - Gestão da Qualidade do Ar, em função de postergações de medições dos contratos da Ecosoft e MLocação Economia: - Custos Gerais, devido a transferência de custos de auditoria à Samarco e serviços sob demanda que não foram necessários
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,1	0,0	57%	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, sem execução de serviços no período, conforme planejado.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,2	2,2	1,0	-32%	<ul style="list-style-type: none"> - Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas dentro do mês de competência. - Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à pandemia e consequente aditamento do contrato atual. - Parcerias (UFV Tecnossolos e Prof. Venâncio) que passaram e/estão passando por aditivo e portanto tiveram seus cronogramas de desembolso impactado e deverão ser reprogramados.
PG28	BIODIVERSIDADE	12,0	1,3	10,8	-90%	<ul style="list-style-type: none"> - Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial. - Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,0	-	1,0	-100%	<ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto. - Desvios caracterizados pela paralisação das atividades, devido à pandemia. - Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,4	7,7	7,7	-50%	<ul style="list-style-type: none"> - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequencias construtivos - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	4,0	2,5	1,5	-38%	<ul style="list-style-type: none"> - Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com laudos e mobilização ainda atrasados e pendentes de medição. Contrato Spot (ALS) com demandas não realizadas durante o take-off/transição 48 para 49. Parceira UNESCO com desembolso semestral ainda não medido. Estudo coloides (ALS/SRK) com laudos UFV em atraso e relatórios ainda não executados. Estudos/Serviços em execução mas ainda não medidos (ERH, RHAMA). Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Parceria com FCO/UFMG/Libanio cancelada pelo Professor. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão orçamentária do Draft17.

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,4	-	0,4	-100%	- Desvios caracterizados pela mudança de estratégia do Programa em virtude de alteração de escopo. - Não execução de serviços sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto. - Adequação de procedimentos para enfrentamento a Pandemia.
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	27,1	21,1	5,9	-22%	- Postergação (R\$ 33,0 MM): menor medição de serviços devido à restrição COVID; contratos EY e Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (IUCN, infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 3,2 MM): menor gasto com viagens e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,6	-	0,6	-100%	- Atraso na aquisição dos coletes para ressarcimento ao Ministério da Integração, com a previsão de entrega do primeiro lote em junho.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	- Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16. - Esse montante já está sendo utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		445,0	169,8	275,2	-62%	
Total Programas		475,2	177,4	297,8	-63%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	15,28	11,96	3,32	-22%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	3,3	1,0	2,3	-71%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		18,6	12,9	5,7	-30%	
Total Geral		493,8	190,3	303,4	-61%	
