

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES_R01

Julho/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>20</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>26</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>36</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>44</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>49</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>82</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>90</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>105</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>125</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>133</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>138</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>143</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>149</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>156</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>162</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>168</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>178</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>185</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>190</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>197</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>202</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>210</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>215</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>221</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>226</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>233</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>238</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>243</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>249</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>255</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>261</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>267</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>273</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>278</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>287</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>293</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>298</u>
Glossário	<u>305</u>
Gestão Econômica	<u>311</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em julho de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em julho houve o protocolo da Edição 2 do Boletim da Qualidade da Água para Consumo Humano, referente aos dados de dezembro de 2020 a março de 2021, além do Atendimento à Deliberação CIF nº 310 - protocolo parcial (3ª e 4ª remessa) dos laudos das análises laboratoriais das campanhas coleta Coloides, envio do Ofício em Cumprimento do Item 3 Deliberação CIF Nº458 e resposta a Deliberação CIF 511 - Resumo Executivo QAQC PMQQS (PG038, pág. 278).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 202). Em julho a CT-GRSA emitiu o Ofício FEAM/CT - GRSA nº 20/2021 validando o cronograma revisado do Plano de Manejo de Rejeitos dos Trechos 13 e 14, mediante as justificativas apresentadas pela Fundação Renova e concorda que o prazo adicional irá melhorar a qualidade técnica do Plano, com informações efetivas, objetivas e suficientes para uma melhor tomada de decisão por parte da CT-GRSA.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 105) a qual, até o mês de julho, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 82), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 442 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.680 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito, além disso houve a realização de cursos on-line pela EMATER de capacitação técnica para agentes de ATER das instituições que trabalham no Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG017, pág. 168).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 215) e de Nascentes (pág. 221) — em julho houve a inscrição de 224 propriedades rurais no Edital de mobilização para os programas de restauração.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até julho/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de julho, em relação as indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o momento, foram atendidas 173 pessoas (98,9% dos 175 elegíveis). Destes, 173 já receberam o pagamento das indenizações . Em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 630 indenizações, o que representa 92% do total das 687 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 197), atualmente existem 19.788 pessoas assistidas, com um total de 9.125 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 26) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 36). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.346 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 173 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 176 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 44) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 149) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve Assinaturas de termos e acordos para implementação dos planos de reparação em proteção social, para fortalecimento dos equipamentos públicos de assistência social dos municípios, qualificação de seus operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis atingidas em: Aracruz, Fernandes Tourinho e Ipatinga. Houve também Capacitação de operadores de proteção social de Mariana, com a temática “Política nacional de assistência social, SUAS e os serviços tipificados e ofertados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Mariana”, avaliada por 99% dos participantes como adequado para contribuir com o trabalho desenvolvido com as famílias vulneráveis atingidas.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 49; PG035, pág. 267 e PG036, pág. 273), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 243), em julho de 2021 foram repassados R\$ 842.145 para ações dos municípios de Dionísio, Ipaba, Linhares, Rio Casca, Rio Doce, São José do Goiabal e Timóteo.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 125), em julho, ocorreu a conclusão da contratação para execução das obras da Casa da Banda, assinatura do termo de Recebimento da obra do Transbordo de Lixo do município de Barra Longa, além da Aprovação para obras complementares do parque de exposição pelo contrato CRP-RBAR (Acesso e ETE - Estação de Tratamento de Esgotos) e concretagem da laje do palco no parque de exposição de Barra Longa.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 90) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de julho:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em julho, ocorreu o início de 6 casas do novo aditivo da HTB.

Paracatu de Baixo — em julho, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Gesteira — em julho, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em julho, houve a conclusão da segunda fase da reforma do ID 258 – Sandra Polack. Imóvel recebido pela família em 02/07/21.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente

Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- Junho de 2021 ● Disponibilização do Cadastro dos impactados remanescentes de Mariana e dos laudos no sistema
- Julho de 2021 ● Comunicação de Devolutivas aos solicitantes de cadastro das campanhas 1, 2 e 3 e remanescentes (Todos os territórios, exceto Mariana)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 85.425 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

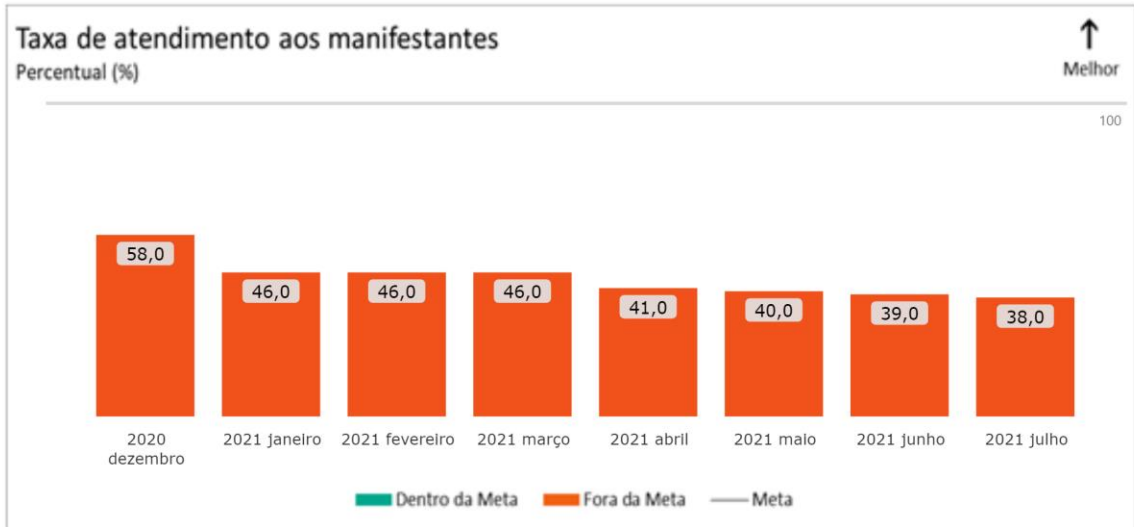


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado

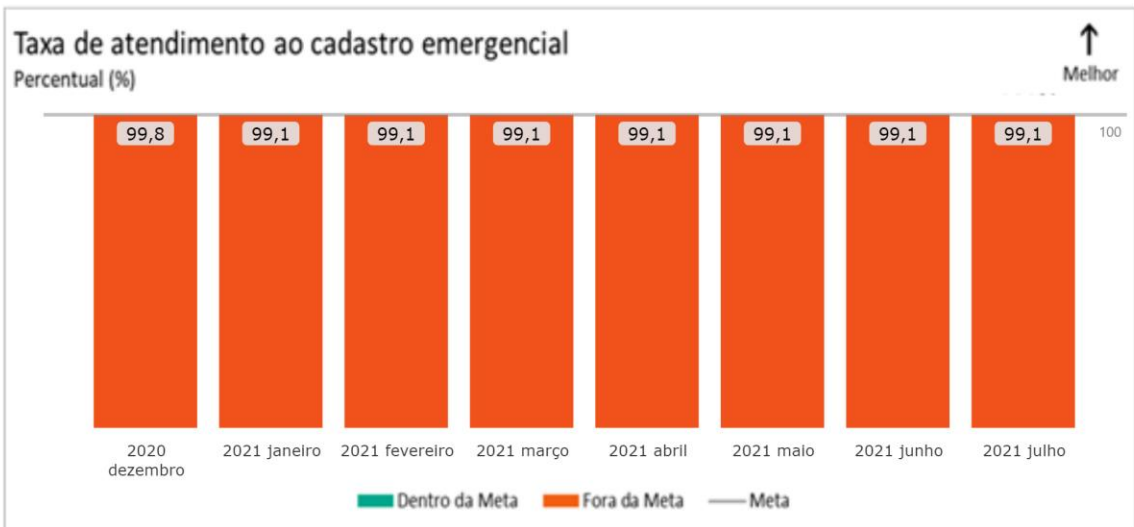


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado

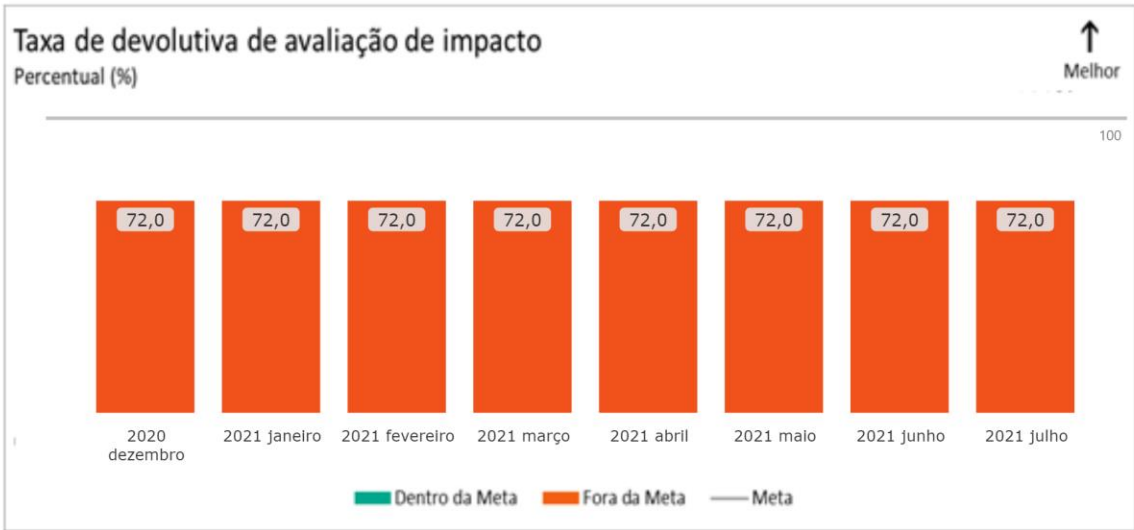


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.

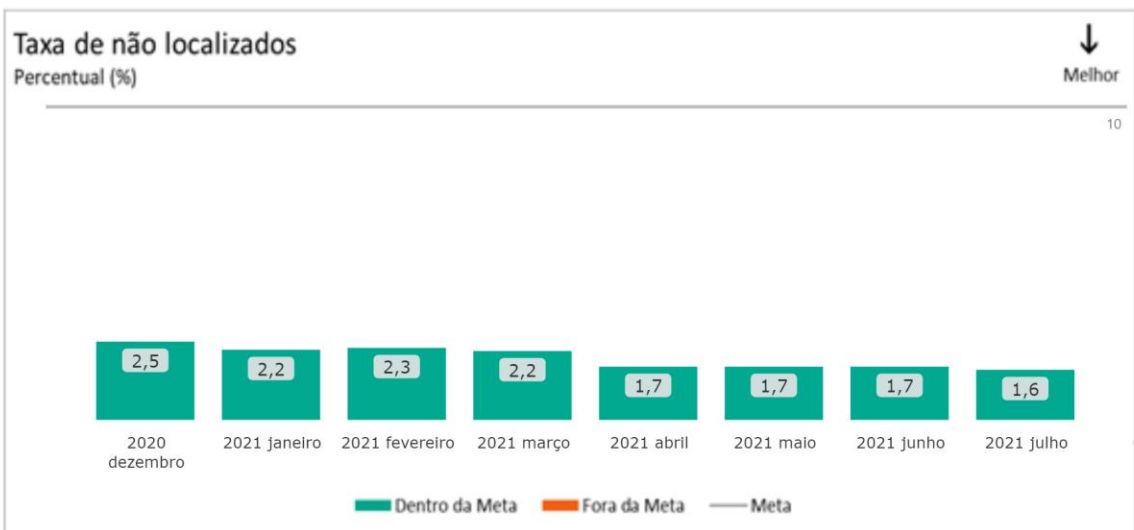


Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

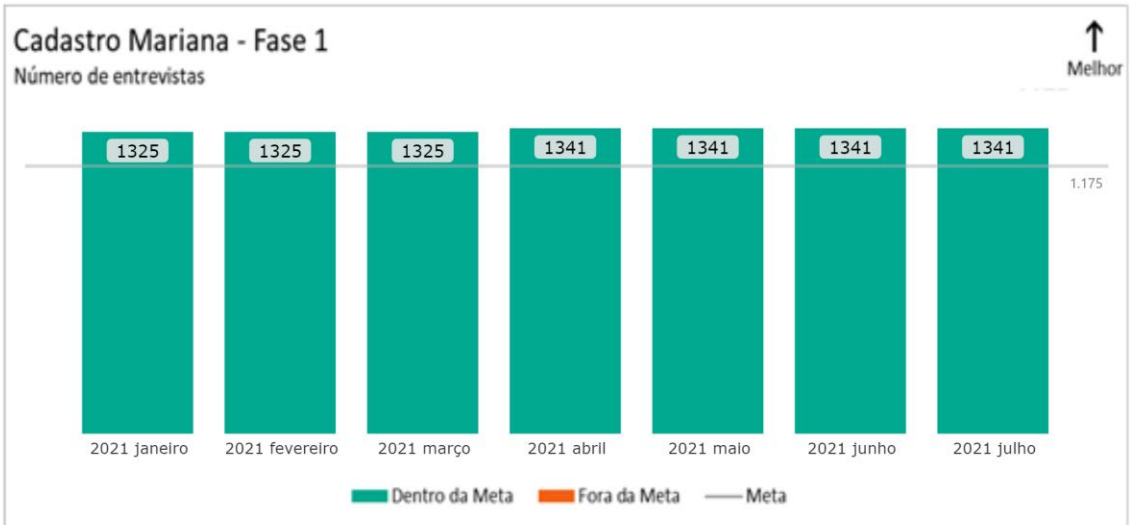


Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado

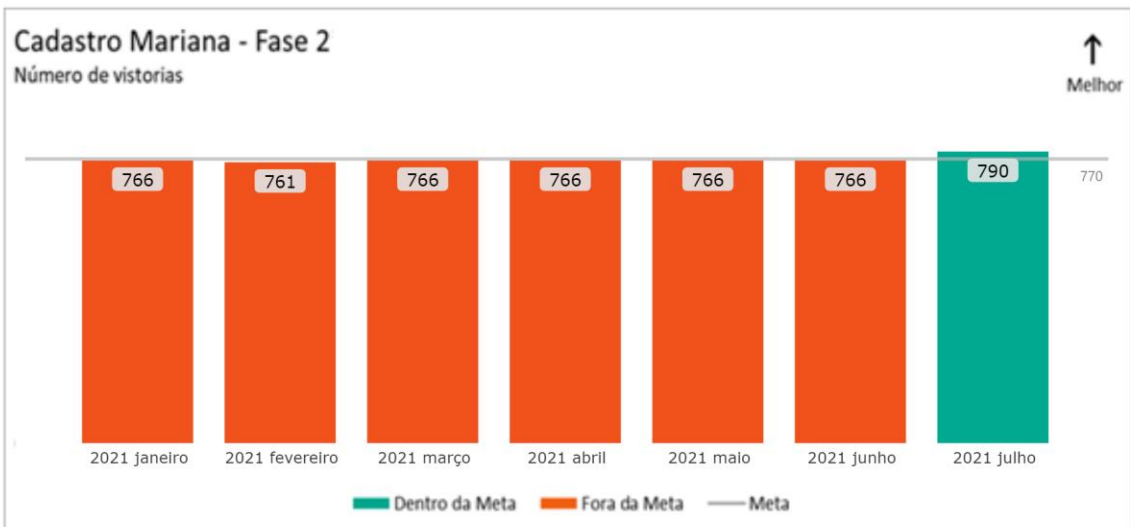


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.178 pessoas, sendo que 270.370 aceitaram propostas. Destas, 264.975 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 297,75 Mi**.
- **Para Danos Gerais**, 10.560 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.529 já foram pagos (99,7% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.182,56 Mi**.
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 630 indenizações, o que representa 92% do total das 687 propostas aceitas.
- **Para os Camaroeiros da Enseada do Suá**, até o momento foram atendidos 173 pessoas (99% do 175 elegíveis). 173 já receberam o pagamento das indenizações.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, foram atendidos 173 Camaroeiros da Enseada do Suá (98,9% dos 175 elegíveis). Destes, 173 já receberam o pagamento das indenizações.

Foram realizados os pagamentos de 630 indenizações em Mariana, o que representam 91,7% do total das 687 propostas aceitas.

Indicadores




Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

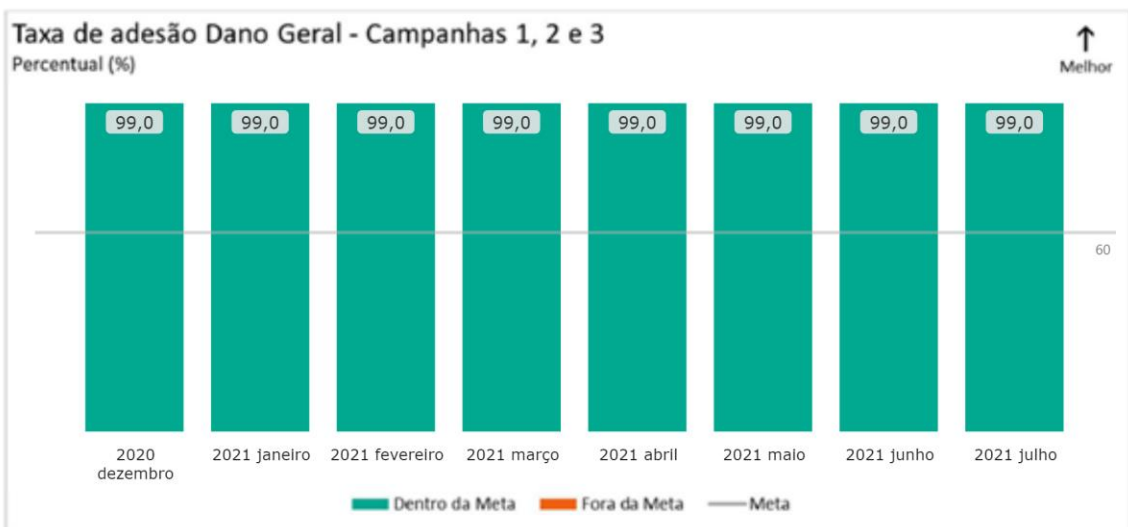


Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Reprogramado
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Planejado

Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Reprogramado
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- dezembro de 2021 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.776 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93.000 litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 145 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 3.910 m³);
- 84 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.878 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$2.992.601,10 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1346 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1346 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 276 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 56 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de 2.992.601,10 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água mineral para comunidade da Terra Indígena de Comboios – 32.520 litros distribuídos nos dias 24 de junho de 2021 e 01, 08, e 15 de julho de 2021 (total de 1.626 galões de 20 litros cada). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.157.351,24, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salário-mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/06/2021 até 20/07/2021 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/06/2021 até 20/07/2021.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/06/2021 até 20/07/2021.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/06/2021 até 20/07/2021.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	46	§3º	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	356	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Em Andamento
Deliberação	423	4	Planejado

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Reprogramado
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	493	2	Concluído Internamente
Deliberação	493	3	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	501	3	Concluído Internamente

Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Concluído Internamente
Deliberação	501	2	Reprogramado

Entregas do ano de 2021

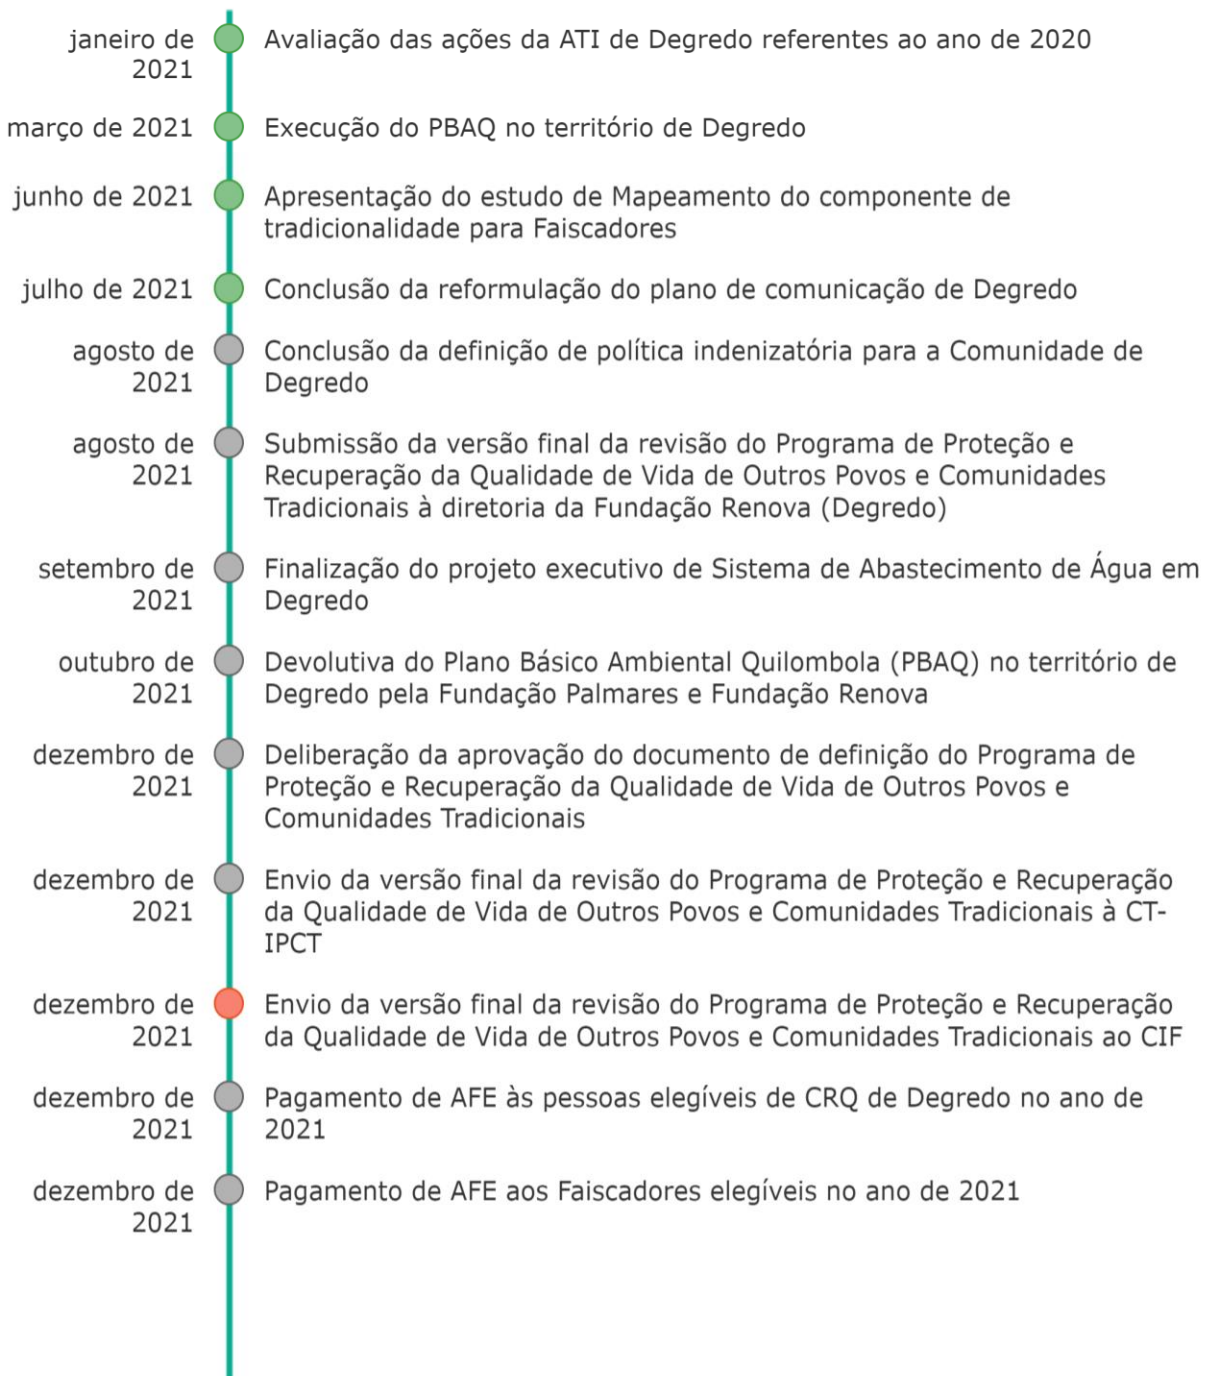

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 349 **titulares** (173 quilombolas, 72 fiscoadores de Rio Doce e 104 fiscoadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Início da execução dos programas: 01 - Documentação de Referências Culturais, 02 - Incentivo às Práticas Culturais do Degredo e 10 - Publicação do Livro de Medicina do Finado Atalino pela empresa Pacatu Assessoria em Projetos Culturais.

Fatos relevantes do mês

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

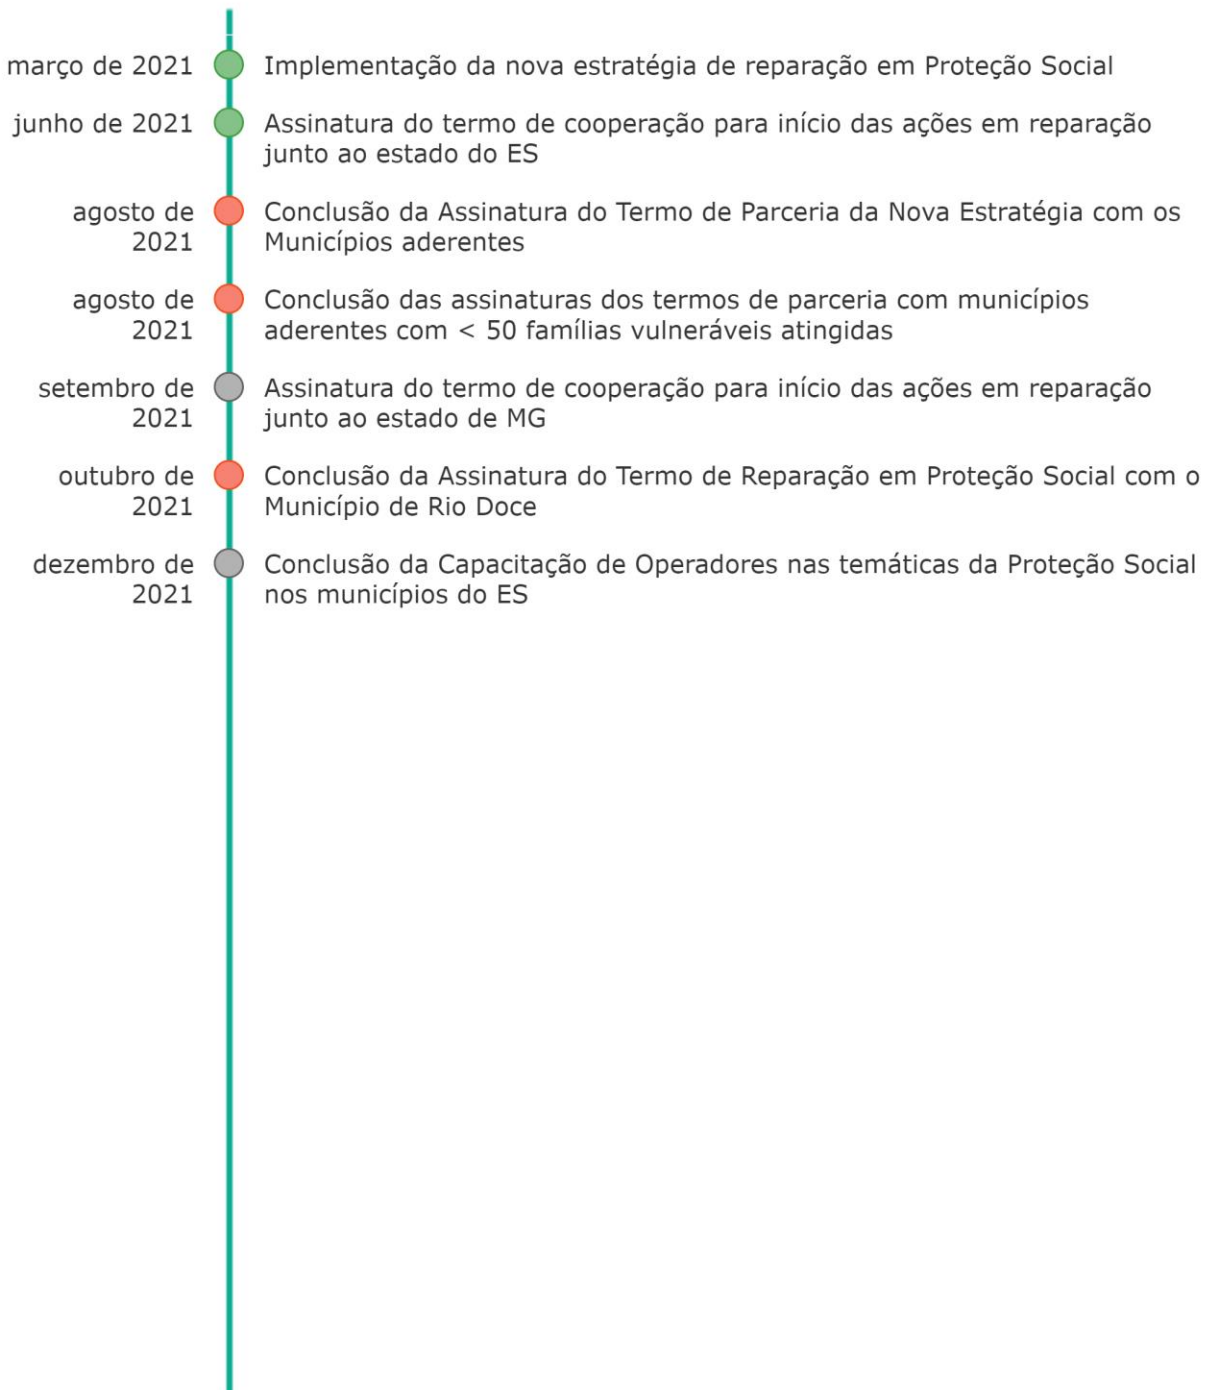

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de 6 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de Mariana/ MG, no período¹.
- Atuação de 58 **profissionais** (entre assistentes sociais, psicólogos, oficinairos e motoristas) nos demais municípios² da Calha, no período¹.
- Disponibilização de 18 **veículos para transporte das equipes** suplementadas nos municípios atenderem às famílias vulneráveis atingidas.
- 14,2 Mil **famílias** no banco do Cadastro Integrado da Fundação Renova identificadas **vulneráveis** a partir de informações autodeclaradas.
- **R\$ 3,0 Mi** correspondente **ao repasse financeiro**, além de compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados.

Nota:

¹ Período - 01/07/2021 à 31/07/2021

² Municípios: Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares, Naque, Periquito e Santana do Paraíso.

Fatos relevantes do mês

Capacitação de operadores de proteção social de Mariana, com a temática “Política nacional de assistência social, SUAS e os serviços tipificados e ofertados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Mariana”, avaliada por 99% dos participantes como adequado para contribuir com o trabalho desenvolvido com as famílias vulneráveis atingidas.

Assinaturas de termos e acordos para implementação dos planos de reparação em proteção social, para fortalecimento dos equipamentos públicos de assistência social dos municípios, qualificação de seus operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis atingidas em: Aracruz, Fernandes Tourinho e Ipatinga.

1ª reunião do Comitê de Monitoramento das Ações do Plano de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público nos seguintes municípios: Periquito, Conselheiro Pena e Naque.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Planejado
Deliberação	506	2.2	Reprogramado
Deliberação	506	3	Em Andamento
Deliberação	506	4	Planejado
Deliberação	506	5	Planejado
Deliberação	506	6	Planejado

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021		Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021		Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021		Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021		Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021		Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021		Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021		Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021		Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021		Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021		Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021		Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021		Execução do Processo de Produção de Conteúdo
dezembro de 2021		Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR MÊS	junho de 2021	julho de 2021	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	8	17	120.525
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	31	37	3.559
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	1.016
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	11

Fatos relevantes do mês

Na Calha do Rio Doce, foram realizadas ações de fomento ao engajamento da juventude do território nas ações de reparação: reunião com jovens do território para apresentação do Vim Ver Virtual, projeto para conhecimento das ações de reparação socioambiental conduzidas pela Fundação Renova ao longo da bacia.

Foram realizadas reuniões para apresentação do projeto “Doce Vivo”, que tem como objetivo apresentar as ações de reparação da Fundação Renova em relação à qualidade da água do rio Doce e melhorar a percepção no que diz respeito ao uso e consumo consciente em Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) e Colatina (ES).

Em Tumiritinga (MG) foi realizada reunião com os moradores e lideranças do Assentamento 1º de Junho para apresentação e discussão de ações para captação de água, tendo em vista as dificuldades de abastecimento da comunidade.

Em Mariana (MG) foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para informes sobre doações de madeiras de supressão vegetal, uso do solo do reassentamento, encaminhamentos sobre os alvarás emitidos e protocolados na Prefeitura de Mariana, status de atendimento aos meeiros pela Fundação Renova e outros assuntos relacionados ao avanço das obras. Ainda no município, destaque para realização de visita da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues ao reassentamento coletivo da comunidade para acompanhamento das obras.

Continuidade da realização dos Fóruns de Prestação de Contas: em Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Santa Cruz do Escalvado (MG) foram realizados encontros para apresentação das ações e resultados do programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce e resultados das frentes de trabalho da Reserva Técnica.

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) permanecem como pauta importante das ações de Diálogo Social no período e incluem a realização de reuniões coletivas, diálogos individualizados, envio sistemático de materiais informativos e suporte para esclarecimento de dúvidas de atingidos e advogados sobre o uso do Portal do Advogado. Destaca-se: na Calha do Rio Doce foram realizadas reuniões com moradores, lideranças e Comissões de Atingidos de Bom Jesus do Galho (MG), Caratinga (MG), Pingo D’Água (MG), Santana do Paraíso (MG), São José do Goiabal (MG), Sem-Peixe (MG), Sobrália (MG) para esclarecimento de dúvidas sobre o sistema; no Médio Rio Doce, foram realizadas reuniões em Cachoeira Escura (Belo Oriente), Baguari e Ilha Brava (Governador Valadares), Galileia (MG) e Tumiritinga (MG) para esclarecimentos e informes sobre o encerramento do prazo de adesão ao Fluxo Ágil.

Fatos relevantes do mês

Na Foz/Litoral ES foram realizadas reuniões para discussão sobre ações para retomada das atividades produtivas: em Linhares (ES) foi realizada reunião com representantes da Cooperativa de Agricultura Familiar (CAF) para acolhimento de demandas relacionadas ao fomento da cadeia produtiva de café e cacau no município e em Aracruz (ES) foi realizada reunião com comerciantes esclarecimento de ações de atendimento ao público por parte da Fundação Renova.

Indicadores

Considerando a aprovação da Definição do Programa, em 16 de junho de 2021, conforme mencionado na Deliberação CIF nº 505, o Pilar de Participação e Diálogo Social encontra-se em fase de apuração e consolidação dos dados dos indicadores, para apresentação de seus resultados a partir do próximo mês.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
11.943,00	173,09

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	265,00
abril de 2021	157	
maio de 2021	458	180,00
junho de 2021	180	
julho de 2021	180	-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

INDICADOR	Junho	Julho
I.24.C - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	70%	46%
I.24.D - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria (dias)	132,92	120,76

O indicador "Avaliação do atendimento pela Ouvidoria (i.26.c)" foi recentemente aprovado na câmara técnica e, após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal processo administrativo exige várias etapas, antes que a pesquisa por se iniciada, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação das propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a realização da pesquisa de satisfação. Portanto, o processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

▼ Grande Número	junho de 2021	julho de 2021
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	184.026	187.488
Canais: Número total de manifestações	799.433	815.977
Canais: Número de manifestações respondidas	729.661	748.233
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	131.804	132.158
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	17.368	18.414
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.164	13.284
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	637.094	652.121
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	9	10
Canais: Número de manifestações em tratamento	69.772	67.744

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente

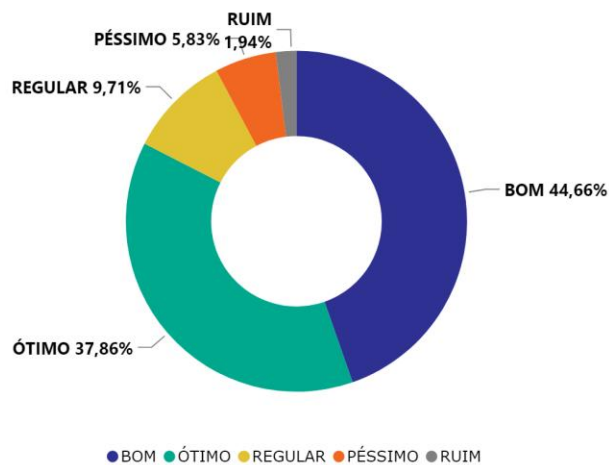


Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos relevantes do mês

- Análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32) no território do Médio Rio Doce (MG).
- Contato com os públicos de relacionamento, de forma remota, para prestar esclarecimentos e repassar informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, contemplando os municípios sentenciados.
- Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas (“Reassentamento” - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana (MG) e Alto Rio Doce (MG).
- Mobilização conjunta com a equipe de Diálogo Social dos atingidos de Mascarenhas (Baixo Guandu) para o Fórum de Prestação de Contas para apresentação dos resultados do Monitoramento da Qualidade da Água e ações para melhorias no sistema de Abastecimento de Água realizadas na comunidade.
- Monitoramento, pelos atendentes dos CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.
- Participação dos atendentes dos CIAs em treinamentos para qualificação dos colaboradores deste Canal no processo de reparação e compensação: Treinamento para esclarecimento de dúvidas sobre comunicado de prazo de encerramento da plataforma Novel enviado aos atingidos elegíveis que não solicitaram ingresso (26/07).

Indicadores

INDICADOR	Junho	Julho
Taxa de manifestações recorrentes (i.22)	na	38%
Proporção de manifestações respondidas (i.24.a)	91%	92%
Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado (i.24.b)	71%	71%
Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco (i.2 e i.26.b)	98%	99%
Satisfação com a resolução das solicitações (i.27)	91%	92%
Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco (i.27.b)	90%	89%

Os indicadores "Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs (i.2 e i.26.a)", "Oferta das informações solicitadas nos CIAs (i.27.a)" e "Satisfação com a estrutura física dos CIAs" não estão sendo medidos porque os espaços físicos dos CIAs encontram-se fechados por causa da pandemia de COVID-19. Assim que os centros forem reabertos para atendimento ao público, as medições serão iniciadas.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	0	1
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	4	43
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	0	3
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	3	6
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	6	21
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	2	18
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	0	57
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	48	197
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	4	28
Newsletter produzidos	6	4	6	3	5	4	32
Outros itens produzidos	2	0	9	8	11	5	46
Pílulas de whatsapp produzidos	27	26	51	46	67	42	339
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	16	63
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0	0
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	0	17
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Total	68	70	139	141	142	134	872

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2021


DADO	jul	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0
ÁudioZaps produzidos	8	8
Carros de som produzidos	1	1
Cartilhas produzidos	1	1
E-mails de Marketing produzidos	3	3
Informes do Reassentamento produzidos	2	2
Jornais da Comunidade produzidos	12	12
Matéria - Boletim Jornada produzidos	19	19
Mídias Sociais produzidas	15	15
Newsletter produzidos	4	4
Outros itens produzidos	11	11
Pílulas de whatsapp produzidos	80	80
Rádios produzidos	16	16
Vídeoreportagens produzidos	0	0
Vídeos produzidos	5	5
VídeoZaps produzidos	1	1
Total	178	178

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território

Canais: ● ÁudioZap ● Carro d... ● Cartilha ● E-mail ... ● Informe ... ● Jornal d... ● Matéria ... ● Mídia S... ● Newslet... ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

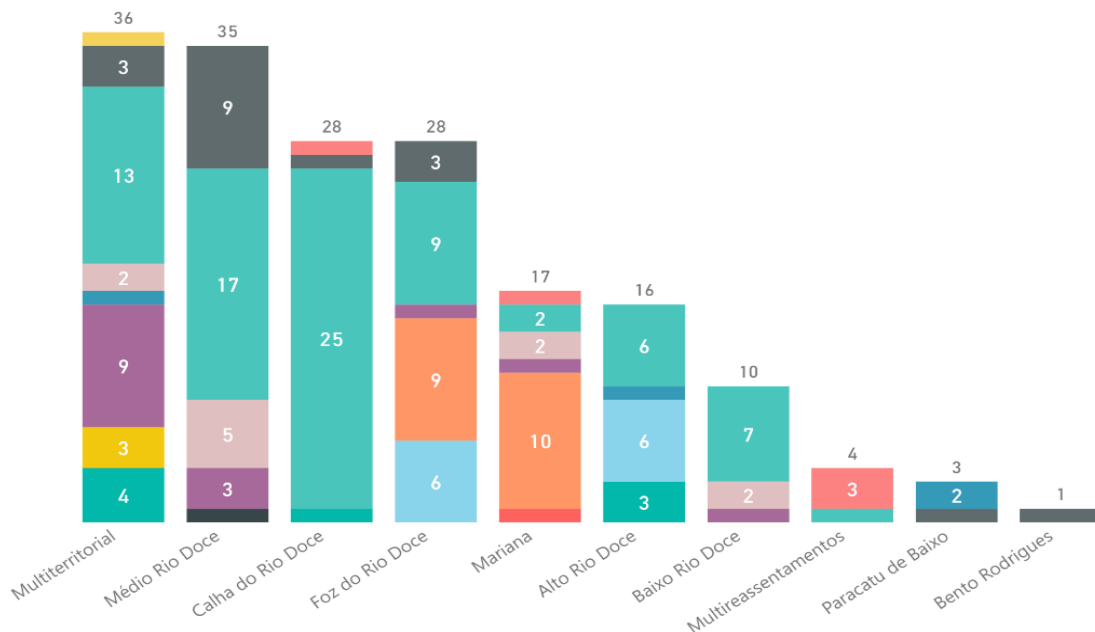


Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Canais ● **A**udioZap ● **C**arro de s... ● **C**artilha ● **E**-mail ... ● **I**nforme d... ● **J**ornal da ... ● **M**atéria - ... ● **M**ídia So... ● **N**ewsletter ● **O**utros ● **P**ílula ● **R**ádio ● **V**ídeo ● **V**ídeoZap



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de audiozap para convidar os moradores de Barra Longa para o Fórum de Prestação de Contas – Resulta sobre o monitoramento da bacia do Rio Doce.

Produção de audiozap para convidar os moradores de Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce para o Fórum de Prestação de Contas – Resulta sobre a Reserva Técnica.

Produção de audiozap para convidar os moradores de Rio Doce para o Fórum de Prestação de Contas – Resulta sobre o monitoramento da bacia do Rio Doce.

Produção e distribuição digital da 16ª edição do Terra da Gente, informativo com as comunidades de Barra Longa, Gesteira e Barreto.

Baixo Rio Doce

Produção de pílula para convidar os moradores de Itueta para o fórum sobre qualidade da água, ações ambientais que contribuem para a melhoria da qualidade da água, judicialização e abastecimento coletivo de água.

Produção de pílula para convidar os moradores de Mascarenhas, Baixo Guandu, para o fórum sobre qualidade da água, ações ambientais que contribuem para a melhoria da qualidade da água, judicialização e abastecimento coletivo de água.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula convidando moradores de Revés do Belém, comunidade de Bom Jesus do Galho, para reunião temática sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 13/07.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Revés do Belém para reunião de apresentação do projeto Doce Vivo, no dia 22/07.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Calha do Rio Doce

Elaboração de pílula convidando moradores de Caratinga para reunião sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 27/07.

Elaboração de pílula convidando moradores de Santana do Paraíso para reunião sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 28/07.

Elaboração de pílula convidando moradores de São José do Goiabal para reunião sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 21/07.

Elaboração de pílula convidando moradores de Sem-Peixe para reunião sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 20/07.

Elaboração de pílula de reforço para o VimVer virtual para jovens do território Calha do Rio Doce, compartilhada no dia do evento.

Elaboração de pílula-convite para o VimVer virtual para jovens do território Calha do Rio Doce, realizado no dia 07/07.

Produção de pílula convidando atingidos de Caratinga para reunião virtual sobre Sistema Indenizatório Simplificado no dia 14/07.

Produção de pílula convidando moradores de Pingo-d'Água para reunião temática sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 08/07.

Produção de pílula de WhatsApp, distribuída no dia 27/07, lembrando moradores de Caratinga sobre o início da reunião sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp, distribuída no dia 28/07, lembrando moradores de Santana do Paraíso sobre o início da reunião sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Mariana

Produção e distribuição digital da 17ª edição do Boletim Jornada para a população de Mariana.

Foz do Rio Doce

Produção e distribuição digital da 17ª edição do jornal Voz da Foz, informativo com as comunidades de Areal, Entre Rios, Povoação e Regência.

Produção e distribuição digital da 10ª edição do Boletim Jornada para a população do entorno da Lagoa Juparanã.

Produção de pílula convidando a Comissão de Comerciantes de Barra do Riacho, Aracruz, para tratar sobre Sistema Indenizatório e participação social.

Comunicação com Territórios

Veiculação de nove programas (Momento Renova) em seis territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em julho com um total de 54 programas, com 162 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp, distribuída no dia do evento, lembrando moradores de Sem-Peixe sobre o início da reunião sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp, distribuída no dia do evento, lembrando moradores de São José do Goiabal sobre o início da reunião sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

- Barra Longa recebe nova estrutura para reforçar a coleta de lixo no município.
- Elaboração de Proposta Técnica e Comercial é tema de palestra para empresários mineiros.
- Elaboração de Propostas Técnicas e Comerciais é tema de palestra para empresários mineiros.
- Fundação Renova conclui revegetação de florestas e APPs afetadas pelo depósito de rejeitos da barragem de Fundão.
- Jovens de Regência apresentam vídeos on-line que contam histórias da comunidade.
- Mariana recebe a praça Gomes Freire requalificada e com melhorias.
- Modelos de negócios inovadores é tema de evento on-line do projeto Mariana Labs.
- Mulheres e Mercado de Trabalho é tema de workshop da plataforma Recoloca Rio Doce.
- Pagamentos pelo Sistema Indenizatório avançam e alcançam R\$ 662 milhões em MG.
- Pagamentos pelo Sistema Indenizatório avançam e chegam a R\$ 926 milhões no ES.
- Parque de Exposições de Barra Longa vai ganhar via de acesso duplicada e pavimentada.
- Parque Estadual do Rio Doce recebe R\$ 93 milhões para melhorar estrutura e fortalecer turismo.
- Profissionais de saúde do SUS recebem capacitações em municípios de MG e do ES.
- Projeto vai apoiar revitalização de bibliotecas públicas em municípios da bacia do rio Doce.
- São José do Goiabal conclui obras de saneamento básico.
- Seleção de 169 instituições visa fortalecer iniciativas de cultura, esporte, turismo e lazer.
- Sistema Indenizatório Simplificado chega à comunidade de Degredo a partir de agosto.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para Rádio Renova divulgando o prazo final para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Ipaba do Paraíso aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Itueta aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Linhares aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Marilândia aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Naque aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Periquito aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de programa de rádio sobre os últimos dias para atingidos de localidades de Minas Gerais aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Senhora da Penha aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Sem-Peixe aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de São José do Goiabal aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Santa Cruz do Escalvado aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Rio Doce aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Revés do Belém aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Resplendor aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Ponte Nova, Chopotó e Rosário do Pontal aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Pingo-d'Água aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Ipaba aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula sobre os últimos dias para atingidos de localidades de Minas Gerais e do Espírito Santo aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula sobre a análise dos pedidos de contestação e reenquadramento no Sistema Indenizatório Simplificado mesmo após o fim do prazo de adesão.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Tumiritinga aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de todas as localidades aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de São Mateus aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Galileia aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Conceição da Barra aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de newsletter com 10 informações atualizadas sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de áudiozap sobre as 17 mil pessoas indenizadas e os pagamentos regionalizados do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as 17 mil pessoas indenizadas e os pagamentos regionalizados do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Aimorés aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Aracruz aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Baguari aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Baixo Guandu aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Bugre aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Cachoeira Escura aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula informando o prazo final para atingidos de Caratinga aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Divulgação de audiozap com informações sobre o prazo final para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para advogados com novos esclarecimentos sobre reingresso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para advogados com orientações sobre os procedimentos exigidos no processo da Pesca Profissional no Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para advogados com orientações sobre reingresso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos com novos esclarecimentos sobre reingresso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Elaboração de pílula de WhatsApp para atingidos com orientações sobre reingresso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de audiozap com 10 informações atualizadas sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Produção de pílula/convite para o primeiro módulo da capacitação das lideranças quilombolas.

Suporte ao PG007 Programa de Assistência aos Animais

Produção de vídeo sobre guarda responsável e adoção dos animais resgatados.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG007 Programa de Assistência aos Animais

Elaboração de cartilha com orientações sobre a retomada das visitas dos tutores dos animais as fazendas da Renova.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Elaboração de série de 10 pílulas sobre apoio com cursos de Educação Financeira oferecido às famílias dos reassentamentos.

Produção de vídeo introdutório para material de educação socioambiental em atendimentos a condicionante dos reassentamentos, sobre o tema “Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e uso de preservativo”.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção da 29ª edição do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues, com informações atualizadas sobre o andamento das obras.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção da 23ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Produção da 24ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Produção de vídeo sobre o Patrimônio Arqueológico de Mariana, em atendimentos a condicionante socioambiental dos reassentamentos.

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de comunicado informando o início das obras de acesso ao Parque de Exposições em Barra Longa.

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de pílula de WhatsApp para convidar os moradores de Barra Longa para o Diálogo Coletivo Virtual sobre a reparação das manifestações culturais.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Elaboração de convite para reunião com as comunidades de Mariana e zona rural sobre diagnóstico de referências culturais.

Elaboração de dez santinhos nas datas das celebrações religiosas das comunidades.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar os moradores de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce para o Diálogo Coletivo Virtual sobre a reparação das manifestações culturais.

Produção de pílula sobre a suspensão das atividades esportivas nos campos de futebol alugados pela Renova para os atingidos em função da Covid-19.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Distribuição de audiodzap com informações sobre o início do Projeto de Incentivo à Leitura.

Produção de e-mail marketing para o webinar de apresentação dos diagnósticos de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer dos municípios que tiveram as atividades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

Produção de nota para o Momento Renova sobre o Festival Identidade Regência, projeto apoiado pelo Edital Doce.

Produção de pílula/convite para o webinar de apresentação dos diagnósticos de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer dos municípios que tiveram as atividades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

Produção de programa de rádio com informações sobre o início do Projeto de Incentivo à Leitura.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de Programa sobre o Festival Identidade Regência, apoiado pelo Edital Doce.

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de pílula convidando os pescadores da Calha a participarem de reunião de apresentação do Edital.

Produção de pílula convidando os pescadores da Praia do Suá, em Vitória, a participarem de reunião de apresentação do Edital.

Produção de pílula convidando os pescadores de Degredo a participarem de reunião de apresentação do Edital.

Produção de pílula convidando os pescadores de Sooretama a participarem de reunião de apresentação do Edital.

Produção de pílula convidando os pescadores do Baixo (ES) e da Foz a participarem de reunião de apresentação do Edital.

Produção de pílula convidando os pescadores do Baixo (MG) e Médio a participarem de reunião de apresentação do Edital.

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre o Termo de Aceite, documento necessário para que produtores rurais atingidos recebam as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) em suas propriedades.

Produção de programa de rádio sobre o início das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para produtores rurais atingidos, com o objetivo de retomar e fortalecer atividades agropecuárias.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Produção de programa de rádio sobre a consultoria aos comerciantes da Foz, cujos negócios foram impactados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de pílula de WhatsApp sobre a Plataforma Recoloca Rio Doce para divulgar as oportunidades de emprego disponíveis em Barra Longa.

Suporte ao PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Distribuição de audiodzap com informações sobre a conclusão das obras de esgotamento sanitário em São José do Goiabal.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a conclusão das obras de esgotamento sanitário em São José do Goiabal.

Produção de programa de rádio sobre a conclusão das obras de esgotamento sanitário em São José do Goiabal.

Produção de videoreportagem sobre a conclusão das obras de esgotamento sanitário em São José do Goiabal.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de faixas com orientações sobre o desvio do trânsito durante a travessia da Avenida JK pelas obras da adutora de Governador Valadares.

Produção de faixas para informar sobre os locais com trânsito interdito e reforço da atenção com as pessoas trabalhando no trecho urbano das obras da adutora de Governador Valadares.

Produção de pílula de WhatsApp para informar sobre a conclusão das obras da adutora de Governador Valadares no cruzamento da Avenida JK com a rua Lincoln Byrro, entre os bairros São Paulo e Vila Bretas, bem como a liberação do trânsito neste trecho.

Produção de pílula de WhatsApp para informar sobre o andamento das obras da adutora de Governador Valadares no cruzamento da Avenida JK com a rua Lincoln Byrro, entre os bairros São Paulo e Vila Bretas.

Indicadores

O Programa 06 foi aprovado recentemente e os indicadores do pilar de Comunicação dependem da realização de pesquisas. Nesse sentido, as áreas responsáveis dentro do programa já deram início aos processos necessários para realização das pesquisas que, conforme aprovado, tem um prazo de 90 dias para acontecer a partir de junho de 2021.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1154 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 154 adoções, 352 devoluções, 164 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 442 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 326 bovinos, 62 equinos, 33 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1680 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Retomada de visitas de atingidos às fazendas.

Indicadores

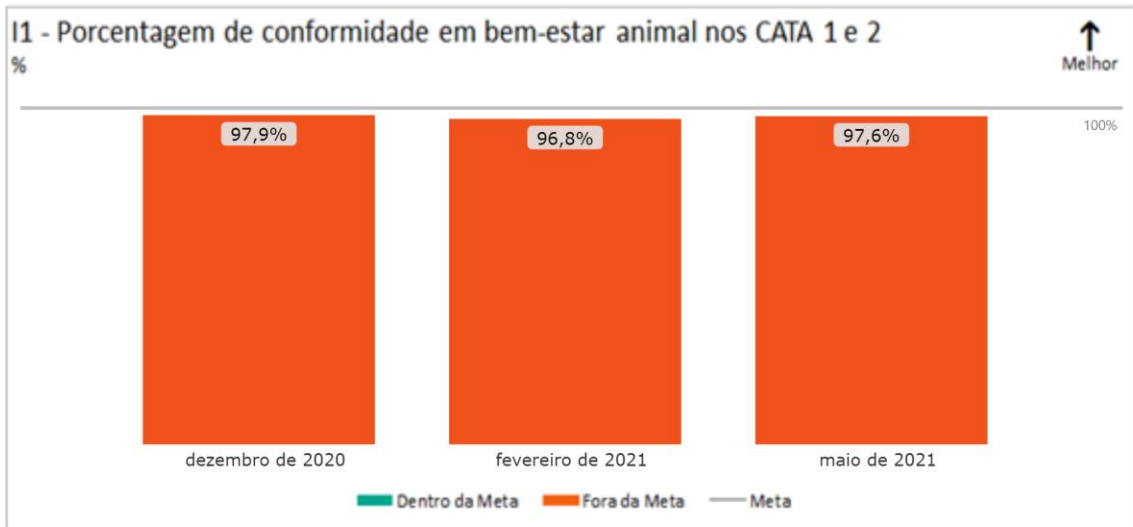


Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

A aplicação deste indicador, em função da pandemia do novo Coronavirus (SARS-CoV-2), vem sendo realizada em caráter trimestral. Conforme apontado em relatórios anteriores, esta ampliação entre os períodos de aferição (de bimestral para trimestral) tem por objetivo reduzir o risco de exposição dos colaboradores em atividades conjuntas, e minimizar possibilidade de acidentes de trabalho em período de intensa ocupação de leitos causada pelo avanço da pandemia. Não obstante, esta frequência está adequada à proposta apresentada de revisão da Definição do Programa, e já validada pela CT-OS em Janeiro de 2020.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

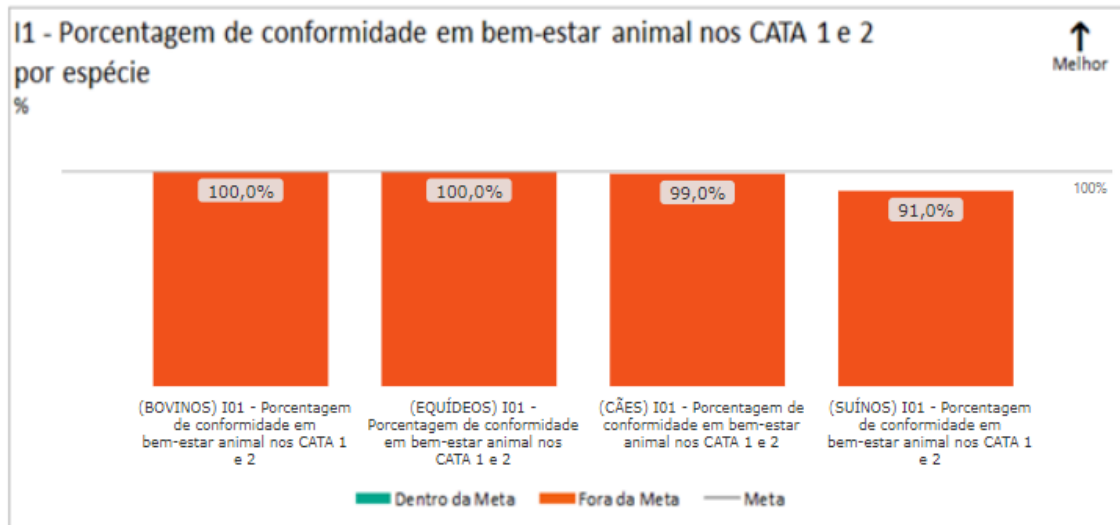


Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Durante o período de verificação de resultados deste indicador, o felino que se encontrava sob guarda temporária não passou por avaliação de bem-estar no período vigente por estar internado para tratamento de enfermidade.

Os demais desvios apresentados em relação a meta vigente, não são significativos do ponto de vista do atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o bimestre referente aos meses de maio e junho de 2021, as adoções realizadas na campanha virtual de 2021 e que ainda se encontravam em fase de acompanhamento, foram finalizadas e, portanto, passaram a incluir o respectivo indicador, conforme previsto na metodologia da Definição do Programa.

Um felino que se estava sob guarda do Programa e que fazia parte dos animais disponíveis para adoção, veio óbito em função de doença crônica, e adicionalmente alterando o resultado do indicador.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Fatos relevantes do mês – Reconstrução de Vilas


Aquisição de imóvel para o ID 191 em 25/06/21, Família oriunda de Bento Rodrigues;

Aquisição de imóvel para o ID 96A2 em 06/07/21, Família oriunda de Paracatu de Baixo;

Aquisição de imóvel para o ID SGC 42810 em 23/07/21, Família oriunda de Pedras.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021  Concluir 54 casas

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Início de 6 casas do novo aditivo da HTB - (ID's 74, 190, 261, 21D(2 Casas), 93B

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.


Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021

- 
- dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
 - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).
 - dezembro de 2021 ● Concluir etapas de 05 construções de casas novas em área rural (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura).

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Conclusão da segunda fase da reforma do ID 258 pela empresa Dinâmica.
Imóvel recebido pela família em 02/07/21.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Indicadores

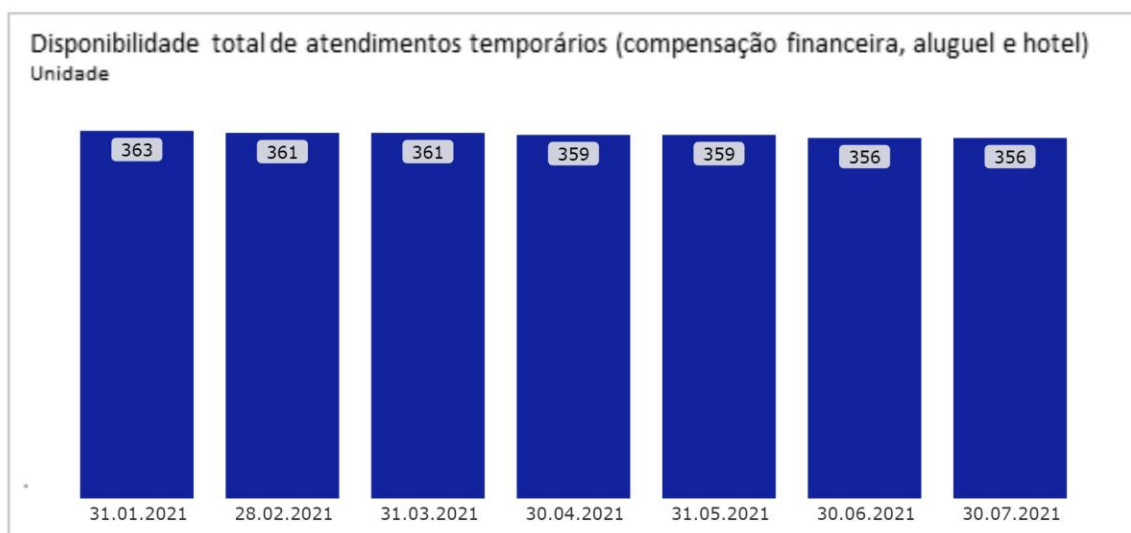


Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Concluída internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Concluída parcialmente /Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluída internamente
Deliberação	80	4.1	Concluída internamente
Deliberação	80	4.2	Concluída internamente
Deliberação	225	2	Concluída internamente /em andamento
Deliberação	286	3	Concluída internamente

Entregas do programa

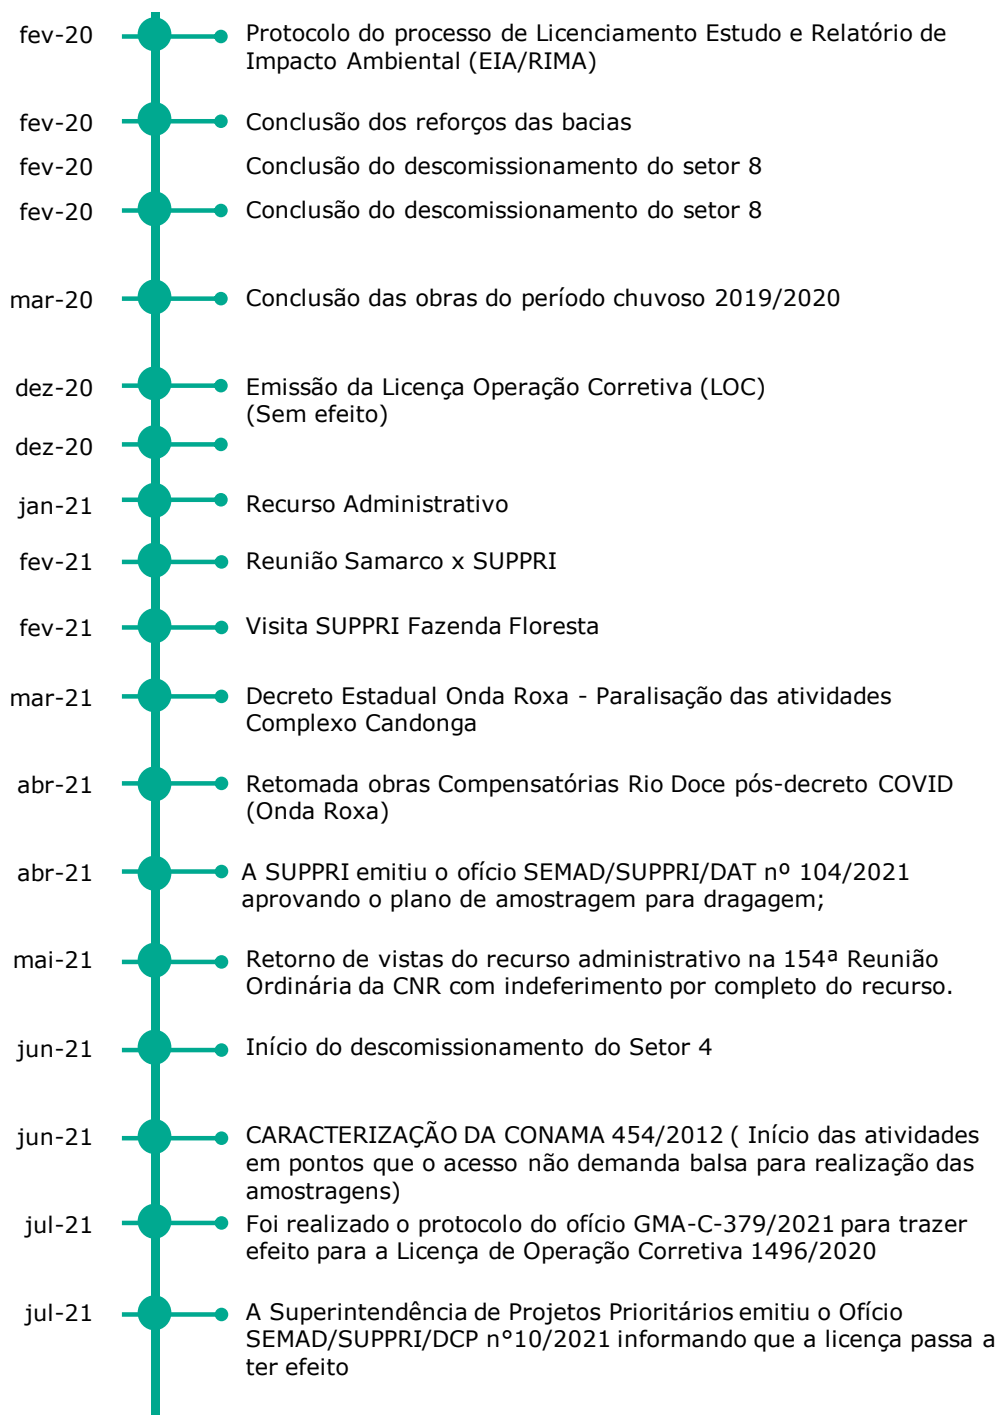

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Fatos relevantes do mês

➤ Bueiro do Córrego dos Borges



Figura 1 - Colocação de aduelas Bueiro dos Borges



Figura 2 - Imagem aérea Bueiro dos Borges

Fatos relevantes do mês

➤ Descomissionamento do setor 4

- Remoção de Sedimentos:
 - ✓ Volume executado até 31/07: 106.061 m³



Figura 3 - Vista aérea do Setor 4

- Área de desaguamento primário:

- ✓ Setor 5



Figura 4 - Setor 5

- ✓ Setor 1



Figura 5 - Setor 1

Fatos relevantes do mês

- ✓ Área à jusante do Setor 4



Figura 6 - Área à jusante do Setor 4

- Empilhamento definitivo - Pilha 1:



Figura 7 - Liberação de camada de compactação

- Dreno no Canal Extravasador - Jusante do dique principal:

- ✓ Lançamento e espalhamento de agregados



Figura 8 - Sequência executiva do dreno no canal extravasador

Fatos relevantes do mês

➤ Recuperação dos pontos de margens

- Execução de recuperação do ponto de margem 144/55



Figura 9 - Enrocamento de talude dos pontos 144/55

- Execução de recuperação do ponto de margem 59/123



Figura 10 - Reforço do ponto 59 e 123

✓ Evolução na execução dos pontos de margens - total de 79

RECUPERAÇÃO PONTOS DE MARGEM	Quantidade				
	Total Previsto	Previsto até a data	Concluído até a data	Em execução	Saldo a concluir
MARGEM ESQUERDA	57 und	33 und	33 und	19 und	24 und
MARGEM DIREITA	22 und	14 und	14 und	0 und	8 und
TOTAL					32 und

Nota: Após revisão, os pontos 23 e 53 tiveram seus status alterados de 'concluído' para 'a executar'.

Fatos relevantes do mês

➤ Reabilitação da UHE - Risoleta Neves

- Avanço por frente de serviço:

Atividades	Status	Avanço Físico
Projeto total	☹️	34,5%
Canteiro	😊	100%
Engenharia e Suprimentos	😊	100%
Materiais de Fornecimento	😊	100%
Limpeza do Tubo Sucção - UG01 a UG03	😊	80%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	😊	63%
Comporta vagão Tomada d'água	😊	64%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água	😊	9%
UG1- Atividades na Casa de Força	😊	67%
UG2- Atividades na Casa de Força	😊	42%
UG3- Atividades na Casa de Força	☹️	0%
Transformador Elevador	😊	49%
Vertedouro	😊	14%
Comissionamento sem água	☹️	0%
Comissionamento com água	☹️	0%
Comportas ensecadeiras montante - Tomada D'água	☹️	0%
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	☹️	0%

- Atividades executadas na UHE durante o período:
 - ✓ Vertedouro 01- Jateamento da comporta, inspeção da guia da grade da tomada d'água, retirada da cuba do óleo do mancal escora, reparo com corte da parte danificada da estrutura.
 - ✓ UG1 - Atividades na Casa de Força + Reabilitação Rotor: descida da tampa da UG para jateamento, análise e constatação de avarias do Eixo e Casquilho da UG, envio das pás da UG para manutenção externa.
 - ✓ UG2 - Atividades na Casa de Força + Reabilitação Rotor: retirada do anel regulador da UG, retirada do casquilho do mancal da UG, retirada do Eixo, medição do segmento escora do mancal da UG, desmontagem e retirada da Ogiva, pás, alavancas e bielas e ensaio de líquidos penetrantes.

Fatos relevantes do mês

- ✓ UG3 - Atividades na Casa de Força: Mobilização da empresa e início das atividades de mergulho com bombeamento para execução da limpeza do vão 5.
- ✓ Atividades de sondagem:
 - ✓ Perfuração dos furos de drenagem;
 - ✓ Sondagens na área do terramech.



Tabela 1 - Fotos de atividades executadas na reabilitação da UHE - Risoleta Neves

Fatos relevantes do mês

➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

✓ **Destques:**

- Revisão da carta de risco dos barramentos concluída;
- Concluída a instalação dos tilt meters nos três barramentos.



Figura 11 - Tilt meters instalados (Barramento A)

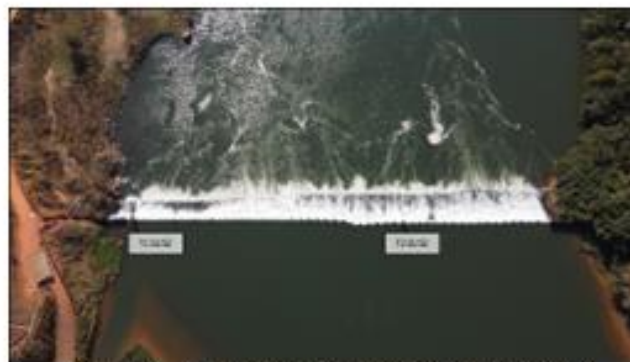


Figura 12 - Tilt meters instalados (Barramento B)



Figura 13 - Tilt meters instalados (Barramento C)

Fatos relevantes do mês

✓ Monitoramento - Instrumentação Barramentos

Campanha de monitoramento nos barramentos A e C - Síntese conclusiva dos resultados obtidos na primeira campanha (realizada entre os meses de junho/21 e julho/21):

- ✓ Sem desvios para o período no ponto de montante do Barramento C;
- ✓ Sem desvios para o período no ponto de montante Barramento A;
- ✓ Sem desvios para o período no ponto de jusante Barramento A.

✓ Monitoramento Descomissionamento do Setor 4

- ✓ Áreas de disposição primária

- Setor 1:



Figura 14 – Pontos de monitoramento Setor 1

Síntese conclusiva:

- ✓ Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco;
- ✓ Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco.

Fatos relevantes do mês

- **Setor 4:**



Figura 15 – Monitoramento Córrego dos Borges

Síntese conclusiva:

Monitoramento de jusante: Desvios no parâmetro turbidez nos dias 15, 17 e 18/06, relacionados com o bombeamento a montante do Dique do Setor 4, demonstrando oportunidade de melhoria no sistema de controle implantado;



Figura 16 - Melhoria realizada: sistema de controle na entrada do efluente (pedras em transição e geotêxtil) e na saída do efluente (sump e sistema filtrante: enrocamento, britas em transição e geotêxtil)

Fatos relevantes do mês

- **Setor 5A:**



Figura 17 - Monitoramento Setor 5A

Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco



Figura 18 - Melhoria realizada: direcionamento do greide do terreno para canaleta envoltória com manta geotêxtil

Fatos relevantes do mês

- **Setor 5B:**



Figura 19 – Monitoramento Setor 5B

Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco



Figura 20 - Melhoria realizada: fechamento da leira, direcionamento do greide do terreno e instalação de tubulação para direcionamento de eventual efluente na saída

Fatos relevantes do mês

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

✓ Monitoramento de Efluentes

Relocação sistema de efluentes – Fazenda Floresta



Figura 21 - Impermeabilização da baía da caixa de efluentes



Figura 22 - Conclusão da realocação da caixa de efluentes

Fatos relevantes do mês

✓ **Monitoramento Hídrico**

Monitoramento Hídrico Superficial: Realizado monitoramento no curso d'água da Fazenda Jerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe e no córrego Micaela, e foram identificados desvios nos parâmetros Manganês e/ou Ferro Dissolvido associados a elementos naturais (background) da região. Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

Não houve desvios nos monitoramentos diários para o período de reporte.

✓ **Monitoramento Atmosférico**

Desde o início do monitoramento da qualidade do ar nas comunidades de Rio Doce, Santana do Deserto e Novo Soberbo, nunca houve a ultrapassagem dos limites legais dos parâmetros monitorados (PM10 e PM2,5), mesmo no período seco. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ **Monitoramento de Ruído e Vibração**

Realizado monitoramento de vibração nas regiões de Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondó, Funil, Buraco e Pontal, assim como nas áreas predominantemente residenciais de Santana do Deserto, Tapera, Rio Doce/Sede e Porto Plácido, e não foram identificados quaisquer desvios. As análises seguiram as definições estabelecidas na ABNT 10151/2019.

✓ **Gestão Ambiental**


✓ **Remoção de Sucata Metálica**

- Concluída atividade de remoção da sucata metálica das margens do reservatório. Peso total de material removido: 288,8 toneladas.

Fatos relevantes do mês



Figura 23 - Conclusão da remoção de sucata

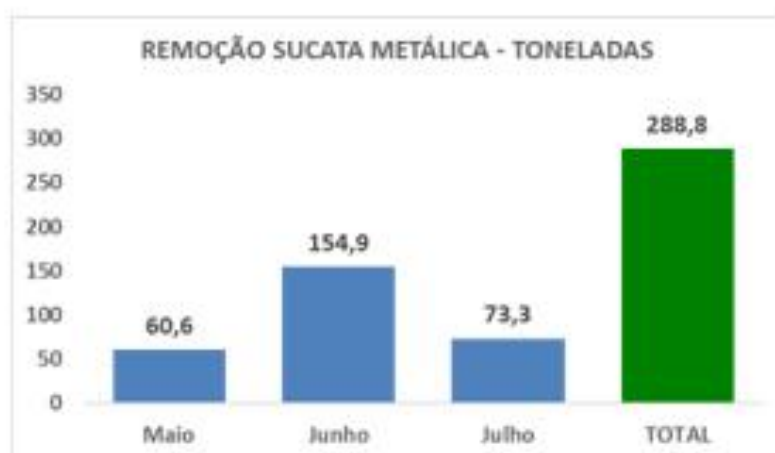

✓ Resgate e translocação da ictiofauna (Setor 4)

- **METODOLOGIA:**
 - ❖ Coleta através de: tarrafas, puças e redes de arrasto.
 - ❖ Após a captura, os peixes foram ser imediatamente transferidos para caixas d'água, preenchidas com água do próprio Dique;
 - ❖ Peixes nativos capturados, foram imediatamente soltos as margens Rio Doce;
 - ❖ Equipe Envolvida: Biólogos especialistas; Barqueiros; Gerência de Meio Ambiente e Gerência de Segurança.

Fatos relevantes do mês



Figura 24 - Evidenciada as etapas de resgate, triagem e soltura dos indivíduos

- Resultados:
 - ❖ 247 indivíduos resgatados;
 - ❖ Índice de Mortandade: zero.

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

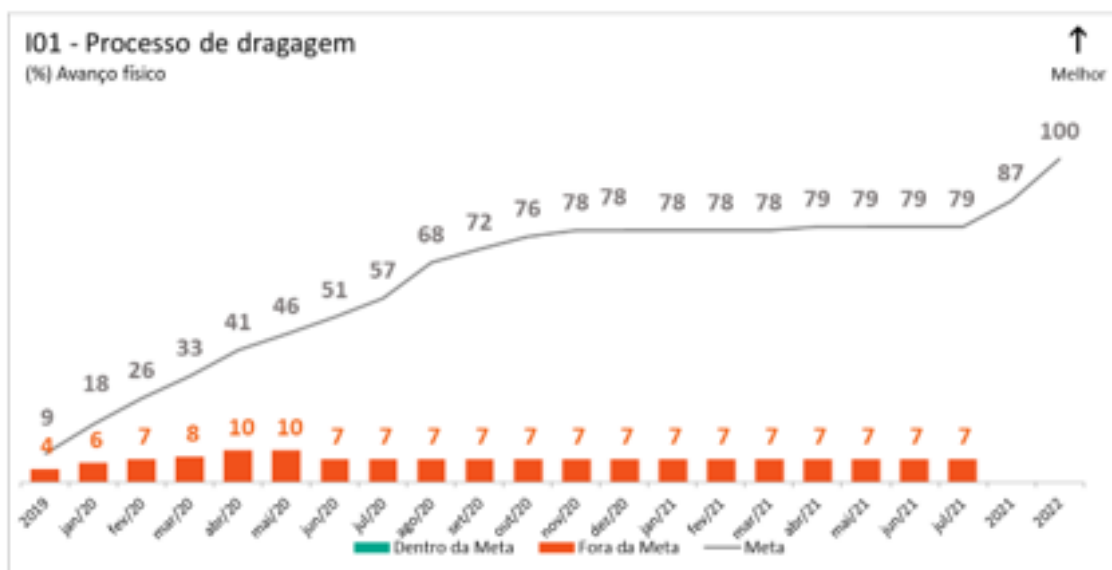


Gráfico 1. Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

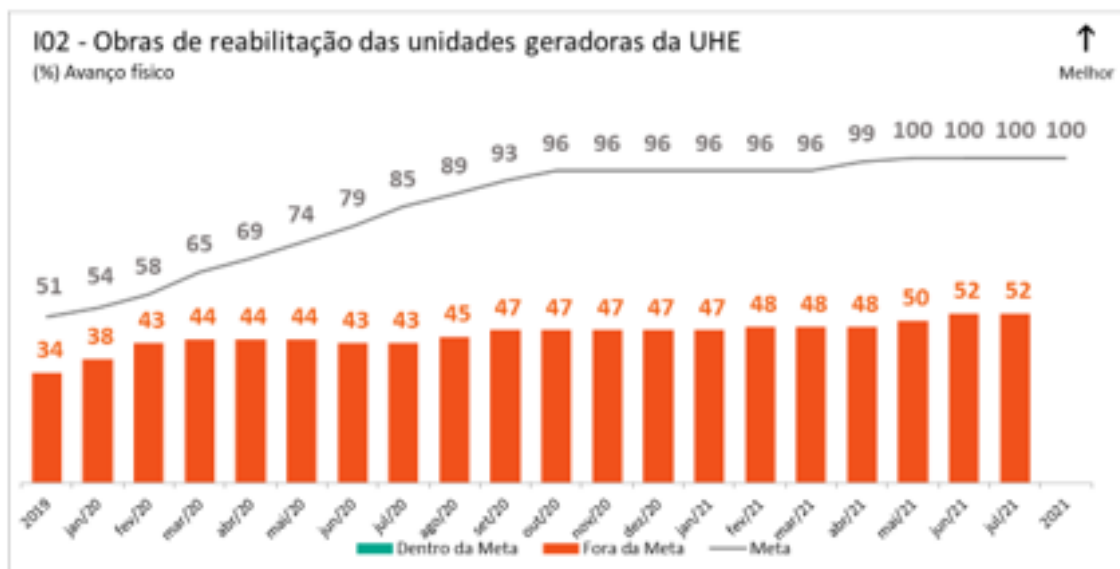


Gráfico 2. Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

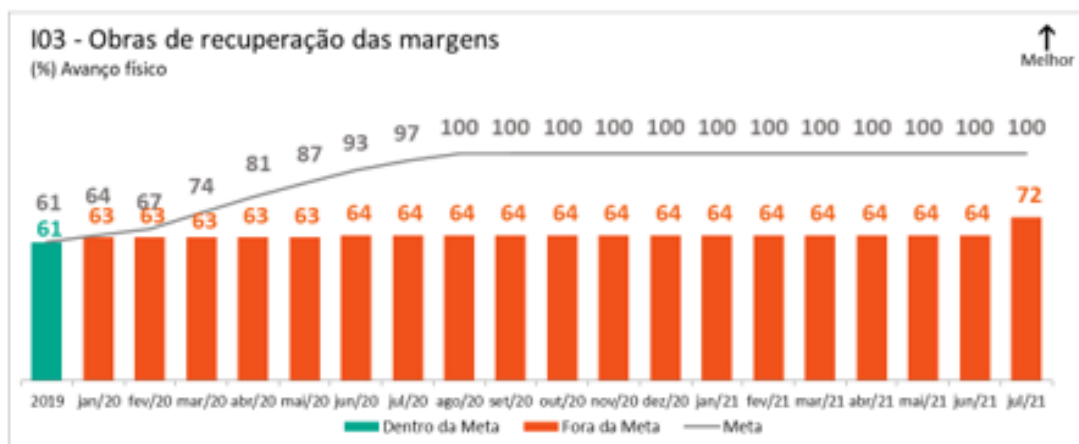


Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.



Gráfico 4. Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado.

A Samarco está empenhada em apresentar dados mais significativos, à luz dos desdobramentos da liberação de atividades que serão estabelecidas num futuro próximo.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado
Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	217	3	Em Andamento

Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.643 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 925 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.720 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 209 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 103 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 15 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 8 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 163 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 3 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 80
- Concluído sem termo: 08
- Paralisado: 03
- Pendente: 148
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 12
- Concluído sem termo: 10
- Paralisado: 00
- Pendente: 04
- Total: 26

Fatos relevantes do mês

Concretagem da laje do palco no parque de exposição de Barra Longa;

Conclusão da contratação para execução das obras da Casa da Banda;

Assinatura do termo de Recebimento da obra do Transbordo de Lixo do município de Barra Longa.

Aprovação para obras complementares do parque de exposição pelo contrato CRP-RBAR (Acesso e ETE - Estação de Tratamento de Esgotos).

Indicadores

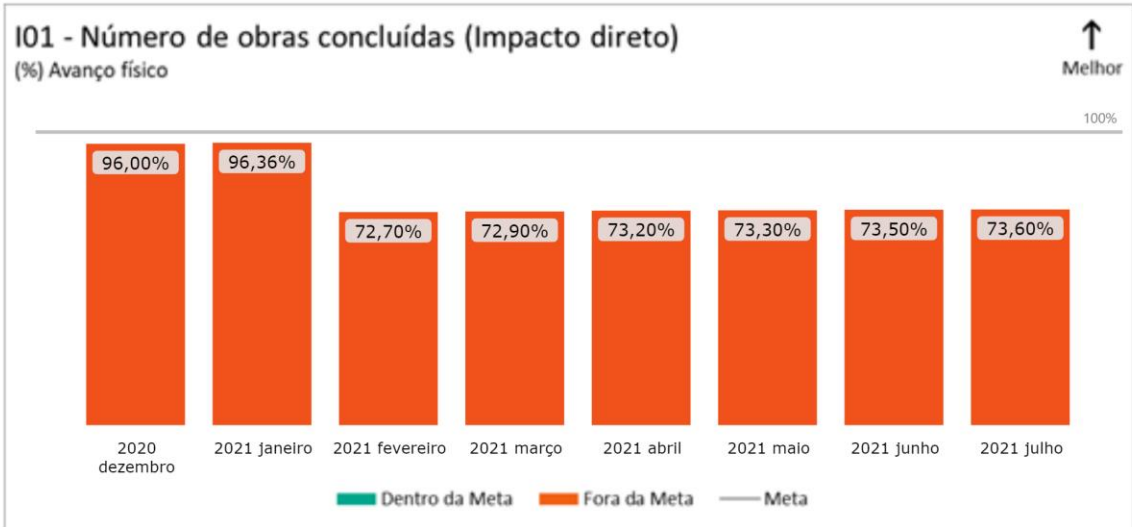


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

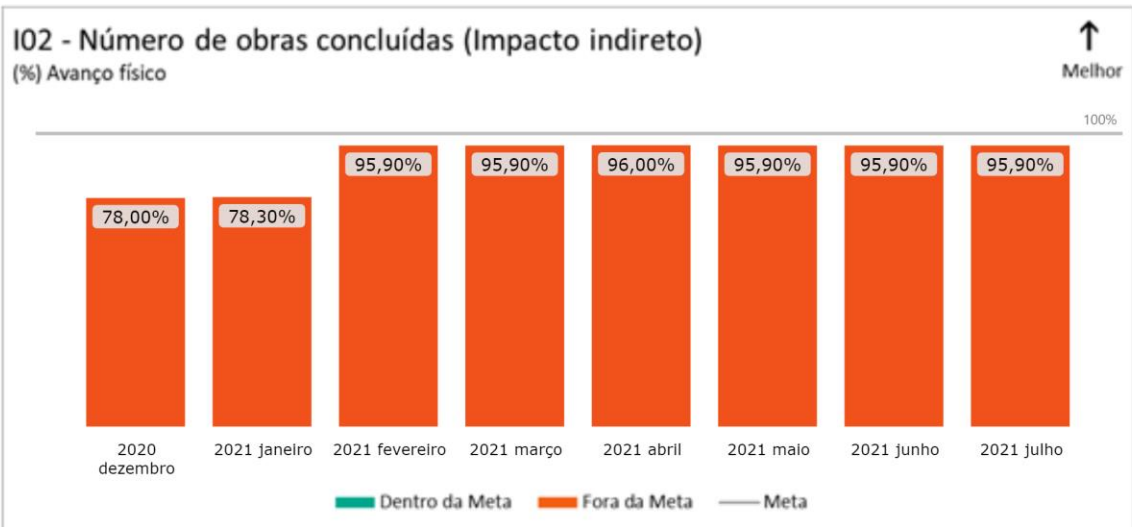


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

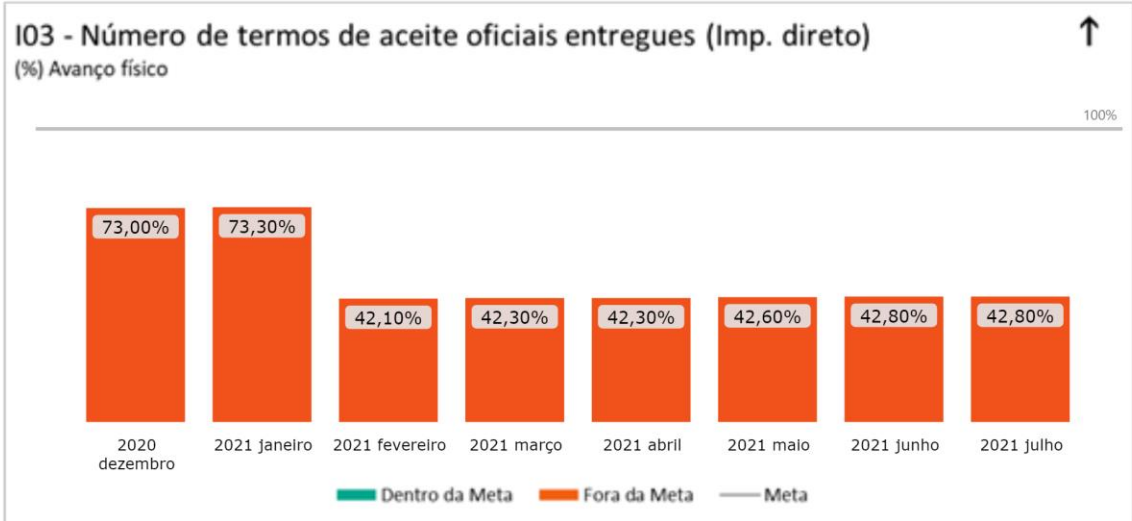


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

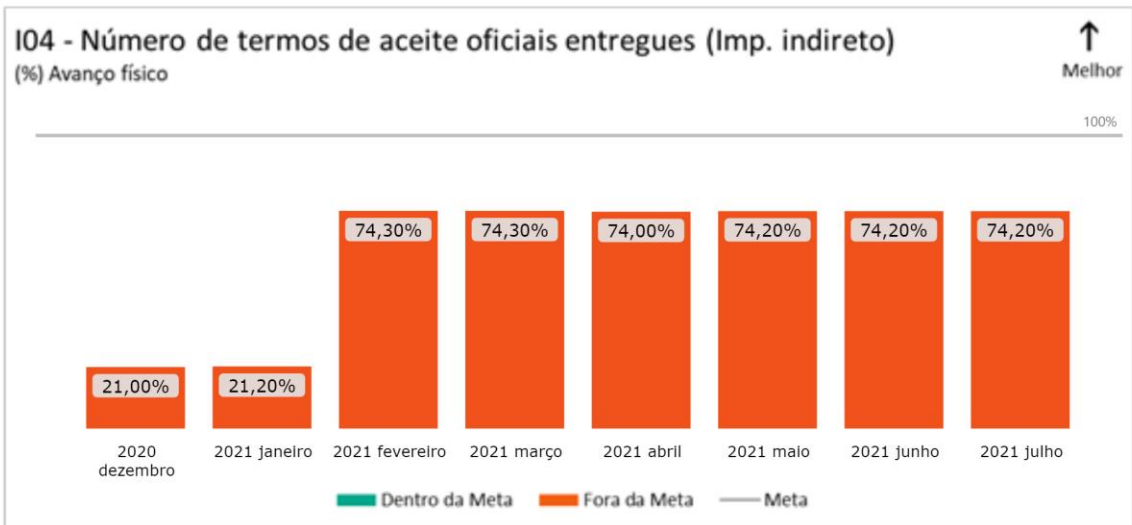


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
- dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021 ● Execução das atividades de socialização da comunidade escolar em Mariana e Barra longa

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Construção do plano de ação para finalização dos Projetos Políticos Pedagógicos das 30 escolas municipais de Mariana e validação pela SEMED.

Elaboração e entrega do Plano de Transição das Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas para a CTECLET.

Reunião com a SEMED de Mariana para início das atividades do Projeto Psicopedagógico Institucional nas escolas municipais de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Indicadores

Revisão Dos indicadores do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF no 508, de 16 de junho de 2021). Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores a partir de dez/21.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Concluído Internamente
Cláusula	97	caput	Concluído Internamente
Cláusula	98	a	Concluído Internamente
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- June de 2021 ● Entrega do sistema básico de monitoramento da Reserva Técnica
- June de 2021 ● Início das ações de reparação das Referências Culturais
- August de 2021 ● Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- October de 2021 ● Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
- December de 2021 ● Restauração de 85 peças na Reserva Técnica
- December de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
- December de 2021 ● Oficinas sobre Educação Patrimonial
- December de 2021 ● Conclusão do calendário 2021 de apoio as manifestações culturais
- December de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário esportivo 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Entrega à comunidade de 195 exemplares de publicação realizada pelo programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística da Fundação Renova sobre a centenária Folia de Reis de Paracatu de Baixo.

Devido às restrições impostas pela pandemia, como forma de apoiar as manifestações culturais típicas da região entre Mariana e o Alto Rio Doce, a Fundação Renova por meio do PG 12 está apoiando a produção dos tradicionais "santinhos", cartões impressos que trazem hinos e orações desses festejos, no mês de julho foram distribuídos para a Festa de Nossa Senhora do Carmo – Matadouro (Rio Doce) e Festa de São Bento – Bento Rodrigues (Mariana).

Reunião realizada entre a equipe do programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística da Fundação Renova, parceria da UNESCO e comunidade de Mariana (sede e zona rural), no dia 22/07/2021, para apresentação e validação do Diagnóstico de Referências Culturais e a proposta de Plano de Reparação.

As atividades de restauro estão em andamento, contando com 09 peças com restauração concluída e 06 projetos de restauro protocolados no IEPHA, quantitativo do mês de julho, atualizados até o dia 31/07.

Apresentação sobre a Reserva Técnica, dia 29 de julho, às 19h, via Resulta - Fórum de Prestação de Contas para as comunidades de Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Indicadores




Gráfico 1 - Percentual de restituição de bens materiais culturais. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.




Gráfico 2 - Percentual de bens culturais reparados. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

* Indicadores atualizados conforme revisão do documento Definição do Programa efetuada em nov/20 aguardando aprovação da CTECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades






Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Planejado

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Reprogramado
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- July de 2021  Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- December de 2021  Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidade
- December de 2021  Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
- December de 2021  Conclusão do Fortalecimento das Organizações Locais
- December de 2021  Conclusão Fortalecimento Institucional para Esporte, Cultura

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização de Webinar de apresentação dos resultados dos diagnósticos de impactos no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer – etapa de sensibilização.

Incentivo à Leitura: 34 Termos de Adesão ao projeto assinados pelas prefeituras.

Formalização da entrega da Praça Gomes Freire em Mariana/MG.

Editais Doce: 34 contratos assinados com os proponentes em julho.

Definição dos projetos estruturantes e da estrutura de governança dos Arranjos Produtivos Locais de Turismo de Mariana e Marliéria/MG.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Descumprimento
Deliberação	416	4	Descumprimento
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Descumprimento
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	73	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 1º Repasse financeiro para contratação de RH
março de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – Final do processo Seletivo
junho de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – Final do processo seletivo
junho de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
junho de 2021	●	Execução do programa de capacitações para profissionais do SUS
agosto de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
agosto de 2021	●	Retomada dos estudos de ARSH
setembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para assistência farmacêutica
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para consultas e exames especializados
novembro de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
novembro de 2021	●	Publicação do edital FAPES/FAPEMIG
dezembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa*

- 32 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (16 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Para a entrega das EPIs de acordo com o disposto na ACP, foram entregues repelentes, protetores solares, botinas, chapéus e perneiras para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Barra Longa vem recebendo apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior. Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa com os respectivos cartões-combustível.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos médicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Quanto ao atendimento em saúde mental, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Os veículos disponibilizados pela Fundação Renova têm sido utilizados para a transporte de pacientes, atendimento no transporte da Estratégia da Saúde da Família, transporte da equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializados, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão o município de Mariana vem recebendo apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologado pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 16 profissionais de saúde atuando no fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após a contratação dos profissionais aprovado no processo seletivo homologado em julho e após a realização de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, na qual são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (16 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de julho/21):

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Enfermeiro – 2 (40h/semana) – Atuação: 1 ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no CAPSAD;

Psicólogo – 9 (30h/semana) – Atuação: 5 no CAPS, 1 no CAPSAD, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Concluído Internamente
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



setembro de 2021	●	Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
setembro de 2021	●	Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica no ES
outubro de 2021	●	Início da execução do projeto de pesquisa para desenvolvimento e registro de herbicida orgânico
novembro de 2021	●	Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica em MG
novembro de 2021	●	Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural
dezembro de 2021	●	Início do Projeto Empreende Rio Doce

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores



Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

Nota: Correção da informação apresentada no relatório anterior “P15-RMS-006-00-CIF 30.06.21” alterando N° de Projetos de Pesquisa entregues de 03 para 04 se adequando a realidade do programa.




Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianual.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Judicializado
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
setembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
outubro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
novembro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce
novembro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral
dezembro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce
dezembro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce
dezembro de 2021	●	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce
dezembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (160 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA no ES (145 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 179 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 07/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 122 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar;
- Aplicados 1943 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro, de forma remota com pescadores e aquicultores do Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro;
- 331 entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as) /aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aquicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar', 'Associativismo e Cooperativismo' e de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas.	100%	Dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER.	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água


Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado

Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- 
- outubro de 2021 ● Cursos de capacitação da EMATER concluídos
 - dezembro de 2021 ● Entrega do relatório final do contrato 4800019735 UFV-SIF - Pró-ATER

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, tem-se 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao PASEA. Dos 202, 190 são PASEA planejados sendo que 186 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 16 refere-se a estudo de caso de elegibilidade ao programa, pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 148 propriedades aderiram à implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 31 não aderiram e 7 estão em análise pelo produtor;
- 51.754,5 toneladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 466,5 toneladas no mês;
- 8.379,3 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades no território de Mariana e Alto Rio Doce;
- 425 barraginhas realizadas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 877 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;
- 187 nascentes cercadas 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.772 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 3.805 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 5.736 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 31.025 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 1.919 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 3.120 toneladas de silagem, via pagamento, para produtores impactados, sendo 206 toneladas no mês.

Parcerias

- 37 Cursos de capacitação realizados pela EMATER nos territórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce;
- 17 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 1 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) junto à empresa Biokratos.

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Alto Rio Doce

Realização de cursos on-line pela EMATER de capacitação técnica para agentes de ATER das instituições que trabalham no Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias.

Indicadores

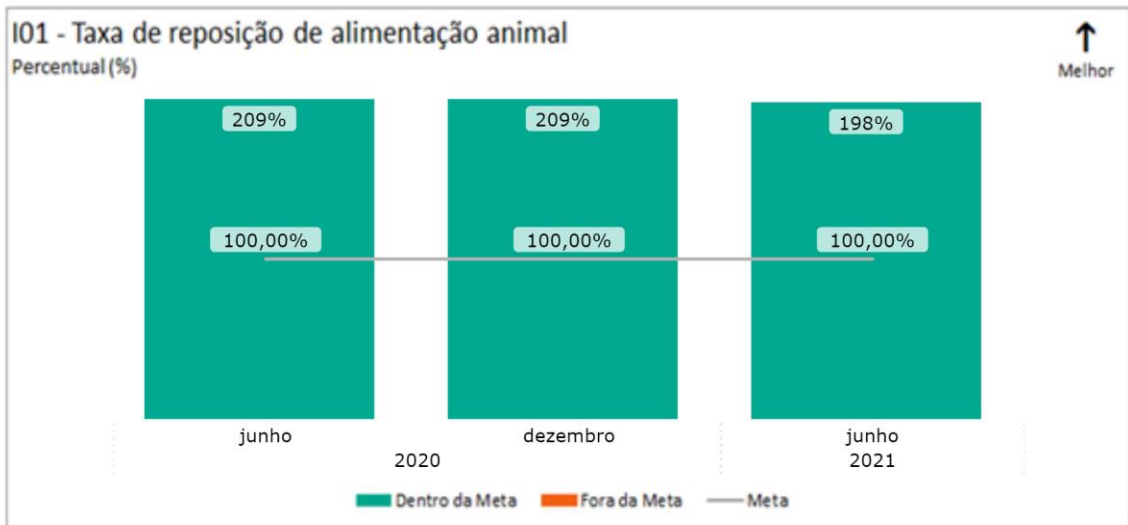


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de produtores com ISA maior ou igual a } 0,7 / \text{n}^\circ \text{ de produtores participantes do Programa}$	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de áreas produtivas reparadas e ou adequadas} / \text{Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação}$	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades




Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Planejado
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Em Andamento
Deliberação	503	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- January de 2021  Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
- June de 2021  Encerramento do Fundo Compete MG
- December de 2021  Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 56.90 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 46 milhões foram **desembolsados** para 1421 contratos e 1112 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 417 contratos e 400 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Fatos relevantes do mês

Entrega das respostas da Nota Técnica CTEI sobre o Documento de Definição do PG018
Atualização dos valores do Distrito Empresarial pela Prefeitura Municipal de Mariana
Realização do kick-off do Projeto Cadeia Produtiva da Meliponicultura no Espírito Santo
Entrega de equipamentos para beneficiamento de café e pimenta do reino no Projeto Agroecológico nos assentamentos do Espírito Santo

Indicadores

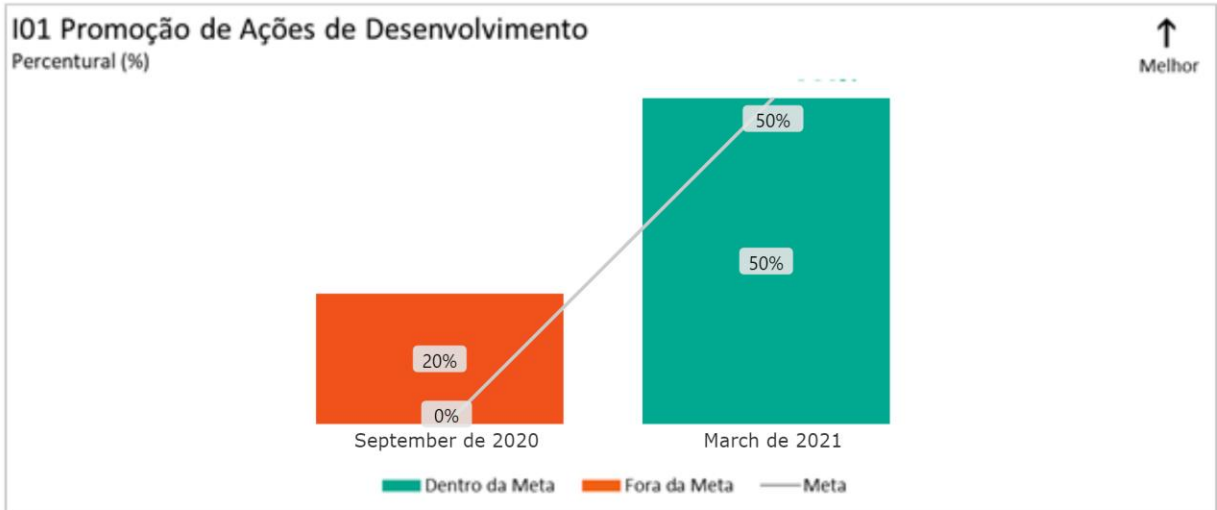


Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.

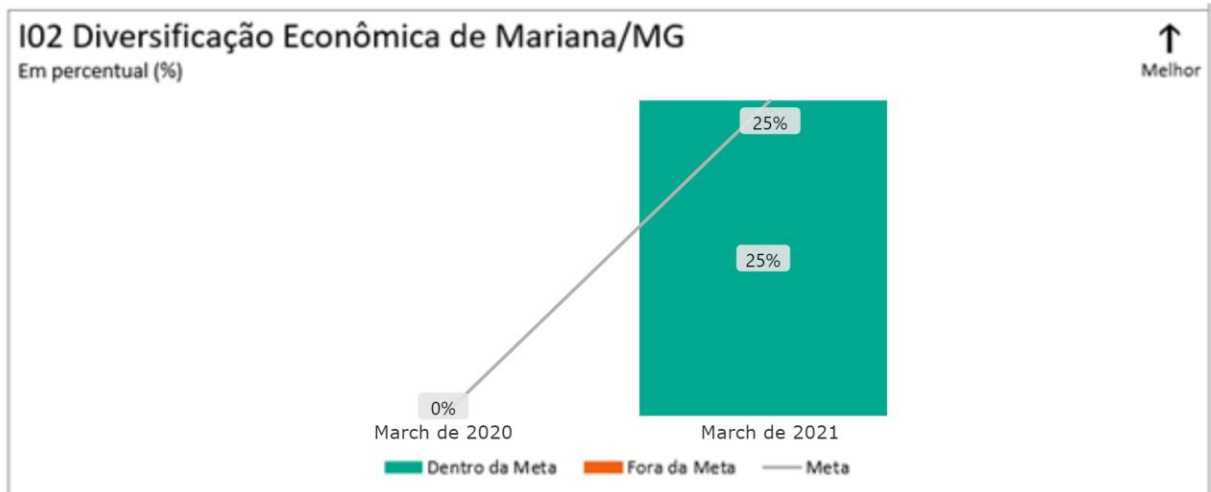


Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
<p>Acordo de cooperação firmado com BDMG, BANDES, INDI, Prefeitura de Mariana, SEBRAE MG/ES.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111</p>	<p>PG018.001: Não foram disponibilizadas pela Fundação Renova, evidências para demonstrar o acordo de cooperação firmado junto ao SEBRAE-ES.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019, foi reportado "Acordo de cooperação firmado com BDMG, BANDES, INDI, Prefeitura de Mariana, SEBRAE MG/ES", porém o correto é "Acordo de cooperação firmado com BDMG, BANDES, INDI, Prefeitura de Mariana, SEBRAE MG".</p>
<p>Emissão do Plano de Atração de Investimentos de Mariana.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111; Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de setembro de 2019, páginas 212 e 214; Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241.</p>	<p>PG018.002: A EY verificou que até a data de emissão dos relatórios a Fundação Renova não possuía evidências da conclusão do estudo do ambiente de negócios em Mariana e a entrega do índice de desenvolvimento municipal e pesquisa qualitativa relativa ao plano de atração de investimentos de Mariana, já que os mesmos ocorreram em data posterior ao que foi divulgado pela Fundação Renova no Relatório CIF de abril de 2019 e no Relatório Mensal de Atividades de Setembro de 2019.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019, foi reportado "Entrega do índice de desenvolvimento municipal e pesquisa qualitativa relativos ao plano de atração de investimentos de Mariana", porém o correto é que a formalização da entrega aconteceu em janeiro de 2020.</p>
<p>Projeto de georreferenciamento e Plano Diretor de Mariana.</p> <p>Fonte: Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de abril de 2019, página 174. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio de 2019, página 203. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de junho de 2019, página 201. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto de 2019, páginas 204 e 207.</p>	<p>PG018.003: Não foram disponibilizadas, pela Fundação Renova, evidências para corroborar a aprovação do plano de trabalho do Projeto de Georreferenciamento e do Plano Diretor de Mariana conforme ação reportada.</p>	<p>No Relatório CIF de abril de 2019 foi reportado "Entrega e aprovação do plano de trabalho do projeto de georreferenciamento e revisão do plano diretor do município de Mariana", porém o correto é "Entrega do plano de trabalho do projeto de georreferenciamento e revisão do plano diretor do município de Mariana".</p>
<p>Projeto de georreferenciamento e Plano Diretor de Mariana.</p> <p>Fonte: Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de abril de 2019, página 174. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio de 2019, página 203. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de junho de 2019, página 201. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto de 2019, páginas 204 e 207.</p>	<p>PG018.004: A EY identificou inconsistência nas informações apresentadas no relatório Mensal de Atividades de Maio de 2019 no qual divulgou que a referida ação foi concluída até abril de 2019, porém as evidências que demonstram a sua realização são datadas de junho de 2019.</p>	<p>No Relatório Mensal de Atividades do mês de maio de 2019, foi reportado "Concluída as etapas de análise das legislações e normas do município de Mariana, estruturação do núcleo de comunicação, registro fotográfico dos imóveis, levantamento de infraestrutura de TI do município e apresentação do projeto à Câmara dos Vereadores" em abril de 2019, porém o correto é que sua formalização aconteceu em junho de 2019.</p>
<p>Projeto Mariana Presente e Futuro.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111. Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de novembro de 2019, páginas 237, 240 e 241.</p>	<p>PG018.005: A EY identificou inconsistência nas informações apresentadas no Relatório CIF de abril de 2019 e no Relatório Mensal de Atividades referente a novembro de 2019, que contemplou na seção destinada às atividades concluídas pelo PG18, ações nas quais a Fundação Renova não possui evidências documentais e nas quais não havia referência de execução por outra instituição.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019 e no Relatório Mensal de Atividades referente a novembro de 2019, foi reportado " Conclusão do desenho dos projetos, suporte ao lançamento público e construção do grupo de governança do programa Mariana Presente e Futuro"; e "O projeto deve ser encerrado. O Presidente do Comitê Gestor enviou e-mail formalizando sua demissão e recomendando o encerramento do projeto", porém o correto é que essas ações sejam desconsideradas por não serem de responsabilidade da Fundação Renova.</p>
<p>Estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor.</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 111</p>	<p>PG018.006: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a conclusão do estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor até abril de 2019, data do reporte desta ação.</p>	<p>No Relatório CIF do mês de abril de 2019 foi reportada a entrega "Estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor", porém o correto é "Início do estudo de viabilidade técnica e arquitetônica para implantação da Casa do Empreendedor".</p>
<p>Conclusão do projeto com ARTE/ES para retomada de atividade produtiva do Grupo de Costura e artesanato em Regência.</p> <p>Fonte: Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de agosto de 2019, páginas 204 e 207.</p>	<p>PG018.007: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes para corroborar a conclusão do projeto ARTE-ES conforme divulgado no Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 2019.</p>	<p>No Relatório Mensal de Atividades de Agosto de 2019 foi reportado "Conclusão do projeto com ARTE/ES para retomada de atividade produtiva do Grupo de Costura e artesanato em Regência.", porém o correto é que a formalização do encerramento da parceria aconteceu em agosto de 2020.</p>

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- setembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- novembro de 2021 Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.

Concluído
 Planejado
 Reprogramado

Grandes números do programa

321 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 265 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 15 a quantidade de **aluguéis**, 172 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 1 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (453) ultrapassa a quantidade total de atendidos (321). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Dados referentes ao mês de junho/21.

Fatos relevantes do mês

Reposição de insumos e equipamentos a 6 negócios, sendo 5 negócios no Alto Rio Doce e 1 no Reassentamento em Julho de 21.

Finalização de diagnósticos - situação atual dos negócios considerando aspectos financeiros, de mercado, jurídicos, organizacionais, de produção, entre outros e definição de estratégias de 19 negócios de Linhares (Regência e Povoação) em Julho de 2021.

Desenvolvimento de consultoria de design gráfico para criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de 6 negócios de atingidos em Julho de 2021.

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em agosto/21.

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em agosto/21.

PG020 Estímulo à Contratação Local


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Concluído Internamente
Deliberação	146	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

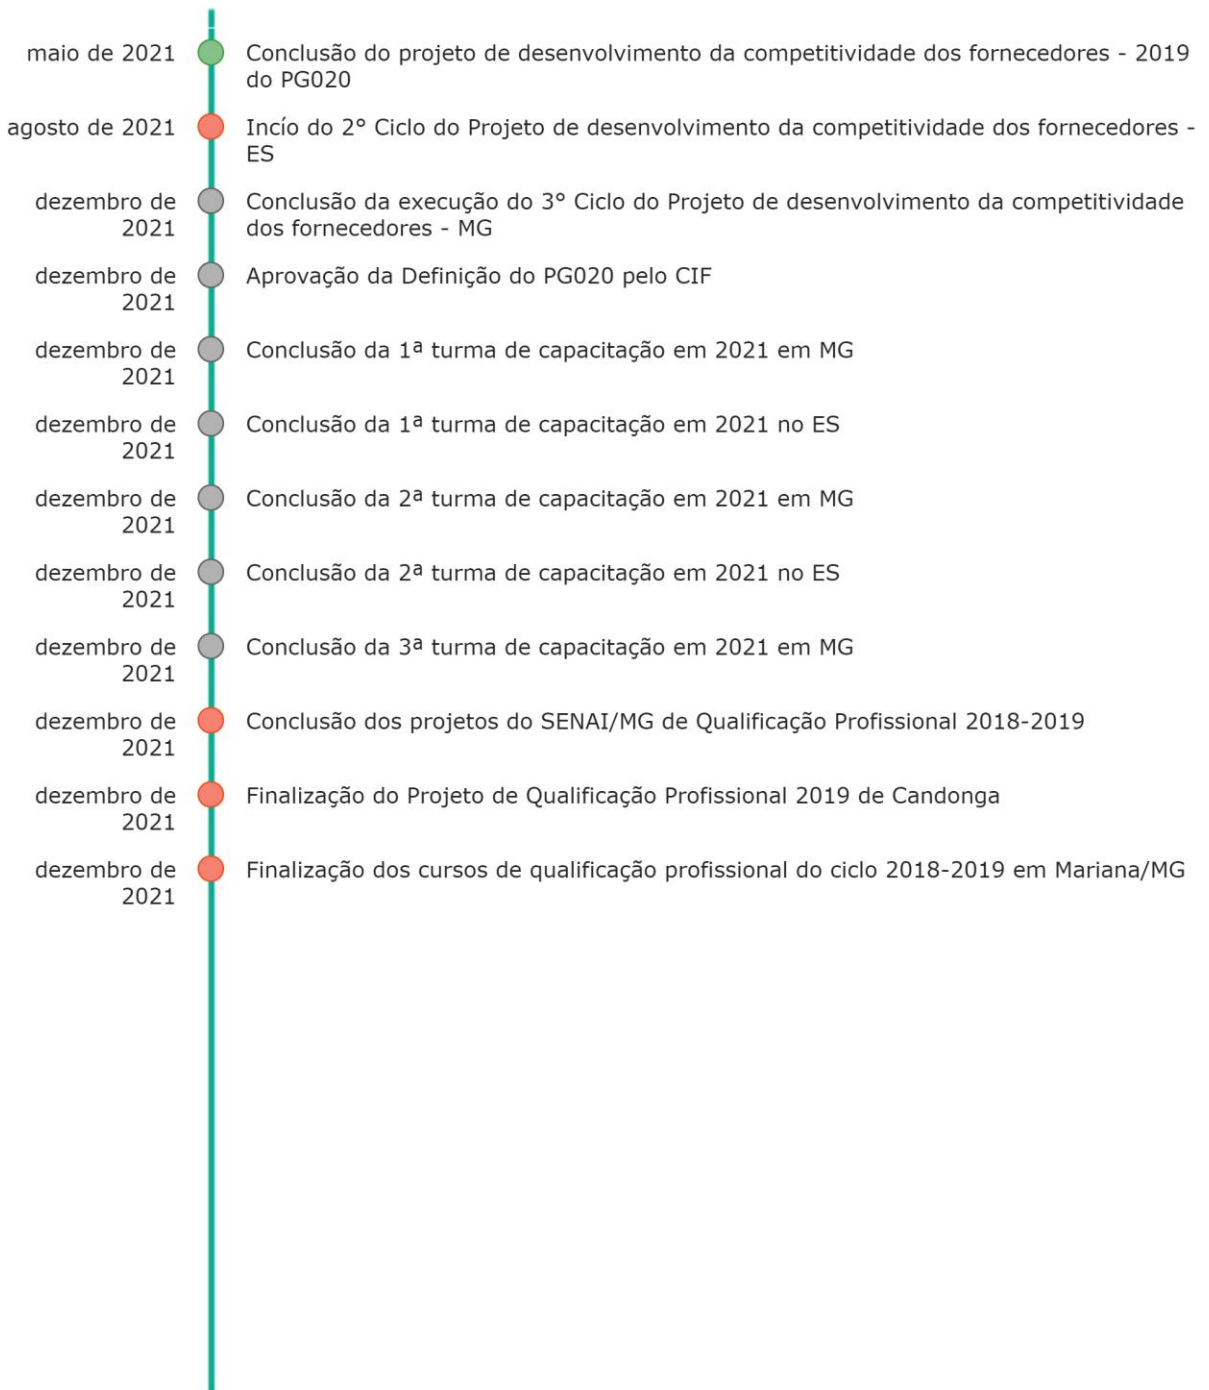

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 133 turmas ofertadas, abertura de 3.735 vagas, 10 Mil pessoas matriculadas, 3.356 concluintes, 1.507 reprovados e 3.656 evadidos.
- **R\$ 1.616.294** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realizado o curso on-line de "Noções em Segurança dos Alimentos" com 30 vagas ofertadas para toda a abrangência de atuação da Fundação Renova, 29 matriculados e 8 aprovados. A realização deste curso tem como objetivo qualificar as pessoas que já atuam na área, aprimorando seus conhecimentos, e as que desejam atuar, deixando as aptas para preencherem as vagas disponibilizadas com a retomada das atividades econômicas.

Por meio do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 209 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em julho/21, sendo 157 contratações locais e 52 não locais, 180 profissionais de Minas Gerais, 10 do Espírito Santo e 19 de outros estados da federação.

O 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova em Minas Gerais, realizou em julho/21 palestras abertas ao público, apresentando de forma sucinta os temas abordados. Também foram realizados seminários, que são direcionados exclusivamente aos participantes do programa, promovendo a interação e debates a respeito dos conteúdos tratados.

- Palestra on-line no dia 06/07/21 cujo tema foi "Gestão Financeira e Tributária", com 150 inscritos, 136 expectadores e pico de transmissão simultânea para 48 pessoas.
- Palestra on-line no dia 21/07/21 com o tema "Elaboração de Propostas Técnicas e Comerciais", com 118 inscritos, 145 expectadores e pico de transmissão simultânea para 45 pessoas.
- Quatro turmas de seminários on-line abordando o tema "Gestão Financeira e Tributária Aplicada a Precificação" de 14/07/21 a 16/07/21.
- Três turmas de seminários on-line abordando o tema "Como Entender a RT (Requisição Técnica) e Montar Propostas Técnicas e Comerciais" de 27/07/21 a 29/07/21.

O 1º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do ES, realizou no dia 15/07/2021 o evento de encerramento e rodada de negócios com as 9 empresas participantes do projeto. Participaram da rodada 4 empresas âncoras fornecedoras da Fundação Renova.

Através do projeto "Recoloca Rio Doce" que tem como objetivo realizar ações para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, foi realizado workshop on-line no dia 20/07/21 com o tema "Preparando Mulheres para o mercado de Trabalho" o evento foi para toda a área de abrangência da Fundação Renova, com 42 pessoas inscritas e, aproximadamente, 29 participantes.

Iniciado o primeiro ciclo de assistência técnica on-line com as empresas participantes do 3º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Minas Gerais. 40 empresas participam dessa etapa, sendo 20 em Mariana, 10 em Governador Valadares, 5 em Barra Longa, 3 em Rio Doce e 2 em Santa Cruz do Escalvado.

Indicadores

I01- Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor

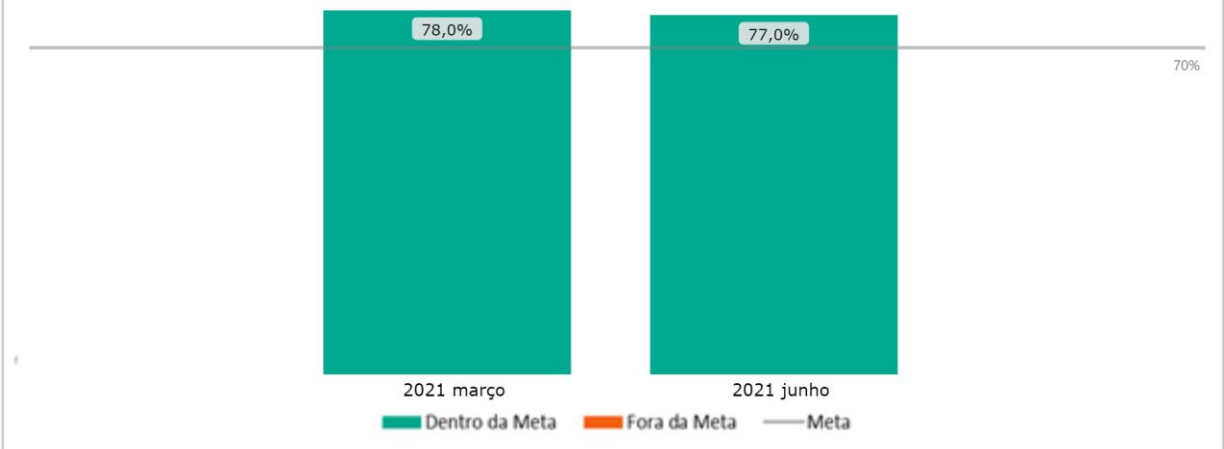


Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

I02- Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor

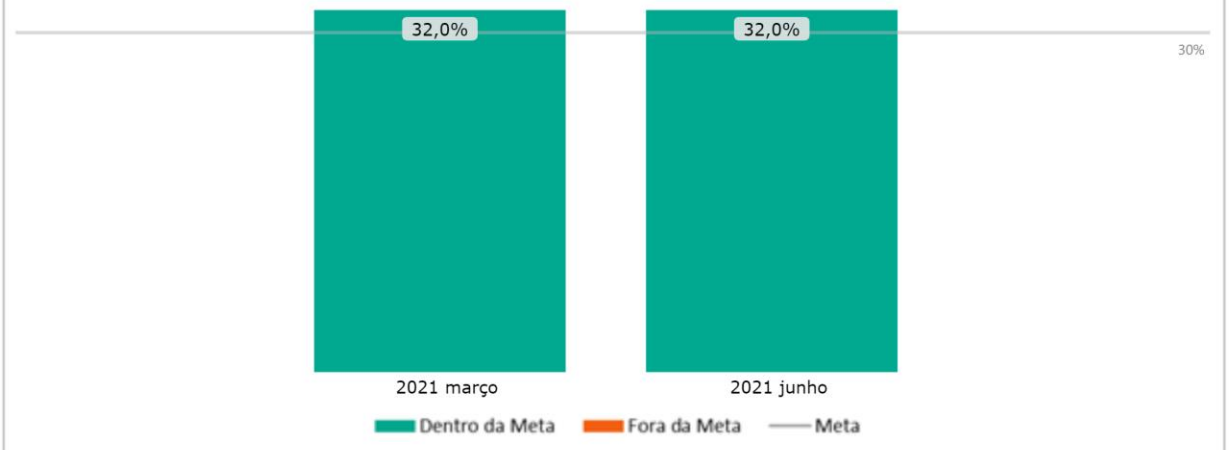


Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.

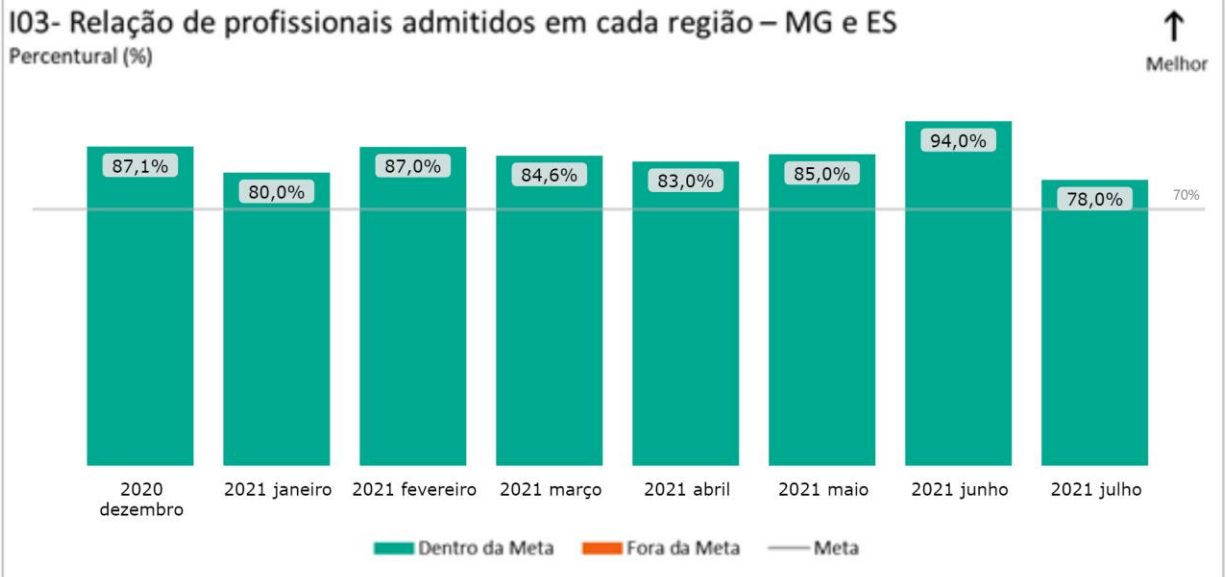


Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

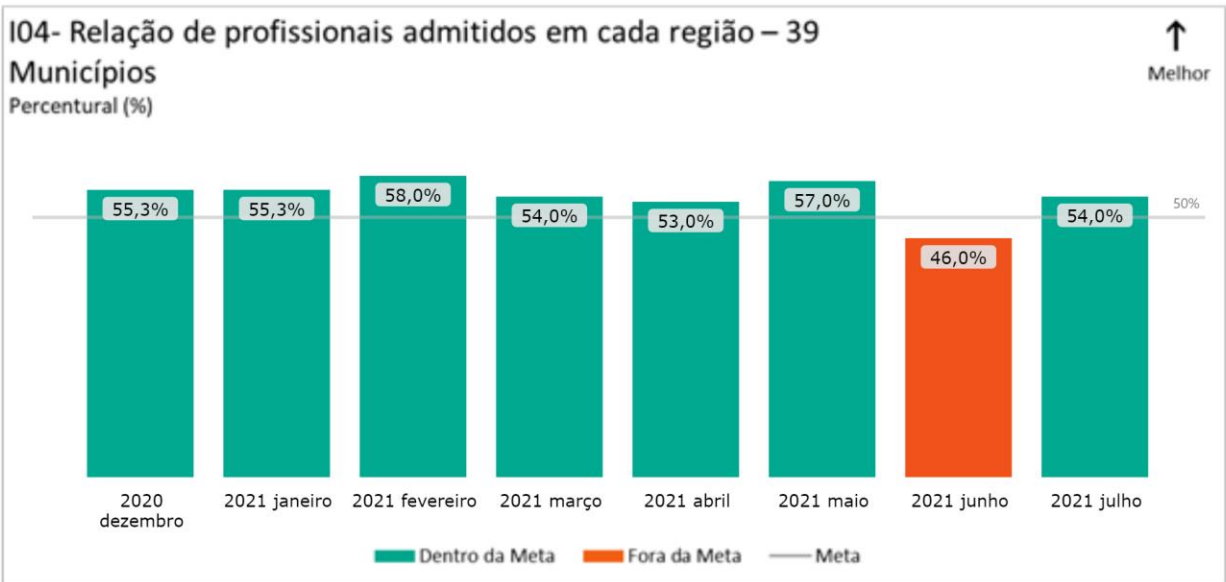


Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I05- Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional¹

Quantidades

↑
Melhor

2.000




Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

¹Nota- Em junho/21 foram considerados concluintes em cursos que não são elegíveis para o indicador I05. Após a correção o valor foi alterado de 1.823 para 1.806.

IC- Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova

Percentual (%)

↑
Melhor

50%

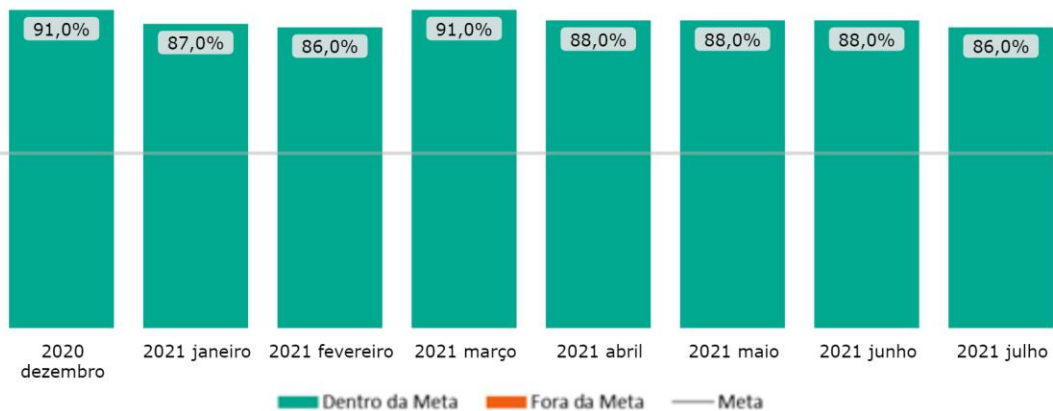


Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente

Deliberação	307	2	Judicializado
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485		Concluído Internamente

Grandes números do programa

- Atualmente há 9.125 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (19.788), são 19.788 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.628,6 Mi .

Fatos relevantes do mês

- Exclusão de 1.390 auxílios;
- Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

Indicadores

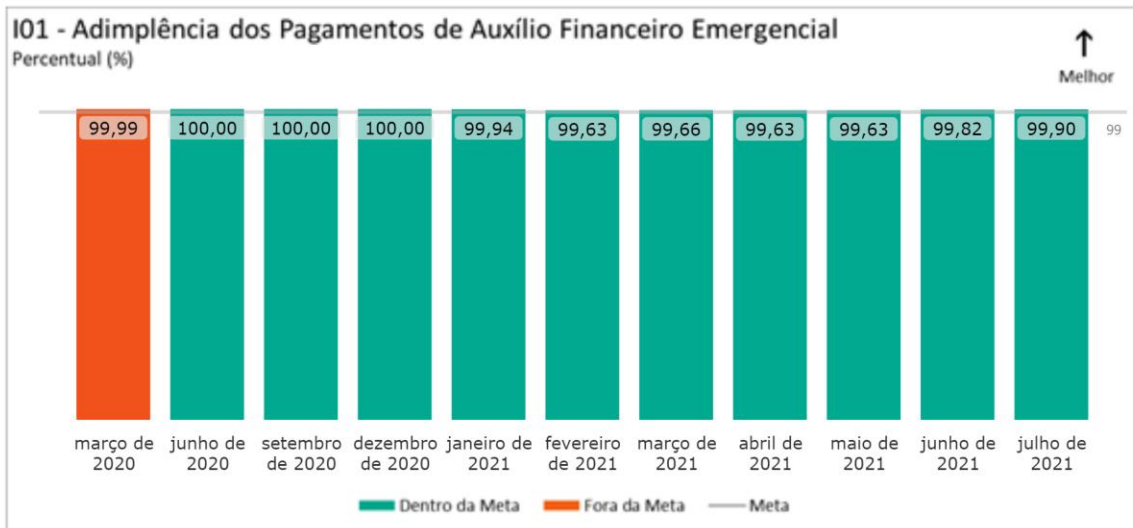


Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Pendente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Reprogramado
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	2	Concluído Internamente

Deliberação	488	4	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Em Andamento
Deliberação	497	2	Em Andamento
Deliberação	497	3	Em Andamento
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021	●	Conclusão do projeto executivo de recuperação das lagoas marginais
abril de 2021	●	Apresentação do contrato assinado com a empresa que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
abril de 2021	●	Conclusão da renaturalização piloto - intracalha dos trechos 6 e 7 - Rio Gualaxo do Norte
maio de 2021	●	Consolidação do 1º relatório anual de estudos da região deltaica no trecho 16 - Baixo Doce
junho de 2021	●	Conclusão do refinamento da mancha de inundação à jusante de Candonga
setembro de 2021	●	Mobilização da equipe que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
outubro de 2021	●	Conclusão da implantação da expansão do Projeto de Renaturalização para novos trechos
novembro de 2021	●	Protocolo relatório final ao CIF - Mancha de Inundação a Jusante de Candonga

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 02/07/21, a CT-GRSA emitiu o Ofício FEAM/CT - GRSA nº 20/2021 validando o cronograma revisado do Plano de Manejo de Rejeitos dos Trechos 13 e 14, mediante as justificativas apresentadas pela Fundação Renova e concorda que o prazo adicional irá melhorar a qualidade técnica do Plano, com informações efetivas, objetivas e suficientes para uma melhor tomada de decisão por parte da CT-GRSA.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Concluído Internamente
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- outubro de 2021 ● Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
- dezembro de 2021 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
- dezembro de 2021 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021
- dezembro de 2021 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Ponte Nova - 2021
- dezembro de 2021 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Rio Doce - 2021
- dezembro de 2021 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Santa Cruz do Escalvado- 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados – pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;

Fatos relevantes do mês

Protocolo na CT-FLOR do relatório técnico de conclusão da implantação da restauração florestal para recuperação da área ambiental 1, no âmbito da cláusula 159 (caput) do TTAC.

As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo









Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente

Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Em Andamento
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021		Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
agosto de 2021		Desenvolvimento de software para gestão e acompanhamento da produção de sementes da rede (objetivo específico 13)
setembro de 2021		Conclusão da elaboração da 1ª versão do plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
outubro de 2021		Conclusão da elaboração do 2ª versão do Plano Participativo de Coleta de Sementes (objetivo específico 5)
novembro de 2021		Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8)
novembro de 2021		Entrega dos programas computacionais para a gestão e acompanhamento dos processos de produção de sementes nas Redes de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce (objetivo específico 13)
dezembro de 2021		Conclusão do engajamento nos Assentamentos (ES) no ano 02 (2020/2021)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Inscrição de 224 propriedades rurais no Edital de mobilização para os programas de restauração;
Assinatura da Ordem de Serviço e Kick off da parceria com o IPE para elaborar um projeto executivo individual que contemple a restauração florestal e a produção rural sustentável para cerca de 140 propriedades rurais de 4 assentamentos nos municípios de Alto Rio Novo e Águia Branca/ES, através de atividades de integração e capacitação até o início do ano de 2022.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Em Andamento
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
- dezembro de 2021 ● Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do engajamento na sub-bacia de Pontões e Lagoas no ano 04 (2019/2020)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Inscrição de 224 propriedades rurais no Edital de mobilização para os programas de restauração.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado

Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	166	§1º	Reprogramado
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente












| Deliberação

79

n/a

Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021		Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 3 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2021		Protocolo do relatório final da Avaliação do estado de conservação de espécies da biota aquática do rio Doce
outubro de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
outubro de 2021		Relatório do Monitoramento da Linha Temática I - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática II - Dinâmica do Sedimento e Hidrogeomorfologia - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática III - Biota Aquática - Estrutura do Habitat - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática V - Ecotoxicidade - Ciclo 1
outubro de 2021		Relatórios do Monitoramento da Linha Temática VI - Matas ciliares - Ciclo 1
novembro de 2021		Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
novembro de 2021		Protocolo, junto à CT-Bio, do relatório consolidado do plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática
dezembro de 2021		Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização de Kick Off do Convênio com a contratada para o Monitoramento da Linha Temática IV - Processos Biogeoquímicos - Ciclo 1

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484		Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Básico do CETRAS ES
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre


Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021  Protocolar Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Em 09/07/2021 foi realizada a Reunião de Monitoria - Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos


Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

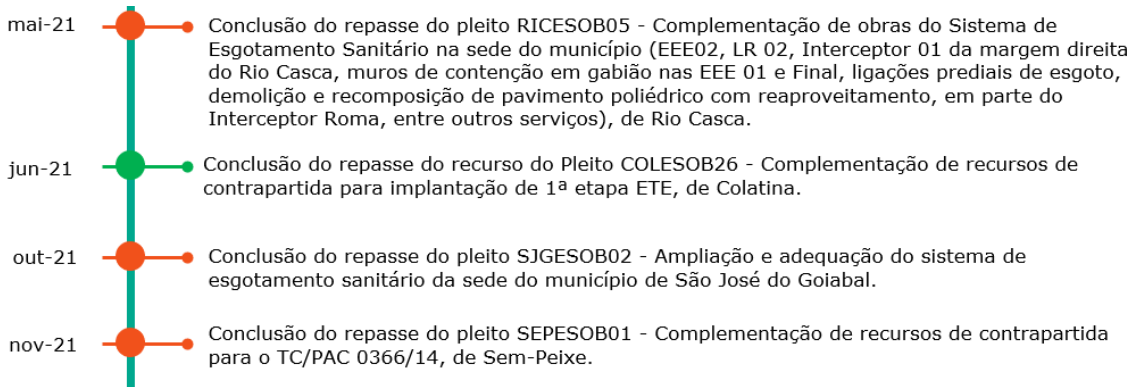

Nota 1: as entregas do ano estão em processo de revisão considerando o cronograma firmado com os municípios e consórcios na 7ª Rodada de Reuniões do Programa.

Nota 2: a conclusão do repasse do Pleito COLESOB026 estava prevista para maio de 2021, porém a finalização ocorreu no mês de junho de 2021.

Grandes números do programa

- No mês **07/2021** , **foram repassados R\$ 842.145** para ações dos municípios*;
- No mês **07/2021** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **07/2021** a equipe técnica realizou **78 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

*Repasses para ações dos municípios de Dionísio, Ipaba ,Linhares , Rio Casca, Rio Doce, São José do Goiabal e Timóteo.

Fatos relevantes do mês

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Timóteo , no valor de R\$ 2.184,00 , referente ao pleito de elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano;

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ R\$ 131.697,04 , referente ao pleito de ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce , no valor de R\$ 76.651,94 , referente ao pleito da construção de SES para o distrito de Jorge;

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce , no valor de R\$ 105.777,74 , referente ao pleito de construção de SES para o distrito de Matadouro;

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 12.985,20 , referente ao pleito de contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 241.839,01, referente ao pleito de execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel.

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$ 68.506,13 , referente ao pleito de elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

Em julho de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 202.504,14 , referente ao pleito de implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde;

Indicadores

Nota: Durante a 31ª Reunião do Comitê Interfederativo, que deliberou a aprovação da Nota Técnica CT-SHQA nº 24/2018 (Deliberação CIF nº 224/2018), a Fundação Renova se manifestou contrária ao procedimento adotado para aprovação da mesma. Foi registrado em ata desta reunião que a Fundação se manifestaria. A Fundação Renova se manifestou ao CIF/CT-SHQA por meio do ofício OFI.NII.012019.497, em 02 de janeiro de 2019 e até o momento não teve retorno deste Comitê. Além disso, em novembro de 2019, foram realizadas oficinas de revisão dos Programas com participação de representantes da Fundação Renova e CT-SHQA. O resultado dessa oficina culminou na Definição do Programa 2020, protocolada em 29 de outubro de 2020, mas que até o momento também não teve resposta da CT-SHQA/CIF. Em julho de 2021 foi emitido pela auditoria externa independente o Relatório de Acompanhamento do Programa, Ciclo 2, que apontava três itens relativos aos indicadores. Como plano de ação a Fundação Renova informou que “iria agendar reunião com a CT-SHQA para definir/formalizar quais os indicadores o Programa 31 deverá adotar, considerando que até o momento não se teve resposta sobre a Definição do Programa e manifestação protocolada pela Fundação Renova. Após o alinhamento da reunião, Fundação Renova irá detalhar os indicadores acordados e protocolar junto ao CIF.” Para dar início ao plano de ação a Fundação Renova protocolou junto ao CT-SHQA/CIF o ofício FR.2021.1064, em 08 de julho de 2021, solicitando para a próxima Reunião Extraordinária da CT-SHQA pauta para tratarmos sobre os indicadores do Programa 31. Aguardamos a manifestação da CT-SHQA para definição de como apresentar os indicadores do Programa do presente Relatório.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	4	Judicializado

Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Entregas do ano

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Grandes números do Programa

- 13 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 10 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- 15 estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes do mês

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Indicadores

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Em Andamento
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021	●	Mobilização e seleção dos participantes da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
fevereiro de 2021	●	Conclusão da 1ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES
fevereiro de 2021	●	Conclusão da 2ª turma de Formação de Formadores de Assentados da Reforma Agrária - MG
março de 2021	●	Lançamento da Plataforma Virtual do Projeto Lideranças Jovens
abril de 2021	●	Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico, definição do Marco Zero da área 4 do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
julho de 2021	●	Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores em Minas Gerais
julho de 2021	●	Conclusão da 3ª turma de Formadores em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - MG
julho de 2021	●	Conclusão da formação e integração dos participantes das áreas 1, 2, 3, 4 e 5 do 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens
outubro de 2021	●	Assinatura do Termo de Parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores e Gestores no Espírito Santo
dezembro de 2021	●	Conclusão da 2ª turma de Formadores de Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária - ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Conclusão da 3ª turma do curso de Formadores em Agroecologia para assentamentos da Reforma Agrária em Minas Gerais.

Assinatura da parceria UFMG/UFOP/Fundep para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais para Revitalização da Bacia do Rio Doce em Minas Gerais.

Indicadores



Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

ERRATA RELATÓRIO CIF ABRIL 2019

No relatório de Auditoria Externa Independente da Ernest Yang, de julho de 2021, sobre o Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, foram apontados erros de report no Relatório CIF de abril de 2019. Sendo assim, solicita-se a correção das informações, conforme segue:

ERRATA: No “Relatório CIF Abril de 2019” página 149, quadro 2:

Onde se lê:

Entregas Realizadas Durante a Elaboração do Programa			
Principais Entregas	Período	Município	Participantes
Realização de 01 encontro de Prosa e Saberes - Etapa 01 Elaboração do Programa	26 e 27/09/2017	Marilândia	70
Realização de 01 Oficina Diálogos com a Gestão Pública - Etapa 02 Elaboração do Programa	05 e 06/12/2017	Governador Valadares	102
Realização de 01 Fórum de Educação para Revitalização da bacia do rio Doce, etapa Colatina e Ipatinga - Devolutiva do Programa elaborado	17 e 18/10/2018	Colatina	104
	24 e 25/10/2018	Ipatinga	144

Leia-se:

Entregas Realizadas Durante a Elaboração do Programa			
Principais Entregas	Período	Município	Participantes
Realização de 01 encontro de Prosa e Saberes - Etapa 01 Elaboração do Programa	26 e 27/09/2017	Marilândia	64
Realização de 01 Oficina Diálogos com a Gestão Pública - Etapa 02 Elaboração do Programa	05 e 06/12/2017	Governador Valadares	80
Realização de 01 Fórum de Educação para Revitalização da bacia do rio Doce, etapa Colatina e Ipatinga - Devolutiva do Programa elaborado	17 e 18/10/2018	Colatina	104
	24 e 25/10/2018	Ipatinga	155

PG034 Preparação a Emergências Ambientais








Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
novembro de 2021		Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO DE MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/21
I03	Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Dezembro/21
I04	Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Dezembro/21

I01: O indicador será medido ao final dos ciclos de graduação e pós-graduação, previsto para o final do programa, em Junho de 2025.


I02: Em virtude do período de isolamento social, não estão ocorrendo demandas por parte da Defesa Civil em 2021.

I03: Não houve solicitações por parte da Defesa Civil para apoio a eventos em 2021. Mapeamento das áreas de risco em andamento. Planos de contingência: 9 planos elaborados, 8 previstos em 2020.


I04: De um total de 5 medidas planejadas, 3 já foram entregues até 2020.

Indicadores

I03 – Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

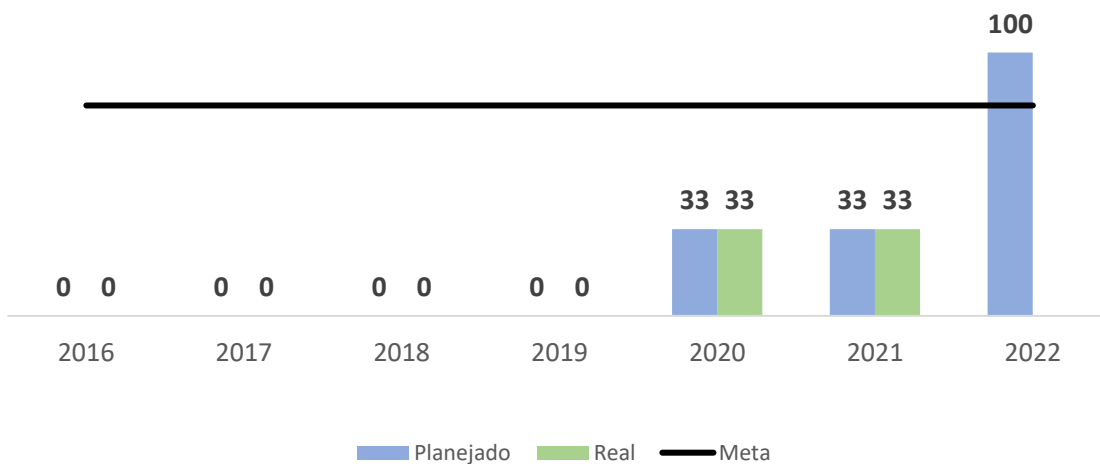

I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis

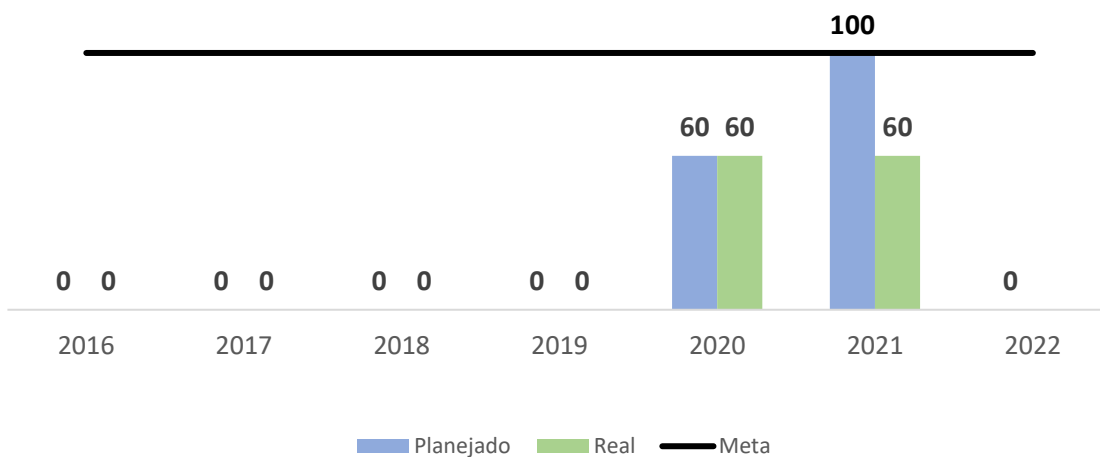

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Reprogramado
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente

Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Em Andamento
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	● Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
julho de 2021	● Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
julho de 2021	● Finalização da Implantação do Repositório Técnico
agosto de 2021	● Aprovação da Definição do Programa pelo CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

Publicação do site do repositório digital pelo PG35.

Planejamento interno para execução das atividades de itinerância e descentralização implantado pelo PG35.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa encontram-se em revisão junto à CT-PDCS, após realização de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas e equipe do programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	junho de 2021	julho de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	196.521	220.955	2.212.413	5.809.439
Documentos no site (mês)	4	5	50	416
Notícias Publicadas (mês)	12	12	76	816
Vídeos (mês)	12	7	67	513

Fatos relevantes do mês

· Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

INDICADOR	junho de 2021	julho de 2021
I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	145.158	164.117
I02 – Visualizações de páginas de serviço	62.864	65.756
I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	41.367	44.871
I05 – Alcance Orgânico Facebook	21.556	27.236
I03 – Tempo de resposta	5,07 Horas	8,75 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água




Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Reprogramado
Deliberação	310	3.2	Reprogramado
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente

Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Reprogramado
Deliberação	512	2	Reprogramado
Deliberação	512	3	Reprogramado
Deliberação	513	1	Planejado
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Nov/20
janeiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Dez/20
março de 2021		Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Colóides do período seco
março de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jan/21
março de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Colóides do período chuvoso
maio de 2021		Plano de ações do período chuvoso 2020/2021 finalizado
junho de 2021		Protocolo do Relatório Quadrimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Out/20 a Jan/21
agosto de 2021		Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Abr/21 a Jun/21

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
- dezembro de 2021 ● Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2020 à Julho 2021
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jul/21 a Set/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são 56 pontos de monitoramento, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 22 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Resposta Deliberação CIF 511 - Resumo Executivo QAQC PMQQS

Relatório do PMQACH 2015 – 2020 revisado, em cumprimento à Deliberação CIF nº 301 e as Notas Técnicas nº 52/2021 e nº 34/2020 da CT-Saúde

Protocolo da Edição 2 do Boletim da Qualidade da Água para Consumo Humano, referente aos dados de dezembro de 2020 a março de 2021

Ofício em Cumprimento do Item 3 Deliberação CIF N°458

Atendimento à Deliberação CIF nº 310 - protocolo parcial (3ª e 4ª remessa) dos laudos das análises laboratoriais das campanhas coleta Coloides

Apresentação Relatório Técnico de Descarga Líquida: Análise de Consistência e Curvas – Chave, em resposta à Nota Técnica nº56 do GTA-PMQQS

Indicadores

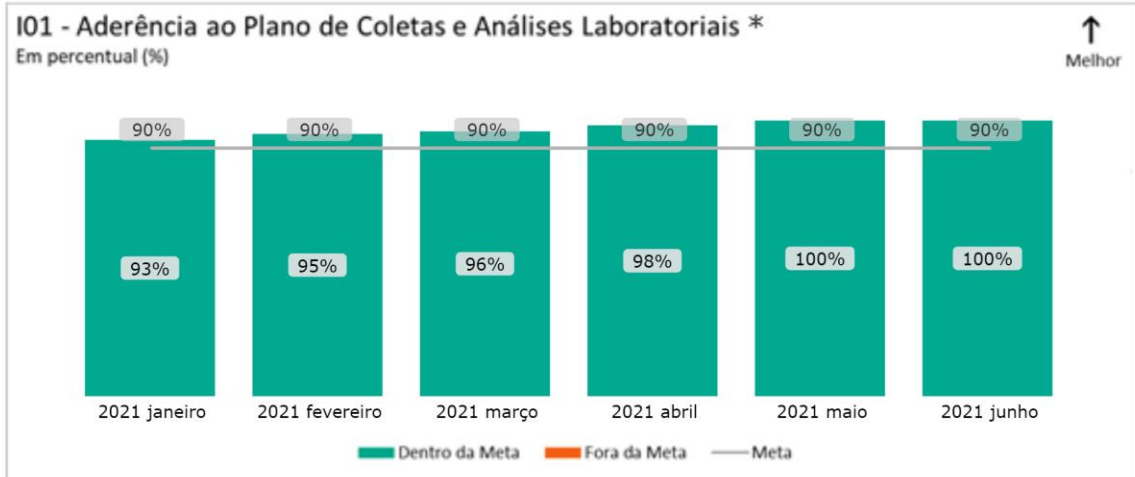


Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

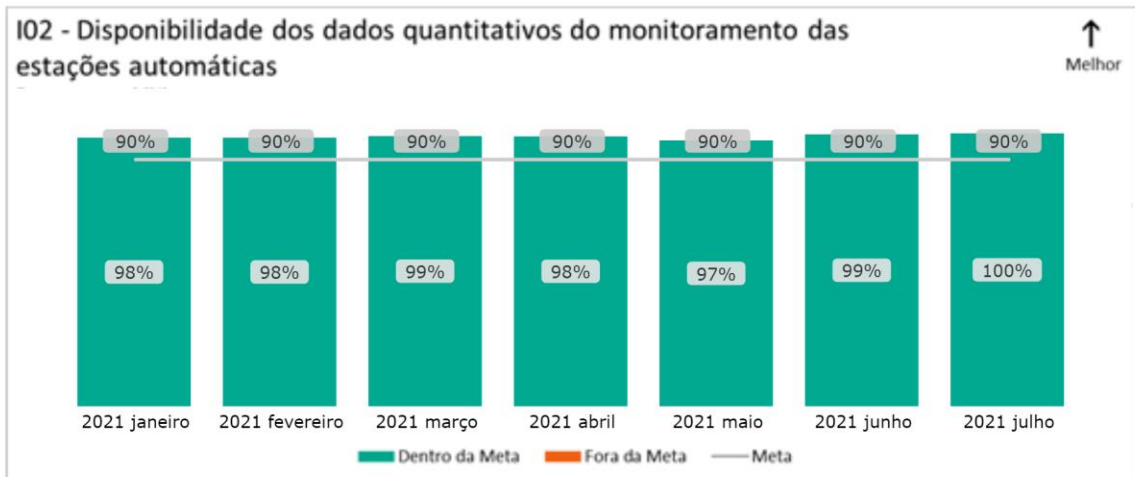


Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores

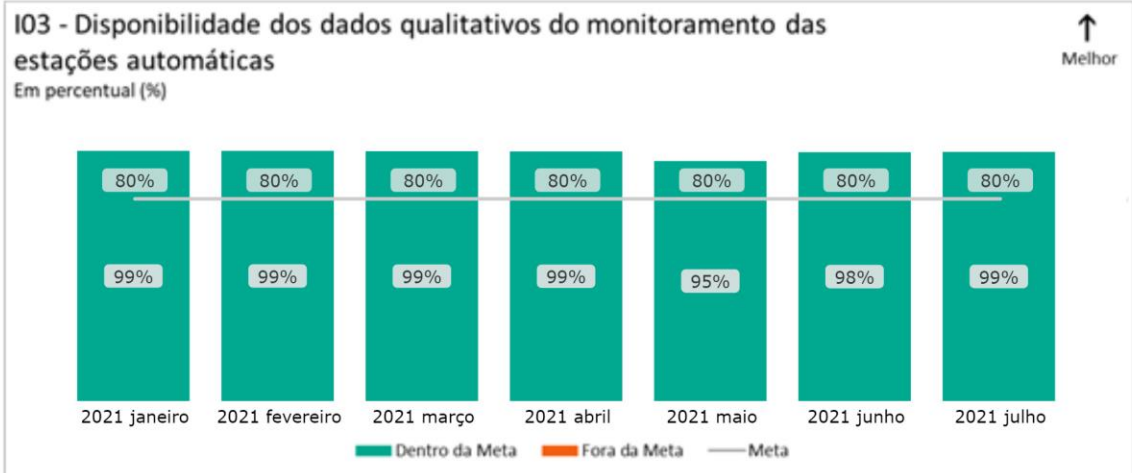


Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

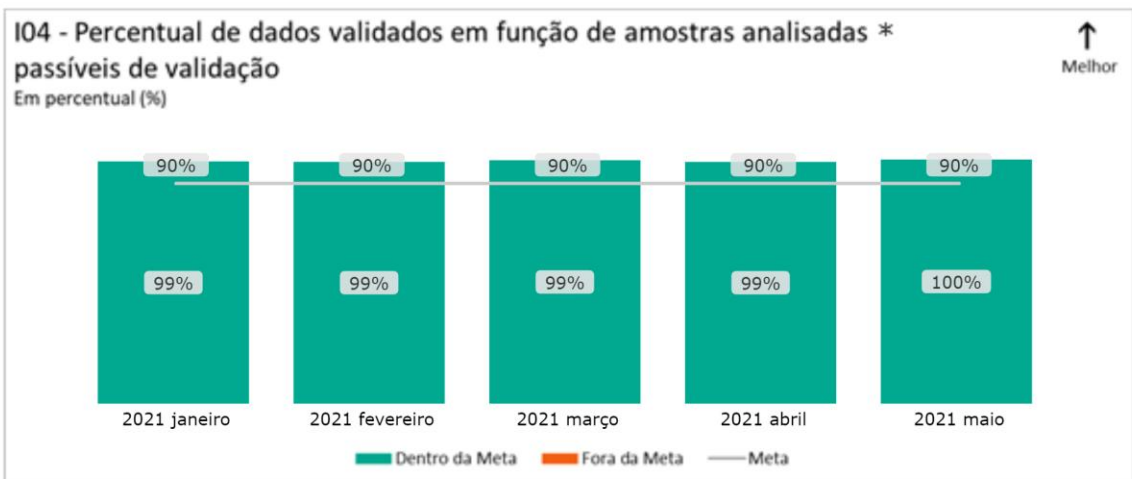


Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água


Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Reprogramado
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

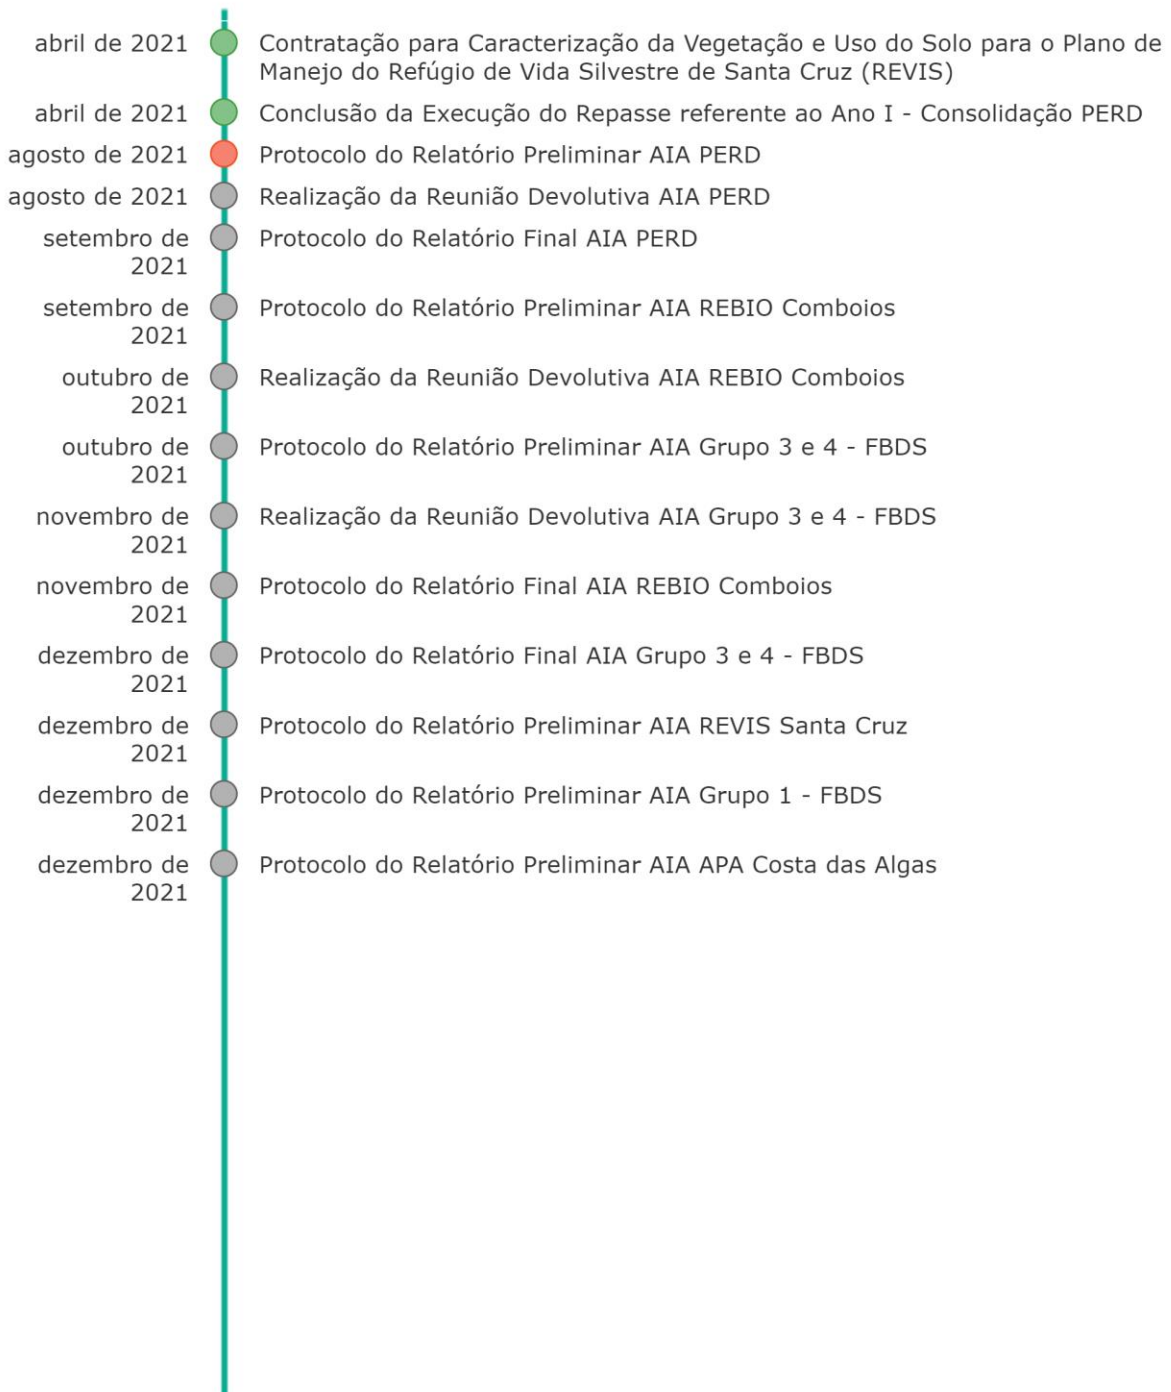

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 06/07/2021, houve a aprovação do ICMBio para o Relatório de Vistoria Virtual UCs revisado - RT ECV 188/21

Em 06/07/2021, houve a apresentação do projeto de mapeamento para a caracterização da vegetação e uso do solo nas UCs e entorno para o Conselho Consultivo Integrado do RVS de Santa Cruz e da APA

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- agosto de 2021 ● Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- agosto de 2021 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

276 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 23 (8,3%) imóveis declinaram e 242 (87,7%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 186 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

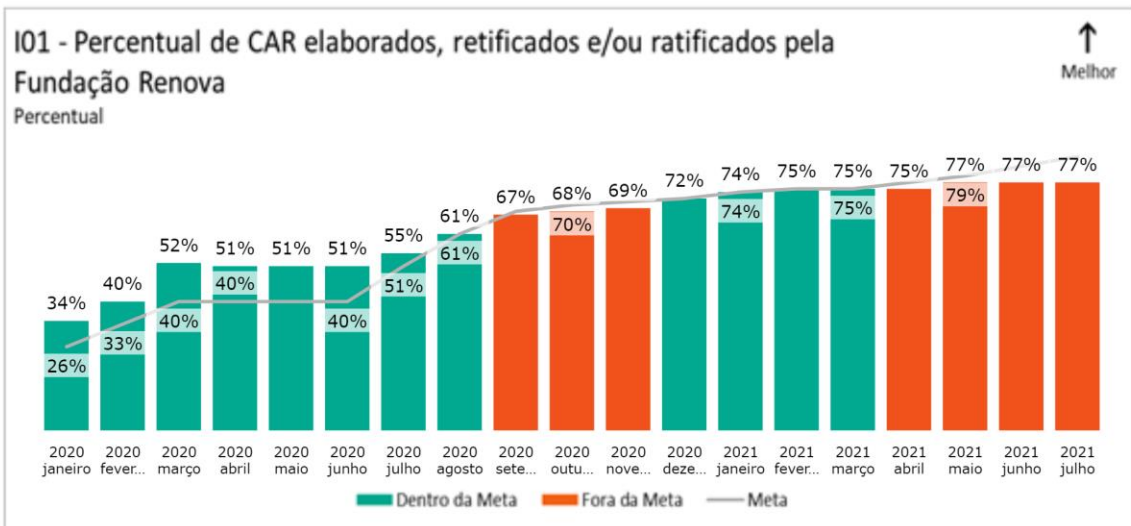


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Reprogramado
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Pendente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- agosto de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana
- outubro de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.

* A realização do ressarcimento à prefeitura de Colatina foi concluída em Janeiro/21, e o município de Mariana aguarda trâmites do processo de judicialização.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 39 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 47,7** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,0** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Realização de entrega do segundo lote, contendo 1000 coletes, totalizando 1500 unidades, referente ao ressarcimento ao órgão comprometente Ministério da Integração, em Julho de 2021.

Indicadores

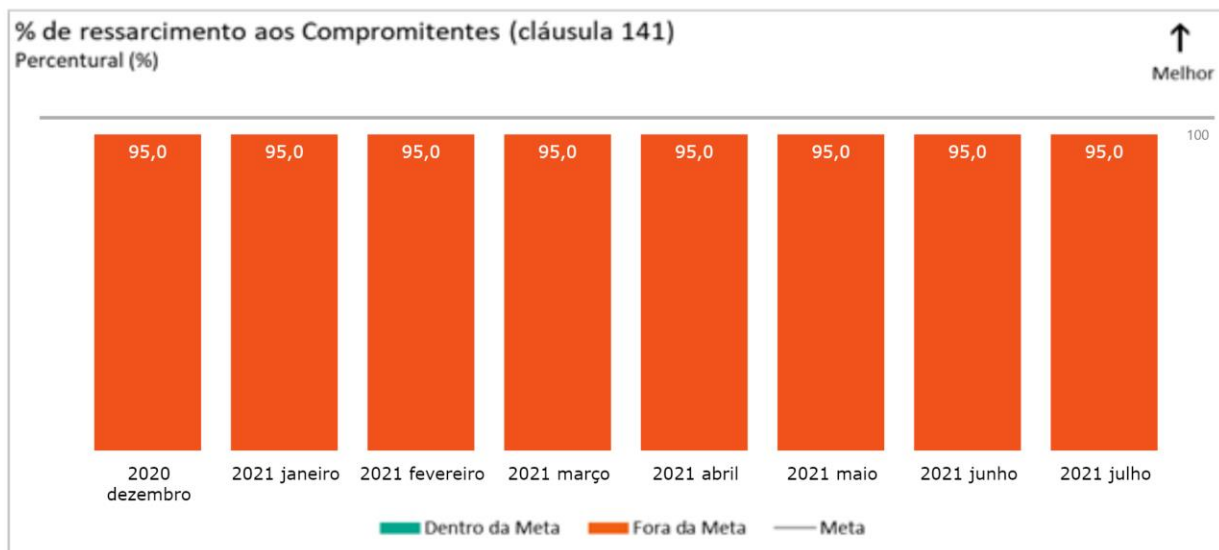


Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

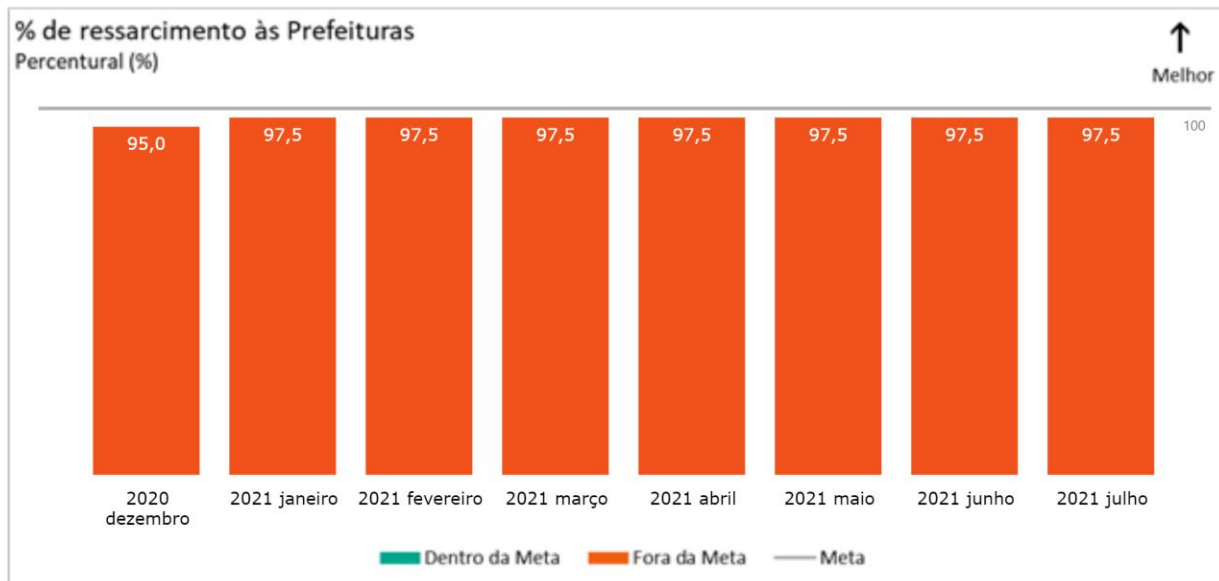


Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.

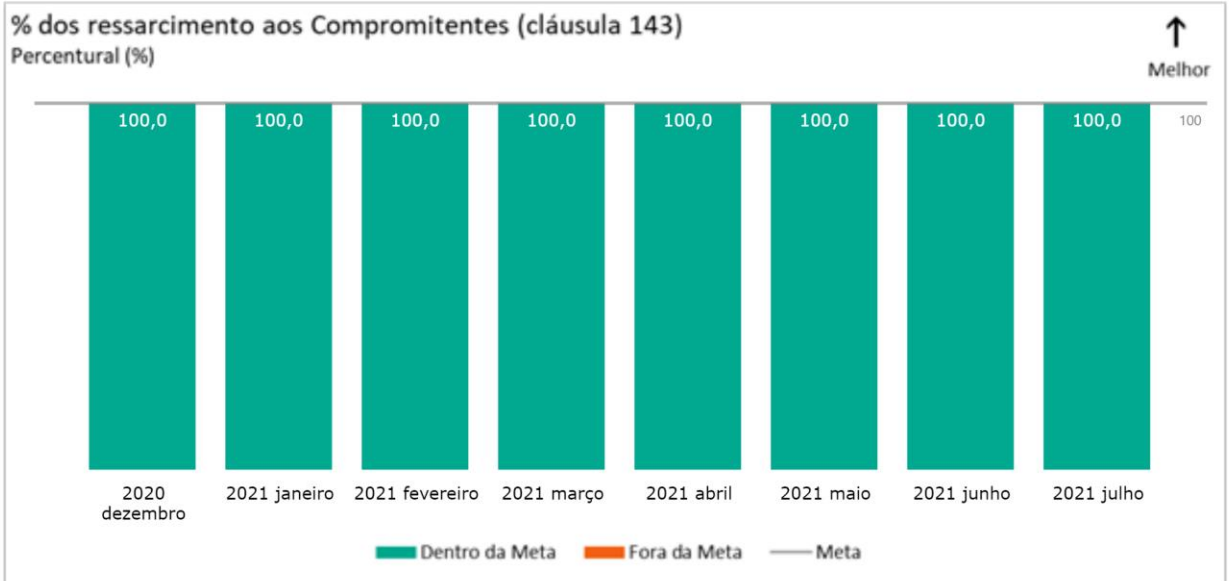


Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas até julho de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados

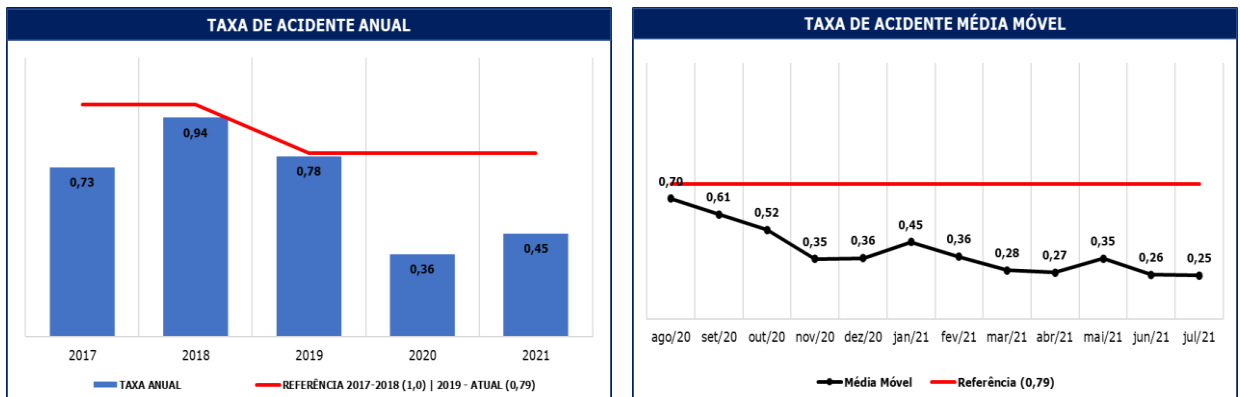

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	2,6	-	12,6	-83%	7,1	2,6	-	4,6	-64%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,5	-	4,5	-89%	3,0	0,5	-	2,5	-82%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	2,4	-	12,2	-84%	8,7	2,4	-	6,3	-72%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	0,9	-	5,9	-87%	3,3	0,9	-	2,4	-73%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	10,5	-	41,1	-80%	28,9	10,5	-	18,4	-64%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	6,0	-	14,6	-71%	10,9	6,0	-	4,8	-45%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	0,7	-	12,3	-94%	6,5	0,7	-	5,8	-89%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	12,2	-	44,3	-78%	28,9	12,2	-	16,6	-58%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	17,0	-	46,0	-73%	38,8	17,0	-	21,8	-56%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	2,9	-	15,3	-84%	10,4	2,9	-	7,5	-72%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	2,0	-	14,0	-88%	8,4	2,0	-	6,4	-76%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,2	-	6,8	-98%	4,5	0,2	-	4,3	-96%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,8	-	1,5	-65%	1,5	0,8	-	0,7	-49%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	19,4	18,2	-	1,2	-6%	3,7	18,2	-	14,5	392%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,3	-	2,3	-88%	0,9	0,3	-	0,6	-68%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	387,2	-	62,8	-14%	297,4	387,2	-	89,8	30%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	464,4	-	297,2	-39%	463,0	464,4	-	1,4	0%

PG	Programas	Mensal				Justificativas da variação anual acumulada	
		Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,3	0,6	-	0,7	-52%	- Edital Rio Doce: O projeto ficou paralisado em função da pandemia, no entanto, desde 12/2020 tem acontecido a formalização gradual para início dos projetos selecionados. - Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram apenas em 2021. - Projeto Pesquisa e Desenvolvimento do Herbicida Orgânico não foi aprovado e está cancelado. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPEs e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Previsão de execução do Empreende Rio Doce para agosto/21. - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17, pendente de aprovações, gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%).
PG15	INOVAÇÃO	0,3	0,1	-	0,2	-74%	- O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado no CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21), passou pela fase da atualização de valores por parte da Prefeitura de Mariana e seguirá para a aprovação do CC. - Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais. - Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 e impede a maior parte das atividades presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17, pendente de aprovação, é de R\$ 3,3 milhões (redução de 51%).
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,7	0,0	-	0,7	-95%	- A previsão do rateio dos custos de gerenciamento para cada programa não condiz com o realizado mensalmente; aliado a não mobilização de profissionais previstos devido a não inicialização/paralisação das atividades de campo. - Atraso no início dos plantios em função das paralisações COVID. - Atividades iniciadas ainda em escala reduzida. Postergado o prazo em função do atraso nas contratações.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,7	0,2	-	0,5	-77%	- A previsão do rateio dos custos de gerenciamento para cada programa não condiz com o realizado mensalmente; aliado a não mobilização de profissionais previstos devido a não inicialização/paralisação das atividades de campo. - Atraso no início dos plantios em função das paralisações COVID. - Despesas Diversas - Rateio contrato administrativo.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	4,3	1,8	-	2,5	-58%	- Engenharia, Construção e Gerenciamento - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Consultoria Construção CETRAS - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma. - Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,6	0,7	-	0,9	-55%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,3	0,3	-	1,0	-79%	- Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. Os custos serão reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato. - Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses. Postergação: - Construção das sedes das Defesas Cíveis e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada; - Projetos APOIO A DEFESA CIVIL, ESCOLA SEGURA, NUPDEC (Contrato H3M): Postergação e suspensão de atividades presenciais durante o período de Pandemia. Economia: Não se aplica.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	4,4	1,5	-	2,9	-65%	- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da Cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. Solicitado em julho/21 ajustes nos projetos para validação do Iphan.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	6,2	3,9	-	2,3	-37%	- CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Encontra-se em análise topográfica do terreno indicado pela prefeitura municipal de GV, denominado Pça. Getúlio Vargas. Início da revisão do Projeto Conceitual.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,6	0,7		0,1	14%	- CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/ conceitual/executivo, considerando a inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMbio. Aguarda-se retorno dos projetos em estudo pela engenharia interna da Fundação Renova quanto as mudanças solicitadas.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,5	0,4	-	1,1	-76%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concursal do fee mensal a menor. Mudança de estratégia - Pagamento da 1 parcela do Acordo de Cooperação PERD - (APRO 223/2020)
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,2	0,0	-	0,2	-83%	- Refúgio de Vidas Sivestres (RVS) - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,1	-	0,1	-39%	- Baixa demanda - Replanejamento de atividades em função da pandemia, em função da postergação do início das atividades de ATER. - Módulo de elaboração do PRA ainda não disponível para o MG e ES. - Medições de custo paralisação nas empresas de ATER rateadas com este DR. - (+R\$98MM) Realizado Agenda Integrada em julho-21, orçado em ago-21. - (+R\$9,5MM) Realizado pagamento retroativo a ago/20 da perícia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,4	0,1	-	0,3	-83%	- (-R\$17MM) Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUS). - (-R\$0,7MM) Ações socioeconomia Covid-19: ações suspensas; em reavaliação de estratégia
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,3	0,1	-	0,2	-74%	-
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	5,9	126,8		120,9	2065%	-
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	-	0%	-
Total Compensatórios		29,8	137,2		107,4	361%	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	8,3	-	16,9 -67%	23,0	8,3	-	14,7 -64%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	1.696,7	-	271,0 19%	958,6	1.696,7	-	738,2 77%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	53,9	-	73,8 -58%	74,1	53,9	-	20,2 -27%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	5,0	-	41,0 -89%	23,1	5,0	-	18,1 -78%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	3,2	-	13,4 -81%	8,8	3,2	-	5,6 -64%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	31,5	-	94,6 -75%	87,8	31,5	-	56,3 -64%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	3,6	-	3,3 -48%	4,0	3,6	-	0,5 -12%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	343,1	-	669,5 -66%	473,1	343,1	-	129,9 -27%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	83,4	-	118,9 -59%	91,9	83,4	-	8,4 -9%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	39,9	-	99,3 -71%	89,3	39,9	-	49,4 -55%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	0,6	-	7,9 -93%	4,7	0,6	-	4,1 -87%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	2,0	-	26,8 -93%	15,6	2,0	-	13,5 -87%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	1,2	-	17,2 -94%	9,1	1,2	-	8,0 -87%
PG14	SAÚDE	19,7	3,3	-	16,4 -83%	12,4	3,3	-	9,1 -73%
PG16	PESCA	53,4	3,0	-	50,3 -94%	29,6	3,0	-	26,6 -90%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	41,7	-	83,9 -67%	78,4	41,7	-	36,7 -47%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	1,3	-	4,2 -77%	2,5	1,3	-	1,3 -50%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	128,1	-	88,6 -41%	167,9	128,1	-	39,8 -24%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	57,1	-	94,9 -62%	95,7	57,1	-	38,5 -40%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	0,8	-	0,0 -2%	0,5	0,8	-	0,3 68%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	16,1	-	18,3 -53%	22,5	16,1	-	6,4 -28%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	76,0	-	7,6 11%	33,3	76,0	-	42,7 128%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	1,0	-	10,7 -92%	5,4	1,0	-	4,4 -82%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	54,6	-	122,7 -69%	110,8	54,6	-	56,2 -51%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	17,1	-	30,4 -64%	33,1	17,1	-	16,0 -48%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	3,8	0,9	-	2,9 -76%	2,6	0,9	-	1,7 -64%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	131,0	-	168,2 -56%	181,7	131,0	-	50,7 -28%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	0,2	-	3,7 -94%	3,5	0,2	-	3,2 -93%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1 -100%	287,1	-	-	287,1 -100%
Total Reparatórios		4.896,3	2.804,9	-	2.091,4 -43%	2.930,1	2.804,9	-	125,3 -4%
Total Programas		5.657,8	3.269,2	-	2.388,6 -42%	3.393,1	3.269,2	-	123,9 -4%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	67,6	-	106,9 -61%	102,0839	67,6482	-	34,4357 -34%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	2,9	-	25,5 -90%	15,9	2,9	-	13,1 -82%
Total Despesas Administrativas		202,9	70,5	-	132,4 -65%	118,0	70,5	-	47,5 -40%
Total Geral		5.860,7	3.339,8	-	2.521,0 -43%	3.511,1	3.339,8	-	171,4 -5%

PG	Programas	Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG00	MEDIDAS MITIGATORIAS EMERGENCIAS	-	-	-	0%	
PG01	CADASTRO	0,6	2,0	1,4	253%	- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vitória Mariana, que foram renegociadas para trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, tais como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2, atraso e redução do volume de laudos previstos na metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel. O orçamento atual é baseado no DRAFT 16 e considera o cenário previsto no primeiro semestre de 2020.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	152,0	257,2	105,2	69%	- Variação decorrente do grande número de municípios sentenciados e prorrogação do prazo de término para adesões em todos os municípios, gerando aceleração da curva de pagamentos no Novel. - A retomada das homologações em junho refletiu diretamente no valor realizado de indenizações neste mês, sendo que apenas em junho, mais de R\$ 200 milhões foram pagos no Novel Sistema. O ritmo de homologações de junho não se manteve em julho, devido à morosidade do juízo na conclusão das homologações. Contudo, julho apresentou o maior volume de termos aceitos da série histórica do Novel (~9k termos aceitos). - Somando os valores acumulados do programa e da contingência em 2021, a variação total é de 451,1 MM.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,8	7,2	-3,6	-33%	- As ações de revisão do programa, atividades do SAA (Tupiniquim-Guarani e Combois) em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impactos de cronograma em função da pandemia de COVID-19; - Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento; - Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Combois e Tupiniquim-Guarani) encerrado em julho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021; - As ações de monitoramento social estão em fase de reestruturação estratégica da gerência.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	12,7	0,5	-12,2	-96%	- As inclusões previstas para o AFE não foram concretizadas. A FR está em nova fase de gestão para o AFE e modalidade de pagamento; - As atividades de apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não foram iniciadas devido a mudança de escopo de execução do programa; - As ações de monitoramento social estão em fase de reestruturação estratégica da gerência; - Planejamento integradores com ação a ser contratada para início em setembro/21; - Devido ao processo de negociação com a comunidade, não foi possível cumprir com o cronograma previsto para a atividade de indenização coletiva quilombola. - Plano Mariana: insumos para oficinas não foram fornecidos devido à paralisação das atividades coletivas (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado (fornecer contato); - Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17); atraso na assinatura de acordos com alguns municípios; capacitação já realizada com metodologia online (não foi necessário custo de logística) e não realização da capacitação para os municípios de MG (em processo de negociação com MG). - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios). - Redução no número de famílias beneficiadas com ceas básicas devido terem sido contempladas via Novel. - Orçamento previsto para 2ª fase do cadastro ainda não iniciado. - Diálogos e Canais – Economia Anual /Postergação Pluriannual (R\$5,3 MM): Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social em decorrência das atividades remotas.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,3	0,4	-0,9	-69%	- Canais de Relacionamento - Economia Anual /Postergação Pluriannual (R\$5,1 MM): Permanência dos escritórios CIAS fechados. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos dos CIAs em decorrência das atividades remotas. - Comunicação - Economia (R\$3,2MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. - Ouvidoria - Economia (R\$ 0,1 MM): Contrato ainda não mobilizado. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 42,1MM): pagamentos judicializados, aguardando parecer.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	8,2	4,2	-4,0	-49%	- Atraso na apresentação da medição por parte da contratada ERG Engenharia (Contrato 4800050629). - Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadora de saúde e segurança (EBI Assessoria - Contrato 480003657) - Novas Moradias Bento (+47,5): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Custos Covid (-39,8): Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Auditora ETE/ETA Paracatu (-36,6): Revisão Escopo da Auditora - Processos em Contratação - Revisão do cronograma conforme LB previsto início atividades - ago/21; - Engenharia (-22,9): Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas a preço global. Apesar da liberação para retomada dos projetos, o impacto no lucro previsto de documentos já está consolidado, mesmo com os trabalhos em desenvolvimento. - Equipamentos Públicos Paracatu (-20,8): Postergação do início das atividades: Escola - previsão de montagem até jul/21, custos serão contabilizados até ago/21. Demais equipamentos públicos, conforme Cronograma LB fev/21 - previsão fev/2022; - Aquisição de Terras, Beneficentes, Contêineres, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-18,7): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Instalações provisórias Bento (-15,1): Revisão da curva de desembolso no ano; - Infraestrutura Bento (+13,2): Serviços para término da infraestrutura previstos no orçamento para serem concluídos em início 2021 e terminados de fato em Abril/2021. - Contêineres Bento (-13,2): Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contêineres e em processo de mobilização da segunda empresa de contêineres - Gesteira (-9,8): Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Infraestrutura, instalações provisórias Paracatu (-9,2): Medições do contrato antigo AG serão contabilizadas até ago/21; Novo Contrato de acordo com Cronograma LB fev/21 - previsão até jan/22. - Iluminação pública, Infraestrutura Sítiantes Bento e Construção do Trevo MG-129 (-8,3): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Auditora ETE/ETA Bento (-7,9): Aguardando aprovação da APRO para medição final dos serviços; - Novas Moradias Familiar (+6,1): Conclusão dos 3 bens públicos previstos para 2021. Aguardando alvarás para continuidade dos demais bens públicos. Aguardando aprovação do Draft 17 orçamentário.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,7	0,1	18%	- Gerenciamento (+5,3): parte do período de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021 - Pacote 2 Drogagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. Licença (LOC) emitida pela SUAPRR, porém o documento ainda se encontra sem efeito. - Reconstrução das casas e propriedades rurais paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Impacto da pandemia nas atividades do programa. - Transporte e Equipamentos: Não execução devido a suspensão das aulas presenciais; Previsão de retorno: setembro/21 (de forma híbrida e escalonada). - Projeto de Arte, Cultura, Sociabilidade e Prod. Saberes: Paralisação por conta do Covid-19 (contratações estão sendo adaptadas para atendimento no modelo remoto). Já o takeoff do Apoio Psicopedagógico foi finalizado e a primeira medição acontecerá em agosto/21. - Engenharia e Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. - Restauro de Igrejas: parceria para restauro em processo de contratação, aguardando APRO. - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido ao processo de judicialização. - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: paralisação temporária, com retomada parcial das atividades em função da pandemia; - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação dos órgãos competentes, impedindo o início das atividades. - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a mudança de estratégia de contratação. - Casa dos Saberes e Horta Comunitária - Atraso no início do contrato devido à pandemia, e início parcial das atividades com escopo reduzido de atividades. - Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais. - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Parque Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais. - Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: aguardando decisão judicial da 12ª vara. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: * Para a aquisição dos EPIS, por solicitação do município, a FR aguardou a conclusão do processo seletivo dos profissionais para proceder com a compra de acordo com o tamanho dos servidores. A entrega parcial dos EPIS foi realizada em julho/21 devido atraso no fornecedor. * Foi postergada a aquisição/repasse de locação imóvel e mobiliário saúde mental por solicitação judicial por parte do município. Decisão judicial atendeu ao pleito do município para realização de repasse financeiro no valor acordado na ACP. Repasse financeiro realizado em julho/21. * Curva de desembolso para veículos e combustível em desalinhamento com o planejado/executado, ajustado no DRAFT 17. * O repasse financeiro para suplementação de RH não foi dado baixa na prestação de contas, devido a falta de comprovação de alguns documentos por parte do município. *Orçamento do DR é maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: *Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. * Não foi apresentada homologação do processo judicial, portanto o 2º repasse previsto para o mês de junho (Draft 16) não foi realizado. A homologação do processo seletivo foi apresentada em julho/21 e o 2º repasse será realizado em agosto/21. * Para a realização das capacitações, o município solicitou aguardar a posse da nova gestão municipal. Houve atraso, também, em decorrência da pandemia de Covid-19. Solicitação do município de revisão do acordo judicial. Apresentação de proposta de capacitação exclusiva para Mariana em julho/21, em fase de análise pelo município. - Plano reparação demais municípios (capacitações): *Capacitação postergada em decorrência da Covid e adequada para modalidade de educação a distância. Capacitação iniciada em 29/06, aguardando medição. *Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos: a realização das ações depende dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico com definição de correlação com o rompimento. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) - aguardando decisão judicial da 12ª vara.
PG08	REASSENTAMENTO	81,1	48,2	-32,9	-41%	
PG09	UHE CANDONÓIA	16,4	17,7	1,3	8%	
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	12,8	4,5	-8,4	-65%	
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,7	0,1	-0,6	-88%	
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,6	0,3	-2,3	-88%	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,8	0,5	-1,3	-71%	
PG14	SAÚDE	1,0	0,3	-0,8	-74%	

PG	Programas	Mensal				%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição			
							Ações referente a Caminhos da Retomada: atividades não realizadas devido a revisão do orçamento (redução) , foi revisado juntamente com a estratégia dos Caminhos da Retomada no Draft 17. Eixo 1: Plano de recuperação da pesca e aquicultura - mudança na estratégia de contratação do fornecedor para elaboração do Plano e Eixo 2: ATER ES: mudança na estratégia de contratação de concorrência para parceria e tratativas com possível fornecedor; ATER MG: negociação quanto a capacitação e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras; via processo concorrencial; Mapeamento das potencialidades econômicas atraso na execução das atividades em campo, devido a pandemia de covid-19. Necessidade de aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança, estabelecidos pelo comite central. Edificação de povoação: Declínio da empresa contratada, para elaboração do projeto executivo. Apartir do mês de julho o processo segue sob responsabilidade da Infraestrutura FR; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais; Projeto Miniestação: Houve a necessidade de readequação da documentação contratual por um especialista em energia fotovoltaico. Início da elaboração da RT, QQP e PT. Geral: Oficinas Participativas: Mudança na estratégia de contratação, escopo absorvido pelo Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura
PG16	PESCA	5,1	1,0	-	4,1	-80%	
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	11,4	6,9	-	4,6	-40%	- Medições pendentes - Impacto nos contratos devido a paralisação nas obras de Barra Longa, no prazo de 27/05 a 15/06. - Os débitos da Fundação Renova em relação a contas de luz impactaram diretamente no processo de aprovação dos projetos pela CEMIG. - Postergação/adequação das atividades devido a pandemia e paralisações devido a decretos municipais. - A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrito comercial e ainda não encerrado formalmente. - Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento). - Postergação do fornecimento de silagem. - Contratação da WRI para execução de Unidades Demonstrativas ainda não aconteceu. - Segundo o Draft 16 implementado, o impacto é referente ao atraso nas contratações para os projetos do Caminhos da Retomada, devido a redefinição da estratégia das ações para marketing territorial, marketplace e também para a ação de rodada de negócios.
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,6	0,2	-	0,4	-64%	- Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novel Sistema, não previstos no orçamento.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	23,1	14,1	-	9,0	-39%	Manejo (22,8) Postergação: Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito (-7,0 MM) atrasos nas contratações da empresa responsável pela manutenção da bioengenharia, assim como as contratações para recomposição de taludes Romildo e Nazareno. Gestão das Áreas Contaminadas (-7,8 MM) em função da alteração nas premissas do trabalho por demanda das mantenedoras e proposta ainda em revisão. Gestão da Qualidade do Ar (-1,5 MM) em função de postergações de medições. Custos Gerais (-4,0 MM) serviços sob demanda que não foram necessários no período. Economia: Custos Gerais (-2,6 MM) transferência de despesas de auditoria à Samarco.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	12,2	8,7	-	3,6	-29%	Barramento Linhares (15,7) Postergação: redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor demanda do que planejado.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,0	-	0,1	-88%	- Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, sem execução de serviços no período, conforme planejado. - Previsto contrato com Gessolis que não ocorreu e orçamento será utilizado em outras demandas. - Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à pandemia e consequente adiamento do contrato atual.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,0	3,9		0,9	29%	- Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas pela contratada. - Serviços tiveram sua postergação do início das atividades devido a pandemia.
PG28	BIODIVERSIDADE	3,3	1,2	-	2,1	-64%	- Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial. - Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,2	0,4	-	0,8	-65%	- Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre e Gerenciamento do PG30 - Paralisação das atividades em virtude da Pandemia
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,7	8,5	-	7,2	-46%	- Execução do plano de ação - Readequação do Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Grupo Especialistas e Conscientização Socioambiental- Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto - Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos COVID, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	0%	Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com mobilização e poucos laudos pendente de medição. Contrato Spot (ALS) com demandas não realizadas durante o período de take-off/transição 48 para 49. Parceira UNESCO com desembolso semestral. Estudo coloides (ALS/SRK) com laudos da UVF em atraso e relatórios técnicos ainda não executados. Estudos/Serviços em execução mas ainda não medidos (ERG, RHAMA).
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	3,6	2,5	-	1,2	-33%	Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Parceria com FCO/UFMG/Libano cancelada pelo Professor. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão orçamentária do Draft17, sendo que do PMQACH será ajustado no Draft18.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,1	0,0	-	0,1	-79%	Avaliação de impacto unidades de conservação: Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa devido a baixa maturidade do projeto; mudança de estratégia devido a alteração do escopo
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	28,0	19,7	-	8,3	-30%	- Postergação (R\$ 45,3 MM): menor medição de serviços devido à restrição COVID; contratos EY e Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (LUCN, infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 5,4 MM): menor gasto com viagens e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,5	0,2	-	0,3	-64%	- Atraso na aquisição dos coletes para ressarimento ao Ministério da Integração, o primeiro lote foi entregue em junho. - Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	-	41,0	-100%	- Esse montante já está sendo utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		451,4	410,9	-	40,4	-9%	
Total Programas		481,2	548,2		67,0	14%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	14,53	10,06	-	4,48	-31%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	1,8	0,3	-	1,5	-83%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		16,3	10,4	-	6,0	-37%	
Total Geral		497,5	558,5		61,0	12%	
