



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Setembro/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>19</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>25</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>35</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>43</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>48</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>82</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>90</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>104</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>119</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>127</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>132</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>137</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>143</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>151</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>157</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>163</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>173</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>179</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>184</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>191</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>196</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>205</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>210</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>217</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>222</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>230</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>235</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>240</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>246</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>251</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>256</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>262</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>268</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>273</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>282</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>288</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>293</u>
Glossário	<u>300</u>
Gestão Econômica	<u>306</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em setembro de 2021, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em setembro houve o protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS referente ao período de Fevereiro a Março/21, bem como o protocolo do 3º Boletim do monitoramento da qualidade da água para consumo humano, na CT Saúde (PG038, pág. 273).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 196). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 104) a qual, até o mês de setembro, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 82), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 449 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.694 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito (PG017, pág. 163).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 210) e de Nascentes (pág. 217) — em setembro foi iniciado o contrato com a Instituição INOVESA para realização das atividades de restauração florestal em 1.833 hectares nos municípios de Mutum e Lajinha (Sub-bacia do Manhuaçu).

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até setembro/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 19). No mês de setembro, em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 688 indenizações, o que representa 97% do total das 711 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 191), atualmente existem 15.407 pessoas assistidas, com um total de 7.191 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 25) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 35). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.350 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 170 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 104 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 43) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 143) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve assinatura de acordo com o município de Baixo Guandu para implementação do Plano de Reparação em Proteção Social, objetivando o fortalecimento da rede socioassistencial, capacitação dos operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis do município, capacitação dos operadores de proteção social do município de Mariana com o tema “Trabalho dos profissionais de assistência social em situações de desastres e calamidades” e realização da 1ª reunião do Comitê de Monitoramento das ações dos Planos de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público, nos seguintes municípios: Aracruz, Colatina, Sooretama e Marilândia.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 48; PG035, pág. 262 e PG036, pág. 268), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 240), em setembro de 2021 foram repassados R\$ 2.558.322 para ações dos municípios de São Domingos do Prata, Rio Doce, Pingo D'Água, Linhares, Ipatinga, Galiléia e Dionísio.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 119), em setembro ocorreu a conclusão da montagem da cobertura do palco do Parque de Exposição. Ainda em relação ao Parque, houve o início das atividades de contenção em terra armada nas obras do acesso, bem como início das atividades da rede de esgoto referente a ETE.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 90) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de setembro:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês. Em setembro, ocorreu o início de 8 casas do novo aditivo da HTB (Ds 135-1, 135-2, 21D-1, 21D-2, 74, 190, 261 e 93B) e início de 6 casas do contrato da Cardan (IDs 61, 75, 81 210, 120A, 110).

Paracatu de Baixo — em setembro, início da pavimentação no Acesso Principal e início da construção dos (ID's 27, 74, 80 e 84).

Gesteira — em setembro, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em setembro, houve a conclusão da segunda fase da reforma do ID 351 e conclusão do ID 031.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 94.749 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Avanço no Cadastro de Mariana
conforme dados abaixo:

Total de Cadastros liberados: 1.326

Total de Pesquisas Aplicadas da
Lista de 2019 (Universo de 79): 89
pesquisas realizadas

Total de Pesquisas Aplicadas da
Lista de 2020 (Universo de 177):
111 pesquisas realizadas

Indicadores




Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado

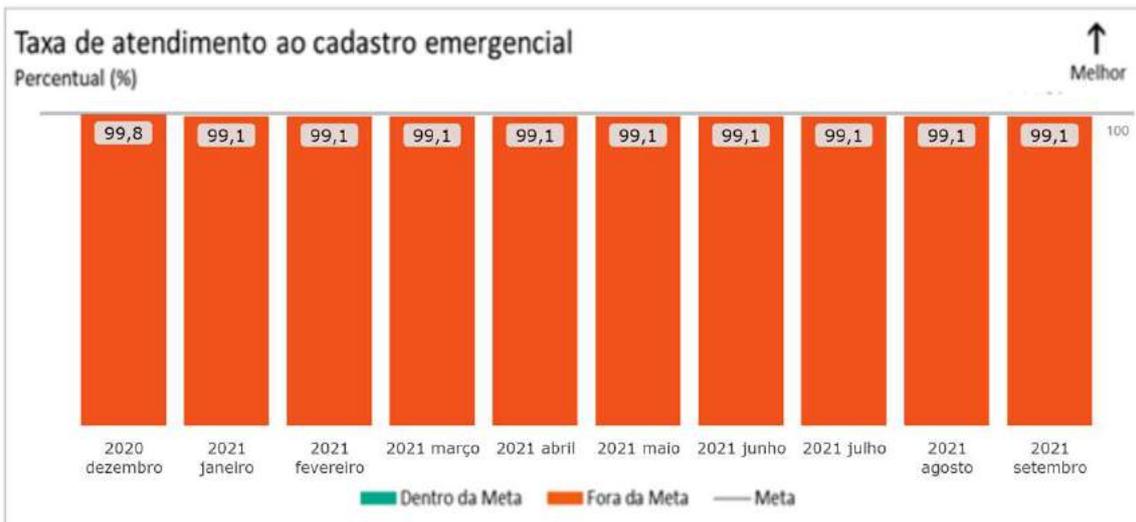


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado

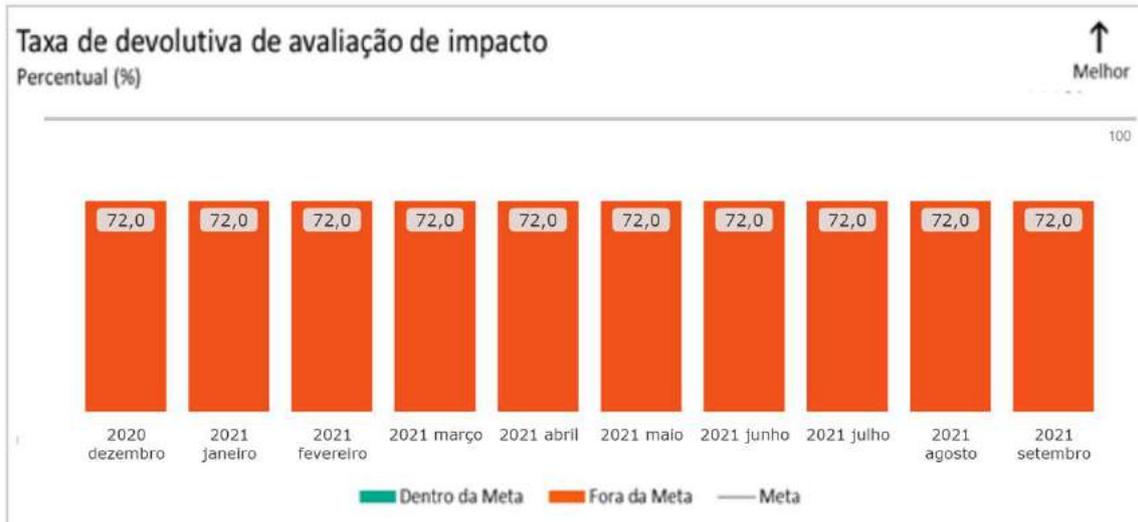


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.

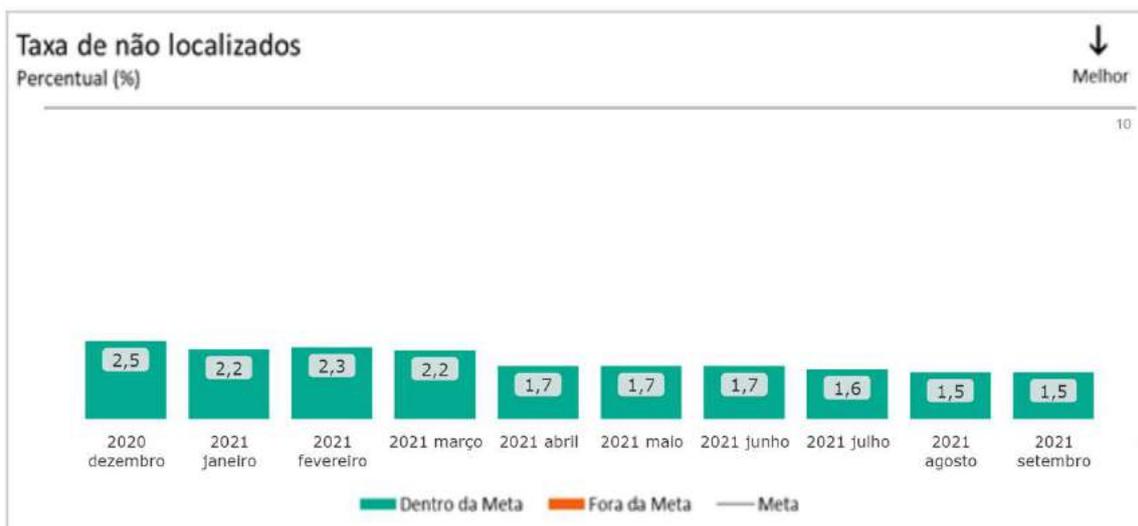


Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

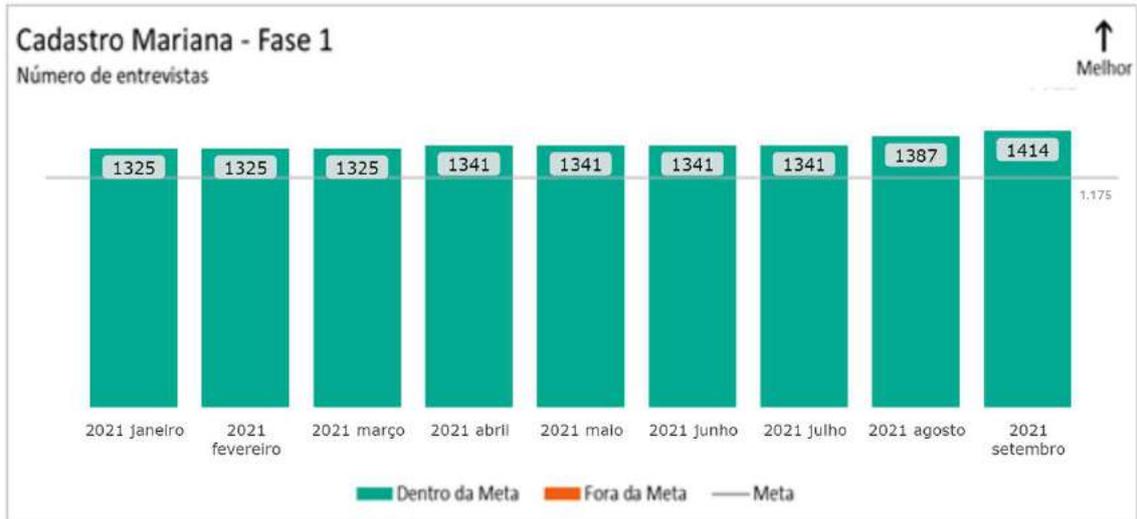


Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado

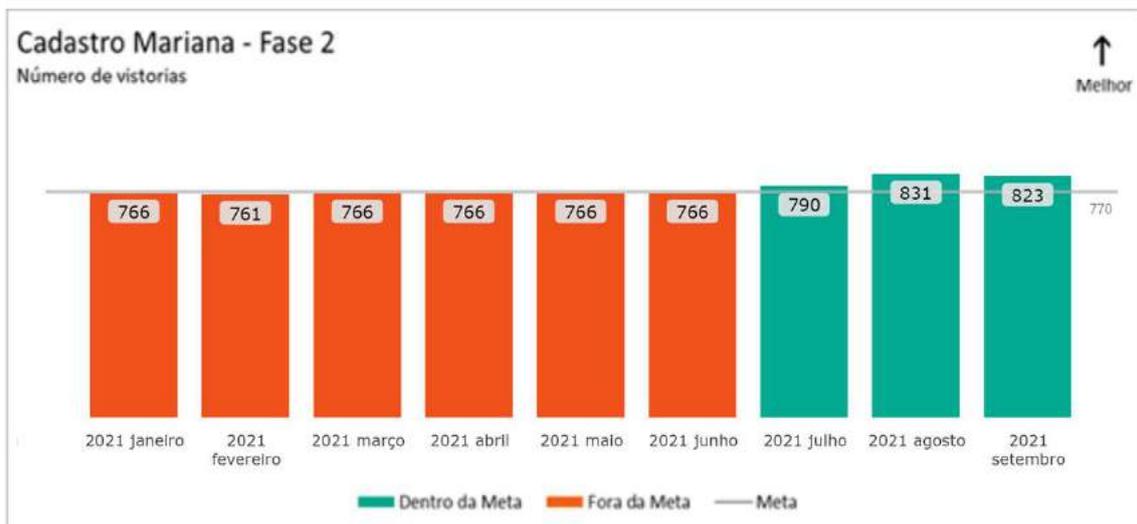


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.371 aceitaram propostas. Destas, 264.996 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 313,60 Mi**.
- **Para Danos Gerais**, 10.589 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 20.461 já foram pagos (193,2% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.207,02 Mi**.
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 688 indenizações, o que representa 97% do total das 711 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 36.426 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 688 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97% do total das 711 propostas aceitas. Foram 12 indenizações pagas no mês.

Indicadores



Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Resplendor)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Comboios)
- novembro de 2021 ● Submissão da versão final da revisão do programa à diretoria da Fundação Renova (Tupiniquim e Guarani)
- dezembro de 2021 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- dezembro de 2021 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.780 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.479 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 2.060 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.010.429,80 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1350 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1350 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.010.429,80 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 26.460 litros distribuídos nos dias 26 de agosto, 02, 09, e 16 de setembro (total de 1323 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$1.156.887,74, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/08/2021 até 20/09/2021. no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/08/2021 até 20/09/2021

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/08/2021 até 20/09/2021

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/08/2021 até 20/09/2021

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	46	§3º	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	356	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Em Andamento

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Em Andamento
Deliberação	493	2	Concluído Internamente
Deliberação	493	3	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado
Deliberação	501	2	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado
Deliberação	534	3	Em Andamento

Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	534	4	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

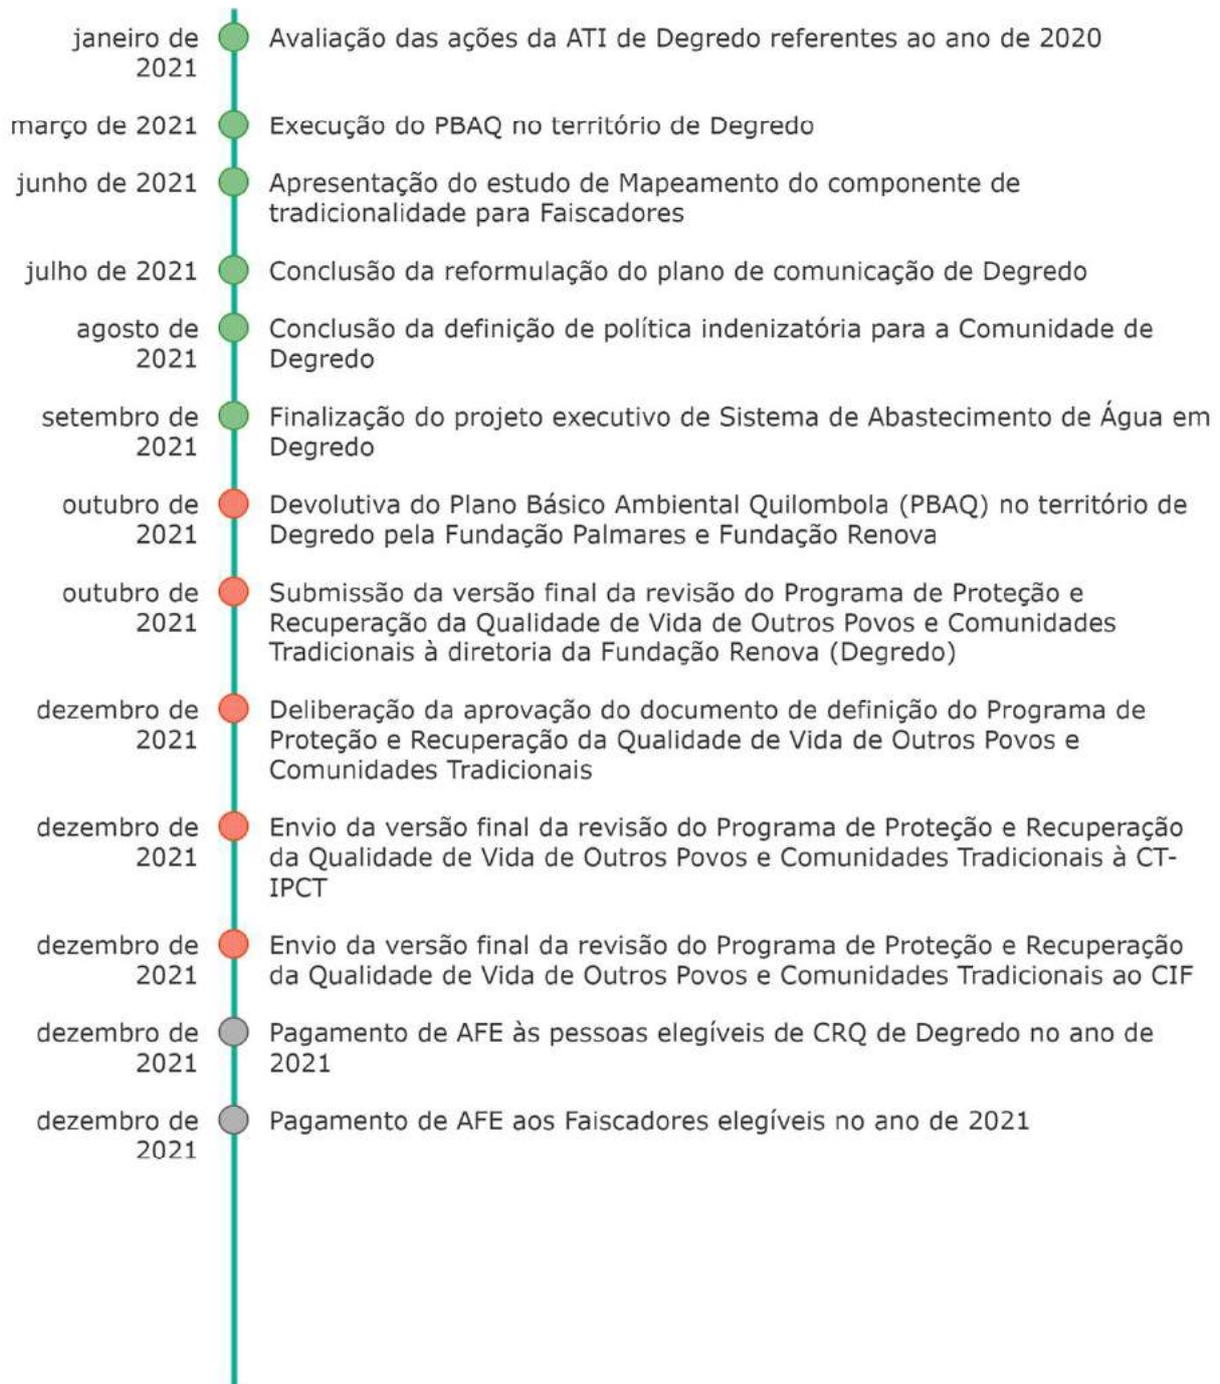

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 274 **titulares** (170 quilombolas, 12 faiscadores de Rio Doce e 92 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Realização das Oficinas de Audiovisual e Produção do Documentário (PG01 Documentações das Referências Culturais do Degredo).

Realização do 2º módulo - Relações Étnico-Raciais (PGR17 PBAQ)

Início do execução do PGR02 Incentivo às práticas culturais do Degredo.

Apresentação do plano de trabalho da Tetra+ (PG15-PBAQ – Atividades de meliponicultura)

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167 *	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Concluído Internamente
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente

Nota 01: Deliberação 167 – Item 3 – O PG05 já concluiu o item 3, pois o PPS não depende do Cadastro (PG01) para poder atender esse item (nesse caso foi pago o aluguel da moradia provisória para os atingidos que tiveram deslocamento físico).

Entregas do ano de 2021

- março de 2021 ● Implementação da nova estratégia de reparação em Proteção Social
- junho de 2021 ● Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado do ES
- agosto de 2021 ● Conclusão das assinaturas dos termos de parceria com municípios aderentes com < 50 famílias vulneráveis atingidas
- setembro de 2021 ● Deliberação da aprovação do documento de definição da revisão do Programa de Proteção Social pelo Comitê Interfederativo (CIF).
- dezembro de 2021 ● Conclusão da capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social em Mariana (Oficinas 2021)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de **70 profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de **Mariana/MG** e outros **12 municípios atingidos** para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de **6 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização **18 veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- **14,2 Mil famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Nota:

Período - 01/09/2021 à 31/09/2021

Municípios atingidos: Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conselheiro Pena, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Mariana, Naque, Periquito, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Santana do Paraíso.

Fatos relevantes do mês

Assinaturas de acordo com o município de Baixo Guandu para implementação dos Plano de Reparação em Proteção Social, com os seguintes objetivos: fortalecimento da rede socioassistencial, capacitação dos operadores e gestores de proteção social e acompanhamento das famílias vulneráveis do município.

1ª reunião do Comitê de Monitoramento das ações dos Planos de Proteção Social, com ampla participação social de atingidos e poder público, nos seguintes municípios: Aracruz, Colatina, Sooretama e Marilândia.

Aprovação do escopo do Programa de Proteção Social pelo CIF, com definição de eixos de atuação, metas, indicadores e cronograma.

Capacitação aos operadores de proteção social do município de Mariana com o tema “Trabalho dos profissionais de assistência social em situações de desastres e calamidades”.

Indicadores

Escopo aprovado pelo CIF em 16.09.21. Os indicadores serão reportados a partir do próximo ciclo.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Em Andamento
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	506	3	Em Andamento
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Em Andamento
Deliberação	506	6	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021	●	Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021	●	Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021	●	Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021	●	Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021	●	Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021	●	Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021	●	Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021	●	Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021	●	Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Produção de Conteúdo
dezembro de 2021	●	Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR MÊS	agosto de 2021	setembro de 2021	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	15	15	122.119
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	33	29	3.621
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	1.046
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	11

Fatos relevantes do mês

Em Mariana (MG) foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo (MG) para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos da reparação. Durante os encontros, foram realizados informes sobre o histórico de reuniões para discussão sobre recursos hídricos e caracterização da rede de energia elétrica na área do reassentamento. Em Bento Rodrigues (MG) foi realizada visita da Comissão de Atingidos para acompanhamento de status e avanço das obras no reassentamento coletivo.

No período, destacamos a realização dos Seminários Participativos de Ações Territoriais que tem como objetivo realizar a apresentação e discussão participativa dos focos de atuação do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06) planejadas para os territórios atendidos.

No território do Alto Rio Doce, foram realizadas reuniões com os grupos de trabalho dos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado para implementação das ações do Plano de Reparação do Patrimônio Cultural, em específico os focos de atuação "Incubadora de projetos socioculturais" e "Registro audiovisual e formação musical". Ainda sobre o tema, destaque para reuniões para discussão sobre o plano de reparação a partir do Diagnóstico de Referências Culturais.

Com foco nas ações para Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras, destaque para a realização de reuniões com pescadores da Calha do Rio Doce, Médio Rio Doce e Espírito Santo para esclarecimentos sobre o primeiro edital de Seleção de Projetos para apoio às atividades de Pesca e Aquicultura.

As ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil) permanecem como pauta importante das ações de Diálogo Social no período e incluem a realização de reuniões coletivas, diálogos individualizados, envio sistemático de materiais informativos e suporte para esclarecimento de dúvidas de atingidos e advogados sobre o uso do Portal do Advogado. Destaca-se na Calha do Rio Doce a realização de reuniões com moradores e as Comissões de Atingidos de Ipatinga (MG), Rio Casca (MG) e São José do Goiabal (MG) para esclarecimento de dúvidas.

Fatos relevantes do mês

Continuidade dos Fóruns de Prestação de Contas: Em Pedra Corrida (Periquito) foi realizado fórum para apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação da Fundação Renova na comunidade, com foco nos temas de Indenização, Proteção Social e Abastecimento de Água e Monitoramento da Bacia do Rio Doce.

Em Tumiritinga (MG) foi realizada reunião com produtores rurais do município para discussão das ações iniciadas pela Ater voltadas à retomada das atividades agropecuárias na localidade.

Em relação ao tema de Proteção Social, destaque para a realização de reuniões com moradores de Linhares (ES), Marilândia (ES), Colatina (ES), Sooretama (ES), Aracruz (ES) para apresentação das ações do Programa e divulgação do resultado do edital de Proteção Social.

Indicadores

INDICADOR	ago/21	set/21
I.8: Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	8,39	9,23
I.10 e I.20 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	47	48,6
I.18 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	5,79	7,31
I.19 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	7,52	8,37
I.21 Avaliação dos espaços de participação e controle social	8,57	8,96
I.16 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	66	Indicador em fase de apuração[1]
I.9 e I.15 Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	9,34	9,31

Os indicadores I.5 Apresentação dialógica dos programas nos territórios; I.31 Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova I.17 e I.32 Percepção de efetividade dos espaços de Participação e controle social são realizados por meio de pesquisa com a população atingida, realizada anualmente, conforme disposto na definição do programa. A pesquisa atualmente está em fase de planejamento para coleta dos dados;

[1] A apuração do indicador I.16 aguarda a finalização dos relatórios das agendas de Diálogo Coletivo, conforme fluxo acordado pela Deliberação 216, a serem enviados no dia 10 do mês seguinte ao mês de referência.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
12.633,00	177,93

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	265,00
abril de 2021	157	
maio de 2021	458	289,00
junho de 2021	180	
julho de 2021	180	-
agosto de 2021	465	
setembro de 2021	222	

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

INDICADOR	Agosto	Setembro
I.24.C - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	88%	86%
I.24.D - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria (dias)	106,27	55,21

O indicador "Avaliação do atendimento pela Ouvidoria (i.26.c)" foi recentemente aprovado na câmara técnica e, após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal processo administrativo exige várias etapas, antes que a pesquisa por se iniciada, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação das propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a realização da pesquisa de satisfação. Portanto, o processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

▼	Grande Número	agosto de 2021	setembro de 2021
	Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	192.693	197.932
	Canais: Número total de manifestações	832.429	849.391
	Canais: Número de manifestações respondidas	768.299	788.132
	Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	132.397	132.589
	Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	19.926	21.498
	Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.310	13.366
	Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	666.796	681.938
	Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	11	7
	Canais: Número de manifestações em tratamento	64.130	61.259

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?

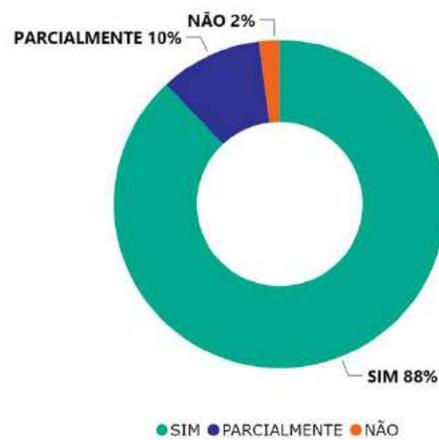


Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos relevantes do mês

Análise de Manifestações registradas no território do Espírito Santo sobre o tema Fundação Renova – Atualização de Informações Pessoais para subsidiar tratativas para encaminhamento e finalização das manifestações

Análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32) no território do Médio Rio Doce (MG)

Apoio na mobilização para os Seminários Participativos de Ações Territoriais com a população de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz, Linhares e Sooretama (ES) para a apresentação e discussão participativa das ações do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06) planejadas para os municípios. (

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas (“Reassentamento” - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana (MG) e Alto Rio Doce (MG)

Monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Participação dos atendentes CIAs em treinamento para qualificação dos colaboradores deste Canal no processo de reparação e compensação: alinhamento sobre Fluxo Ágil para equipe do território de Mariana (22/09) e Reciclagem de orientações sobre devolutiva a manifestações (22/09)

Indicadores

INDICADOR	Agosto	Setembro
Taxa de manifestações reincidentes (i.22)	26%	39%
Proporção de manifestações respondidas (i.24.a)	92%	93%
Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado (i.24.b)	72%	72%
Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco (i.2 e i.26.b)	99%	98%
Satisfação com a resolução das solicitações (i.27)	91%	91%
Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco (i.27.b)	98%	98%

Os indicadores “Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs (i.2 e i.26.a)”, “Oferta das informações solicitadas nos CIAs (i.27.a)” e “Satisfação com a estrutura física dos CIAs” não estão sendo medidos porque os espaços físicos dos CIAs encontram-se fechados por causa da pandemia de COVID-19. Assim que os centros forem reabertos para atendimento ao público, as medições serão iniciadas.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	0	7
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	4	48
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	0	3
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	3	9
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	6	43
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	2	19
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	0	84
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	48	292
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	4	81
Newsletter produzidos	6	4	6	3	5	4	39
Outros itens produzidos	2	0	9	8	11	5	74
Pílulas de whatsapp produzidos	27	26	51	46	67	42	478
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	16	126
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	0	26
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Total	68	70	139	141	142	134	1.331

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2021


DADO	jul	ago	set	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	2	4	6
ÁudioZaps produzidos	8	3	2	13
Carros de som produzidos	1	0	0	1
Cartilhas produzidos	1	2	1	4
E-mails de Marketing produzidos	3	17	5	25
Informes do Reassentamento produzidos	2	1	0	3
Jornais da Comunidade produzidos	12	12	15	39
Matéria - Boletim Jornada produzidos	19	77	18	114
Mídias Sociais produzidas	15	40	13	68
Newsletter produzidos	4	3	4	11
Outros itens produzidos	11	20	8	39
Pílulas de whatsapp produzidos	80	76	63	219
Rádios produzidos	16	38	25	79
Vídeoreportagens produzidos	0	0	1	1
Vídeos produzidos	5	5	4	14
VídeoZaps produzidos	1	0	0	1
Total	178	296	163	637

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território

Canais ● Áudio ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail ... ● Jornal da ... ● Matéria - ... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo ● Videore...

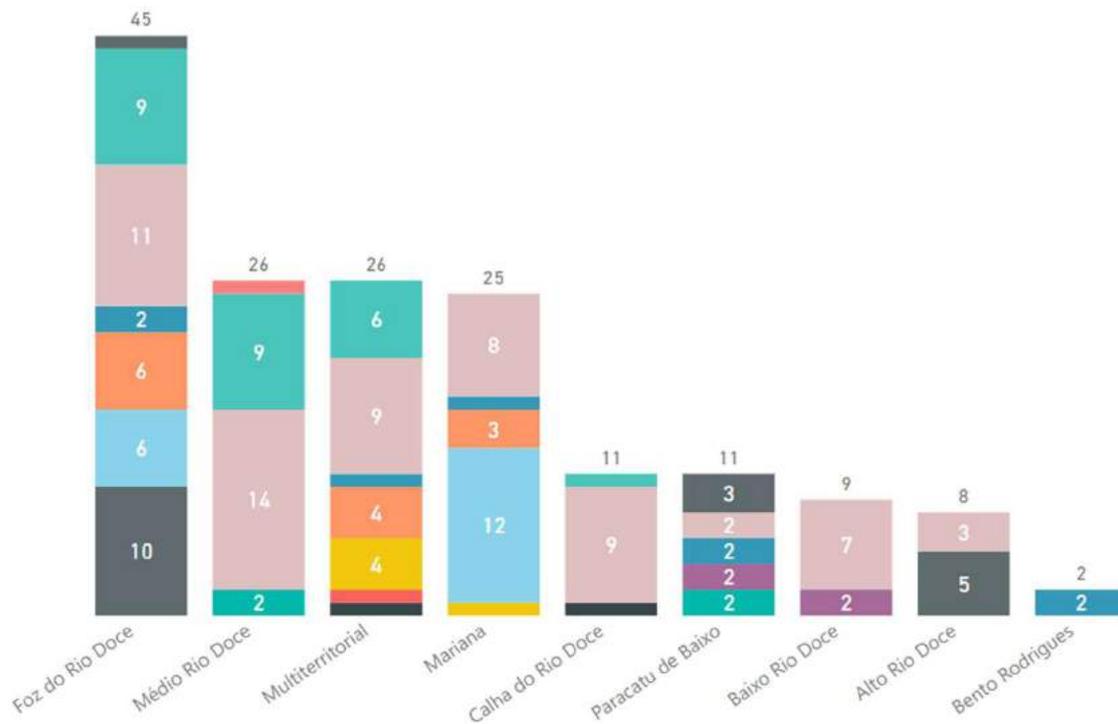


COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Principais Temas Veiculados

Canais: ● Áudio ● ÁudioZap ● Cartilha ● E-mail Marketing ● Jornal da Co... ● Matéria - Boleti... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo ● Vídeoreporta...



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção e distribuição digital da 17ª edição do jornal Terra da Gente, informativo com as comunidades de Barra Longa, Gesteira e Barreto.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula com mensagem de lembrete para moradores de Bugre, Caratinga, Santana do Paraíso, Sobrália, Ipatinga, Iapu, Ipaba e Fernandes Tourinho sobre o Fórum Resulta sobre Sistema Indenizatório e Ações do Diálogo, compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula de WhatsApp com lembrete para atingidos de Rio Casca acessarem o link da reunião online, no dia 09/09, sobre Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com mensagem de lembrete para moradores de Bom Jesus do Galho, Dionísio e Pingo-D'Água sobre o Fórum Resulta sobre Sistema Indenizatório e Ações do Diálogo, compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula de WhatsApp com mensagem de lembrete para moradores de Rio Casca, São José do Goiabal e Sem-Peixe sobre o Fórum Resulta sobre Sistema Indenizatório e Ações do Diálogo, para ser compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar moradores de Bugre, Caratinga, Santana do Paraíso, Sobrália, Ipatinga, Iapu, Ipaba e Fernandes Tourinho para o Fórum Resulta sobre Sistema Indenizatório e Ações do Diálogo, no dia 05/10.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar moradores de Rio Casca, São José do Goiabal e Sem-Peixe para o Fórum Resulta sobre Sistema Indenizatório e Ações do Diálogo, no dia 07/10.

Produção de pílula para convidar moradores de Bom Jesus do Galho, Dionísio e Pingo-d'Água para o Fórum Resulta sobre Sistema Indenizatório e Ações do Diálogo, no dia 06/10.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Comunicação com Territórios

Veiculação de oito programas (Momento Renova) em seis territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em setembro com um total de 48 programas, com 144 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência.

Foz do Rio Doce

Produção de matéria na Rádio Renova sobre as inscrições para o Projeto de Meliponicultura na Foz.

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o início de obras de drenagem em Patrimônio da Lagoa, em Sooretama.

Produção de pílula convidando a comunidade de Regência para reunião sobre o sistema de abastecimento de água na comunidade.

Produção de pílula para a comunidade de Aracruz para informar sobre a reestruturação do atendimento do Centro de Informação e Atendimento (CIA).

Produção de pílula para a comunidade de Povoação para informar sobre a reestruturação do atendimento do Centro de Informação e Atendimento (CIA).

Produção de pílula para a comunidade de Regência para informar sobre a reestruturação do atendimento do Centro de Informação e Atendimento (CIA).

Produção e distribuição digital da 10ª edição do Jornada para a população de Degredo.

Produção e distribuição digital da 11ª edição do Jornada Juparanã, informativo para as comunidades do entorno da Lagoa.

Produção e distribuição digital da 18ª edição do Jornal Voz da Foz, informativo com as comunidades de Areal, Povoação, Entre Rios e Regência.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Médio Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação do seminário participativo sobre o Plano de Ação Territorial da área de Diálogo Social para as cidades de Governador Valadares e Alpercata.

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação do seminário participativo sobre o Plano de Ação Territorial da área de Diálogo Social para as cidades de Conselheiro Pena, Galileia e Tumiritinga.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar a comunidade a participar do Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce - em Naque.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar a comunidade a participar do Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce - do distrito de Pedra Corrida, em Periquito.

Produção de áudio para WhatsApp e carro de som com o objetivo de convidar a comunidade a participar do Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce em Naque.

Produção de áudio para WhatsApp e carro de som com o objetivo de convidar a comunidade a participar do Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce - do distrito de Pedra Corrida, em Periquito.

Mariana

Produção e distribuição digital da 18ª edição do boletim Jornada para a população de Mariana.

Produção de pílula convite para reunião do Diálogo com a comunidade de Ponte do Gama.

Foz do Rio Doce

Publicação de post nas redes sociais da Fundação Renova sobre as inscrições no Projeto de Meliponicultura na Foz.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Médio Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp com o objetivo de convidar a comunidade a participar do Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce em Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente.

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação do seminário participativo sobre o Plano de Ação Territorial da área de Diálogo Social para as cidades de Belo Oriente, Naque e Periquito.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Cerca de 4 mil hectares de propriedades rurais já foram inscritos em edital que une preservação do meio ambiente e renda extra

Fundo Desenvolve Rio Doce é tema de palestra on-line para empreendedores mineiros

Imóvel centenário de Mariana é restaurado e vai abrigar a história de uma das primeiras bandas do Brasil

Inovação é tema de palestra on-line e gratuita para empreendedores mineiros

Inscrições para Programa Jovem Aprendiz em Mariana e distritos estão abertas

MG e ES vão receber R\$ 150 milhões em recursos para investimentos em saúde

Primeira etapa das obras de saneamento em Dionísio vai beneficiar 2.600 pessoas

Projeto de criação de abelhas sem ferrão abre inscrições para famílias em Linhares

Projeto de renaturalização em trecho do rio Gualaxo restaura condições da região

Tradicionais “santinhos” reavivam celebrações religiosas de Mariana e do Alto Rio Doce

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para a Rádio Renova esclarecendo que o Sistema Indenizatório Simplificado passa por alterações permanentes para atender às decisões judiciais.

Produção de matéria para programa da Rádio Renova com esclarecimentos sobre o funcionamento do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula com informações para advogados sobre a inclusão da Autodeclaração de não pertencimento à comunidade indígena aldeado nos procedimentos para atingidos de Resplendor aderirem ao Sistema Indenizatório Simplificado

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre o prazo para atingidos de localidades com sentença para o Sistema Indenizatório Simplificado fazerem a opção pelo Programa de Indenização Mediada (PIM)

Produção de pílula de WhatsApp com orientações para advogados sobre os prazos para requerimentos no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp esclarecendo aos advogados que alterações divergentes e/ou contraditórias em autodeclaração resultam em negativa no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp esclarecendo que o Sistema Indenizatório Simplificado passa por alterações permanentes para atender às decisões judiciais.

Produção de programa de rádio sobre o Sistema Indenizatório Simplificado com informações sobre os prazos e etapas para entrega da documentação necessária.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção de álbum digital de fotos para acompanhamento dos avanços das obras das casas.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Divulgação nas mídias sociais da Renova sobre o início das obras de revitalização da Casa da Banda de Monsenhor Horta.

Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Publicação de post nas redes sociais da Renova sobre a realização da oficina de audiovisual com os quilombolas de Degredo. |

Produção de programa de rádio Momento Renova sobre a oficina de audiovisual realizada com os jovens e adultos da comunidade quilombola de Degredo.

Produção de pílula/convite para as inscrições no segundo módulo do curso de capacitação das lideranças quilombolas de Degredo. |

Produção de matéria para a rádio sobre o segundo módulo da oficina de capacitação das lideranças quilombolas.

Produção de folder sobre o Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de programa de rádio sobre o Sistema Indenizatório Simplificado com prestação de contas sobre um ano da implementação do sistema pela 12ª Vara Federal.

Produção de pílula para a comunidade de Degredo sobre os canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas em relação ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Portal do Advogado passa por adequações constantes para atender às sentenças judiciais. |

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção da 28ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Produção da 27ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Elaboração de vídeo/banner animado para apresentação durante o evento simbólico Tijolo Fundamental de Paracatu de Baixo.

Elaboração de vídeo com a linha do tempo e histórico das obras para o evento simbólico Tijolo Fundamental de Paracatu de Baixo.

Elaboração de pílula-flyer no formato PDF para envio às famílias participantes do evento simbólico Tijolo Fundamental de Paracatu de Baixo. A peça trouxe informações sobre o transporte dos convidados.

Elaboração de pílula-convite para envio às famílias participantes do evento simbólico Tijolo Fundamental de Paracatu de Baixo, realizado no dia 15/09/2021.

Elaboração de banners para o evento simbólico Tijolo Fundamental de Paracatu de Baixo.

Elaboração de arquivo de áudio para divulgação no reassentamento de Paracatu de Baixo, por meio de carro de som, com informações sobre segurança do trabalho e protocolos sanitários em relação à covid-19.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção de cartazes com informações institucionais e de segurança e saúde para orientar visitantes na portaria do reassentamento de Bento Rodrigues.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Elaboração de faixas para o evento simbólico Tijolo Fundamental de Paracatu de Baixo.

Produção de newsletter para sobre atividades de vistorias cautelares em residências de Furquim, para início das obras do Sistema de Abastecimento de Água, em atendimento a uma das condicionantes socioambientais do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Produção de pílula de WhatsApp informando a ampliação dos horários das obras no Parque de Exposições.

Suporte ao PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Produção de pílula-convite para reunião sobre retorno híbrido para a escola de Paracatu de Baixo

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de pílula convite aos participantes do Diagnóstico das Referências Culturais de Mariana

Produção de pílula de WhatsApp para divulgar as inscrições para o webinar da Reserva Técnica no evento da Primavera dos Museus

Produção de pílula de WhatsApp sobre a reunião virtual do Plano de Reparação do Patrimônio Cultural para os moradores de Barra Longa.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a reunião virtual do Plano de Reparação do Patrimônio Cultural para os moradores de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Publicação de post nas redes sociais da Fundação Renova sobre o projeto Natureza por Perto, apoiado pelo Edital Doce e implementado em Povoação.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Posts nas redes sociais da Fundação Renova reforçando a continuidade das inscrições para o Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura.

Produção de matéria na Rádio Renova para reforço das inscrições no Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura.

Produção de matéria sobre a prorrogação das inscrições no Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura para o dia 22/10.

Produção de pílula convidando a comunidade de Resplendor, Itueta e Aimorés para reunião sobre o Edital para Grupos Produtivos de Pesca e Aquicultura.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar pescadores de Conselheiro Pena, Galileia e Tumiritinga a participar da reunião de esclarecimentos sobre o Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar pescadores de Governador Valadares e Periquito a participar da reunião de esclarecimentos sobre o Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura.

Produção de pílula para informar que as inscrições do Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura vai até 04/10.

Produção de pílula para informar sobre a prorrogação das inscrições no Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura para 22/10.

Produção de pílula reforçando a continuidade das inscrições para o Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de pílula de WhatsApp com o objetivo de convidar pescadores do território Calha do Rio Doce para reunião de esclarecimentos sobre o Edital de Seleção de Projetos para Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e Aquicultura.

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de pílula de WhatsApp para convidar os produtores rurais de Tumiritinga a participar da 1ª Rodada de Avaliação da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Criação de e-mail marketing convite para palestra sobre Inovação em Empresas para Minas Gerais.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Criação de pílula para divulgação de vaga de assistente de suprimentos.

Produção de matéria informando sobre as pré-inscrições nos cursos de capacitação profissional em Regência e Povoação.

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação de vagas de emprego disponíveis na obra da adutora em Governador Valadares através do Recoloca Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as pré-inscrições nos cursos de capacitação profissional em Regência.

Produção de pílula para divulgar vagas de emprego disponíveis na plataforma Recoloca Rio Doce para a região de Governador Valadares.

Publicação de posts nas redes sociais da Renova informando sobre as pré-inscrições nos cursos de capacitação profissional em Regência e Povoação.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação de vagas de emprego disponíveis para técnico socioambiental/meio ambiente em Governador Valadares através do Recoloca Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp sobre as pré-inscrições nos cursos de capacitação profissional em Povoação.

Produção de pílula para divulgar vagas de emprego disponíveis na plataforma Recoloca Rio Doce para Governador Valadares.

Produção de pílula sobre as inscrições para contratação do Programa Aprendiz em Mariana.

Produção de pílula sobre o prazo final das inscrições para contratação do Programa Aprendiz em Mariana.

Suporte ao PG023 Manejo de Rejeitos

Produção de programa de rádio sobre os resultados do estudo do professor e doutor Carlos Tucci, que apontam a redução de 34% do volume de rejeitos no leito do rio Doce.

Suporte ao PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Divulgação nas mídias sociais sobre a preservação de APPs e conscientização dos produtores rurais quanto ao acesso inadequado do gado às áreas.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de newsletter digital sobre qualidade da água, ações de reparação que contribuem para melhoria da qualidade da água, sistema de abastecimento de água e melhorias nos sistemas do município de Itueta.

Produção de programa de rádio com atualizações sobre o avanço da instalação de tubos e pavimentação nas obras do trecho urbano da Adutora de Governador Valadares.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Produção de newsletter digital sobre qualidade da água, ações da reparação que contribuem para melhoria da qualidade da água, sistema de abastecimento de água e melhorias nos sistemas do município de Resplendor.

Produção de videorreportagem com atualizações sobre o avanço da instalação de tubos e pavimentação nas obras do trecho urbano da Adutora de Governador Valadares.

Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce

Produção de programa de rádio sobre a Formação de Lideranças Jovens, com atualização sobre a etapa atual de elaboração de projetos e depoimentos das pessoas que participam do projeto.

Suporte ao PG035 Informação para a População

Pílula convite para participação no segundo webinar acadêmico - ação preparatória para lançamento e operação do repositório virtual do CIT.

Produção de áudio contextualizando o projeto Oficinas Trilhas de Memórias, para circulação junto à pílula convite enviada aos participantes. (

Produção de pílula convite aos participantes da primeira edição da oficina Trilhas de Memórias, ação preparatória para operação do repositório virtual do CIT.

Produção de pílula lembrete aos participantes da primeira edição da oficina Trilhas de Memórias, ação preparatória para operação do repositório virtual do CIT.

Produção de pílula lembrete aos participantes da segunda edição da oficina Trilhas de Memórias, ação preparatória para operação do repositório virtual do CIT.

Produção de pílula para convite aos participantes da segunda edição da oficina Trilhas de Memórias, ação preparatória para operação do repositório virtual do CIT.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Relações Institucionais

Elaboração de pílula com informações sobre o repasse do Fundo de R\$ 150 milhões para investimentos em saúde, destacando os municípios da Calha.

Produção de audiozap para o território Calha sobre o repasse aos municípios para investimentos em saúde do Fundo de R\$ 150 milhões.

Produção de pílula para divulgar os investimentos de R\$ 150 milhões para a área de saúde e o valor específico para o município de Aimorés.

Produção de pílula para divulgar os investimentos de R\$ 150 milhões para a área de saúde e o valor específico para o município de Baixo Guandu.

Produção de pílula para divulgar os investimentos de R\$ 150 milhões para a área de saúde e o valor específico para o município de Colatina.

Produção de pílula para divulgar os investimentos de R\$ 150 milhões para a área de saúde e o valor específico para o município de Resplendor.

Produção de programa da Rádio Renova sobre o repasse aos municípios para investimentos em saúde do Fundo de R\$ 150 milhões.

Produção de programa de rádio para divulgar o Fundo de Saúde, com foco nos recursos para o Hospital Regional de Governador Valadares e para as prefeituras das cidades atingidas.

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores das cidades de Governador Valadares e Alpercata para reunião de apresentação das ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce.

Suporte ao UST

Produção de programa de rádio sobre o Edital de Restauração Florestal com o balanço de inscrições até o momento, além do convite de produtor rural para outros se inscreverem.

Indicadores

O Programa 06 foi aprovado recentemente e os indicadores do pilar de Comunicação dependem da realização de pesquisas. Nesse sentido, as áreas responsáveis dentro do programa já deram início aos processos necessários para realização das pesquisas.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1179 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 157 adoções, 358 devoluções, 173 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 449 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 338 bovinos, 59 equinos, 31 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1694 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

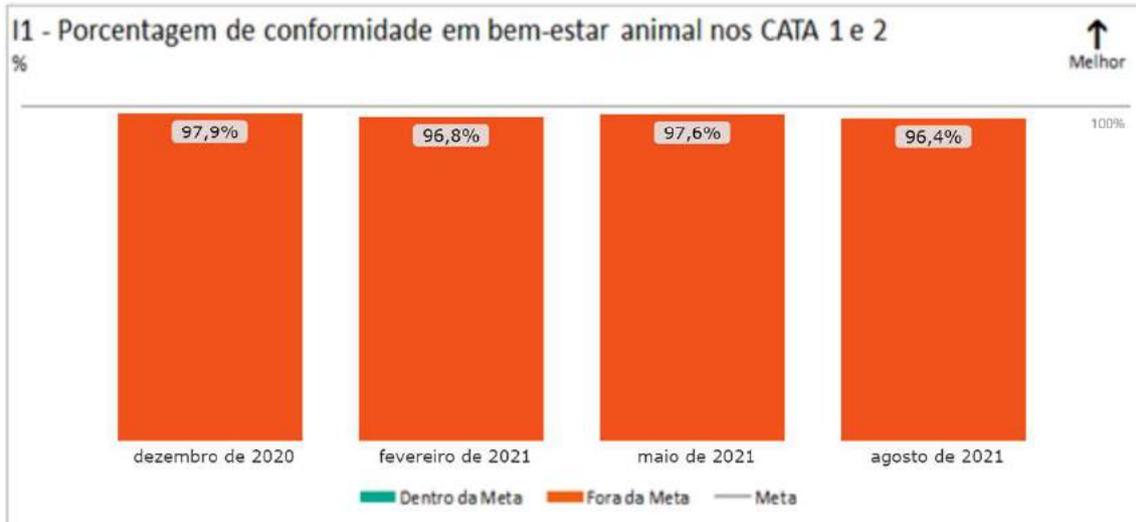


Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de inverno de 2021, e que foi realizado no mês de agosto do corrente ano. O reporte de resultados deste indicador para a estação de primavera/21 está previsto para o relatório de dezembro de 2021 (ref. novembro/21).

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente, não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, conforme exposto no quadro 1, e conforme resultado, todas as espécies encontram-se em atendimento aos quesitos avaliados de bem-estar animal.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar



Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o bimestre referente aos meses de julho e agosto de 2021, não houve contabilização de novas adoções ou óbito de animal disponível para adoção, mantendo-se o valor reportado no bimestre anterior.

A próxima atualização deste indicador é prevista para o mês de novembro (referência ao bimestre set/out de 2021).

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021 ● Concluir 54 casas

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Início de 8 casas do novo aditivo da HTB (Ds 135-1, 135-2, 21D-1, 21D-2, 74, 190, 261 e 93B);

Início de 6 casas do contrato da Cardan (IDs 61, 75, 81 210, 120A, 110);

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir 20 Fundações de casas
dezembro de 2021	●	Concluir 05 Estruturas
dezembro de 2021	●	Concluir 02 Alvenaria
dezembro de 2021	●	Concluir 75% da Infraestrutura

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Início da pavimentação no Acesso Principal;

Início da construção dos (ID's 27, 74, 80 e 84).

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Processo de divulgação do Grandes Números em reavaliação para consonância em atendimento ao procedimento PG-PMO-001 – Registro de Evidências da Fundação Renova.

Alinhado junto ao Programa que os reportes serão dados após consolidação das respectivas evidências que amparem os Grandes Números a serem reportados.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

ID 031 - Obra concluída! Pendente recebimento pela família.

Conclusão da segunda fase da reforma do ID 351 – Recebimento do imóvel dia 03/09/2021;

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Indicadores



Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Concluída internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Concluída parcialmente /Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluída internamente
Deliberação	80	4.1	Concluída internamente
Deliberação	80	4.2	Concluída internamente
Deliberação	225	2	Concluída internamente /em andamento/ Judicializado
Deliberação	286	3	Concluída internamente

Entregas do programa



● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Fatos relevantes do mês

➤ Descomissionamento do setor 4

- Execução de ensecadeira



- Conclusão do sistema temporário de condução das vazões do córrego dos Borges.



- Remoção de Sedimentos:

✓ Volume executado até 29/06: 11.814 m³



Fatos relevantes do mês

➤ Obras de Recuperação das Margens:

- Continuação na execução das obras para recuperação dos pontos de margem: 144/55



➤ Reabilitação da UHE - Risoleta Neves

Atividades desenvolvidas no período:

UG1: Desmontagem do cubo da ogiva, análise de líquido penetrante nos componentes do sistema de bielismo das palhetas, manutenção e limpeza das grades da tomada d'água, retirada das grades da tomada d'água, recuperação metalúrgica do vertedouro, transporte da tampa da UG1 para pintura, finalização dos ensaios de líquido penetrante no cubo e pás da UG1.

UG2: desmontagem das alavancas e bielas do servomotor da UG2, remoção do Rotor da UG2.

UG3: início das atividades de mergulho para limpeza da pista de contato/comporta do vão 5 da UG3, retirada e limpeza da grade da tomada da água da UG3.

Fatos relevantes do mês



➤ UHE - Investigações para análise das condições do Barramento Principal

- Status das sondagens das Galerias da UHE ~~Risoleta~~ Neves:
 - ✓ Devido ao ~~merecimento~~ ~~desnível~~ identificado nos drenos, foi solicitada execução de sondagem e ensaio de perda d'água em outros dois furos: SRBP-508 e SRBP-509

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

- ✓ Monitoramento de Efluentes
- Relocação sistema de efluentes – Fazenda Floresta

Fatos relevantes do mês



- Lançamentos/bacias: Pontos não monitorados em atendimento aos compromissos legais, haja vista que não houve efluente bombeado para as Bacias 2A e 2B ou para a Bacia 1 no período.
- Realizado monitoramento para linha de base do rio Doce: sem desvios identificados no período de reporte;

✓ **Plano de monitoramento efluentes – Descomissionamento setor 4**

• **SETOR 1:**



Fatos relevantes do mês

Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- **CÔRREGO DOS BORGES:**



Síntese conclusiva:

- Montante: Diários: Não houve desvios para o período
Mensal: Desvio de Manganês Total no ponto de montante, atribuído ao background natural da região, sendo valor de referência associado ao próprio solo, águas superficiais e águas subterrâneas da região;
- Jusante: Diários: Não houve desvios para o período
Mensal: Desvio de Manganês Total no ponto de jusante, conforme monitoramento de montante, conclui-se, portanto, que vinha no curso d'água antes do empreendimento e é atribuível ao background natural da região.

Fatos relevantes do mês



Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- **SETOR 5A**



Fatos relevantes do mês

Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
 - Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- **SETOR 5B**



Síntese conclusiva:

- Montante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
 - Jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco
- ✓ **Monitoramento Qualidade do Ar/Fumaça Preta**
 - Todas as áreas da Samarco e Contratadas responsáveis pela operação de equipamentos e veículos a diesel devem realizar o monitoramento periódico de emissão de fumaça preta, através do Opacímetro.
 - A periodicidade do monitoramento é semestral após a data de mobilização do veículo/equipamento.
 - Os seguintes selos são usados para identificar a condição de emissão de fumaça de cada equipamento:

VERDE - Certificado de Análise de Opacidade Aprovado - Equipamento liberado.

Fatos relevantes do mês

PRETO - Certificado de Análise de Opacidade Reprovado - Equipamento reprovado e impedido de ser utilizado para prestação de serviço ou uso próprio pela Samarco.

- Para os equipamentos reprovados, o responsável da área ou empresa deve apresentar, dentro de 2 dias úteis, laudo técnico de manutenção dos veículos, atestando que os ajustes necessários foram feitos e que a emissão de fumaça encontra-se dentro dos limites aceitáveis de acordo com a legislação vigente. Além disso, um novo teste com opacímetro deverá ser feito. Após apresentação do laudo técnico e novo teste o veículo receberá o selo verde para circulação interna.
- Desde o início do monitoramento da qualidade do ar nas comunidades de Rio Doce, Santana do Deserto e Novo Soberbo, nunca houve a ultrapassagem dos limites legais dos parâmetros monitorados (PM10 e PM2,5), mesmo no período seco. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Hídrico

Realizado monitoramento no curso d'água da Fazenda Gerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe e no córrego Micaela, e foram identificados desvios nos parâmetros Manganês e/ou Ferro Dissolvido associados a elementos naturais (background) da região. Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ Monitoramento - Instrumentação Barramentos

- Iniciada campanha de monitoramento nas seguintes estruturas:
Barramento C (montante e jusante) – Período 01/06 a 10/07 e Barramento A (montante e jusante) – Período 15/06 a 27/07;

Fatos relevantes do mês

- Frequência: Diária
- Parâmetros: Turbidez, Temperatura, Condutividade, Sólidos Sedimentáveis e pH.

Como essa primeira campanha ainda não foi concluída, os resultados dos monitoramentos de montante e jusante dos Barramentos A e C serão apresentados no próximo relatório.

✓ Hidrogeologia

- Foi apresentada proposta de Locação dos Poços de Monitoramento na Fazenda Gerônimo e Setor 8, sendo previstos 4 poços para Fazenda Gerônimo e 4 poços para o Setor 8.
- Encontram-se em andamento estudos de mapeamento geológico/estrutural nas 3 regiões (Fazenda Floresta, Fazenda Gerônimo e Setor 8).
- Também se encontra em andamento a Geofísica na Fazenda Floresta.

✓ Monitoramento de Ruído e Vibração

Realizado monitoramento de vibração nas regiões de Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal e não foram identificados quaisquer desvios. As análises seguiram as definições estabelecidas na ABNT 10151/2019.

✓ Subprograma de Resgate e Translocação da Ictiofauna da UHE Risoleta Neves



Fatos relevantes do mês

✓ Reabilitação STP (Sistema de Transposição de Peixes)

- ✓ O Sistema de Transposição de Peixes da UHE – Risoleta Neves não foi impactado diretamente pelos sedimentos provenientes de Fundão, sendo que a necessidade de sua reabilitação é decorrente de: a) inatividade; b) falta de manutenção periódica; c) Impacto da pluma de água do vertedouro nas estruturas.
- ✓ Os serviços de reabilitação estão sendo executados pela RIP Serviços, operadora de O&M da Usina Risoleta Neves, conforme previsões abaixo:
 - Elaboração da especificação dos componentes: Executado;
 - Aquisição de componentes e peças : Em processo;
 - Reparos de Campo: Início previsto para 01/08/21 (120 dias aprox.).



✓ Gestão Ambiental

Se mantém em andamento a atividade remoção da sucata metálica nas margens do reservatório;



Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

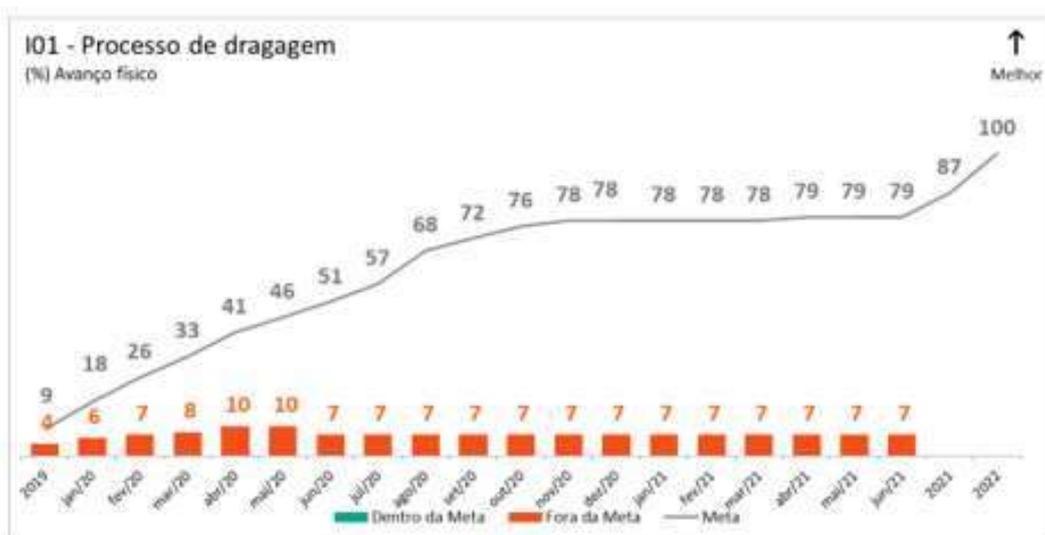


Gráfico 2. Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

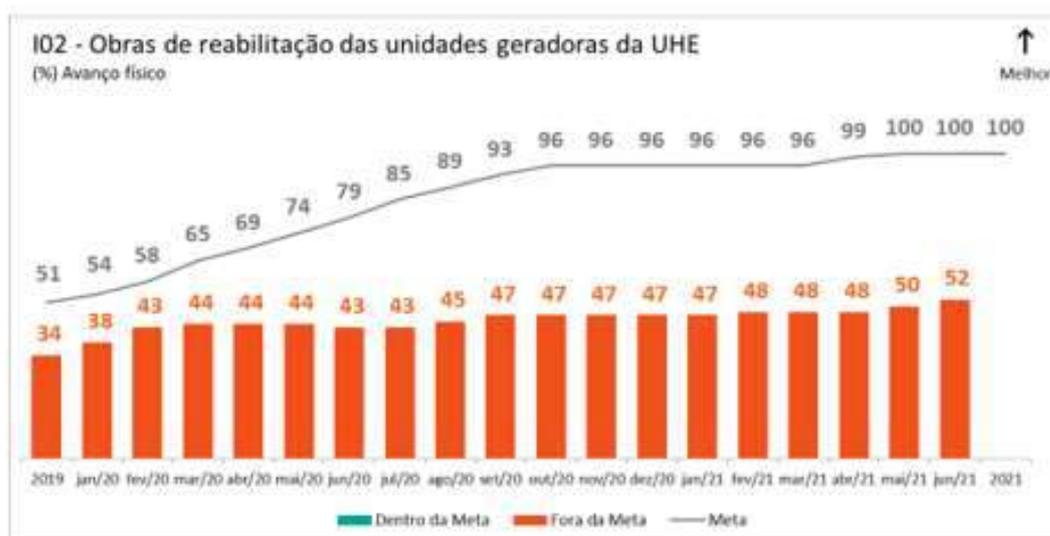


Gráfico 3. Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. (Gráfico Acumulado).

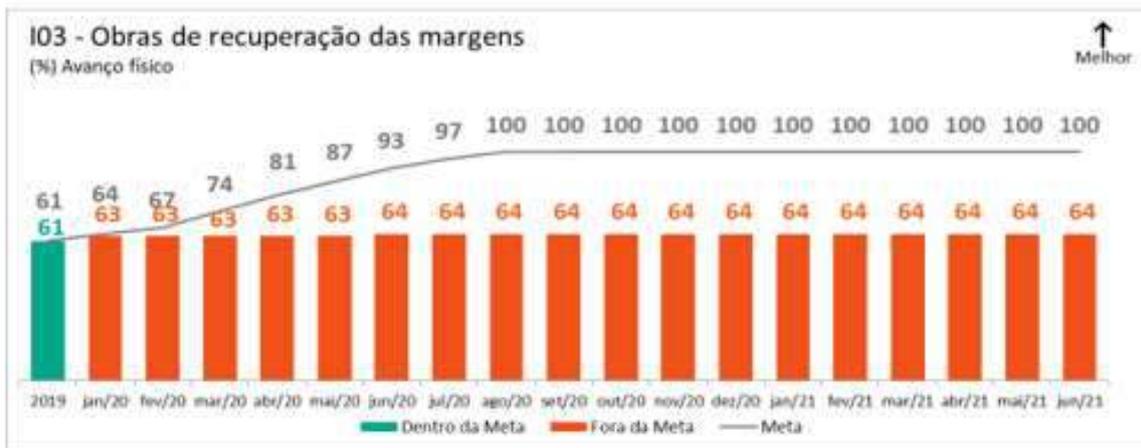


Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

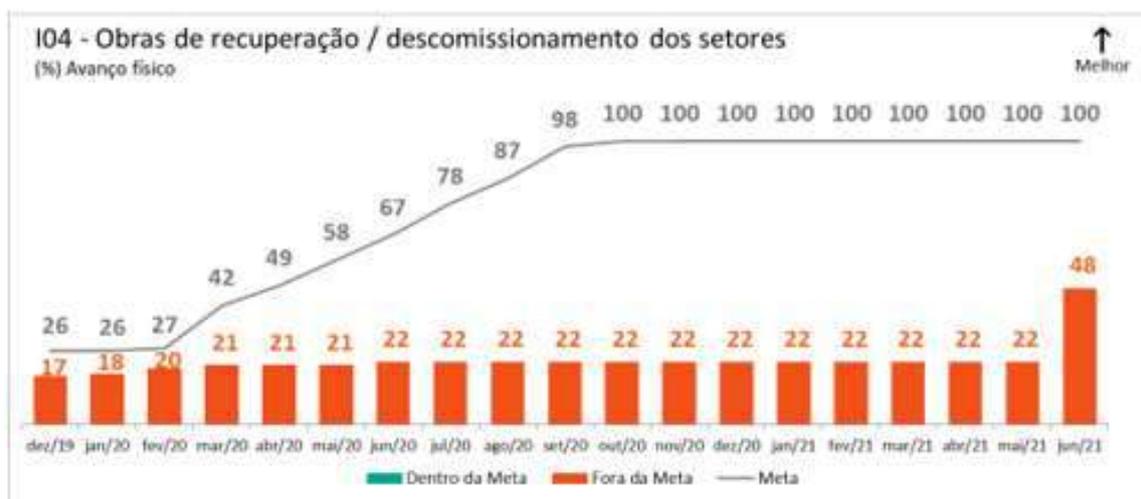


Gráfico 4. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado
Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	217	3	Em Andamento

Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1693 obras concluídas (projetos e processos) , sendo que, desse total:

- **935** correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1775,21 Km de manutenções realizadas, 142,2 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- **109** correspondem a Residências e Propriedades recuperadas;
- **16** correspondem a Casas reconstruídas;
- **28** correspondem a Comércio reformados;
- **189** correspondem a Quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- Residências e Propriedades recuperadas: 105
- Casas reconstruídas: 9
- Comércio reformados: 27
- Quintais e lotes reformados: 189

Mariana:

- Residências e Propriedades recuperadas: 4
- Casas reconstruídas: 7
- Comércio reformados: 1
- Quintais e lotes reformados: 0

Grandes números do programa

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 81
- Concluído sem termo: 08
- Paralisado: 02
- Pendente: 148
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 05
- Paralisado: 01
- Pendente: 04
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

Conclusão da montagem da cobertura do palco do Parque de Exposição;
Início das atividades de contenção em terra armada nas obras do acesso ao Parque de Exposição;
Início das atividades da rede de esgoto referente a ETE do Parque de Exposição.

Indicadores

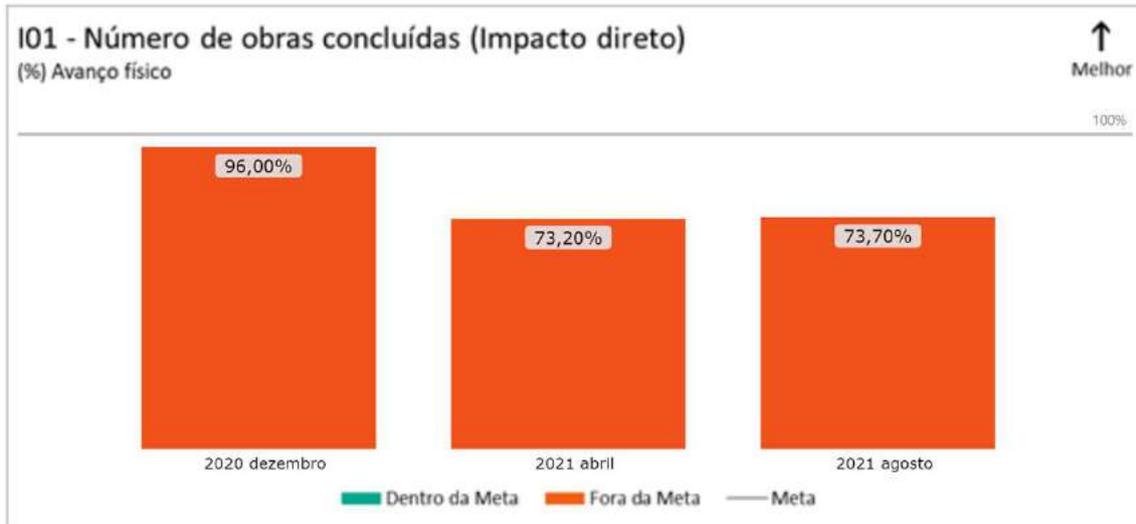


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

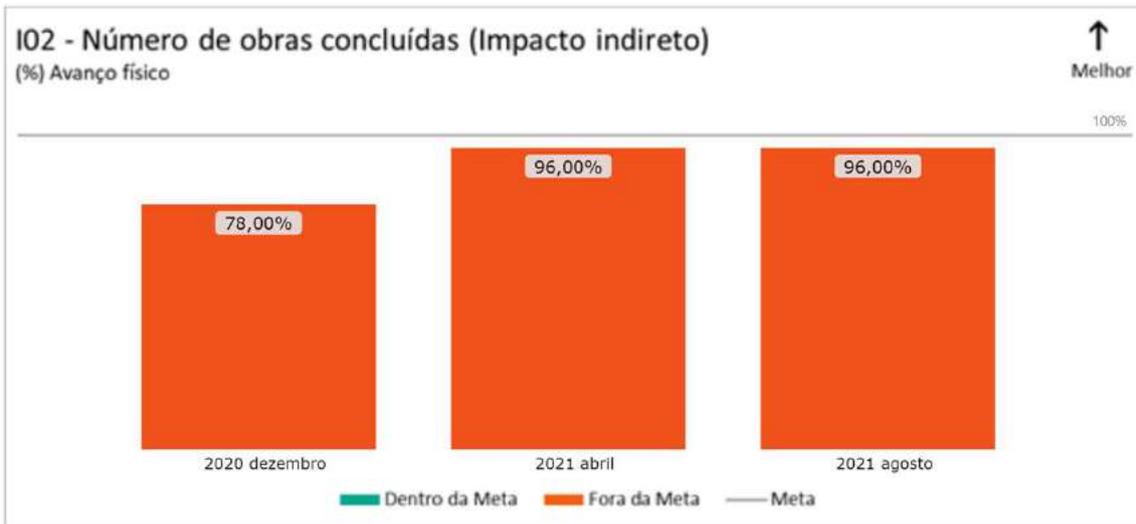


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

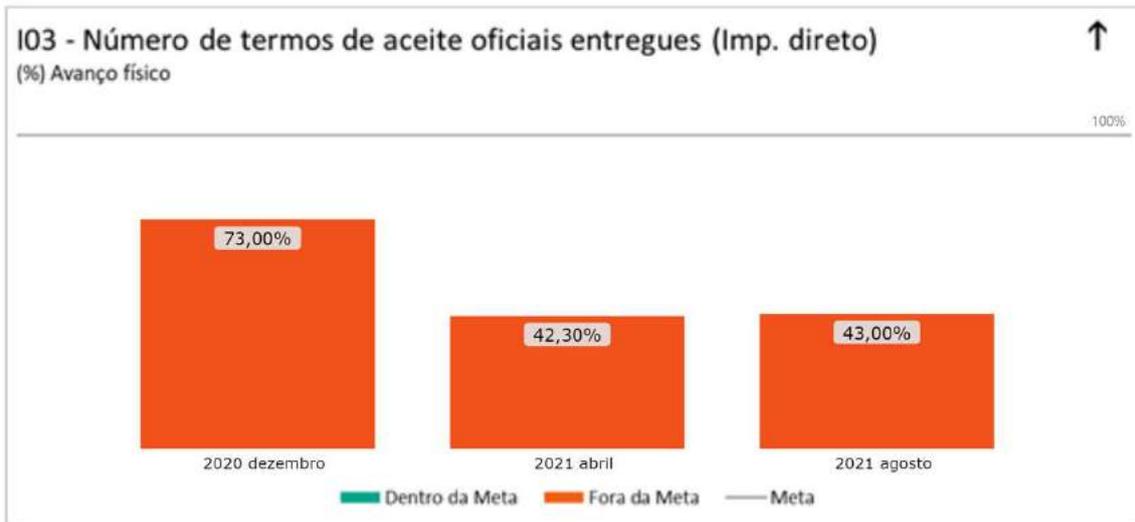


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

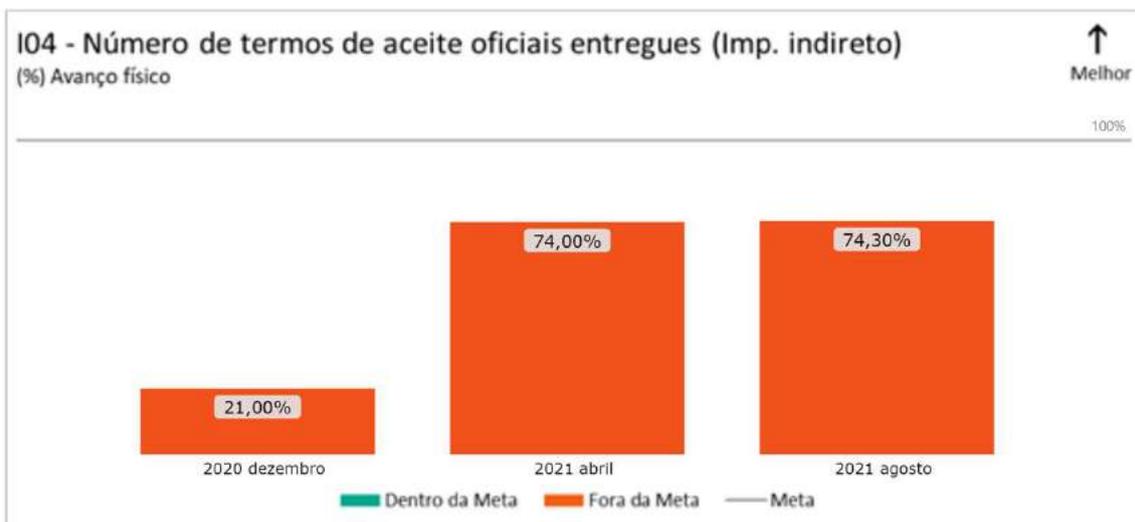


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
- dezembro de 2021 ● Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021 ● Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Apoio pedagógico nas escolas municipais de Mariana: Reuniões para finalização dos projetos políticos pedagógicos (PPPs).

Apoio psicopedagógico Mariana: realização de formação de professores na escola municipal de Paracatu de Baixo.

Apoio psicopedagógico Barra Longa: realização de formação de professores nas escolas estaduais Claudionor Lopes e Padre José Epifânio Gonçalves.

Volta às aulas presenciais em set/21:

Retomada do fornecimento de transporte escolar para comunidade escolar atingida das escolas Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gustavo Capanema.

Compra de equipamentos para as escolas de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues.

Manutenção predial em andamento nas escolas Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e José de Vasconcelos Lanna.

Indicadores

Revisão Dos indicadores do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF no 508, de 16 de junho de 2021). Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores a partir de dez/21.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Concluído Internamente
Cláusula	97	caput	Concluído Internamente
Cláusula	98	a	Concluído Internamente
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Entrega do sistema básico de monitoramento da Reserva Técnica
junho de 2021	●	Início das ações de reparação das Referências Culturais
agosto de 2021	●	Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
outubro de 2021	●	Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
dezembro de 2021	●	Oficinas sobre Educação Patrimonial
dezembro de 2021	●	Confecção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
dezembro de 2021	●	Restauração de 85 peças na Reserva Técnica
dezembro de 2021	●	Conclusão do calendário 2021 de apoio as manifestações culturais
dezembro de 2021	●	Confecção e implantação de um calendário esportivo 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

- Apoio a três manifestações culturais locais (Folia de Reis), com entrega de santinhos produzidos junto à comunidade.
- Apoio a manifestação esportiva, com transporte de time de futebol de Ponte do Gama para Mariana.
- Apoio à Festa do Menino Jesus de Paracatu de Baixo, apoio com transporte, ônibus, água, banheiros, sonorização.
- Continuidade das devolutivas às comunidade sobre o Plano de Reparação em parceria com a Unesco.
- Mobilização do grupo de artesanato da Casa dos Saberes e das famílias frequentadoras da Horta Comunitária para início das oficinas em outubro.
- Elaboração de 8 projetos de restauro na reserva técnica.
- Restauro de 5 peças na Reserva Técnica.

Indicadores




Gráfico 1 - Percentual de restituição de bens materiais culturais. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

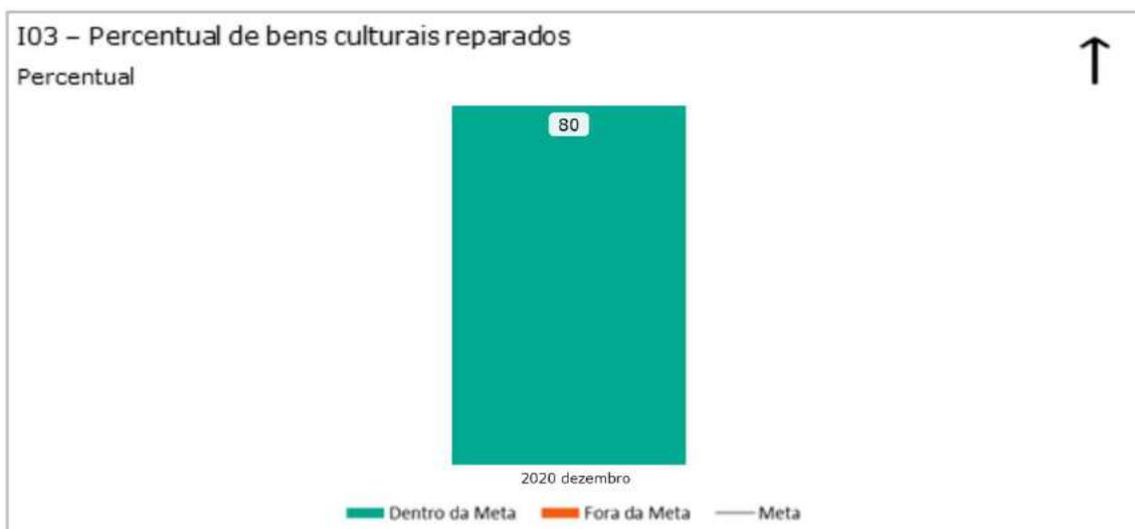


Gráfico 2 - Percentual de bens culturais reparados. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Em Andamento
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- dezembro de 2021 ● Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidades
- dezembro de 2021 ● Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fortalecimento das Organizações Locais

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização de workshops e oficinas de construção dos projetos estruturantes dos Arranjos Produtivos Locais dos polos turísticos.

Realização da "Semana de Turismo Integrado: um olhar sobre redes colaborativas", na qual foram realizadas 04 palestras e 08 oficinas em quatro dias de evento, com a participação de cerca de 220 pessoas distribuídas entre as atividades realizadas (meta da gerência de segunda rodada de capacitação para cadeia do turismo).

Início do processo de mobilização para participação no Projeto de Fortalecimento Institucional da Cultura e Esporte junto aos municípios da área de abrangência socioeconômica.

Formalização de 23 contratos de projetos do Edital Doce (concluindo a meta de 150 contratos assinados no ano de 2021).

Finalização e entrega aos municípios polos de Marliéria, Governador Valadares e Linhares dos Planos Participativos de Turismo elaborados por consultoria disponibilizada pela Fundação Renova (cláusula 104b).

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Concluído Internamente
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	73	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 1º Repasse financeiro para contratação de RH
março de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – Final do processo Seletivo
junho de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – Final do processo seletivo
junho de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
junho de 2021	●	Execução do programa de capacitações para profissionais do SUS
agosto de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
setembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
outubro de 2021	●	Retomada dos estudos de ARSH
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para assistência farmacêutica
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para consultas e exames especializados
novembro de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
novembro de 2021	●	Publicação do edital FAPES/FAPEMIG
dezembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa*

- 26 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (10 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

Os profissionais médicos e enfermeiros atuam realizando consultas e procedimentos clínicos no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h, com média de 545 consultas e 218 procedimentos por mês.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. A Secretaria de Saúde também relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na alimentação dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops.

3º Repasse de recursos financeiros no valor de R\$ 434.125,06 para contratação de recursos humanos na área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 10 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante deverá ser substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a realização de novo processo simplificado, em andamento, para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalacões, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (10 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de setembro/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 6 (30h/semana) – Atuação: 3 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS (cedida pela Saúde) e 1 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 1 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPSij;

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: 2 no Conviver.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Fatos relevantes do mês

Conclusão da 3ª Oficina de capacitação dos profissionais do SUS - Vigilância em Saúde.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Celebração na data 01/09/2021 do convênio com a FAPEMIG para lançamento da Chamada de Agroecologia e Produção Orgânica em MG.

Indicadores



Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianual.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

junho de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
setembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
outubro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
novembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce
novembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce
dezembro de 2021		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce
dezembro de 2021		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (200 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA no ES (145 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 187 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 09/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 162 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar;
- Aplicados 4311 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro, de forma remota com pescadores e aquicultores do Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro;
- 361 entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado.

Fatos relevantes do mês

Início das atividades presenciais para levantamento de dados primários do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado

Entrega do segundo informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as) /aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	Dez/25	Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e aquicultores em atividades alternativas, nos projetos 'Cultivando para Pescar', 'Associativismo e Cooperativismo' e de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas.	100%	Dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER.	100%	Dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela FR.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado

Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021  Cursos de capacitação da EMATER concluídos

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 252 propriedades elegíveis ao programa, sendo 50 direcionados ao reassentamento e 202 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 190 são do PASEA planejados sendo que 187 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 12 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 152 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 31 não aderiram e 4 estão em análise pelo produtor;
- 52.385,0 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 268,0 toneladas no mês;
- 9.970,5 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades;
- 425 barraginhas realizadas;
- 890 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 188 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 1.966 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 4.376 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 7.245 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 32.929 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.986 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 3.598 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 209 toneladas no mês.

Parcerias

- 33 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 8 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Parcerias

Aprovação da definição do programa no CIF.

Médio Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Alto Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores



Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I2	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
I3	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
I4	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de produtores com ISA maior ou igual a } 0,7 / \text{n}^\circ \text{ de produtores participantes do Programa}$	%
I5	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
I6	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
I7	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de áreas produtivas reparadas e ou adequadas} / \text{Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação}$	%
I8	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente
Deliberação	503	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

- janeiro de 2021 ● Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
- junho de 2021 ● Encerramento do Fundo Compete MG
- dezembro de 2021 ● Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 58,43 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 48 milhões foram **desembolsados** para 1458 contratos e 1135 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 418 contratos e 402 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Como previsto, a disponibilidade do Fundo Compete Rio Doce- MG foi encerrada em outubro de 2020. As últimas liberações das empresas que já haviam começado o processo aconteceram em abril de 2021. Portanto, não ocorrerão novas alterações nos números.

Ref. Agosto/2021

Fatos relevantes do mês

Início da prospecção junto as famílias das comunidades Regência, Povoação, Areal e Entre-Rios (ES) do projeto da Cadeia Produtiva do Mel - Meliponicultura

Comercialização de 208 sacas (60kg), totalizando 12,5 toneladas de feijão do Projeto Feijão. Faturamento de R\$ 59.948,60 aos agricultores familiares participantes do projeto (aquisição pela empresa DHG Foods - Alnutri)

Início dos seminários de sensibilização das famílias do projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce / MG - Territórios Beneficiados: Períquito, Governador Valadares e Tumiritinga

No Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce / ES - Territórios Beneficiados: Conceição da Barra, Aracruz, Fundão, São Mateus

- Alcance de 92% de compras em equipamentos para Paulo Vinhas e Piranema;
- 69% de compras em equipamentos para Assentamento Zumbi do Palmares
- 100% de compras para Assentamento Valdício Barbosa
- Contratada empresa de obra e instalação de equipamentos para todos os assentamentos.

Indicadores

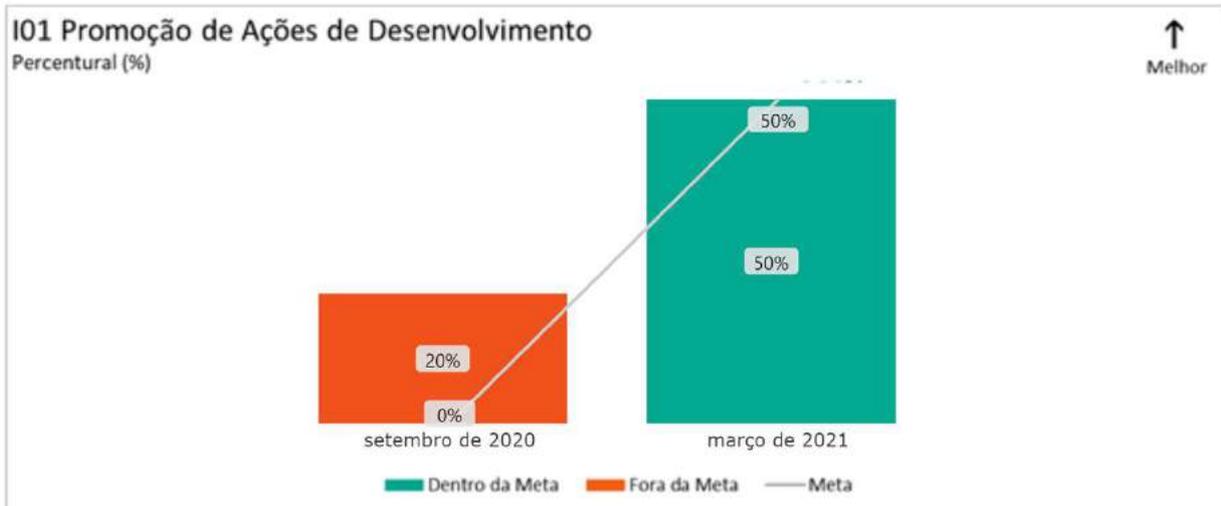


Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.

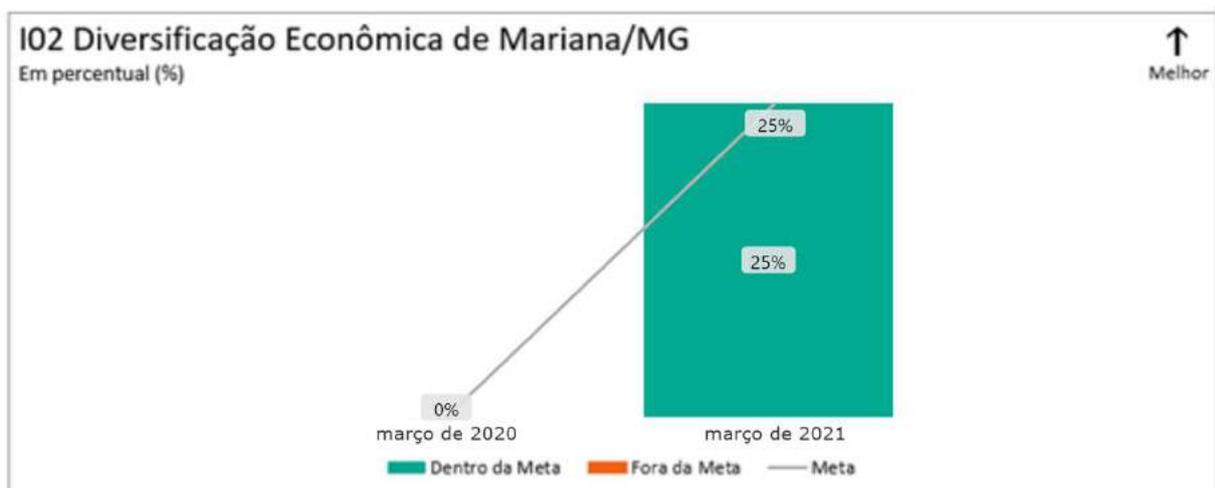


Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- novembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

349 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 383 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 16 a quantidade de **aluguéis**, 187 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 1 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (587) ultrapassa a quantidade total de atendidos (349). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Reposição de insumos e equipamentos a 10 negócios do ARD em Setembro de 2021.

Início do Diagnóstico de Território de Regência e Povoação - Grupos Produtivos de artesanato com Marcelo Rosenbaum e Ronaldo Fraga.

Finalização de diagnósticos - situação atual dos negócios considerando aspectos financeiros, de mercado, jurídicos, organizacionais, de produção, entre outros e definição de estratégias de 72 negócios de Linhares (Regência e Povoação). *Dados acumulados até setembro 2021.

Disponibilização de enxoval de materiais desenvolvidos na consultoria de design gráfico para 2 negócios atingidos.

Desenvolvimento de consultoria de design gráfico para criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de 21 negócios atingidos. *Dados acumulados até setembro 2021.

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente, o qual terá seu levantamento concluído em outubro/21.

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em outubro/21.

PG020 Estímulo à Contratação Local


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

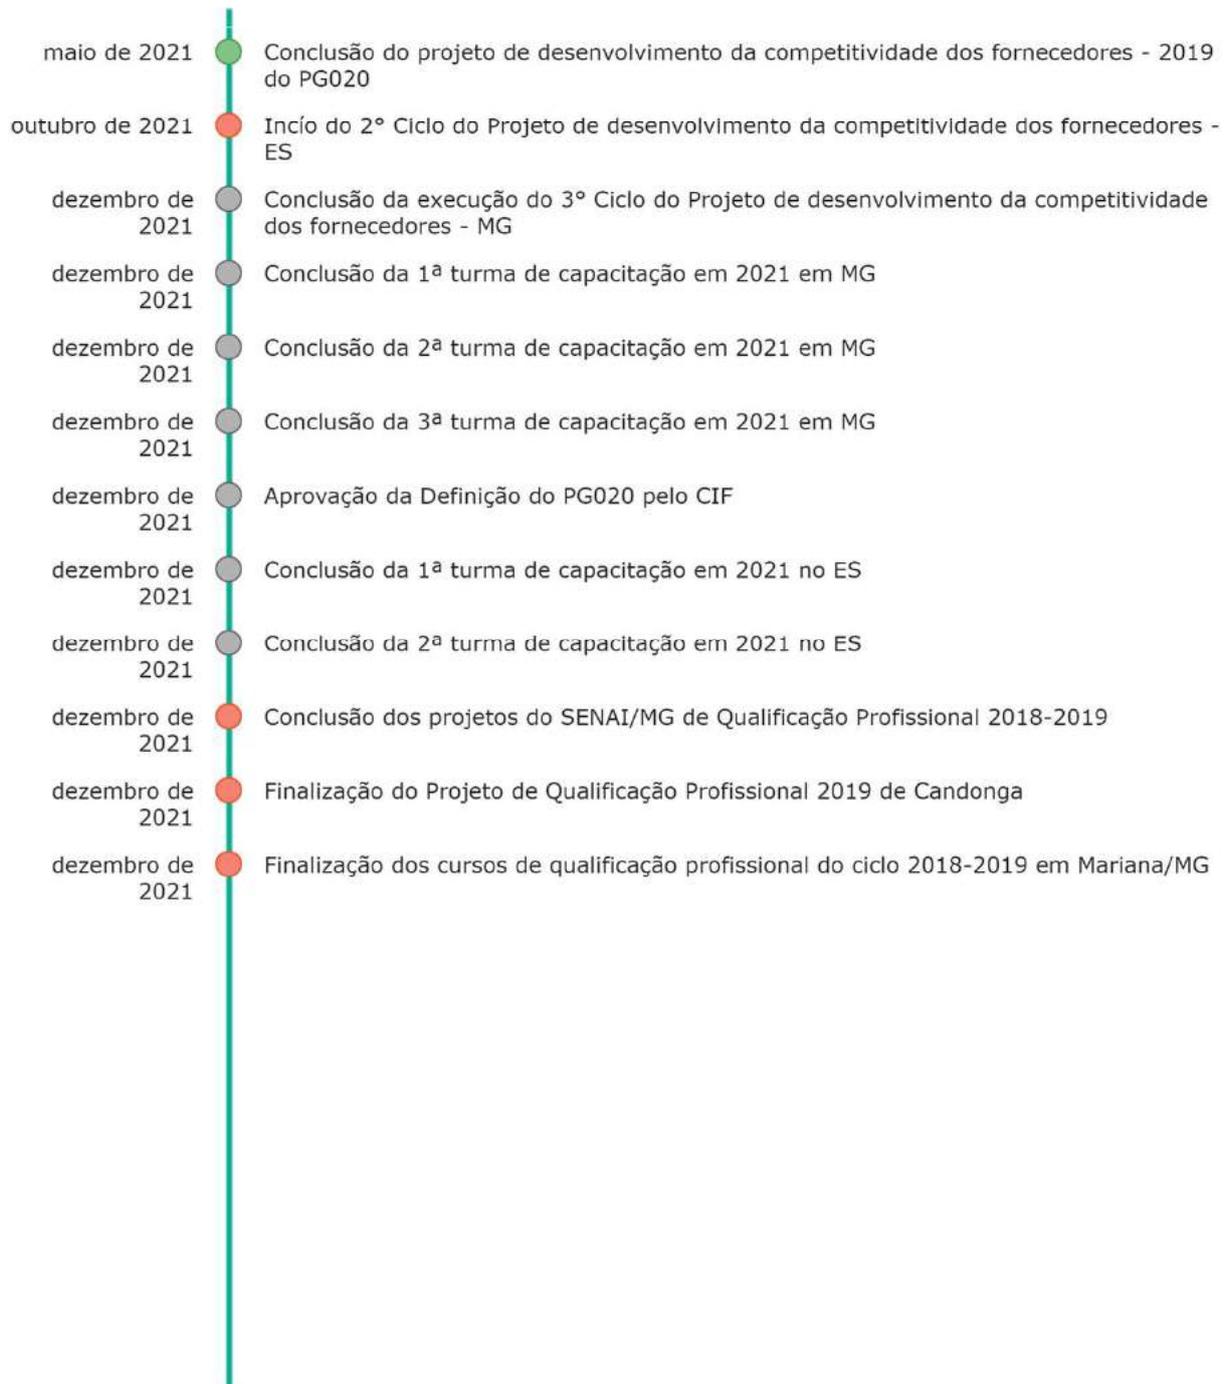

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- 131 turmas ofertadas, abertura de 14 Mil vagas, 11 Mil pessoas matriculadas nos cursos presenciais e online, 3.372 concluintes, 1.510 reprovados e 3.676 evadidos.
- **R\$ 1.744.150** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realizado o planejamento do 2º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Espírito Santo, que tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova.

O 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova em Minas Gerais, em setembro/21 realizou palestra aberta ao público, capacitações e assistências técnicas, que são direcionadas exclusivamente aos participantes do programa, promovendo a interação e debates a respeito dos conteúdos tratados.

- Palestra on-line no dia 08/09/21 cujo tema foi "Como Inovar na Minha Empresa", com 66 inscritos, 53 participantes e 82 visualizações no YouTube até o dia 04/10/2021.

- Três turmas de capacitações on-line abordando o tema "Como Inovar na Minha Empresa" de 09/09/21 a 10/09/21.

- Iniciado o quinto ciclo de assistências técnicas on-line com as empresas participantes do 3º Ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Minas Gerais. 40 empresas participam dessa etapa, sendo 20 em Mariana, 10 em Governador Valadares, 5 em Barra Longa, 3 em Rio Doce e 2 em Santa Cruz do Escalvado.

Início da pré-inscrição para diversos cursos de capacitação profissional para moradores de Regência e de Povoação, comunidades localizadas em Linhares (ES) e que foram impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). A ação é uma iniciativa da área de Contratação Local da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES) e, inicialmente, as oportunidades são para nove cursos em Regência e outros seis em Povoação.

Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 78 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em setembro/21, sendo 41 contratações locais e 37 não locais, 62 profissionais de Minas Gerais, 4 do Espírito Santo e 12 de outros estados da federação.

Indicadores

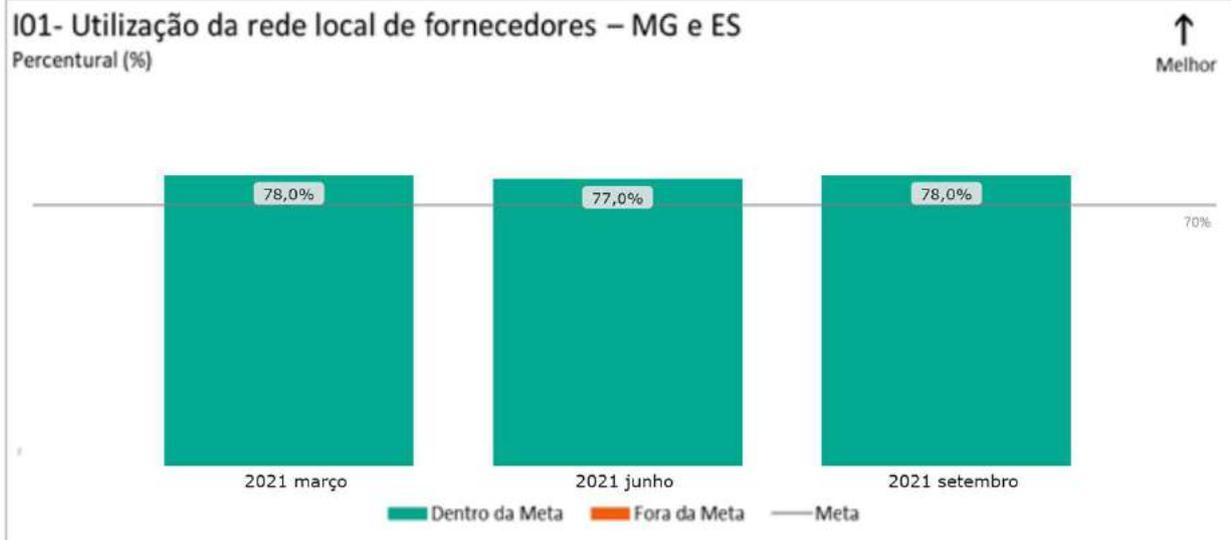


Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

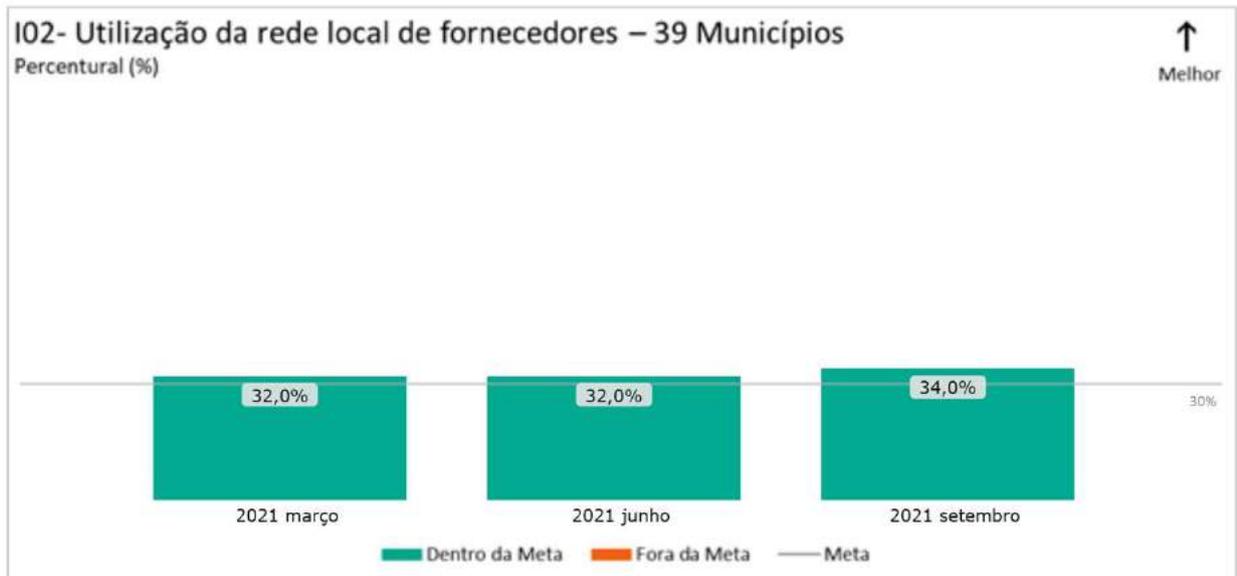


Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.

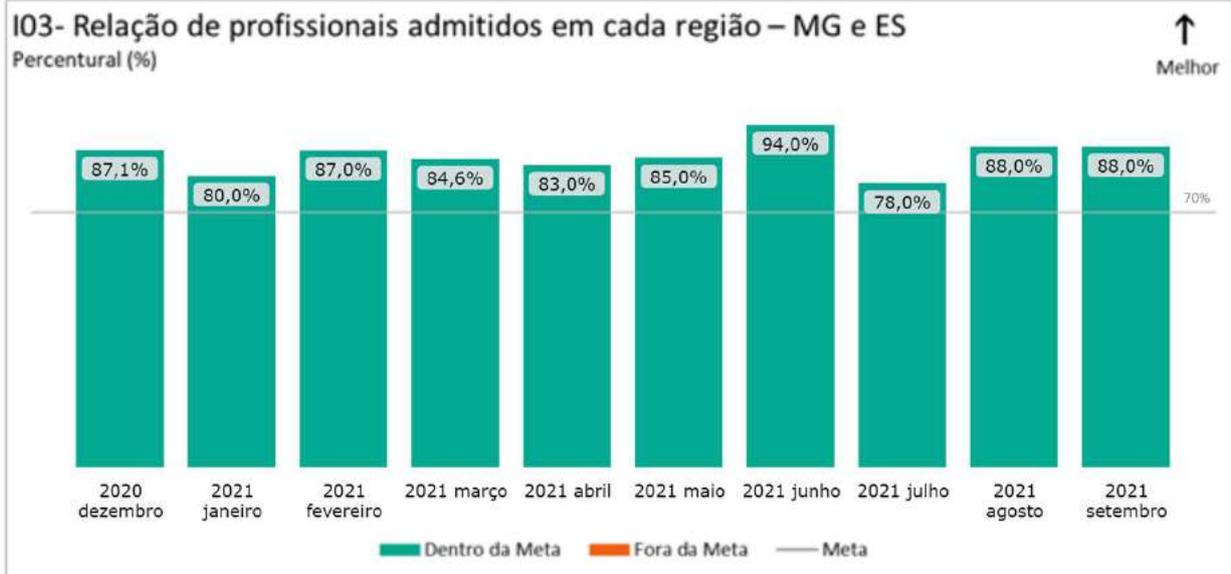


Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

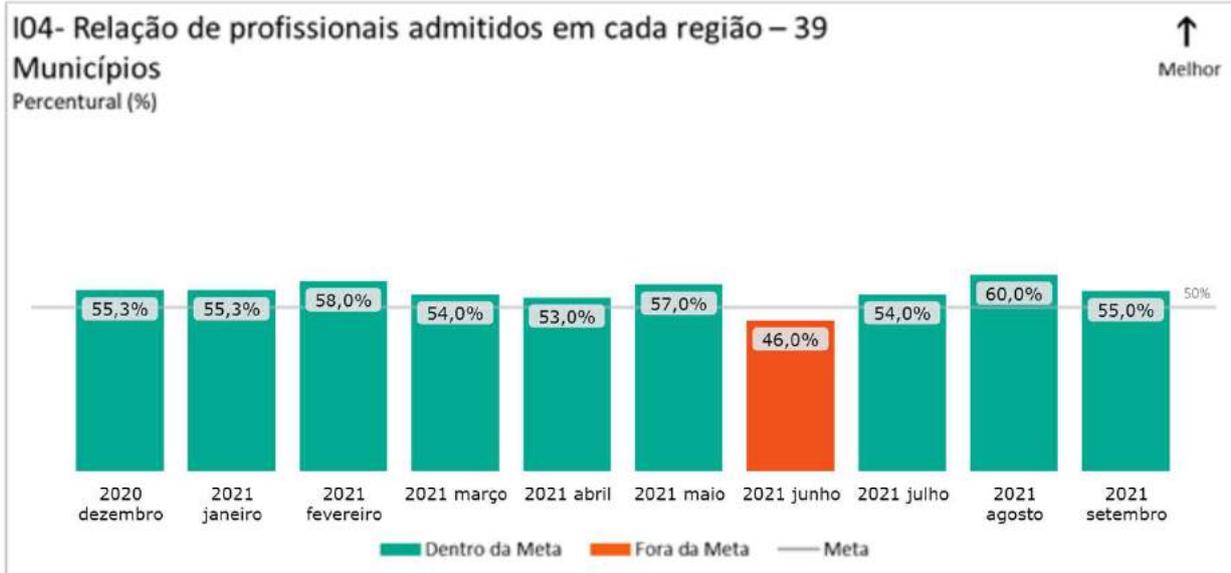


Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

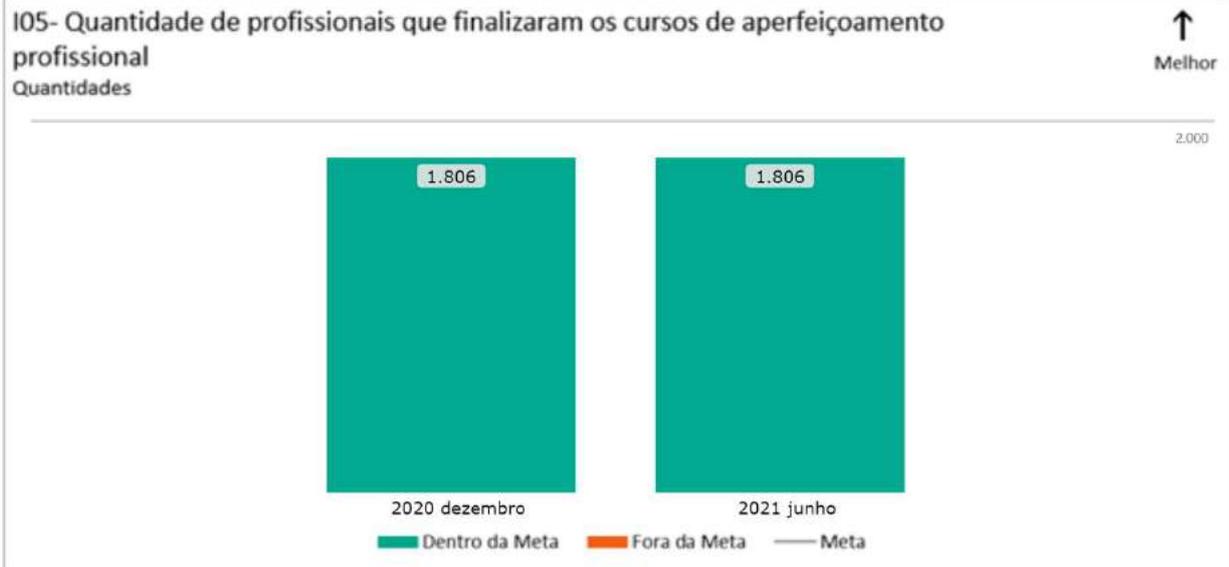


Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

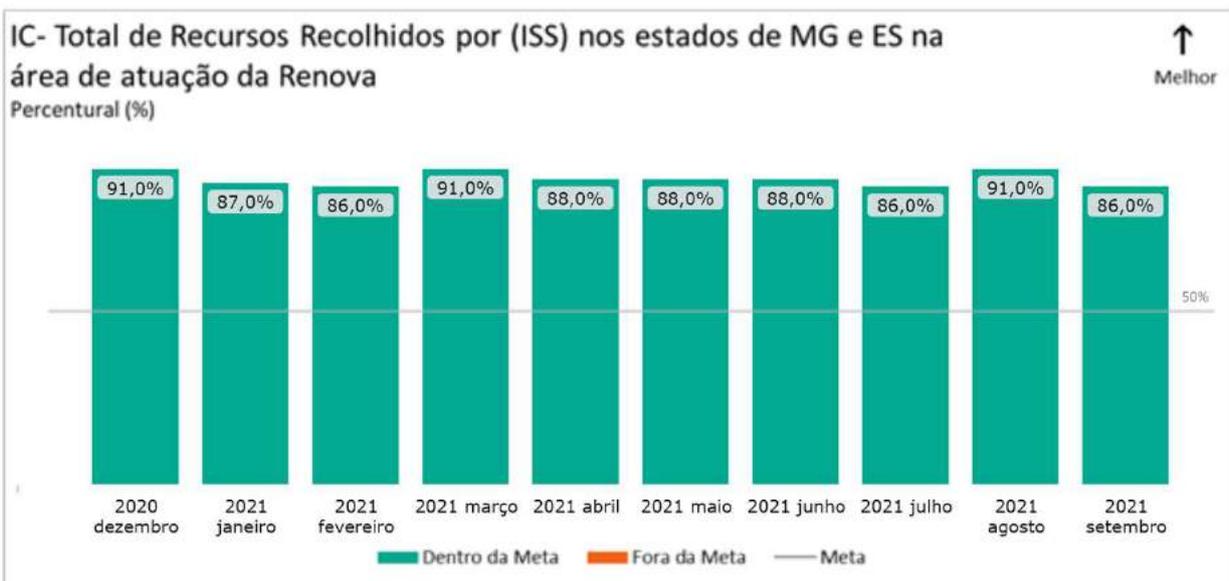


Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente

Deliberação	307	2b	Judicializado
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- Atualmente há 7.191 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes (15.407) ;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.653,8 Mi .

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 52 auxílios.

Exclusão de 1.322 auxílios.

Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

Indicadores

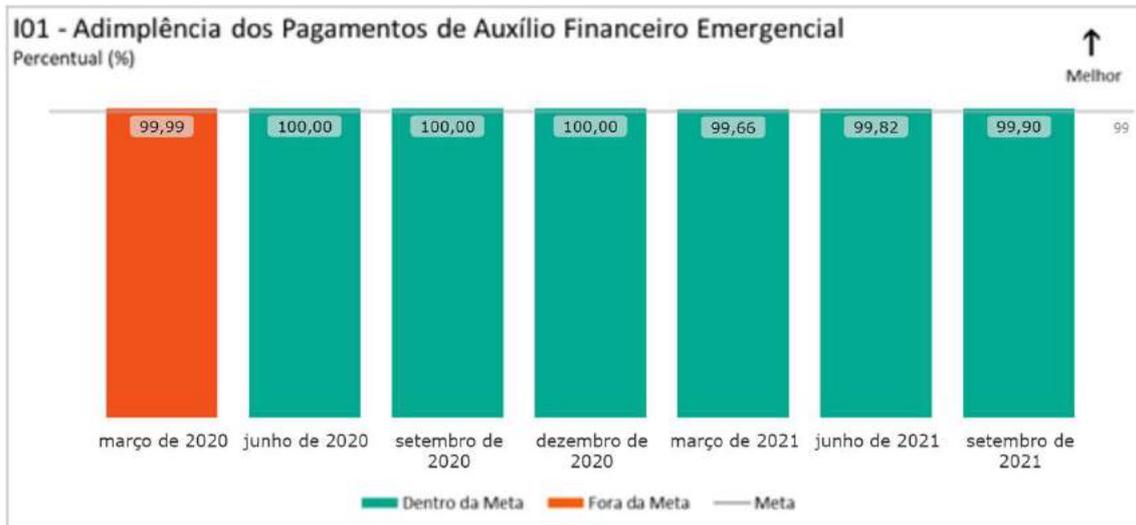


Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

Nota: A partir desse mês, os dados dos indicadores foram acertados, conforme frequência (trimestral) contida na ficha do documento de escopo vigente do PG21.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	2	Concluído Internamente

Deliberação	488	4	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Em Andamento
Deliberação	497	3	Em Andamento
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	526		Judicializado
Deliberação	527		Judicializado
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



março de 2021	●	Conclusão do projeto executivo de recuperação das lagoas marginais
abril de 2021	●	Apresentação do contrato assinado com a empresa que executará a Etapa 2 da caracterização ambiental do Plano de Manejo de Rejeitos – Trecho 17 (marinho)
abril de 2021	●	Conclusão da renaturalização piloto - intracalha dos trechos 6 e 7 - Rio Gualaxo do Norte
maio de 2021	●	Consolidação do 1º relatório anual de estudos da região deltaica no trecho 16 - Baixo Doce
junho de 2021	●	Conclusão do refinamento da mancha de inundação à jusante de Candonga
outubro de 2021	●	Conclusão da implantação da expansão do Projeto de Renaturalização para novos trechos
novembro de 2021	●	Protocolo relatório final ao CIF - Mancha de Inundação a Jusante de Candonga

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Conclusão de 7 campanhas de amostragens na região deltaica do rio Doce para investigação dos impactos dos rejeitos (Deliberação n.º165 do CIF e Nota Técnica CT-GRSA nº 05/2019). A cada campanha, são realizadas análises físico-químicas de água superficial, sedimentos e solos em 32 pontos de amostragem, com frequência trimestral por 2 anos.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Concluído Internamente
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- outubro de 2021 Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Ponte Nova - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Rio Doce - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Santa Cruz do Escalvado- 2021

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

Início do contrato de manutenções de cercas previstas no programa.

As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea} - \text{arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há]} \text{ nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Cláusula		Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente

Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021		Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021		Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
abril de 2021		Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Aimorés e Santa Rita do Itueto - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Alvarenga e Pocrane - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Santa Teresa - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Geraldo da Piedade e Santa Efigênea de Minas - 21/22
junho de 2021		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Entregas do ano de 2021

junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Açucena - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Assentamentos/MST - CFFV - 19/21
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares e Periquito - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Pancas e Águia Branca - 21/22
outubro de 2021	●	Elaboração do conteúdo de material didático-pedagógico de apoio aos eventos de formação, atualização e divulgação técnica científica (objetivo específico 8)
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Santa Teresa - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 981 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 213 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH).

Fatos relevantes do mês

Deliberações CIF nºs 528/2021 e 538/2021 que aprovam as revisões da definição dos programas 26 e 27;

Início do contrato com a Instituição INOVESA para realização das atividades de restauração florestal em 1.833 hectares nos municípios de Mutum e Lajinha (Sub-bacia do Manhuaçu).

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula		Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Conclusão do terceiro ano de manutenção florestal, referente ao plantio do ano 01 (2016/2017), na sub-bacia de Pontões e Lagoas
- dezembro de 2021 ● Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
- dezembro de 2021 ● Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1038 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 445 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

Fatos relevantes do mês

Deliberações CIF nºs 528/2021 e 538/2021 que aprovam as revisões da definição dos programas 26 e 27.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo


Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Reprogramado
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado

Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	166	§1º	Reprogramado
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Reprogramado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente

Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente
-------------	----	-----	------------------------

Entregas do ano de 2021

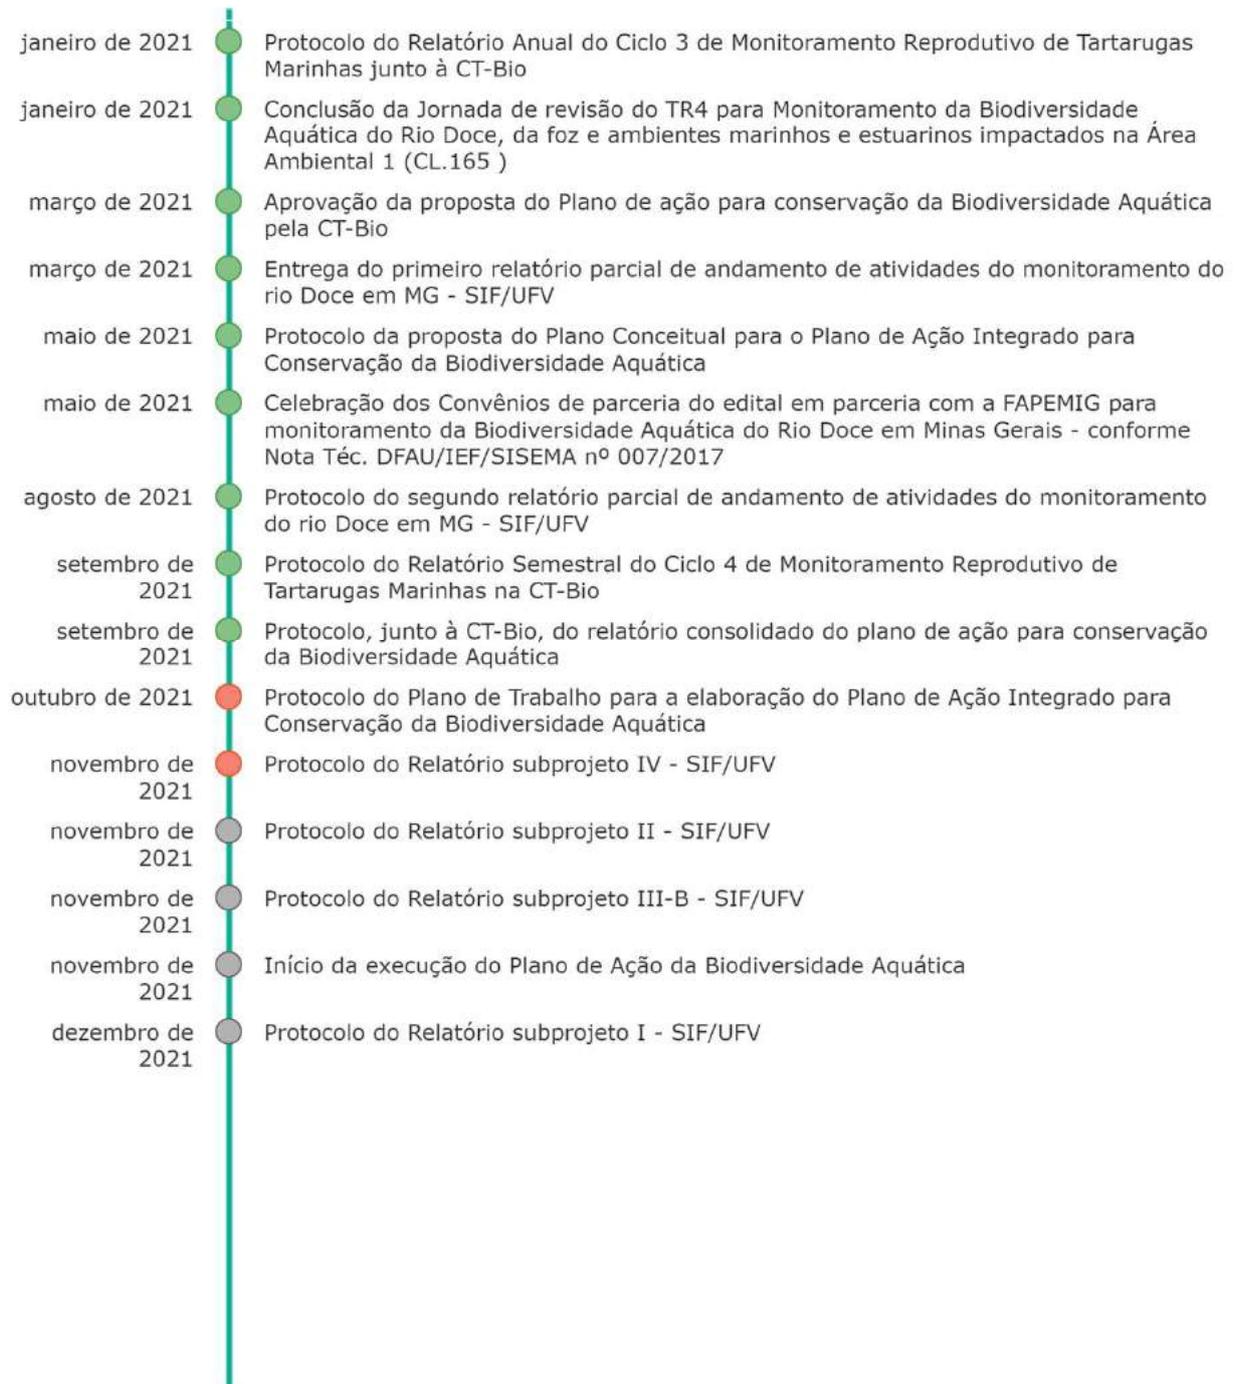

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Anual do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
- outubro de 2021 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 (exceto Monitoramento das Tartarugas Marinhas) - TR4 - Ciclo 3
- dezembro de 2021 ● Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 24/09/2021, foi entregue o 4º relatório semestral de monitoramento reprodutivo das tartarugas marinhas

Em 08/09/2021, foi enviado ofício em atendimento ao item 3 da deliberação CIF nº 461.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484		Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

setembro de 2021	●	Conclusão do Projeto Básico do CETRAS ES
outubro de 2021	●	Aprovação do orçamento do Programa pelo CIF
dezembro de 2021	●	Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 30/09/2021 foi entregue o Projeto Básico Arquitetônico do CETRAS-ES

Em 20/09/2021 foi realizada a apresentação do Orçamento e Parecer Técnico do CETRAS – MG

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- fevereiro de 2021  Protocolar Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
- junho de 2021  Entrega do Plano de Trabalho para execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Terrestre
- agosto de 2021  Protocolar na CTBio relatório e matriz de monitoria 1 do Plano de Ação

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.**

Fatos relevantes do mês

Em 22/09/2021 foi protocolada a revisão geral de Definição do Programa 30 em atendimento à Nota Técnica nº 02/2021/ CTBio/DIBIO/ICMBio

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01-Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI)
junho de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Colatina COLESOB26-Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE
outubro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá
outubro de 2021		Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESA001-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB13-Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOESCT01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02-Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
novembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Marliéria MREESCT01-Aquisição de terreno
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB14-Execução de obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Vila Bagueira
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do pleito de Resplendor RESRSPM01-Elaboração de estudos ambientais para a formalização do processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês **09/2021** , **foram repassados R\$ 2.558.322** para ações dos municípios*;
- No mês **09/2021** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **09/2021** a equipe técnica realizou **71 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

*Repases para ações dos municípios de Ipatinga, Dionísio, Galiléia , Linhares, Pingo D' Água, Rio Doce e São Domingos do Prata.

Fatos relevantes do mês

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ R\$ 464.092,51, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário.

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 62.411,12, referente a construção de SES para o distrito de Matadouro;

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 167.648,48, referente a construção de SES para o distrito de Jorge;

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Pingo D'Água, no valor de R\$ 21.137,69, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 458.535,71, referente a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel;

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 166.766,23, referente a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário localidade de Vila Bagueira;

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ R\$ 1.055.782,20, referente a obras de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto;

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R\$ 81.117,86, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;

Em setembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 80.830,35, referente a implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos;

Indicadores

Nota: Durante a 31ª Reunião do Comitê Interfederativo, que deliberou a aprovação da Nota Técnica CT-SHQA nº 24/2018 (Deliberação CIF nº 224/2018), a Fundação Renova se manifestou contrária ao procedimento adotado para aprovação da mesma. Foi registrado em ata desta reunião que a Fundação se manifestaria. A Fundação Renova se manifestou ao CIF/CT-SHQA por meio do ofício OFI.NII.012019.497, em 02/01/2019 e até o momento não se teve retorno deste Comitê. Além disso, em novembro/2019, foram realizadas oficinas de revisão dos Programas com participação de representantes da Fundação Renova e CT-SHQA. O resultado dessa oficina culminou na Definição do Programa 2020, protocolada em 29/10/2020, mas que até o momento também não teve resposta da CT-SHQA/CIF.

Em julho de 2021 foi emitido pela auditoria externa independente o Relatório de Acompanhamento do Programa, Ciclo 2, que apontava três itens relativos aos indicadores.

Como Plano de Ação a Fundação Renova informou que iria "agendar reunião com a CT-SHQA para definir/formalizar quais os indicadores o Programa 31 deverá adotar, considerando que até o momento não se teve resposta sobre a Definição do Programa e manifestação protocolada pela Fundação Renova. Após o alinhamento da reunião, Fundação Renova irá detalhar os indicadores acordados e protocolar junto ao CIF."

Para dar início ao Plano de Ação a Fundação Renova protocolou junto ao CT-SHQA/CIF o ofício FR.2021.1064, em 08 de julho de 2021, solicitando para a próxima Reunião Extraordinária da CT-SHQA pauta para tratarmos sobre os indicadores do PG31. Aguardamos a manifestação da CT-SHQA para definição de como apresentar os indicadores do Programa do presente Relatório.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	4	Judicializado

Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado
Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Grandes números do Programa

- 13 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 10 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);
- 15 estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes superficiais e subterrâneas).

Fatos relevantes do mês

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.

Indicadores

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da judicialização.

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

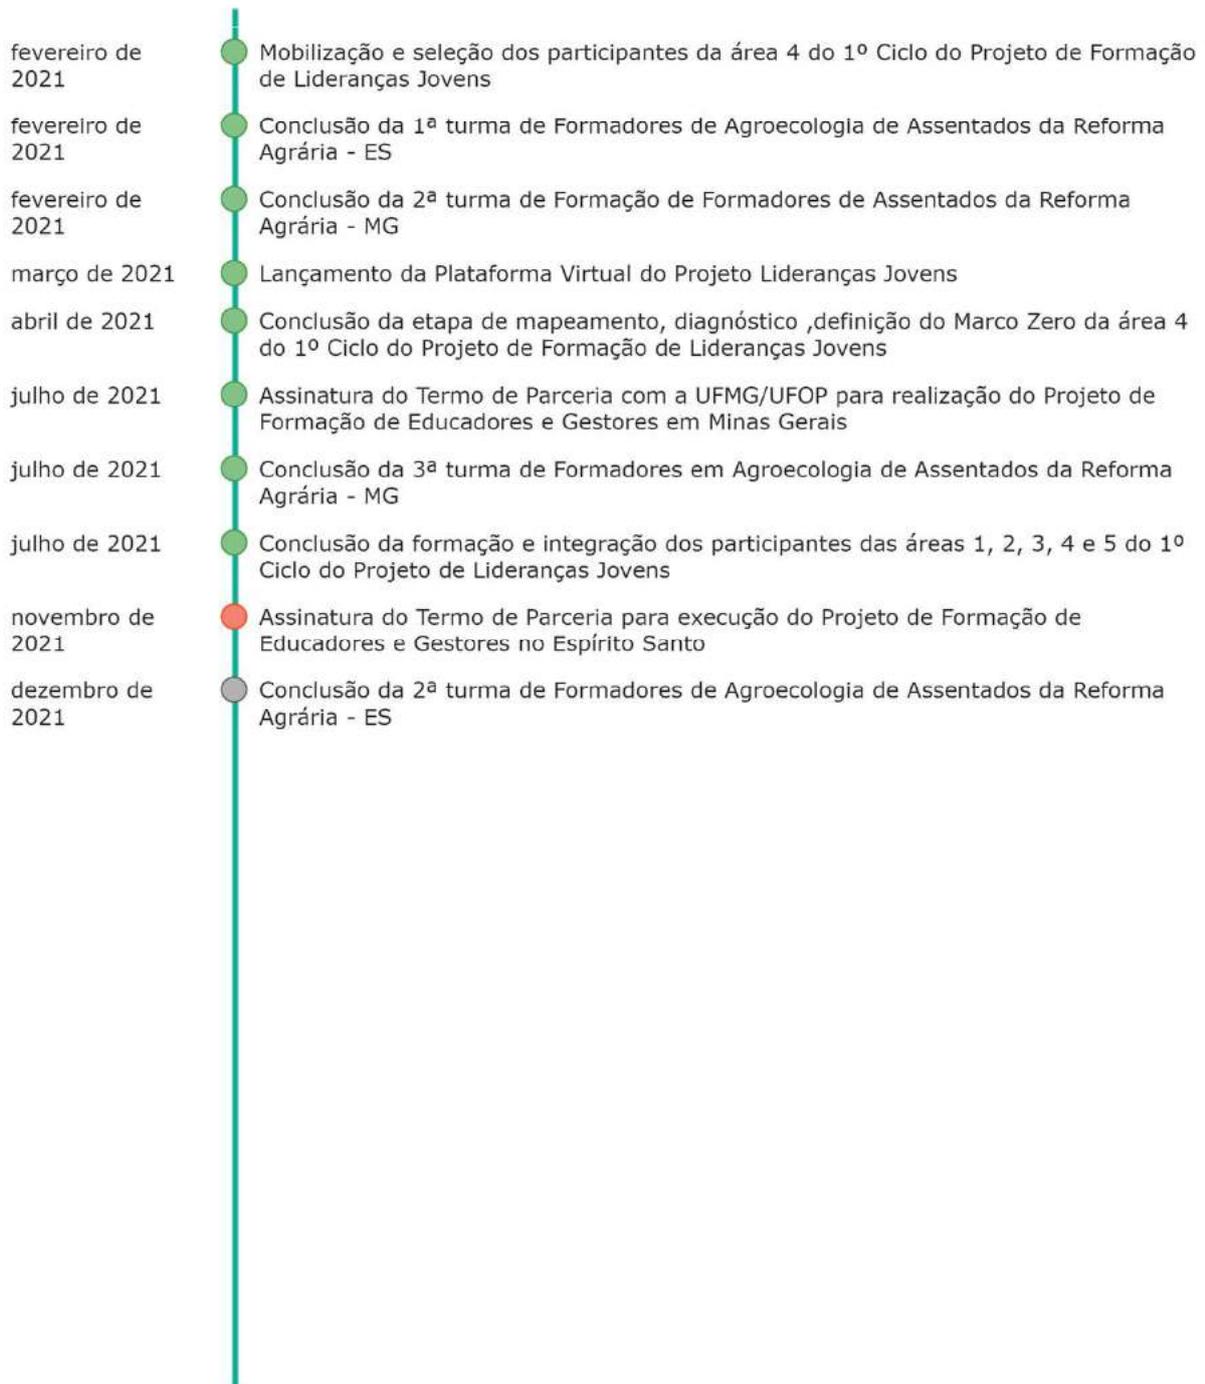

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores



Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021	 Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
novembro de 2021	 Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação de professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde de 2021 nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021	 Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

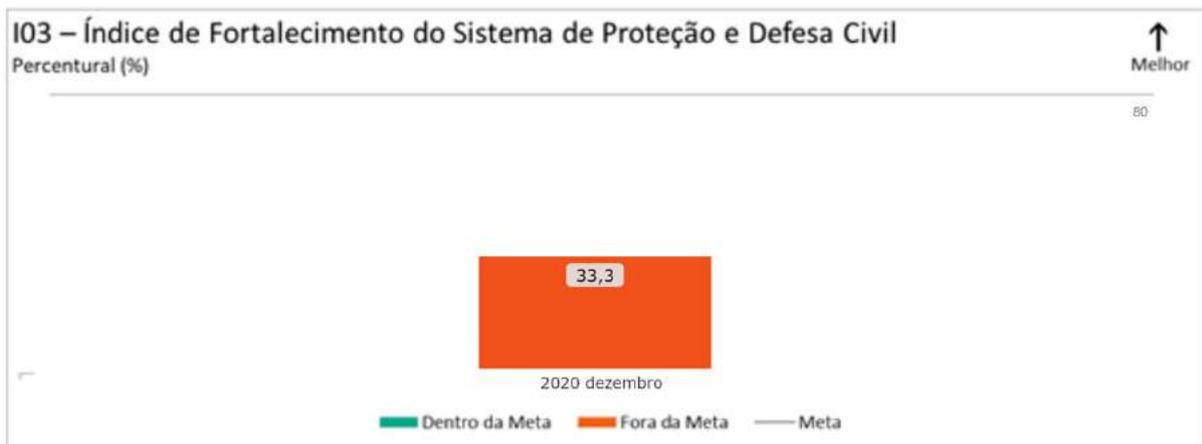


Gráfico 1. Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Frequência anual.



Gráfico 2. Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis. Frequência anual.

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/21

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Concluído Internamente
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente

Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	● Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
julho de 2021	● Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
julho de 2021	● Finalização da Implantação do Repositório Técnico
novembro de 2021	● Aprovação da Definição do Programa pelo CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

Em 1º de setembro de 2021 foi realizada a reunião de Kick-off com a empresa Digital Pixel para início da prestação de serviço de manutenção da Plataforma Interativa DP.

No dia 02 de setembro de 2021 for realizada a reunião entre a equipe do PG35 e a Prefeitura de Governador Valadares para devolutiva sobre solicitação de inserção do Museu da Cidade no CIT GV.

No dia 20 de setembro de 2021 a Fundação Renova enviou o Ofício FR.2021.1505 para o ICMBio solicitando agenda para 06/10/2021 para atualizações sobre a parceria e continuidade das ações com o instituto.

Dentro das ações de Descentralização e Itinerância, foram realizadas 04 (quatro) Oficinas Trilhas de Memórias no mês de setembro, a saber: 15 e 16/09/2021: Espírito Santo; 21 e 22/09/2021: Mariana; 28 e 29/09/2021: Calha do Rio Doce.

No dia 16 de setembro de 2021 as equipes dos Programas 35 e Programa 12 fizeram uma reunião com o objetivo de trocar informações e promover alinhamento e convergência das ações de território realizadas por eles, bem como, para democratizar o acesso aos resultados delas na Plataforma Interativa.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa encontram-se em revisão junto à CT-PDCS, após realização de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas e equipe do programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	530	1	Planejado

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	agosto de 2021	setembro de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	233.836	222.151	2.668.400	6.265.426
Documentos no site (mês)	5	3	58	424
Notícias Publicadas (mês)	24	16	116	856
Vídeos (mês)	11	7	85	531

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

▲	INDICADOR	agosto de 2021	setembro de 2021
	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	166.390	154.459
	I02 – Visualizações de páginas de serviço	30.486	30.470
	I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	55.443	38.689
	I05 – Alcance Orgânico Facebook	39.725	26.562
	I06 – Visualizações no Youtube	10.419	14.595
	I03 – Tempo de resposta	11,00 Horas	8,13 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Reprogramado
Deliberação	313	2	Concluído Internamente

Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente
Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Nov/20
janeiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Dez/20
março de 2021	●	Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Colóides do período seco
março de 2021	●	Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jan/21
março de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021	●	Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021	●	Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021	●	Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Colóides do período chuvoso
maio de 2021	●	Plano de ações do período chuvoso 2020/2021 finalizado
junho de 2021	●	Protocolo do Relatório Quadrimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Out/20 a Jan/21
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
outubro de 2021	●	Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Abr/21 a Jun/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- novembro de 2021 ● Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jul/21 a Set/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentorioce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são 56 pontos de monitoramento, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 22 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21

3º Boletim do monitoramento da qualidade da água para consumo humano protocolado na CT Saúde

Indicadores

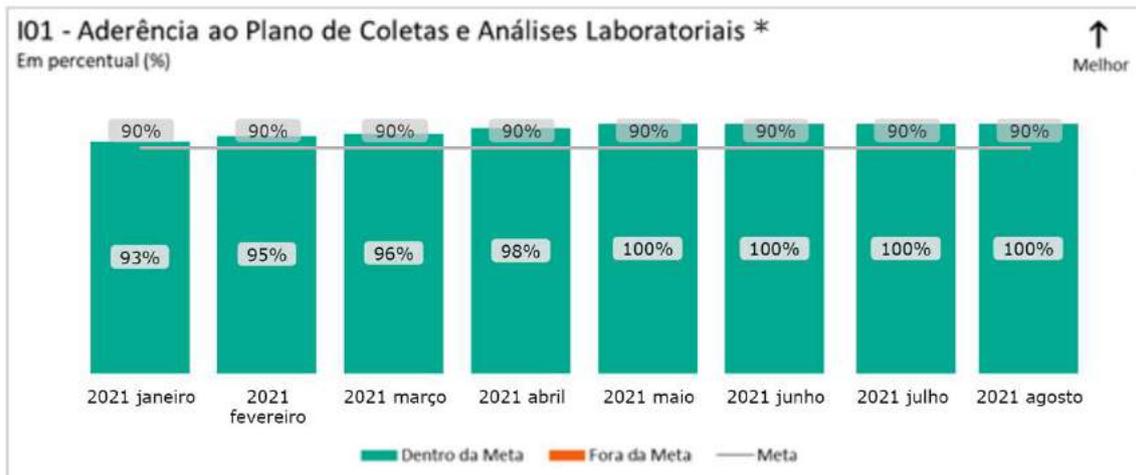


Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

**O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.*

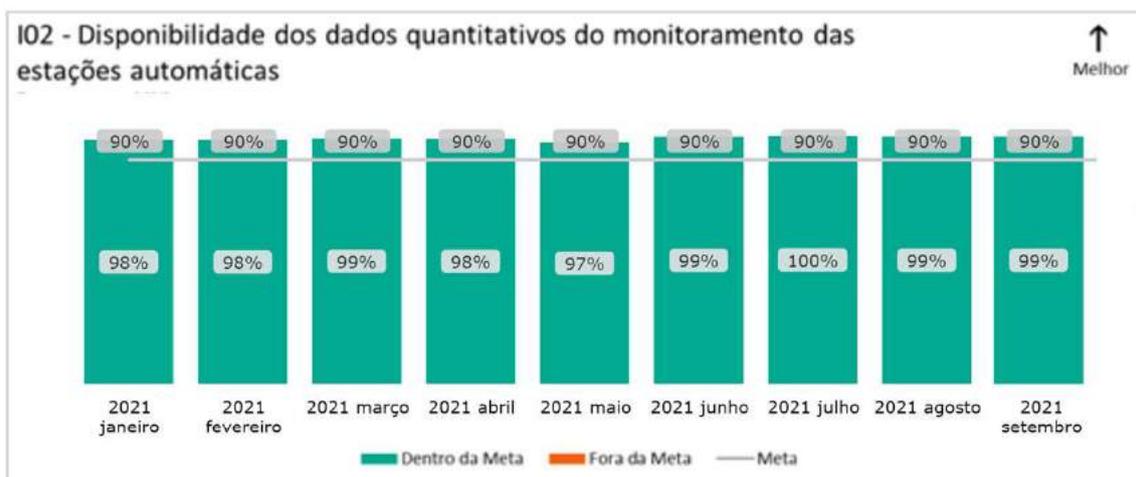


Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores

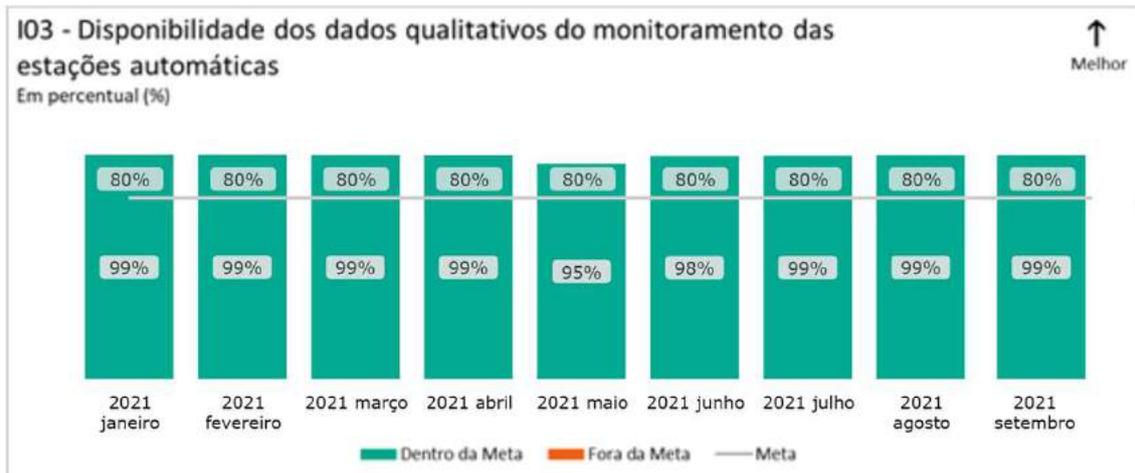


Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal



Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

**O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.*

** Devido ao arredondamento, segue o detalhamento dos percentuais de Julho/21: 99,98% e Agosto/21: 99,99%*

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexos causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Em Andamento
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

abril de 2021	●	Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
abril de 2021	●	Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano I - Consolidação PERD
setembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA PERD
outubro de 2021	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
outubro de 2021	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA PERD
novembro de 2021	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
novembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
novembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Final AIA PERD
novembro de 2021	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
dezembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
dezembro de 2021	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 13/09/2021, foi protocolado o relatório preliminar de AIA do PERD

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- outubro de 2021  Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- novembro de 2021  Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021  Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

275 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 25 (9,1%) imóveis declinaram e 242 (88,0%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 192 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

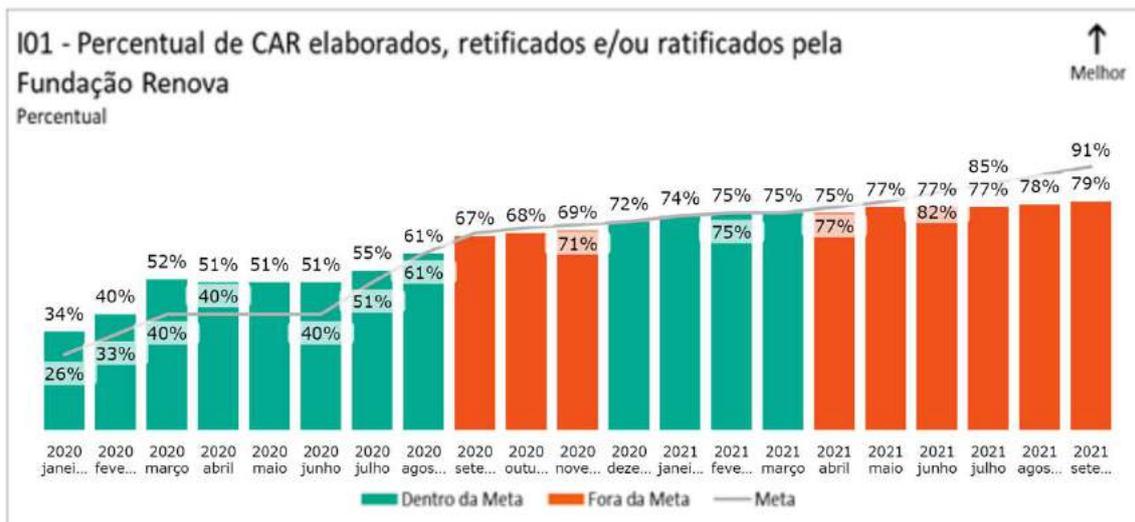


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Reprogramado
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Em Andamento
Deliberação	254	2	Reprogramado
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

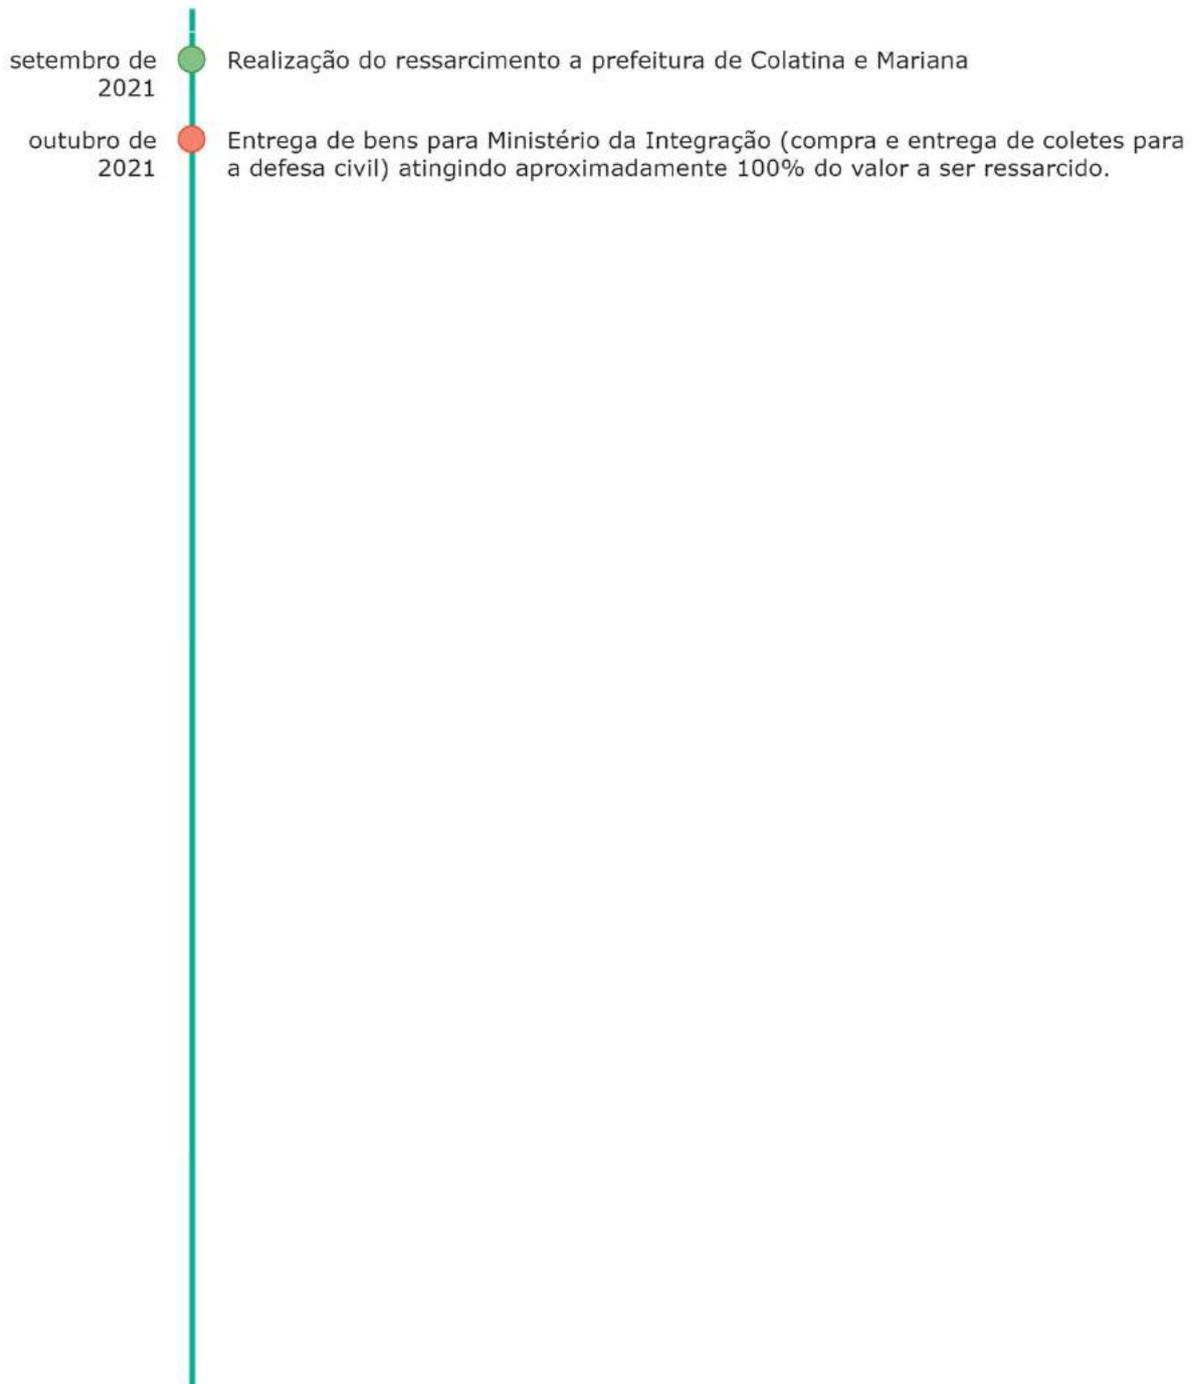

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 18 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 54,0** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,4** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Ressarcimento a Mariana, referente aos gastos extraordinários, realizado em Setembro de 2021, possibilitando a conclusão da cláusula 142.

Realização de entrega de 2 lotes, 2703 coletes, totalizando 5103 unidades, referente ao ressarcimento ao órgão comprometente Ministério da Integração, em Setembro de 2021.

Indicadores

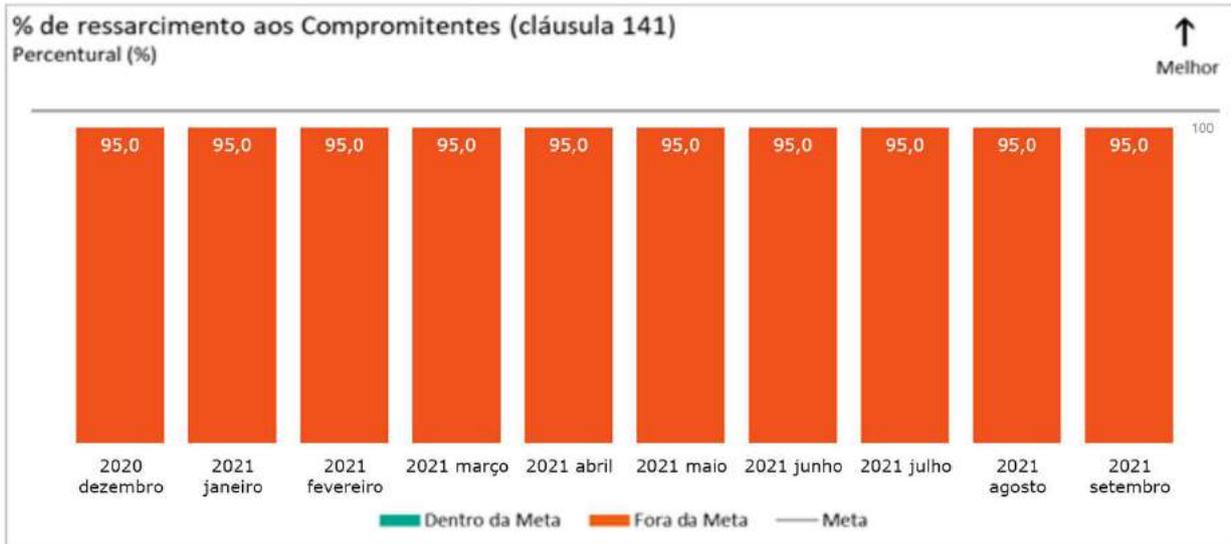


Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

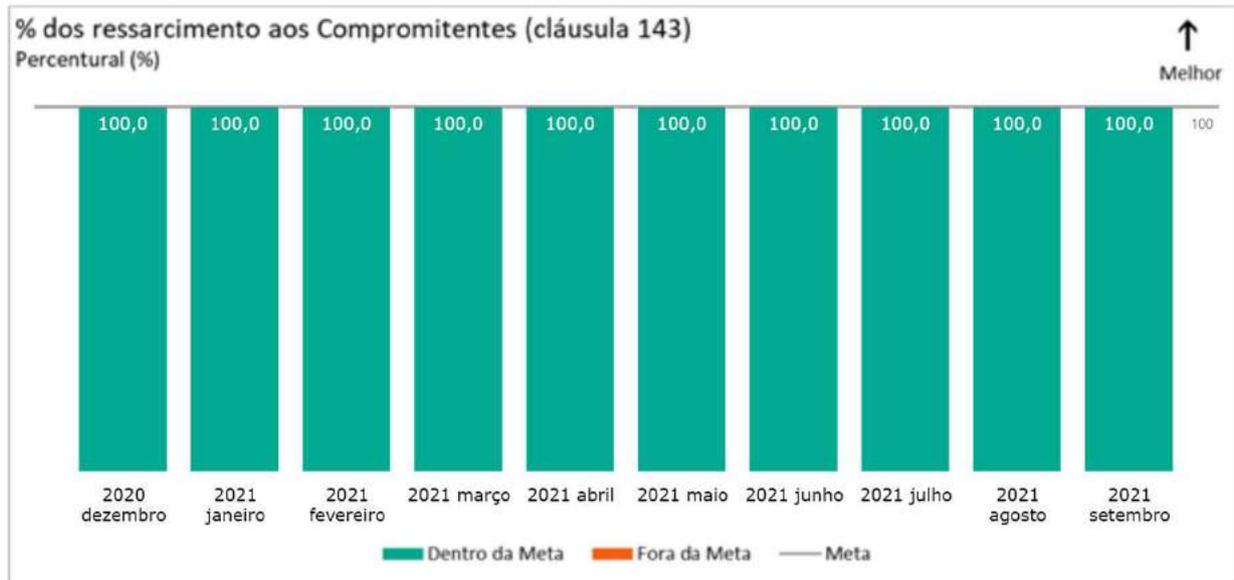


Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas até setembro de 2021.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. **ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. **MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. **MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. **PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. **PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. **PROGRAMAS:** são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.


XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

Taxa de acidentes registrados

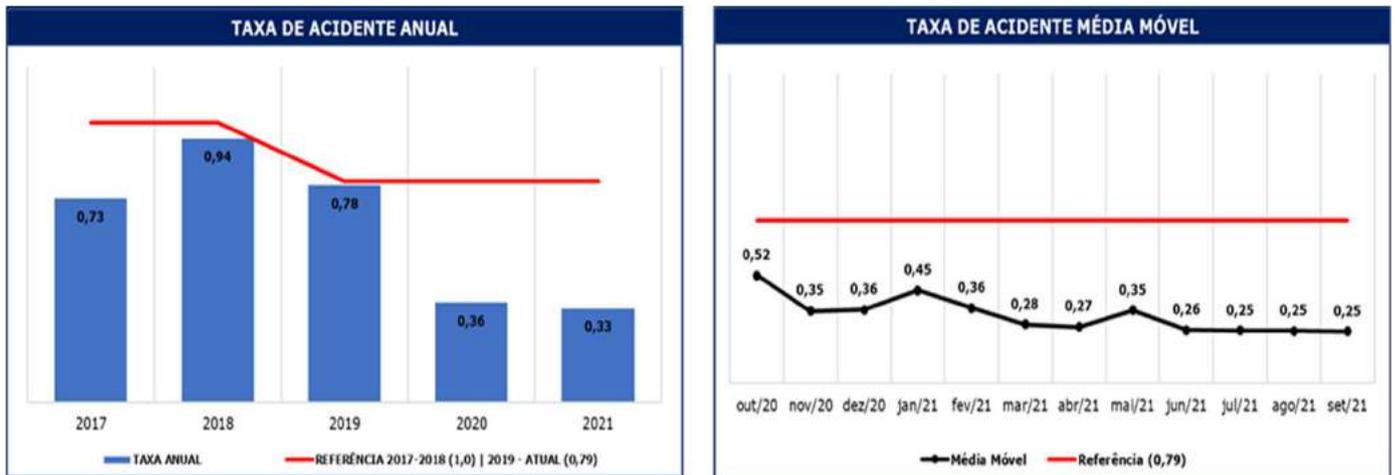

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	3,3 -	11,8	-78%	10,0	3,3 -	6,7	-67%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,7 -	4,3	-87%	3,7	0,7 -	3,0	-82%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	2,8 -	11,8	-81%	10,7	2,8 -	7,9	-74%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	1,1 -	5,7	-83%	4,7	1,1 -	3,6	-76%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	14,6 -	37,0	-72%	37,9	14,6 -	23,2	-61%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	8,0 -	12,6	-61%	14,6	8,0 -	6,5	-45%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	1,3 -	11,8	-90%	9,3	1,3 -	8,0	-86%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	14,9 -	41,6	-74%	40,3	14,9 -	25,4	-63%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	26,9 -	36,1	-57%	50,6	26,9 -	23,7	-47%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	3,8 -	14,4	-79%	11,7	3,8 -	8,0	-68%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	2,7 -	13,2	-83%	11,7	2,7 -	9,0	-77%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,3 -	6,7	-96%	5,4	0,3 -	5,1	-95%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	0,9 -	1,3	-60%	1,8	0,9 -	1,0	-52%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	19,4	18,2 -	1,2	-6%	4,5	18,2	13,7	303%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,4 -	2,1	-82%	1,5	0,4 -	1,1	-71%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	543,7	93,8	21%	432,3	543,7	111,5	26%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	643,7 -	117,9	-15%	650,7	643,7 -	7,0	-1%

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,5	0,2	1,3	-88%	Edital Doce: O projeto ficou paralisado em função da pandemia, no entanto, desde 12/2020 tem acontecido a formalização gradual para início dos projetos selecionados. A previsão feita no orçamento está baseada no repasse do recurso ao proponente, no entanto, a baixa contábil é feita após a prestação de contas dos projetos apoiados, o que gera o desvio. Valorização das Referências Socioculturais: Projeto em execução, mas estava sendo medido em DR diferente, reclassificação solicitada.
PG15	INOVAÇÃO	0,4	0,1	0,3	-77%	- Projeto Pesquisa e Desenvolvimento do Herbicida Orgânico não foi aprovado e está cancelado. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Empreende Rio Doce não iniciado (em processo de contratação). - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17 gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%).
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	1,1	0,4	0,7	-68%	- O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado pelo CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21) e seguirá para aprovação interna, após correção de valor pela Prefeitura de Mariana. - O projeto Fortalecimento do Laticínios Mariana foi cancelado e está sendo reformulado pela equipe técnica.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,7	0,1	0,6	-88%	- Paralisação da obra Casa do Empreendedor por decisão judicial. - Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das contratações locais. - Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 e impede a maior parte das atividades presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17 é de R\$ 3,3 milhões (redução de 51%).
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	4,6	2,1	2,4	-54%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda em escala reduzida.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,9	0,9	1,0	-53%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda em escala reduzida.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,5	0,3	1,2	-83%	- Despesas Diversas - Rateio contrato administrativo. - Engenharia, Construção e Gerenciamento - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Consultoria Construção CETRAS - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	6,7	1,4	5,3	-79%	- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	5,7	2,1	3,6	-63%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,6	0,7	0,0	3%	- Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. 1º repasse já realizado, mas somente será contabilizado após prestação de contas, sem ser uma parceria. - Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos necessários, não estão ocorrendo novos repasses.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,7	0,4	1,3	-78%	Postergação: - Construção das sedes das Defesas Cívicas e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada; - Projetos APOIO A DEFESA CIVIL, ESCOLA SEGURA, NUPDEC (Contrato H3M): Postergação e suspensão de atividades presenciais durante o período de Pandemia. Economia: Não se aplica.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,5	0,0	0,5	-91%	- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. Solicitado em julho/21 ajustes nos projetos para validação do Iphan. Realizada reunião com a Prefeitura Municipal em agosto/21, que posteriormente solicitou que o CIT fosse instalado em outro imóvel. - CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Análise topográfica do terreno indicado pela prefeitura municipal de GV, denominado Pça. Getúlio Vargas, concluída. Terreno aprovado, revisão do Projeto Conceitual em andamento. - CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/ conceitual/executivo, considerando a inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMbio. Previsão para recebimento dos projetos em 27/10 para solicitação de orçamentação.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,1	0,0	-31%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,4	-	0,4	-100%	Mudança de estratégia - Pagamento da 1 parcela do Acordo de Cooperação PERD - (APRO 223/2020) - Refúgio de Vidas Sivestres (RVS) - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,3	0,1	0,2	-69%	Replanejamento de atividades em função da pandemia, em função da postergação do início das atividades de ATER. As atividades no médio e baixo Doce foram iniciadas. Os Diagramas referentes a medição do CAR estão sendo inseridos por remanejamento nos contratos de ATER. Em andamento os treinamentos das Instituições de ATER para o CAR, PTIP (Projeto) e Collector (ferramenta do geoprocessamento). As curvas foram revistas nos Drafts 17 e 18. (-R\$25,3MM) Acordos ainda não firmados/homologados novas áreas e não realizado residência em gestão pública MG ES (+R\$11,1MM) Realizado pagamento retroativo a ago/20 da perícia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	5,6	154,8	149,1	2640%	(-R\$23,7MM) Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUS). (+R\$150MM) Realizado repasse R\$ 150 MM Apoio Saúde para os estados de MG, ES e Municípios MG. Valor estava previsto em 2020 e somente realizado neste mês set-21. (-R\$0,7MM) Ações socioeconomia Covid-19: ações suspensas; em reavaliação de estratégia
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-
Total Compensatórios		33,4	163,5	130,1	389%	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
PG01	CADASTRO	25,3	13,3	-	12,0	-47%	24,0	13,3	-	10,7	-45%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	3.327,3	1.901,5	133%	1.185,1	3.327,3	2.142,1	181%		
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	69,0	-	58,7	-46%	94,4	69,0	-	25,4	-27%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	6,4	-	39,6	-86%	42,4	6,4	-	36,0	-85%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	3,8	-	12,8	-77%	12,7	3,8	-	8,8	-70%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	48,8	-	77,3	-61%	104,7	48,8	-	55,9	-53%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	5,4	-	1,5	-22%	5,2	5,4	0,2	4%	
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	505,6	-	507,0	-50%	665,2	505,6	-	159,6	-24%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	123,2	-	79,2	-39%	140,5	123,2	-	17,3	-12%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	53,1	-	86,1	-62%	113,5	53,1	-	60,4	-53%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	1,1	-	7,4	-87%	6,1	1,1	-	5,0	-82%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	2,8	-	26,1	-90%	20,9	2,8	-	18,1	-87%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	1,5	-	16,8	-92%	12,9	1,5	-	11,4	-89%
PG14	SAÚDE	19,7	4,0	-	15,7	-80%	14,6	4,0	-	10,6	-73%
PG16	PESCA	53,4	4,5	-	48,8	-92%	41,2	4,5	-	36,6	-89%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	57,7	-	67,9	-54%	99,6	57,7	-	41,9	-42%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	2,0	-	3,5	-64%	3,9	2,0	-	1,9	-49%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	153,7	-	63,0	-29%	214,1	153,7	-	60,3	-28%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	84,9	-	67,1	-44%	119,5	84,9	-	34,5	-29%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	1,1	0,3	37%	0,6	1,1	0,5	83%		
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	19,1	-	15,3	-44%	28,0	19,1	-	8,9	-32%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	79,5	11,1	16%	48,8	79,5	30,7	63%		
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	1,3	-	10,3	-89%	8,3	1,3	-	7,1	-85%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	74,4	-	102,9	-58%	140,8	74,4	-	66,4	-47%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%		
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	22,3	-	25,2	-53%	39,3	22,3	-	17,0	-43%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	3,8	1,0	-	2,8	-74%	2,9	1,0	-	1,9	-66%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	175,1	-	124,2	-41%	230,3	175,1	-	55,2	-24%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	0,7	-	3,2	-83%	3,9	0,7	-	3,2	-83%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1	-100%	369,1	-	-	369,1	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	4.842,6	-	53,6	-1%	3.792,3	4.842,6	1.050,3	28%	
Total Programas		5.657,8	5.486,3	-	171,5	-3%	4.443,0	5.486,3	1.043,3	23%	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%		
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	90,3	-	84,3	-48%	130,3669	90,2501	-	40,1169	-31%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	3,4	-	25,0	-88%	21,0	3,4	-	17,6	-84%
Total Despesas Administrativas		202,9	93,6	-	109,3	-54%	151,3	93,6	-	57,7	-38%
Total Geral		5.860,7	5.579,9	-	280,8	-5%	4.594,4	5.579,9	-	985,6	21%

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	0,5	2,7	2,2	460%	- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vitoria Mariana, que foram renegociadas para trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, tais como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2, atraso e redução do volume de laudos previstos na metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel. O orçamento atual é baseado no DRAFT 16 e considerava o cenário previsto no primeiro semestre de 2020.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	113,3	889,5	776,2	685%	- A retomada do ritmo das homologações do Novel refletiu diretamente no valor realizado de indenizações em setembro, com o alcance do maior número de pagamentos da série histórica. Foram pagos mais de R\$ 870 milhões em acordos no mês de setembro, superando o maior volume mensal pago, realizado em agosto. - O desvio das frentes de indenizações fora Novel continua negativo, pela realização a menor em relação ao previsto, com destaque para Pescadores Juparanã, Danos de agropecuária e Dano Moral/Indenizações de Barra Longa.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,1	7,5	2,6	-25%	- As ações de revisão do programa, atividades do SAA (Tupiniquim-Guarani e Comboios) em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impactos de cronograma em função da pandemia de COVID-19; - Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento; - Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim-Guarani) encerrado em julho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021; - As ações de monitoramento social remanejadas para execução do PBAI.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	4,6	0,7	3,9	-85%	- As inclusões previstas para o AFE não foram concretizadas. A FR está em nova fase de gestão para o AFE e modalidade de pagamento; - As atividades de apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e consultoria para indenização não foram iniciadas devido a mudança de escopo de execução do programa; - As ações de monitoramento social estão em fase de reelaboração estratégica da gerência; - Planejamento Integradores estão em fase de reelaboração estratégica da gerência; - Os pagamentos da Indenização que estavam inicialmente previstos para serem pagos pelo PG04 estão em execução pelo PG02.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	2,4	0,2	2,2	-92%	- Plano Mariana: insumos para oficinas não fornecidos devido à paralisação decorrente da Covid-19 (pandemia); valor orçado para RH foi maior do que o realizado, visto substituição por RH com contrato municipal (fornecedor Contexto); prestação de contas do 1º repasse não realizada, o valor só é contabilizado no Financeiro com a baixa da prestação de contas. - Plano Barra Longa: insumos para oficinas não fornecidos devido à paralisação decorrente da Covid-19 (pandemia); saldo DR maior do que o Termo de acordo firmado com o município (draft 16) - reprogramado no Draft 17. - Plano Demais Municípios: atraso na assinatura de acordos com alguns municípios; desalinhamento do cronograma físico e financeiro (ajuste já realizado no cronograma físico em abril e no orçamento do Draft 17); em decorrência da Covid-19, a capacitação foi realizada com metodologia online (sem necessidade de custo com logística), reduzindo custo total previsto e não realização da capacitação para os municípios de MG (em processo de negociação com MG); insumos para oficinas não adquiridos pelos municípios devido à paralisação decorrente da Covid-19 (pandemia). - Planos estaduais: atraso na homologação do acordo com o estado de MG/Sedese. - Revisão contratual de "Equipe Dedicada Territorial" com diminuição de escopo (exclusão de veículos e escritórios). - Redução no número de famílias beneficiadas com cestas básicas por terem sido contempladas via Novel. - Orçamento previsto para 2ª fase do cadastro ainda não iniciado.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	8,0	4,0	4,0	-50%	- Diálogos – Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$6,7MM): Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade remota o que acarreta uma economia no processo. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social em decorrência das atividades remotas. - Canais de Relacionamento - Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$6,9MM): Permanência dos escritórios CIAS fechados. Cancelamentos de contratações de serviços para os CIAs. Redução da equipe de profissionais dos contratos dos CIAs em decorrência das atividades remotas. Para os escritórios dos CIAs encontra-se em estudo o processo de readequação das estruturas e reabertura dos espaços gradual a partir do próximo período. - Comunicação - Economia (R\$4,5MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. Verba de consultoria postergada entre 2º semestre 2021/22 Draft 17, aguardando realização de pesquisa. - Ouvidoria - Economia (R\$ 0,0 MM): não houve desvios significativos no orçamento para o período. - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 37,5MM): pagamentos judicializados, aguardando parecer.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,8	0,2	30%	- Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadoras (EBJ Assessoria - Contrato 48000033657; e PROGEN - Contrato 48000033410)

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG08	REASSENTAMENTO	67,7	56,8	-10,9	-16%	<ul style="list-style-type: none"> - Novas Moradias Bento (+44,5): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Custos Covid (-40,5): Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Adutora ETE/ETA Paracatu (-26,9): Revisão Escopo da Adutora - Processos em Contratação - Revisão do cronograma conforme LB previsão início atividades - ago/21; - Engenharia (-18,5): Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas à preço global; - Equipamentos Públicos Paracatu (-15,9): Postergação do início das atividades: Escola - previsão de montagem até jul/21, custos serão contabilizado até ago/21. Demais equipamentos públicos, conforme Cronograma LB fev/21 - previsão fev/2022; - Infraestrutura Bento (+13,2): Serviços para término da infraestrutura previstos no orçamento para serem concluídos em início 2021 e terminados de fato em Abril/2021. - Infraestrutura, Contêntes e instalações proviórias Paracatu (-12,5): Medições a entrar do CRP - reajuste 2, BMM's 24 e 25, serviços remanescentes que serão contabilizados até ago/21. e Novo Contrato de acordo com Cronograma LB fev/21 - previsão até jan/22.; - Contêntes Bento (-12,1): Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contêntes e não iniciada a mobilização da segunda empresa de contêntes; - Instalações provisórias Bento (-11,2): Revisão da curva de desembolso no ano; - Aquisição de Terras, Benfeitorias, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-10,7): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Adutora ETE/ETA Bento (-7,9): Aguardando aprovação da APRO para medição final dos serviços; - Gesteira (-6,7): Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Iluminação pública Bento e Construção do Trevo MG-129 (-5,3): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Gerenciamento (+4,9): parte do período de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021 - Equipamentos Públicos Bento (+2,2): Conclusão dos 3 bens públicos previstos para 2021. Aguardando alvarás para continuidade dos demais bens públicos. Aguardando aprovação do Draft 17 orçamentário.
PG09	UHE CANDONGA	15,3	9,9	-5,4	-35%	<ul style="list-style-type: none"> - Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	13,3	6,8	-6,5	-49%	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstrução das casas e propriedades rurais paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Impacto da pandemia nas atividades do programa.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,7	0,1	-0,7	-89%	<ul style="list-style-type: none"> - Transporte e Equipamentos: Não execução devido a suspensão das aulas presenciais; - Apoio Psicopedagógico e Projeto de Arte, Cultura, Sociabilidade e Prod. Saberes: Paralisação por conta do Covid-19 (contratações estão sendo adaptadas para atendimento no modelo remoto). Em relação ao Apoio Pedagógico de Mariana, ainda não houve medição (primeira medição em julho/2021)
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,5	0,3	-2,2	-89%	<ul style="list-style-type: none"> - Engenharia de Restauro de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. - Restauro de Igrejas: parceria para restauro em processo de contratação - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido à judicialização. - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: paralisação temporária, com retomada parcial das atividades em função da pandemia; - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação do órgãos competentes e em revisão - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a conclusão do plano de trabalho da UNESCO. Orçamento foi ajustado no draft 17 para refletir os gastos de forma correta e não linear.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,7	0,1	-1,6	-93%	<ul style="list-style-type: none"> - Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais. - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais. - Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: aguardando decisão judicial da 12ª vara. - Plano de Reparação de Saúde em Barra Longa: O acordo judicial firmado com o município foi menor que a previsão orçamentária; Segundo repasse teve valor menor que o previsto considerando existência de saldo do primeiro repasse. - Plano de Reparação de Saúde em Mariana: não apresentação de demanda por parte do município à Fundação Renova quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP; Não foi realizada prestação de contas em relação ao 1º repasse, portanto o 2º repasse previsto para o mês de junho (Draft 16) não foi realizado.
PG14	SAÚDE	3,6	0,2	-3,3	-93%	<ul style="list-style-type: none"> - Plano de Capacitação SUS em Mariana: solicitação do município para aguardar a posse da nova gestão municipal e atraso na realização das capacitações previstas na ACP Mariana em decorrência da Covid 19 e solicitação do município de revisão do acordo judicial. - Plano reparação demais municípios (capacitações): Capacitação postergada em decorrência da Covid e adequada para modalidade de educação a distância. Ações de mitigação de possíveis impactos nos municípios atingidos: a realização das ações depende dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico com definição de correlação com o rompimento. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) - aguardando decisão judicial da 12ª vara.

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG08	REASSENTAMENTO	103,1	75,2	27,8	-27%	<ul style="list-style-type: none"> - Novas Moradias Bento (+62,6): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Adutora ETE/ETA Paracatu (-55,6): Revisão do cronograma conforme LB previsão início atividades - ago/21. Finalização de Processo de Contratação, em aprovação de APRO - previsão de início de mobilização a partir de 15/11/2021; - Equipamentos Públicos Paracatu (-33,9): Demais equipamentos públicos, conforme Cronograma LB fev/21 - previsão mar e abr/2022; - Engenharia (-33,9): A paralisação no desenvolvimento de projetos, ocorrida no primeiro semestre 2021, somada ao atraso na liberação dos ID's interrompidos, ocasionou uma lacuna em toda a programação de atividades de Engenharia, gerando a postergação das atividades subsequentes, como bens coletivos, crosschecks, etc, ocasionando a diferença verificada na programação financeira. - Custos Covid (-30,1): Variação a menor em função da revisão da curva de desembolso no ano. Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19; - Instalações provisórias Bento (-25,3): Revisão da curva de desembolso no ano; - Iluminação pública, Infraestrutura Sítiantes, Benefeitorias, Cemitério, Equip.Públicos Bento e Construção do Trevo MG-129 (-22,2): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Aquisição de Terras, Benefeitorias, Contenções, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-20,4): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Contenções Bento (-19,2): Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contenções (PROGEO) e em processo de mobilização da segunda empresa de contenções (TECNOSONDA). - Novas Moradias Familiar (+18,6): Houve aquisições de Imóveis além do previsto para o período, bem como foi apropriado Novas Moradias do Reassentamento Familiar (16 Cartas de Creditos de um total de 28) que eram para ser apropriados em Novas Moradias de Gesteira. - Instalações provisórias Paracatu (-17,6): Medições do contrato antigo AG serão contabilizadas até ago/21; Novo Contrato de acordo com Cronograma LB fev/21 - previsão até jan/22. - Infraestrutura Bento (+16,8): Serviços para término da infraestrutura previstos no orçamento para serem concluídos em início 2021 e ainda encontram-se parte em execução. - Gesteira (-13,5): Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito. - Gerenciamento (+9,4): Parte do período de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021 - Adutora ETE/ETA Bento (+4,6): Redução no realizado em relação ao previsto, devido ao faturamento direto de vários serviços/materiais para a Fundação Renova;
PG09	UHE CANDONGA	20,2	19,8	0,4	-2%	<ul style="list-style-type: none"> - Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	11,7	6,2	5,5	-47%	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstrução das casas e propriedades rurais paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - Grande impacto da pandemia nas atividades do programa (paralisações municipais e protocolos rígidos). Draft 16 (-94%)/ Draft 17 (-53%). 41% do desvio do Draft 16 foi resolvido com o novo planejamento no Draft 17. O desvio de 53% (Draft 17) ocorreu devido: - Custo COVID: Todos os contratos foram aditados para serem realizados de forma remota (Paralisação COVID) (18,2%); - Escola Temporárias Barra Longa e Mariana: Indefinição do escopo de manutenção das escolas (Gestão/ planejamento) (30,8,%); - Apoio Pedagógico Mariana: Escolas sobrecarregadas devido o retorno das aulas presenciais (Externalidade)(3,9%);
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,6	0,3	0,3	-44%	<ul style="list-style-type: none"> - Engenharia de Restauero de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 - Restauero de Igrejas: parceria para restauero em processo de contratação, aguardando aprovação da APRO. - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido ao processo de judicialização. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: Retomada parcial das atividades em função da pandemia; Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação do órgãos competentes, impedindo o início das atividades. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a mudança de estratégia de contratação. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 - Casa dos Saberes e Horta Comunitária - Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 - Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem essencialmente presenciais.
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,7	0,2	2,5	-94%	<ul style="list-style-type: none"> - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Parque Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais. Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. - Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais. - Atraso da publicação do edital FAPES/FAPEMIG: aguardando decisão judicial da 12ª vara. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: *Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. * Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,9	0,2	1,7	-91%	<ul style="list-style-type: none"> - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : *Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487.
PG14	SAÚDE	1,1	0,4	0,8	-67%	

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG16	PESCA	5,1	0,1	5,0	-97%	Ações referente a Caminhos da Retomada: atividades não realizadas em função da pandemia, necessidade de revisão do orçamento (redução) e contratação suspensa devido o processo de revisão da estratégia dos Caminhos da Retomada; Eixo 1: Plano de recuperação da pesca e aquicultura - aguardando a conclusão do processo seletivo via Edital, para finalizar a contratação. Eixo 2: ATER ES: mudança na estratégia de contratação de concorrencial para parceria e tratativas com possível fornecedor; ATER MG: negociação quanto a capacitação e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras, via processo concorrencial; Mapeamento das potencialidades econômicas: aguardando a conclusão do aditivo de contrato para aquisição dos testes de covid, considerando os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais Geral: Oficinas Participativas: Mudança na estratégia de contratação, escopo absorvido pelo Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	11,2	7,0	4,2	-38%	- Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento). - Postergação de contratos devido à pandemia. - Medições apresentadas fora do prazo de fechamento contábil. - Atraso na aprovação da CEMIG dos projetos de instalações elétricas das infra rurais, devido a pandemia. - Postergação do débito da silagem e atraso no início ATER Território pós Candonga a Foz. - Redução no fornecimento de pipas, devido a implantação de ações pela FR de alternativas de acesso à água. - Início da redução do fornecimento de silagem no Território Alto Doce (após evidenciada a recuperação dos pastos impactados), mudança de estratégia de monitoramento de pastagens (agora realizado com equipe já mobilizada) e encerramento de contratos. - A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrato comercial; sendo que os contratos que vão dar continuidade ao escopo de reestruturação produtiva, embora já estejam contratados estão em fase inicial de execução com baixa produção (curva de mobilização).
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,5	0,2	0,3	-59%	- Segundo o Draft 16 implementado, o impacto é referente ao atraso nas contratações para os projetos do Caminhos da Retomada, devido a redefinição da estratégia das ações para marketing territorial, marketplace e também para a ação de rodada de negócios.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	24,1	15,5	8,6	-36%	- Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novo Sistema, não previstos no orçamento.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	13,1	9,3	3,7	-29%	Manejo (20,4) Postergação: Aplicação dos Plano de Manejo de Rejeito (-7,8 MM) atrasos nas contratações da empresa responsável pela manutenção da bioengenharia, assim como as contratações para recomposição de taludes e aditivo do projeto de renaturalização. Gestão das Áreas Contaminadas (-6,9 MM) em função do atraso no início das atividades de campo devido aos embargos impostos pela 12a Vara. Gestão da Qualidade do Ar (-1,2 MM) em função de postergações de medições. Custos Gerais (-2,3 MM) serviços sob demanda que não foram necessários no período. Economia: Custos Gerais (-2,3 MM) transferência de despesas de auditoria à Samarco. Barramento Linhares (14,6) Postergação: redução das atividades medidas (alçamento); engenharia menor demanda do que planejado.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,5	0,5	721%	- Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, sem execução de serviços no período, conforme planejado.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,0	2,1	0,9	-30%	- Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas dentro do mês de competência. - Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à pandemia e consequente aditamento do contrato atual. - Parcerias (UFV Tecnossolos e Prof. Venâncio) que passaram e/estão passando por aditivo e portanto tiveram seus cronogramas de desembolso impactado e deverão ser reprogramados.
PG28	BIODIVERSIDADE	3,7	34,5	30,8	839%	- Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial. - Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG16	PESCA	7,1	0,8	-6,3	-88%	<p>Ações referente a Caminhos da Retomada: atividades não realizadas devido a revisão do orçamento, foi revisto juntamente com a estratégia dos Caminhos da Retomada no Draft 17. Eixo 1: Atraso na execução das atividades de campo devido a pandemia.</p> <p>Eixo 2: ATER ES: mudança na estratégia de contratação de concorrential para parceria e tratativas com possível fornecedor; ATER MG: negociação quanto a capacitação e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras, via processo concorrential; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na execução das atividades em campo, devido a pandemia de covid-19. Necessidade de aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança, estabelecidos pelo comite central. Edificação de povoação: Declínio da empresa cotratada, para elaboração do projeto executivo. Apartir do mês de julho o processo segue sob responsabilidade da Infraestrutura FR; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais; Projeto Miniestação: Houve a necessidade de readequação da documentação contratual por um especialista em energia fotovoltaico. Início da elaboração da RT, QQP e PT.</p> <p>General: Oficinas Participativas: Mudança na estratégia de contratação, escopo absorvido pelo Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura</p> <p>- Impacto nos contratos devido a paralisação nas obras de Barra Longa, no prazo de 27/05 a 15/06. Baixa performance da contratada causando atrasos no cronograma e medição. Devido a baixa performance, esse contrato será substituído, já em concorrência pelas SR's SR286644105 / SR286644161.</p> <p>- Os débitos da Fundação Renova em relação a contas de luz impactaram diretamente no processo de aprovação dos projetos pela CEMIG. Suprimentos voltou com o vendor list devido a baixa adesão de empresas a adesão no processo concorrential.</p> <p>- Postergação/adequação das atividades devido a pandemia e paralisações devido a decretos municipais.</p> <p>- A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrato comercial e ainda não encerrado formalmente.</p> <p>- Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram ao reassentamento).</p> <p>- Em andamento plano de redução da silagem no Alto Rio Doce.</p> <p>- Medições pendentes por falha nas instituições na prestação de contas e mobilização das atividades.</p>
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	10,4	10,4	0,0	0%	<p>- Segundo o Draft 16 implementado, o impacto é referente ao atraso nas contratações para os projetos do Caminhos da Retomada, devido a redefinição da estratégia das ações para marketing territorial, marketplace e também para a ação de rodada de negócios.</p> <p>- Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novel Sistema, não previstos no orçamento.</p>
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,7	0,5	0,2	-24%	
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	23,1	14,1	9,0	-39%	
PG23	MANEJO DE REJEITOS	11,3	13,8	2,5	22%	<p>Manejo (17,1) Postergação: Aplicação dos Plano de Manejo de Rejeito (-10,1 MM) atrasos na mobilização da empresa responsável pela manutenção da bioengenharia, assim como nas contratações para recomposição de taludes Romildo e Nazareno e execução da recuperação das lagoas marginais, postergando os fluxos de desembolsos. Gestão das Áreas Contaminadas (-10,1 MM) com a impugnação da GAISMA pela judicialização do Eixo 2, foram iniciadas novas tratativas com a CT Rejeitos sobre as metodologias e premissas para este escopo. As revisões de planos e bases teóricas estão atualmente em fase de revisão para protocolo junto à CT (deliberação 524) e as atividades serão retomadas após a homologação; Gestão da Qualidade do Ar (-1,5 MM) em função da não utilização de serviços e equipamentos sob demanda. Custos Gerais (-7,3 MM) serviços sob demanda que não foram necessários no período (engenharia, estudos, comunicação, licenciamento, peer review) totalizam desvio de -2,9 MM; exclusão do escopo de conscientização ambiental -0,2 MM; escopo de auditoria AECOM transferido para Samarco -2,9 MM e realizado gerenciamento abaixo do previsto -1,3 MM.</p> <p>Gestão das Áreas Contaminadas (+11,9 MM) em função do pagamento da perícia adicional AECOM homologada para o eixo 6 não previsto.</p> <p>Barramento Linhares (17,4) Postergação: redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor demanda do que planejado.</p>
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,2	0,2	267%	<p>- Execução acima do previsto com a elaboração dos estudos de alternativa de descomissionamento em atendimento ao termo de referência enviado pela AECOM (avaliação da remoção parcial ou total do dique e recuperação da área alagada a montante).</p> <p>- Previsto contrato com Gessois que não ocorreu e orçamento será utilizado em outras demandas.</p> <p>- Cancelamento da contratação dos serviços de levantamento topográfico em virtude da pandemia e consequentemente aditamento do contrato atual</p>
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,7	1,9	0,8	-29%	<p>- Medições referente aos serviços de restauro florestal (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram apresentadas pela contratada. Para o mês de agosto o houve um problema no sistema SAP/FIORI (uma divergência de lançamentos devido ao aditivo do contrato do Consórcio), sendo assim a medição não caiu no mês</p> <p>- Antecipação das atividades de manutenção dos cercamentos, em decorrência das parcerias com os próprios produtores.</p>
PG28	BIODIVERSIDADE	11,8	1,6	10,2	-87%	<p>- Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial.</p> <p>- Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021, porém aprovado na APRO 232/2020.</p> <p>- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.</p>

		Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,4	0,3	1,1	-80%	-Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre e Gerenciamento do PG30 - Paralisação das atividades em virtude da Pandemia. -Execução do plano de ação - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. -Grupo Especialistas e Conscientização Socioambiental - Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	14,6	7,2	7,4	-51%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	3,0	2,5	0,5	-15%	Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com mobilização pendente de medição. Contrato Spot (ALS) com demandas não realizadas durante o período de take-off/transição 48 para 49. Parceria UNESCO com desembolso semestral. Estudo coloides com relatórios técnicos ainda não executados. Estudos/Serviços em execução mas ainda não medidos (ERG, RHAMA). Parceria com FCO/UFMG/Libânio cancelada pelo Professor. Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Contratos encerrados com saldo: ALS PMQQS e Ecology. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão orçamentária do Draft17, sendo que do PMQACH será ajustado no Draft18.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,2	0,1	0,1	-71%	Avaliação de impacto unidades de conservação: Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa devido a baixa maturidade do projeto; mudança de estratégia devido a alteração do escopo
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	24,2	21,7	2,4	-10%	- Postergação (R\$ 49,1 MM): menor medição nos contratos sob demandas de serviços devido à restrição COVID; contrato da Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (Infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 6,1 MM): menor gasto com viagens e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,1	0,3	0,2	151%	- Atraso na aquisição dos coletes em ressarcimento ao Ministério da Integração. Serão entregues apenas 6.971 coletes e o valor correspondente aos 3.792 coletes restantes será ressarcido na forma de equipamentos eletrônicos (drones, GPS, PCs) até o fim de 2021.
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	- Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16. - Esse montante foi utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		432,3	1.083,0	650,7	151%	
Total Programas		465,8	1.246,6	780,8	168%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	14,87	11,42	3,45	-23%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	1,6	0,3	1,3	-83%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		16,4	11,7	4,8	-29%	
Total Geral		482,2	1.258,3	776,1	161%	
