



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Novembro/2021

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>20</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>26</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>36</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>44</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>52</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>81</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>89</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>105</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>134</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>142</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>147</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>152</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>158</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>166</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>172</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>178</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>188</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>195</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>200</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>207</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>212</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>220</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>225</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>232</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>237</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>244</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>249</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>254</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>260</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>267</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>272</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>278</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>284</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>289</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>298</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>304</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>310</u>
Glossário	<u>317</u>
Gestão Econômica	<u>324</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento como está disposto na CLÁUSULA 05 INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em novembro de 2021 distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados em novembro houve a realocação da estação automática do PMQQS - RDO 02 (PG038 pág 289)

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce nas ações do manejo de rejeitos (PG023 pág 212) em novembro ocorreu o protocolo de uma nova versão do Relatório Técnico denominado Revitalização da Cachoeira Camargos: Consolidação das Ações de Manejo e Monitoramento e do "Plano de Caracterização revisado" em resposta aos itens 2 e 3 da Deliberação nº 544 e à Nota Técnica CT -GRSA nº 16/2021. O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009 pág 105) a qual até o mês de novembro bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007 pág 81) a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 448 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem geraram até agora 1 710 prontuários médicos com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito além da finalização da reaplicação de 15 ISA's nas propriedades aderidas no Alto Rio Doce (PG017 pág 178) No território Baixo Doce ocorreu o início da entrega dos insumos da reparação dos danos aos produtores a jusante de Candonga

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 respectivamente de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág 225) e de Nascentes (pág 232)

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001 pág 12) 34 870 cadastros foram enviados ao CIF correspondente a 30 380 famílias e 98 165 pessoas desde o início do programa até novembro/2021

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados são ações do programa (PG002 pág 20) No mês de novembro em relação à campanha de Mariana foi realizado o pagamento de 719 indenizações o que representa 98% do total das 735 propostas aceitas Quanto aos auxílios emergenciais (PG021 pág 207) atualmente existem 11 234 pessoas assistidas com um total de 7 611 pagamentos

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003 pág 26) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004 pág 36) No âmbito do programa 03 o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 1 349 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios As 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho sal mineral para bovinos e ração Em relação ao programa 04 foi realizado pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial a 162 titulares da comunidade Quilombola de Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 33 titulares das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

Os programas de Proteção Social (PG005 pág 44) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014 pág 158) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a conclusão da segunda capacitação para os municípios do ES e da quarta capacitação de Mariana para os operadores municipais de proteção social, entrega de insumos para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV para atendimentos das famílias vulneráveis de Mariana e implantação do Comitê de Avaliação com a participação dos atingidos nos seguintes municípios: Aracruz/ES, Colatina/ES, Baixo Guandu/ES e Sooretama/ES.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006 pág 52; PG035 pág 278 e PG036 pág 284) seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031 pág 254) em novembro de 2021 foram repassados R\$ 1 305 915 para ações dos municípios de Alpercata Bom Jesus do Galho Ipatinga Itueta Linhares Rio Casca Rio Doce São Domingos do Prata e São José do Goial

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010 pág 134) em novembro ocorreu a conclusão das atividades no vestiário estábulo de equinos e galpões de gado no parque de exposição de Barra Longa

A frente de reconstrução de vilas (PG008 pág 89) prevê três reassentamentos coletivos Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo em Mariana e Gesteira no município de Barra Longa (MG) bem como o reassentamento familiar que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos

A seguir são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de novembro:

Bento Rodrigues a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada mês Em novembro ocorreu o início da execução de 8 edificações pela empresa Cardan: ID's 173 CC 41 226 181 UH1 181 UH2 123 CC 123 NN 123

Paracatu de Baixo em novembro houve o início das construções das edificações dos ID's 37 41 e 46

Gesteira em novembro não houve fatos relevantes a serem reportados

Reassentamento Familiar e Reconstruções Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem) Em novembro o ID 31 foi recebido pela família

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC). As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas, voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente

Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 112.578 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.870 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.380 famílias e 98.165 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Avanço no Cadastro de Mariana
conforme dados abaixo:
Total de Cadastros Liberados: 1.365
Total de Pesquisas Aplicadas da
Lista de 2019 (Universo de 79): 89
pesquisas realizadas
Total de Pesquisas Aplicadas da
Lista de 2020 (Universo de 184):
139 pesquisas realizadas

Indicadores

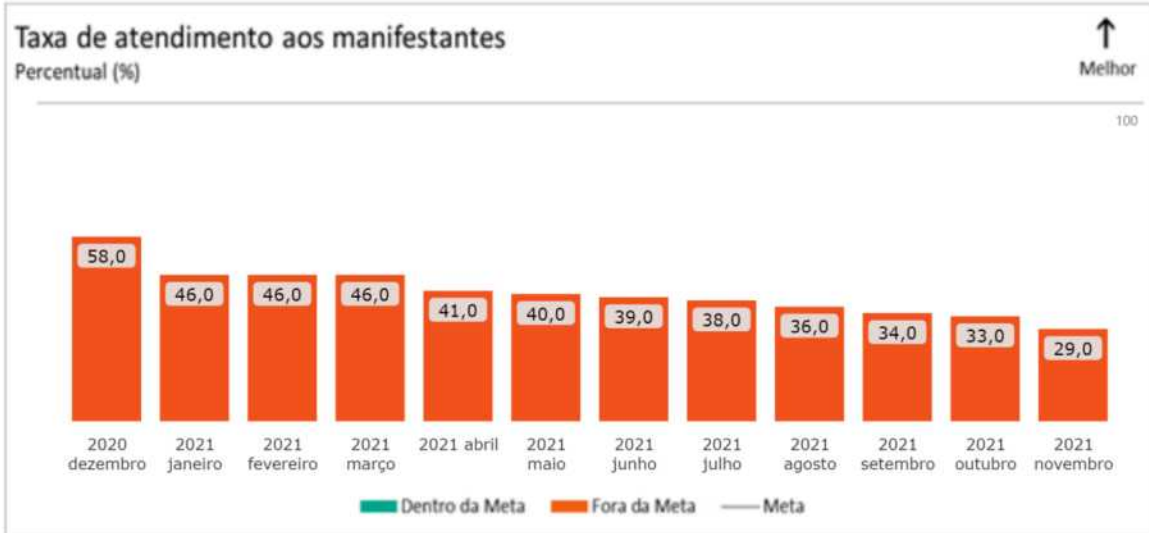


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado




Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado

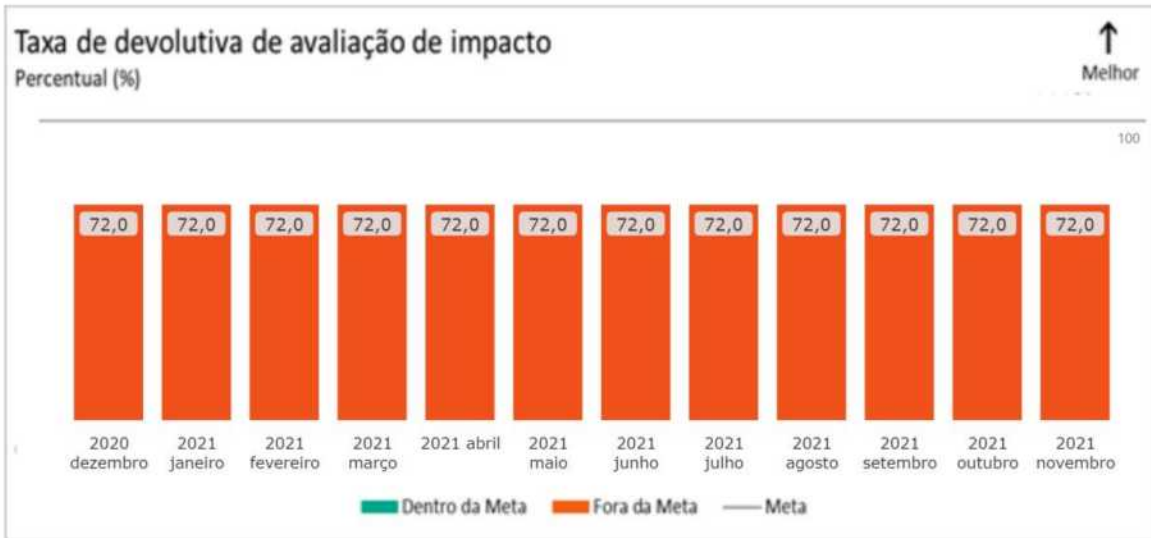


Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado.




Gráfico 4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.




Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado

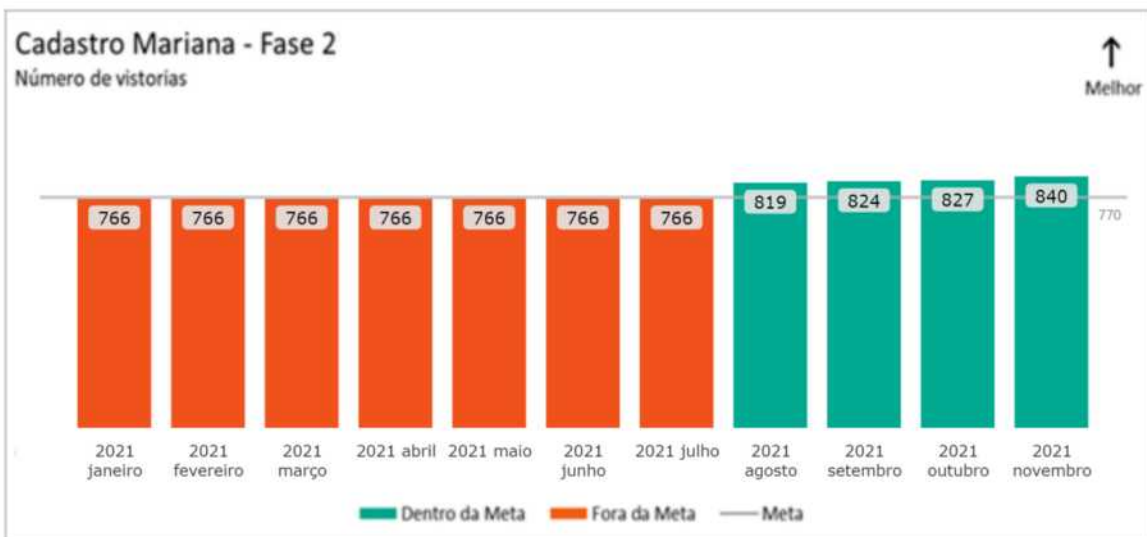


Gráfico 6. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado

Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320,179 pessoas, sendo que 270,371 aceitaram propostas. Destas, 264,996 propostas já foram pagas (98.0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 303.16M**.
- **Para Danos Gerais**, 10,615 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10,594 já foram pagos (99.8% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1,290.31M**.
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 719 indenizações, o que representa 98% do total das 735 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 51.238 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 719 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98% do total das 735 propostas aceitas. Foram 12 indenizações pagas no mês.

Indicadores



Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	201	1	Em Andamento
Deliberação	201	2	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluído Internamente
Deliberação	452	5	Concluído Internamente
Deliberação	477	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021 ● Finalização dos pagamentos do auxílio subsistência emergencial (ASE) no território indígena Comboios - 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1.779 **titulares de comunidades indígenas** estão no escopo de atuação da Fundação Renova;
- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 90 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 3.795 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.375 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

ACORDO- Tupiniquim Guarani

Minuta assinada em 22.10.2021 entre as Associações Indígenas, Comissão de Caciques Tupiniquim Guarani, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE) e Defensoria Pública da União (DPU);

Minuta Protocolada em 05.11.2021 na 12ª Vara Cível e Agraria da SJMG;

O Juiz concedeu prazo para manifestação da AGU e FUNAI.

ACORDO- COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI MBOAPY PINDÓ

Minuta assinada em 12.11.2021 entre a Associação Indígena, Cacique da aldeia de Três Palmeiras, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE) e Defensoria Pública da União (DPU);

Minuta Protocolada em 18.11.2021 na 12ª Vara Cível e Agraria da SJMG.

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$3.078.101,01 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1349 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 164 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R\$3.078.101,01 compreende o pagamento mensal por família de R\$ 1.100,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 34.580 litros distribuídos nos dias 21 e 28 de outubro, 04, 11 e 18 de novembro (total de 1729 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária, um total de R\$2.347.023,14, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas para as Associações.

ACORDO- TERRA INDÍGENA DE COMBOIOS

Minuta assinada em 08.10.2021 entre as Associação Indígena, caciques das aldeias de Comboios e Córrego do Ouro, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE) e Defensoria Pública da União (DPU);
Acordo homologado na 12ª Vara Cível e Agraria da SJMG em 08.11.2021;
Pagamentos da indenização ocorreu no dia 18.11.2021 para as famílias que assinaram o termo e estavam com a documentação completa.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 9.900,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/10/2021 até 20/11/2021, no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros)

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/10/2021 até 20/11/2021.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/10/2021 até 20/11/2021.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/10/2021 até 20/11/2021.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo


O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados a partir dos estudos realizados.

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	46	§3º	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	300	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	300	2	Concluído Internamente
Deliberação	333	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente
Deliberação	355	1	Em Andamento
Deliberação	281	4	Em Andamento

Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	204	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	1	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	493	2	Judicializado
Deliberação	493	3	Judicializado
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado

Deliberação	231	1	Concluído Internamente
Deliberação	231	2	Concluído Internamente
Deliberação	231	3	Concluído Internamente
Deliberação	232	1	Concluído Internamente
Deliberação	232	2	Em Andamento
Deliberação	233	2	Em Andamento
Deliberação	255	5	Concluído Internamente
Deliberação	256	1	Concluído Internamente
Deliberação	256	2	Concluído Internamente
Deliberação	256	3	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	501	2	Judicializado

Entregas do ano de 2021

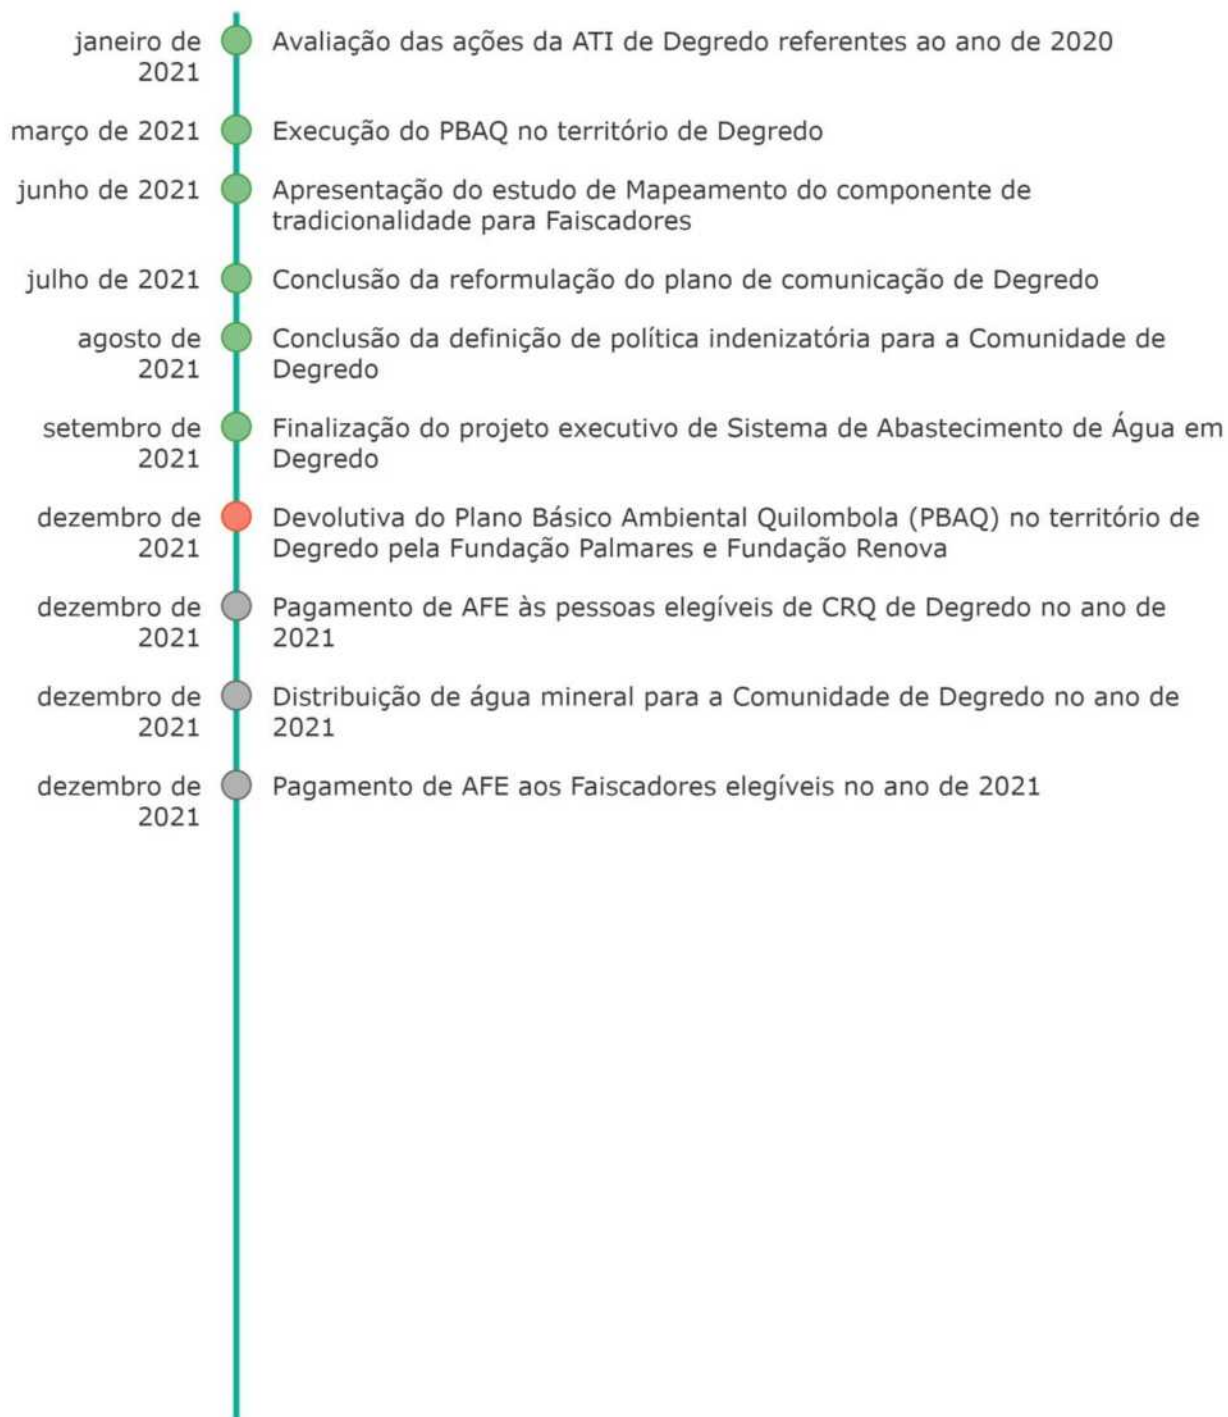

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 195 **titulares** (162 quilombolas, 8 faiscadores de Rio Doce e 25 faiscadores de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômica e alimentar;
- 183 **famílias** abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo;

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Realização de oficinas culturais - Programa 02 Incentivo às Práticas Culturais de Degredo.

Planejamento e capacitação dos assistentes para a realização da terceira consulta do PBAQ.

Início da pesquisa etnográfica - Programa 01 Documentação das Referências Culturais de Degredo

Início da elaboração da documentação do material botânico - Programa 10 de Publicação do Livro de Medicina tradicional do Degredo.

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG005 Programa de Proteção Social


Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Reprogramado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	533	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



março de 2021	●	Implementação da nova estratégia de reparação em Proteção Social
junho de 2021	●	Assinatura do termo de cooperação para início das ações em reparação junto ao estado do ES
agosto de 2021	●	Conclusão das assinaturas dos termos de parceria com municípios aderentes com < 50 famílias vulneráveis atingidas
setembro de 2021	●	Deliberação da aprovação do documento de definição da revisão do Programa de Proteção Social pelo Comitê Interfederativo (CIF).
novembro de 2021	●	Conclusão da Capacitação de Operadores nas temáticas da Proteção Social nos municípios do ES
dezembro de 2021	●	Conclusão da capacitação dos operadores nas temáticas da Proteção Social em Mariana (Oficinas 2021)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- Atuação de 70 **profissionais** (entre assistentes sociais e psicólogos) no município de **Mariana/MG** e outros **11 municípios atingidos** para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de RS 7,97 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 18 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23325 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Implantação do Comitê de Avaliação, com a participação dos atingidos, nos seguintes municípios: Aracruz /ES, Colatina /ES, Baixo Guandu/ES e Sooretama/ES.

Entrega de insumos para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, para atendimentos das famílias vulneráveis de Mariana.

Conclusão da segunda capacitação para os municípios do ES e da quarta capacitação de Mariana para os operadores municipais de proteção social.

Apresentação do plano de reparação para os municípios impactados com a deliberação 533 e respectivo aceite para implantação dos seguintes termos: Fernandes Tourinho, Bugre, Rio Casca e Pingo D'Água. Os planos visam o incremento do atendimento às famílias vulneráveis atingidas, com foco no acompanhamento social e realização de atividades para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Indicadores



Gráfico 1. % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social. Frequência Anual.



Gráfico 2. % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.



Gráfico 3. % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos. Freqüência Semestral.



Gráfico 4. % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos. Freqüência Semestral.

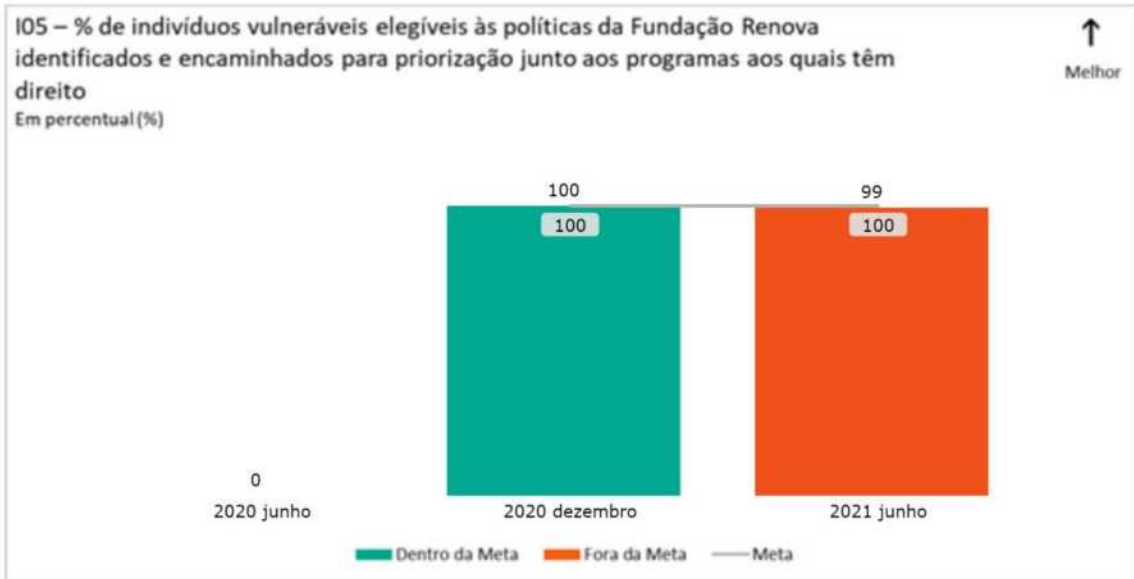


Gráfico 5. % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito. Frequência Semestral.

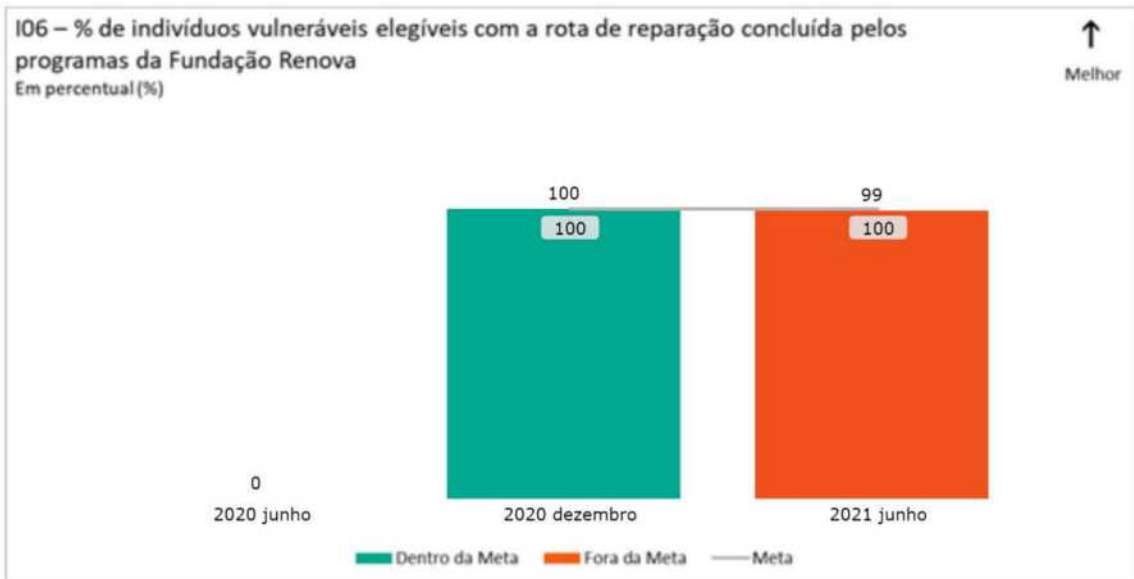


Gráfico 6. % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova. Frequência Semestral.



Gráfico 7. % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares). Frequência Semestral.

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF. (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva temática e territorial.

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Reprogramado
Deliberação	506	2.2	Reprogramado
Deliberação	506	3	Em Andamento
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

outubro de 2021		Publicação dos relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos da Ouvidoria
outubro de 2021		Mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das Comunidades impactadas
dezembro de 2021		Execução de eventos de prestação de contas e painéis temáticos periódicos, conforme previsto no TTAC
dezembro de 2021		Atuação para maior ambiência para expansão do fluxo ágil em municípios não peticionados
dezembro de 2021		Execução do acolhimento e resposta às demandas direcionadas aos canais de relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Análise de Contexto
dezembro de 2021		Execução do processo de Diálogo Social Permanente
dezembro de 2021		Execução do processo de Gestão dos Canais de Relacionamento
dezembro de 2021		Execução do processo de Participação Social
dezembro de 2021		Realização compreensão do Território por meio da elaboração da Análise de Cenário
dezembro de 2021		Atendimento a 15 demandas encaminhadas pela Força Tarefa do MPF , enviado através das experts FGV e Rambol
dezembro de 2021		Execução do processo estruturado de Ouvidoria
dezembro de 2021		Execução do Processo de Canais de Informação e Interação com as Comunidades
dezembro de 2021		Execução do Processo de Produção de Conteúdo
dezembro de 2021		Execução do processo para garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	Outubro/2021	Novembro/2021	ACUMULADO
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	20	21	3.662
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	7	13	1.066
Reuniões Realizadas – Outras Localidades			11
Total de Participantes em Reuniões			123.298

Fatos relevantes do mês

Sobre o tema de Economia e Inovação: realização de reuniões para apresentação do projeto “O Impulso”, que tem como objetivo a capacitação, assessoria e acompanhamento para o desenvolvimento de empreendimentos rentáveis e eficientes nos municípios de Barra Longa (MG); Ipatinga (MG); Colatina (MG) e Marilândia (ES), Barra do Riacho (Aracruz), Povoação, Regência e Areal (Linhares) e Sooretama (ES). Em Linhares e Sooretama (ES) foi realizado encontro para apresentação e esclarecimento de dúvidas do projeto “Recoloca Rio Doce”, vinculado ao programa de Estímulo à Contratação Local (PG20).

Realização da pesquisa de Avaliação de Diálogo e Comunicação, que busca: 1) identificar a percepção da população atingida acerca das estratégias de Diálogo e Comunicação desenvolvidas até o momento pela Fundação Renova; 2) identificar o atendimento Fundação Renova a seus propósitos de transparência, participação e controle social; e 3) produzir indicadores de resultado do programa, acordados com a CT-PDCS, baseados em pesquisa de opinião junto à população atingida.

No Espírito Santo, nos municípios de Sooretama (ES), Baixo Guandu (ES), Colatina (ES) e Aracruz (ES) foi realizada reunião com poder público e moradores para apresentação da(s) entidade(s) selecionadas pelo Edital de Proteção Social, e para criação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social (COMAPS) da Fundação Renova. A eleição e apresentação dos representantes do Comitê também foi realizada durante os encontros.

Em Mariana (MG), destaque para a visita da Presidência da Fundação Renova, Conselho Curador e Comissão de Atingidos (Paracatu de Baixo) aos Reassentamentos coletivos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues para discussão e acompanhamento das obras.

Desenvolvimento de ações para o fortalecimento do processo de retomada das atividades agropecuárias no território da Calha do Rio Doce, com a realização de diálogos coletivos presenciais junto ao público elegível à Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) na região da Baixada do Coronel Roberto (entre Ipaba e Caratinga) e em Revés do Belém (Bom Jesus do Galho); e diálogo coletivo junto aos participantes do Projeto do Feijão, na região da Fazenda Esmeralda (Rio Casca).

Continuidade dos Fóruns de Prestação de Contas, encontros voltados à apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação da Fundação Renova nos territórios: nos municípios dos microterritórios do Vale do Aço e do Parque Estadual do Rio Doce, foram realizadas agendas para apresentação das ações desenvolvidas pela Fundação Renova em relação à qualidade de água do rio Doce e ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38); no Assentamento Liberdade/MG (Periquito) e de Cachoeira Escura (Belo Oriente) foram realizadas reuniões para apresentação dos avanços do Sistema Indenizatório Simplificado e apresentação das ações relacionadas à reparação ambiental nas comunidades; em Tumiritinga (MG) foi realizada a apresentação do andamento do Sistema Indenizatório Simplificado com foco no município, ações para Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17), área de Economia e Inovação, Coleta e Tratamento de Esgoto (PG31); em Povoação (Linhares) foi realizado encontro para apresentação das ações de reparação do rio Doce no município.

Fatos relevantes do mês

No território do Alto Rio Doce, a partir de levantamento realizado pela equipe de Uso Sustentável da Terra (UST), sobre as propriedades em que incidem Área de Preservação Permanente (APP), foi estrategiada comunicação com os proprietários dos imóveis, referenciados pela equipe de Diálogo Social, a fim de conscientizá-los sobre a necessidade de manutenção de tais áreas protegidas. As orientações estão relacionadas, prioritariamente, à não utilização do espaço para pastagem dos animais. Além disso, a narrativa utilizada pela equipe enfatizou a importância de que os proprietários dessas regiões se percebam como corresponsáveis por essa preservação.

Indicadores

Resposta	out/21	nov/21	Acumulado
I 8: Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	8,61	8,33	8,93
I 10 e I 20 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	39	35	35
I 18 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	5,79	6,67	6,66
I 19 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	8,16	7,33	8,03
I 21 Avaliação dos espaços de participação e controle social	8 55	8 68	8 84
I 16 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	37	Indicador em fase de apuração ¹	2705 ²
I 9 e I 15 Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	8,68	9,44	9 27
I 31 Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	-	-	60,55%
I 17 e I 32 Percepção de efetividade dos espaços de Participação e Controle Social	-	-	6,89

¹ A apuração do indicador I.16 aguarda a finalização dos relatórios das agendas de Diálogo Coletivo, conforme fluxo acordado pela Deliberação 216, a serem enviados no dia 10 do mês seguinte ao mês de referência.

² O indicador compreende os encaminhamentos de reuniões entre Janeiro/2019 e Outubro/2021. RETIFICAÇÃO: no último mês ocorreu um erro na geração do indicador. O valor a ser considerado deve ser o reportado acima.

³ A definição do Programa indica a unidade do indicador como percentual, no entanto, o descritor e a memória de cálculo estabelecem o indicador como a média da pontuação das respostas, parametrizada para variação de 0 a 10, considerada para o resultado acima.

O indicador I.5 Apresentação dialógica dos programas nos territórios está em fase de mensuração e será reportado no relatório do mês de dezembro/2021.

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
13.293,00	182,10

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2021	175	251,33
fevereiro de 2021	246	
março de 2021	333	265,00
abril de 2021	157	
maio de 2021	458	289,00
junho de 2021	180	
julho de 2021	180	330,00
agosto de 2021	465	
setembro de 2021	222	
outubro de 2021	307	
novembro de 2021	353	

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

INDICADOR	Outubro	Novembro
I.24.C - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	84%	86%
I.24.D - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria (dias)	40,32	41,62

O indicador "Avaliação do atendimento pela Ouvidoria (I.26.c)" foi recentemente aprovado na câmara técnica e, após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal processo administrativo exige várias etapas, antes que a pesquisa por se iniciada, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação das propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a realização da pesquisa de satisfação. Portanto, o processo encontra-se em andamento.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	outubro de 2021	novembro de 2021
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	203.551	218.507
Canais: Número total de manifestações	870.208	896.368
Canais: Número de manifestações respondidas	808.938	832.007
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	133.519	134.656
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	24.469	26.366
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.414	13.559
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	698.806	721.787
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	5	3
Canais: Número de manifestações em tratamento	61.270	64.361

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente

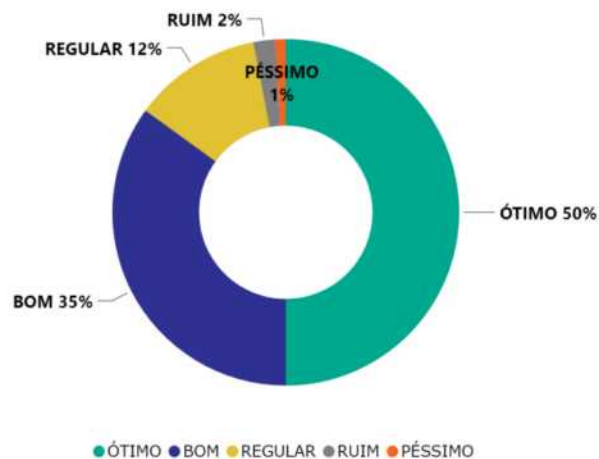


Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.

Fatos relevantes do mês

Considerando as novas diretrizes estabelecidas pela Fundação Renova, para a reabertura dos Centros de Informação e Atendimento, foram realizadas, no mês de novembro/202, visitas para planejamento e organização para o retorno das atividades presenciais dos CIAs. Foram reabertas as unidades de Mariana (MG) (17/11), Barra Longa (MG) (22/11), Rio Doce (MG) (22/11), Belo Oriente (MG) (17/11), Naque (MG) (17/11), Periquito (MG) (17/11), Governador Valadares (MG) (12/11), Tumiritinga (MG) (24/11), Baixo Guandu (ES) (23/11), Linhares (ES) (22/11).

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Ressarcimento e Indenização (PG02), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce. No Médio Rio Doce foi realizada análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32).

Participação dos atendentes CIAs em treinamentos para qualificação e aperfeiçoamento dos atendimentos sobre o processo de reparação e compensação: Treinamento Saúde e Segurança para Retomada das Atividades Presenciais das equipes dos CIAs (08/11); Ambientação Técnica sobre o Projeto para novos colaboradores (09/11 e 10/11); Treinamento - Solicitações individuais e SGS (10/11, 11/11 e 12/11): Momento para esclarecimento de dúvidas | Atendentes CIAs (29/11).

Realização de contato ativo em apoio à equipe de Diálogo Social na mobilização para em reunião de apresentação do Projeto Impulso em Linhares (ES) e Sooretama (ES). O projeto tem como objetivo fomentar o empreendedorismo nas comunidades atendidas pela Fundação Renova.

Indicadores

INDICADOR	Outubro	Novembro
Taxa de manifestações reincidentes (i.22)	39%	38%
Proporção de manifestações respondidas (i.24.a)	93%	93%
Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado (i.24.b)	72%	72%
Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco (i.2 e i.26.b)	98%	99%
Satisfação com a resolução das solicitações (i.27)	92%	94%
Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco (i.27.b)	98%	98%

Os indicadores "Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs (i.2 e i.26.a)", "Oferta das informações solicitadas nos CIAs (i.27.a)" e "Satisfação com a estrutura física dos CIAs" não estão sendo medidos porque os espaços físicos dos CIAs encontram-se fechados por causa da pandemia de COVID-19. Assim que os centros forem reabertos para atendimento ao público, as medições serão iniciadas.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2021

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	0	1	0	0	0	7
ÁudioZaps produzidos	4	5	9	8	5	4	48
Carros de som produzidos	0	0	2	0	0	0	3
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	1	3	11
E-mails de Marketing produzidos	0	0	3	6	3	6	44
Informes do Reassentamento produzidos	4	2	4	2	2	2	22
Jornais da Comunidade produzidos	8	0	15	9	13	0	106
Matéria - Boletim Jornada produzidos	14	31	22	49	14	48	368
Mídias Sociais produzidas	0	0	5	0	4	4	94
Newsletter produzidos	6	4	6	3	5	4	48
Outros itens produzidos	2	0	9	8	11	5	81
Pílulas de whatsapp produzidos	27	26	51	46	67	42	603
Rádios produzidos	0	0	10	8	13	16	151
Vídeoreportagens produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Vídeos produzidos	2	2	2	2	4	0	33
VídeoZaps produzidos	0	0	0	0	0	0	1
Total	68	70	139	141	142	134	1.621

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar 2º Semestre de 2021


DADO	jul	ago	set	out	nov	Acumulado 2021
Áudios produzidos	0	2	4	0	0	6
ÁudioZaps produzidos	8	3	2	0	0	13
Carros de som produzidos	1	0	0	0	0	1
Cartilhas produzidos	1	2	1	1	1	6
E-mails de Marketing produzidos	3	17	5	1	0	26
Informes do Reassentamento produzidos	2	1	0	2	1	6
Jornais da Comunidade produzidos	12	12	15	10	12	61
Matéria - Boletim Jornada produzidos	19	77	18	70	6	190
Mídias Sociais produzidas	15	40	13	8	5	81
Newsletter produzidos	4	3	5	3	5	20
Outros itens produzidos	11	20	8	2	5	46
Pílulas de whatsapp produzidos	80	76	63	84	41	344
Rádios produzidos	16	38	25	13	12	104
Vídeoreportagens produzidos	0	0	1	0	0	1
Vídeos produzidos	5	5	4	4	3	21
VídeoZaps produzidos	1	0	0	0	0	1
Total	178	296	164	198	91	

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território

Canais ● Cartilha ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria - Boletim... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pílula ● Rádio ● Vídeo

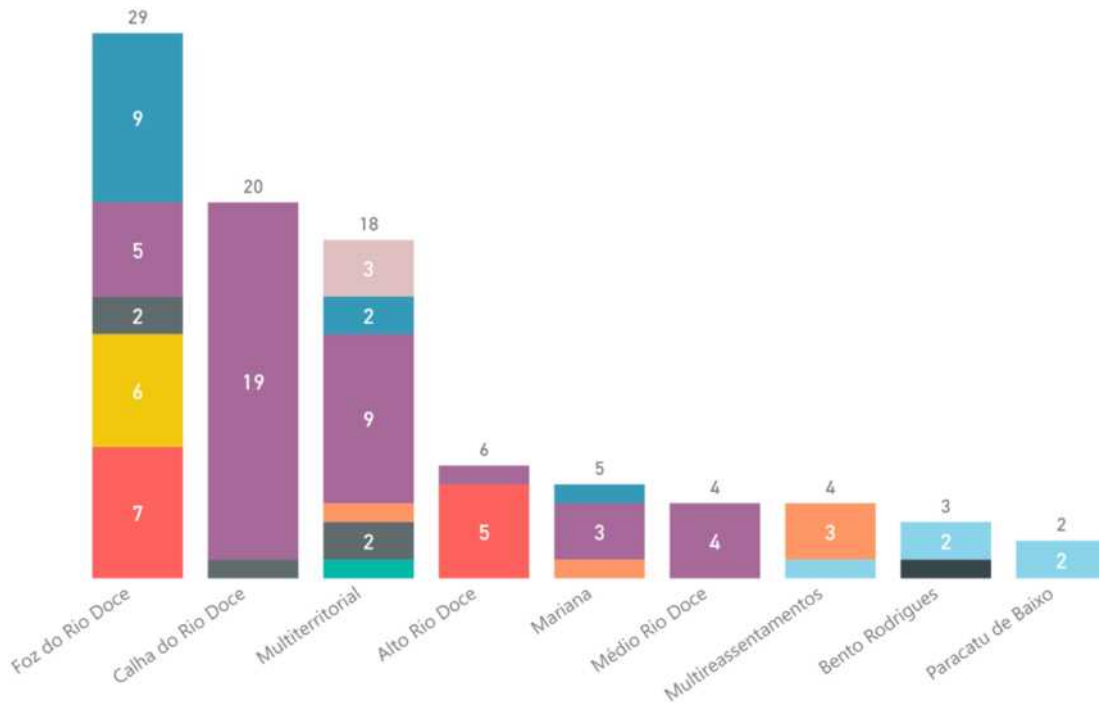


Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Principais Temas Veiculados

Canais ● Cartilha ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria - Boletim Jornada ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Pilula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção e distribuição digital da 18ª edição do jornal Terra da Gente, informativo com as comunidades de Barra Longa, Gesteira e Barreto.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos do território Calha do Rio Doce para oficina sobre uso de ferramentas para reuniões virtuais, no dia 09/11.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar atingidos de Bom Jesus do Galho, Timóteo, Marliéria, Dionísio, Córrego Novo e Pingo-d'Água para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 24/11.

Produção de pílula de WhatsApp para convidar atingidos de Bugre, Caratinga, Ipaba, Ipatinga, Iapu, Santana do Paraíso, Sobrália e Fernandes Tourinho para o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, no dia 23/11.

Produção de pílula lembrando atingidos de Bom Jesus do Galho, Timóteo, Marliéria, Dionísio, Córrego Novo e Pingo-d'Água sobre o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, para ser compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula lembrando atingidos de Bugre, Caratinga, Ipaba, Ipatinga, Iapu, Santana do Paraíso, Sobrália e Fernandes Tourinho sobre o Resulta - Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce, para ser compartilhada no dia da reunião.

Produção de pílula para convidar moradores da Baixada do Coronel Roberto (Ipaba e Caratinga) para reunião presencial do Diálogo sobre Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), no dia 18/11.

Comunicação com Territórios

Veiculação de sete programas (Momento Renova) em seis territórios, na programação semanal de diversas rádios das áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em novembro com um total de 42 programas, com 126 inserções em rádios de municípios de Mariana a Regência. Não houve veiculação dos programas na semana do dia 05/11, em respeito aos seis anos do rompimento da barragem.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Foz do Rio Doce

Produção de matéria na Rádio Renova sobre a assinatura, pelo Governo do Estado, da ordem de serviços para o início das obras de pavimentação das estradas de acesso a Regência e a Povoação.

Produção de matéria para o programa de rádio Momento Renova sobre a reabertura do Centro de Informações e Atendimento (CIA) de Linhares.

Produção de pílula informando aos moradores do entorno da Lagoa Juparanã sobre o alteamento da enseadeira, no Rio Pequeno, devido à elevação do nível de água do rio Doce por conta das chuvas.

Produção de pílula para os moradores da Avenida Beira Rio, em Linhares, e Patrimônio da Lagoa, em Sooretama, sobre o rebaixamento da enseadeira no rio Pequeno.

Produção e distribuição digital da 12ª edição do Boletim Jornada para a população do entorno da Lagoa Juparanã.

Produção e distribuição digital da 19ª edição do Jornal Voz da Foz, informativo com as comunidades de Areal, Povoação, Entre Rios e Regência.

Mariana

Produção de matéria para o programa de rádio Momento Renova sobre a reabertura do Centro de Informações e Atendimento (CIA) de Mariana.

Produção de pílula sobre a reabertura do Centro de Informações e Atendimento (CIA) de Mariana.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Bibliotecas públicas de 37 municípios da bacia do rio Doce mais perto da revitalização.

Cerca de 4 mil pessoas serão beneficiadas com ações de Proteção Social no Espírito Santo.

Iron Biker incentiva economia e turismo esportivo em Mariana.

Projeto apoiado pela Fundação Renova incentiva ginástica artística em Ipatinga.

Projeto vai estimular empreendedorismo em municípios da bacia do rio Doce.

Rodovias da região da Foz do rio Doce receberão investimentos de R\$ 365 milhões.

Sistema Indenizatório Simplificado atinge R\$ 2,1 bilhões de pagamentos em Minas.

Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassa R\$ 2,4 bilhões de pagamentos no ES.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de matéria para o Momento Renova com informações sobre novos pedidos de cadastros a partir da nova decisão da 12ª Vara Federal.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre novos pedidos de cadastros até 31/12/2021, conforme decisão judicial.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Conselheiro Pena.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Córrego Novo.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Fernandes Tourinho.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Fundão.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Governador Valadares.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Iapu.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Timóteo.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Sobrália.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Serra (Nova Almeida).

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de São Pedro dos Ferros.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de São Domingos do Prata.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Santana do Paraíso.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Raul Soares.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Marliéria.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Ipatinga.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Bom Jesus do Galho.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de vídeo da série Conhecendo o Sistema Indenizatório Simplificado sobre o tema Reingresso.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Belo Oriente.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o Sistema Indenizatório Simplificado passa a valer para o município de Alpercata.

Produção de pílula de WhatsApp informando que atingidos de Barra Longa podem aderir ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que a Justiça incluiu novas localidades no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que a Fundação Renova irá tomar as medidas cabíveis a respeito do uso indevido de imagem de sua logomarca.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre quem pode ingressar no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos a advogados sobre prazos para tratamento de pendências no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o novo prazo para adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp para informar que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado para 30/04/2022 para todas as localidades.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a priorização no atendimento pelo Sistema Indenizatório Simplificado a idosos, pessoas com deficiência e portadores de necessidades especiais.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o repasse da primeira parcela dos recursos financeiros às instituições que vão atuar no Espírito Santo e que foram selecionadas pelo Edital de Proteção Social.

Produção e publicação de posts nas redes sociais da Fundação Renova sobre o repasse da primeira parcela dos recursos financeiros às instituições que vão atuar no Espírito Santo e que foram selecionadas pelo Edital de Proteção Social.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Elaboração de cartazes para impressão nos reassentamentos sobre Direito à moradia.

Elaboração de cartazes para impressão nos reassentamentos sobre Diversidade e Inclusão.

Elaboração de cartazes para impressão nos reassentamentos sobre Proteção ao trabalho decente e enfrentamento ao trabalho escravo.

Produção de material explicativo sobre os alvarás de construção para as famílias dos reassentamentos.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção do informativo para a Comissão de Atingidos com os principais avanços no reassentamento de Bento Rodrigues.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção de informativo mensal para as famílias do reassentamento de Bento Rodrigues com os avanços das obras, fotos e status dos projetos de bens públicos.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção da 30ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Produção da 31ª edição do Panorama da Obra de Paracatu de Baixo com os principais avanços no reassentamento.

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação da vaga de mobilizador social para a Reserva Técnica.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre a entrega dos certificados às instituições que participaram do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Produção de pílula de WhatsApp sobre a conclusão da etapa de formação do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Produção de posts no site e redes sociais da Renova sobre o Edital Doce, com foco no esporte e lazer, nos territórios da Foz do Rio Doce e do Baixo Rio Doce.

Produção de vídeo sobre o Edital Doce, com foco em Cultura, nos territórios da Foz do Rio Doce e do Baixo Rio Doce.

Publicação de posts nas redes sociais da Renova sobre o projeto Baleia Jubarte, apoiado pelo Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte à Economia e Inovação

Produção de pílula de WhatsApp para convidar produtores que participam do Projeto Feijão, em Rio Casca, para reunião presencial com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA/MG), no dia 12/11.

Publicação de post nas redes sociais com os resultados alcançados pelo segundo ano do Projeto Feijão, realizado com produtores de Rio Casca.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de vídeo sobre o Edital Doce, com foco no esporte e lazer, nos territórios da Foz do Rio Doce e do Baixo Rio Doce.

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre a suspensão do Edital da Pesca para grupos produtivos.

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de cartilha orientativa para os produtores rurais sobre a mudança de alimentação animal em Mariana e no Alto.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o Projeto Impulso Rio Doce.

Produção de pílula de WhatsApp para divulgação de vagas para especialista e engenheiro de projetos e obras.

Indicadores

O Programa 06 foi aprovado recentemente e os indicadores do pilar de Comunicação dependem da realização de pesquisas. Nesse sentido, as áreas responsáveis dentro do programa já deram início aos processos necessários para realização das pesquisas.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Em Andamento
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Concluído Internamente
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2021.

Grandes números do programa

- 1183 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 159 adoções, 359 devoluções, 175 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 448 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 339 bovinos, 59 equinos, 29 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1710 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Adoção de dois cães - Prontuários 411 e 45

Indicadores




Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de primavera de 2021. O reporte de resultados deste indicador para a estação de verão/22 está previsto para o relatório de março de 2022 (ref fevereiro/22)

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

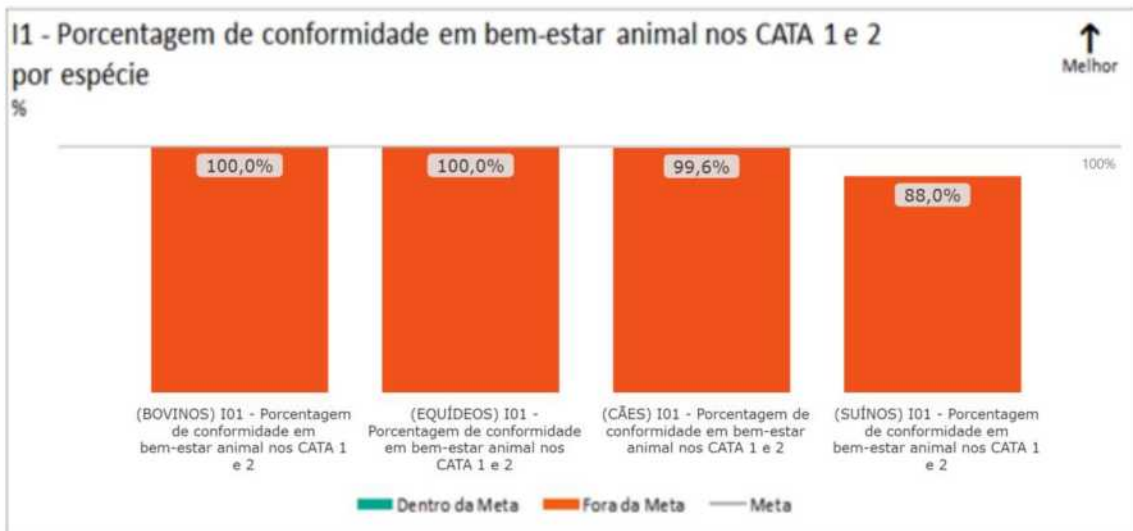


Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Os desvios apresentados em relação à meta vigente não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

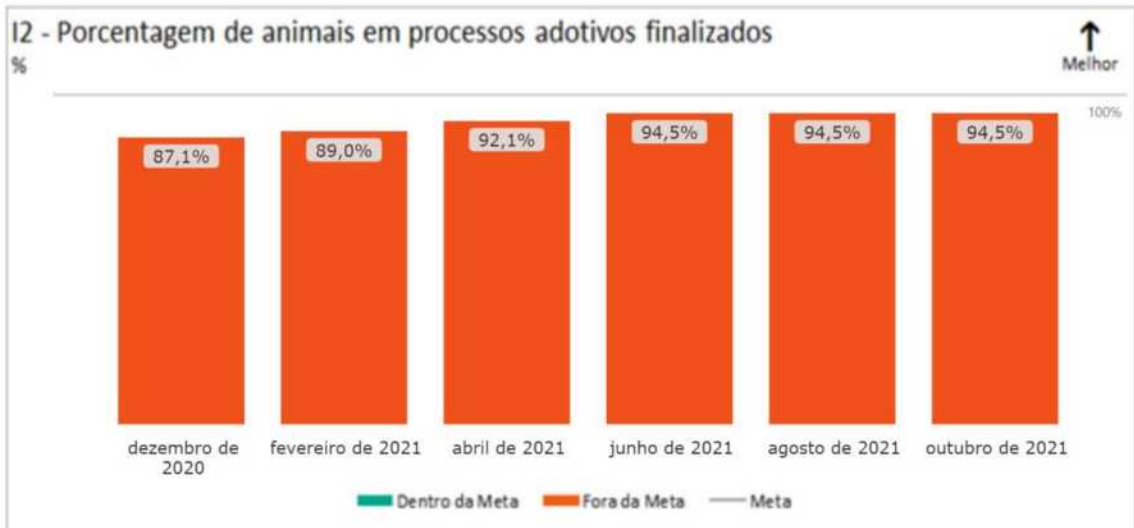


Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o último bimestre avaliado referente aos meses de setembro e outubro de 2021 não houve contabilização de novas adoções finalizadas ou óbito de animal disponível para adoção mantendo-se o valor reportado no bimestre anterior

A próxima atualização deste indicador é prevista para o mês de Janeiro de 2022 (referência ao bimestre nov /dez de 2021)

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I3	Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento	Número de restituições no reassentamento / Número de animais acolhidos nos CATA's	%
I4	Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Número de acompanhamentos finalizados / Número de animais atendidos pelo Programa no pós-ocupação	%

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Fatos relevantes do mês – Reconstrução de Vilas

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2021

dezembro de 2021  Concluir 54 casas

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 203 **famílias**;

Obras:

- Em andamento construção de 108 **edificações**;
- Conclusão de 10 **edificações**;
- Conclusão de 03 **bens coletivos** (escola posto de serviços unidade básica de saúde);
- Total de 03 **contratos assinados** para construção de edificações

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para 177 edificações 23 lotes vagos e 15 bens coletivos;
- **Projetos básicos concluídos** para 176 edificações 23 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura para 158 edificações 22 lotes e 12 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** para 22 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos para 155 edificações e para 07 bens coletivos

Nota¹: Edificações são correspondentes a casas e pontos comerciais

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Início de execução de 8 edificações pela empresa Cardan: ID's 173, CC.41, 226, 181 UH1, 181 UH2, 123, CC.123, NN.123

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 78 **famílias**.

Obra:

- Em andamento construção de 12 **edificações**;
- Em andamento construção de 03 **bens coletivos** (escolas e posto de saúde)

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para 66 edificações 04 lotes vagos e 12 bens coletivos;
- **Projetos básicos concluídos** para 61 edificações 03 lotes vagos e 11 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura para 50 edificações 02 lotes e 10 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** para 02 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos para 44 edificações e para 06 bens coletivos

Nota¹: Edificações são correspondentes a casas e pontos comerciais

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Início das construções das edificações dos ID's 37, 41 e 46.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2021

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimento para 9 **famílias;**
- Acordos homologados com 28 **famílias;**
- Total de 21 **imóveis** adquiridos para famílias que possuem acordo homologado.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2021



dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 05 reformas de casas (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura);
dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 08 casas urbanas novas (Terraplanagem, Drenagens, Contenções, Acessos, Fundações).
dezembro de 2021	●	Concluir etapas de 05 construções de casas novas em área rural (Alvenaria, Estruturas, Instalações e Cobertura).

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- Atendimento para 122 **famílias**;
- Aquisição de 75 **edificações** para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia
- Em andamento construção 43 **edificações**.
- Em andamento reforma de 23 **edificações**;
- Em andamento entrega de 09 **lotes vagos**;
- Atendimento a 10 **famílias** na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 12 **edificações** nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções entregues para 06 **edificações** principais nas Comunidades Rurais

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para construções de 38 edificações para reformas de 18 edificações e 04 lotes vagos;
- **Projetos básicos concluídos** para construções de 33 edificações para reformas de 17 edificações e 03 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 31 edificações para reforma de 17 edificações e 03 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 21 construções de edificações para 14 reformas de edificações e para 03 lotes vagos

Nota¹: O termo Edificações abrange-se casas e pontos comerciais

Nota²: O termo Não necessário se refere a não obrigatoriedade de alguns documentos por fases e localidades de registros das edificações Reassentamento Familiar com atendimento em âmbito nacional

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

ID 31 Recebido pela Família em 11/11/2021

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Indicadores



Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


Eixo Terra e Água

Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Cumprido internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Cumprido parcialmente
Deliberação	30	N/A	Cumprida internamente
Deliberação	80	4.1	Cumprida internamente
Deliberação	80	4.2	Cumprida internamente
Deliberação	225	2	Cumprido internamente
Deliberação	286	3	Cumprida internamente

Entregas do programa

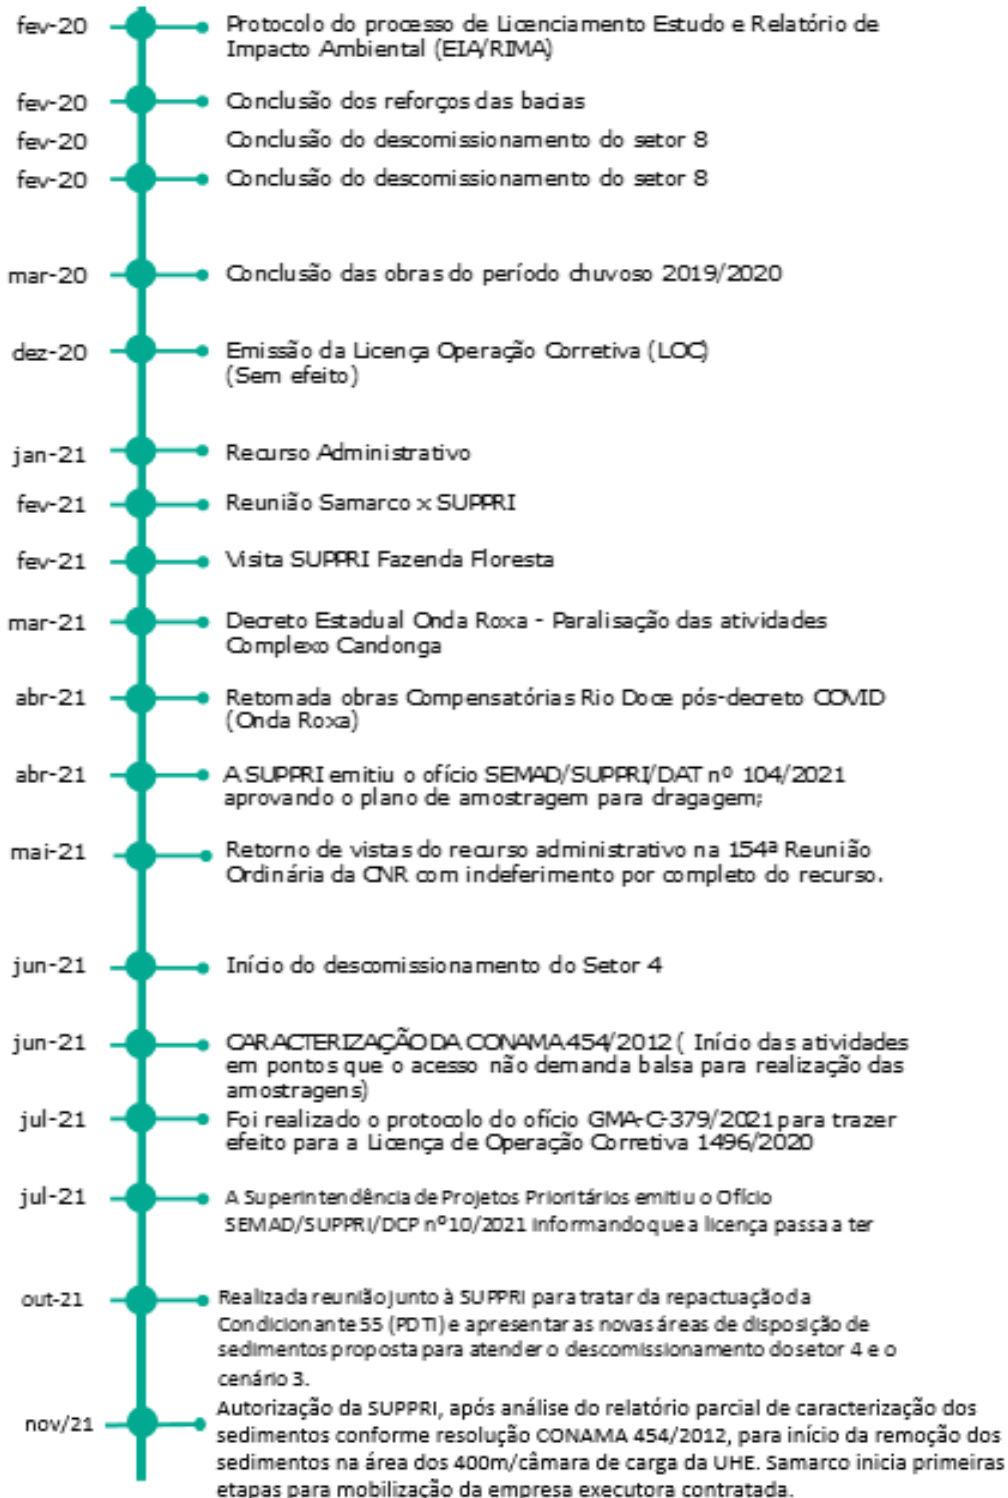

Concluído



Planejado



Reprogramado

Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves

Fatos relevantes do mês

- Descomissionamento do setor 4
 - ✓ Volume executado até 28/11:
 - Remoção de sedimentos: 289.088 m³



Figura 1- Vista à jusante do Dique Setor 4



Figura 2 - Vista a montante do Dique Setor 4

Fatos relevantes do mês

✓ Disposição de sedimentos:

- ✓ Evolução na disposição de sedimentos provenientes do setor 4:

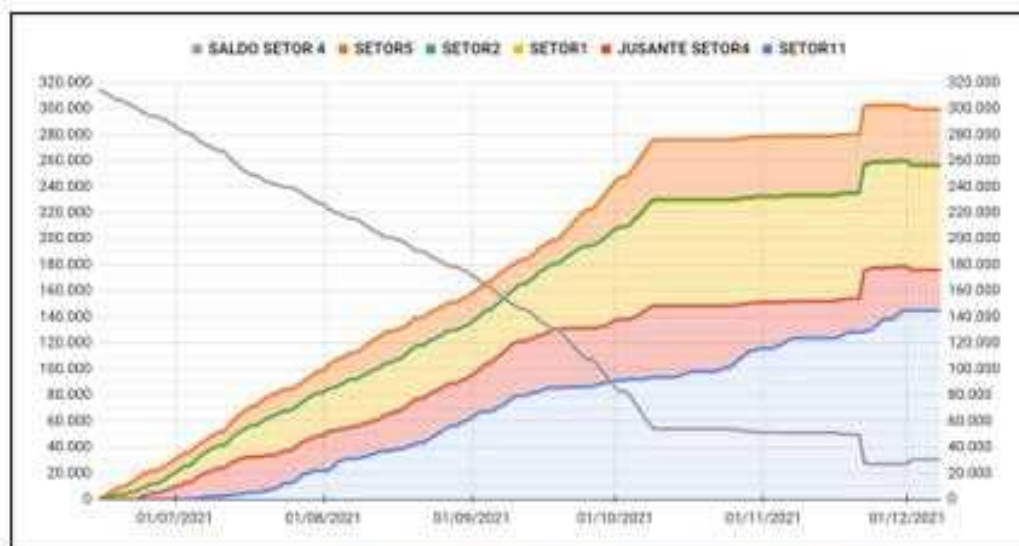


Figura 3 - Gráfico de Disposição de Sedimentos

✓ Setor 11



Figura 4 - Setor 11

Fatos relevantes do mês

- ✓ Bacias 1, 2A e 2B



Figura 5 – Bacias 1, 2A e 2B

- ✓ Setor 1



Figura 6 - Setor 1

Fatos relevantes do mês

✓ Setor 5B



Figura 7 - Setor 5B

✓ Setor 5C



Figura 8 - Setor 5C

Fatos relevantes do mês

- ✓ Pilha ADME OE (Setor 11)
 - Bioengenharia
 - Área total: 17.050 m³ (concluído em: 01/12/2021)



Figura 9 - Bioengenharia ADME

- ✓ Estruturação para Remoção de Sedimentos Região dos 400m
 - ✓ Execução de Ponto de Apoio (Status:28/11/2021)

Atividades	Quantidade (unid.)			
	Total Previsto	Revisado	Realizado	Saldo
Cravação de estacas	124	120	120	0
Instalação de tirantes	70	70	70	0
Baias	2	0	0	2

Fatos relevantes do mês



Figura 10 - Vista aérea Ponto de Apoio

- Status atual:
 - Execução da envoltória de areia nos tirantes;
 - Execução dos cabeços de amarração;
 - Mobilização de mão-de-obra para execução das baias de sedimentos.
- Próximos passos:
 - Início da execução das baias para sedimentos;
 - Mobilização de caminhões para transporte de agregado que será lançado sobre a área do Ponto de Apoio.

Fatos relevantes do mês

➤ Recuperação dos pontos de margens

✓ Execução de recuperação do ponto de margem 23

- Retomada da recuperação do ponto prevista para 2022. Conclusão do processo de contratação prevista para dez/2021.

✓ Evolução na execução dos pontos de margens – total de 79

- Pontos em recuperação: 23 (suspenso); 55; 57; 58; 59; 115; 119; 120; 123; 124; 125; 126; 135; 144; 147; 166; bueiro 144/55
- Tem termos de quantidade, o status geral se mantém conforme informado no relatório anterior:

RECUPERAÇÃO PONTOS DE MARGEM	Total Previsto	Concluído até a data	A Executar
MARGEM ESQUERDA	56 und	35 und	21und
MARGEM DIREITA	23 und	15 und	8 und
TOTAL			29 und

- Execução de recuperação do ponto de margem 23: Em processo de contratação, com conclusão prevista para 15/12/2021


✓ Plano de Chuvas 2021/2022

- Setor 1: Dimensionamento de drenagem superficial (TR de 25 anos para as estruturas provisórias) e análise de estabilidade geotécnica (não-circular e circular), utilizando-se do método racional.
 - Ações a serem adotadas:
 - Reconformação do sedimento lançado e;
 - Proteção superficial com manta e enrocamento.

Fatos relevantes do mês



Figura 11 - Seção Setor 1

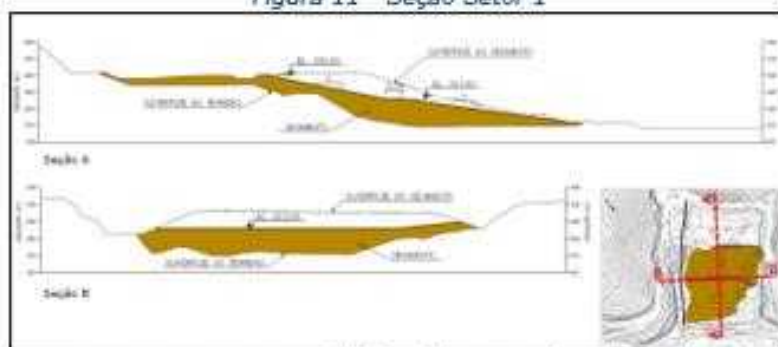

• Figura 12 - Situação final do projeto de adequações

- Setor 4: Dimensionamento de drenagem superficial (TR de 25 anos para as estruturas provisórias), utilizando-se do método racional.

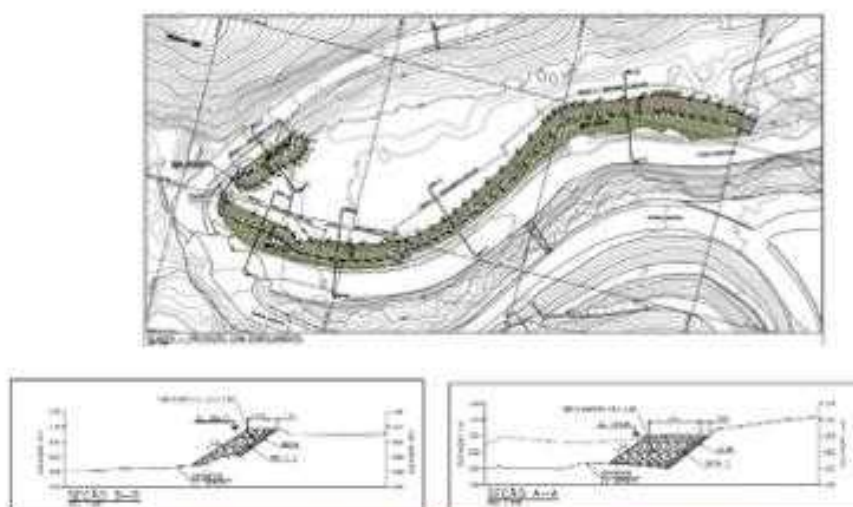


Figura 13 - Plano de chuvas Setor 4 (Arranjo Geral)

Fatos relevantes do mês

- o Ações adotadas:
 - Proteção do reservatório com enrocamento.



Figura 14 - Vista aérea do Setor 4

- Setor 5B: Em execução o dimensionamento de drenagem superficial (TR de 25 anos para as estruturas provisórias) e análise de estabilidade ruptura (não-circular e circular), utilizando-se do método racional.

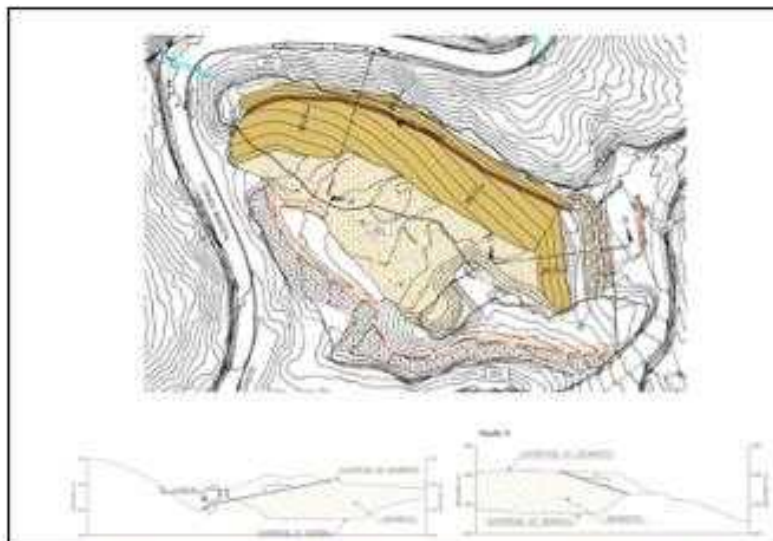


Figura 15 - Plano de chuvas Setor 5B (Arranjo Geral)

Fatos relevantes do mês

- o Ações adotadas:
 - Reconformação do sedimento lançado e;
 - Bioengenharia.



Figura 16 - Vista aérea Setor 5B

- Setor 11: Dimensionamento de Drenagem superficial em dimensionamento (método racional e TR de 25 anos para as estruturas provisórias);

✓ Resultados da Caracterização de Sedimentos – Região dos 400 m

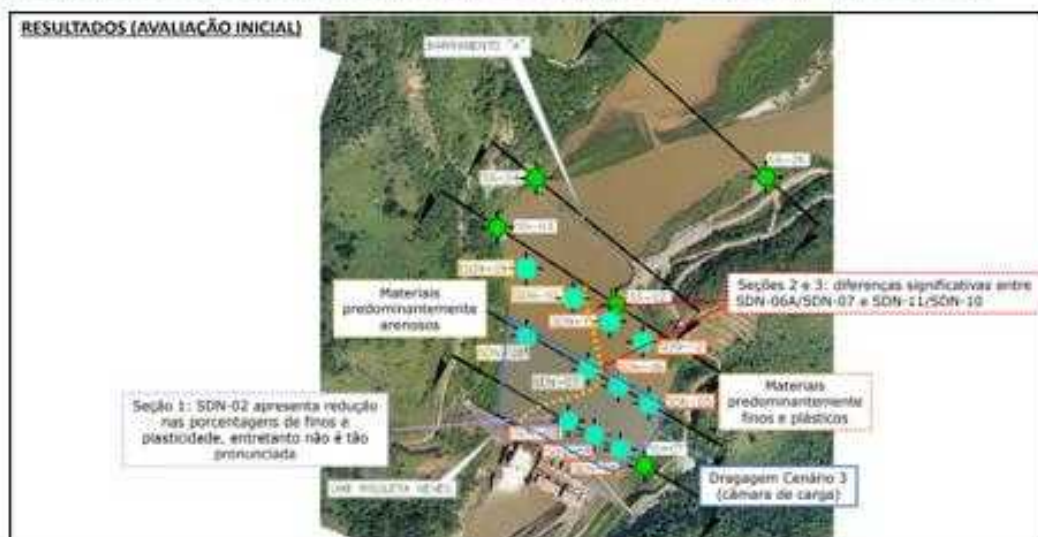


Figura 17 – Resultados

Fatos relevantes do mês

- Reabilitação da UHE - Risoleta Neves
- ✓ Avanço por frente de serviço

Atividades	Status	Avanço Físico
Projeto total	☺	53,6%
Canteiro	☺	100%
Engenharia e Suprimentos	☺	98%
Materiais de Fornecimento	☺	100%
Limpeza do Tubo Sucção - UG01 a UG03	☺	80%
BOP - Tubulação sistema do fitro autolimpante	☺	78%
Comporta vação Tomada d água	☺	68%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água	☺	23%
UG1- Atividades na Casa de Força	☺	80%
UG2- Atividades na Casa de Força	☺	55%
UG3- Atividades na Casa de Força	☺	2%
Transformador Elevador	☺	63%
Vertedouro	☺	32%
Comissionamento sem água	☹	0%
Comissionamento com água	☹	0%
Comportas enseadeiras jusante - Tubo de Sucção	☹	0%
Ordem de Serviços adicionais	☺	74%
Reparos de Responsabilidade Candonga	☺	nd

Reabilitação das UG's
Avanço Físico 11/21




Figura 18 - Avanço Físico Reabilitação das UG's

Atividade de Limpeza	UG#1	UG#2	UG#3	Avanço Físico	Data Término
Projeto Total	☺			63,6%	jul/22
Limpeza das Galerias dos Stop Log	☺	☺	☺	100%	Finalizado
Desobstrução das rinhuras	☺	☺	☺	100%	Finalizado
Limpeza da pista de contato da comporta	☺	☺	☺	100%	Finalizado
Descida do Stop Log	☺	☺	☺	100%	Finalizado
Drenagem das Máquinas	☺	☺	☺	100%	Finalizado
Limpeza da Caixa espiral	☺	☺	☺	100%	Finalizado
Limpeza do tubo de sucção	☺	☺	☺	100%	Finalizado
Retirada das grades de Montante	☹	☹	☹	0,0%	mai/22
Limpeza final da sucção	☹	☹	☹	0,0%	mai/22
Limpeza dos drenos	☹	☹	☹	0,0%	mai/22
Dragagem do Canal de fuga	☹			0,0%	mai/22

Limpeza das UG's
Avanço Físico 11/21




Figura 19 - Avanço Físico Limpeza das UG's

Nota: Atividades de responsabilidade do Consórcio Candonga.

Fatos relevantes do mês

✓ Atividades executadas no período:

Desmontagem da UG3, recuperação e pintura da Caixa Espiral da UG2, montagem do sistema de resfriamento, recuperação das comportas da tomada d'água, reabilitação do STP – Sistema de Transposição de Peixes (Atividade paralisada por solicitação da UHE Risoleta Neves), limpeza Complementar da Caixa Espiral.

Nota: As atividades de reparo das Ogivas UG1 e UG2, foram paralisadas em razão da necessidade de equalização técnica entre Andritz e Aliança.

Errata: Apesar de informado no relatório referente a out/21 que a limpeza da sucção havia sido iniciada, por pendências na documentação o Consórcio não autorizou e o início efetivo das atividades de campo foi programado para 06/12/2021.



Figura 20 - Limpeza Entre a Comporta e a Descida do Conduto

Fatos relevantes do mês



Figura 21 - Sistema de resfriamento



Figura 22 - Pintura Caixa Espiral



Figura 23 - Finger Print UG3

Fatos relevantes do mês

MONITORAMENTO

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

✓ Destaques:

- Os sensores SAT e tilt meters instalados nos barramentos metálicos não indicaram deslocamentos significativos.
- A retirada da ADME OE está em andamento, com cerca de 90% do material destinado para a ADME 1. Os extensômetros 1, 2 e 4 foram descomissionados devido ao avanço das obras.
- O monitoramento dos marcos superficiais da Pedreira Corsini não indica tendência de deslocamento. A instalação dos instrumentos está em andamento. A área segue isolada.
- O monitoramento dos piezômetros e indicadores de nível d'água não apresentou variações significativas no mês de referência.
- Foi prevista a instalação de cinco marcos superficiais na ADME OD, para monitoramento dos deslocamentos na estrutura. A confecção das bases está em andamento.

✓ Constatações:

- Após o lançamento de enrocamento a jusante do Barramento A, as cotas dos perfis obtidos nos levantamentos de GPR encontram-se acima da referência estabelecida pela SPEC;

Fatos relevantes do mês

Os deslocamentos registrados nos barramentos metálicos se encontram dentro dos níveis normais de operação.

▪ Recomendações:

- Finalizar a instalação dos instrumentos na Pedreira Corsini;
- Finalizar a instalação das bases dos prismas na ADME OD para monitoramento dos deslocamentos na estrutura;
- Aprimorar o monitoramento da ombreira direita do córrego Micaela;
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nota: Informações referentes ao período da campanha, o qual não necessariamente coincide com o mês de referência do reporte.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 1

- Entrada: Bombeamento realizado da Bacia 2 para a Bacia 1 em alguns períodos do mês, porém sem desvios identificados;
- Saída: Síntese Conclusiva: Não houve efluente sendo bombeado da bacia 1 para o rio Doce no período. Sem desvios identificados;
- Lançamentos de Montante e de jusante: Bombeamento realizado da Bacia 2 para a Bacia 1 em alguns períodos do mês, desvio de turbidez identificado no ponto rio Doce, porém sem influência do empreendimento uma vez que já havia

Fatos relevantes do mês

alteração de turbidez no ponto de montante e não houve bombeamento da Bacia 1 para o rio Doce no período.

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 1:



Figura 24 - Setor 1

✓ Síntese conclusiva:

- Montante e jusante: monitoramentos diários e mensal: Ponto Seco;
- Melhoria no ponto de coleta do efluente saída – Setor 1



Figura 25 - Dreno do tubo de direcionamento de efluente do setor 1

Fatos relevantes do mês

- ✓ Monitoramento e controle: Descomissionamento Setor 4



Figura 26 – Montante Barramento Setor 4 - Entrada



Figura 27 – Jusante Barramento Setor 4 - Saída

Fatos relevantes do mês

▪ Monitoramento de Efluentes – Córrego dos Borges



Figura 28 - Montante Córrego dos Borges

✓ Síntese conclusiva:

- Montante e jusante: Desvios de turbidez associado ao alto índice pluviométrico do período (10, 11, 16, 19, 20 e 25/10);

Nota: O desvio identificado no mês de out/21 está sendo reportado neste relatório (nov/21) em razão dos prazos necessários para cada um dos métodos analíticos de análise laboratorial dos parâmetros.

▪ Monitoramento de Efluentes – Setor 4

- ✓ Montante e jusante Setor 4: Síntese conclusiva: Pontos secos
- ✓ Entrada Setor 4: Ponto descomissionado;
- ✓ Saída Setor 4: Ponto seco.

Monitoramento à montante do barramento:

- ✓ Entrada e saída: Sem desvios para o período.

Nota: O desvio identificado no mês de out/21 está sendo reportado neste relatório (nov/21) em razão dos prazos necessários para cada um dos métodos analíticos de análise laboratorial dos parâmetros.

Fatos relevantes do mês

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5A:



Figura 29 - Setor 5A

✓ Síntese conclusiva: Montante e jusante: Pontos Secos

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5B



Figura 30 - Setor 5B

✓ Síntese conclusiva: Montante e jusante: Pontos Secos

✓ Melhoria no ponto de coleta do efluente de saída – Setor 5B: Inserida caixa para armazenamento de efluentes eventualmente vertidos pós leira filtrante do Setor 5B.

Fatos relevantes do mês



Figura 31 - Implantação de caixa de armazenamento de efluentes

✓ Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)

Conclusões / considerações finais

- A fazenda Jerônimo não foi monitorada, devido a restrição de acesso imposta pelo proprietário, a qual será justificada no relatório anual, associada ao Anexo II Item 1 da LOC de Candonga.
- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA) provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida a jusante da ADA (que finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o configura como forte indicativo de estes valores encontrados no monitoramento serem background da região
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre estas hipóteses.

Fatos relevantes do mês

✓ Síntese conclusiva – Córrego Micaela:

- O controle semanal de monitoramento hídrico superficial no córrego Micaela (montante e jusante) apresentou desvios de ferro dissolvido, manganês (ambos estes que podem representar background da região - estudos em andamento), turbidez (associado a pluviometria) e desvio pontual de fósforo (em 19/10).

Nota: O desvio identificado no mês de out/21 está sendo reportado neste relatório (nov/21) em razão dos prazos necessários para cada um dos métodos analíticos de análise laboratorial dos parâmetros.

✓ Monitoramento Atmosférico

Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

Fatos relevantes do mês

✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 32 - Localização nascentes Pilha 1 e Pilha 2

▪ Nascente 1 – setor 11



Figura 33 - Nascentes 1 e 2

Conclusões / considerações finais

- O monitoramento em ambas nascentes (nascente 1 e nascente 2) apontou desvios de alumínio, ferro e manganês no período; Não há interfaces do empreendimento com águas subterrâneas nesses pontos onde foram identificados os desvios, o que corrobora com a premissa técnica que estes possivelmente se configuram como *background* da

Fatos relevantes do mês

região. Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de *background*.

✓ Monitoramento futuro: Plano de Perfuração e Instalação dos Poços de Monitoramento

Proposta:

Serão perfurados 7 poços de monitoramento da Qualidade de Água Subterrânea, os quais serão executados de acordo com as exigências das normas ABNT, cumprindo as seguintes etapas:

- Perfuração e descrição litológica
- Amostragem de solo/Ensaio
- Instalação do Poço de Monitoramento
- Desenvolvimento do Poço de Monitoramento
- Levantamento Planialtimétrico
- Medição de Nível d'água
- Amostragem de Água Subterrânea/Análises
- Ensaio Hidrogeológicos

Metodologia:

- Perfuração, Instalação e Desenvolvimento de Poços de Monitoramento Ambiental (ABNT 15492/2007, ABNT 15495/2007);
- Amostragem de solo e análise metais (CONAMA, 420);
- Ensaio físicos de solo (Porosidade total e efetiva (Reinert e Reichert (2006), análise granulométrica (Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, 1975);
- Amostragem de água subterrânea por baixa vazão e ensaios físico-químicos (NBR 15847/2010 e D 6771-02/2002);
- Garantia e controle da qualidade (QA/QC) (ABNT 16.435);

Fatos relevantes do mês

- Ensaio permeabilidade (Slug e Bail Test) (Hvorslev, Bouwer-Rice, etc);
- Padrão de comparação de Standard CONAMA 420 (2009);
- Levantamento Planialimétrico (Sistema de Coordenadas UTM - SIRGAS 2000);
- Relatório de Investigação Ambiental (ABNT NBR 15.515-2/2011).

✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

Não foram identificados registros de ocorrências de desvios de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal e predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 40 pontos de monitoramento dentro da ADA.

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

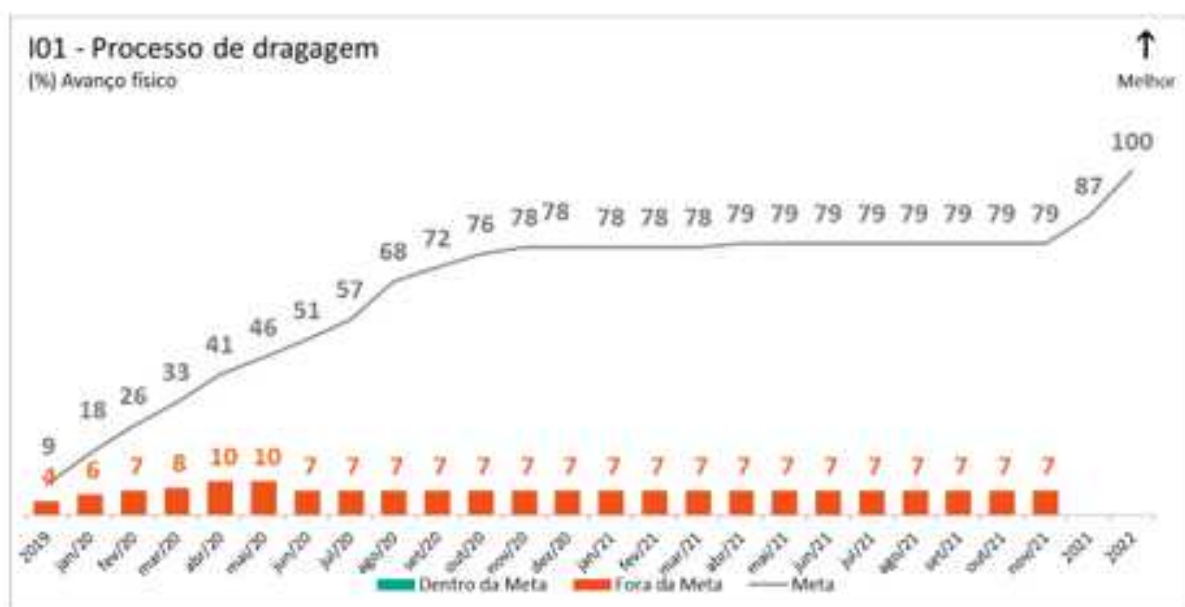


Figura 34 - Gráfico 1. Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

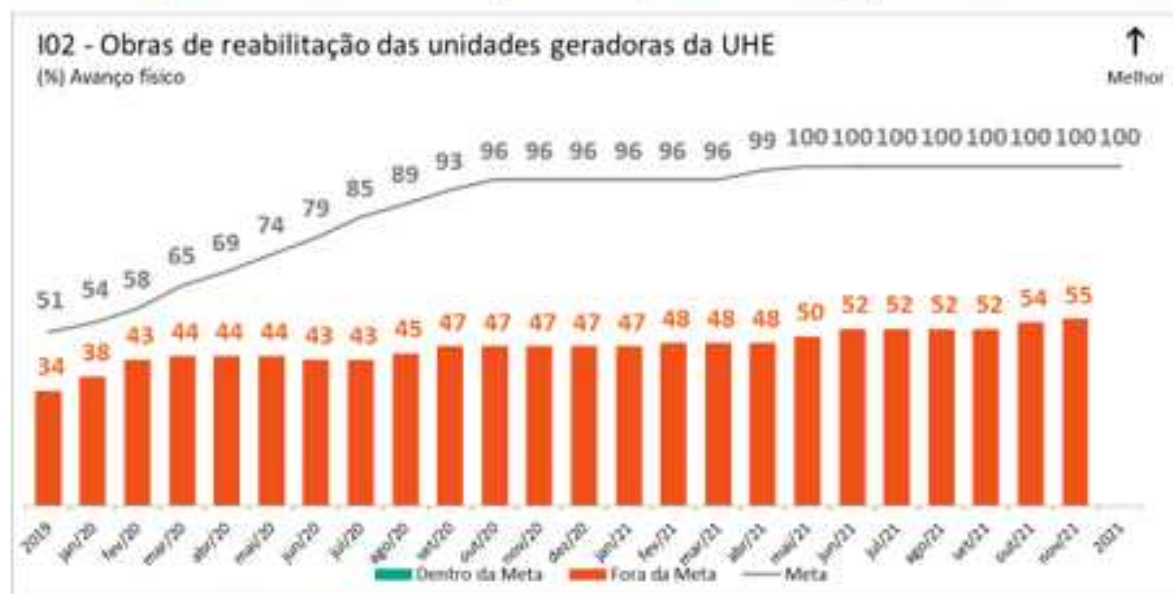


Figura 35 - Gráfico 2. Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

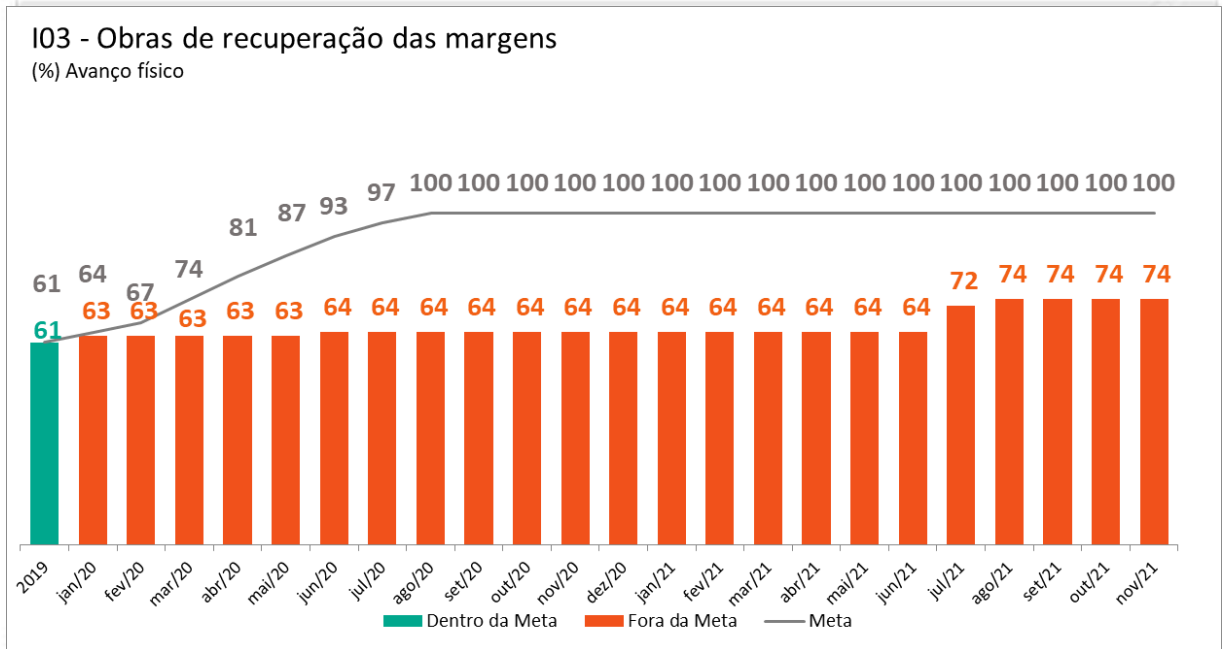


Figura 36 - Gráfico 3. Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.



Figura 37 - Gráfico 4. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento dos setores. Gráfico Acumulado.

Nota: A Samarco está empenhada em apresentar dados mais significativos, à luz dos desdobramentos de estudos e atividades imprescindíveis que se encontram em desenvolvimento e que serão concluídos num futuro próximo.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.

Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado
Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	217	3	Em Andamento

Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.701 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 937 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.790 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 81
- Concluído sem termo: 8
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27 ;

Fatos relevantes do mês

Conclusão das atividades no vestiário, estábulo de equinos e galpões de gado no parque de exposição de Barra Longa;

Enviado a suprimentos Parecer Técnico das propostas recebidas referentes a licitação para reconstrução das pontes Mariana e Barra Longa.

Indicadores

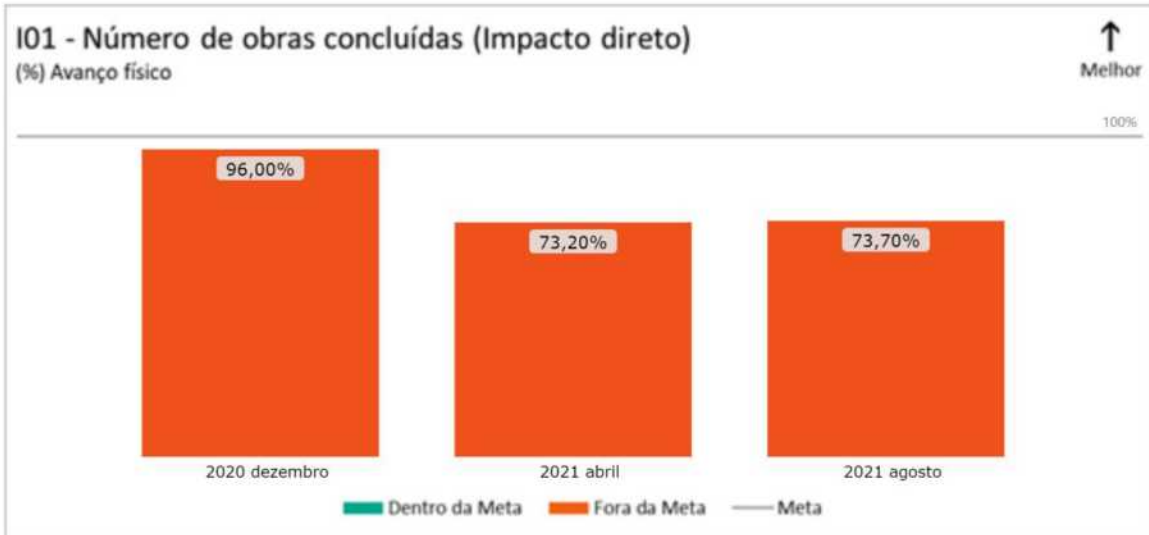


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

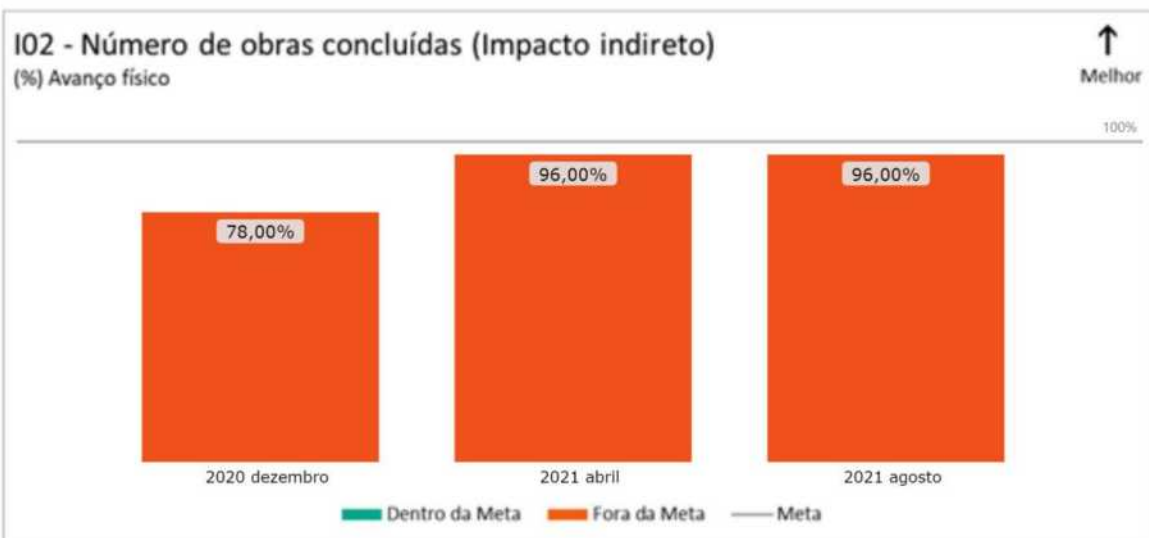


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

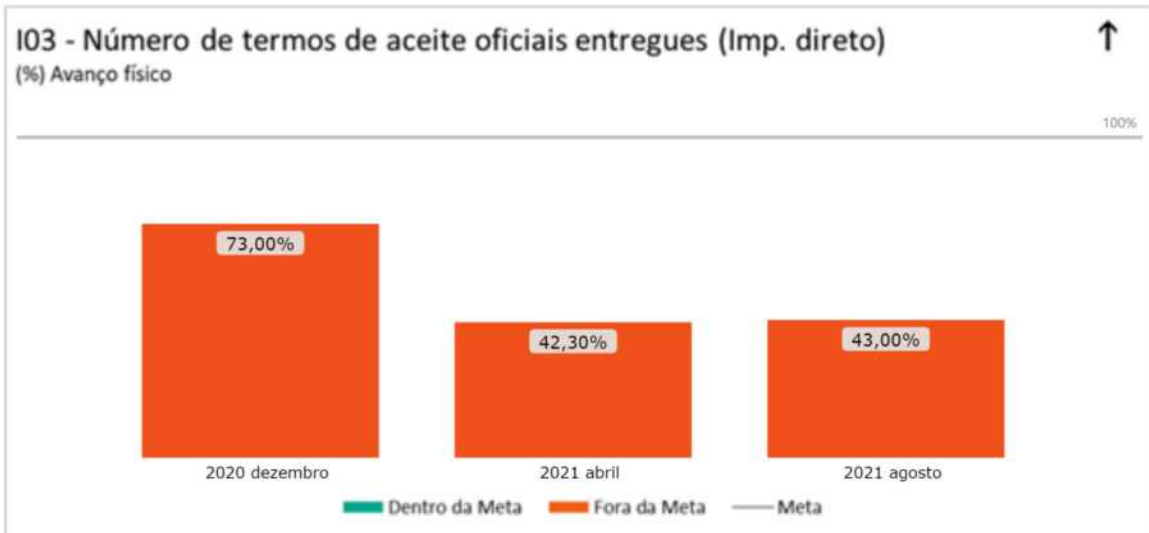


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

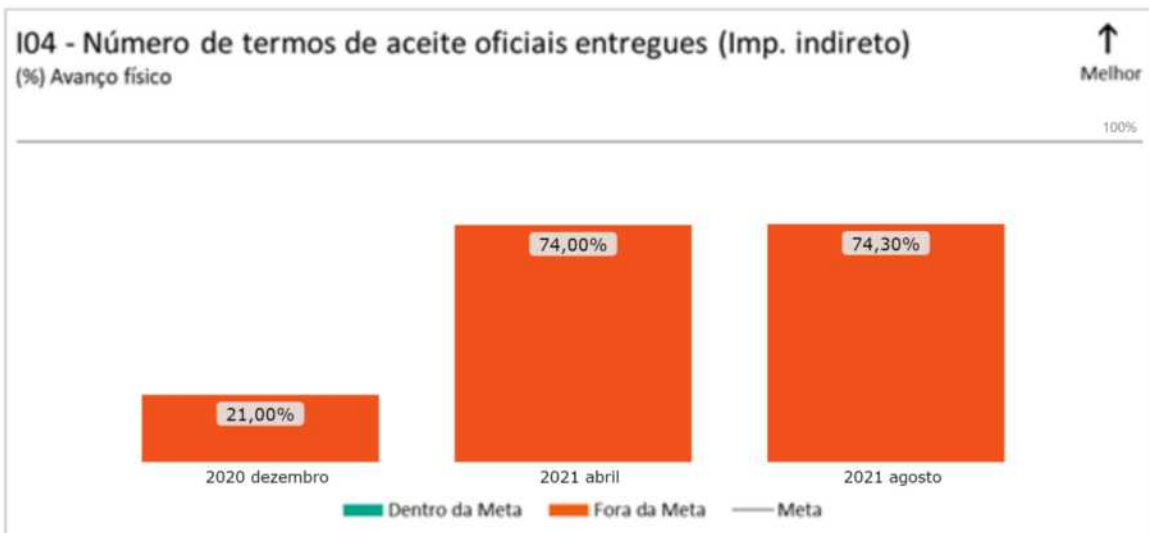


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar




Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC.

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Planejado

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021  Apoio na realização de eventos de acordo com o calendário escolar das escolas impactadas em Mariana e Barra Longa.
- dezembro de 2021  Finalização do 1º Ciclo de Formação de Professores do Apoio Psicopedagógico Institucional
- dezembro de 2021  Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Formação remota para profissionais da escola EE Claudionor Lopes pelo projeto de Apoio Psicopedagógico Institucional.

Formações presenciais para profissionais da escola EM Bento Rodrigues pelo projeto de Apoio Psicopedagógico Institucional.

Visita da turma do 4º ano da Escola Municipal Bento Rodrigues à escola definitiva do reassentamento coletivo de Bento Rodrigues. A ação faz parte do projeto "Bento: Passado, Presente e Futuro".

Indicadores

Revisão Dos indicadores do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11) aprovada pelo CIF (Deliberação CIF no 508, de 16 de junho de 2021). Definido junto à Câmara Técnica o início do reporte dos indicadores a partir de dez/21.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Concluído Internamente
Cláusula	97	caput	Concluído Internamente
Cláusula	98	a	Concluído Internamente
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	3	Planejado

Entregas do ano de 2021

- junho de 2021 ● Entrega do sistema básico de monitoramento da Reserva Técnica
- junho de 2021 ● Início das ações de reparação das Referências Culturais
- agosto de 2021 ● Primeira etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2021 ● Devolutivas aos respectivos públicos do Diagnóstico de Referências Culturais
- dezembro de 2021 ● Restauração de 85 peças na Reserva Técnica
- dezembro de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário da Casa dos Saberes e Horta comunitária
- dezembro de 2021 ● Oficinas sobre Educação Patrimonial
- dezembro de 2021 ● Conclusão do calendário 2021 de apoio as manifestações culturais
- dezembro de 2021 ● Confecção e implantação de um calendário esportivo 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Reparação de instrumentos musicais para a realização das manifestações culturais para três grupos locais (Folia do Menino Jesus de Pedras, Mariana; Folia do Menino Jesus do Barreto, Barra Longa; Folia do Menino Jesus do Barreto, Barra Longa – Folia Nova).

Realização de oficina de corte e cultura na casa dos saberes e roda de conversa para mobilização na horta comunitária.

Mobilizações em campo da equipe da UNESCO, junto a comunidades e prefeituras.

Apoio a duas manifestações culturais locais (Missa de 280 anos da Paróquia de São José, Barra Longa; Missa na Capela das Mercês em Bento Rodrigues).

24 projetos de restauro aprovados na reserva técnica.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

O detalhamento dos indicadores, com as fichas daqueles consensuados, está em processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral desse programa é, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Em Andamento
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente

Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- julho de 2021 ● Conclusão da obra da Praça Gomes Freire em Mariana
- agosto de 2021 ● Término da apresentação dos Diagnósticos de impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer junto às comunidades
- dezembro de 2021 ● Conclusão do projeto de fortalecimento institucional para o turismo no Estado de Minas Gerais e Espírito Santo
- dezembro de 2021 ● Conclusão do Fortalecimento das Organizações Locais

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Repasse do capital semente no valor de R\$5.000,00 para implantação dos planos de ação para fortalecimento de 149 organizações locais que concluíram o processo formativo do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais-FOL (meta da gerência de 150 organizações capacitadas).

Realização de oficinas participativas para elaboração dos planos participativos de turismo nos municípios complementares de Ipatinga e Timóteo (polo turístico de Marliéria). (clausula 104b)

Realização de missão técnica com 16 empreendedores dos 04 polos turísticos realizada na cidade do Recife/PE para conhecimento de experiências de turismo de base comunitária, turismo criativo e trabalho em redes colaborativas.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13) aprovado pelo CIF (Deliberação CIF nº532, de 15 de setembro de 2021).
Definido junto à Câmara Técnica o início do reporté dos indicadores a partir de dezembro/21.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações para reparação nos possíveis impactos à saúde dos atingidos.

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Concluído Internamente
Deliberação	435	1	Concluído Internamente
Deliberação	436	1	Concluído Internamente
Deliberação	452	2	Concluído Internamente
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Concluído Internamente
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	73	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 1º Repasse financeiro para contratação de RH
março de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – Final do processo Seletivo
junho de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – Final do processo seletivo
junho de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
junho de 2021	●	Execução do programa de capacitações para profissionais do SUS
agosto de 2021	●	Acompanhamento do plano de Mariana – 2º Repasse financeiro para contratação de RH
setembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para assistência farmacêutica
outubro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro para consultas e exames especializados
dezembro de 2021	●	Publicação do edital FAPES/FAPEMIG
dezembro de 2021	●	Retomada dos estudos de ARSH
dezembro de 2021	●	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa*

- 20 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (4 **profissionais**) e Barra Longa/MG (16 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 4 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

No Relatório Semestral, referente ao período de abril a setembro/21, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 3.629 consultas (média de 604 por mês) e 1.194 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para teste Covid-19, entre outros (média de 199 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, no Relatório Semestral referente ao período de outubro/20 a março/21, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. Aguarda-se a atualização deste número de consultas no período de abril a setembro/21. No relatório mais recente, a Secretaria de Saúde continuou o relato do importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 2ª Vara Cível, a Fundação Renova mantém o financiamento, por meio da empresa Contexto, de 04 profissionais de saúde atuando no apoio e fortalecimento do SUS. Nos meses de abril e maio de 2021, a Prefeitura de Mariana iniciou a contratação de parte dos profissionais que deverão substituir os atualmente contratados pela empresa Contexto. O restante vem sendo substituído após a contratação dos profissionais aprovados no processo seletivo homologado em julho e após a homologação de novo processo simplificado para preencher as vagas que ainda não puderam ser preenchidas pelo primeiro. Estes profissionais atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

Mariana – Saúde (04 profissionais atuando por meio da empresa Contexto no dia 15 de novembro/21):

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 3 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS, 1 na ESF Bento Rodrigues e Paracatu e 1 no Conviver;

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Fatos relevantes do mês

Conclusão da primeira oficina de capacitação dos profissionais do SUS no município de Mariana – Bioestatística.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.

PG015 Promoção da Inovação




Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação.

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- outubro de 2021  Início da execução da primeira rodada do programa de aceleração (online) do Hub de Inovação em Mariana
- dezembro de 2021  Finalização do monitoramento e avaliação do protótipo da Estação de Tratamento Natural
- dezembro de 2021  Lançamento da Chamada Pública - Agroecologia e Produção Orgânica em MG

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores



Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianaual.

Nota: Correção da informação apresentada no relatório anterior “P15-RMS-010-00-CIF 31.10.21” alterando Percentual de recurso já aportado em formação de pessoas de 13,6 para 13,5 se adequando a realidade do programa.

Nota: "O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa, em dezembro/2025. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas".

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras


Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras. É importante ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles (as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o Registro Geral de Pesca (RGP), aqueles advindos do "Pescador de Fato" ou com protocolo emitido com a legislação vigente. Para aquicultura, aqueles (as) que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para desempenhar essa atividade. Nesse contexto, para atendimento dos (as) pescadores (as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de atuação: Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas e Eixo 2 - Processos de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda através de processos de reparação coletivos onde serão somadas ações de dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e da comercialização de pescado.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2021



junho de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral I
setembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral II
outubro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral I
dezembro de 2021	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral III

Nota: entrega do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Relatórios Territoriais Foz do Rio Doce – Litoral, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Alto do Rio Doce, foram reprogramados para 2022.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 7 comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal, Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (200 beneficiários);
- Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários;
- 40 oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e ASPERDOCE em MG e APIGUA no ES (145 beneficiários);
- 246 participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga;
- 187 materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até 11/2021 , aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 162 beneficiários pelo Projeto Cultivando para Pescar;
- Aplicados 4311 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro, de forma remota com pescadores e aquicultores do Projeto da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro;
- 1279 entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais do Projeto do Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado.

Fatos relevantes do mês

Obtenção da anuência municipal do sistema de Aquaponia em Entre Rios do Projeto Cultivando para Pescar.

Finalização da capacitação de piscicultura superintensiva em Regência do Projeto Cultivando para Pescar

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os pescadores e aquicultores em atividades alternativas nos projetos Cultivando para Pescar, Associativismo e Cooperativismo e, de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e, de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela Fundação Renova.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições encontram-se em revisão na CTEI onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a fomentar o reestabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado

Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

Os cursos da EMATER programados para término em outubro/2021 foram reprogramados para término em 2022 mediante aditivo que cobre o prazo paralisado devido COVID em seu novo formato on-line

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 250 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 201 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 191 são do PASEA planejados sendo que 191 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 10 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 160 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 31 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.803,3 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 189,7 toneladas no mês;
- 11.940,5 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades;
- 458 barraginhas realizadas;
- 897 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 188 nascentes cercadas e 48 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.098 hectares de reestruturação produtiva executados.

Médio Rio Doce

- 5.035 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 8.539 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 39.671 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 2.162 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 4.404 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 324 toneladas no mês.

Parcerias

- 33 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 15 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Não houve fatos relevantes no mês.

Baixo Rio Doce

- Início da entrega dos insumos da reparação dos danos aos produtores a jusante de Candonga.

Alto Rio Doce

- Finalização da reaplicação de 15 ISA's nas propriedades aderidas no Alto Rio Doce.

Indicadores

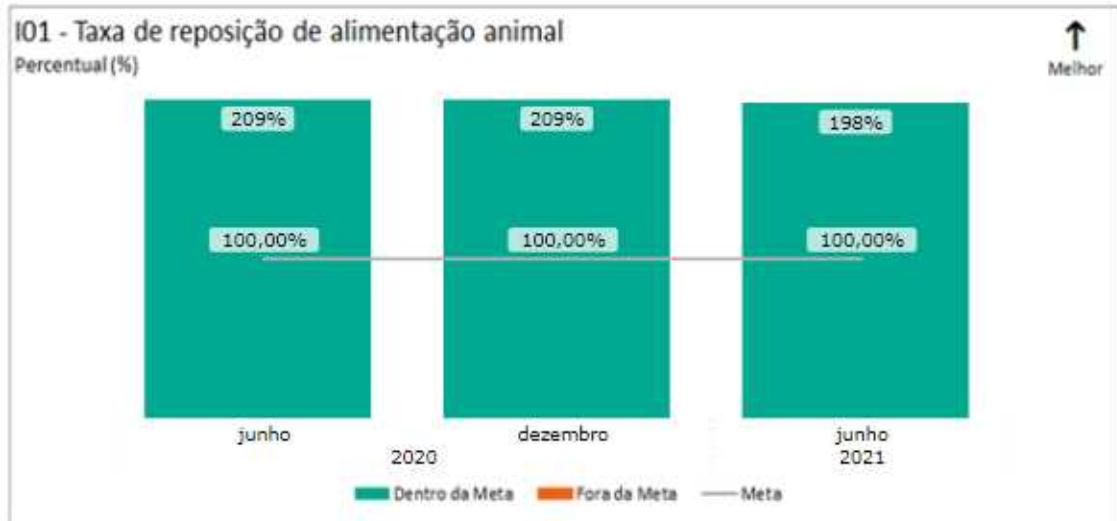


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	N° de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / n° de produtores participantes do Programa	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	N° de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	448	3	Reprogramado
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- janeiro de 2021 ● Encerramento do 2º Edital para promoção de negócios coletivos sociais (Brazil Foundation)
- junho de 2021 ● Encerramento do Fundo Compete MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 59,03 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 48 milhões foram **desembolsados** para 1475 contratos e 1146 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 424 contratos e 403 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Ref. Outubro/2021

Fatos relevantes do mês

- Projeto Feijão - Visita com equipes técnicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA/MG) às comunidades participantes do Projeto Feijão, para construção de plano de atuação conjunta, em desenvolvimento a partir da CTEI;
- Projeto Bancos Comunitários - Emissão da Minuta da Nota Técnica 95/2021 pela CTEI recomendando a Aprovação do projeto.
- Projeto Agroecológico ES - Licenciamento da obra no assentamento Valdício Barbosa – Autorizado pela Prefeitura, início da obra a partir de 06/12.

Indicadores

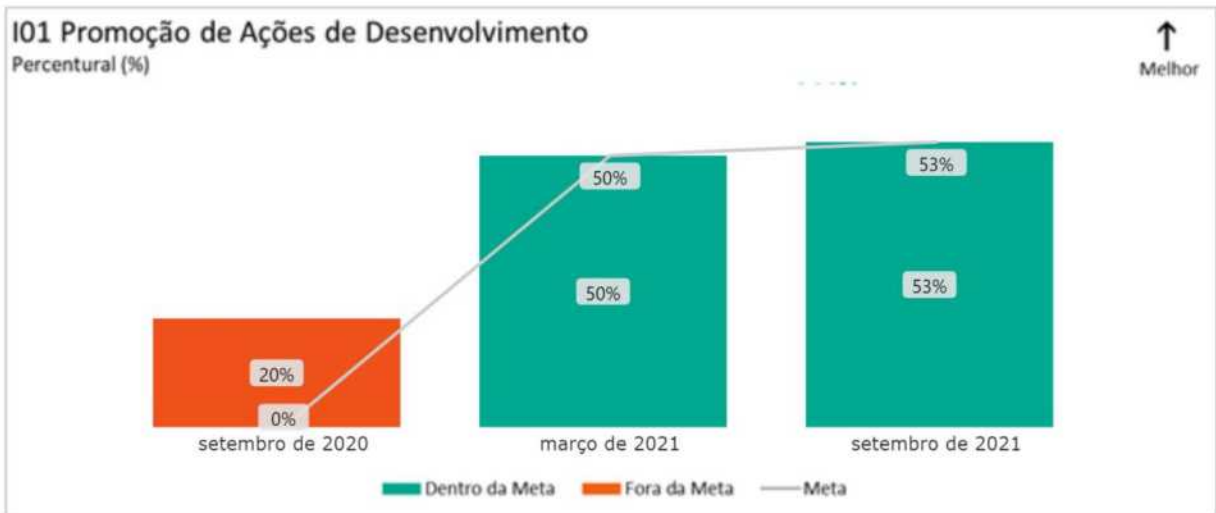


Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.

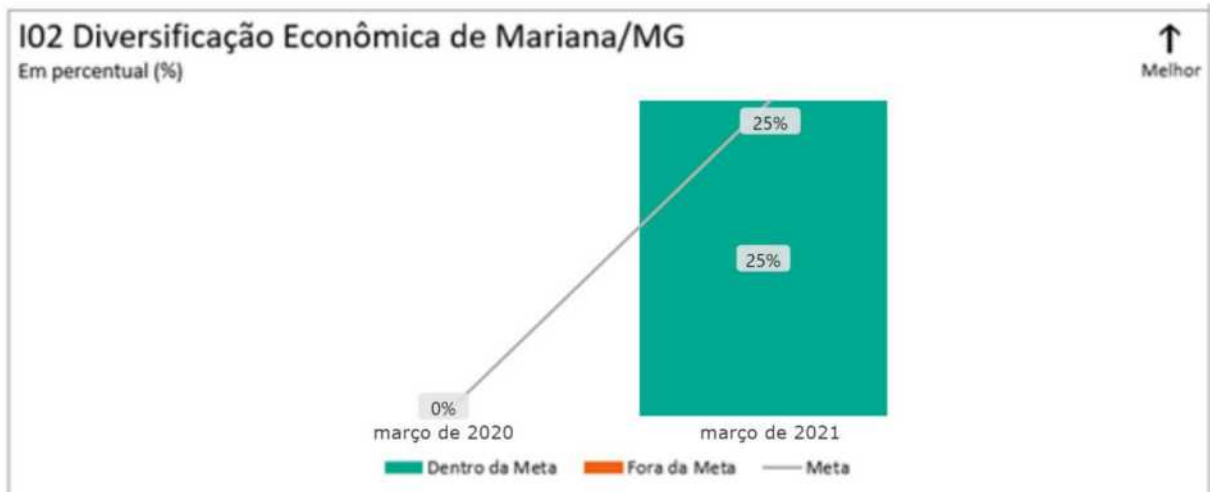


Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
<p>Fundo Compete Rio Doce Minas Gerais: R\$ 7,05 milhões desembolsados; 213 contratos; 130 empresas</p> <p>A Fundação Renova reportou no Relatório Mensal de Atividades de Fevereiro de 2021, na página 147, os valores desembolsados, o número de contratos firmados e a quantidade de empresas contempladas pelo Fundo Compete Rio Doce em Minas Gerais. Dessa forma, a EY executou procedimentos de inspeção documental, visando verificar os quantitativos reportados pela Fundação Renova no Relatório Mensal de Atividades de fevereiro de 2021.</p>	<p>PG018.008: Foi identificada divergência entre o reporte realizado pela Fundação Renova e as evidências disponibilizadas em relação à quantidade de empresas associadas ao Fundo Compete Rio Doce, sendo que no Relatório Mensal de Fevereiro de 2021 foi reportado 130 empresas e nas evidências apresentadas foi identificada menção a 127 empresas.</p>	<p>Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de fevereiro/2021 o número correto de empresas que acessaram o Fundo Compete Rio Doce-MG foi de 127 empresas e não 130 como informado anteriormente.</p>
<p>Fundo Compete Rio Doce Minas Gerais: R\$ 7,05 milhões desembolsados; 213 contratos; 130 empresas</p> <p>A Fundação Renova reportou no Relatório Mensal de Atividades de Fevereiro de 2021, na página 147, os valores desembolsados, o número de contratos firmados e a quantidade de empresas contempladas pelo Fundo Compete Rio Doce em Minas Gerais. Dessa forma, a EY executou procedimentos de inspeção documental, visando verificar os quantitativos reportados pela Fundação Renova no Relatório Mensal de Atividades de fevereiro de 2021.</p>	<p>PG018.009: Foram disponibilizadas pela Fundação Renova evidências que apresentam dois valores distintos para a quantidade de contratos associados ao Fundo Compete Rio Doce no Estado de Minas Gerais, sendo que ambos são divergentes do reportado pela Fundação Renova no Relatório Mensal de Atividades de Fevereiro de 2021.</p>	<p>Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de fevereiro/2021 o número correto de contratos realizados para o Fundo Compete Rio Doce-MG foi de 214 contratos e não 213 como informado anteriormente.</p>

Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de março/2021 o número correto de empresas que acessaram o Fundo Compete Rio Doce-MG foi de 127 empresas e não 130 como informado anteriormente.

Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de março/2021 o número correto de contratos realizados para o Fundo Compete Rio Doce-MG foi de 214 contratos e não 1296 como informado anteriormente.

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO.

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Finalização dos atendimentos de assessoria técnica aos 13 grupos produtivos (175 artesãos) de Mariana e Barra Longa do Projeto Catarse Coletiva.
- abril de 2021 Finalização da assessoria técnica pelo IEBT para 26 negócios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
- julho de 2021 Finalização de atendimentos de assessoria técnica para 20 atingidos em 2 turmas, em formato online, do Projeto Inovando Futuros
- novembro de 2021 Reposição de insumos e equipamentos para 15 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2021 Finalização da assessoria técnica e implementação de melhorias para 70 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação (17% do público do PG19).
- dezembro de 2021 Finalização de assessoria técnica para 20 negócios impactados em Mariana-MG e 15 negócios em Barra Longa-MG

A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues prevista para 2021 não ocorrerá em função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

365 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 487 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 16 a quantidade de **aluguéis**, 189 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 5 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (697) ultrapassa a quantidade total de atendidos (365). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Lançamento do Programa Impulso Rio Doce – Programa de Aceleração de Negócios de Mariana e Barra Longa.

Desenvolvimento de consultoria de design gráfico para criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de 31 negócios atingidos.

*Dados acumulados até novembro 2021.

Indicadores

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria / assessoria especializada reportado a partir de janeiro de 21 encontra-se em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente o qual terá seu levantamento concluído em dezembro/21

¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa feito com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de mapeamento dos pesos para medição previsão de conclusão em dezembro/21

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas de Fundação a Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertados pela Fundação Renova, **7.335 pessoas matriculadas, 1.566 concluintes, 1.208 reprovados e 2.617 evadidos.**
- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas **131 turmas, abertas 3.671 vagas, 3.225 pessoas matriculadas, 1.810 concluintes, 304 reprovados e 1.081 evadidos.**
- **R\$ 1.848.563** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

O 3º ciclo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF), tem como objetivo preparar empreendedores para se tornarem mais competitivos nos territórios de atuação da Fundação Renova em Minas Gerais, em outubro/21 realizou palestras abertas ao público, capacitações e assistências técnicas, que são direcionados exclusivamente aos participantes do programa, promovendo a interação e debates a respeito dos conteúdos tratados.

-Palestra on-line no dia 03/11/2021 cujo tema foi "Gestão de Contratos e Projetos", com 37 inscritos, 70 participantes e 86 visualizações no YouTube até o dia 02/12/2021.

-Quatro turmas de capacitações on-line abordando o tema "Gestão de Contratos e Projetos" de 08/11/21 a 09/11/21.

Início das inscrições presenciais para duas modalidades de capacitação profissional para moradores de Povoação e Regência, comunidades localizadas em Linhares (ES) e que foram impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). A ação é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (SENAI ES). Foram ofertados os cursos de Assistente Administrativo e Almoxarifado ambos com 25 vagas para cada comunidade.

Conclusão do curso presencial de "Iniciação Profissional em Noções Básicas de Pedreiro de Alvenaria" em Mariana (MG), ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (SENAI MG).

Através do eixo de monitoramento do PG20, que tem como objetivo a orientação dos fornecedores da Fundação Renova sobre a priorização da contratação local (mão de obra e fornecedores), foi identificada a contratação de 158 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em novembro/21, sendo 127 contratações locais e 31 não locais, 152 profissionais de Minas Gerais, 1 do Espírito Santo e 5 de outros estados da federação.

Indicadores

I01- Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor

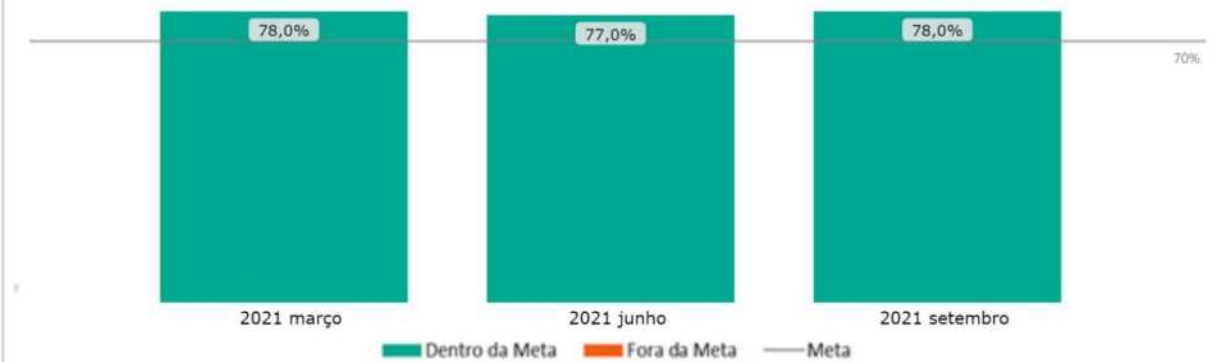


Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

I02- Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor



Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.

I03- Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual (%)

↑
Melhor

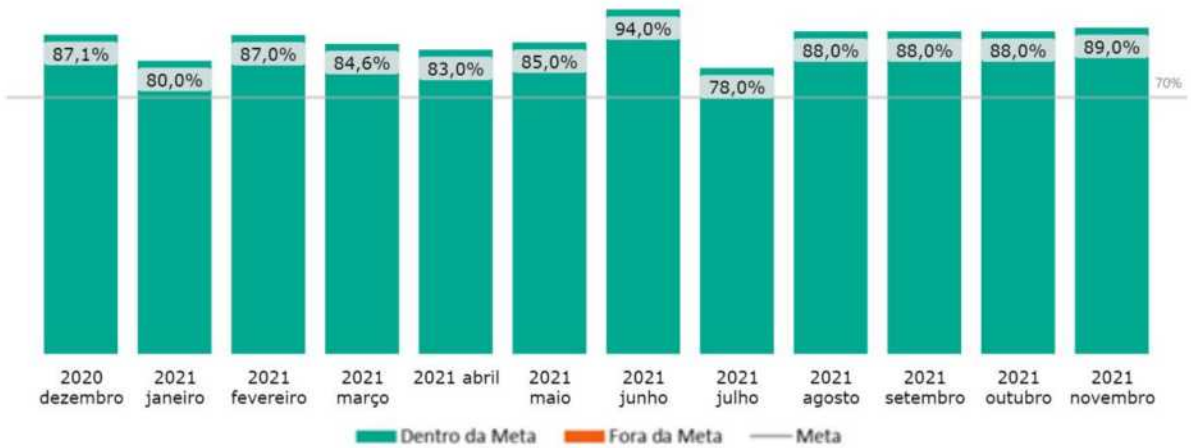


Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I04- Relação de profissionais admitidos em cada região – 39

Municípios

Percentual (%)

↑
Melhor

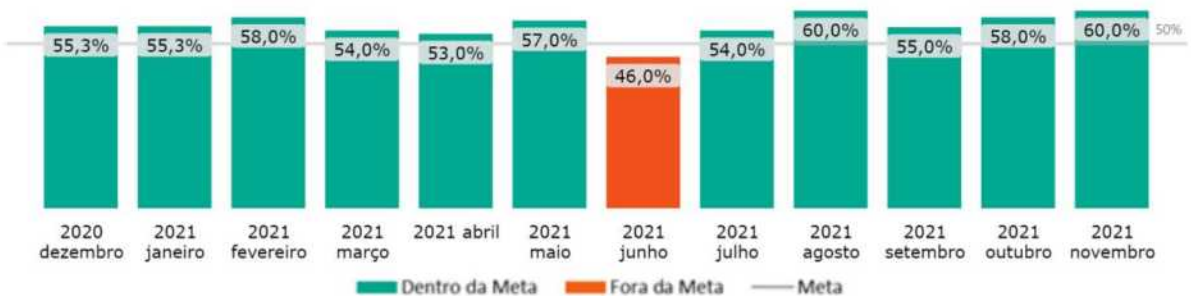


Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

I05- Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento
profissional

Quantidades



Melhor

2.000



Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

IC- Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova

Percentual (%)



Melhor

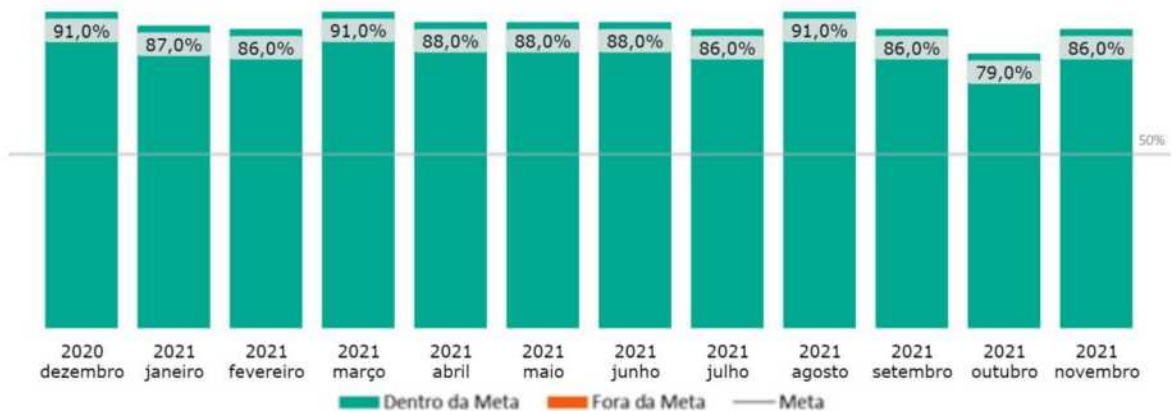


Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas.

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente

Deliberação	307	2b	Judicializado
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente

Grandes números do programa

- Atualmente há 7 611 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 11 234 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1 670 8 Mi .

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 6 auxílios

Exclusão de 266 auxílios

Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal

Indicadores

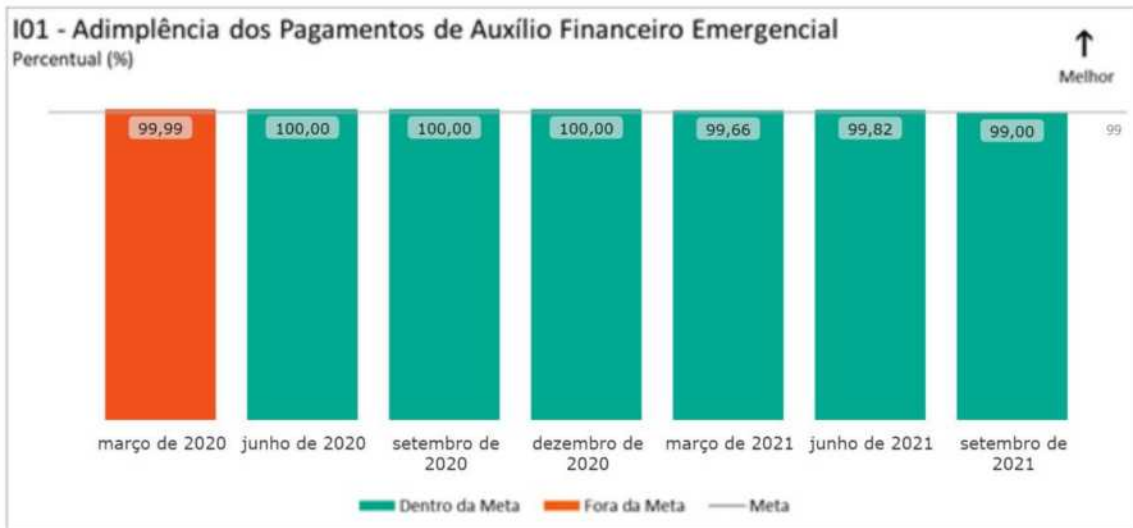


Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

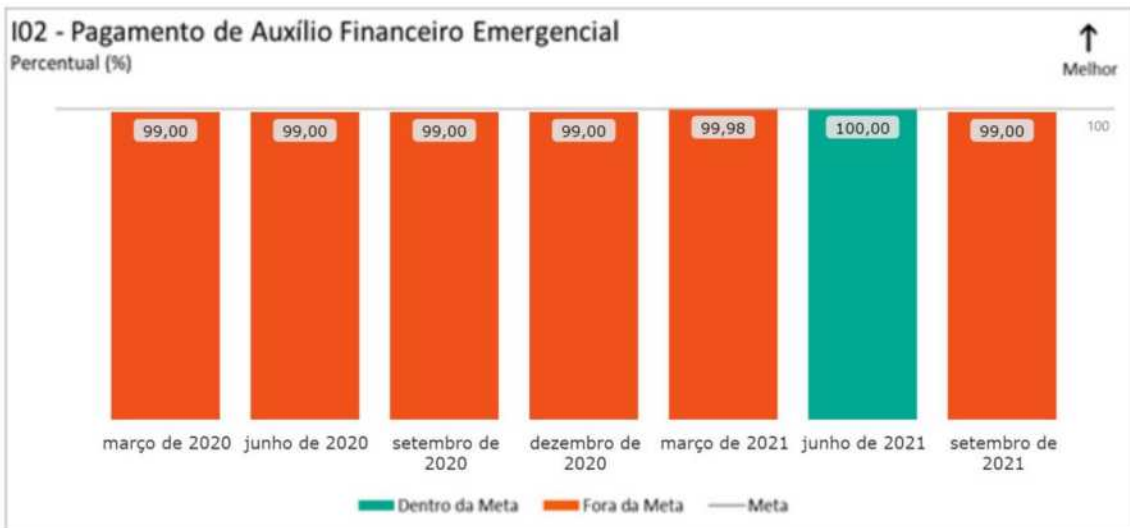


Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Concluído Internamente
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente

Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	378	5	Em Andamento
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Em Andamento
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	464	2	Reprogramado
Deliberação	488	4	Concluído Internamente

Deliberação	488	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Em Andamento
Deliberação	497	3	Em Andamento
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	544	2	Em Andamento
Deliberação	544	3	Em Andamento
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Protocolo de uma nova versão do Relatório Técnico denominado "Revitalização da Cachoeira Camargos: Consolidação das Ações de Manejo e Monitoramento" e do "Plano de Caracterização revisado" em resposta aos itens 2 e 3 da Deliberação nº 544 e à Nota Técnica CT -GRSA nº. 16/2021.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Concluído Internamente
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios finalizado
- setembro de 2021 Conclusão do monitoramento aéreo executado pela empresa Geopixel
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Barra Longa- 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Mariana - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Ponte Nova - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Rio Doce - 2021
- dezembro de 2021 Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada no município de Santa Cruz do Escalvado- 2021

Concluído

Planejado

Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%
I08	Solo Exposto – Cenários B e C	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente

Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

fevereiro de 2021	●	Celebração do termo de adesão com os atores sociais e instituições envolvidos na cadeia produtiva de restauração (objetivo específico 1)
abril de 2021	●	Entrega do Fundo Rotativo Social (objetivo específico 12)
abril de 2021	●	Conclusão as atividades de engajamento nas propriedades para Sabinópolis, Virgíópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Açucena - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Aimorés e Santa Rita do Itueto - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Alto Rio Novo e Águia Branca - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Alvarenga e Pocrane - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Assentamentos/MST - CFFV - 19/21
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Colatina e Marilândia - 2021/2022
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares e Periquito - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virgíópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virgíópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para Santa Teresa - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Geraldo da Piedade e Santa Efigênea de Minas - 21/22
junho de 2021	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Alvarenga e Pocrane - 21/22
dezembro de 2021	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Baixo Guandu - 21/22


Concluído

Planejado

Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Alto Rio Novo e Água Branca - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Açucena - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Aimorés e Santa Rita do Itueto - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Colatina e Marilândia - 2021/2022
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Governador Valadares e Periquito - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Laranja da Terra - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Mutum e Lajinha - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Pancas - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Rio Bananal e Linhares - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sabinópolis, Virginópolis, Guanhães e Governador Valadares - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Santa Teresa - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para São Geraldo da Piedade e Santa Efigênea de Minas - 21/22
- dezembro de 2021  Conclusão da mobilização dos produtores rurais para São Roque do Canaã e Colatina - 21/22

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

Grandes números do programa

- 981 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 213 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 19 Mil **hectares** inscritos no edital;

Fatos relevantes do mês

No tópico “Marcos do Programa” sobre a assinatura do Termo de Anuência por todos os proprietários rurais do município de Coimbra (MG), publicados nos “Relatórios Mensais de Atividades” de julho e agosto de 2019, página 275 e 261, respectivamente. Onde se lia: mar-19. Leia-se: jun-18

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
I04	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água



Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021  Início do cercamento em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)
- dezembro de 2021  Conclusão do cercamento/proteção nas propriedades em Ponte Nova (MG) no ano 03 (2018/2019)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 1037 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 446 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 3 Mil **nascentes** inscritas no edital;

Fatos relevantes do mês

A data de execução do plantio da nascente ICIC0006_UT01_NAS01 foi reportada pela Fundação Renova como sendo em setembro de 2017, mas retifica-se a data do plantio para novembro de 2019, executado por empresa contratada

No "Relatório Anual de Atividades" de 2017 onde se lia "311 propriedades foram cadastradas e 687 nascentes levantadas" leia-se: 249 propriedades foram cadastradas e 476 nascentes levantadas, através da declaração dos produtores".

No relatório CIF 2019 onde se lia "No ano 2 da recuperação de nascentes e APPs (2018), 528 nascentes em 233 propriedades estão contempladas" leia-se 529 nascentes em 245 propriedades contempladas" conforme o shapefile "PG27_Mob_Nascentes_ANO1_ANO2".

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Diversidade de espécies nativas	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) \times 100$	%
I02	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I03	Controle de espécies invasoras	$(\text{Total da área amostral com espécie invasora} / \text{Total da área amostral}) \times 100$	%
I04	Solo exposto	$(\text{Total da área amostral com solo exposto} / \text{Total da área amostral}) \times 100$	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Reprogramado
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado

Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	166	§1º	Reprogramado
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente
Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	361	2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente
Deliberação	74	1	Concluído Internamente


| Deliberação

79

n/a

Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

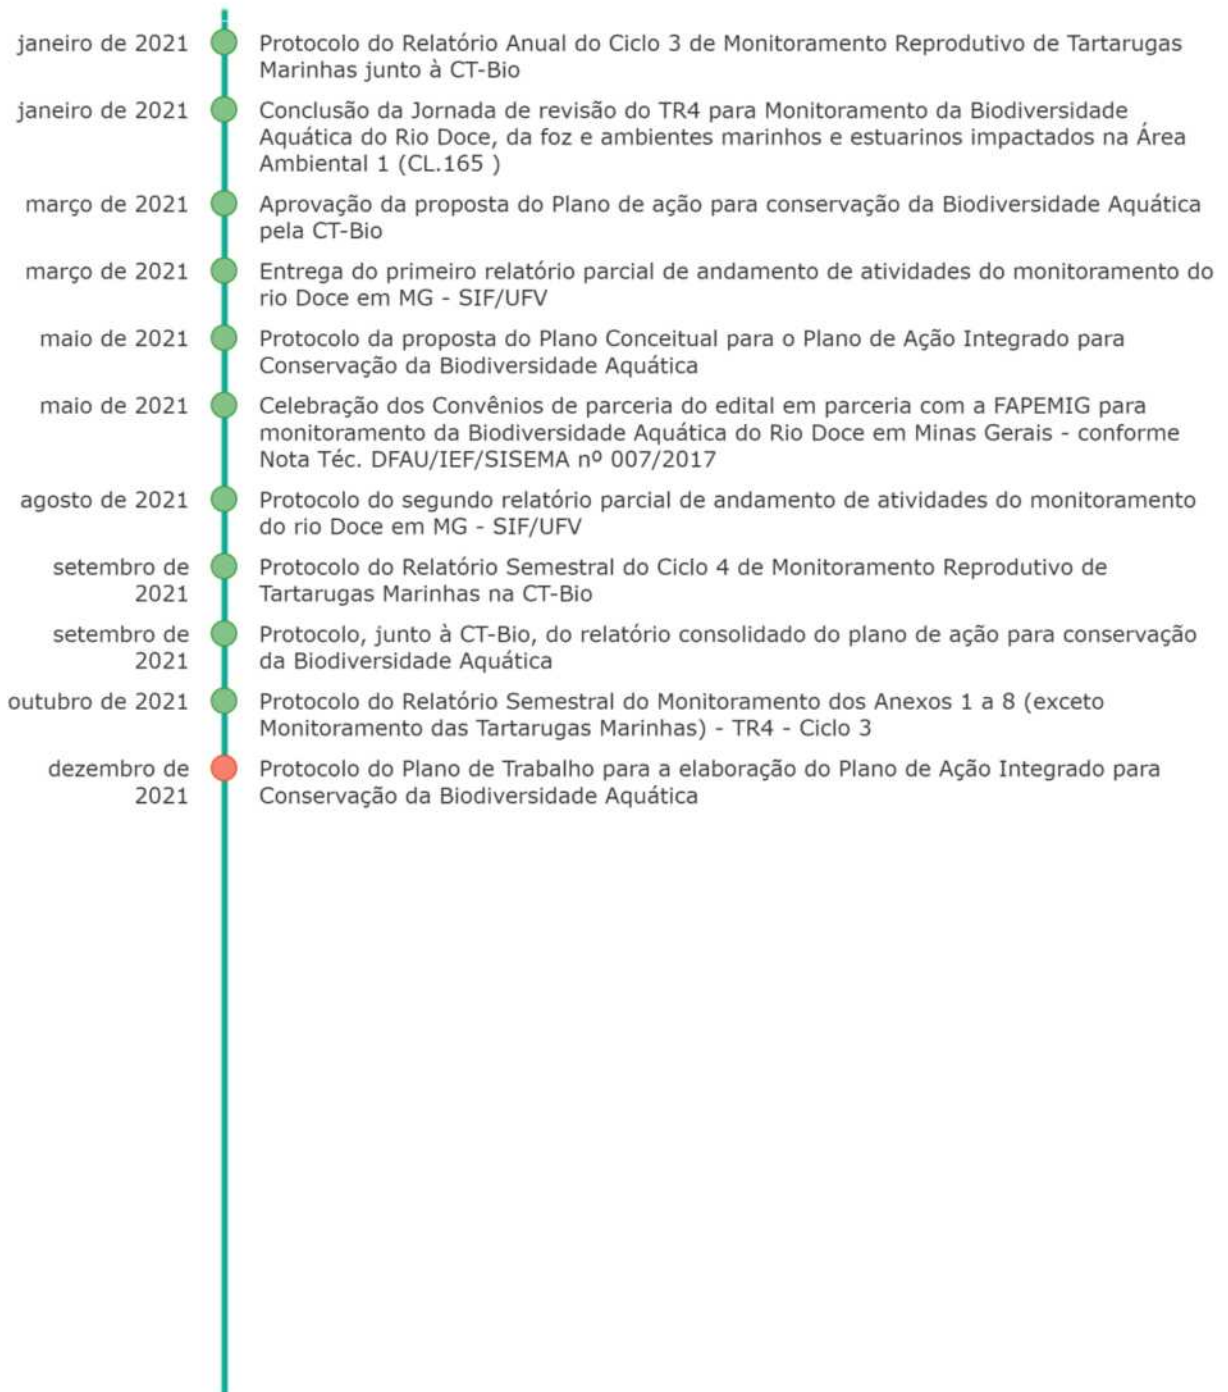

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Seminário de apresentação do relatório semestral do PMBA - Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

setembro de 2021	● Conclusão do Projeto Básico do CETRAS ES
dezembro de 2021	● Aprovação do orçamento do Programa pelo CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para recuperação e conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- fevereiro de 2021 ● Protocolar Relatório da 2ª campanha de Monitoramento do inventário de Flora Terrestre
- junho de 2021 ● Entrega do Plano de Trabalho para execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Terrestre
- agosto de 2021 ● Protocolar na CTBio relatório e matriz de monitoria 1 do Plano de Ação

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Em 19/11 foi protocolado a complementação do 1º relatório de monitoria incluindo o resultado do processo de revisão das metas e indicadores das ações do Plano de Ação pelo GAT.

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos








Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela Fundação Renova, no valor de R\$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos, estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o programa prevê também a destinação de R\$ 17 milhões para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Em Andamento
Cláusula	170	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc II	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc IV	Concluído Internamente
Cláusula	170	Inc V	Concluído Internamente
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRSPM01-Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (PIGIRS/CIMVALPI)
junho de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Colatina COLESOB26-Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de São José do Goiabal SJGESOB02-Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Linhares LINESOB13-Execução da obra de sistema de esgotamento sanitário na localidade de Baixo Quartel
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
dezembro de 2021		Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
dezembro de 2021		Cancelamento do pleito

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês **11/2021** , **foram repassados R\$ 1.305.915** para ações dos municípios*;
- No mês **11/2021** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **11/2021** a equipe técnica realizou **77 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

*Repasse para ações dos municípios de Alpercata Bom Jesus do Galho Ipatinga Itueta Linhares Rio Casca Rio Doce São Domingos do Prata e São José do Goial

*As evidências de visitas e/ou reuniões com apoio técnico referentes aos meses de Set/21 e Out/21 foram atualizadas

Fatos relevantes do mês

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$ 47.550,06, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Bom Jesus do Galho, no valor de R\$ 28.678,89, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 52.171,65, referente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R\$ 40.825,70, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Linhares, no valor de R\$ 381.347,31, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 12.985,20, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento de obras;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 184.175,65, referente a construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 30.606,58, referente a construção de SES para o distrito de Jorge;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 417.669,33, referente a construção do sistema de esgotamento sanitário;

Em novembro de 2021, foi realizado repasse ao município de São José do Goiabal, no valor de R\$ 109.904,40, referente a ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário;

Indicadores

Nota: Durante a 31ª Reunião do Comitê Interfederativo que deliberou a aprovação da Nota Técnica CT-SHQA nº 24/2018 (Deliberação CIF nº 224/2018) a Fundação Renova se manifestou contrária ao procedimento adotado para aprovação da mesma. Foi registrado em ata desta reunião que a Fundação se manifestaria. A Fundação Renova se manifestou ao CIF/CT-SHQA por meio do ofício OFI NII 012019 497 em 02/01/2019 e até o momento não se teve retorno deste Comitê. Além disso, em novembro/2019 foram realizadas oficinas de revisão dos Programas com participação de representantes da Fundação Renova e CT-SHQA. O resultado dessa oficina culminou na Definição do Programa 2020 protocolada em 29/10/2020, mas que até o momento também não teve resposta da CT-SHQA/CIF.

Em julho de 2021 foi emitido pela auditoria externa independente o Relatório de Acompanhamento do Programa Ciclo 2, que apontava três itens relativos aos indicadores.

Como Plano de Ação, a Fundação Renova informou que iria agendar reunião com a CT-SHQA para definir/formalizar quais os indicadores o Programa 31 deverá adotar, considerando que até o momento não se teve resposta sobre a Definição do Programa e manifestação protocolada pela Fundação Renova. Após o alinhamento da reunião, Fundação Renova irá detalhar os indicadores acordados e protocolar junto ao CIF.

Para dar início ao Plano de Ação, a Fundação Renova protocolou junto ao CT-SHQA/CIF o ofício FR 2021 1064 em 08 de julho de 2021, solicitando para a próxima Reunião Extraordinária da CT-SHQA pauta para tratarmos sobre os indicadores do PG31. Aguardamos a manifestação da CT-SHQA para definição de como apresentar os indicadores do Programa do presente Relatório.

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura


Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado

Deliberação	2		Em andamento
Deliberação	4		Judicializado
Deliberação	10		Concluída internamente
Deliberação	16		Judicializado
Deliberação	33	1	Concluída internamente
Deliberação	33	i e ii	Em andamento
Deliberação	76	4	Concluída internamente
Deliberação	76	3	Concluída internamente
Deliberação	76	5	Concluída internamente
Deliberação	98	1	Concluída internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída internamente
Deliberação	107	4	Concluída internamente
Deliberação	123	2	Concluída internamente
Deliberação	123	3	Judicializado
Deliberação	124	2	Concluída internamente
Deliberação	124	4	Concluída internamente
Deliberação	185	2	Concluída internamente
Deliberação	185	3	Concluída internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluída internamente
Deliberação	258	5	Concluída internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluída internamente
Deliberação	378	5 e 6	Concluída internamente
Deliberação	379	1	Concluída internamente
Deliberação	379	2	Concluída internamente
Deliberação	379	3	Concluída internamente
Deliberação	443		Concluída internamente

Entregas do ano

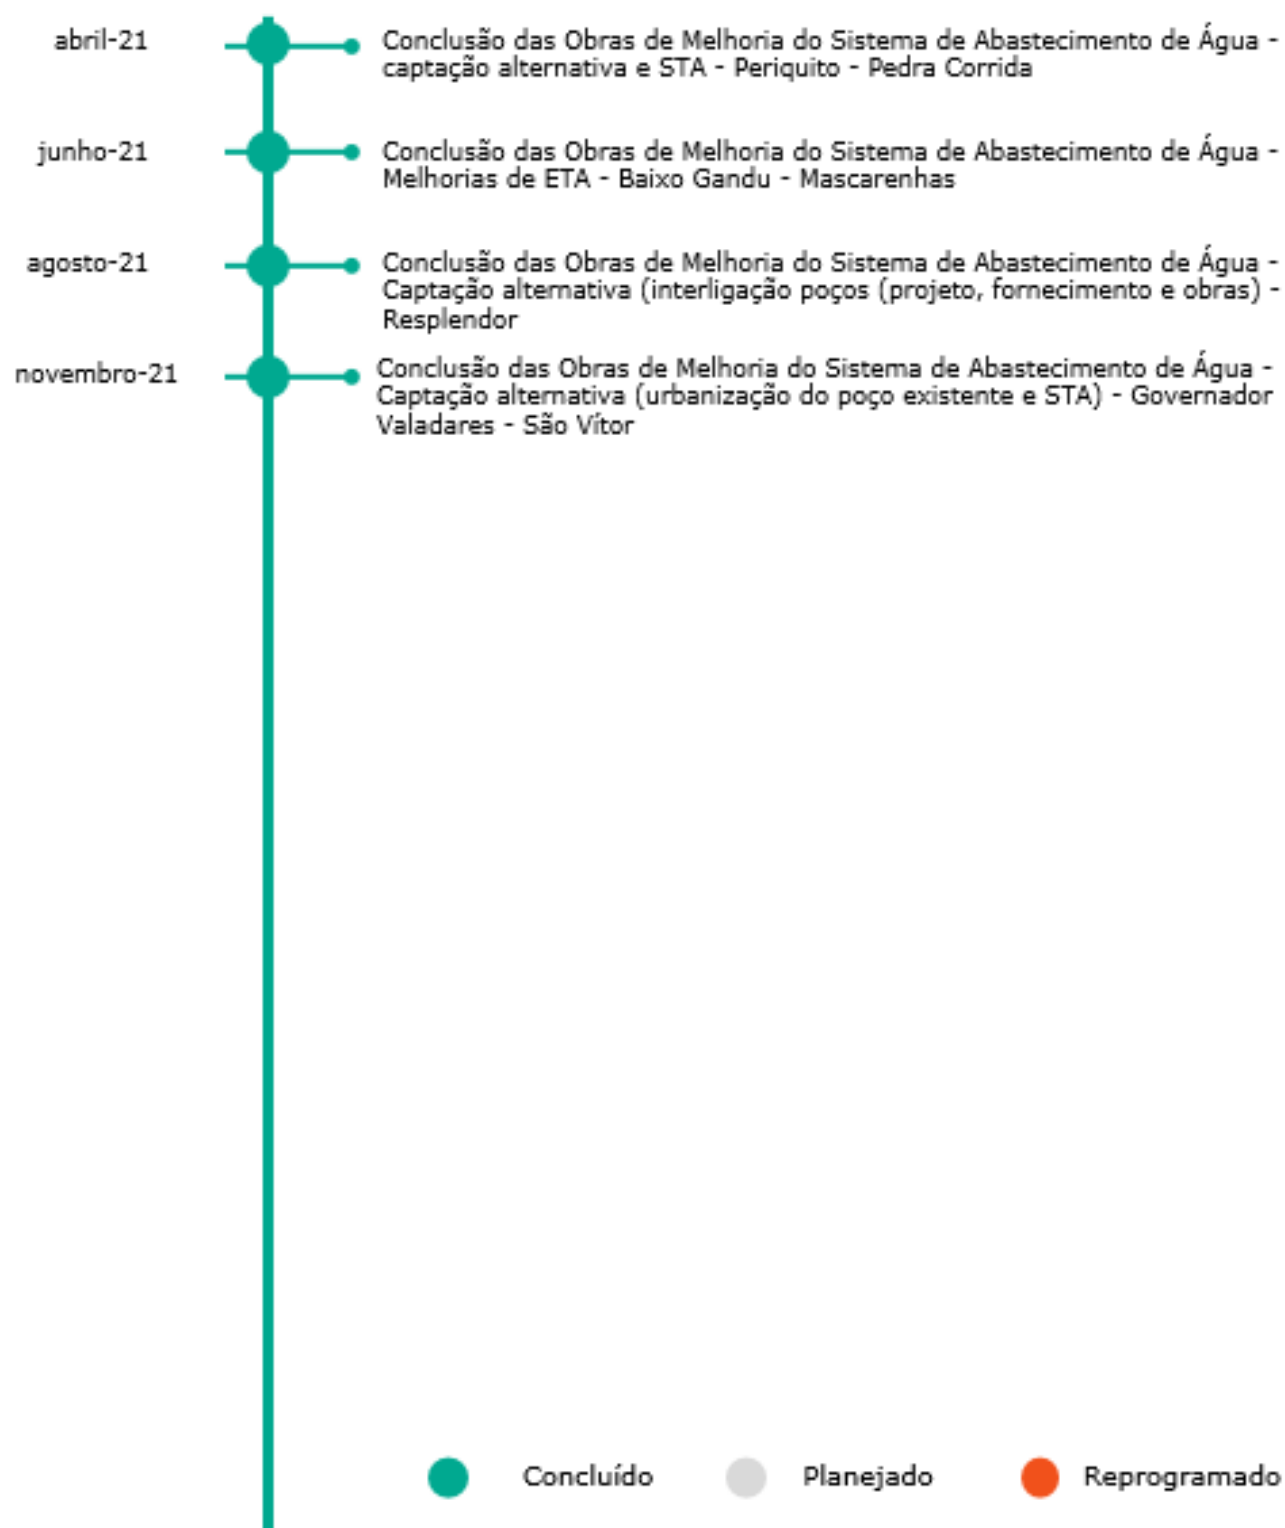

Grandes números do Programa

- **17** Sistemas de Tratamento Concluídos (construídos e reformados);
- **17** adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas).

Fatos relevantes

Em função da judicialização do Programa foram realizadas as visitas técnicas da Perícia do eixo 9 nas localidades de Santana do Deserto, Gesteira Mutirão, Pedras ,Ponte do Gama, Pedra Corrida, Itueta e Baixada do Coronel Roberto (Ipaba e Caratinga).

Início dos testes de interferência nas vazões dos poços C1 e C2 da COPASA em Itueta.

Indicadores


I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer, devido à judicialização.

I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer, devido à judicialização

I03 A - Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captação Alternativa

Em Percentual (%)

↑
Melhor

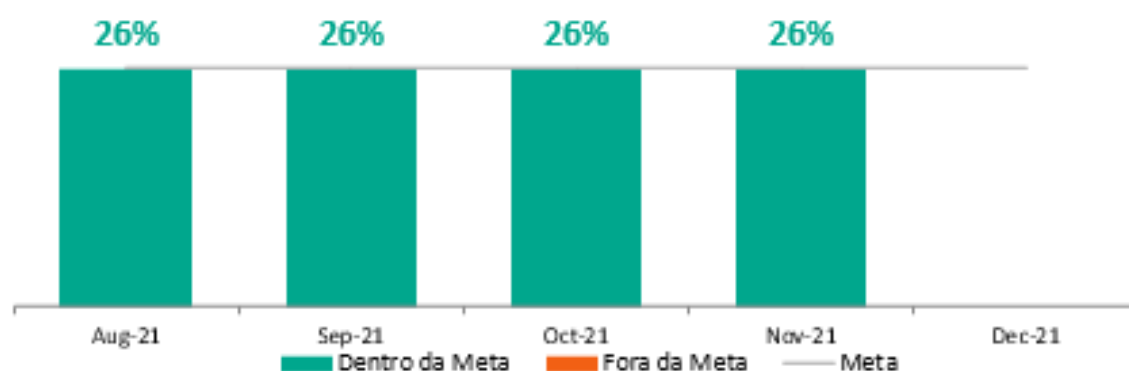


I03 B - Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento Melhoria das Estações de Tratamento de Água

Em Percentual (%)

↑


Melhor

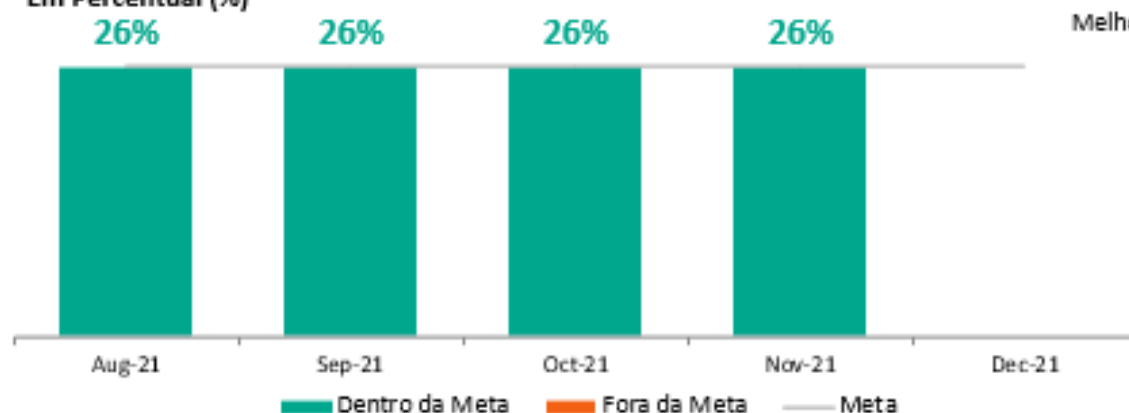

Indicadores


I04: -Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Em Percentual (%)

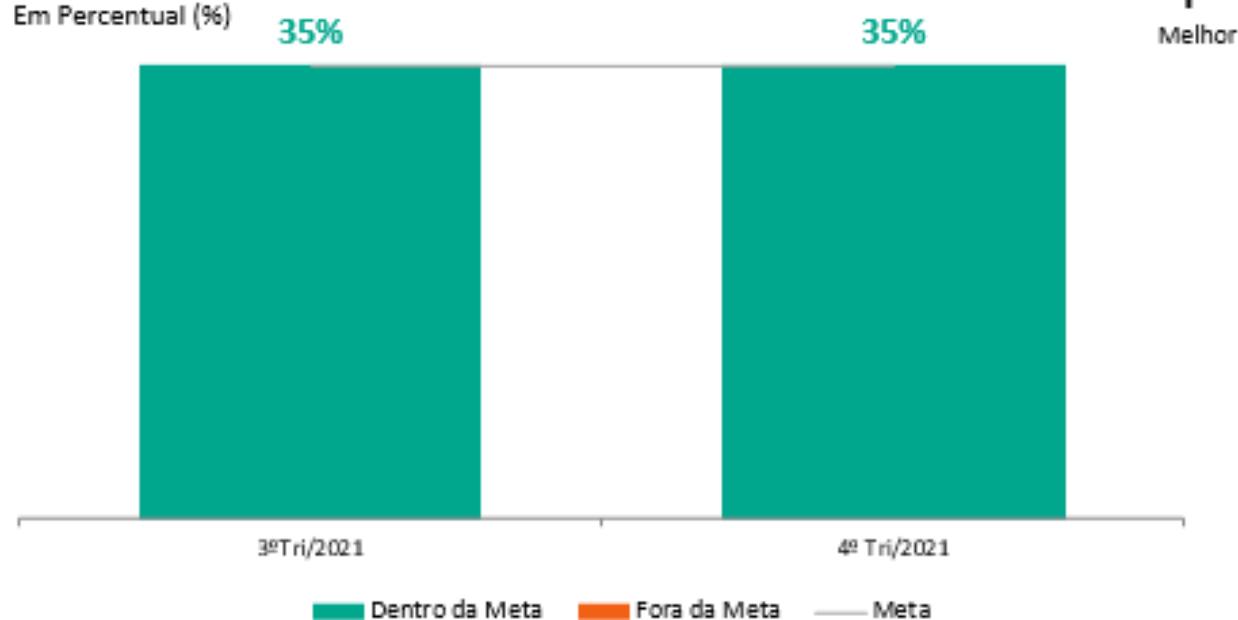

I05: -Índice de Localidades com com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Em Percentual (%)

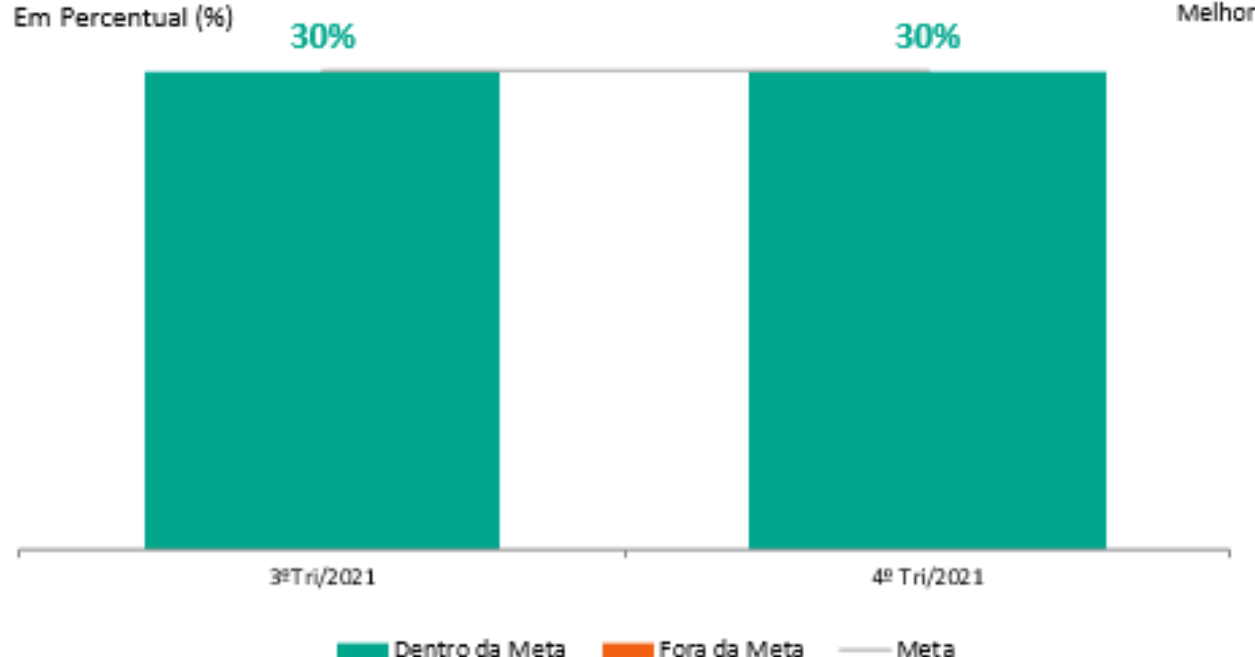

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O programa tem como objetivo geral implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021



 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

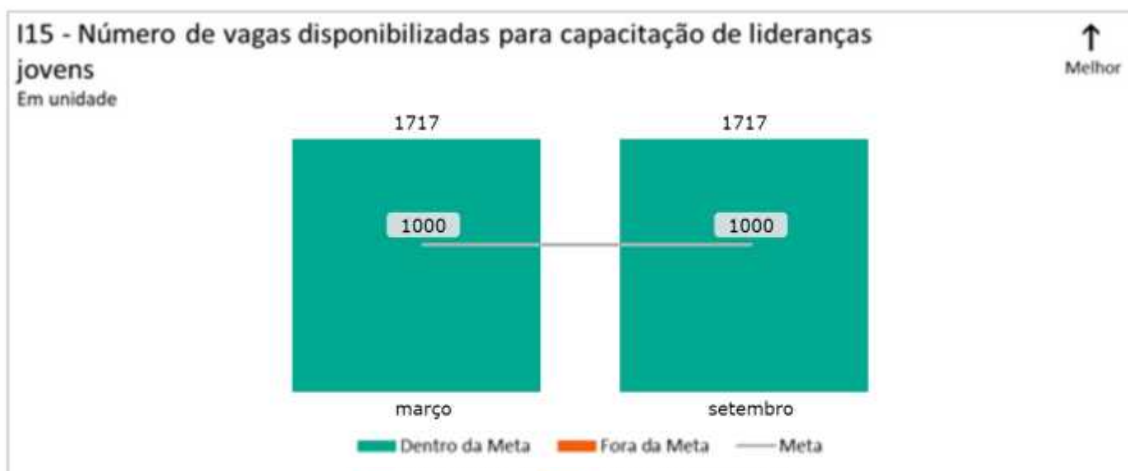


Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

PG034 Preparação para Emergências Ambientais





Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

O objetivo geral é a implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

março de 2021		Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas
dezembro de 2021		Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos 2021 em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Conclusão dos Simulados de resposta às situações de emergência na comunidade escolar de 2021 com a COMPDEC nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2021		Repasse de recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civas e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civas - Deliberação 471

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Repasse de recurso no valor de R\$ 4.0 MM para a construção/reforma da sede da Defesa Civil de Mariana - Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Cíveis

Repasse de recurso no valor de R\$ 0.5 MM para a aquisição de novos equipamentos para a Defesa Civil de Mariana

Indicadores

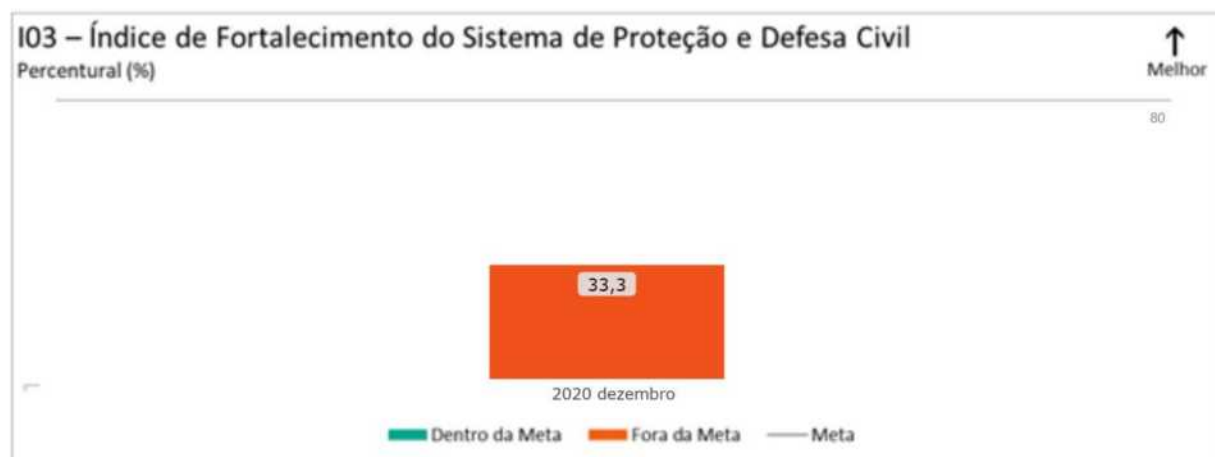


Gráfico 1. Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Frequência anual.



Gráfico 2. Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis. Frequência anual.

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/21

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e dar acesso a informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo: (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços fixos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e (ii) informações sobre o modo de vida e os processos relacionados às comunidades e municípios atingidos.

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Concluído Internamente
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente

Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Finalização das Contratações para Execução do Projeto do CIT de Regência
- julho de 2021 ● Fase 2 - Apresentação da plataforma digital como repositório técnico de informações
- julho de 2021 ● Finalização da Implantação do Repositório Técnico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.

Fatos relevantes do mês

No dia 11/11/2021 foi realizada uma visita técnica ao Museu da Cidade e a Praça Getúlio Vargas em Governador Valadares com o intuito de colher mais informações a respeito dos dois locais. A equipe da Fundação Renova PG35 também esteve presente no escritório do CIA para avaliar a implantação do ponto de acesso do CIT e a Plataforma Interativa do PG35.

No dia 18/11/2021 às 18h foi realizado o 3º Webinário Conhecimento em Pauta com o Tema Referências culturais impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão com a consultora convidada Caroline Cesari da empresa Stilo Nacional.

No dia 25/11/2021 às 17h foi realizado o 4º Webinário Conhecimento em Pauta com o Tema Pesquisa e transferência de tecnologias de restauração florestal das áreas atingidas por rejeito na região de Mariana/MG com o professor convidado Sebastião Venâncio Martins da UFV.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa encontram-se em revisão junto à CT-PDCS, após realização de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas e equipe do programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC;
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso;
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	530	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

dezembro de 2021	●	Execução do Processo de Manutenção do sítio eletrônico
dezembro de 2021	●	Atualização no site da Fundação Renova das entregas e fatos relevantes do mês, dos programas de reparação e compensação, de acordo com o reportado no relatório mensal do CIF.
dezembro de 2021	●	Atualização e manutenção do conteúdo do site
dezembro de 2021	●	Atualização dos relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	outubro de 2021	novembro de 2021	ACUMULADO 2021	ACUMULADO (2016 - 2021)
Acesso ao Site (mês)	283.047	289.084	3.240.531	6.837.557
Documentos no site (mês)	9	15	82	448
Notícias Publicadas (mês)	11	11	138	878
Vídeos (mês)	10	12	116	562

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

INDICADOR	outubro de 2021	novembro de 2021
I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	187.889	203.108
I02 – Visualizações de páginas de serviço	50.764	80.656
I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	45.570	35.649
I05 – Alcance Orgânico Facebook	103.628	22.186
I06 – Visualizações no Youtube	12.087	10.059
I03 – Tempo de resposta	18,15 Horas	22,45 Horas

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

O objetivo central do Programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Cláusula	177	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Reprogramado
Deliberação	313	2	Concluído Internamente

Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente
Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2021

janeiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Nov/20
janeiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Dez/20), em atendimento à deliberação CIF 378.
janeiro de 2021		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Jan/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
fevereiro de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Dez/20
março de 2021		Protocolo do relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem de Colóides do período seco
março de 2021		Protocolo do Relatório Mensal de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jan/21
março de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Fev/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Encerramento Expedição Rio Doce
abril de 2021		Protocolo do Relatório mensal do plano período chuvoso (Mar/21), em atendimento à deliberação CIF 378.
abril de 2021		Protocolo da análise laboratorial da amostragem de Colóides do período chuvoso
maio de 2021		Plano de ações do período chuvoso 2020/2021 finalizado
junho de 2021		Protocolo do Relatório Quadrimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Out/20 a Jan/21
setembro de 2021		Protocolo do Relatório Bimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Fev/21 a Mar/21
outubro de 2021		Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Abr/21 a Jun/21

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Entregas do ano de 2021

- outubro de 2021 Protocolo do relatório de QAQC da primeira e segunda Campanha de coleta
- dezembro de 2021 Protocolo do Relatório Trimestral de garantia e controle de qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS - Jul/21 a Set/21

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2021 está aprovado um orçamento de **R\$ 47.533.003** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriadoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são 56 pontos de monitoramento, sendo 36 com tratamento e 20 sem tratamento, distribuídos em 30 municípios.
- São monitorados mensalmente 78 **parâmetros** em pontos com e sem tratamento, sendo que nos pontos cuja captação é superficial são analisados 82 **parâmetros**. Além disso, nos pontos com tratamento, semanalmente são monitorados 22 **parâmetros**.

Fatos relevantes do mês

Realocação da estação automática do PMQQS - RDO 02

Indicadores

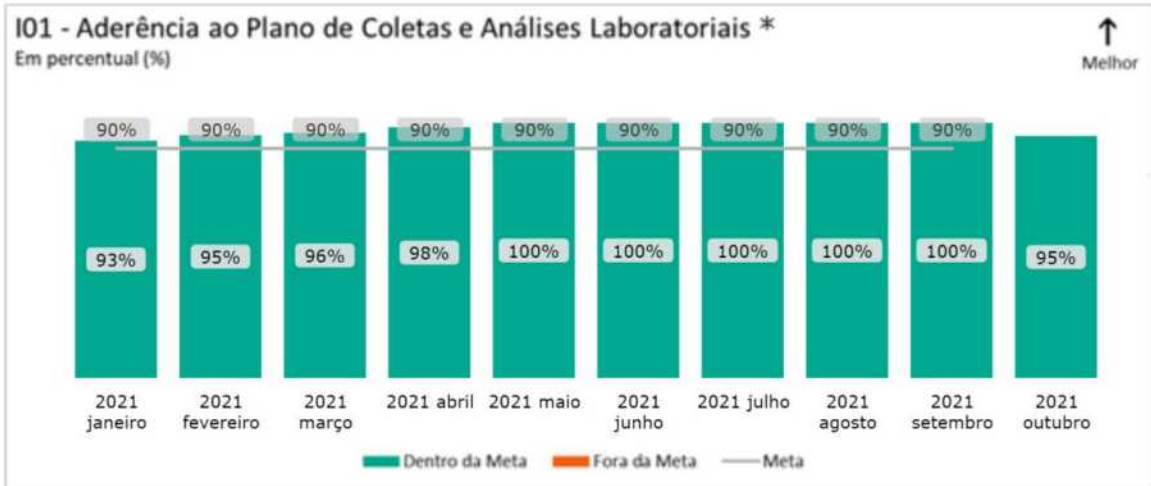


Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

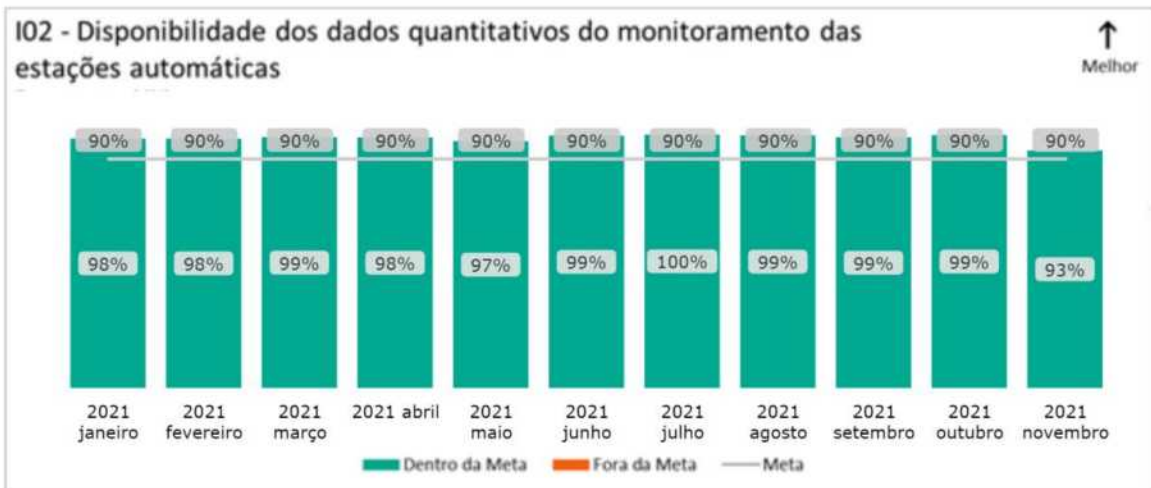


Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

Indicadores



Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

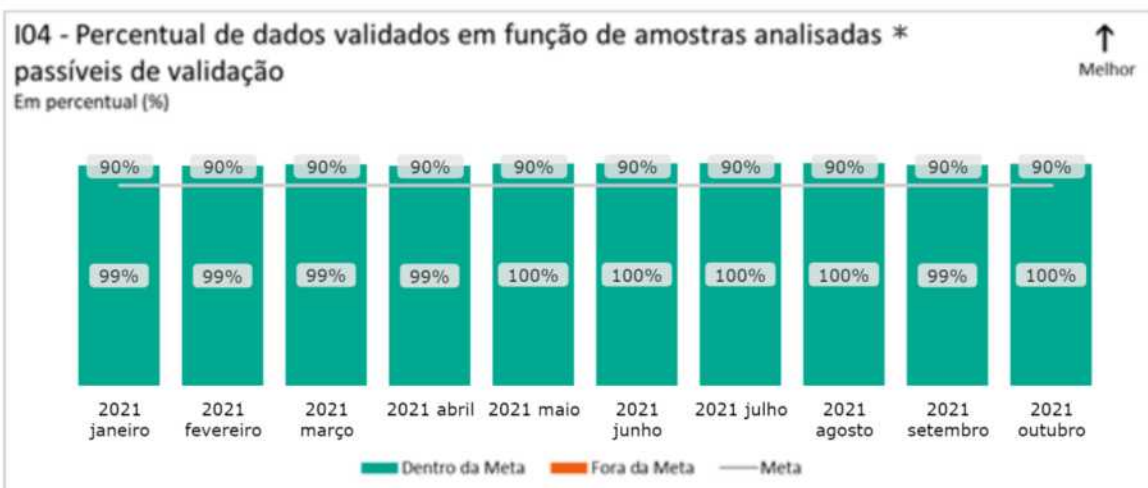


Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Reprogramado
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Em Andamento
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	6	Planejado

Entregas do ano de 2021

- abril de 2021 ● Contratação para Caracterização da Vegetação e Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
- abril de 2021 ● Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano I - Consolidação PERD
- setembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA PERD
- novembro de 2021 ● Realização da Reunião Devolutiva AIA PERD
- dezembro de 2021 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 05/11/2021, foi realizada a Reunião Devolutiva de Avaliação de Impactos Ambientais do PERD

Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA


Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- dezembro de 2021  Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto em Minas Gerais
- dezembro de 2021  Assinatura do acordo de cooperação técnica com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) para apoio ao fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA)
- dezembro de 2021  Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

274 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 27 (9,9%) imóveis declinaram e 239 (87,2%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 195 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

- Material de divulgação do PRA - Cartilha do PRA pronta para distribuição.

Indicadores

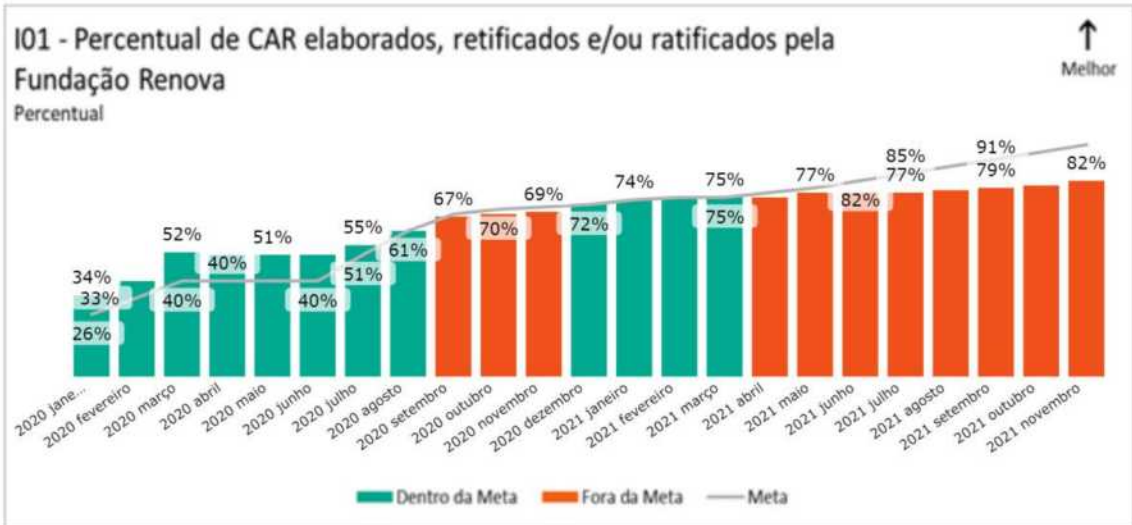


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de *Compliance* da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Cláusula	141	caput	Reprogramado
Cláusula	142	caput	Judicializado
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	5	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente

Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- setembro de 2021 ● Realização do ressarcimento a prefeitura de Colatina e Mariana
- outubro de 2021 ● Entrega de bens para Ministério da Integração (compra e entrega de coletes para a defesa civil) atingindo aproximadamente 100% do valor a ser ressarcido.

O marco de entrega de bens para Ministério da Integração foi concluída com a entrega de 6 971 unidades de coletes para a Defesa Civil do Brasil e atendendo à solicitação do órgão o saldo remanescente foi ressarcido via GRU

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 54,0** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 30,2** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

Fatos relevantes do mês

Foi protocolado na CT-EI, a conclusão da cláusula 141, que se refere aos ressarcimentos aos 19 órgãos compromitentes elencados no TTAC, em 09 de Novembro de 2021.

Indicadores

% de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 141)
Percentual (%)

↑
Melhor

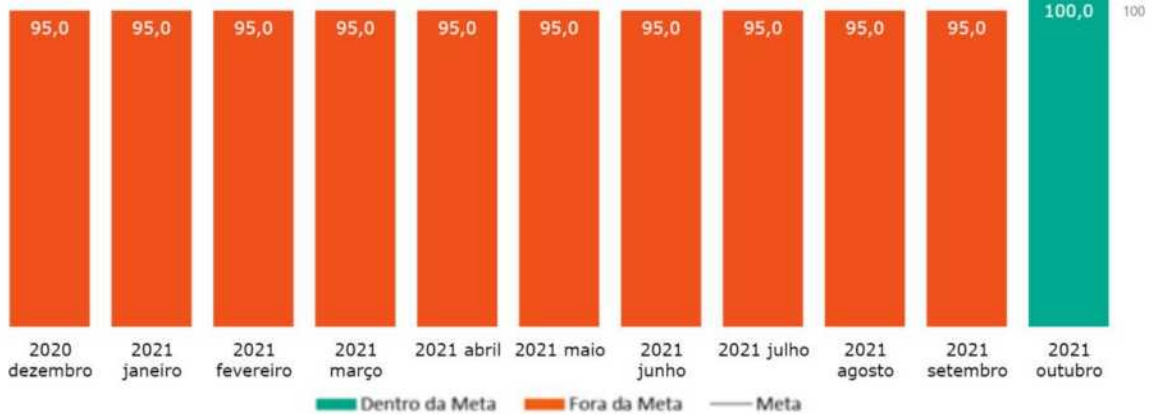


Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

% de ressarcimento às Prefeituras
Percentual (%)

↑
Melhor




Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.

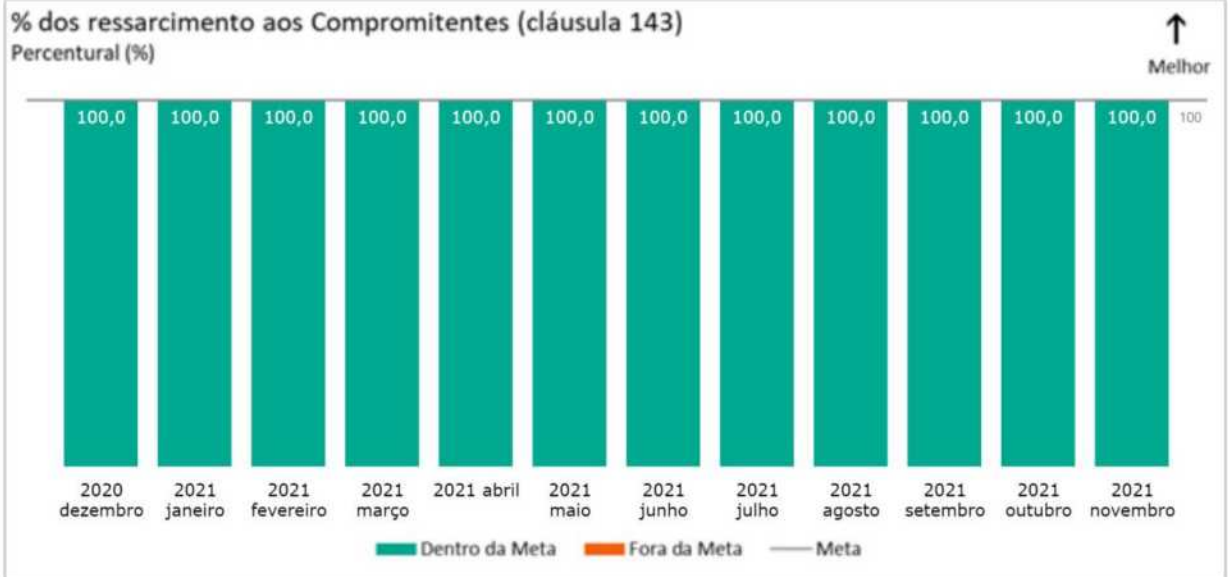


Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

* 100% se refere às solicitações feitas e já auditadas até novembro de 2021

Glossário

- I IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas e respectivas comunidades que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a perda de cônjuge companheiro familiares até o segundo grau por óbito ou por desaparecimento;
 - b perda por óbito ou por desaparecimento de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f perda de fontes de renda de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g prejuízos comprovados às atividades produtivas locais com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros incluindo as terras de domínio público e uso coletivo afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i danos à saúde física ou mental; e

j destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas estuarinas tradicionais e povos indígenas

II **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas presentes ou futuras que não se enquadrem nos incisos anteriores que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas diretas ou indiretas presentes ou futuras do rompimento da barragem de Fundão que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS

III **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte Carmo e Doce considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes bem como as regiões estuarinas costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão

IV **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo a saber: Mariana Barra Longa Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Sem-Peixe Rio Casca São Pedro dos Ferros São Domingos do Prata São José do Goiabal Raul Soares Dionísio Córrego Novo Pingo d'Água Marliéria Bom Jesus do Galho Timóteo Caratinga Ipatinga Santana do Paraíso Ipaba Belo Oriente Bugre Iapu Naque Periquito Sobrália Fernandes Tourinho Alpercata Governador Valadares Tumiritinga Galileia Conselheiro Pena Resplendor Itueta Aimorés Baixo Guandu Colatina Marilândia e Linhares

V **ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas costeira e marinha impactadas

VI **MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Mariana Barra Longa Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Rio Casca Sem-Peixe São Pedro dos Ferros São Domingos do Prata São José do Goiabal Raul Soares Dionísio Córrego Novo Pingo-D'Água Marliéria Bom Jesus do Galho Timóteo Caratinga Ipatinga Santana do Paraíso Ipaba Belo Oriente Bugre Iapu Naque Periquito Sobrália Fernandes Tourinho Alpercata Governador Valadares Tumiritinga Galiléia Conselheiro Pena Resplendor Itueta e Aimorés

VII **MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA:** Baixo Guandu Colatina Barra do Riacho em Aracruz Marilândia e Linhares além das áreas estuarinas costeira e marinha impactadas

VIII **PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado necessárias à reparação mitigação compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO nos termos do TTAC

IX **PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS:** conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO nos termos do TTAC

X **PROGRAMAS:** são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto

XI **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO nos termos do TTAC para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

XII **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO nos termos do TTAC para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

XIII **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto

XIV **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que em razão de suas atribuições institucionais tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA

XV **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG)

XVI **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG)

XVII **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão

XVIII PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas cuja reparação não seja possível ou viável nos termos dos PROGRAMAS

XIX FUNDAÇÃO: fundação de direito privado sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

XX EXPERT: pessoa física ou jurídica ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão avaliação elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS total ou parcialmente

XXI SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015



XXII PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas

XXIII Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a Concluída internamente o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b Em andamento itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c Encerrado item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d Judicializado não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item que passa a ser acompanhado através das decisões na 12ª Vara;
- e Pendente a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova mas de outros fatores externos;
- f Planejada itens que estão no prazo porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g Reprogramado item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

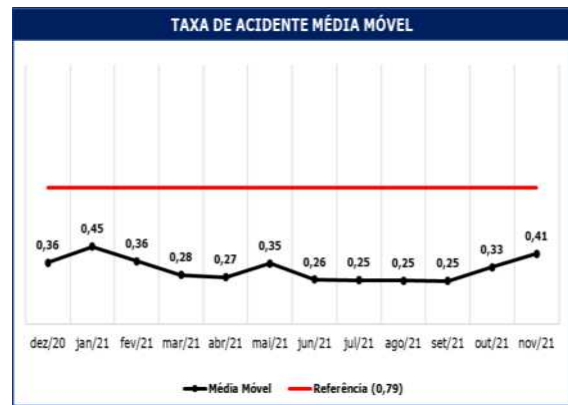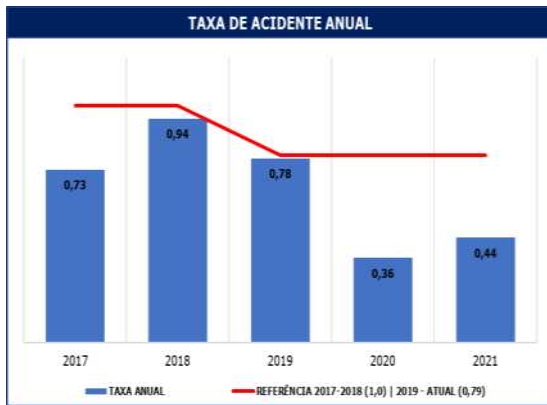

(Número de acidentes registrados x 1 000 000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado					
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	15,2	5,7	-	9,4	-62%	13,3	5,7	-	7,6	-57%
PG15	INOVAÇÃO	5,0	0,8	-	4,2	-84%	4,5	0,8	-	3,7	-82%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	14,5	2,9	-	11,6	-80%	13,2	2,9	-	10,3	-78%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,8	1,5	-	5,3	-78%	6,1	1,5	-	4,6	-75%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	51,6	21,1	-	30,5	-59%	47,1	21,1	-	26,0	-55%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	20,6	11,1	-	9,5	-46%	18,5	11,1	-	7,4	-40%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	13,1	2,1	-	10,9	-84%	11,8	2,1	-	9,7	-82%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,5	19,6	-	37,0	-65%	50,6	19,6	-	31,1	-61%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	63,0	29,2	-	33,8	-54%	59,8	29,2	-	30,6	-51%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18,2	4,3	-	13,9	-77%	17,5	4,3	-	13,2	-76%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	15,9	7,5	-	8,4	-53%	14,8	7,5	-	7,3	-49%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	7,0	0,3	-	6,7	-95%	6,5	0,3	-	6,2	-95%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,2	1,0	-	1,2	-55%	2,1	1,0	-	1,1	-53%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	19,4	18,2	-	1,2	-6%	19,0	18,2	-	0,8	-4%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	2,6	0,6	-	2,0	-78%	2,2	0,6	-	1,6	-74%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	449,9	545,5		95,5	21%	444,6	545,5		100,9	23%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
Total Compensatórios		761,6	671,4	-	90,2	-12%	731,8	671,4	-	60,3	-8%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	25,3	17,5	-	7,7	-31%	24,9	17,5	-	7,3	-30%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	1.425,7	4.474,2		3.048,5	214%	1.350,7	4.474,2		3.123,5	231%
PG03	POVOS INDÍGENAS	127,7	86,6	-	41,1	-32%	116,8	86,6	-	30,2	-26%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	46,0	6,7	-	39,4	-85%	44,8	6,7	-	38,1	-85%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	16,6	4,3	-	12,3	-74%	15,8	4,3	-	11,5	-73%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	126,1	58,9	-	67,2	-53%	119,4	58,9	-	60,4	-51%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	6,9	6,9	-	0,0	0%	6,3	6,9	-	0,6	9%
PG08	REASSENTAMENTO	1.012,6	617,7	-	394,9	-39%	893,9	617,7	-	276,1	-31%
PG09	UHE CANDONGA	202,4	165,6	-	36,8	-18%	181,3	165,6	-	15,7	-9%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	139,2	61,7	-	77,5	-56%	132,6	61,7	-	70,9	-53%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	8,5	2,1	-	6,3	-75%	7,6	2,1	-	5,5	-72%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	28,8	3,9	-	24,9	-86%	26,2	3,9	-	22,3	-85%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	18,3	1,5	-	16,8	-92%	16,6	1,5	-	15,0	-91%
PG14	SAÚDE	19,7	4,3	-	15,4	-78%	18,6	4,3	-	14,3	-77%
PG16	PESCA	53,4	6,8	-	46,5	-87%	49,5	6,8	-	42,6	-86%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	125,6	72,4	-	53,2	-42%	117,9	72,4	-	45,6	-39%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	5,5	2,8	-	2,7	-50%	5,0	2,8	-	2,3	-45%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	216,7	171,2	-	45,5	-21%	215,8	171,2	-	44,6	-21%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	152,1	106,5	-	45,6	-30%	140,9	106,5	-	34,4	-24%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,8	1,3		0,5	68%	0,7	1,3		0,6	83%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	34,4	22,3	-	12,1	-35%	32,5	22,3	-	10,2	-31%
PG28	BIODIVERSIDADE	68,4	103,0		34,6	51%	65,5	103,0		37,5	57%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	11,6	1,7	-	10,0	-86%	10,5	1,7	-	8,9	-84%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	177,3	86,6	-	90,7	-51%	166,5	86,6	-	79,9	-48%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	47,5	27,1	-	20,4	-43%	44,7	27,1	-	17,6	-39%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	3,8	1,8	-	2,0	-53%	3,5	1,8	-	1,7	-49%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	299,3	215,3	-	84,0	-28%	276,6	215,3	-	61,3	-22%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	3,9	1,4	-	2,5	-63%	3,9	1,4	-	2,5	-63%
PG99	CONTINGÊNCIA	492,1	-	-	492,1	-100%	451,1	-	-	451,1	-100%
Total Reparatórios		4.896,3	6.332,1	1.435,9	29%	4.540,1	6.332,1	1.792,0	39%		
Total Programas		5.657,8	7.003,6	1.345,7	24%	5.271,9	7.003,6	1.731,7	33%		
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	174,5	117,5	-	57,0	-33%	159,9770	117,544	-	42,4332	-27%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	28,4	3,8	-	24,6	-86%	26,5	3,8	-	22,6	-85%
Total Despesas Administrativas		202,9	121,4	-	81,5	-40%	186,4	121,4	-	65,0	-35%
Total Geral		5.860,7	7.124,9	1.264,2	22%	5.458,3	7.124,9	1.666,6	31%		

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,7	1,2	0,5	-29%	Edital Doce: O projeto ficou paralisado em função da pandemia, no entanto, desde 12/2020 tem acontecido a formalização gradual para início dos projetos selecionados. A previsão feita no orçamento está baseada no repasse do recurso ao proponente, no entanto, a baixa contábil é feita após a prestação de contas dos projetos apoiados, o que gera o desvio. Valorização das Referências Socioculturais: Projeto em execução, mas estava sendo medido em DR diferente, reclassificação realizada. Praça Gomes Freire: Ocorreram medições em 2021 originalmente planejadas para 2020, devido a alteração do cronograma da obra Carta Mariana: Recursos projetados inicialmente para o PG13, mas que foram repassados para a agenda integrada.
PG15	INOVAÇÃO	0,4	0,1	0,4	-85%	- Projeto Pesquisa e Desenvolvimento do Herbicida Orgânico não foi aprovado e está cancelado. - Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG). - Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, por conta da Covid-19. - Empreende Rio Doce não iniciado (em processo de contratação) e ainda não aprovado pela CTEI. - Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17 gerou postergação de custos para 2022. O orçamento projetado para 2021 é de R\$ 3,5 milhões (redução de 30%).
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	1,3	0,1	1,2	-94%	- O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R\$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O projeto foi aprovado pelo CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21) e seguirá para aprovação interna, após a correção de valor pela Prefeitura de Mariana. - O projeto Fortalecimento do Laticínios Mariana foi cancelado e está sendo reformulado pela equipe técnica. - Paralisação da obra Casa do Empreendedor por decisão judicial.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,7	0,2	0,5	-77%	- Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19. - Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 e impede a maior parte das atividades presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17 é de R\$ 3,3 milhões (redução de 51%).
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	4,6	4,1	0,5	-11%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda não foi possível recuperar os atrasos gerados no passado.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,0	2,4	0,4	21%	- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.); - Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de insumos de cercamento), mas ainda não foi possível recuperar os atrasos gerados no passado.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,3	0,5	0,8	-60%	- Despesas Diversas - Rateio contrato administrativo. - Engenharia, Construção e Gerenciamento - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,3	1,2	4,2	-78%	- Consultoria Cosntrução CETRAS - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma. - Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não apresentaram medições de serviços previstos no orçamento. - Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	4,2	1,3	2,8	-68%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. "- Projeto Formação de Educadores (UFMG/UFOP). Em razão de procedimentos burocráticos das instituições envolvidas, houve atraso na formalização. Após assinatura do Termo de Parceria, foi necessário ajustar as planilhas orçamentárias para o início das atividades (remanejamento simples + take off).
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,7	0,5	0,2	-26%	- Projeto Lideranças Jovens. Em razão da pandemia e devido à impossibilidade de realizar atividades em campo (presenciais), as parcerias executaram com atraso custos previstos (necessidade de ajustes para o formato remoto) impactando a liberação de aportes, conforme cronograma de desembolso no contrato. Postergação:
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	1,5	4,6	3,1	212%	- Construção das sedes das Defesas Cíveis e equipamentos: Após a elaboração do orçamento houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela FR. Será realizado repasse para Defesa Civil que será responsável pela execução do escopo, conforme APRO 215/2020 já aprovada. Em novembro foi realizado o repasse para a Defesa Civil de Mariana no valor de \$ 4,5MM. Os demais municípios aguardam a homologação para realizar o repasse. - Projetos APOIO A DEFESA CIVIL, ESCOLA SEGURA, NUPDEC (Contrato H3M): Postergação e suspensão de atividades presenciais durante o período de Pandemia.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,5	0,0	0,5	-95%	- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço para implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. Solicitado em julho/21 ajustes nos projetos para validação do Iphan. Realizada reunião com a Prefeitura Municipal em agosto/21, que posteriormente solicitou que o CIT fosse instalado em outro imóvel. Aguardando devolutiva do RI sobre últimas agendas com a Prefeitura de Mariana - CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela prefeitura. Análise topográfica do terreno indicado pela prefeitura municipal de GV, denominado Pça. Getúlio Vargas, concluída. Terreno aprovado, revisão do Projeto Conceitual e minuta do termo de parceria em processo de validação com ente público. - CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/conceitual/executivo, considerando a inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do termo de cooperação técnica entre FR e ICMbio. Aguardando finalização dos projetos para solicitação de orçamentação. Aguardando avaliação da minuta do termo de parceria pelo ente público.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,1	-	0,1	-100%	- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	14,0	-	14,0	-100%	Mudança de estratégia - Pagamento da 1ª parcela do Acordo de Cooperação PERD - (APRO 223/2020) - Refugio de Vidas Silvestres (RVS) - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,3	0,1	0,3	-76%	Atraso no cronograma em função da postergação do início das atividades de ATER (executores do CAR no território 2) devido pandemia. Os Diagramas referentes a medição do CAR estão sendo inseridos por remanejamento nos contratos de ATER, para correta apropriação contábil. Atividades referente ao PRA reprogramadas em função da disponibilidade do órgão ambiental, publicação de decreto, e assinatura de Termo de Cooperação Técnica. As curvas orçamentárias foram revistas conforme repanejamento das atividades nos Drafts 17 e 18.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	5,4	0,2	5,2	-96%	(-R\$26,4MM) Acordos ainda não firmados/homologados novas áreas e não realizado residência em gestão pública MG ES (+R\$11,8MM) Realizado pagamento retroativo a ago/20 da pericia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021. Perícia está suspensa. (-R\$34MM) Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo compensatório" e novas ações (Apoio SUS), manutenção vias públicas Mariana. (+R\$150MM) Realizado repasse R\$ 150 MM Apoio Saúde para os estados de MG, ES e Municípios MG. Valor estava previsto em 2020 e somente realizado neste mês set-21. (-R\$0,6MM) Ações socioeconomia Covid-19: ações suspensas; em reavaliação de estratégia
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-
Total Compensatórios		44,1	16,4	27,7	-63%	

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-
PG01	CADASTRO	0,4	2,4	2,0	489%	- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vitoria Mariana, que foram renegociadas para trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, tais como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2, atraso e redução do volume de laudos previstos na metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel. O orçamento atual é baseado no DRAFT 16 e considerava o cenário previsto no primeiro semestre de 2020.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	75,1	737,5	662,4	882%	- A retomada do ritmo das homologações do Novel refletiu diretamente no valor realizado de indenizações em novembro. - O desvio das frentes de indenizações fora Novel continua negativo, pela realiação a menor em relação ao previsto, com destaque para Pescadores Jupanã e Danos de agropecuária.
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,9	9,1	1,8	-17%	- As ações de revisão do programa, atividades do SAA (Tupiniquim-Guarani e Comboios) em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impactos de cronograma em função da pandemia de COVID-19; - Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes internos de procedimentos para execução. Cronograma ajustado em andamento; - Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim-Guarani) encerrado em julho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021. Em novembro ocorreu antecipação do valor referente aos pagamentos de dezembro para ASE para TI Comboios conforme previsto em acordo de indenização
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,2	0,4	0,8	-70%	- As ações de monitoramento social remanejadas para execução do PBAI - A execução do PBAI Tupiniquim-Guarani e Comboios está em atraso devido a realização de etapas predecessores ainda em andamento. - As inclusões previstas para o AFE não foram concretizadas. A FR está em nova fase de gestão para o AFE e modalidade de pagamento; - As atividades de apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, ações de monitoramento social e planejamento integradores não foram iniciadas devido a mudança de escopo de execução e aceleração do programa; - A consultoria revisão do programa e consultoria para indenização tiveram as metodologias adaptadas, - Os pagamentos da Indenização que estavam inicialmente previstos para serem pagos pelo PG04 estão em execução pelo PG02.Z7
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	0,8	0,3	0,5	-64%	- Plano de Mariana: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); prestação de contas não realizada pelo município. - Plano de Barra Longa: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); desembolsos previstos no Draft 16 não realizados e já reprogramados no Draft 17. - Plano dos Demais Municípios: atraso na assinatura de acordos com alguns municípios; atualização do cronograma físico e do desembolso financeiro (Draft 17); em decorrência da Covid-19, a capacitação foi realizada com metodologia online; não realização da capacitação para os municípios de MG (em processo de repactuação com MG); ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); prestação de contas de alguns planos municipais com valor menor do que o informado inicialmente pelos municípios - Planos Estaduais: SEDESE declinou da negociação do plano de proteção social com a Fundação Renova, portanto o mesmo não foi homologado/repassado recurso. - Revisão contratual das equipes de território em decorrência da Covid-19 (exclusão de veículos e escritórios). - Redução das ações socioassistenciais devido ao avanço nos atendimentos da Renova via Novel. - Demandas judiciais não iniciadas.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	7,1	5,4	1,8	-25%	- Diálogos – Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$ 7,5MM): Atividades com as comunidades sendo realizadas em modalidade híbrida o que acarreta uma economia no processo. Redução da equipe de profissionais dos contratos de Diálogo Social em decorrência das atividades remotas. - Canais de Relacionamento - Economia Anual /Postergação Plurianual (R\$ 7,1MM): Readequação das estruturas físicas para abertura gradativa dos escritórios CIAS. Reativação de serviços suspensos para os CIAS. Redução da equipe de profissionais dos contratos dos CIAS. Aumento da capacidade de atuação da central 0800 - Comunicação - Economia (R\$ 5,6MM): em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão sendo realizados. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. Verba de consultoria postegada para 2022 draft 17. - Ouvidoria - Economia (R\$ 0,4 MM): Desvio devido ao atraso na formalização do aditivo para o contrato da ICTS ao qual interferiu no registro de algumas medição durante o exercício de 2021 - Assessorias Técnicas - Postergação (R\$ 39,4MM): pagamentos judicializados, aguardando decisão judicial, além de atrasos no envio de documentos por comissões locais e morosidade na inclusão de documentos no SAP. - Vivência de territórios - Postergação (R\$ 0,4 MM) : Houve uma redução das visitas presenciais ao projeto Vm ver em função da pandemia.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,6	0,5	0,1	-18%	- Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadoras (EBJ Assessoria - Contrato 4800003657; e PROGEN - Contrato 4800033410) - Execução acima do previsto no arrendamento de propriedade rural para abrigo temporário de animais (Contrato 4800030166) - Execução de demandas de manutenção de acessos e curvas de nível em propriedade rural voltadas à conservação de pastagens (Contrato 4800030166)

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição		
PG08	REASSENTAMENTO	118,9	75,0	43,9	-37%	<ul style="list-style-type: none"> - Novas Moradias Bento (+44,2): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para maior entrega de casas em 2021); - Adutora ETE/ETA Paracatu (-75,9): Revisão do cronograma conforme LB previsão início atividades - ago/21. Pedido em aprovação - previsão de início de mobilização a partir de 15/12/2021. - Equipamentos Públicos Paracatu (-46,9): Equipamentos públicos, conforme Cronograma LB maio/21_atual ago/21 - previsão mar e abr/2022. - Engenharia (-38,9): A paralisação no desenvolvimento de projetos, ocorrida no primeiro semestre 2021, somada ao atraso na liberação dos ID's interrompidos, ocasionou uma lacuna em toda a programação de atividades de Engenharia, gerando a postergação das atividades subsequentes, como bens coletivos, crosschecks, etc, ocasionando a diferença verificada na programação financeira. - Instalações provisórias Bento (-36,3): Revisão da curva de desembolso no ano; - Iluminação pública, Infraestrutura Sítiantes, Benfeitorias, Cemitério, Equip. Públicos Bento e Construção do Trevo MG-129 (-33,6): Escopo com execução reprogramada para 2022. - Aquisição de Terras, Benfeitorias, Contêndores, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sítiantes Paracatu (-32,2): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021); - Contêndores Bento (-28,7): Atraso no processo e na formalização do aditivo da Proge, o que está impedindo medições por parte do fornecedor. Demora na entrega da medição por parte da Tecnosonda. - Custos Covid (-26,0): Variação a menor em função da revisão da curva de desembolso no ano. Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19 para 2022; - Novas Moradias Paracatu (-20,2): 03 Pacotes de Novas Moradias Contratados - novos pacotes em contratação. - Gesteira (-20,2): O valor previsto não ocorreu, em função de eventos e definições judiciais que paralisaram as Compras, Contratações, Obras e Serviços. - Novas Moradias Familiar (+15,6): Houve aquisições de Imóveis além do previsto para o período, uma vez que a premissa para as Compras Assistidas estavam programadas para iniciar a partir de Outubro/21, fato este que iniciou em Março/21. - Instalações provisórias Paracatu (-16,2): Variação a menor em função da curva de desembolso no ano. - Infraestrutura Bento (+16,8): Serviços e obras de infraestrutura executados em 2021, o que estava previsto para término em 2020. - Gerenciamento (+12,6): Parte do período de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021 - Adutora ETE/ETA Bento (+4,7): Redução no realizado em relação ao previsto, devido ao faturamento direto de vários serviços/materiais para a Fundação Renova; - Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para início em fevereiro/21, não iniciada em função dos desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPR1, porém o documento ainda se encontra sem efeito
PG09	UHE CANDONGA	20,0	25,8	5,7	29%	<ul style="list-style-type: none"> - Grande impacto da pandemia nas atividades do programa (paralisações municipais e protocolos rígidos). - Escopo de Reconstrução das casas e Manutenção de edificações paralisado devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados da perícia. - Recuperação de estradas e manutenção de vias é executado sob demanda, conforme solicitações do poder público e necessidades identificadas pela FR. - O desvio no Draft 16 é 72%, já no Draft 17 é 43%. Dessa forma, 71% do desvio do Draft 16, já foi corrigido no Draft 17. O restante do desvio (29%) é devido: - Escolas Impactadas de Mariana e Barra Longa (9%): Compra de equipamento sob demanda das escolas (ECONOMIA REAL), alteração na forma de desembolso para pagamento da plataforma da escola de Paracatu e falta de definição de escopo nas escolas de Barra Longa. - Custo Covid (11%): Contratos aditados para modelo remoto. Não será necessário a utilização desse recurso; - Projeto Pedagógico Mariana e Barra Longa (8%): Condensação das etapas para finalização dos PPPs em dezembro de 21 (redução das reuniões planejadas gera desvio financeiro). Postergação do início do apoio pedagógico estadual Mariana e de Barra Longa (estadual+municipal) para 2023, após atualização do plano de trabalho. -Projeto Sociabilidade (1%): Atividades previstas para out21 não realizadas devido avaliação das diretoras de possível não dedicação dos alunos nas atividades remotas. Ação prevista para novembro foi realizada sem custo (Vimver)- ECONOMIA REAL
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	8,7	2,0	6,7	-77%	<ul style="list-style-type: none"> - Engenharia de Restauero de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Restauero de Igrejas: parceria para restauero das capelas com APRO ainda sem aprovação. - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido ao processo de judicialização. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: Retomada parcial das atividades em função da pandemia; - Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação dos órgãos competentes, impedindo o início das atividades. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a mudança de estratégia de contratação. Atividades reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Casa dos Saberes e Horta Comunitária - Contrato com início atrasado e mobiliação parcial devido a pandemia. Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 e 18 - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Parque Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. - Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais. - Não aditamento do edital FAPES/FAPEMIG. Termo de convênio finalizado por decurso de prazo. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487. Análise da Deliberação 487 para construção de cenários diversos de ação - Ações referentes a Caminhos da Retomada: revisão do orçamento (-R\$ 11,8 MM). - Eixo 1: restrição das atividades de campo devido à pandemia e atraso na medição devido à falta de documentação por parte do parceiro (-R\$ 8,8 MM). - Eixo 2: ATER MG e ES: negociação quanto a execução de capacitação de atingidos junto ao SENAR e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na execução das atividades em campo, devido à pandemia. Aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais (-R\$ 18,4 MM). - Ações Gerais: Oficinas Participativas: Escopo absorvido no Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura (-R\$ 3,7 MM).
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	1,0	0,4	0,6	-56%	<ul style="list-style-type: none"> - Custo Covid (11%): Contratos aditados para modelo remoto. Não será necessário a utilização desse recurso; - Projeto Pedagógico Mariana e Barra Longa (8%): Condensação das etapas para finalização dos PPPs em dezembro de 21 (redução das reuniões planejadas gera desvio financeiro). Postergação do início do apoio pedagógico estadual Mariana e de Barra Longa (estadual+municipal) para 2023, após atualização do plano de trabalho. -Projeto Sociabilidade (1%): Atividades previstas para out21 não realizadas devido avaliação das diretoras de possível não dedicação dos alunos nas atividades remotas. Ação prevista para novembro foi realizada sem custo (Vimver)- ECONOMIA REAL
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,7	0,4	2,2	-84%	<ul style="list-style-type: none"> - Engenharia de Restauero de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de revisão de alguns projetos. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Restauero de Igrejas: parceria para restauero das capelas com APRO ainda sem aprovação. - Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido ao processo de judicialização. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Reserva Técnica - Conservação e Restauração: Retomada parcial das atividades em função da pandemia; - Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação dos órgãos competentes, impedindo o início das atividades. Atividade reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a mudança de estratégia de contratação. Atividades reprogramada para 2022 no draft 17 e no draft 18 - Casa dos Saberes e Horta Comunitária - Contrato com início atrasado e mobiliação parcial devido a pandemia. Atividades reprogramadas para 2022 no draft 17 e 18 - Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a Renova siga com o projeto PURD (Parque Urbano do Rio Doce). - Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da melhor estratégia de execução. - Subsídio de Rota: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. - Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais. - Não aditamento do edital FAPES/FAPEMIG. Termo de convênio finalizado por decurso de prazo. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487. Análise da Deliberação 487 para construção de cenários diversos de ação - Ações referentes a Caminhos da Retomada: revisão do orçamento (-R\$ 11,8 MM). - Eixo 1: restrição das atividades de campo devido à pandemia e atraso na medição devido à falta de documentação por parte do parceiro (-R\$ 8,8 MM). - Eixo 2: ATER MG e ES: negociação quanto a execução de capacitação de atingidos junto ao SENAR e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na execução das atividades em campo, devido à pandemia. Aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais (-R\$ 18,4 MM). - Ações Gerais: Oficinas Participativas: Escopo absorvido no Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura (-R\$ 3,7 MM).
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,8	0,0	1,8	-101%	<ul style="list-style-type: none"> - Subsídio de Rota: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. - Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais. - Não aditamento do edital FAPES/FAPEMIG. Termo de convênio finalizado por decurso de prazo. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487. Análise da Deliberação 487 para construção de cenários diversos de ação - Ações referentes a Caminhos da Retomada: revisão do orçamento (-R\$ 11,8 MM). - Eixo 1: restrição das atividades de campo devido à pandemia e atraso na medição devido à falta de documentação por parte do parceiro (-R\$ 8,8 MM). - Eixo 2: ATER MG e ES: negociação quanto a execução de capacitação de atingidos junto ao SENAR e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na execução das atividades em campo, devido à pandemia. Aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais (-R\$ 18,4 MM). - Ações Gerais: Oficinas Participativas: Escopo absorvido no Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura (-R\$ 3,7 MM).
PG14	SAÚDE	1,2	0,2	1,0	-86%	<ul style="list-style-type: none"> - Subsídio de Rota: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. - Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais. - Não aditamento do edital FAPES/FAPEMIG. Termo de convênio finalizado por decurso de prazo. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487. Análise da Deliberação 487 para construção de cenários diversos de ação - Ações referentes a Caminhos da Retomada: revisão do orçamento (-R\$ 11,8 MM). - Eixo 1: restrição das atividades de campo devido à pandemia e atraso na medição devido à falta de documentação por parte do parceiro (-R\$ 8,8 MM). - Eixo 2: ATER MG e ES: negociação quanto a execução de capacitação de atingidos junto ao SENAR e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na execução das atividades em campo, devido à pandemia. Aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais (-R\$ 18,4 MM). - Ações Gerais: Oficinas Participativas: Escopo absorvido no Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura (-R\$ 3,7 MM).
PG16	PESCA	4,0	1,8	2,2	-55%	<ul style="list-style-type: none"> - Subsídio de Rota: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET. - Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboração e execução alterados. Sua realização está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais. - Não aditamento do edital FAPES/FAPEMIG. Termo de convênio finalizado por decurso de prazo. - Apoio ao Plano de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem de medicamentos nos termos previstos na ACP. Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em decorrência da pandemia de Covid 19. - Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP firmado com o município, valor reclassificado no DRAFT 17. - Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : Ações de mitigação para possíveis impactos nos municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico. - Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487. Análise da Deliberação 487 para construção de cenários diversos de ação - Ações referentes a Caminhos da Retomada: revisão do orçamento (-R\$ 11,8 MM). - Eixo 1: restrição das atividades de campo devido à pandemia e atraso na medição devido à falta de documentação por parte do parceiro (-R\$ 8,8 MM). - Eixo 2: ATER MG e ES: negociação quanto a execução de capacitação de atingidos junto ao SENAR e elaboração de metodologia para contratação de empresas executoras; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na execução das atividades em campo, devido à pandemia. Aditivo para adequações no contrato devido os procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais (-R\$ 18,4 MM). - Ações Gerais: Oficinas Participativas: Escopo absorvido no Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura (-R\$ 3,7 MM).

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	8,6	6,4	2,2	-25%	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto no início/execução das atividades devido a pandemia covid-19 e outros decretos de paralisação; - Necessidade de adequações contratuais, aditivos, devido alteração de escopo, correção de variações de mercado e revisão de orçamento devido pandemia; - Atraso no início das atividades por dificuldades de gestão e mobilização pelo fornecedor; - Baixa performance de empresas contratadas na Infraestrutura; - Redução no fornecimento de silagem (território 1) devido plano de redução, alugueis de pastagens assumidos pelo PG08 e mudança de modalidade de fornecimento de silagem por feno, milho e fubá; - Continuidade do fornecimento de silagem (território 2) em função do atraso na conclusão do estudo; - Definição de escopo para contratação e Implantação de Unidades Demonstrativas e Articulação de ATER a jusante e atraso na contratação da WRI para montante; - Problema de logística devido extensão do território 2 nos serviços de ATER e público alvo aquém do esperado previsto nos editais.
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,5	0,3	0,2	-43%	<ul style="list-style-type: none"> - Segundo o Draft 16 implementado, o impacto é referente ao atraso nas contratações para os projetos do Caminhos da Retomada, devido a redefinição da estratégia das ações para marketing territorial, marketplace e também para a ação de rodada de negócios.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,9	8,5	7,6	853%	<ul style="list-style-type: none"> - Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novel Sistema, não previstos no orçamento.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	11,0	9,9	1,1	-10%	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicação dos Planos de Manejo de Rejeito: Houve atraso na mobilização da empresa Inovosa para início das atividades e consequente postergação de desembolsos previstos e baixa performance operacional desta empresa ao longo de 2021; Aguardando homologação do Projeto Executivo pelo juiz. Consequente atraso na contratação da empresa que irá prestar os serviços de recuperação das lagoas. Impacto no fluxo de desembolsos; Houve atraso na contratação da Obra do Talude do Nazareno e os desembolsos previstos foram postergados. Processo concorrencial finalizado. Obras previstas para próximo período seco; O projeto renaturalização sofreu atraso e impactos COVID. Algumas campanhas foram postergadas para 2022. No Draft16, o contrato da Rhama 4800012846 estava associado a este DR. Como agora este contrato pertence a outro DR (5400000987 0010), o valor medido não está sendo contabilizado nesse DR, ocasionando essa variação. - Gestão da Qualidade do Ar: O contrato da Ecosoft tem serviços de consultoria e análises que ocorrem sob demanda. Além de ter sua curva de desembolso com distribuição específica, o contrato da M Locação prevê a utilização de equipamentos sob demanda. Além disso, a execução desta atividade está sujeita a sazonalidade, em que devido às condições climáticas há impacto na utilização do serviço. - Gestão de Áreas Contaminadas: O planejamento das medições foi impactado pela judicialização do Eixo 02, ainda em discussão no âmbito do juízo, para replanejamento dos dispêndios. - Estudos Complementares: Projeto de parceria não iniciado. A UFMG declinou do projeto. Aguardando decisão do PG15 em assumir a contratação deste estudo com outra universidade; O modelo de curva do contrato da HidroBR não é linear, sendo específica porque se trata de um contrato sob demanda. A aderência em relação ao valor original de nov/21 do Draft16 foi de 18,52%. Entrega do relatório final das manchas de inundação 2D pós Candonga para o CIF e CT-rejeitos e entrega do relatório preliminar dos indicadores intracalha. - Custos Gerais: Pagamento de medições retroativas à AECOM devido à definições judiciais. Os dispêndios não estão acompanhando o planejado; Contratos matriciais sob demanda, os dispêndios não estão acompanhando o planejado; Gerenciamento matricial MCA previsto maior que o realizado, no Draft 17 os ajustes foram realizados; Atraso na celebração do aditivo da parceria do Convênio com a UFV Tecnossolos (Prof. Carlos Schaefer), Barramento Linhares (18,0) Postergação: redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor demanda do que planejado.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,1	0,2	0,2	271%	<ul style="list-style-type: none"> - Execução acima do previsto com a elaboração dos estudos de alternativa de descomissionamento em atendimento ao termo de referência enviado pela AECOM (avaliação da remoção parcial ou total do dique e recuperação da área alagada a montante). - Previsto contrato com Gessois que não ocorreu e orçamento será utilizado em outras demandas. - Previsto desembolso ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMB - serviço gestão qualidade do AR. - Cancelamento da contratação dos serviços de levantamento topográfico em virtude da pandemia e consequentemente aditamento do contrato atual
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,1	1,8	0,3	-13%	<ul style="list-style-type: none"> - Previsto de Medições referente ao serviços de restauro florestal - Contratada EGIS tinha previsão de desembolso até jul/22 mas foi finalizado em jul/21 / Contratado Consórcio ERG/STCP baixo desempenho e contrato estendido até mar/22; além disso a curva não condiz com a execução por conta do covid-19. Foram adequados os valores mensais na nova curva. - Previsto de curva de desembolso até nov/21 do Contrato Construtora Lages Gomes mas finalizou em abr/21 e também com baixa performance e sem consumir todo o saldo do contrato. - Antecipação das atividades de manutenção dos cercamentos, em decorrência das parcerias com os prórios produtores. - Revisão da curva de desembolso (MONITORAMENTO e PSA) em virtude da postergação da contratação devido a pandemia covid-19 e por alterações no cronograma deste monitoramento na definição de escopo dos programas.
PG28	BIODIVERSIDADE	2,9	1,5	1,4	-49%	<ul style="list-style-type: none"> - Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial e não prevista no Draft 16. - Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021, porém aprovado na APRO 232/2020. - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa. - Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre e Gerenciamento do PG30 - Paralisação das atividades em virtude da Pandemia.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,0	0,1	0,8	-85%	<ul style="list-style-type: none"> - Execução do plano de ação - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma físico. - Grupo Especialistas e Conscientização Socioambiental - Não execução de atividades sob demanda, devido a alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	12,2	5,5	6,7	-55%	- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de serviço da ferrovia Vale. - Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos. - Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito. - Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e ampliação da outorga de captação córrego Barroso). - Alteração do critério de medição para m³ transportado.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,6	2,6	0,0	0%	Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com mobilização pendente de medição. Contrato Spot (ALS) com demandas não realizadas durante o período de take-off/transição 48 para 49. Parceira UNESCO sofreu atraso pandemia e mudança de estratégia. Estudo coloides com relatório técnico postergado para 2022. Estudos/Serviços postergados pela pandemia, retornaram porém ainda com baixa execução (ERG, RHAMA). Parceria com FCD/UFMG/Libano cancelada pelo Professor. Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Contratos encerrados com saldo: ALS PMQQS, Ecology e Século XXI. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão orçamentária do Draft17 e Draft18.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,3	-	0,3	-100%	Avaliação de impacto unidades de conservação: Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa devido a baixa maturidade do projeto; mudança de estratégia devido a alteração do escopo
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	22,7	23,1	0,4	2%	- Postergação (R\$ 54,3 MM): menor medição nos contratos sob demandas de serviços devido à restrição COVID; contrato da Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de serviços contratados (Infra e veículos, consultorias, fundário, apoio adm e TI). - Economia (R\$ 7,0 MM): menor gasto com viagens e horas extras.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	0,2	0,2	#DIV/0!	- A variação representa o saldo da Copasa (já subtraído do programa no Draft 17).
PG99	CONTINGÊNCIA	41,0	-	41,0	-100%	- Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados durante a elaboração do Draft 16. - Esse montante foi utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.
Total Reparatórios		360,5	921,3	560,8	156%	
Total Programas		404,6	937,8	533,2	132%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	14,21	14,45	0,24	2%	- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de contratação. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos, salários e encargos. - Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em processo de contratação. - Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário Covid-19. - Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais. - Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades presenciais.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	3,3	0,2	3,1	-93%	- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos previstos.
Total Despesas Administrativas		17,5	14,7	2,9	-16%	
Total Geral		422,1	952,4	530,3	126%	
