



FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Fevereiro/2022

## Sumário

<b>Apresentação .....</b>	<b><u>5</u></b>
<b>Sumário Executivo .....</b>	<b><u>6</u></b>
<b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>	<b><u>12</u></b>
<b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>	<b><u>20</u></b>
<b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas .....</b>	<b><u>27</u></b>
<b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais .....</b>	<b><u>34</u></b>
<b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>	<b><u>42</u></b>
<b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>	<b><u>51</u></b>
<b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>	<b><u>80</u></b>
<b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>	<b><u>88</u></b>
<b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>	<b><u>105</u></b>
<b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b>	<b><u>129</u></b>
<b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>138</u></b>
<b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>	<b><u>146</u></b>

<b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>	<b><u>152</u></b>
<b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>	<b><u>159</u></b>
<b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>	<b><u>167</u></b>
<b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>	<b><u>174</u></b>
<b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>	<b><u>181</u></b>
<b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>	<b><u>192</u></b>
<b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>	<b><u>198</u></b>
<b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>	<b><u>205</u></b>
<b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>	<b><u>213</u></b>
<b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>	<b><u>219</u></b>
<b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>	<b><u>228</u></b>
<b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b>	<b><u>237</u></b>
<b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>	<b><u>243</u></b>
<b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>	<b><u>250</u></b>
<b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>	<b><u>258</u></b>
<b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>	<b><u>264</u></b>
<b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>	<b><u>270</u></b>
<b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>	<b><u>278</u></b>

<b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b>	<b><u>288</u></b>
<b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>	<b><u>294</u></b>
<b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>	<b><u>302</u></b>
<b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>	<b><u>308</u></b>
<b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>314</u></b>
<b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>	<b><u>324</u></b>
<b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>	<b><u>332</u></b>
<b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>	<b><u>339</u></b>
<b>Glossário .....</b>	<b><u>346</u></b>
<b>Dados de Segurança .....</b>	<b><u>352</u></b>
<b>Gestão Econômica* .....</b>	<b><u>353</u></b>

## **Apresentação**

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em fevereiro de 2022, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

### Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em fevereiro foi realizado as reuniões com o GTA para discussões sobre o desenvolvimento do novo protótipo do portal Monitoramento Rio Doce (PG038, pág. 314).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 219). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 105) a qual, até o mês de fevereiro, bombeou cerca de 959 mil m<sup>3</sup> de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 80), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 393 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.732 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito (PG017, pág. 181).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 237) e de Nascentes (pág. 243). Em fevereiro ocorreu o lançamento de edital com quatro lotes na bacia do Manhuaçu para recuperação de 720 ha, e orçamento de 26MM para cada lote. Visita técnica do edital teve a participação de 48 empresas proponentes.

## **Eixo Pessoas e Comunidades**

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.916 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.397 famílias e 98.240 pessoas, desde o início do programa até fevereiro/2022.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de fevereiro, em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 738 indenizações, o que representa 98% do total das 755 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 213), atualmente existem 8.196 pessoas assistidas, com um total de 3.829 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 27) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 34). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, além disso, receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado capacitação de lideranças Quilombolas- Realização do Seminário de Relações-étnico Raciais junto ao PG17, publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo - Continuidade do trabalho de documentação do material botânico junto ao PG10, incentivo às práticas culturais de Degredo - Realização da Oficina Cultural para organização das fogueiras de santos em junho e forró, da Oficina do Jongo, construção de instrumentos e confecção de vestimentas para o grupo de Jongo junto ao PG02 e monitoramento e gestão das ações do PBAQ- Início da pesquisa Baseline junto ao PG18.



Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 42) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 159) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a conclusão das atividades do plano municipal de Caratinga, último repasse financeiro para o município de Naque.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 51; PG035, pág. 302 e PG036, pág. 308), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

## **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 270), em fevereiro de 2022 foram repassados R\$ 1.194.123 para ações dos municípios de Alpercata, Barra Longa, Periquito, Rio Doce e consórcio CONDOESTE.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 198), em fevereiro ocorreu a conclusão do aterro do acesso ao Parque de Exposição em Barra Longa.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 88) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de fevereiro:

***Bento Rodrigues*** — em janeiro, não houve fatos relevantes a serem reportados.

***Paracatu de Baixo*** — em janeiro, não houve fatos relevantes a serem reportados.

***Gesteira*** — em janeiro, não houve fatos relevantes a serem reportados.

**Reassentamento Familiar e Reconstruções** — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em fevereiro, houve a aquisição dos imóveis para o ID SGC 42359 (Id Autodelimitação 186), para o ID SGC 42446 (Id autodelimitação 110 ) data de entrega 24/01/22 e para o ID SGC 42510 (Id autodelimitação 108 ) data de entrega 24/01/22.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

## **PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	127	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	2	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- 
- Maio de 2022 ● Contestações Fluxo Novel
  - Maio de 2022 ● Finalização do universo de cadastros de impactados remanescentes de Mariana
  - Maio de 2022 ● Laudos Fluxo Novel
  - Dezembro de 2022 ● Atender solicitantes de 2017 - 2019

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 167.270 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.916 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.397 famílias e 98.240 pessoas, desde o início do programa até o momento.

### **Nota:**

Ajustes na quantidade de famílias e pessoas a partir do saneamento da base de dados.

## Fatos relevantes do mês

Total de Cadastros liberados: 1.326

Total de Pesquisas Aplicadas da  
Lista de 2019 (Universo de 79): 89  
pesquisas realizadas

Total de Pesquisas Aplicadas da  
Lista de 2020 (Universo de 177):  
162 pesquisas realizadas



## Indicadores

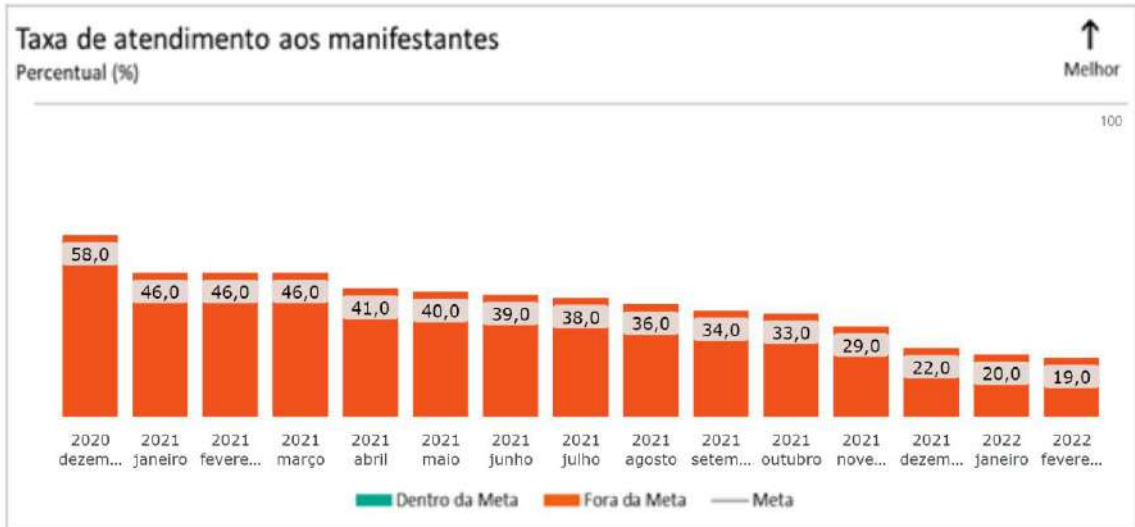


Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado

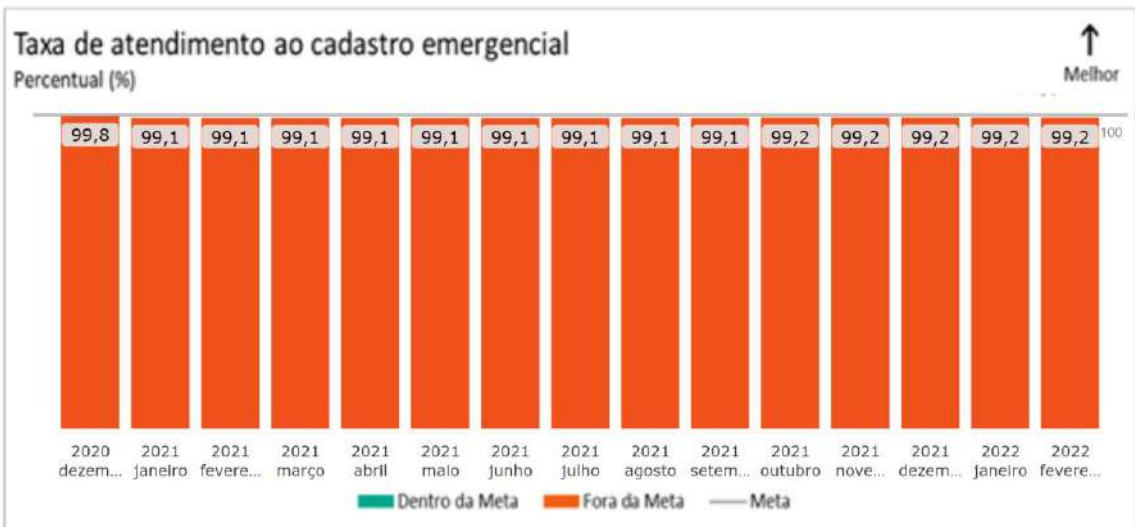


Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado

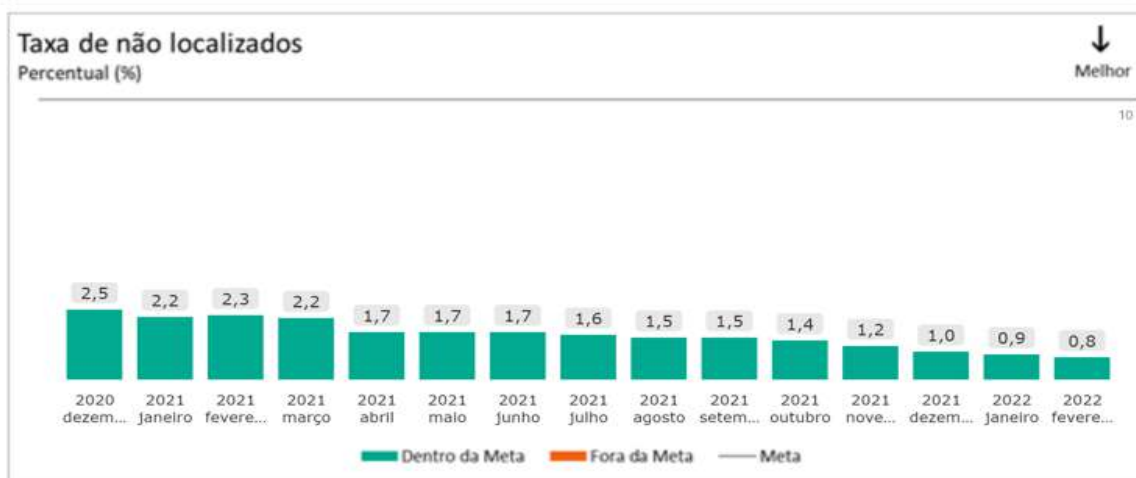


Gráfico 3. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado.

**Nota:**

Justificativa para Não medição do indicador **I03 – Taxa da Devolutiva da Avaliação de Impacto**: o Programa esclarece que o processo de envio das devolutivas de avaliação, ou seja, dos formulários por meio de cartas registradas com AR's (Aviso de Recebimento) pelos Correios se tornou obsoleto e ineficaz. O processo foi modernizado e substituído pela disponibilização de todas as informações relativas ao atingido, incluindo seu parecer de avaliação de impacto, no Portal do Usuário. Dessa forma, ao final do processo cadastral, o atingido já tem disponível seus respectivos documentos e perde-se o sentido de monitorar as devolutivas enviadas por meio físico.

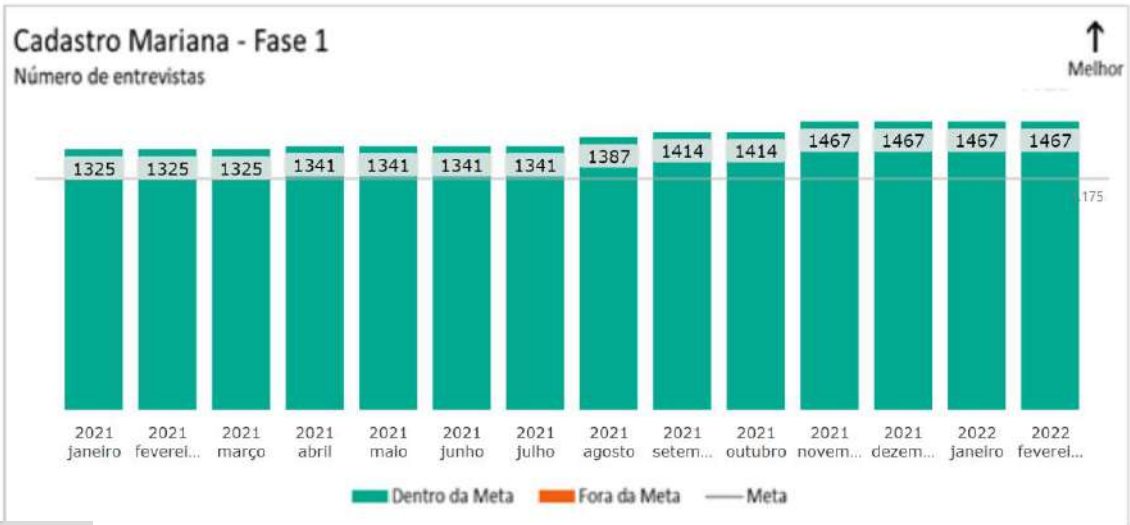


Gráfico 4. Cadastro Mariana – Fase 1. Gráfico Acumulado



Gráfico 5. Cadastro Mariana – Fase 2. Gráfico Acumulado

## **PG002    Ressarcimento    e    Indenização    dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320,179 pessoas, sendo que 270,372 aceitaram propostas. Destas, 556,060 propostas já foram pagas ( 205.7% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 303.58M** .
- **Para Danos Gerais**, 10,670 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10,618 já foram pagos ( 99.5% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1,642.95M** .
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 738 indenizações, o que representa 98% do total das 755 propostas aceitas.

## **Fatos relevantes do mês**

Até 28/02/2022, 54.809 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até 28/02/2022, foi realizado o pagamento de 738 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98% do total das 755 propostas aceitas. Foram 06 indenizações pagas no mês.



## Indicadores



Gráfico 1. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

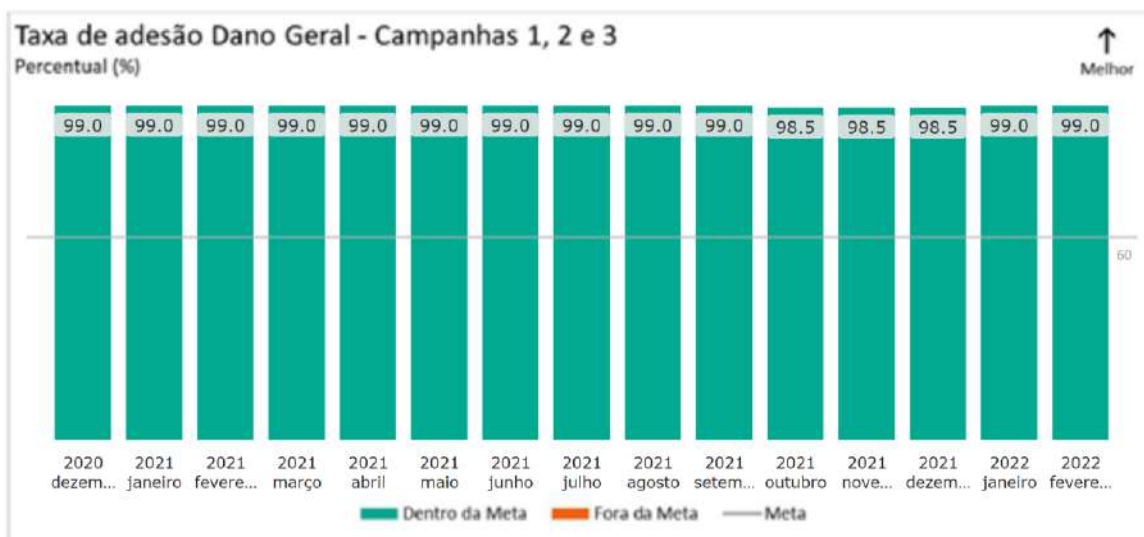


Gráfico 2. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado



Gráfico 3. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Acumulado

## **PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

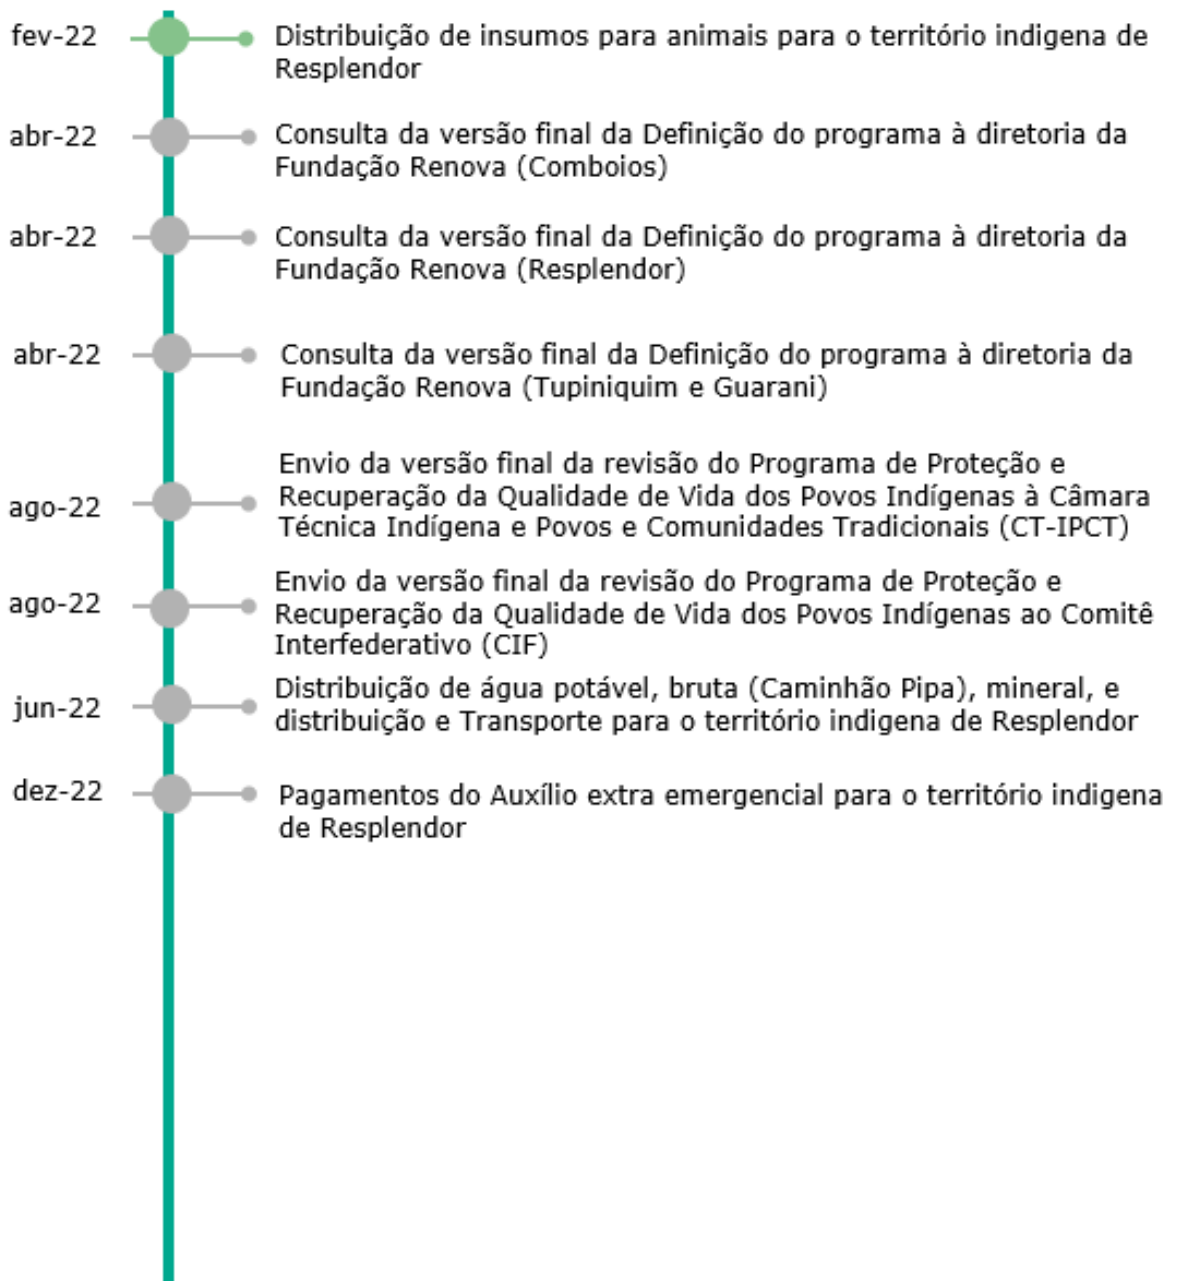

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 84 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 3.650 m<sup>3</sup>);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.270 m<sup>3</sup>).

## **Comboios**

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 31.480 litros distribuídos nos dias 27 de janeiro, 03 10 e 17 de fevereiro de 2022 (total de 1574 galões de 20 litros)

## Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/01/2022 até 20/02/2022. no total diário de 3000 litros. (total de 84.000 litros)

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/01/2022 até 20/02/2022

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/01/2022 até 20/02/2022

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/01/2022 até 20/02/2022



## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**







Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	50	caput	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	355	1	Em Andamento
Deliberação	281	4	Em Andamento
Deliberação	300	1	Judicializado
Deliberação	300	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Judicializado
Deliberação	493	2	Judicializado
Deliberação	493	3	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado

Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado

## Entregas do ano de 2022

- 
- janeiro de 2022  Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
  - novembro de 2022  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
  - dezembro de 2022  Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
  - dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
  - dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

 Concluído  Planejado  Reprogramado

### **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Quilombolas**

PG17 - Capacitação de lideranças Quilombolas- Realização do Seminário de Relações-étnico Raciais

PG10 - Publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo - Continuidade do trabalho de documentação do material botânico

PG02 - Incentivo às práticas culturais de Degredo - Realização da Oficina Cultural para organização das fogueiras de santos em junho e forró., da Oficina do Jongô, construção de instrumentos e confecção de vestimentas para o grupo de Jongô.

PG18 – Monitoramento e gestão das ações do PBAQ – Início da pesquisa Baseline

## **Fiscadores**

Não houve fatos relevantes no mês.



## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG005 Programa de Proteção Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Reprogramado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	533	4	Judicializado

Nota 01: Deliberação 167 – Item 3 – O PG05 já concluiu o item 3, pois o PPS não depende do Cadastro (PG01) para poder atender esse item (nesse caso foi pago o aluguel da moradia provisória para os atingidos que tiveram deslocamento físico).

## Entregas do ano de 2022

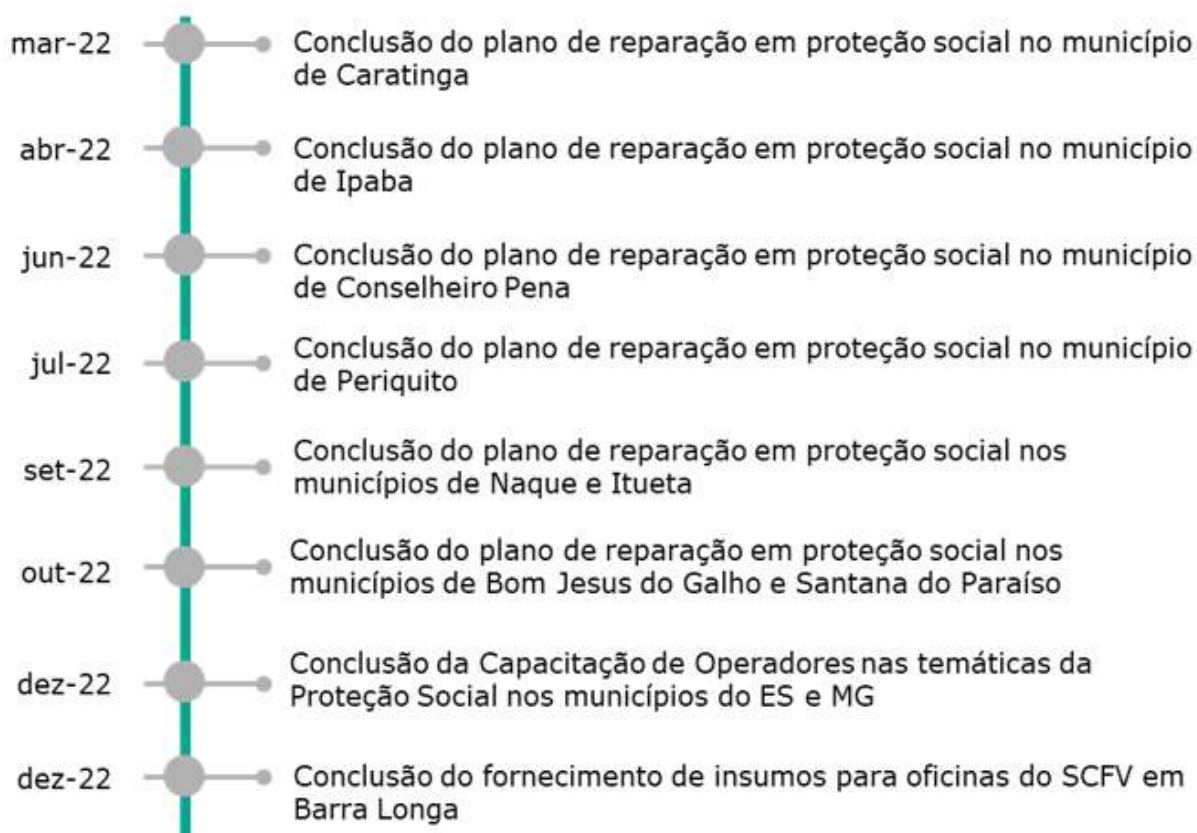

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 108 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de R\$ 8,69 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 19 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23325 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Nota:

Período - 01/02/2022 à 28/02/2022

Municípios atingidos com previsão de suplementação de RH: Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta, Linhares, Mariana, Naque, Periquito, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Santana do Paraíso.

\* Atualização da quantidade de famílias a partir da deliberação CIF533 + variável de 4 salários mínimos.

## **Fatos relevantes do mês**

Último repasse financeiro para o município de Naque.

Efetuada a distribuição do incidente de divergência sobre o conceito de vulnerável (12ª VF).

Conclusão das atividades do plano municipal de Caratinga.

## Indicadores



Gráfico 1. % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social. Frequência Anual.

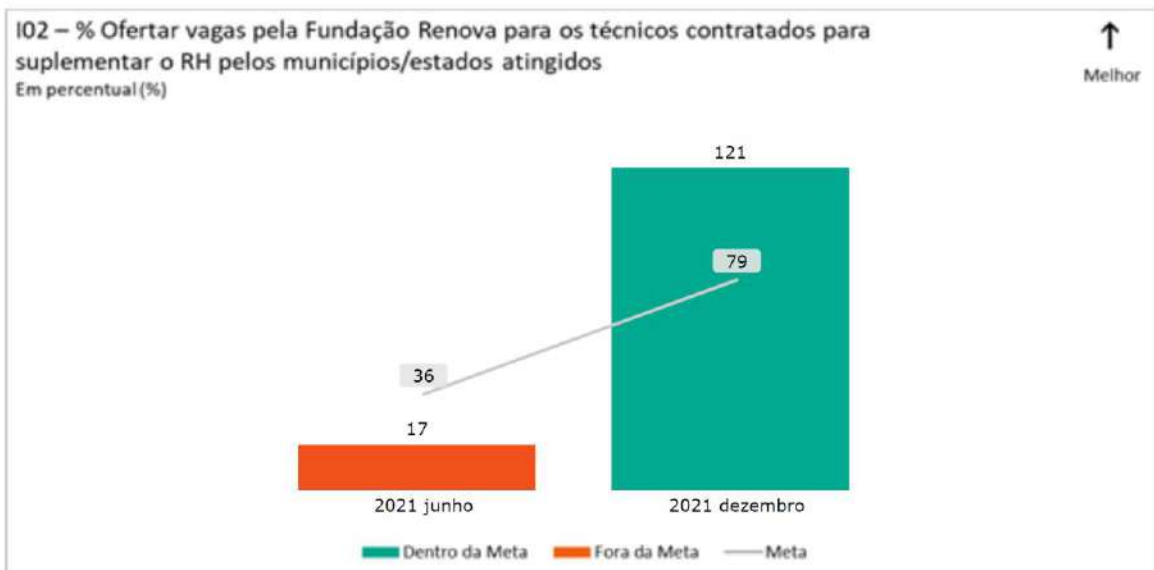


Gráfico 2. % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.

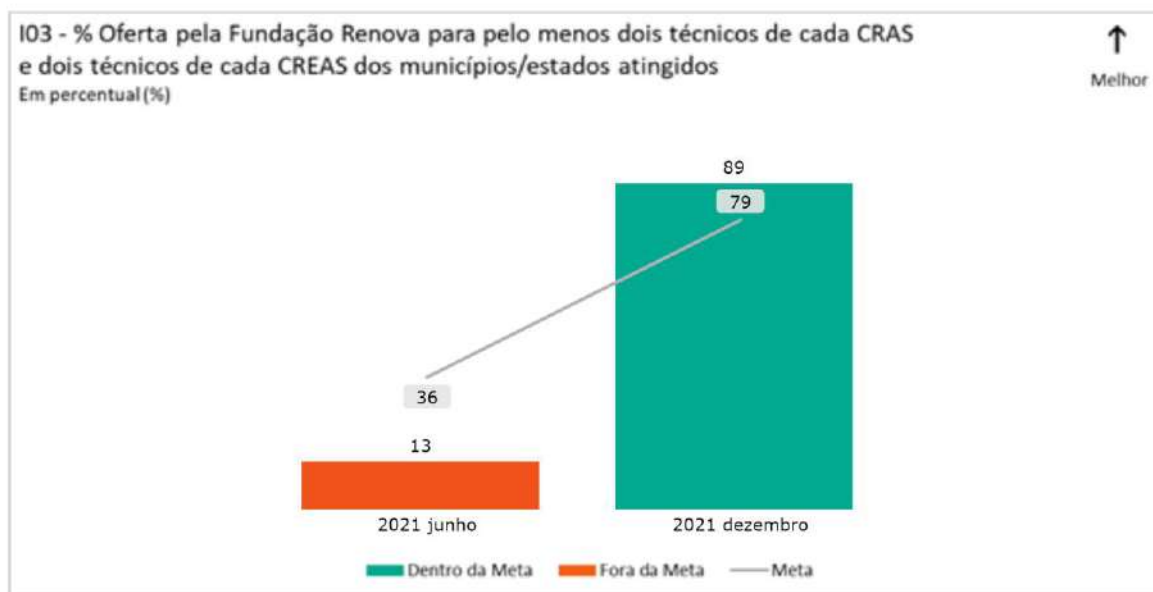


Gráfico 3. % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.

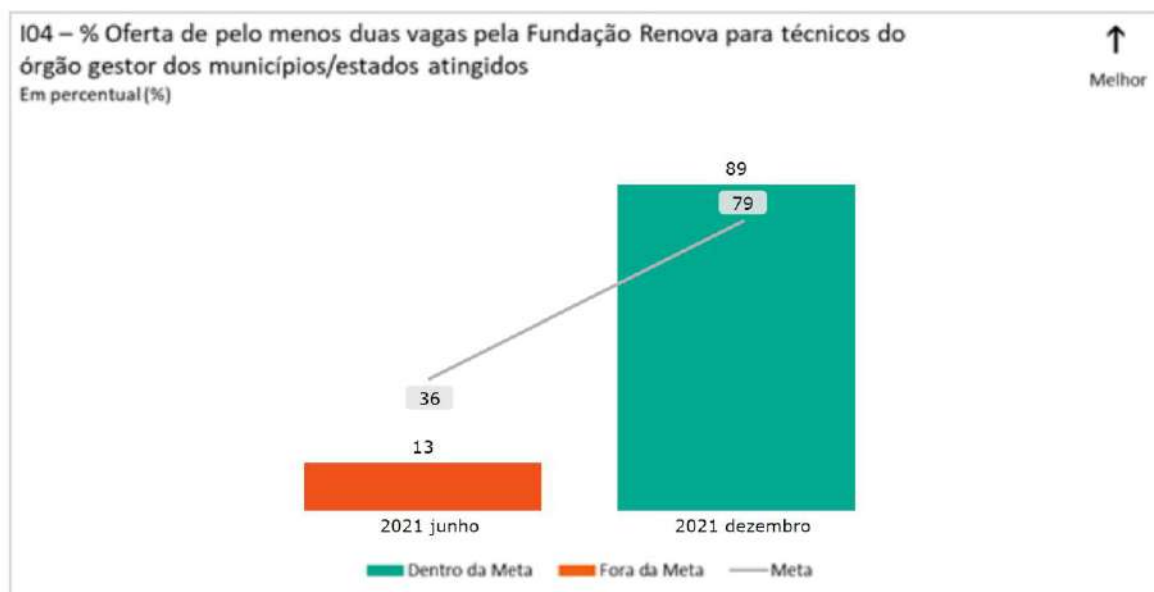


Gráfico 4. % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos. Frequência Semestral.



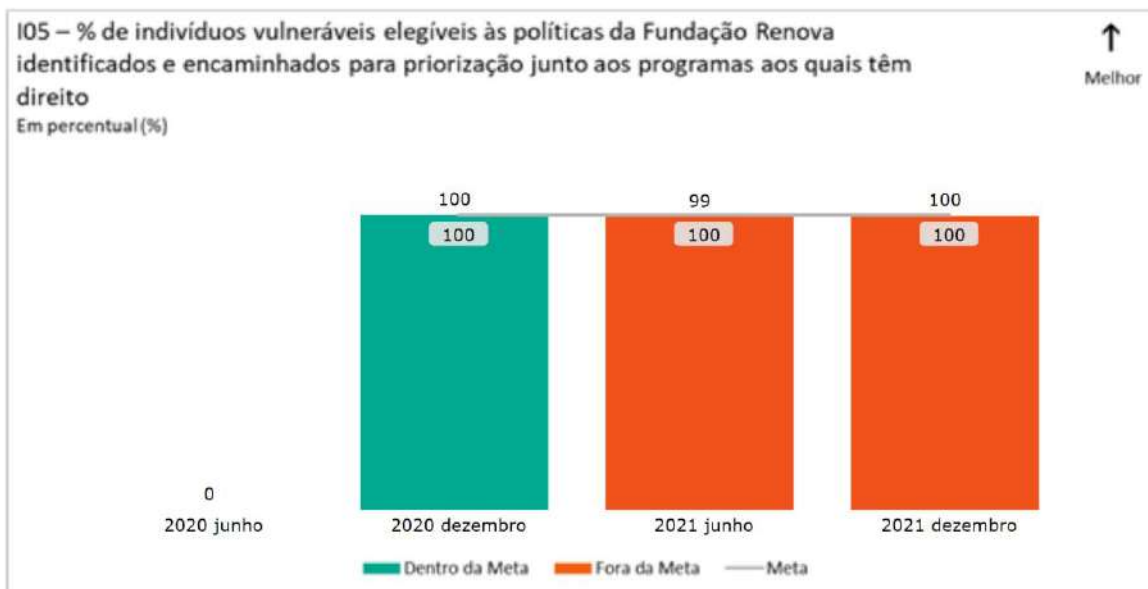


Gráfico 5. % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito. Frequência Semestral.



Gráfico 6. % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova. Frequência Semestral.



Gráfico 7. % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares). Frequência Semestral.

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivos**

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

## Status de Cláusulas e Deliberações












Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Concluído Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	506	3	Concluído Internamente
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente
Deliberação	550	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

- dez-22 ● Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais
- dez-22 ● Conclusão do processo de identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em
- dez-22 ● Conclusão do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2022
- dez-22 ● Conclusão da ampla divulgação nos canais institucionais em 2022
- dez-22 ● Conclusão da publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2022
- dez-22 ● A ouvidoria encaminhará resposta final ao manifestante, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período, nos termos do art. 16 da LEI Nº
- dez-22 ● Conclusão do monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2022
- dez-22 ● Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022
- dez-22 ● Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas, Ativos Locais e suas Redes em 2022.
- dez-22 ● Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.
- dez-22 ● Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.
- dez-22 ● Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.
- dez-22 ● Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.
- dez-22 ● Conclusão da mobilização dos públicos e implementação dos Espaços Dialogais em 2022.

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- dez-22  Conclusão dos encaminhamentos das Decisões, Acompanhamento das Tratativas e Devolutivas aos Públicos em 2022.
- dez-22  Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.
- dez-22  Conclusão do alinhamento interno e planejamento das Agendas de Diálogo em 2022.
- dez-22  Conclusão da mobilização dos públicos e implementação dos Espaços Dialogais em 2022.
- dez-22  Conclusão dos encaminhamentos das Decisões, Acompanhamento das Tratativas e Devolutivas aos Públicos em 2022.
- dez-22  Conclusão do acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2022
- dez-22  Conclusão do registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022
- dez-22  Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.
- dez-22  Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.
- dez-22  Conclusão do acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2022.
- dez-22  Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números.

<b>INDICADOR</b>	<b>Janeiro/2022</b>	<b>Fevereiro/2022</b>	<b>ACUMULADO</b>
Reuniões Realizadas – Minas Gerais	4	7	3.690
Reuniões Realizadas – Espírito Santo	2	-	1.076
Reuniões Realizadas – Outras Localidades			11
Total de Participantes em Reuniões			124.103

## Fatos relevantes do mês

Em Mariana foram realizados encontros do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos da reparação. Foram discutidos os temas de pagamento de custas cartoriais da Associação de Moradores de Paracatu de Baixo, informes sobre a manutenção da área de origem e retorno sobre o atendimento a novos núcleos familiares.

No Médio Rio Doce foi realizada Reunião mensal com representantes da Comissão Local de Atingidos e Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (Periquito) para esclarecimentos sobre pagamento de Lucro Cessante, Sistema Indenizatório Simplificado e o andamento da obra de captação alternativa de água na comunidade. Destaque para encontro com os representantes da Colônia de Pescadores Z-19 para esclarecimentos sobre o processo de revalidação das informações para o Programa de Auxílio Financeiro Emergencial.

Realização de ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil), incluindo agendas de diálogo coletivo; diálogos individualizados; envio sistemático de materiais informativos e suporte para esclarecimento de dúvidas de atingidos; comunicação estratégica e busca ativa de elegíveis não requerentes ao Fluxo Ágil para informação sobre possibilidade de adesão.



## Indicadores

Indicadores Mensais		
Indicador	01/22	02/22
<b>I.10 e I.20</b> Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	21,66	12,66
<b>I.16</b> Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios	25	<i>Em consolidação<sup>1</sup></i>
Indicadores Trimestrais		
Indicador	12/21	02/22
<b>I.5</b> Apresentação dialógica dos programas nos territórios	56,18%	<i>Aguarda fechamento do trimestre</i>
<b>I.8:</b> Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	8,61	<i>Aguarda fechamento do trimestre</i>
<b>I.9 e I.15</b> Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em diálogos coletivos	8,78	<i>Aguarda fechamento do trimestre</i>
Indicadores Semestrais		
<b>I.18</b> Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	6,72	<i>Aguarda fechamento do semestre</i>
<b>I.19</b> Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	7,99	<i>Aguarda fechamento do semestre</i>
<b>I.21</b> Avaliação dos espaços de participação e controle social	8,86	<i>Aguarda fechamento do semestre</i>
Indicadores Anuais		
<b>I.31</b> Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	60,55%	<i>Aguarda fechamento do ano</i>
<b>I.17 e I.32</b> Percepção de efetividade dos espaços de Participação e Controle Social <sup>2</sup>	6,89	<i>Aguarda fechamento do ano</i>

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO</b>	<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA</b>
13.855,00	182,30

Tabela 3. Manifestações recebidas.

<b>MÊS/ANO</b>	<b>REALIZADO MENSAL</b>	<b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b>
janeiro de 2022	177	154,00
fevereiro de 2022	131	
		-
		-
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

Item de monitoramento	jan-2022	fev-2022
124c - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	80	83
124d - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	38	45

Justificativa: O indicador "Avaliação do atendimento pela Ouvidoria (i.26.c)" foi recentemente aprovado na câmara técnica e, após a aprovação, a Ouvidoria deu início ao processo de contratação da empresa que será responsável pela realização da pesquisa. Tal processo administrativo exige várias etapas, antes que a pesquisa possa ser iniciada, desde a elaboração da requisição técnica, apresentação das propostas, contratação, elaboração técnica do conteúdo da pesquisa, até a realização da pesquisa de satisfação. Atualmente, a empresa que será responsável pela realização da pesquisa já foi contratada e deu início aos trabalhos de planejamento/elaboração da estrutura da pesquisa. A previsão é que os primeiros resultados sejam obtidos no primeiro trimestre de 2022.

## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	janeiro de 2022	fevereiro de 2022
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	264.553	270.807
Canais: Número total de manifestações	1.025.147	1.042.277
Canais: Número de manifestações respondidas	959.815	974.049
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	185.655	186.868
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	33.505	41.429
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.865	14.303
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	791.840	799.171
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	2	6
Canais: Número de manifestações em tratamento	65.332	68.231

### Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q2.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Sim.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente





Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q3, Q1= Parcialmente.


## Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● RUIM ● PÉSSIMO


Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?

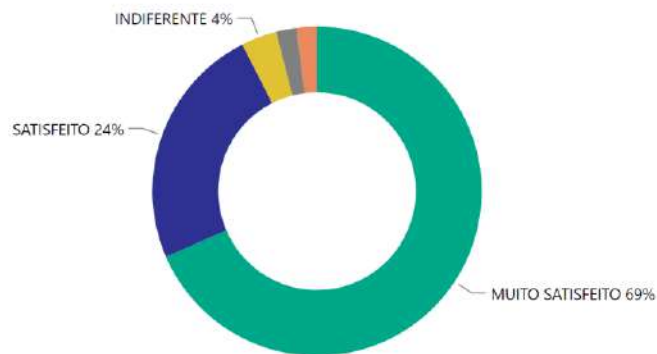

Legenda ● MUITO SATISFEITO ● SATISFEITO ● INDIFERENTE ● INSATISFEITO ● MUITO INSATISFEITO




Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● RUIM ● PÉSSIMO

Avalie o Conforto e qualidade do espaço

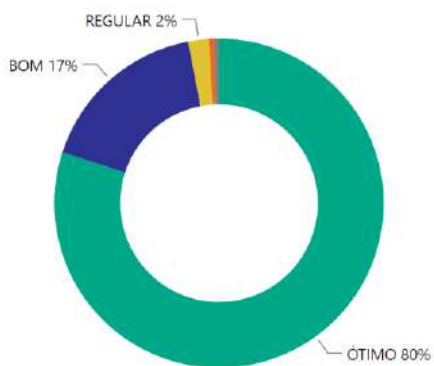

Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

## Fatos relevantes do mês

Acolhimento e registro de manifestações pelos Centros de Informação e Atendimento para entrega de documentos extras referente ao processo de revalidação do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), bem como o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o processo.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Ressarcimento e Indenização (PG02), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" e "Moradia Temporária" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce. No Médio Rio Doce foi realizada análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Aduadora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32).

Monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Participação dos atendentes CIAs em treinamento para qualificação e aperfeiçoamento dos atendimentos sobre o processo de reparação e compensação: Preparo para intervenção em situação de conflitos (01/02); Encontro para repasse de informações sobre o SPA e esclarecimento de dúvidas gerais | CIA (02/02); Webinar de Indicadores PG 06 - Canais de Relacionamento e Diálogo (04/02).

Produção de relatório analítico sobre o processo de Gestão de Manifestações no Território do Espírito Santo. O material traz um panorama das manifestações no território, apresentando a evolução dos registros e tratativas por ano com o objetivo de reduzir o passivo de manifestações, realizar o controle social e a aproximação com as demandas do território.

## Indicadores

Item de monitoramento	jan-2022	fev-2022
I02 e I26b - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e Fale Conosco	92	93
I2 e I26a - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias	97	97
I22 - Pilar canais - Taxa de manifestações recorrentes	35	35
I24a - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	94	93
I24b - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	73	72
I27 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	98	98
I27a - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs	99	94
I27b - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	97	97
Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs	96	97

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### 1º Semestre de 2022


DADO	jan	fev	Acumulado no ano
▼			
VídeoZaps produzidos	0	0	<b>0</b>
Vídeos produzidos	1	0	<b>1</b>
Vídeoreportagens produzidos	0	0	<b>0</b>
Rádios produzidos	18	20	<b>38</b>
Pílulas de whatsapp produzidos	39	21	<b>60</b>
Outros itens produzidos	2	1	<b>3</b>
Newsletter produzidos	3	3	<b>6</b>
Mídias Sociais produzidas	15	3	<b>18</b>
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	15	<b>15</b>
Jornais da Comunidade produzidos	5	0	<b>5</b>
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	<b>4</b>
E-mails de Marketing produzidos	0	1	<b>1</b>
Cartilhas produzidos	0	0	<b>0</b>
Carros de som produzidos	4	1	<b>5</b>
ÁudioZaps produzidos	0	0	<b>0</b>
Áudios produzidos	0	0	<b>0</b>

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### Publicações por Território


Canais: Carro de som, E-mail Marketing, Informe do Reassentamento, Matéria - Boletim Jornada, Mídia Social, Newsletter, Outros, Pilula, Rádio

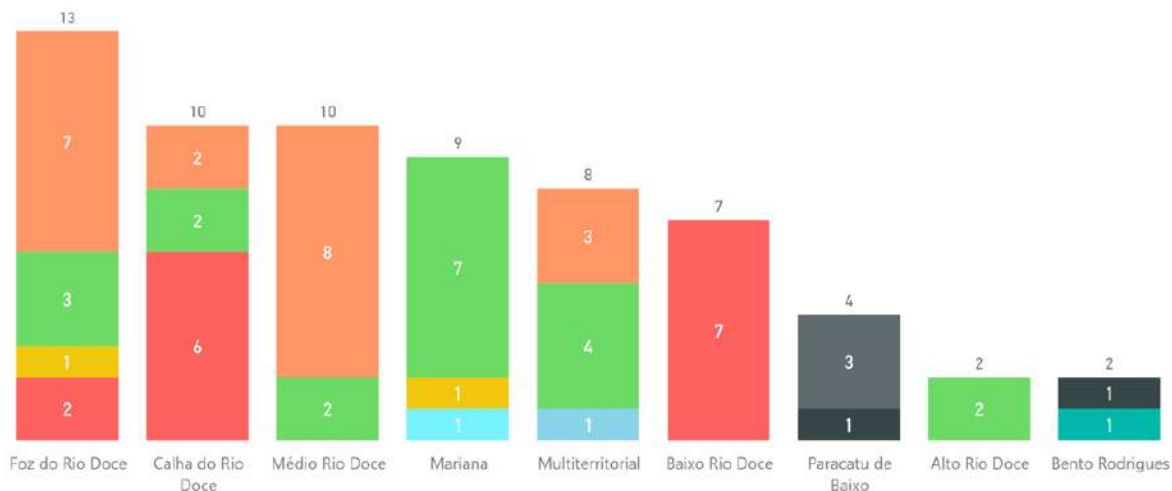

Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

#### Principais Temas Veiculados

Canais: Carro de som, E-mail Marketing, Informe do Reassentamento, Matéria - Boletim Jornada, Mídia Social, Newsletter, Outros, Pilula, Rádio



## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Alto Rio Doce

Divulgação sobre a mudança de endereço do CIA de Sta Cruz e Rio Doce.

Produção de pílula sobre funcionamento dos CIAs de Sta Cruz e Rio Doce durante o carnaval.

#### Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Ipatinga para reunião do Diálogo sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 22/02.

Produção de pílula de WhatsApp convidando atingidos de Timóteo para reunião do Diálogo sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, no dia 23/02.

Publicação de matéria na 11ª edição do Jornada da Calha sobre atividades realizadas pelo Diálogo durante o momento atual da pandemia de Covid-19.

#### Foz do Rio Doce

Produção de matéria apresentando e esclarecendo sobre o Portal da Transparência no site da Renova.

Produção de matéria especial para a edição 1 do Jornada Foz do Rio Doce (Linhares, Aracruz e Sooretama) esclarecendo sobre o período chuvoso e a ensecadeira instalada no Rio Pequeno.

Produção de pílula informando sobre novo alteamento da ensecadeira devido à elevação do nível de água do rio Doce.

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Foz do Rio Doce

Divulgação de vídeo nas redes sociais com os destaques da 20a edição do Jornal Voz da Foz.

#### Médio Rio Doce

Produção de pílula de Whatsapp para divulgação da reunião mensal entre a equipe de Diálogo Social da Fundação Renova e a comunidade de Pedra Corrida, distrito de Periquito.

Produção de programa de rádio para divulgação do horário de funcionamento do Centros de Informação e Atendimento da Fundação Renova nas cidades do território Médio Rio Doce.

## Fatos relevantes do mês

### Imprensa

Fundação Renova encerra 2021 com recorde de indenizações e auxílios financeiros.

Consultoria para negócios inicia nova fase de atendimentos em Regência e Povoação.

Qualidade dos produtos e serviços é tema de palestra on-line para empreendedores capixabas.

Pesquisadores apresentam avanços de projetos para a reparação da Bacia do Rio Doce.

Formação de Lideranças Jovens inicia repasse de mais R\$ 1 milhão para ações na bacia do rio Doce (ES).

Formação de Lideranças Jovens inicia repasse de mais R\$ 1 milhão para ações na bacia do rio Doce (Mariana).

Reparação da bacia do rio Doce terá mais de R\$ 10 bilhões em 2022.

Concluído o pagamento de indenização dos povos indígenas de Aracruz.

Segunda edição do Edital Doce será lançada em março com modalidades inéditas.

Recursos da Agenda Integrada começam a ser investidos em ações estruturantes.

Indenizações ao setor agropecuário ultrapassam R\$ 178 milhões no Espírito Santo.

Governador Valadares vira a capital do voo livre com festival de três dias.



## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Produção de matéria especial para a edição 1 do Jornada Foz do Rio Doce (Linhares, Aracruz e Sooretama) informando sobre a nova forma de solicitar adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM) e ao Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Produção de matéria para a Rádio Renova com informações sobre as mudanças de regras relacionadas a declarações de postos de saúde e escolas no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o número de pagamentos em indenizações (incluindo o Sistema Indenizatório Simplificado) e auxílios financeiros em 2021.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre os quatro tipos de processos tratados pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula com orientações para advogados sobre as formas de negativas a requerimentos de falecidos no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre as mudanças de regras relacionadas a declarações de postos de saúde e escolas no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com o número de pagamentos em indenizações (incluindo o Sistema Indenizatório Simplificado) e auxílios financeiros em 2021.

Produção de pílula de WhatsApp com orientações para os advogados sobre as formas de pagamento de requerimentos de atingidos falecidos no Sistema Indenizatório Simplificado.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu**

Produção de newsletter com esclarecimentos sobre o processo de concorrência para contratação das empresas do Pacote 1 do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção de informativo mensal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status sobre projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

Produção da 37ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 36ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

#### **Suporte ao PG007 Programa de Assistência aos Animais**

Produção de pílula sobre alteração nas visitas aos animais nas fazendas de Mariana

#### **Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social**

Produção de programa de rádio para divulgação das inscrições para a Oficina de Artesanato do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na cidade de Naque. A ação faz parte do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social, realizado a partir de um acordo assinado entre a Fundação Renova e a prefeitura da cidade.

#### **Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais**

Produção de pílula, convidando à população de Degredo a participar do seminário quilombola.

#### **Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados**

Publicação de matéria na 15ª edição do Boletim Jornada Baixo Rio Doce sobre o Sistema PIM/AFE, informando que as categorias formais serão atendidas de forma virtual em uma plataforma criada para este fim.

Publicação de matéria na 15ª edição do Boletim Jornada Baixo Rio Doce sobre o prazo para solicitar indenização no Sistema Indenizatório Simplificado.

Publicação de matéria na 11ª edição do Jornada da Calha sobre o funcionamento do Sistema PIM/AFE (SPA).

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local**

Produção de matéria sobre as novas datas de inscrições para o curso de assistente administrativo em Regência e Povoação.

Produção de matéria divulgando o adiamento das inscrições presenciais para o curso de assistente administrativo, em Povoação, devido ao isolamento da localidade por conta das fortes chuvas.

Elaboração de pílula de WhatsApp sobre vagas de emprego em Mariana ,pela plataforma Recoloca Rio Doce, em parceria com o Sine.

#### **Suporte ao PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

Produção de matéria sobre o andamento do projeto de consultoria aos comerciantes da Foz do Rio Doce.

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Publicação de matéria na 11ª edição do Jornada da Calha sobre o Arranjo Produtivo Local (APL) de Marliéria.

Publicação de matéria na 11ª edição do Jornada da Calha sobre ações desenvolvidas em Bom Jesus do Galho por meio de apoio do Edital Doce e do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre o Casa Laboratório, de Ipatinga, apoiado pelo projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Divulgação do sexto episódio do vídeo de educação patrimonial da praça Gomes Freire

#### **Suporte ao PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar**

Produção de pílula com orientações sobre o termo para autorização do transporte escolar oferecido para os alunos das escolas temporárias de Bento e Paracatu.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local**

Divulgação de posts direcionados nas redes sociais da Renova, informando sobre o adiamento das inscrições presenciais para o curso de assistente administrativo, em Povoação, devido ao isolamento da localidade em função das fortes chuvas.

Elaboração de pílula de WhatsApp sobre vagas de emprego em Mariana, pela plataforma Recoloca Rio Doce, em parceria com o Sine.

Produção de nota sobre o ciclo de palestra de desenvolvimento de fornecedores locais

Produção de pílula divulgando o adiamento das inscrições presenciais para o curso de assistente administrativo, em Povoação, devido ao isolamento da localidade em função das fortes chuvas.

Produção de pílulas para divulgação das novas datas de inscrições no curso de Assistente Administrativo em Regência e em Povoação.

#### **Suporte ao PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP**

Publicação de matéria na 11ª edição do Jornada da Calha sobre o Edital de Restauração Florestal para produtores rurais.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte à Economia e Inovação**

Produção de pílula de Whatsapp para divulgação das vagas de emprego abertas na plataforma Recoloca Rio Doce para atuar nas obras da Adutora em Governador Valadares através do Grupo Dinâmica LCM.

Produção de programa de rádio para divulgação das vagas de emprego abertas na plataforma Recoloca Rio Doce para atuar nas obras da Adutora em Governador Valadares através do Grupo Dinâmica LCM.

Publicação de matéria na 11ª edição do Jornada da Calha sobre o Impulso Rio Doce, com destaque para empreendedor participante de Ipatinga.

#### **Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce**

Impressão de 1000 formulários de avaliação do projeto Doce Vivo.

Produção de programa de rádio para divulgação do avanço de mais uma etapa da Formação de Lideranças Jovens com a seleção de 15 projetos nas cidades do território Médio Rio Doce.

Produção de programa de rádio sobre o projeto Horta Cultural de Timóteo, selecionado pelo projeto de Formação de Lideranças Jovens.

Publicação de matéria na 15ª edição do Boletim Jornada Baixo Rio Doce sobre os projetos criados pelos jovens que participam do projeto de Formação de Lideranças Jovens.

#### **Suporte ao UST**

Publicação de matéria na 15ª edição do Boletim Jornada Baixo Rio Doce sobre as ações de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER que apoiarão produtores rurais na retomada das atividades.

Publicação de matéria na 15ª edição do Boletim Jornada Baixo Rio Doce sobre o Edital de Restauração Florestal voltado para produtores rurais.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte à Economia e Inovação**

Produção de matéria sobre a parceria com os assentamentos de reforma agrária do ES impactados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Produção de matéria sobre a parceria entre a Fundação Renova e a Coopterra para apoio a nove assentamentos de reforma agrária do ES.

Publicação de matéria na 15ª edição do Boletim Jornada Baixo Rio Doce sobre os projetos que foram selecionados para participar do Impulso Rio Doce.

## Indicadores

Item de monitoramento	Periodicidade	2021
I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	Anual	5,37
I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	Anual	5,20
I6 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Anual	3,52
I7 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	Anual	21,65

## **PG007 Programa de Assistência aos Animais**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Concluído Internamente
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Em Andamento
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Em Andamento
Deliberação	563	4	Planejado

## **Entregas do ano de 2022**

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

## Grandes números do programa

- 1201 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 160 adoções, 426 devoluções, 180 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 393 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 289 bovinos, 56 equinos, 27 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1732 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## **Fatos relevantes do mês**

Visita do Grupo de Monitoramento e de Integrantes da CT-OS em cumprimento à Deliberação 226/2018 - Acompanhamento das atividades do Programa.

## Indicadores

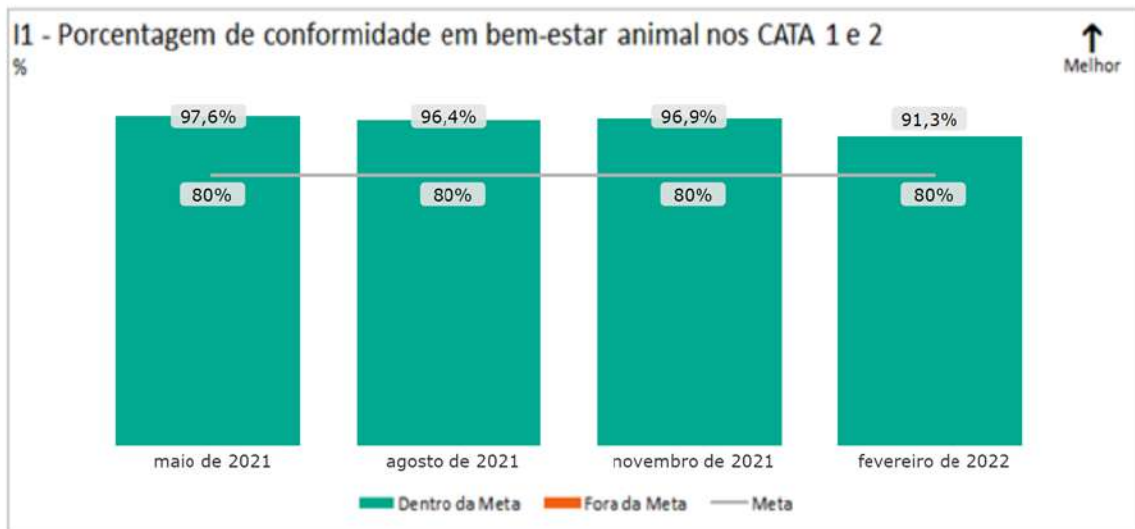


Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2. Frequência Trimestral.

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de verão/22.

Em fevereiro, todos os médicos-veterinários integrantes das atividades do Programa participaram de uma capacitação teórico e prática em bem-estar animal e responsabilidades do profissional veterinário, bem como sobre a metodologia de aplicação da ferramenta desenvolvida para este indicador. O treinamento teve a duração de 3 dias, e foi realizado por empresa de consultoria especializada em cursos e perícias na área de medicina veterinária. A queda de 5,6 pontos percentuais em relação ao mês de novembro/21 se deu pelo aprimoramento e capacidade de refinamento dos critérios avaliados pelos médicos-veterinários após o treinamento e desenvolvimento. Aspectos relacionados à condição de saúde, principalmente para animais idosos e/ou portadores de doenças crônicas foram os itens de maior influência nesta aferição, sem, contudo, deixar de atingir a meta prevista do indicador.

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 por espécie. Frequência Trimestral.

Eventuais desvios em relação à meta vigente não serão classificados como de relevância significativa caso estejam em valores iguais ou superiores à 60%, de acordo com o grau de escalonamento do Quadro 1. A metodologia utilizada prevê um padrão para os diferentes graus de bem-estar animal, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo antes de situações críticas que possam implicar na caracterização de sofrimento animal (resultados inferiores à 60%).

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar




Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados. Frequência Bimestral.

Para o último bimestre avaliado, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, não houve contabilização de novas adoções finalizadas ou óbito de animal disponível para adoção. Para o período do presente relatório, 6 animais estão em acompanhamento pós-adoção e 3 aguardam processos adotivos sob guarda temporária da Fundação Renova.

A próxima atualização deste indicador é prevista para o mês de Maio de 2022 (referência ao bimestre mar./abr. de 2022).

**Nota 1:** Os indicadores I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia e I04 Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação iniciaram a medição em fevereiro, com periodicidade bimestral terão seus gráficos informados no próximo relatório.

## **PG008 Reconstrução de Vilas**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses. CLÁUSULAS: 76 a 78.



## Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

## **Fatos relevantes do mês – Reconstrução de Vilas**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Entregas para o ano de 2022



dezembro de 2022	●	Concluir 78 edificações
dezembro de 2022	●	Concluir 22 lotes
dezembro de 2022	●	Concluir 01 bem coletivo

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Grandes números do projeto

#### Social:

- Atendimentos para 202 **famílias**;
- Atendimentos para 10 **famílias de Novos Núcleos**.

#### Obras:

- Em andamento construção de 89 **edificações**;
- Conclusão de 47 **edificações**;
- Conclusão de 3 **bens coletivos** (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde);
- Total de 6 **contratos assinados** para construção de edificações.

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para 182 edificações, 23 lotes vagos e 14 bens coletivos;
- **Projetos básicos concluídos** para 181 edificações 23 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura para 171 edificações, 22 lotes e 13 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** para 22 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos para 160 edificações e para 13 bens coletivos.

Nota<sup>1</sup>: Edificações são correspondentes a "edificações e pontos comerciais".

Nota<sup>2</sup>: Dados reportados com data de corte em 25/02


## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Entregas para o ano de 2022

- 
- dezembro de 2022 ● Concluir 38 edificações
  - dezembro de 2022 ● Concluir 01 bem coletivo

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Grandes números do projeto

#### Social:

- Atendimentos para 78 **famílias**.
- Atendimentos para 2 **famílias de Novos Núcleos**.

#### Obra:

- Em andamento construção 26 **edificações**.
- Em andamento construção de 3 **bens coletivos** (escolas e posto de saúde.)

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para 64 edificações, 3 lotes vagos e 11 bens coletivos;
- **Projetos básicos concluídos** para 64 edificações, 6 lotes vagos e 11 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura para 59 edificações, 5 lotes e 11 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** para 5 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos para 57 edificações e para 11 bens coletivos.

Nota<sup>1</sup>: Edificações são correspondentes a "edificações e pontos comerciais".

Nota<sup>2</sup>: Dados reportados com data de corte em 25/02

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.



## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Entregas para o ano de 2022**

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Grandes números do projeto**

#### **Social:**

- Atendimento para 9 **famílias;**
- Acordos homologados com 28 **famílias;**
- Total de 26 **edificações** adquiridos para famílias que possuem acordo homologado.

Observação: Números de edificações adquiridos para famílias que possuem acordo homologado - temos 23 imóveis adquiridos + 3 pagamentos de acordo integral (Sem aquisição de imóvel)

Nota<sup>1</sup>:Dados reportados com data de corte em 25/02


## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Entregas para o ano de 2022

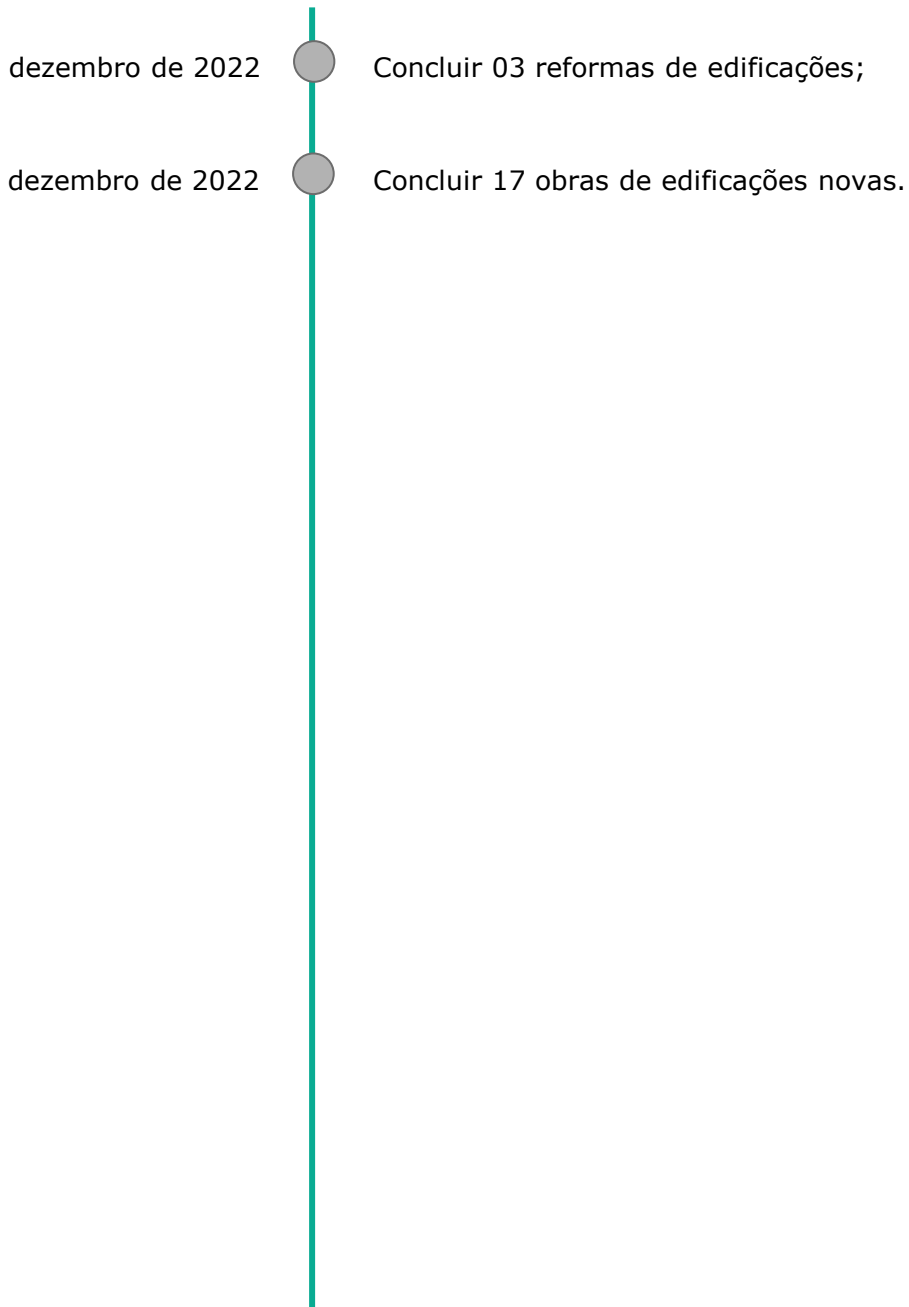

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Grandes números do Familiar

#### Social:

- Atendimento para 123 **famílias**;
- Atendimento para 9 **famílias de Novos Núcleos**;
- Aquisição de 80 **edificações** para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
- Aquisição de 5 **edificações** para **famílias de Novos Núcleos** que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
- Em andamento construção 41 **edificações**;
- Em andamento construção 4 **edificações de Novos Núcleos**;
- Em andamento reforma de 29 **edificações**;
- Em andamento reforma de 1 **edificações de Novos Núcleos**;
- Previsão de entregas de 10 **lotes vagos**;
- Atendimento a 10 **famílias** na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 13 **edificações** nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções entregues para 6 **edificações** principais nas Comunidades Rurais.

Nota<sup>1</sup>: Dados reportados com data de corte em 25/02

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Grandes números do Familiar

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** para construções de 41 edificações, para reformas de 28 edificações e 8 lotes vagos;
- **Projetos básicos concluídos** para construções de 40 edificações, para reformas de 28 edificações e 8 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 39 edificações, para reforma de 27 edificações e 8 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 35 construções de edificações, para 25 reformas de edificações e para 8 lotes vagos.

"Nota<sup>1</sup>: O termo edificações abrange-se "casas e pontos comerciais."

Nota<sup>2</sup>: O termo "Não necessário" se refere a não obrigatoriedade de alguns documentos por etapas de liberação e/ou aplicação em localidades de registros das edificações. Reassentamento Familiar com atendimento em âmbito nacional.

Nota<sup>3</sup>: Dados reportados com data de corte em 25/02

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Fatos relevantes do mês**

Pecúnias Geral (O cálculo das propostas está sendo revisadas para posterior retomada das apresentações – APRO 49):

Propostas apresentadas:

- o 14 Propostas de pecúnias aceitas;
- o 11 Propostas de pecúnias pagas;
- o 03 Propostas de pecúnias ainda não pagas;
- o 08 Propostas de pecúnias recusadas.

Pecúnia Novos Núcleos: Propostas apresentadas:

- o 05 Propostas de pecúnias aceitas;
- o 02 Propostas de pecúnias pagas;
- o 03 Propostas de pecúnias ainda não pagas;
- o 05 Propostas de pecúnias recusadas.

Informações referente as Verbas de Autogestão para Casas Novas, Reformas e Reconstrução  
Dados numéricos sobre quantidade de casas prontas para entrega:

Casas Novas: 05 atendimentos optaram por verba para autogestão;  
Casas reformadas: 02 atendimentos optaram por verba para execução da reforma;  
Reconstrução: 01 atendimento optou por verba para autogestão.

Aquisição do imóvel para o ID SGC 42510 (Id autodelimitação 108 ) data de entrega 24/01/22

Aquisição do imóvel para o ID SGC 42446 (Id autodelimitação 110 ) data de entrega 24/01/22

Aquisição do imóvel para o ID SGC 42359 (Id autodelimitação 186 ) data de entrega 24/02/22

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Indicadores



Gráfico 4. Disponibilidade total de atendimentos temporários. Gráfico Mensal



## PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves


### Eixo Terra e Água

#### Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Cláusula	79	Caput	Cumprido internamente
Cláusula	80	Caput	Em andamento
Cláusula	81	Caput	Em andamento
Cláusula	150	§3º	Cumprido parcialmente/Judicializado
Deliberação	30	N/A	Cumprida internamente
Deliberação	80	4.1	Cumprida internamente
Deliberação	80	4.2	Cumprida internamente
Deliberação	225	2	Cumprido internamente
Deliberação	286	3	Cumprida internamente

## Entregas do programa

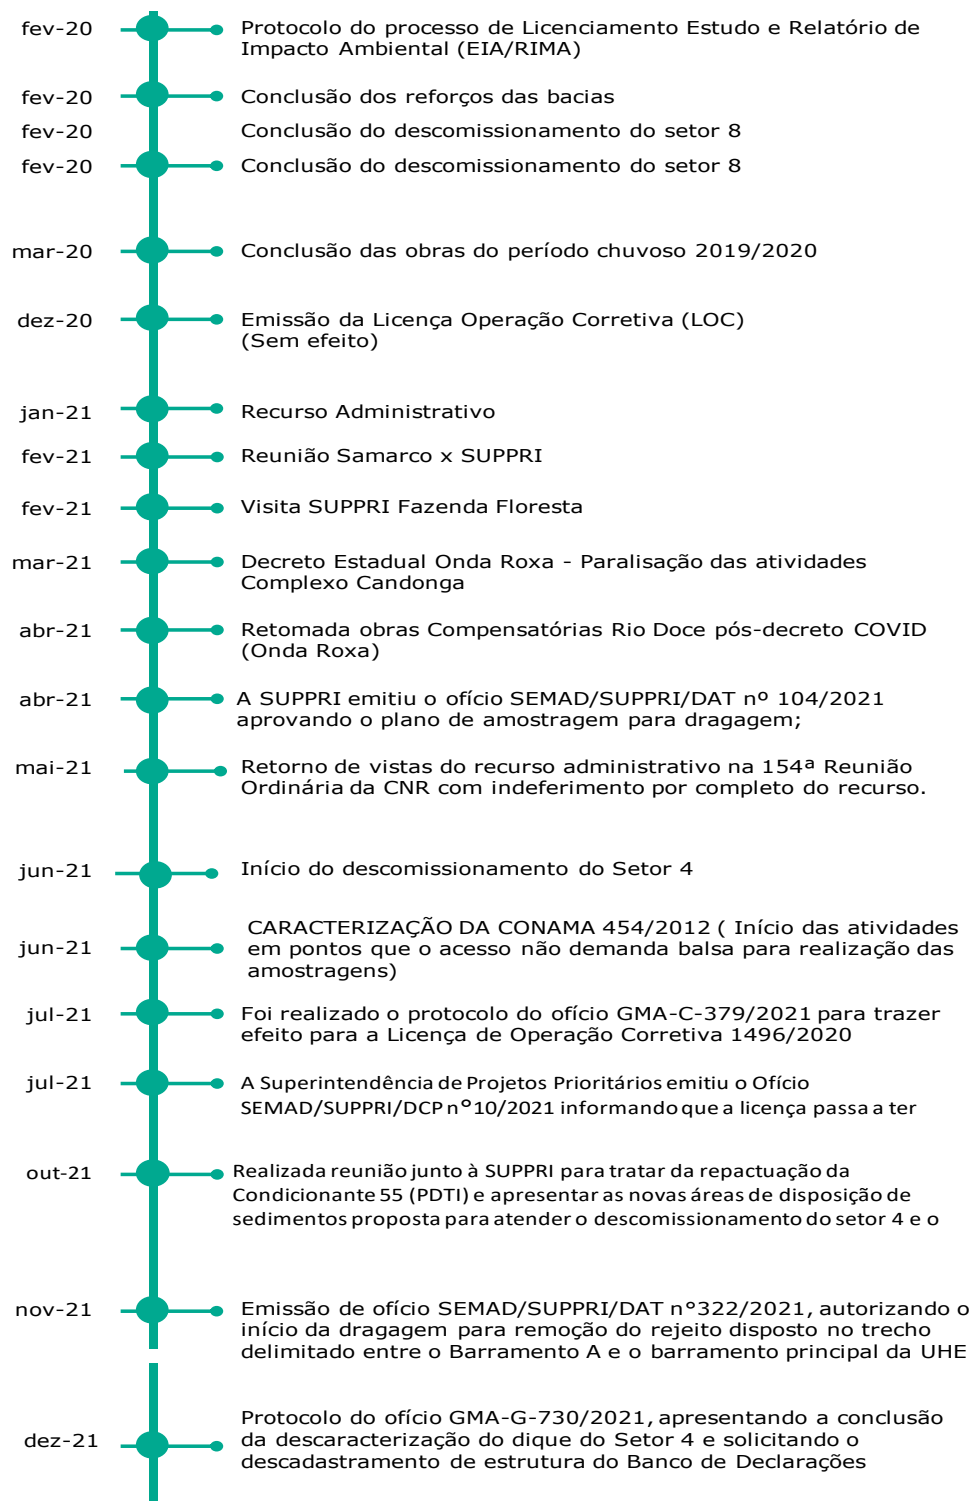

Concluído



Planejado



Reprogramado

## **Grandes números do programa**

959 mil m<sup>3</sup> de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

## FATOS RELEVANTES DO MÊS

### ➤ Descomissionamento do setor 4

- Status atual:
  - Remoção da ensecadeira auxiliar construída à montante do córrego dos Borges para a execução do descomissionamento do setor 4.



*Figura 1 -Remoção da ensecadeira à montante do córrego dos Borges*

- Regularização das ombreiras da área descomissionada



*Figura 2 - Regularização das ombreiras*

✓ Disposição de sedimentos

- Status atual:

- Remoção de sedimentos das áreas de desaguamento primário executada parcialmente, onde sua retomada está prevista para ocorrer no período seco, quando haverá condições de executar o empilhamento definitivo no setor 11.

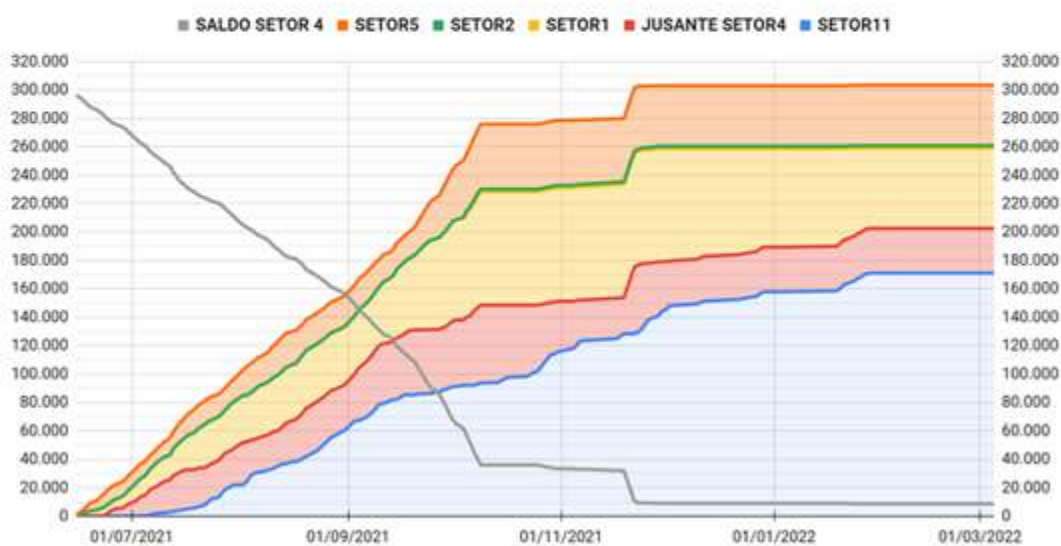


Gráfico 1 - Distribuição de massa descomissionamento setor 4

✓ Remoção de Sedimentos nas proximidades da UHE

❖ Infraestrutura para Remoção de Sedimentos

- Execução de Ponto de Apoio (Status:27/02/21)



Figura 3 - Vista aérea Ponto de Apoio

Atividades	Quantidade (unid.)			
	Total Previsto	Revisado	Realizado	Saldo
<b>Cravação de estacas</b>	124	120	120	0
<b>Instalação de tirantes</b>	70	70	70	0
<b>Baias</b>	2	3	1	2

- Status atual:
  - Concluída a execução da baía nº1;
  - Lançamento e espalhamento de pedra-de-mão.

**Nota:** O início da execução das baias nº2 e 3 sofreu impactos provenientes da elevação da cota do reservatório (pluviometria).
- Próximos passos:|
  - Execução das baias nº 02 e 03.

- Infraestrutura das bacias (setor 11) para recebimento dos sedimentos



*Figura 4 - Vista aérea das bacias*



*Figura 5 - Bacia 5 (setor 11)*

- Status atual:
  - Remoção de sedimentos da bacia 2A para a bacia 5, localizada no setor 11, para permitir o recebimento dos sedimentos (lama) a serem removidos da região próxima ao Barramento Principal da UHE.
- Próximos passos:
  - Remoção do septo que separa as bacias 2A e 2B para permitir a disposição de um maior volume de sedimentos.

❖ Remoção de Sedimentos

- Status atual:
  - Mobilização de mão de obra e equipamentos
  
- Próximos passos:
  - Continuação da mobilização de equipamentos
  - Montagem de equipamentos
  - Início da remoção de sedimentos



Figura 6 - Guindaste O Liebherr 200 t



Figura 7 - Clamshel 10m<sup>3</sup>



➤ **Recuperação dos pontos de margens**

- ✓ Execução de recuperação do ponto de margem 23
  - Processo de contratação com nova previsão de encerramento para março/22.
- ✓ Evolução na execução dos pontos de margens – total de 79
  - Pontos recuperados no período: 1 e 151.
  - Pontos em recuperação: 119, 120, 147 e 148



Figura 8 - Pontos da margem esquerda em execução



Figura 9 - Pontos da margem direita em execução

- Em termos de quantidade, o status geral se mantém conforme informado no relatório anterior.

RECUPERAÇÃO PONTOS DE MARGEM	Total Previsto	Concluído até a data	A Executar
MARGEM ESQUERDA	56 und	35 und	21und
MARGEM DIREITA	23 und	15 und	8 und
<b>TOTAL</b>			<b>29 und</b>

➤ Plano de Chuvas 2021/2022

• **Setor 1:**

- Ações concluídas até 23/02/22:
  - Abatimento de sedimentos



*Figura 10 - Abatimento Setor 1*

- Proteção de toda área de disposição de sedimentos com manta geotêxtil



*Figura 11 - Vista aérea do Setor 1*

- **Setor 4:**

- Conclusão do canal de drenagem projetado para o período chuvoso



*Figura 12- Vista Canal de drenagem à jusante do dique*




*Figura 13 - Vista Canal de drenagem à montante do dique*

## ➤ Reabilitação da UHE - Risoleta Neves

✓ Avanço por frente de serviço

Atividades	Status	Avanço Físico	Data Término
Escopo Inicial	☹️	57,45%	out/22
Canteiro	😊	100,00%	mar/20
Engenharia e Suprimentos	😊	98,00%	mar/21
Materiais de Fornecimento	😊	100,00%	abr/21
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	☹️	85,06%	dez/21
Comporta vagão Tomada d'água	☹️	67,50%	jan/22
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água	☹️	45,25%	mar/22
UG1- Atividades na Casa de Força	☹️	80,83%	nov/21
UG2- Atividades na Casa de Força	☹️	57,31%	jan/22
UG3- Atividades na Casa de Força	☹️	57,69%	mar/22
Transformador Elevador	☹️	63,00%	set/22
Vertedouro	😊	32,20%	jul/22
Comissionamento sem água	☹️	0,00%	mar/22
Comissionamento com água	☹️	0,00%	out/22
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	☹️	0,00%	set/22
Serviços Adicionais	☹️	93,67%	set/22
Projeto Consolidado	☹️	63,19%	jul/22

Reabilitação das UG's  
Avanço Físico 21/02/22



■ Executado ■ Falta executar

🟦	Executado
🟢	Em execução
☹️	Executado parcialmente
☹️	Não executado

Figura 14 - Avanço Físico Reabilitação das UG's

Atividade de Limpeza	UG#1	UG#2	UG#3	Avanço Físico	Data Término
Projeto Total	☹️			65,1%	jul/22
Limpeza das Galerias dos Stop Log	😊	😊	😊	100%	Finalizado
Desobstrução das ranhuras	😊	😊	😊	100%	Finalizado
Limpeza da pista de contato da comporta	😊	😊	😊	100%	Finalizado
Descida do Stop Log	😊	😊	😊	100%	Finalizado
Drenagem das Máquinas	😊	😊	😊	100%	Finalizado
Limpeza da Caixa espiral	😊	😊	😊	100%	Finalizado
Limpeza do tubo de sucção	😊	😊	😊	100%	Finalizado
Retirada das grades de Montante	☹️	☹️	☹️	0,0%	mai/22
Limpeza final da sucção	☹️	☹️	☹️	9,5%	mai/22
Limpeza dos drenos	☹️	☹️	☹️	0,0%	mai/22
Dragagem do Canal de fuga	☹️			0,0%	mai/22

Limpeza das UG's  
Avanço Físico 21/02/22



■ Executado ■ Falta executar

🟦	Executado
🟢	Em execução
☹️	Executado parcialmente
☹️	Não executado

Figura 15 - Avanço Físico Limpeza das UG's

Nota: Atividades de responsabilidade do Consórcio Candonga.

✓ Atividades em andamento no período:

- ✓ Reparo rotor Kaplan da UG1 e UG2 em andamento na fábrica;
- ✓ Desmontagem da UG3 para retirada da árvore Kaplan foi concluída;
- ✓ Recuperação das comportas da tomada d'água em andamento;
- ✓ Recuperação do sistema de resfriamento em fase final de solda;
- ✓ Recuperação das virolas da sucção da UG2;
- ✓ Recuperação e pintura da Caixa Espiral da UG2 foi concluída;
- ✓ Limpeza da sucção da UG1;



Figura 16 - Limpeza da Sucção

## MONITORAMENTO

### ➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

#### ✓ Destaques:

- A trinca identificada no acesso municipal acima da margem direita do Barramento C foi selada. Além disso, foram realizadas melhorias no acesso, contemplando a adequação do greide, lançamento de forro e adequação da drenagem superficial.
- Com a passagem da cheia no Rio Doce, foi identificado carreamento dos sedimentos à jusante do Barramento B. No perfil obtido com o GPR, a elevação dos sedimentos da margem direita do barramento está abaixo da referência estabelecida no projeto, a necessidade de reparo está sendo avaliada. Os sensores SAT não indicam deslocamentos significativos na estrutura do barramento.
- Os sensores SAT instalados nos Barramentos Metálicos permaneceram em níveis normais de operação, sem deslocamentos significativos registrados no período.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água seguiu apresentando elevação em quase todas as ilhas, devido às chuvas do período. Faz-se importante destacar, no entanto, que todas as leituras permanecem em níveis normais de operação.
- As leituras dos cinco marcos superficiais da ADME OD apresentaram picos de recalque após as chuvas da primeira quinzena de janeiro, com movimento direcionado para nordeste (jusante). Os dois extensômetros da estrutura não apresentaram evolução no período.

- Foi observada reabertura da trinca recentemente selada no talude da ombreira direita do contrapilhamento. O monitoramento do talude foi iniciado, suas leituras estão sendo comissionadas.
- O monitoramento do extensômetro da Bacia 5 não apresentou evolução significativa no período. Devido à estabilização, a periodicidade do monitoramento foi alterada para semanal. Está em andamento o fechamento da Bacia 5.
- Após as chuvas da primeira quinzena de janeiro, foi observado um pico de deslocamento nos marcos da Pedreira Corsini, no entanto, esse comportamento não foi refletido nas mesmas magnitudes em recalque ou direcionamento leste/oeste. Não foi observada evolução nos escorregamentos da estrutura após esse período. A área segue isolada.

✓ **Constatações:**

- Em razão da necessidade de disponibilização de área para lançamento dos sedimentos que serão removidos do reservatório, foi iniciada a retirada do septo de divisão entre as Bacias 2A e 2B.

✓ **Recomendações:**

- Verificar a integridade dos tiltmeters, bem como dos cabeamentos, assim que possível;
- Realizar testes nos sensores verticais instalados nos barramentos, de forma semelhante ao realizado nos sensores horizontais;
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

## ➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

**Nota:** Informações referentes ao período da campanha, o qual não necessariamente coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos de tratamento dos dados.

### ✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 1

- Entrada: Não houve bombeamento da Bacia 2 para a Bacia 1 no período;
- Saída: Síntese Conclusiva: Não houve efluente sendo bombeado da bacia 1 para o rio Doce no período, ponto não monitorado;
- Lançamentos de montante e de jusante: Houve bombeamento da bacia 2A e 2B para a Bacia 1 nos dias 26, 27, 28, 29, 30 e 31/01 da Bacia 2 para a Bacia 1. Sem desvios para o período.

### ✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 1:



Figura 17 - Setor 1



✓ Síntese conclusiva:

○ Montante e jusante: Sem desvios para o período

○ Em 24/01/2022 a frequência de monitoramento foi alterada novamente para diária.

✓ Monitoramento e controle: Descomissionamento Setor 4



Figura 18 – Montante Setor 4 – Entrada



Figura 19 – Jusante Setor 4 – Saída

Conforme mencionado no relatório anterior, em 09/01 o Córrego dos Borges deixou de passar pela tubulação de PEAD e passou a fluir pelo canal natural, e nesse mesmo dia o monitoramento dos pontos de efluente do Setor 4 foi suspenso uma vez que, após o descomissionamento do Setor 4, somente há necessidade de continuidade no monitoramento dos pontos de montante e jusante do Córrego dos Borges.

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5A:



Figura 20 - Setor 5A

✓ Síntese conclusiva:

- o Montante e jusante: Ponto Seco;
- o Em 24/01/2022 a frequência de monitoramento foi alterada novamente para diário.

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5B



Figura 21 - Setor 5B

✓ Síntese conclusiva:

- o Jusante: Sem desvios para o período (somente água na caixa de saída - água de chuva, não havendo água saindo na tubulação).
- o Em 24/01/2022 a frequência de monitoramento foi alterada novamente para diário.

✓ Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações finais

- o A fazenda Jerônimo não foi monitorada devido a restrição de acesso imposta pelo proprietário, a qual será justificada no relatório anual, associada ao Anexo II Item 1 da LOC de Candonga.
  - o O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA).
  - o Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que finda no Dique Micaela).
  - o Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o configura como forte indicativo de estes valores encontrados no monitoramento serem background da região
  - o Os estudos de valores de referência concluirão sobre estas hipóteses.
- ✓ Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
- o O controle semanal de monitoramento hídrico superficial no Córrego Micaela Montante apresentou no período desvios de cor verdadeira, ferro dissolvido, fósforo, manganês e turbidez associada a pluviometria.
  - o O Córrego Micaela jusante apresentou no período desvios de cor verdadeira, fósforo e manganês e turbidez associado a pluviometria.

✓ **Monitoramento Atmosférico**

- o Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ **Monitoramento Subterrâneo**



Figura 22 - Locação nascentes Pilha 1 e Pilha 2

▪ **Nascente 1 – setor 11**



Figura 23 - Nascentes 1 e 2

✓ **Conclusões / considerações finais**

- o O monitoramento em ambas nascentes (nascente 1 e nascente 2) apontou desvios de alumínio, ferro e manganês no período; Não há interfaces do empreendimento com águas subterrâneas nesses pontos onde foram

identificados os desvios, o que corrobora com a premissa técnica que estes possivelmente se configuram como background da região. Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Atividade em andamento.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal e predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 38 pontos de monitoramento dentro da ADA.

## Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

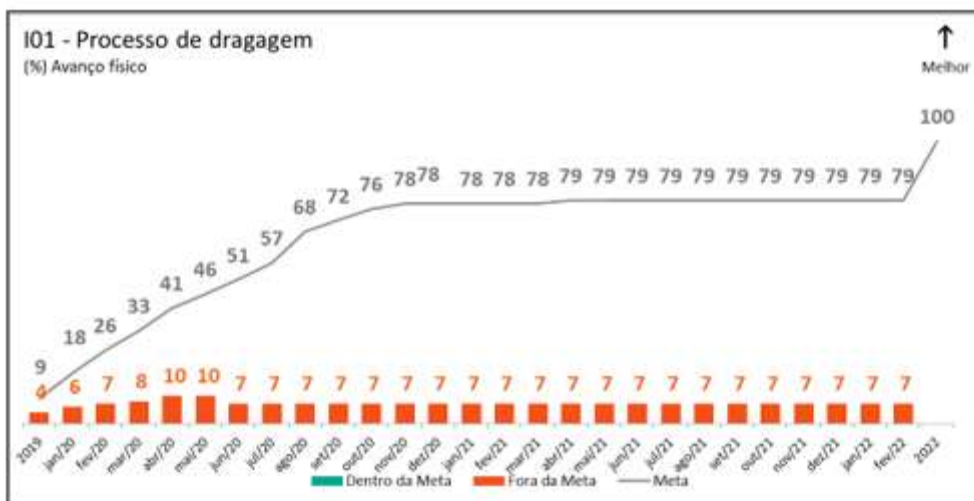


Gráfico 2 - Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

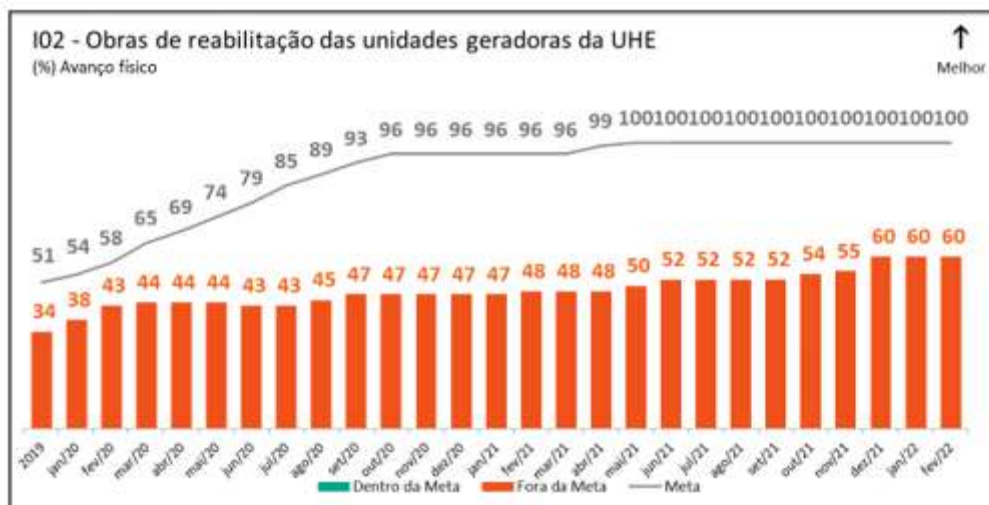


Gráfico 3 - Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

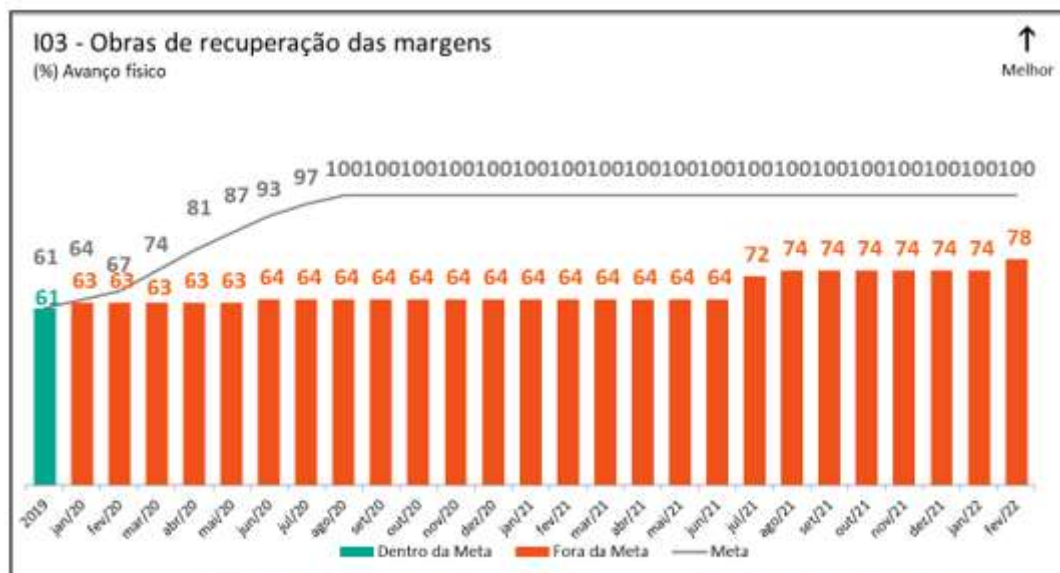


Gráfico 4 - Avanço físico das obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

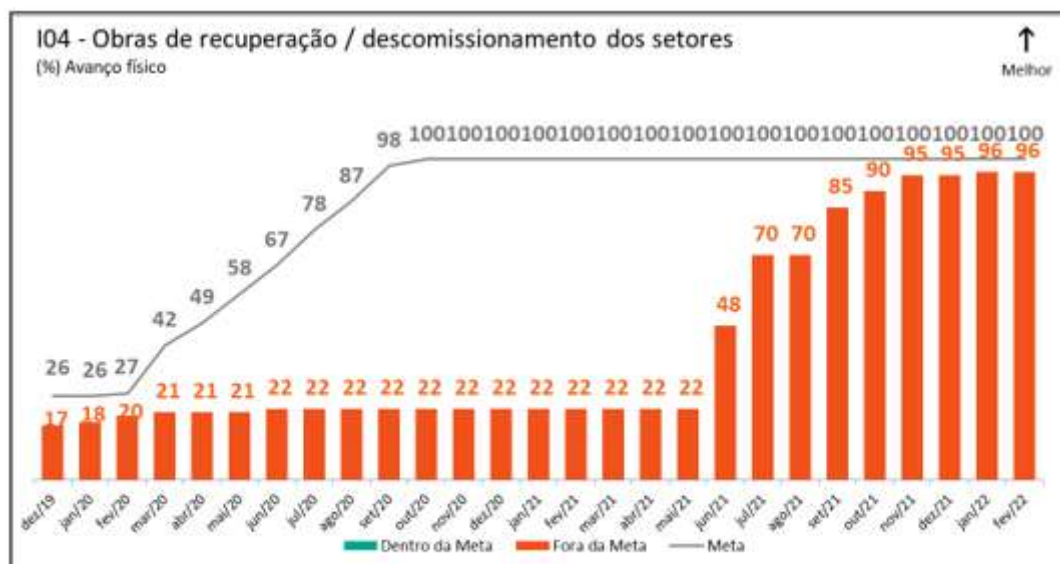


Gráfico 5 - Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento



## **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**


Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	3	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

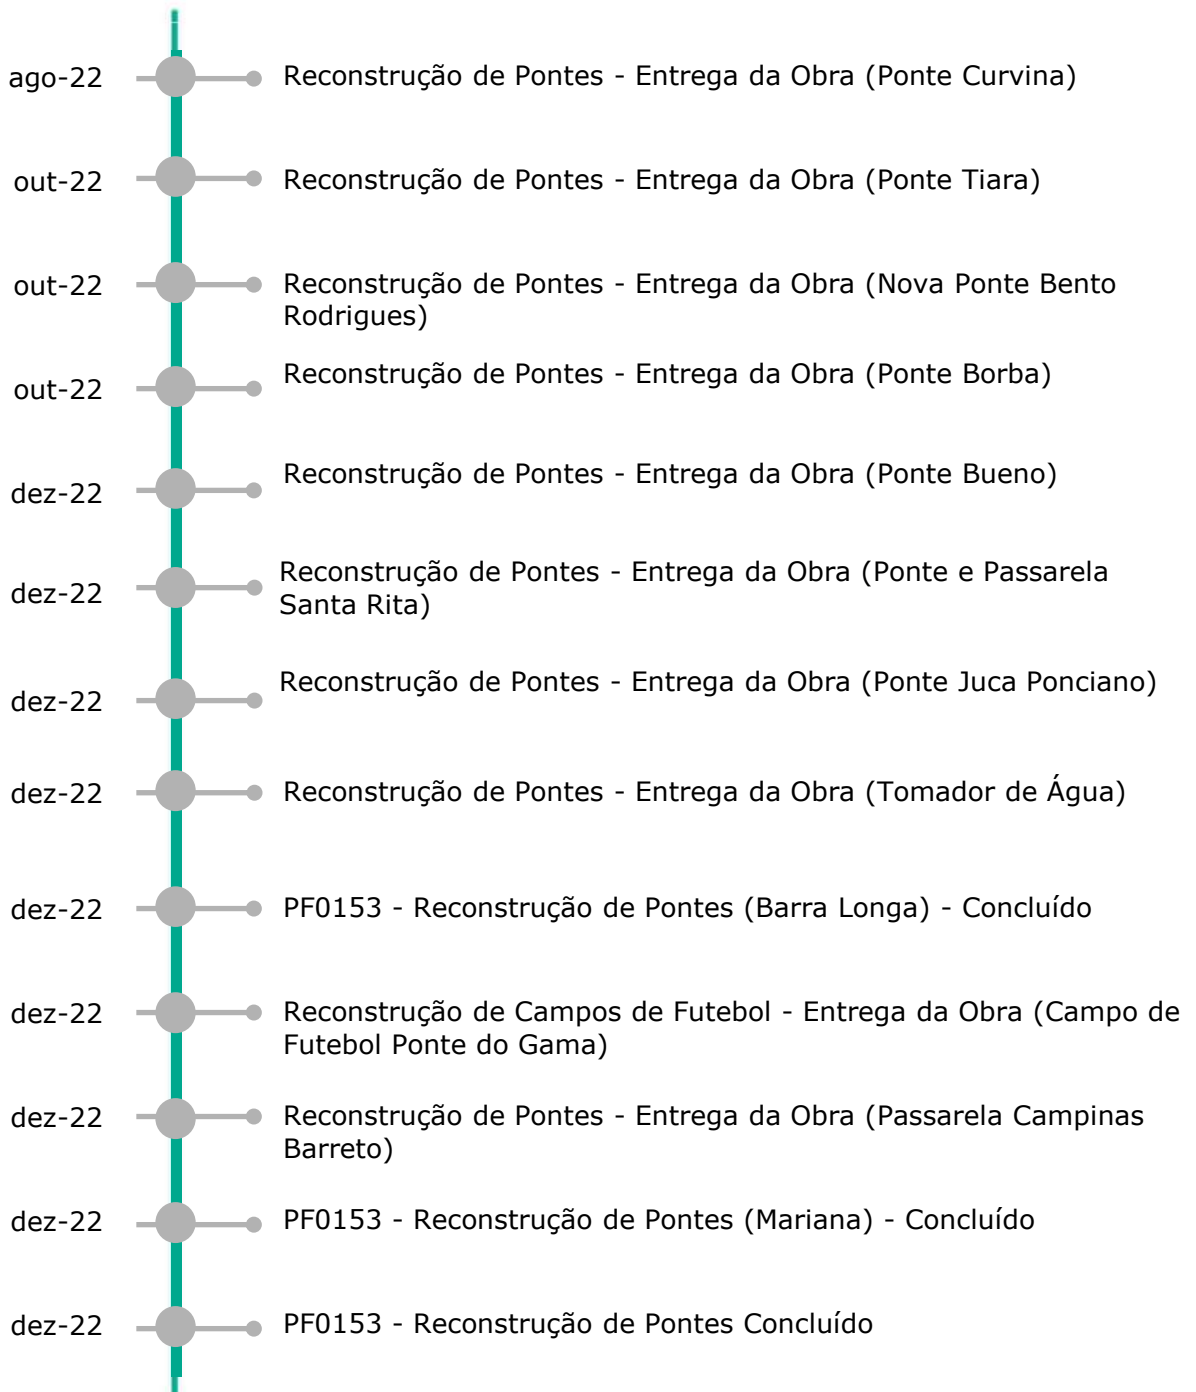

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.738 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 189 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.810 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

### **Barra Longa:**

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

### **Mariana:**

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

### **Termos de entrega para Moradias e Comércio:**

#### **Moradias Barra Longa:**

- Concluído com termo: 82
- Concluído sem termo: 7
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

#### **Comércio Barra Longa:**

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27 :

## **Fatos relevantes do mês**

Proteção de taludes estrutura rurais complexas - em fase de análise comercial

Processo de contratação para estruturas rurais complexas concluso - Em fase de validação de APRO - PCT 1

Processo de contratação para estruturas rurais complexas em fase de conclusão comercial PCT 2

Paralisação das atividades em Barra Longa conforme ofício da Prefeitura entre os dias 03/02 a 14/02/22

Formal de Partilha retirado em 23/02/22 - Em análise pela equipe do Fundiário a negociação para compra e venda do terreno.

Contrato RBAR acionado e mobilizado para finalizar 05 estruturas. Mobilização Iniciada em 17/01/2022

Conclusão do aterro do acesso ao Parque de Exposição em Barra Longa.

Bens Públicos Ponte do Gama - Em fase de validação de APRO

## Indicadores

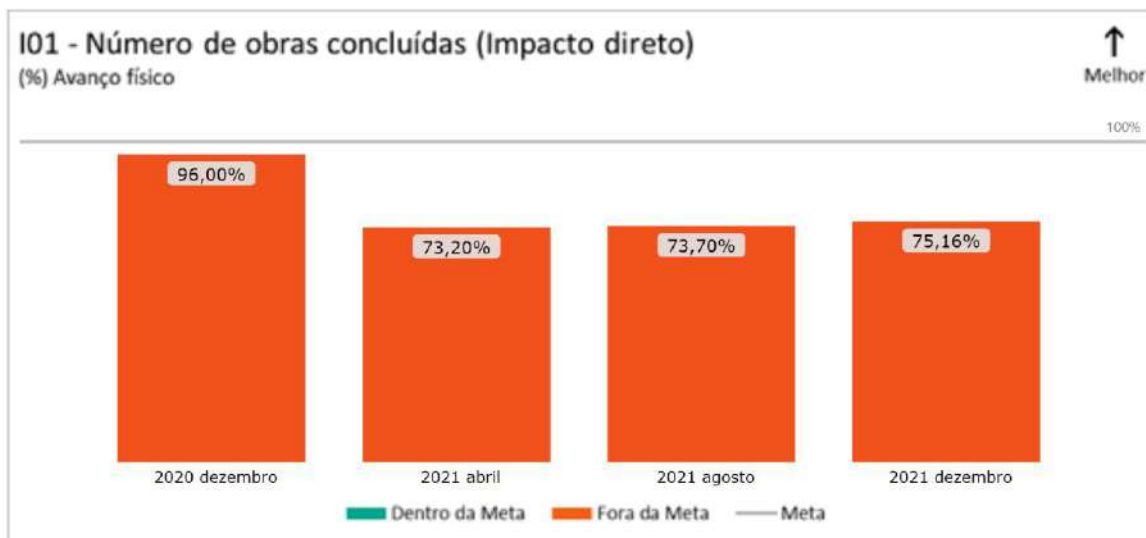


Gráfico 1 - Número de obras concluídas (Impacto direto). Gráfico Acumulado

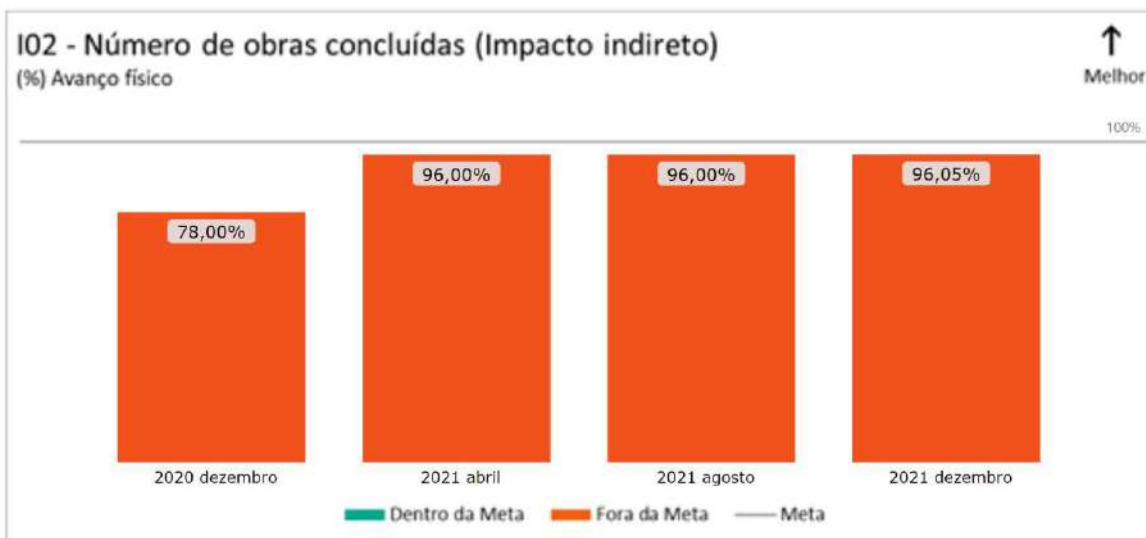


Gráfico 2 - Número de obras concluídas (Impacto indireto). Gráfico Acumulado



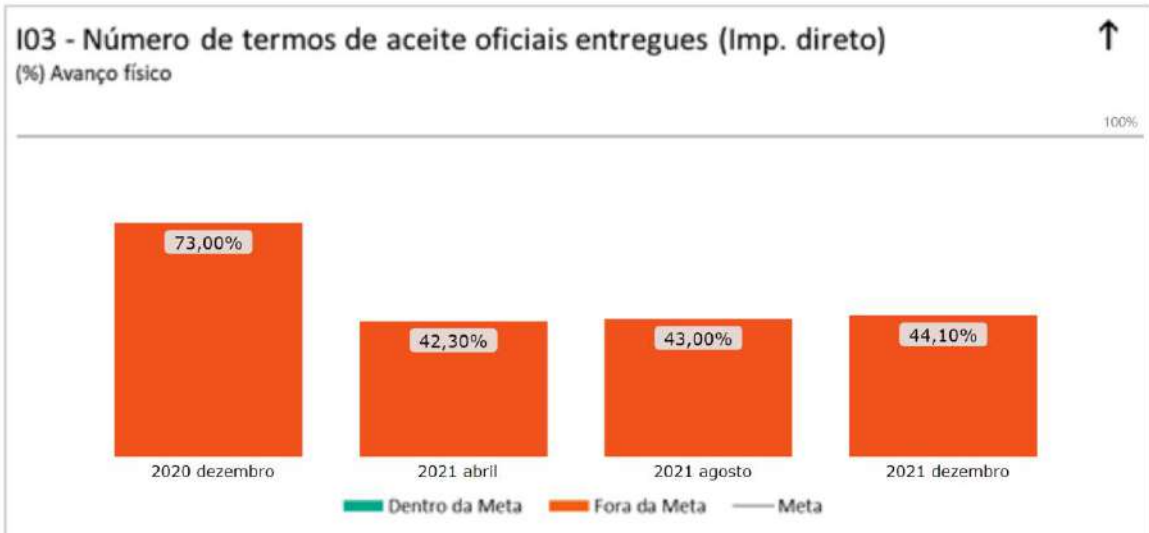


Gráfico 3 - Número de termos de aceite entregues (Impacto direto). Gráfico Acumulado

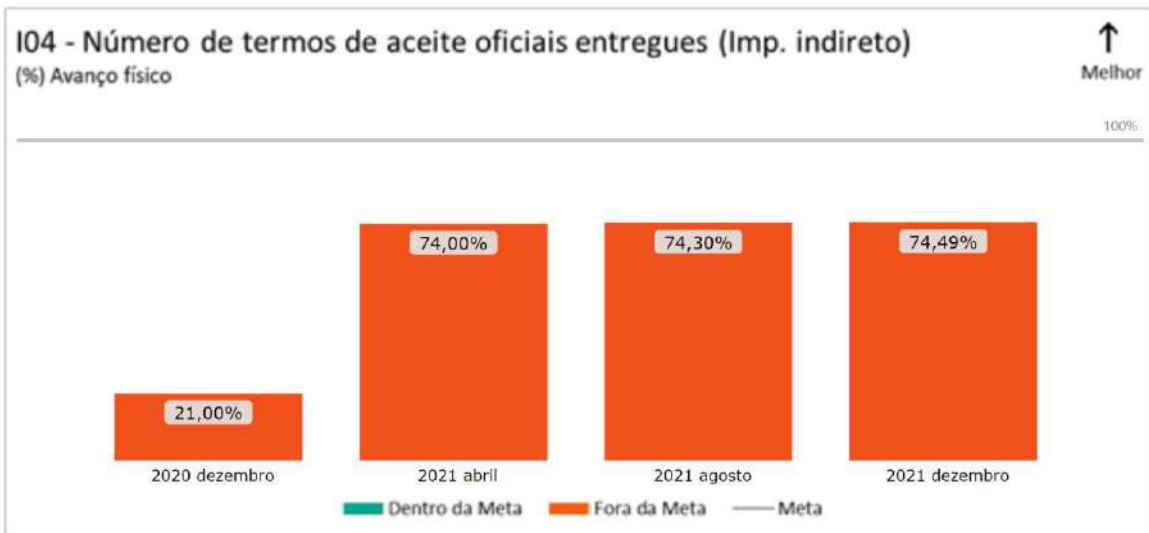


Gráfico 4 - Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto). Gráfico Acumulado

## **PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

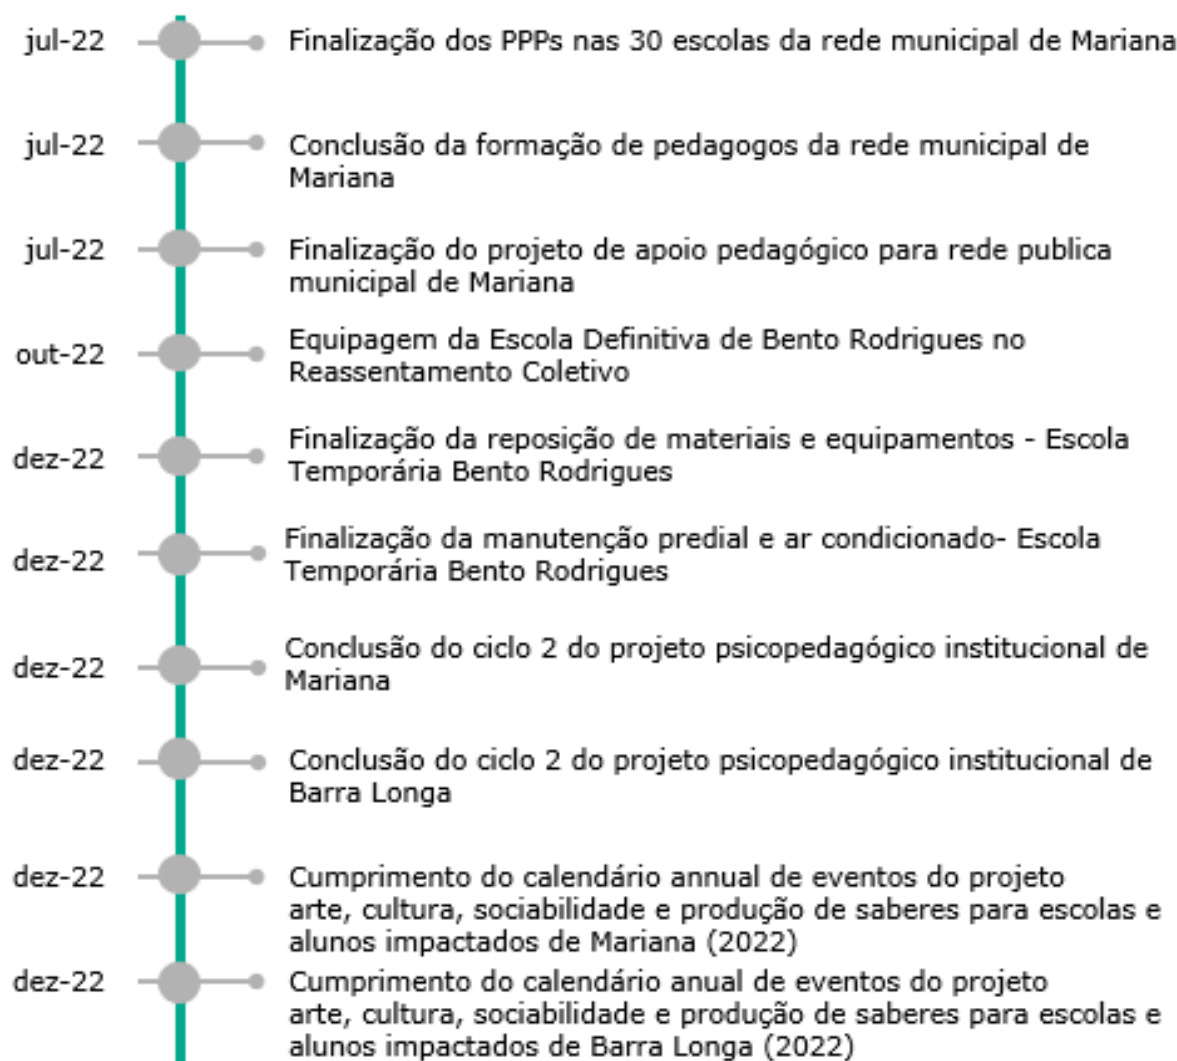

● Concluído    
 ● Planejado    
 ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Entrega da plataforma de acessibilidade na escola temporária municipal de Paracatu de Baixo.

Serviços de pequenos reparos e melhorias nas escolas municipais de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

## Indicadores

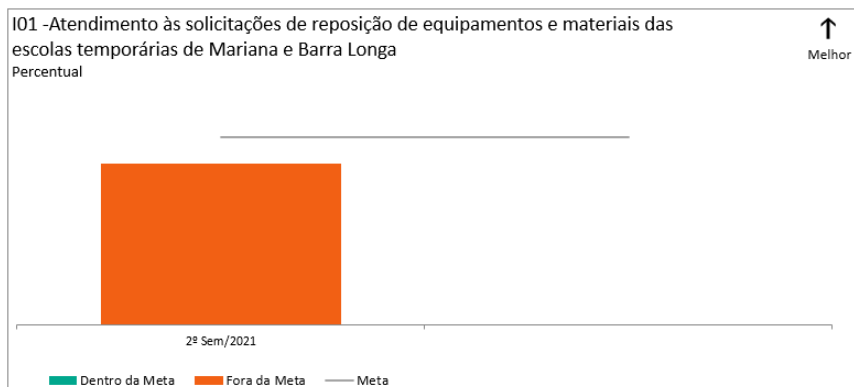


Gráfico 1. 21 Demandas; 18 atendimentos. Indicador frequência semestral.

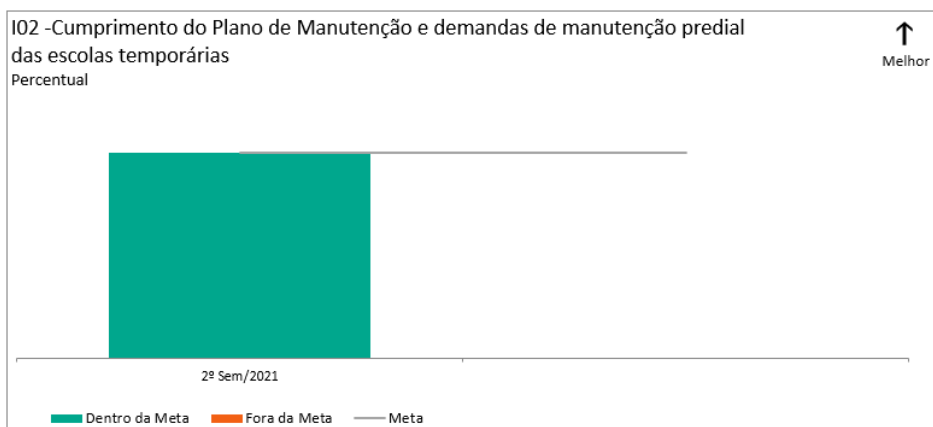


Gráfico 2. 21 Demandas; 21 atendimentos. Indicador frequência semestral.

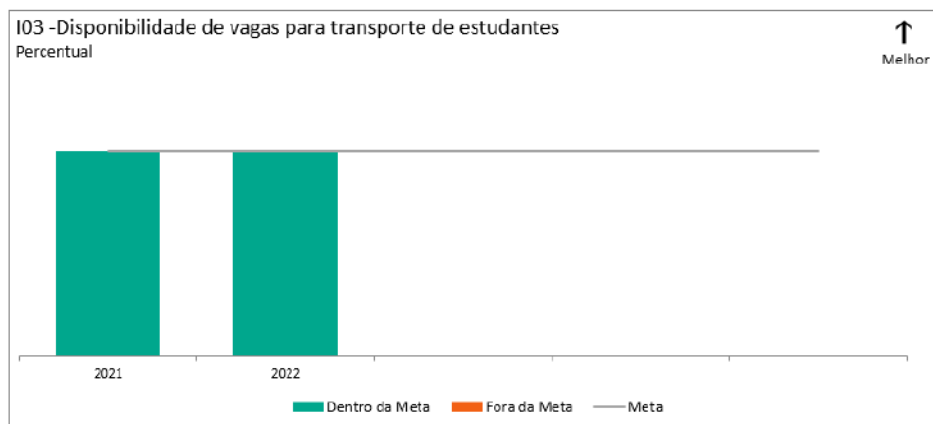


Gráfico 3. Indicador frequência por ano letivo.

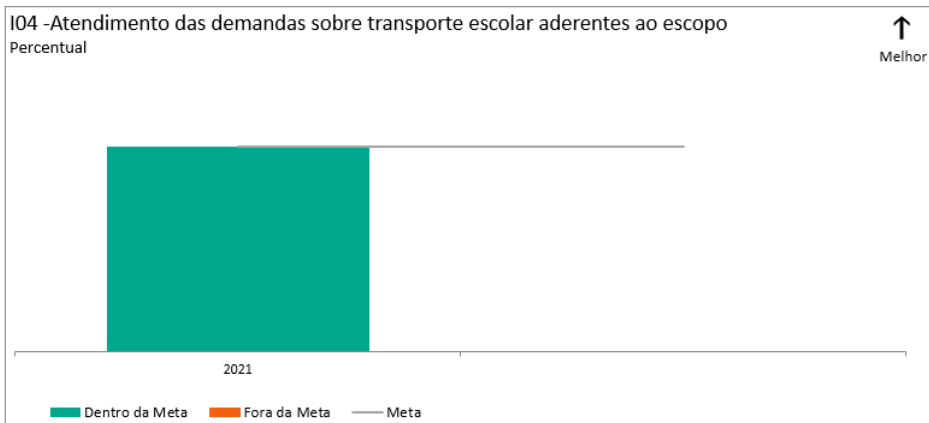


Gráfico 4. 06 Demandas; 06 atendimentos. Indicador frequência por ano letivo.



Gráfico 5. 07 Demandas; 07 atendimentos. Indicador frequência semestral.




Gráfico 6. 22 demandas; 09 recusados; 13 atendidos. Indicador frequência anual.



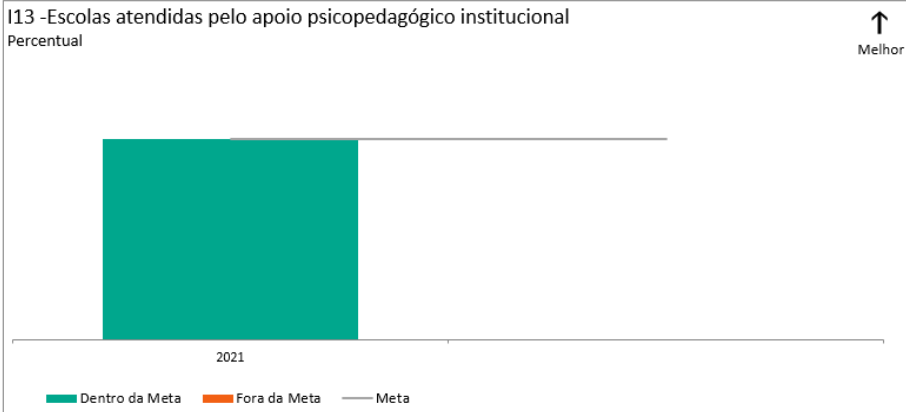


Gráfico 7. 06 ofertas; 04 adesões; 02 não adesões. Indicador frequência anual.

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Em Andamento
Cláusula	97	caput	Em Andamento
Cláusula	98	a	Em Andamento
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	3	Planejado

## Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2022 Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
- dezembro de 2022 Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica
- dezembro de 2022 Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
- dezembro de 2022 Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingida
- dezembro de 2022 Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades<sup>1</sup>

Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Protocolo na CT-ECLET da versão final do Diagnóstico de Referências Culturais (e de suas devolutivas às comunidades) e do Plano de Reparação do Programa 12, avançando na conclusão da cláusula 96 e concluindo a obrigação prevista na cláusula 97 do TTAC.

Restauro de 10 peças na Reserva Técnica, atingindo 33% da obrigação total (que se encerra em outubro de 2024) e avançando em 20% da meta para o ano de 2022.

## **Indicadores**

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

O detalhamento dos indicadores, com a ficha daqueles consensuados, está em processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.

## **PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Concluído Internamente
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- agosto de 2022 ● Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
- setembro de 2022 ● Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo
- dezembro de 2022 ● Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas
- dezembro de 2022 ● Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
- dezembro de 2022 ● Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
- dezembro de 2022 ● Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Realização do InovaFol: rodadas de negócios entre representantes das 169 organizações sociais participantes do Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais e quatro grandes empresas apoiadoras (Arcelor Mittal, Itaú Social, Instituto Usiminas e BTG Pactual), visando a sustentabilidade das organizações após o término do Projeto. Encerramento da 1ª edição do Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais.

Realização de mentoria com condutores e receptivos turísticos na Foz, como ação integrante do Plano de Desenvolvimento Integrado da Foz e Região costeira Adjacente – PDI (judicializado no Eixo 8).




Gráfico 1: Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município. Frequência Anual.

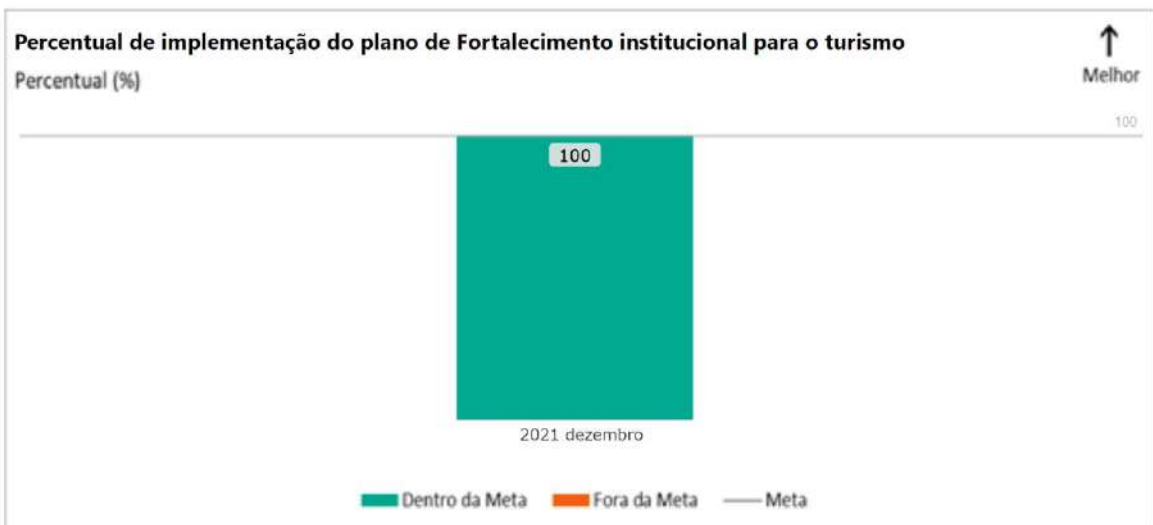


Gráfico 2: Percentual de implementação do plano de Fortalecimento institucional para o turismo. Frequência Anual.




Gráfico 5: Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados. Frequência Anual.

**Nota:** O indicador *Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce* não será reportado com medição parcial no relatório CIF esse mês, pois terá a frequência de medição realizada por edição e apresentada após o encerramento de cada uma.

## **PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Judicializado
Deliberação	435	1	Judicializado
Deliberação	436	1	Judicializado
Deliberação	452	2	Judicializado
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializado
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado



Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	73	1	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

- março de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
- junho de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
- agosto de 2022 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
- setembro de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 7º Repasse financeiro para contratação de RH e Conclusão dos repasses financeiros de RH para o município de Barra Longa
- outubro de 2022 ● Finalização das Área temáticas de capacitação dos profissionais do SUS
- dezembro de 2022 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa\*

- 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG ( 34 **profissionais**) e Barra Longa/MG ( 14 **profissionais**).

\* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

## Fatos relevantes do mês

### Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

No Relatório Semestral, referente ao período de abril a setembro/21, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 3.629 consultas (média de 604 por mês) e 1.194 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para teste Covid-19, entre outros (média de 199 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

Quanto ao atendimento em saúde mental, realizado tanto no CAS quanto na ESF, no Relatório Semestral referente ao período de outubro/20 a março/21, foram reportados em média 150 consultas mensais realizadas pelo médico psiquiatra e média de 94 atendimentos mensais pela profissional psicóloga. Nos autos da ACP, foi reportado que no período de abril a setembro/21, houve, em média, 97 consultas psiquiátricas por mês. No relatório mais recente, a Secretaria de Saúde continuou o relato do importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

## Fatos relevantes do mês

### Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos, com os respectivos cartões-combustível para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão.

## **PG015 Promoção da Inovação**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

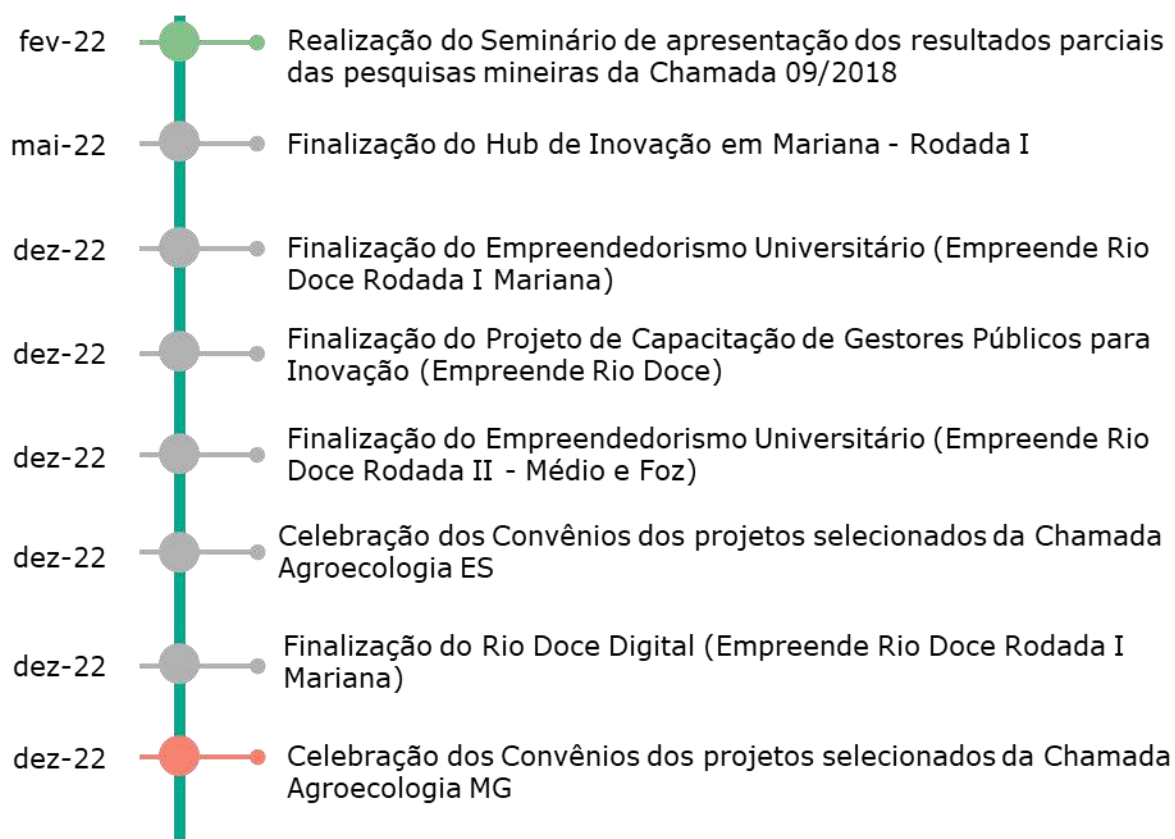

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das 12 pesquisas mineiras da Chamada 09/2018 nos dias 09 e 10/02

## Indicadores



Gráfico 1 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.

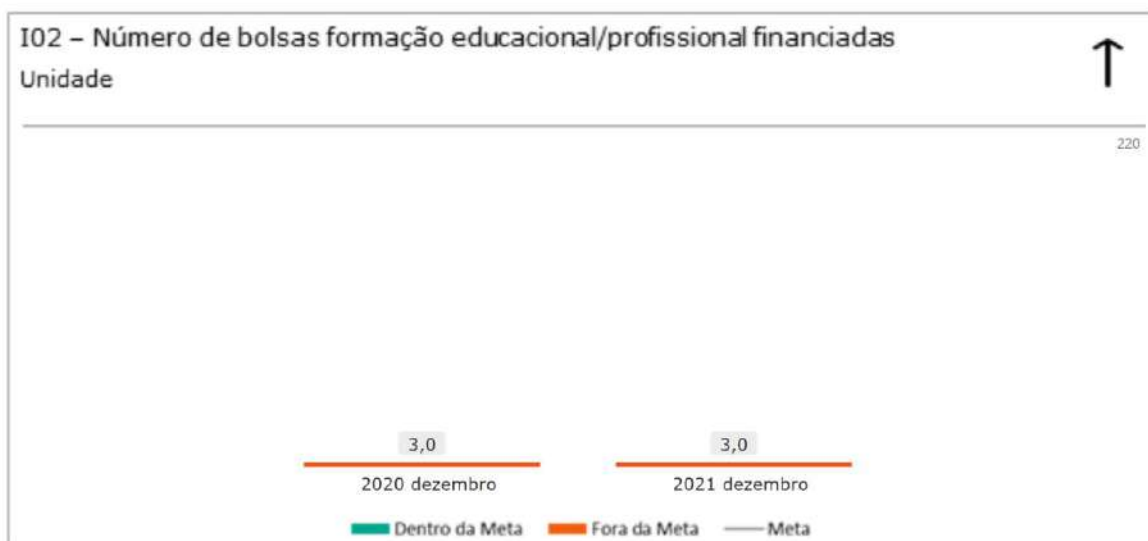


Gráfico 2 - Número de bolsas formação educacional/profissional financiadas. Gráfico Acumulado. Frequência Anual.



Gráfico 3 - Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas. Gráfico Acumulado. Frequência Bianaual.

**Nota:** “O Indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02, e I03 são finalísticas e vinculadas ao encerramento do Programa em janeiro/2026. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento da evolução do programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas”.

## **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**


### **Eixo Pessoas e comunidade**

#### **Objetivo**

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

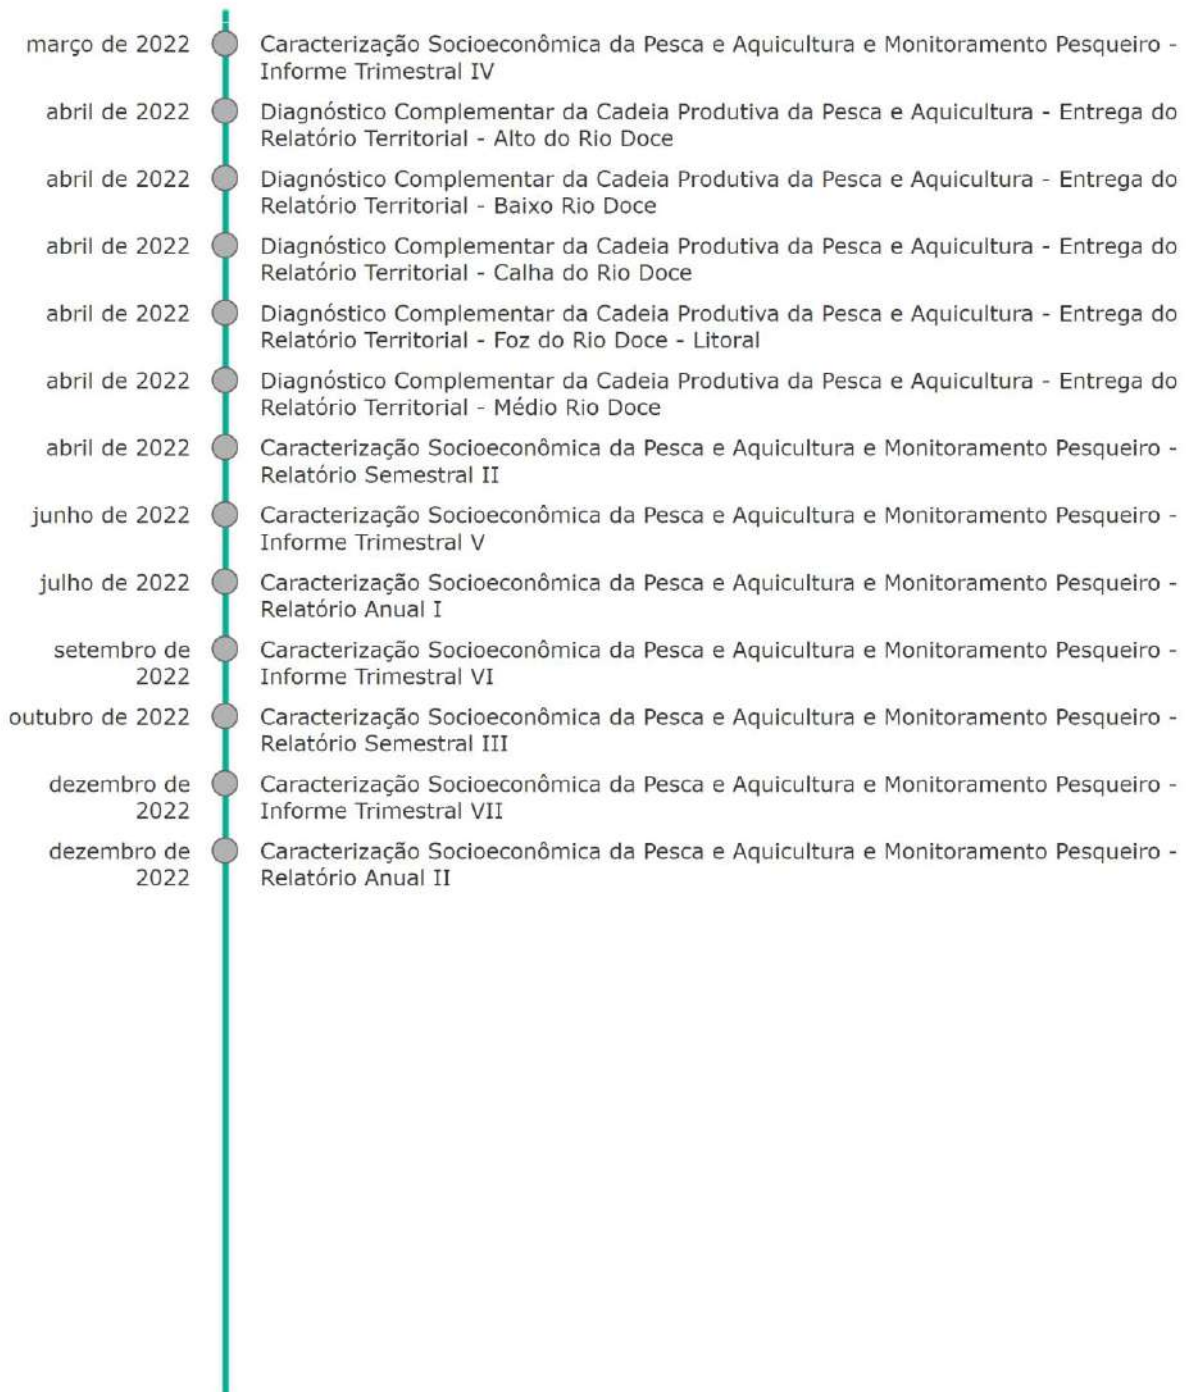

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

### **Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:**

- **Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades:**
  - 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
  - 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.
- **Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro:**
  - 6.900 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
  - 3 Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES;
  - 1 Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

### **Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:**

- **Projeto Cultivando para Pescar:**
  - 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 162 pessoas beneficiadas;
  - 7 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
  - 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
  - 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

## Grandes números do programa

- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
  - 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
  - 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
  - 4 associações beneficiadas:
    - 30 ASPERDOCE (Rio Doce)
    - 77 ASPIPEC (Pedra Corrida)
    - 38 APIGUA (Guaxe)
    - 52 APAP (Povoação);
    - 2 associações formalizadas em MG (APIPEC e ASPERDOCE);
  - 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
  - 4 Planos de negócio entregues.
  
- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado:
  - 3090 Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais.

## **Fatos relevantes do mês**

Conclusão de 5 books municipais (Alpercata, Colatina, Marilândia, Fundão e Serra) do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca.

Conclusão das atividades de campo do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura, com participação de 405 pessoas nos DRPs, sendo:

240 - Foz do Rio Doce

68 - Baixo Rio Doce

62 - Médio Rio Doce

35 - Calha do Rio Doce

Conclusão da montagem do sistema de piscicultura e início dos testes na comunidade de Areal do Projeto Cultivando para Pescar.

## Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os pescadores e aquicultores em atividades alternativas nos projetos Cultivando para Pescar, Associativismo e Cooperativismo e, de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e, de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela Fundação Renova.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

## **PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**



Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado
Cláusula	74	c	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022  Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
- dezembro de 2022  Término dos contratos de aluguel de pastagem

 Concluído       Planejado       Reprogramado



## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 192 são do PASEA planejados sendo que 192 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 5 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 161 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 31 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.962,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 13.107,4 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 135 propriedades;
- 459 barraginhas realizadas;
- 900 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.178 hectares de reestruturação produtiva executados.

- Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

### **Médio Rio Doce**

- 5.436 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 9.260 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 46.293 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.881 toneladas no mês.

## **Baixo Rio Doce**

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 5.066 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 216 toneladas no mês.

## Parcerias

- 33 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 20 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

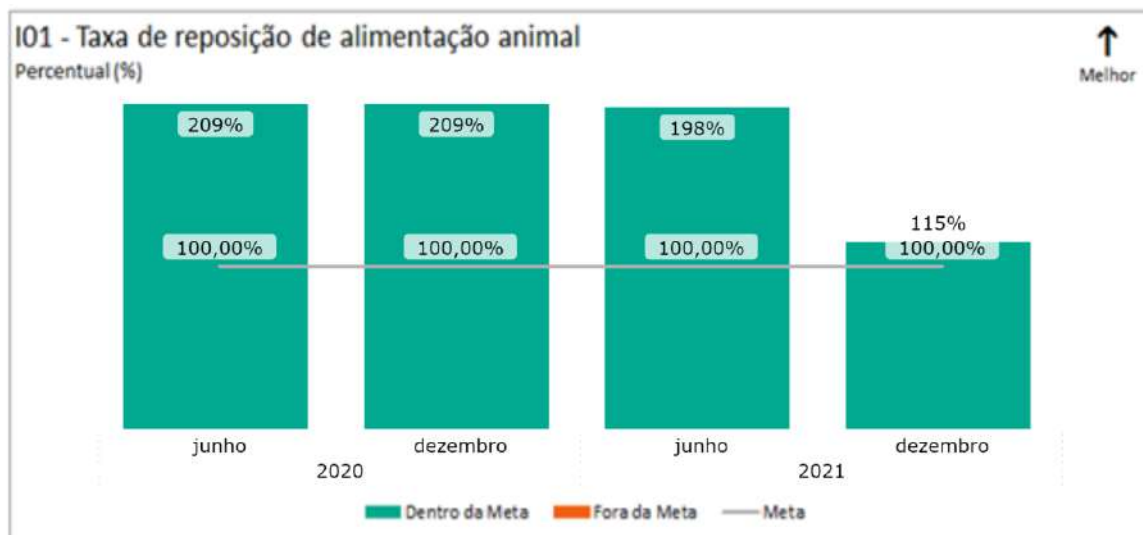


Gráfico 1. Taxa de reposição de alimentação animal. Gráfico Semestral.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
12	Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas à montante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de produtores com ISA maior ou igual a } 0,7 / \text{n}^\circ \text{ de produtores participantes do Programa}$	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	$\text{N}^\circ \text{ de áreas produtivas reparadas e ou adequadas} / \text{Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação}$	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	$(\text{Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas}) / (\text{Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação})$	%

## **PG018    Desenvolvimento    e    Diversificação Econômica**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente
Deliberação	503	3	Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

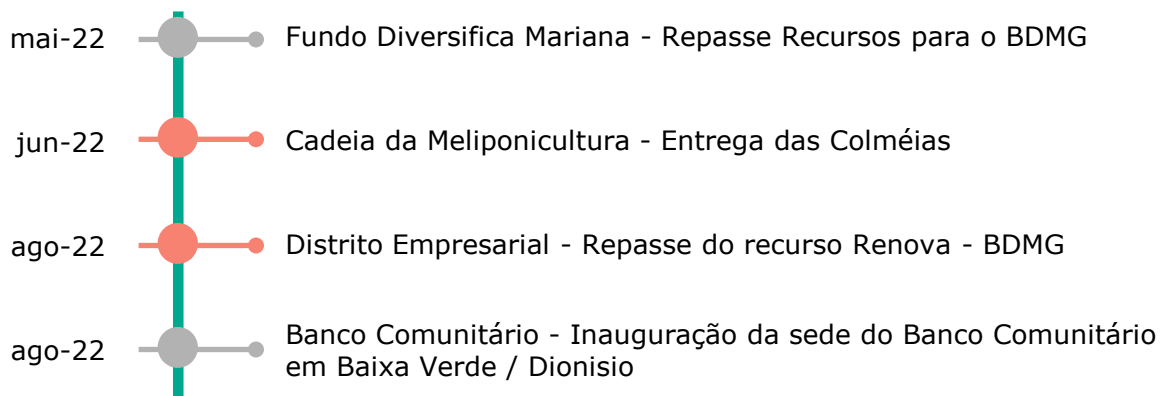

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do programa

### Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 61,49 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 50 milhões foram **desembolsados** para 1523 contratos e 1170 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 434 contratos e 408 empresas.

### Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

### Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

*Ref. Janeiro/2022*

## **Fatos relevantes do mês**

Deliberação do Projeto Cadeias Produtivas - Cadeia do Cacau pelo CIF

## Indicadores

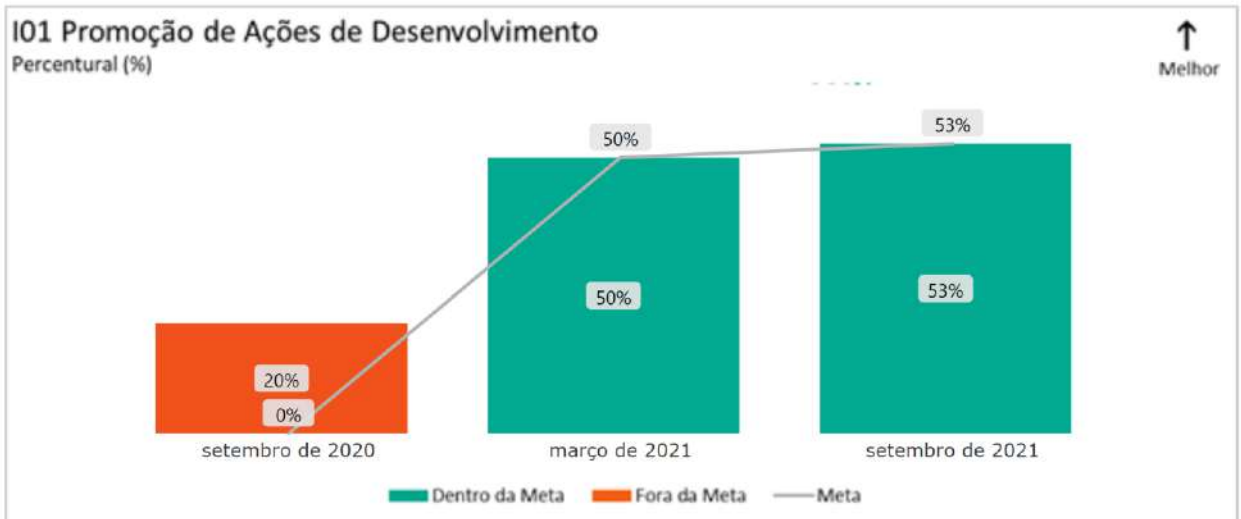


Gráfico 1. Percentual de ofertas, de pelo menos uma ação do escopo do programa, conforme a cláusula 130 do TTAC em 100% dos municípios atingidos. Frequência Semestral. Gráfico Acumulado.

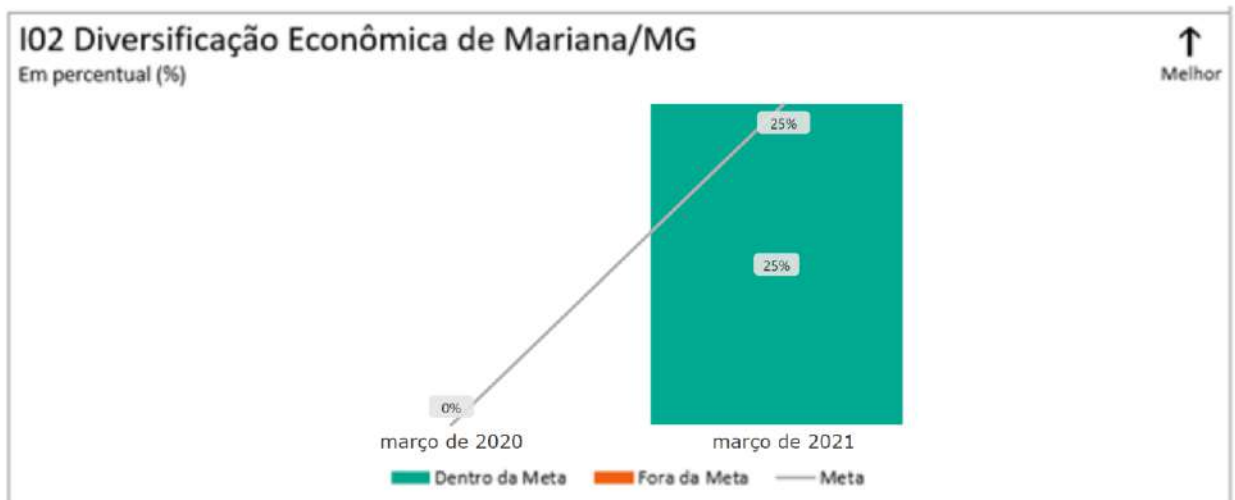


Gráfico 2. Percentual de entregas de quatro projetos do eixo de Atração de Investimentos do programa (Mariana) aprovados nas instâncias de governança. Frequência Anual. Gráfico Acumulado

## **PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

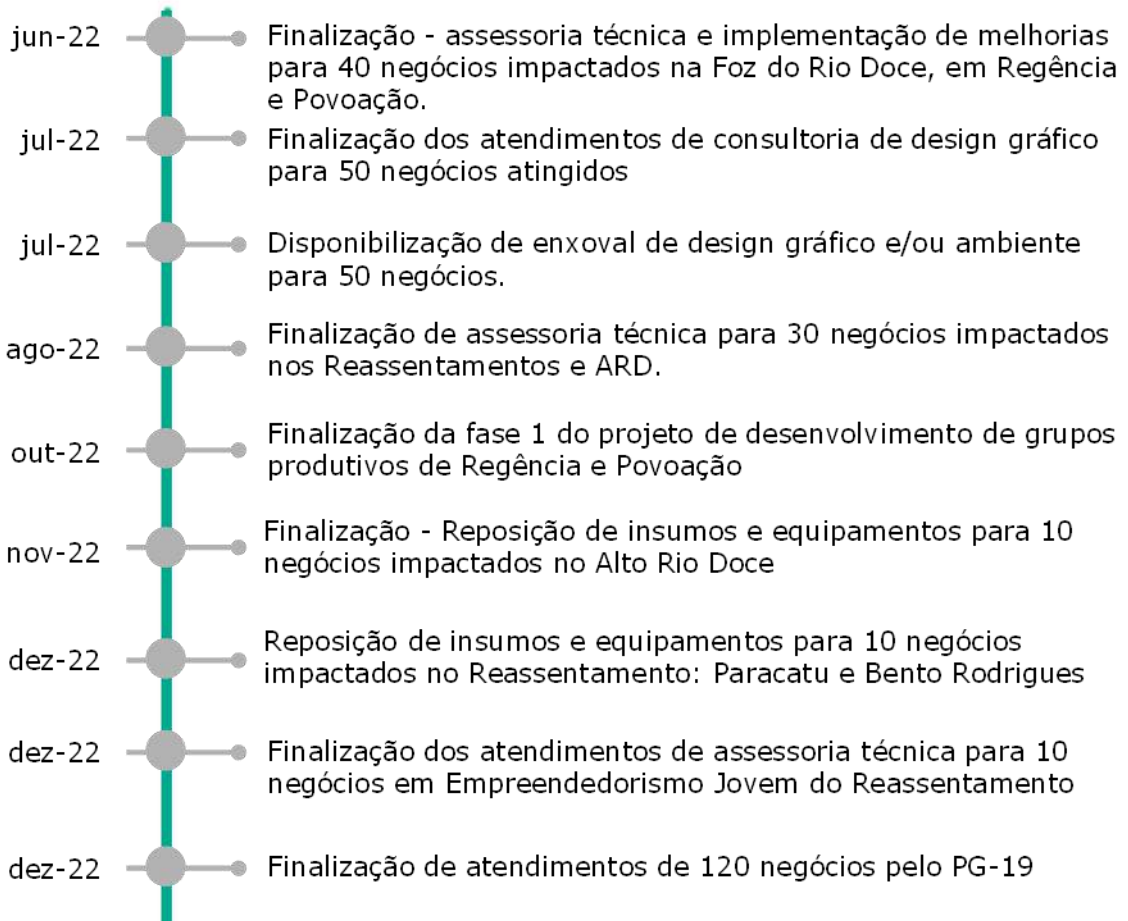

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado



## Grandes números do programa

386 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 564 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 16 a quantidade de **aluguéis**, 191 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 5 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo ( 776 ) ultrapassa a quantidade total de atendidos ( 386 ). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores



Gráfico 1. % de negócios impactados com condições de produção recuperadas. Frequência semestral.



Gráfico 2: % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada. Frequência semestral.

## Indicadores



Gráfico 3. % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado. Frequência semestral.

<sup>1</sup> O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

<sup>2</sup> O indicador aparece como fora da meta pois as metas apresentadas para I01, I02 e I03 estão vinculadas ao encerramento do Programa. Assim, as medições são realizadas conforme frequência estabelecida para acompanhamento de evolução do Programa de modo a permitir o alcance das metas finalísticas.

## **PG020 Estímulo à Contratação Local**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- maio de 2022 ● Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana (marco CIF-Planejamento 2022)
- outubro de 2022 ● Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF-Planejamento 2022)
- novembro de 2022 ● Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF-Planejamento 2022)

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertados pela Fundação Renova, 7.335 **peçoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.208 **reprovados** e 2.617 **evadidos**.
- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 134 **turmas**, **abertas** 3.671 **vagas**, 3.223 **peçoas matriculadas**, 1.816 **concluintes**, 304 **reprovados** e 1.086 **evadidos**.
- **R\$ 2.047.519** de **Geração de Renda** para os atingidxs, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.



## Fatos relevantes do mês

Realizada a contratação de 201 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 127 contratações locais e 73 contratações não locais. Dessas 201 contratações, 167 profissionais são de Minas Gerais, 1 do Espírito Santo e 33 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 172 currículos e prospectadas 262 vagas de emprego no mês. No acumulado, 3.474 currículos estão cadastrados e 2.745 vagas já foram captadas.

Foram realizados, nos dias 22 e 23 de fevereiro, dois workshops de "preparação para o Mercado de trabalho", um em Rio Doce e um em Sem Peixe. 50 vagas foram ofertadas e 21 pessoas participaram das capacitações, 12 em Rio Doce e 9 em Sem Peixe.

Iniciou em nove de fevereiro, com previsão de término em dezesseis de maio, o curso de Padeiro em parceria com o SENAI, na comunidade de Degredo | ES. Serão abordados ao longo do curso, temas como: boas práticas de higiene, metrologia da panificação, tecnologia de panificação, dentre outros. Foram ofertadas 20 vagas e tivemos 21 alunos matriculados.

No dia 1º de fevereiro, teve início o curso de Assistente Administrativo para a comunidade de Degredo | ES. Foram ofertadas 25 vagas, todas preenchidas.

Iniciou em nove de fevereiro, o acompanhamento para formação empreendedora, realizado pela aceleradora FA.VELA, para os empreendedores da Fábrica de Biscoitos de Degredo | ES. O acompanhamento tem como objetivo capacitar os participantes com técnicas e procedimentos que aprimorem a atuação no cenário de trabalho em que eles atuam.

Realizada em ambiente online, no dia oito de fevereiro, a 1ª Palestra do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores | PDF, da 2ª turma do Espírito Santo, com o tema: "O IMPACTO DA QUALIDADE NA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES".

## Indicadores

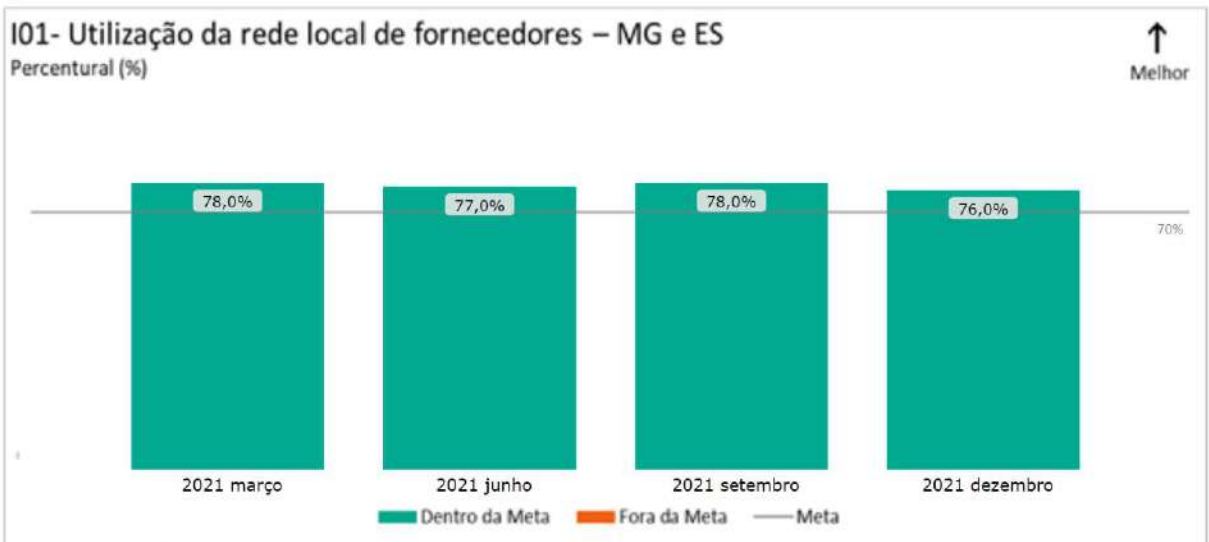


Gráfico 1. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Frequência Trimestral.

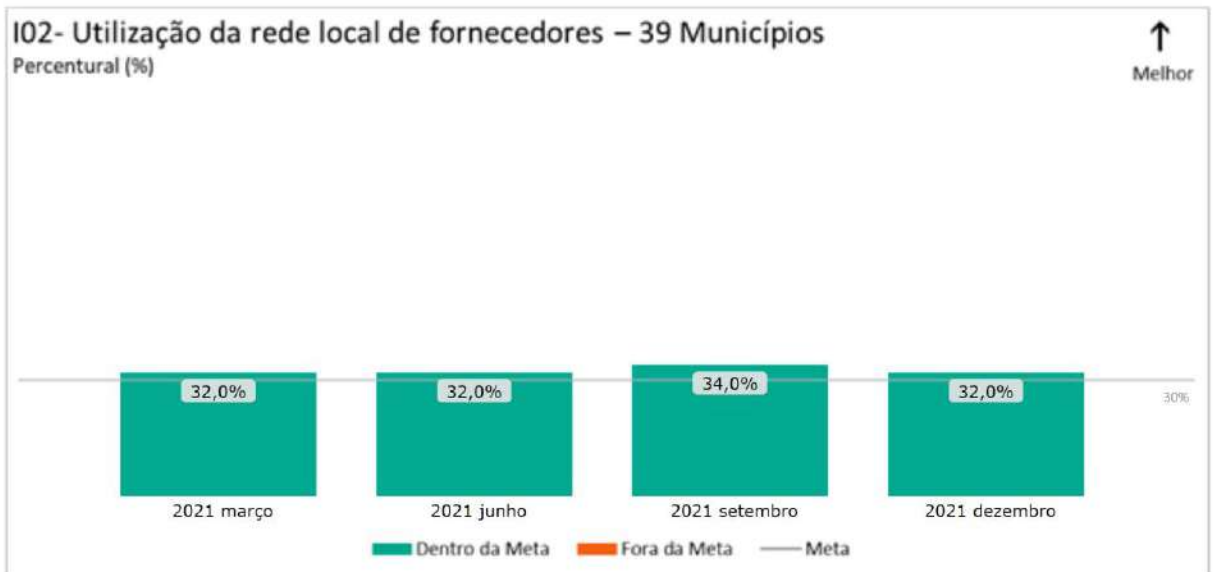


Gráfico 2. Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios. Frequência Trimestral.

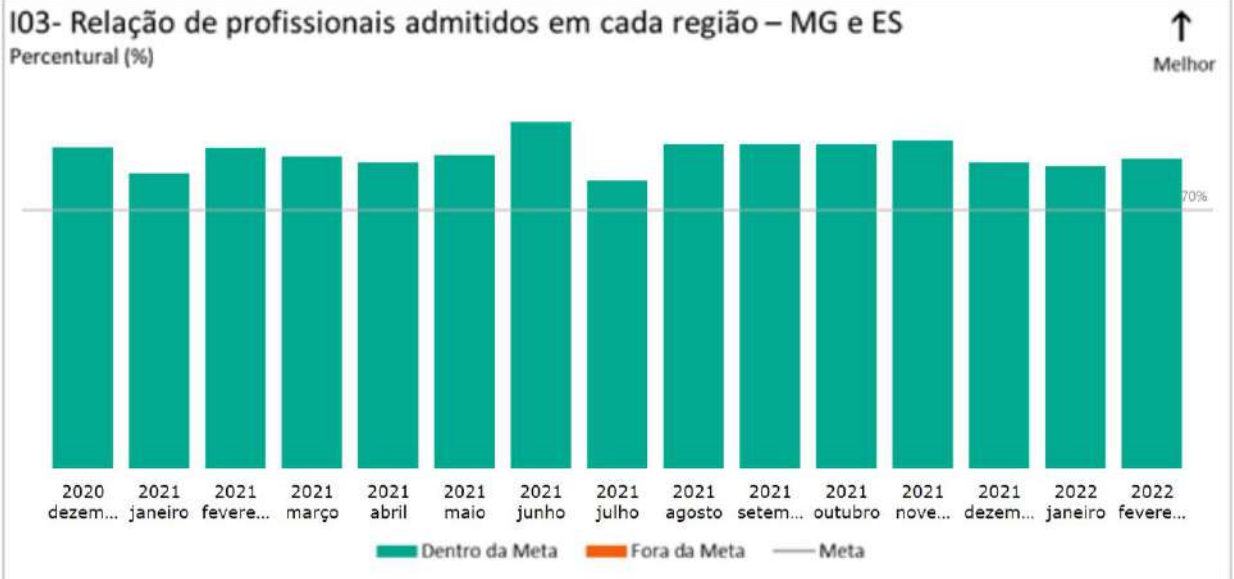


Gráfico 3. Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

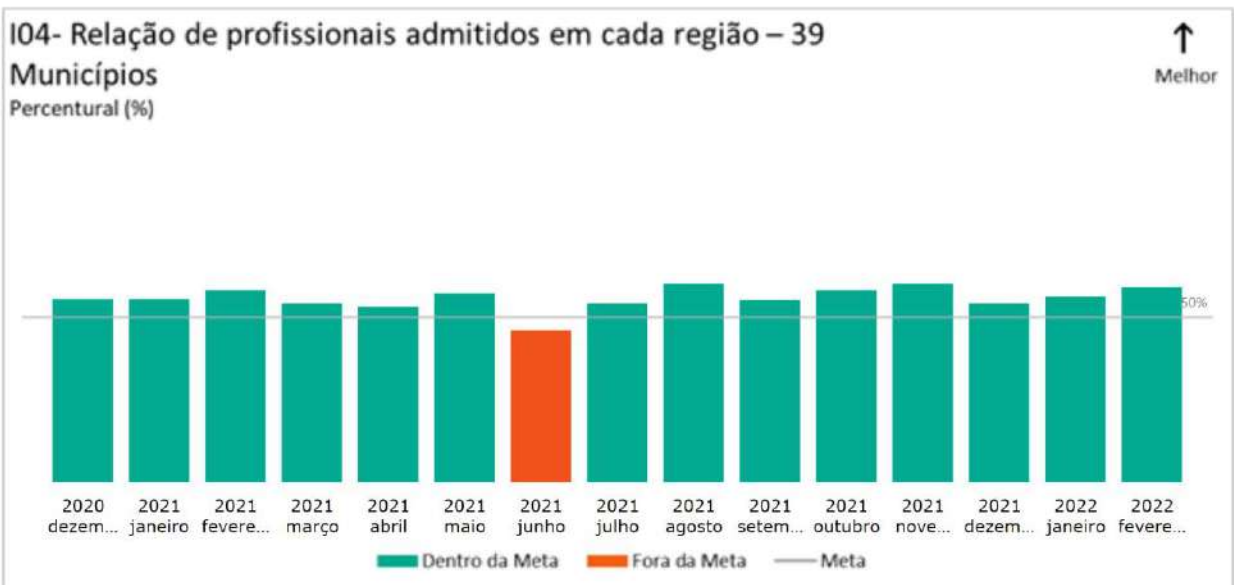


Gráfico 4. Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios. Gráfico Acumulado. Frequência Mensal.

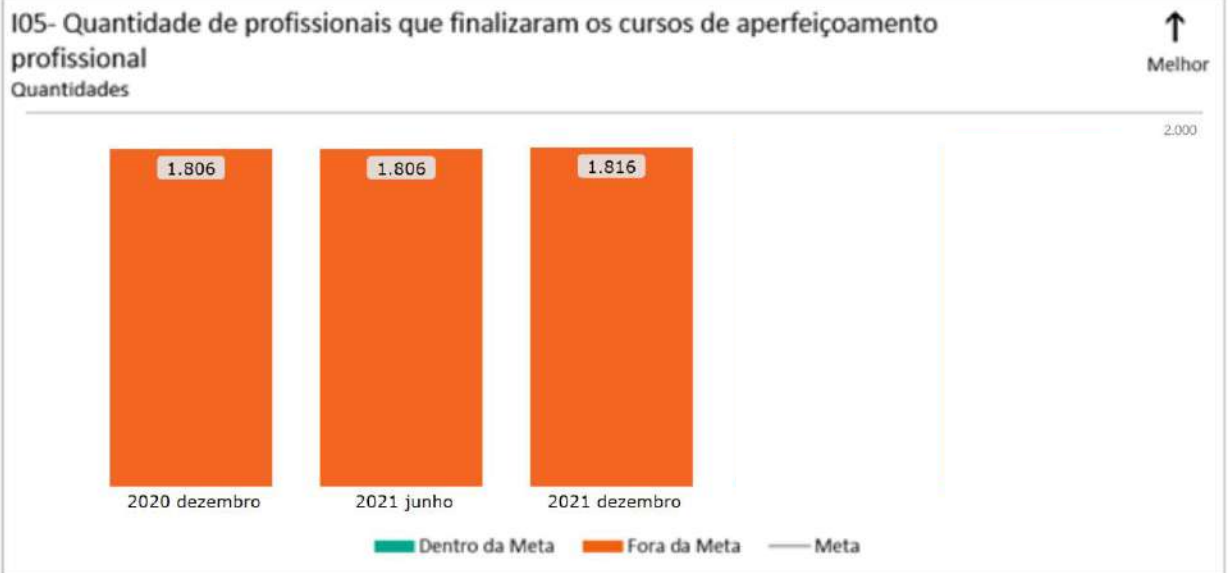


Gráfico 5. Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional. Gráfico Acumulado. Frequência Semestral.

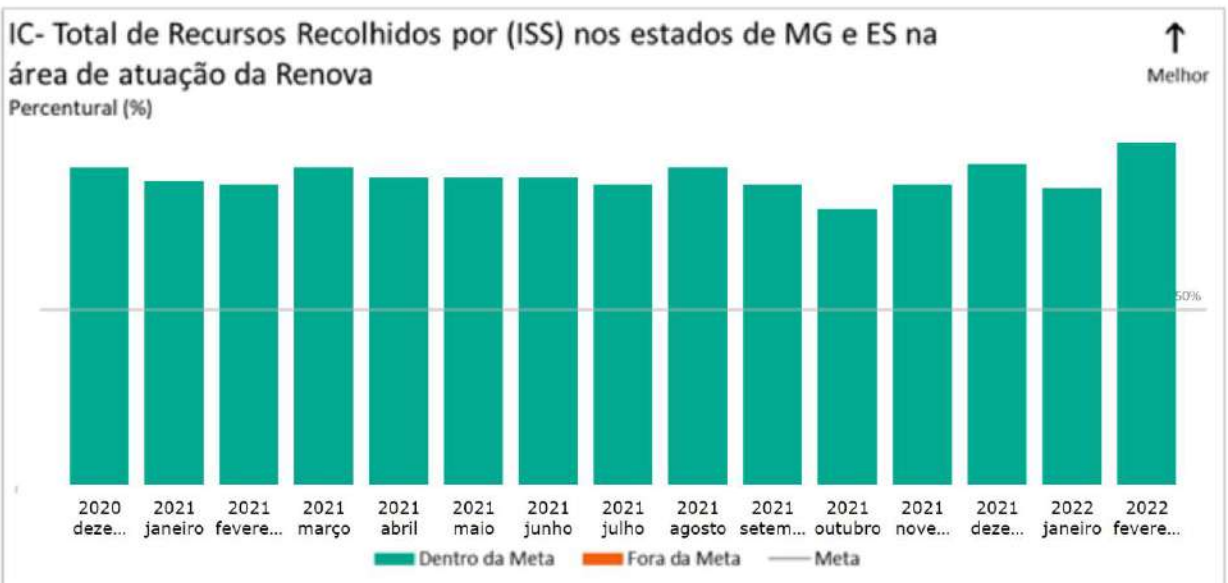


Gráfico 6. Total de Recursos Recolhidos por (ISS) nos estados de MG e ES na área de atuação da Renova. Frequência Mensal.

## **PG021 Auxílio Financeiro Emergencial**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2b	Judicializado
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- Atualmente há 3.829 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 8.196 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.692,2 Mi .



## **Fatos relevantes do mês**

Inclusão de 5 auxílios.

Exclusão de 684 auxílios.

Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

## Indicadores




Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.




Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.

## **PG023 Manejo de Rejeitos**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Em Andamento
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente

Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	4	Concluído Internamente

Deliberação	488	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	3	Concluído Internamente
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	544	2	Concluído Internamente
Deliberação	544	3	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- março de 2022 ● Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica
- julho de 2022 ● Conclusão do Monitoramento Ambiental 2021-2022 - 4º Ano Hidrológico
- dezembro de 2022 ● Conclusão da Operação das localidades monitoradas
- dezembro de 2022 ● Conclusão da Recuperação da cachoeira Camargos - PG23

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## **PG023 Manejo de Rejeitos**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Em Andamento
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente





Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	4	Concluído Internamente

Deliberação	488	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	3	Concluído Internamente
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	544	2	Concluído Internamente
Deliberação	544	3	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- março de 2022  Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica
- julho de 2022  Conclusão do Monitoramento Ambiental 2021-2022 - 4º Ano Hidrológico
- dezembro de 2022  Conclusão da Operação das localidades monitoradas
- dezembro de 2022  Conclusão da Recuperação da cachoeira Camargos - PG23

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## **PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**


Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

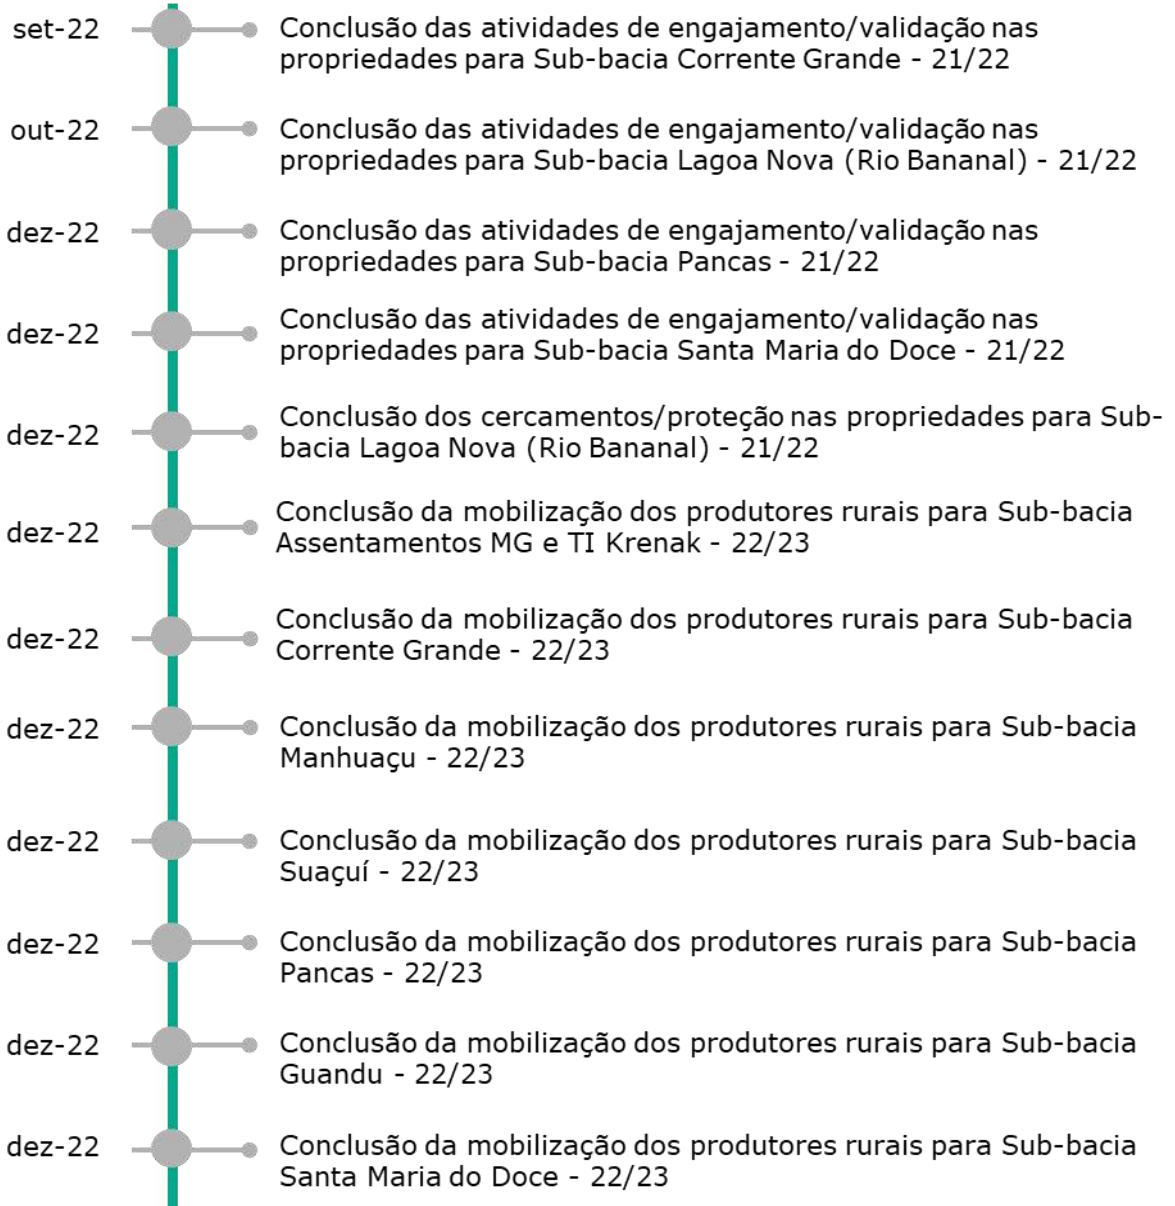

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1204,2 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 255 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 21,6 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R\$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.



## **Fatos relevantes do mês**

Lançamento de edital com quatro lotes na bacia do Manhuaçu para recuperação de 720 ha, e orçamento de 26MM para cada lote. Visita técnica do edital teve a participação de 48 empresas proponentes.

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## **PG027 Programa de Recuperação de Nascentes**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**


Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

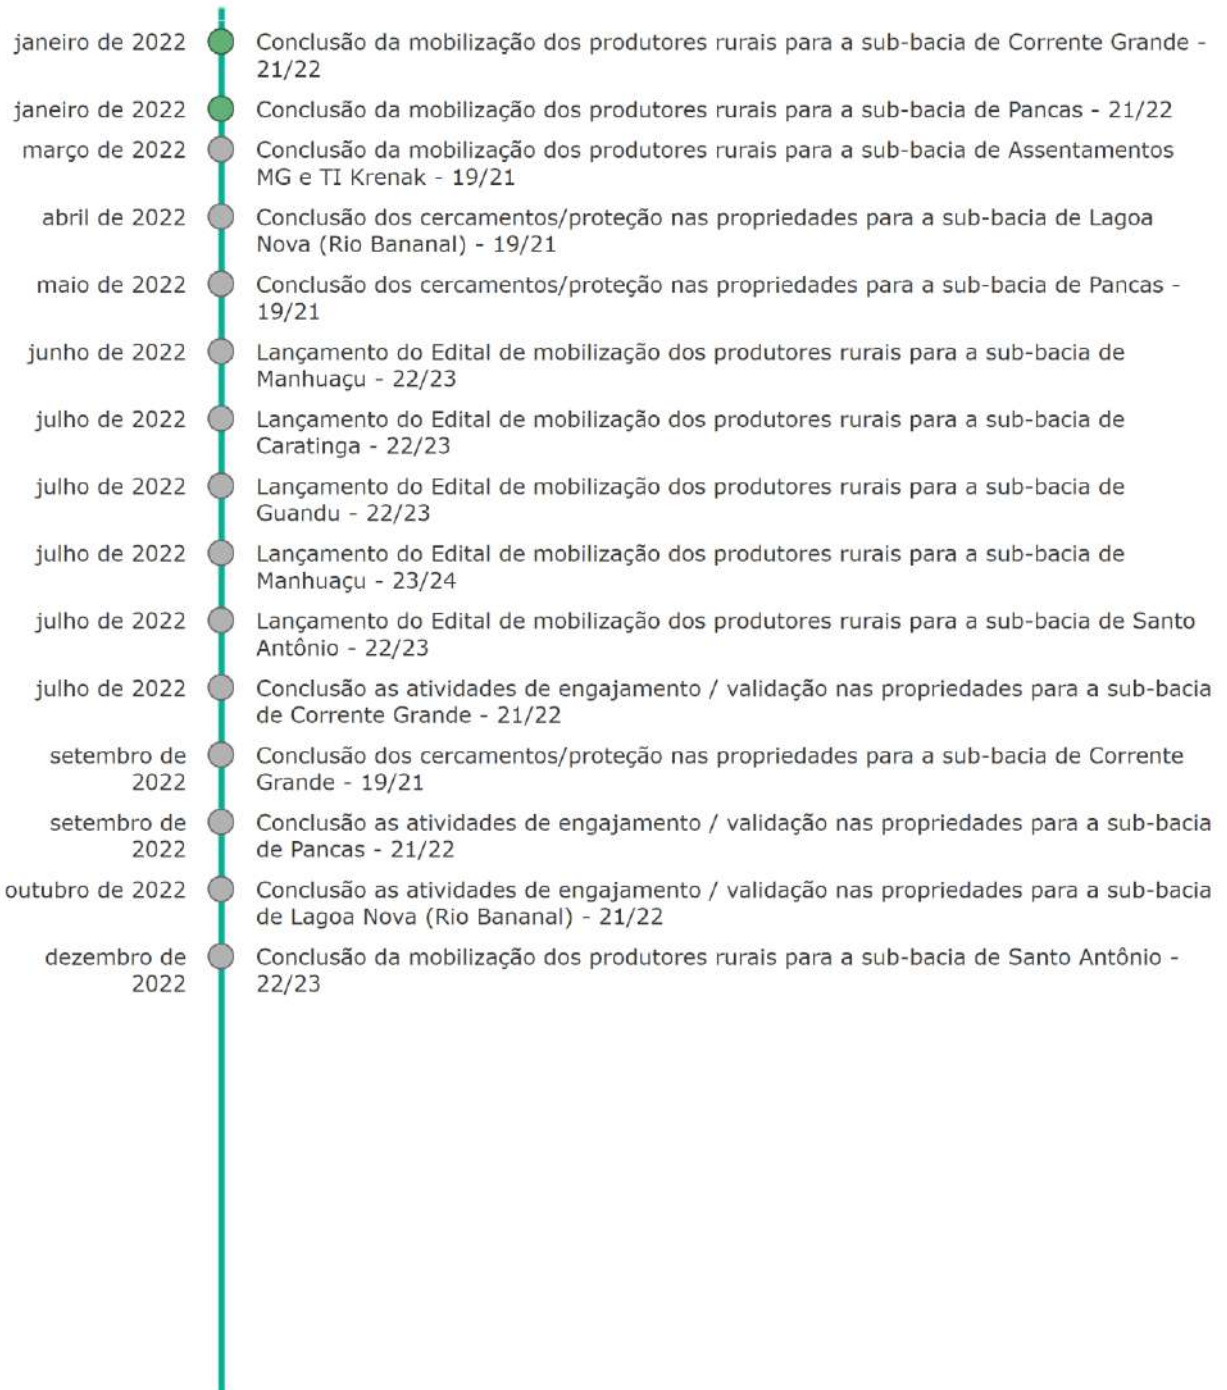

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/21
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1161 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 473 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 3388 Mil **nascentes** inscritas no edital;
- R\$ 183 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.

## **Fatos relevantes do mês**

Reunião organizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo para divulgação das ações de restauração florestal com participação de todos os prefeitos das bacias dos rios Guandu e Santa Maria, além de representações de Ibatiba e Iúna.



## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Diversidade de espécies nativas	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
<b>I02</b>	Densidade total de espécies nativas (Mudas + Regenerantes)	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I03</b>	Controle de espécies invasoras	(Total da área amostral com espécie invasora/Total da área amostral) x 100	%
<b>I04</b>	Solo exposto	(Total da área amostral com solo exposto/Total da área amostral) x 100	%

## **PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes que foram comprovadamente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Reprogramado
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado
Cláusula	166	§1º	Reprogramado
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente


Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022



● Concluído    
 ● Planejado    
 ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- 
- dez-22 ● Protocolo do Relatório do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática
  - dez-22 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 3 e 7 - TR4 - Ciclo 4

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Realização do 3º Seminário Técnico-científico de avaliação de Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Resultados dos 3 anos de PMBA.

Protocolo do relatório revisado do processo de elaboração do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce, de acordo com o Ofício SEI nº 12/2022/CTBio/DIBIO/ICMBio.

Entrega do 3º Relatório Anual de Evolução de 2021 (RA2021) do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST-RRDM).

Apresentação do 4º Relatório Anual “Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Planície Costeira do Rio Doce – agosto/2020 a julho/2021” (4º ano de monitoramento) em atendimento à Cláusula 165, do Termo de Referência 4 do Anexo 6.



## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF.

## **PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente
Deliberação	554	1	Planejado

## \* Entregas do ano de 2022

novembro de 2022	●	Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES
dezembro de 2022	●	Início da execução das obras do CETRAS MG

\* Prazos de entregas baseados na premissa de que haverá definição dos terrenos do CETRAS-MG e CETRAS-ES até junho de 2022.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultados do programa foram aprovados em dezembro de 2021 pela Deliberação CIF 553, porém por solicitação do IBAMA, as ações deste programa estão paralisadas devido a indefinição sobre as áreas a serem construídos os CETRAS, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Desta forma, não será possível a medição dos indicadores até a retomada das ações ainda sem previsão.

## **PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**


- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022



abril de 2022	● Conclusão da campanha estação chuvosa
julho de 2022	● Protocolar relatório na CTBio da Campanha da estação chuvosa de flora
agosto de 2022	● Protocolo do relatório na CTBio/CIF
agosto de 2022	● Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2022	● Protocolo do relatório semestral 1
outubro de 2022	● Publicação da chamada de projetos
dezembro de 2022	● Publicação da chamada de projetos

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

## Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores



Gráfico 1: Execução do Plano de Ação. Frequência Sazonal.

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivos**

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.


#### **Objetivos específicos**


Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais ; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo; contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos; fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas; fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.


## Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrado
Cláusula	170	Inc I	Encerrado
Cláusula	170	Inc II	Encerrado
Cláusula	170	Inc III	Encerrado
Cláusula	170	Inc IV	Encerrado
Cláusula	170	Inc V	Encerrado
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

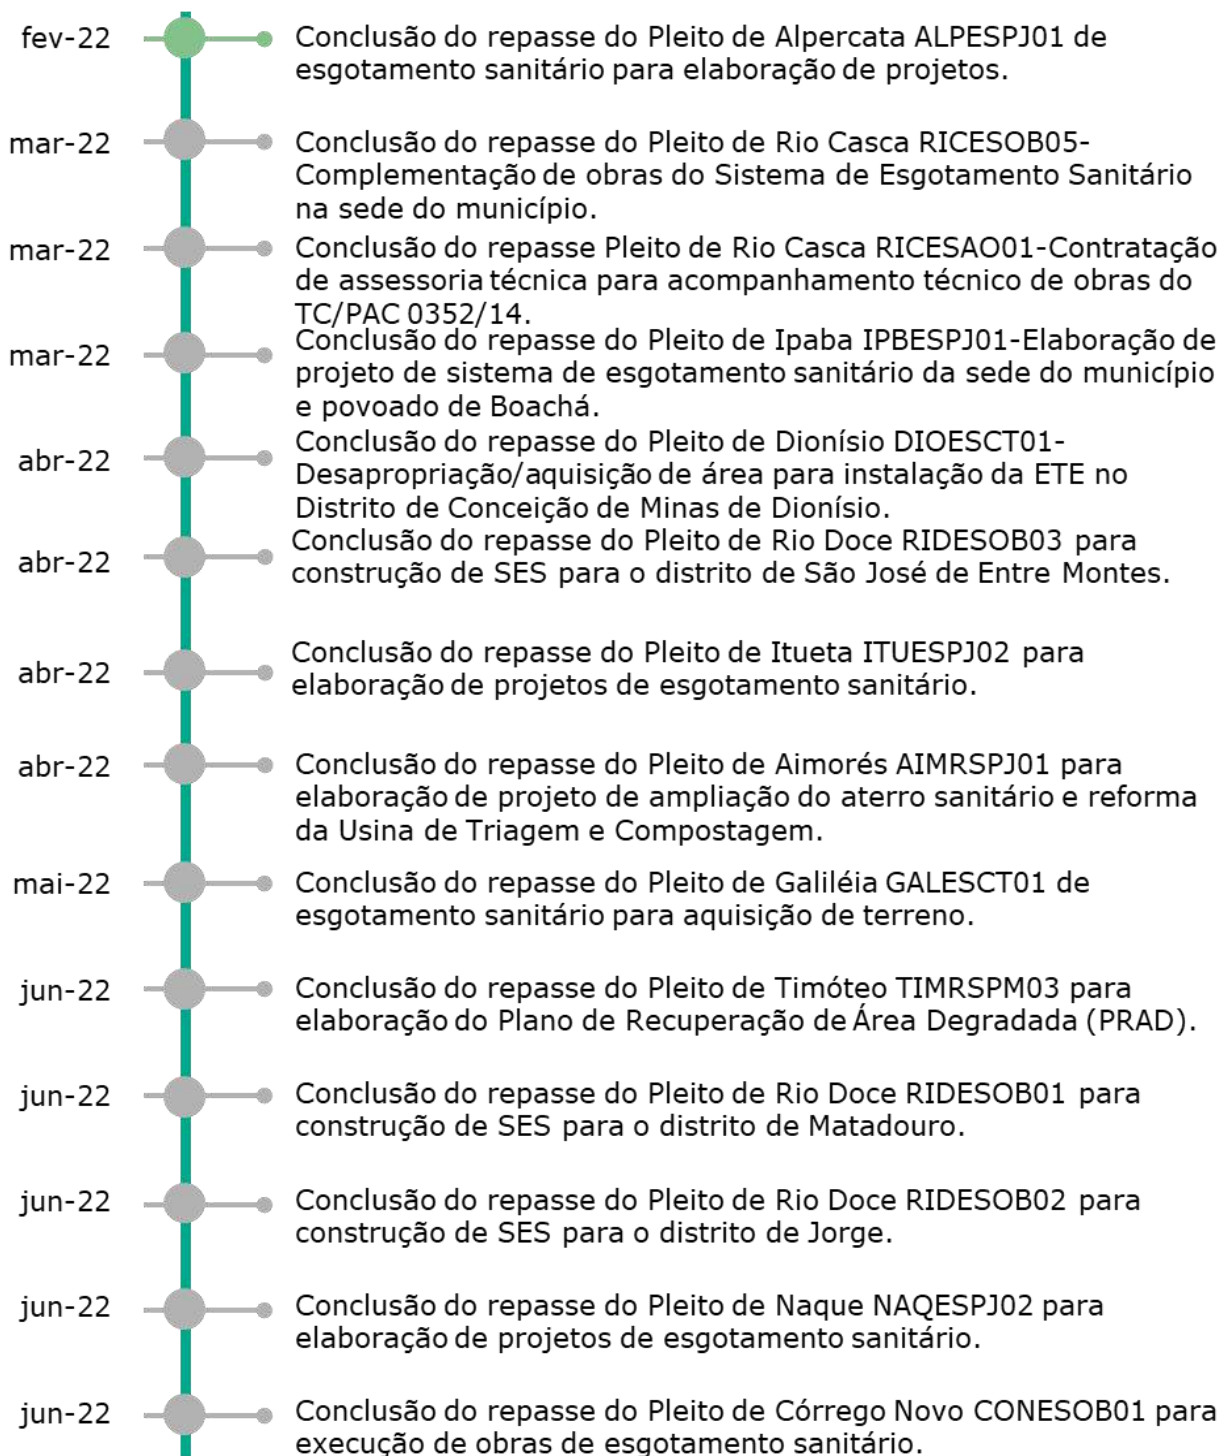


 Concluído

 Planejado

 Reprogramado



## Entregas do ano de 2022

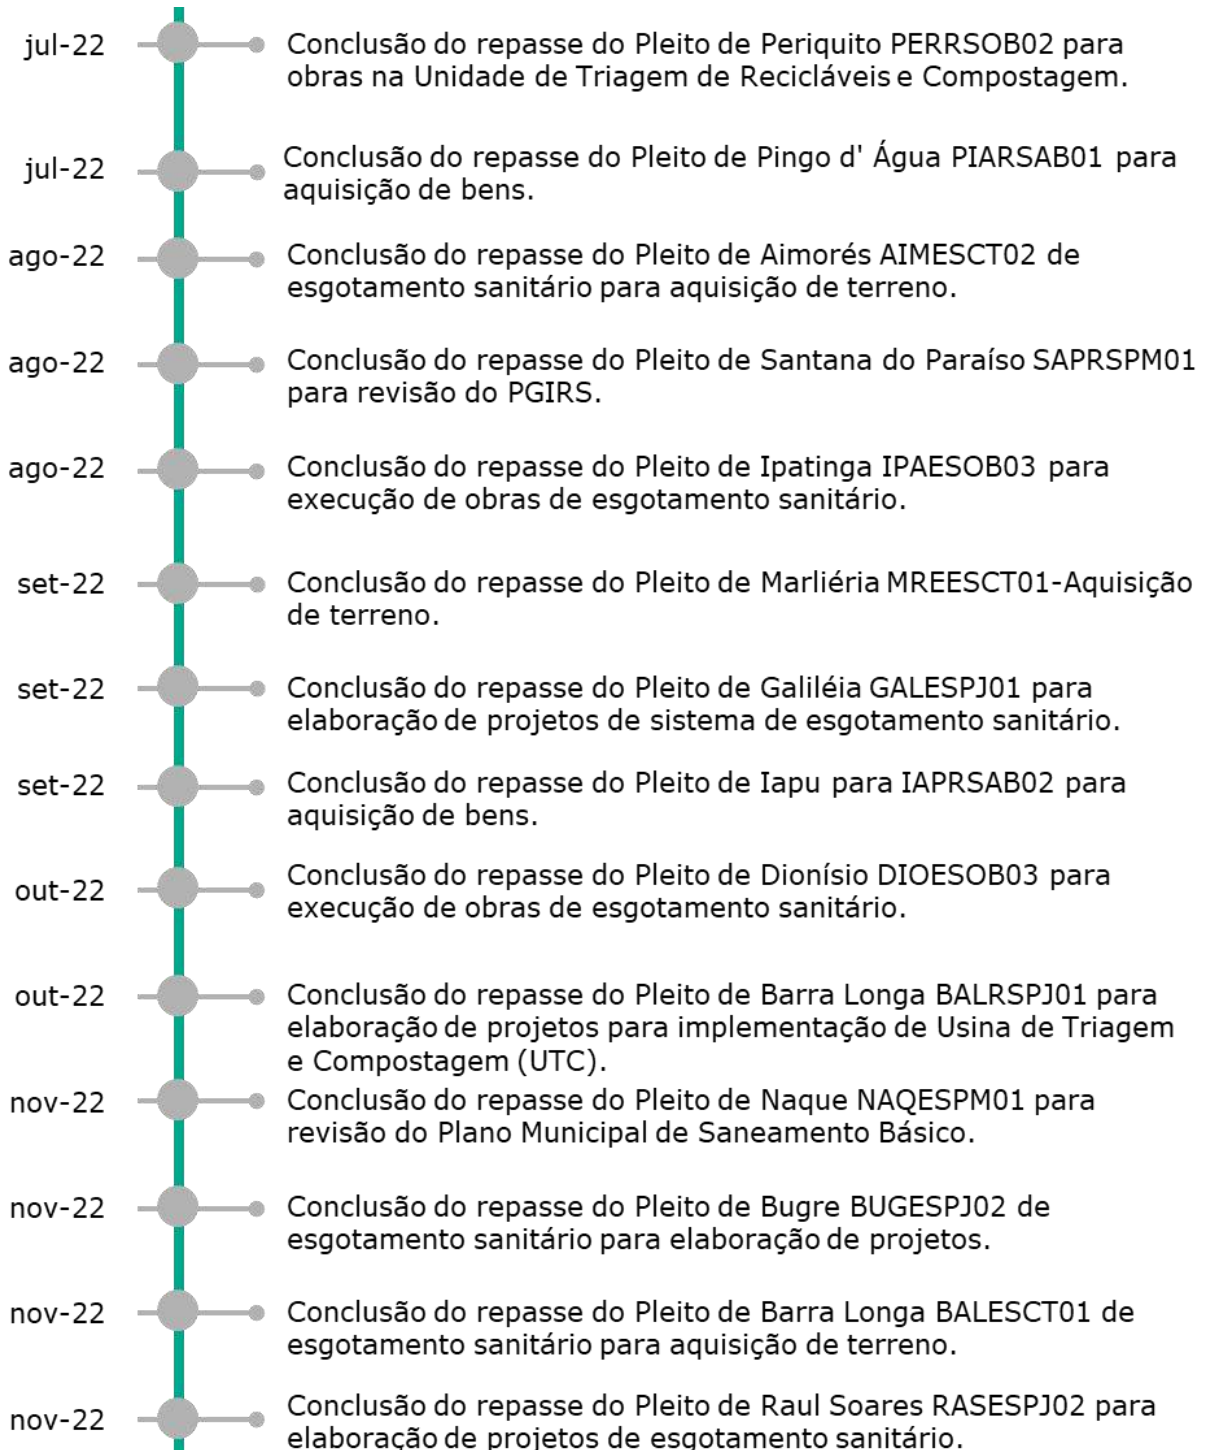





 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

dez-22  Conclusão do repasse do Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01 para elaboração de projetos de esgotamento sanitário.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do programa

- No mês **02/2022** , foram repassados R\$ **1.194.123** para ações dos municípios\*;
- No mês **02/2022** foram ofertadas **0** **oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **02/2022** a equipe técnica realizou **76** **visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

### Notas:

\*Repasses para ações dos municípios Alpercata, Barra Longa, Periquito, Rio Doce e consórcio CONDOESTE.

## Fatos relevantes do mês

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao consórcio Condoeste, no valor de R\$ 828.725,96, referente a referente a execução de obra para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos no município de Colatina;

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$ 50.058,23, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Barra Longa, no valor de R\$ 38.611,61, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R\$ 43.500,00, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Periquito no valor de R\$ 64.823,12, referente a referente a execução de obra para melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem;

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 34.859,32, referente a referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro;

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 57.291,76, referente a referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Jorge;

Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 76.252,60, referente a referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de São José de Entre Montes;

## **Indicadores**

**Nota:** Indicadores aprovados conforme Deliberação CIF nº 570, de 09 de fevereiro de 2022 serão reportados no Relatório de Atividades Mensal de março de 2022.

## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.


## Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	123	3	Judicializado
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	325	1	Judicializado
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado

Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

mar-22  Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação Principal  
- Ponte do Gama

dez-22  Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador  
Valadares - Sede

## **Grandes números do Programa**

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

## Fatos relevantes do mês

- Na semana do dia 07 de fevereiro de 2022 a equipe de perícia realizou visitas técnicas periciais nas localidades e casas dos beneficiários pelo abastecimento de água que constam no programa da Fundação Renova dos municípios de Ipaba, Caratinga, Santana do Paraíso que correspondem ao Território III do Item 2 da Decisão Judicial.
- Na semana do dia 14 de fevereiro de 2022 a equipe de perícia deu continuidade ao processamento das informações coletadas nas visitas técnicas periciais nas localidades e casas dos beneficiários pelo abastecimento de água que constam no programa da Fundação Renova dos municípios de Ipaba, Caratinga, Santana do Paraíso que correspondem ao Território III do Item 2 da Decisão Judicial.
- Na semana do dia 21 de fevereiro de 2022, a equipe de perícia retornou as atividades referentes à Etapa 2.2, Situação Fática no Território IV do Item 2 da Decisão Judicial. A localidade visitada será Pedra Lorena, no município de Aimorés.

## Fatos relevantes do mês

- No dia 24 de fevereiro de 2022 a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

\* As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

\* Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

## Indicadores

**I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água:** indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

**I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos:** indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

## Indicadores

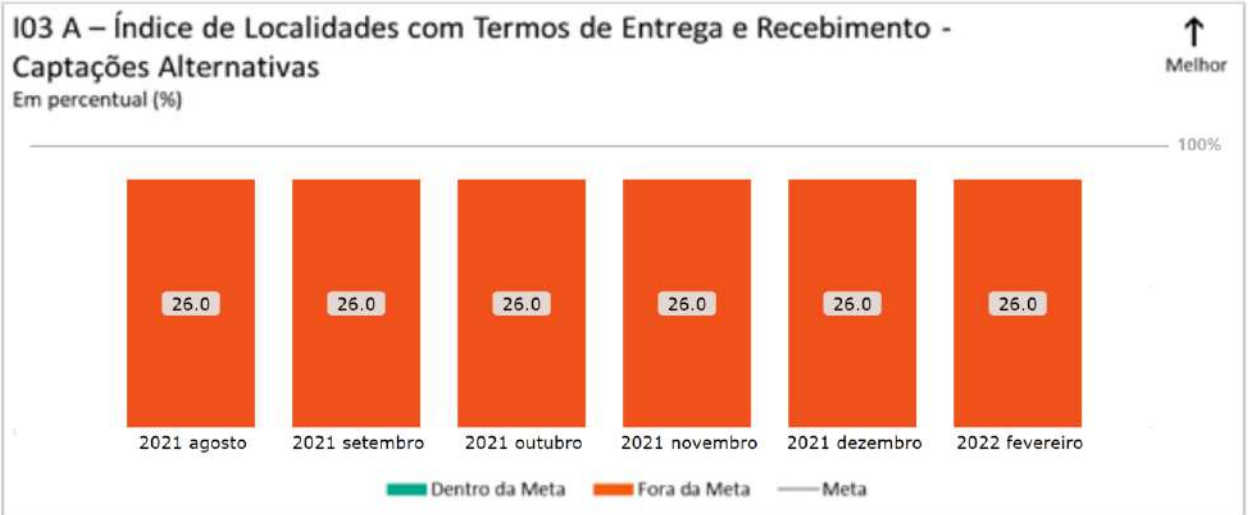


Gráfico 1. Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas. Frequência Mensal.

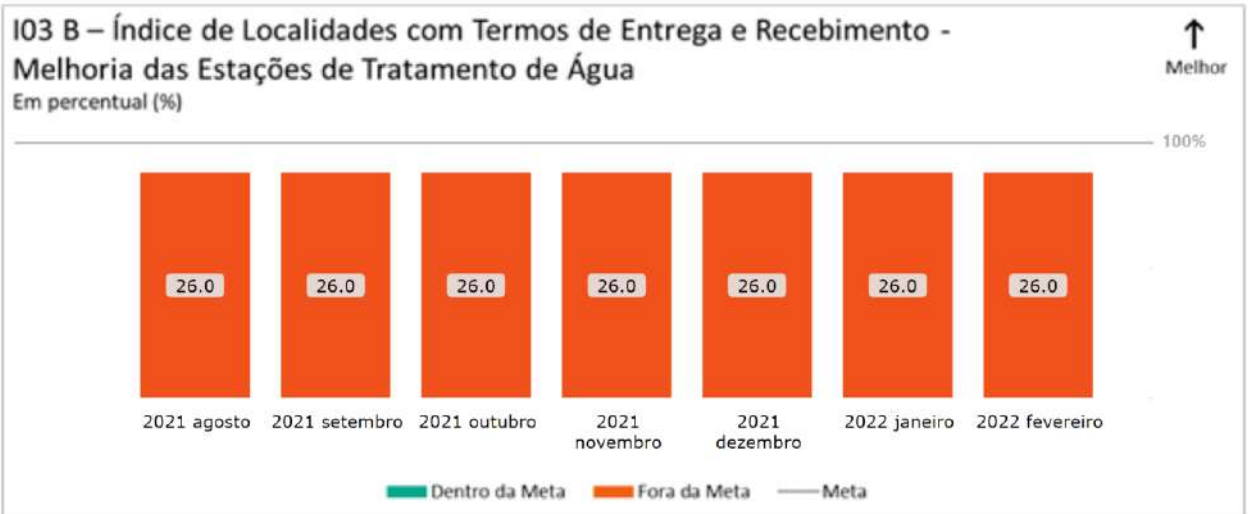


Gráfico 2. Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água. Frequência Mensal.

## Indicadores

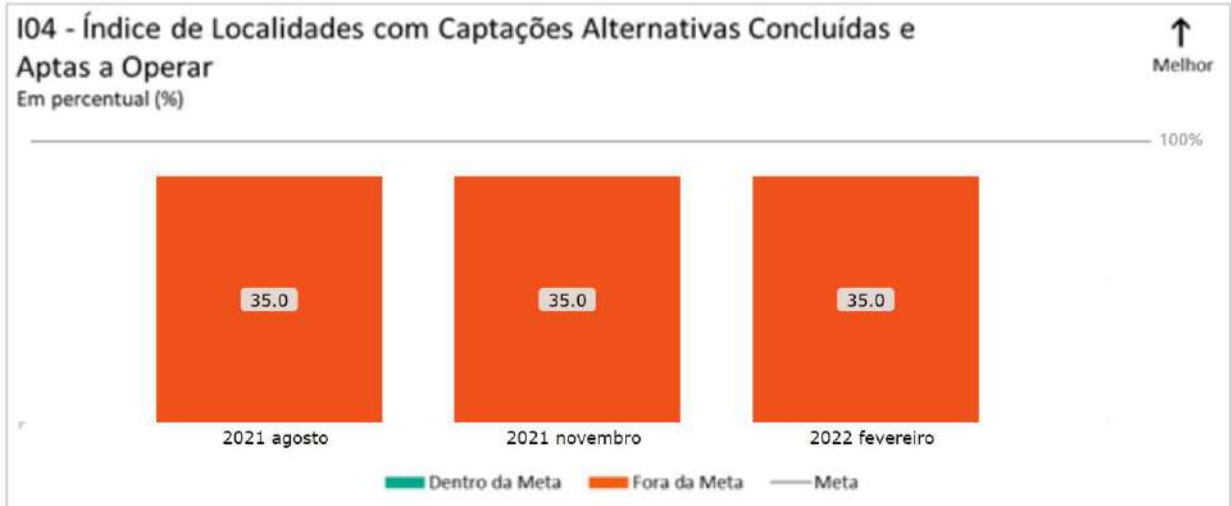


Gráfico 3. Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar. Frequência Trimestral.

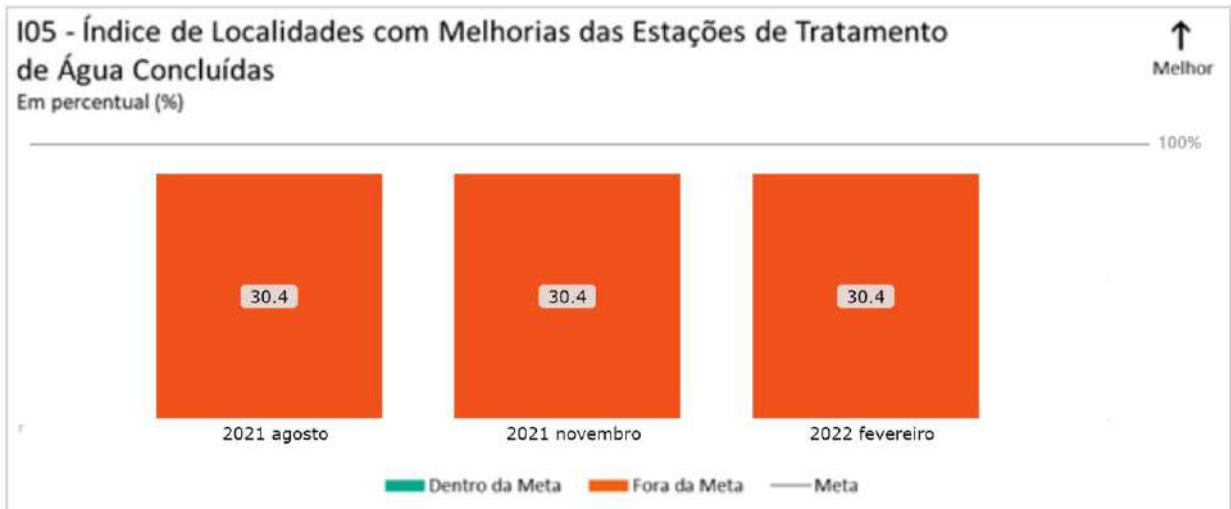


Gráfico 4. Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas. Frequência Trimestral.

## **PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	549	2	Planejado

## Entregas do ano de 2022

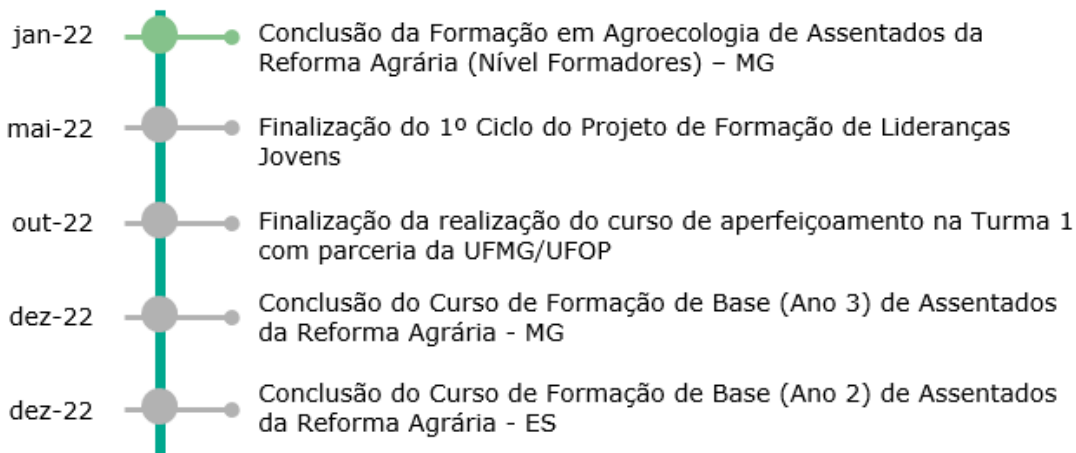

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Assinatura do aditivo de prazo, valor e escopo junto ao CEFORMA para realização do curso técnico em agroecologia, previsto para iniciar em março/2022.

## Indicadores




Gráfico 1. Número de vagas disponibilizadas x número de inscritos para capacitação de lideranças. Gráfico semestral.

## **PG034 Preparação para Emergências Ambientais**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**


#### **Objetivo**

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

junho de 2022  Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

Obs.: As entregas de 2022 serão revisados no próximo relatório tendo em vista que os Planos de Trabalhos para Escola Segura, NUPDEC e CGR encontram-se em aprovação junto as 04 COMPDECs.

 Concluído  Planejado  Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

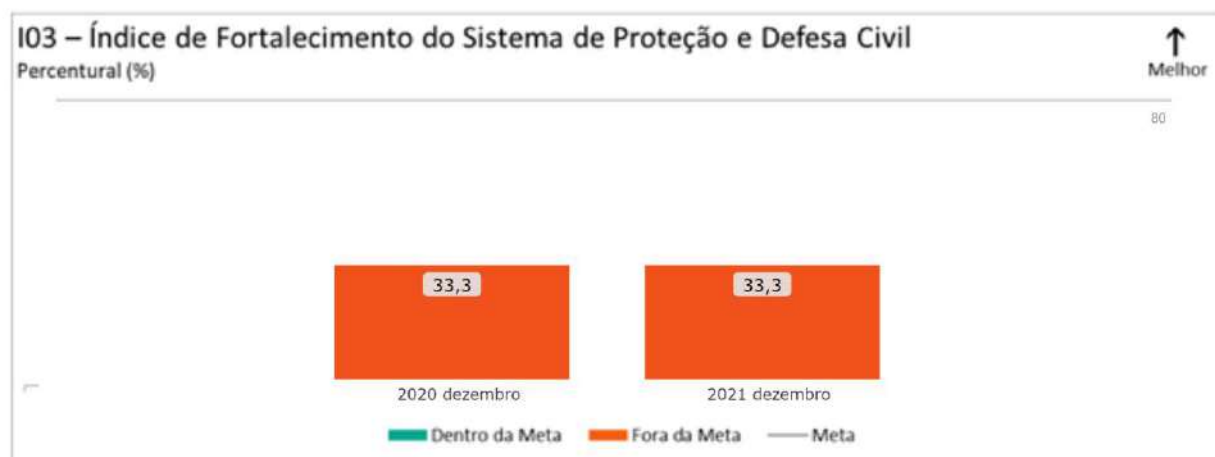


Gráfico 1. Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil. Frequência anual.

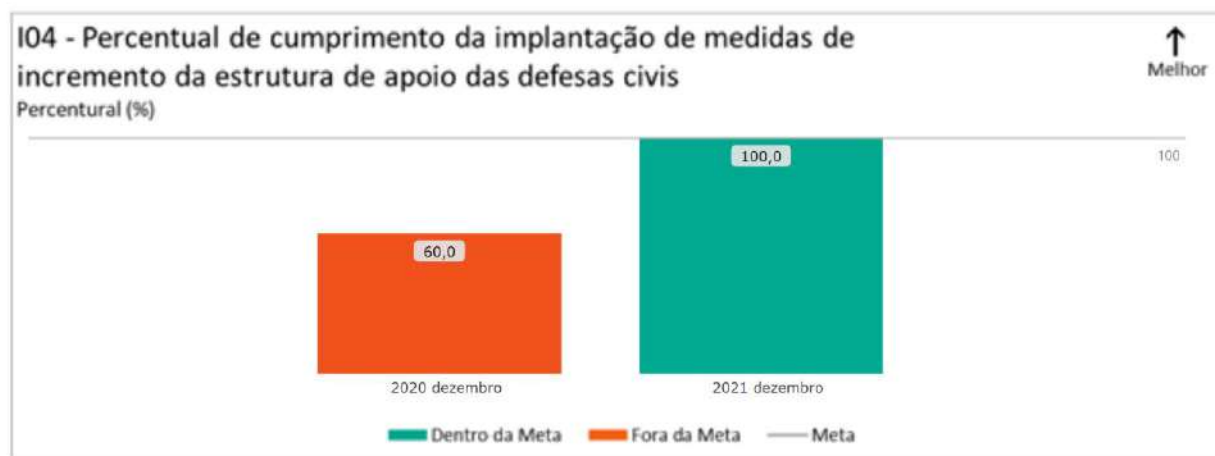


Gráfico 2. Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis. Frequência anual.

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO</b>
<b>I01</b>	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
<b>I02</b>	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/22

## Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
<p>Instalação do sistema de monitoramento e alerta de cheias: Estações Linigráficas e réguas de nível instaladas ao longo do Rio do Carmo e Gualaxo. Sistema desenvolvido e em operação pela Renova com as Defesas Cíveis de Mariana e Barra Longa treinadas, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 156</p>	<p><b>PG034.001:</b>a EY não identificou documentação comprobatória referente à realização de treinamento com a participação de representantes das Defesas Cíveis dos municípios de Mariana (MG) e Barra Longa (MG)</p>	<p>No relatório mensal do ano 2019 mês abril, foi reportado (Instalação do sistema de monitoramento e alerta de cheias, desenvolvido e operado pela mesma com as Defesas Cíveis dos municípios de Mariana (MG) e Barra Longa (MG) treinadas em 02/3/2017), porém o correto é (Instalação do sistema de monitoramento e alerta de cheias, desenvolvido e operado pela mesma com as Defesas Cíveis do município de Barra Longa (MG)).</p>
<p>Treinamento na metodologia do Sistema de Comando em Operações (SCO)</p> <p>Fonte: Relatório CIF Abril 2019, página 156</p>	<p><b>PG034.002:</b> A EY identificou evidências da realização do treinamento na metodologia do Sistema de Comando em Operações (SCO) em 2017</p>	<p>No relatório mensal do ano 2019 mês abril, foi reportado (Realização do treinamento na metodologia do Sistema de Comando em Operações (SCO) no ano de 2017, atendendo aos municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Santa Cruz do Escalvado (MG)), porém o correto é (Realização do treinamento na metodologia do Sistema de Comando em Operações (SCO) no ano de 2016, atendendo aos municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Santa Cruz do Escalvado (MG)).</p>
<p>Primeiro encontro do Comitê Gestor de Riscos em Mariana (MG)</p> <p>Fonte: Relatório CIF Fevereiro 2019, página 170.</p>	<p><b>PG034.004:</b> A EY identificou Divergência entre a data de realização do encontro do Comitê Gestor de Risco no município de Mariana (MG).</p>	<p>No relatório mensal do ano 2019 mês fevereiro, foi reportado (Primeiro encontro do Comitê Gestor de Riscos em Mariana (MG) em maio de 2018), porém o correto é (Primeiro encontro do Comitê Gestor de Riscos em Mariana (MG) em julho de 2018)</p>

## **PG035 Programa de Informação para a População**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Salvaguardar e dar acesso às informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo:

- (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação; aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços físicos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e
- (ii) processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos, sobre o modo de vida e memória.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Em Andamento
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2021

- março de 2022 ● Aprovação da Definição do Programa pelo CIF
- junho de 2022 ● Finalização da Contratações para Execução do Projeto do CIT Governador Valadares

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## Grandes números do programa

INDICADOR	janeiro de 2022	fevereiro de 2022	ACUMULADO
Quantidade de acessos à plataforma interativa	80	117	197
Quantidade de atividades nos territórios	0	0	0

## Fatos relevantes do mês

A equipe do PG35 e de Relações Institucionais da Fundação Renova reuniram-se, presencialmente, no dia 07 de fevereiro de 2022, com o Prefeito de Mariana, Sr. Juliano Gonçalves e assessores para apresentar o Projeto Conceitual do CIT no Terminal Turístico.

Em 17 de fevereiro de 2022, a equipe técnica do PG35 esteve presente no Centro Ecológico de Linhares/ES para finalizar a instalação do Ponto de Acesso da Plataforma Interativa do CIT, conforme comunicado na 56ª RO da CT-PDCS e notificada por ofício.

No dia 17 de fevereiro de 2022, foi instalado o Ponto de Acesso à Plataforma Interativa dentro da Unidade CIA, situado à Rua Bom Jesus, nº 196/A, Bairro Centro, Mariana/MG. A instalação foi comunicada na 56ª RO da CT-PDCS e notificada por ofício.

No dia 24 de fevereiro de 2022, foi realizada uma reunião, online, entre a equipe do PG35 e o ICMBio com a presença do Relações Institucionais e a equipe de Engenharia da Fundação Renova. A reunião teve como pauta a aprovação final do Termo de Parceria entre as duas instituições, os últimos alinhamentos sobre o Projeto Executivo do CIT de Regência e a formalização da entrega do Ponto de Acesso à Plataforma Interativa no Centro Ecológico.

No dia 25 de fevereiro de 2022, foram encaminhados, por email, a versão final para assinatura do Termo de Cooperação entre o ICMBio e a Fundação Renova e seu respectivo Plano de Trabalho para implantação do CIT em Regência.

O Programa 35 finalizou a instalação dos Pontos de Acesso à Plataforma Interativa em todas as 3 localidades escolhidas para implantação das bases físicas do Centro de Informação Técnica – CIT, Mariana/MG, Governador Valadares/MG e Regência/ES. A instalação foi comunicada na 56ª RO da CT-PDCS e notificada por ofício.

## **Indicadores**

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

## **PG036 Comunicação Nacional e Internacional**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**





#### **Objetivo**

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	530	1	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção dos mecanismos relacionados à acessibilidade do site, seguindo como critério recomendações do guia WCAG 2.0 (Web ContentAccessibilityGuidelines) e/ou padrão E-MAG em 2022                                 |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022 |

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	janeiro de 2022	fevereiro de 2022	ACUMULADO 2022	ACUMULADO (2016 - 2022)
Acesso ao Site (mês)	200.367	175.968	376.335	7.522.317
Documentos no site (mês)	15	11	26	489
Notícias Publicadas (mês)	5	11	16	903
Vídeos (mês)	7	9	16	598

## **Fatos relevantes do mês**

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.



## Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.

▲ INDICADOR	janeiro de 2022 fevereiro de 2022	
	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	127.341
I02 – Visualizações de páginas de serviço	31.762	22.025
I04 – Alcance Orgânico LinkedIn	16.530	31.186
I05 – Alcance Orgânico Facebook	11.446	32.880
I06 – Visualizações no Youtube	8.468	10.418
I03 – Tempo de resposta	8,03 Horas	3,25 Horas

## **PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**


Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrado
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Em Andamento
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente

Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	572	3	Planejado
Deliberação	572	4	Planejado
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

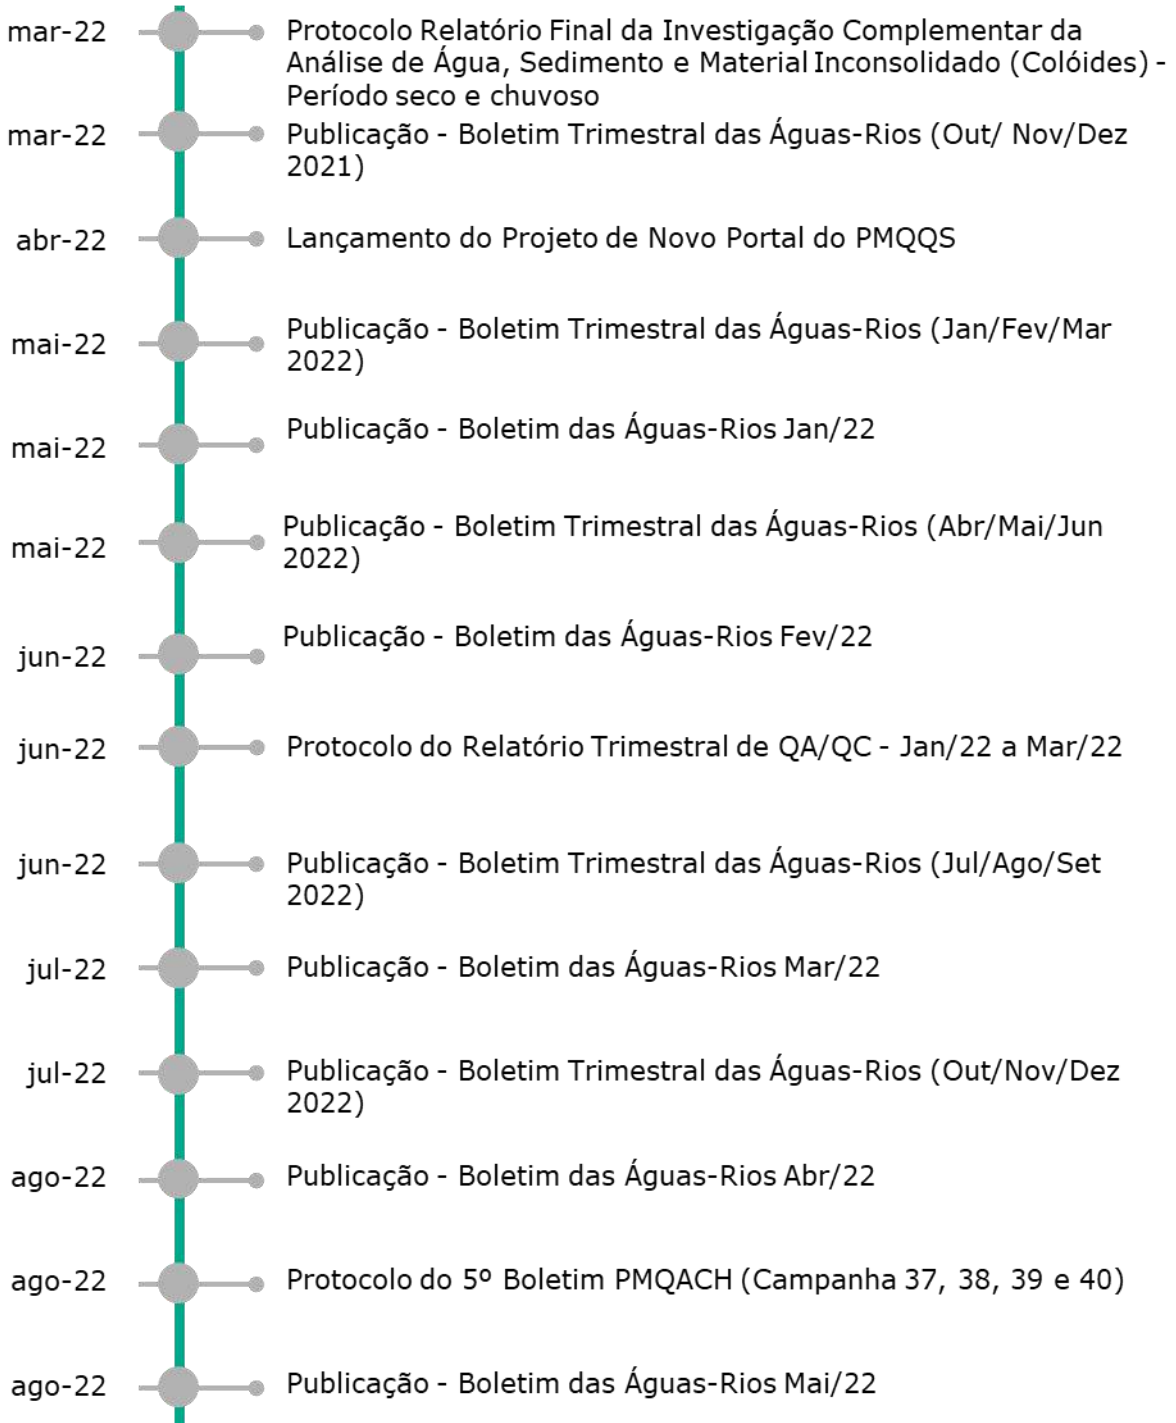

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

Em 2022 está aprovado um orçamento de **R\$ 36.917.467** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

### Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,5 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em [www.monitoramentoriadoce.org](http://www.monitoramentoriadoce.org);
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

## **Grandes números do programa**

### **Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)**

- Atualmente são monitorados 293 pontos, sendo 35 com tratamento e 258 sem tratamento em 29 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.



## **Fatos relevantes do mês**

Reuniões com o GTA para discussões sobre o desenvolvimento do novo protótipo do portal Monitoramento Rio Doce

## Indicadores

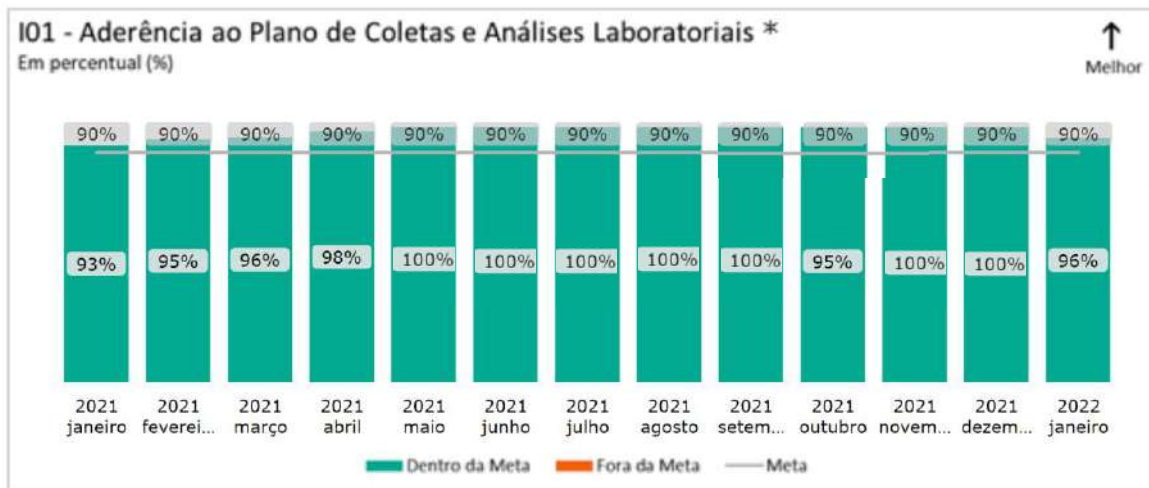


Gráfico 1. Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais. Gráfico Mensal

\*O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

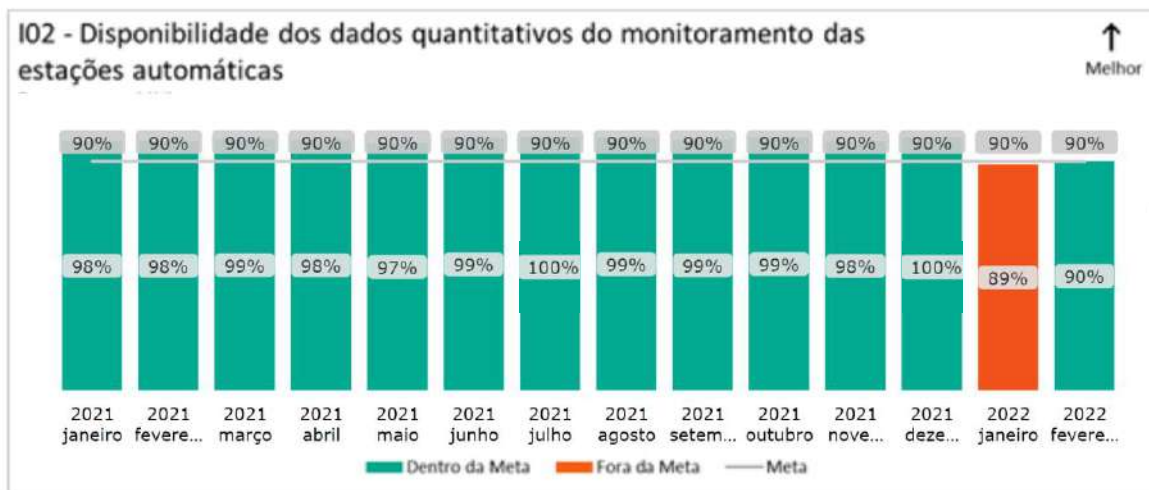


Gráfico 2. Disponibilidade dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

## Indicadores

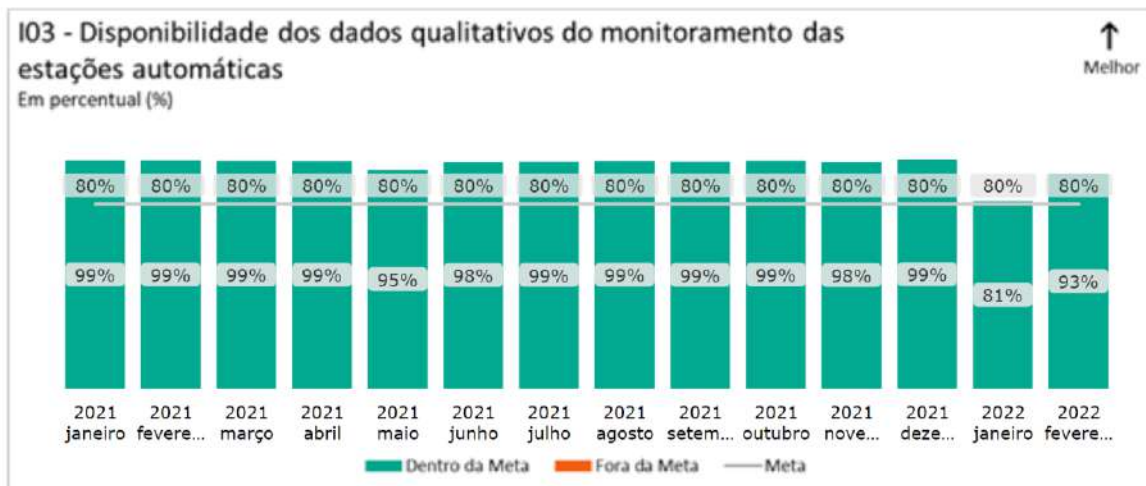


Gráfico 3. Disponibilidade dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas. Gráfico Mensal

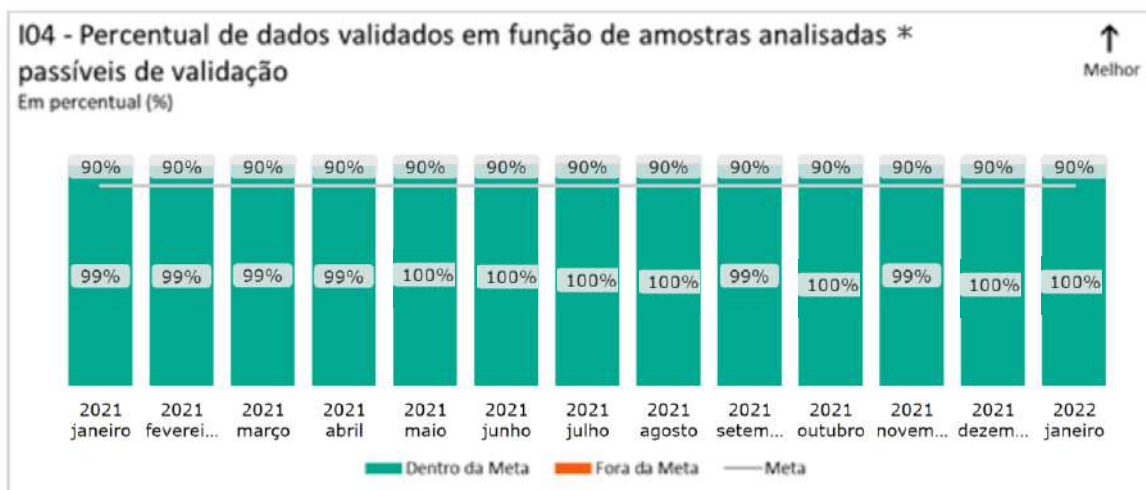


Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação. Gráfico Mensal

\*O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

## **PG039 Unidades de Conservação**

### **Eixo Terra e Água**


#### **Objetivo**

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Reprogramado
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Em Andamento
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	6	Planejado

## Entregas do ano de 2022

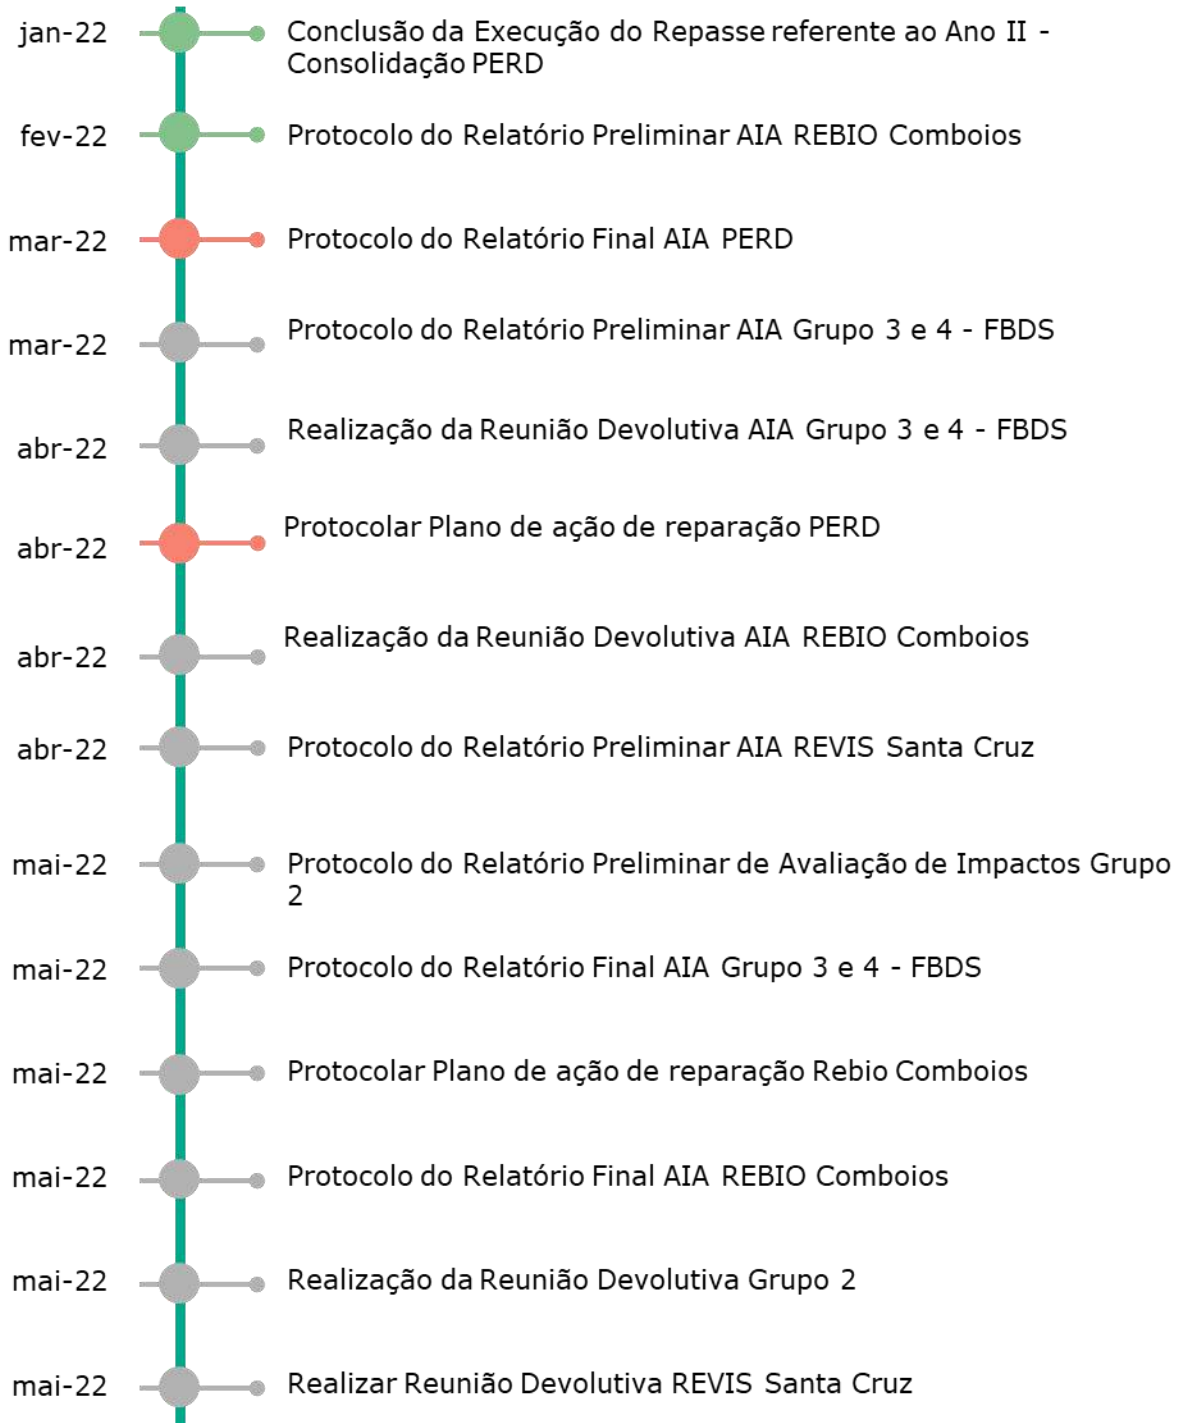


● Concluído    
 ● Planejado    
 ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022



● Concluído    
 ● Planejado    
 ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

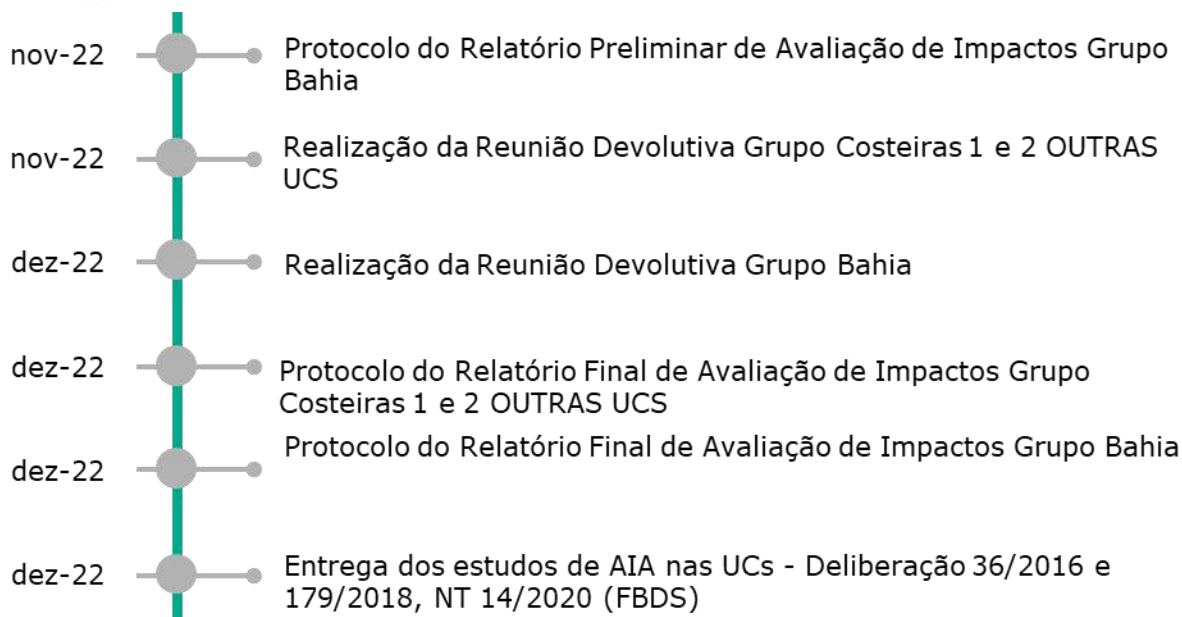

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Em 18/02/2022, foi aprovado o produto "Relatório Reuniões Prévias - Bloco 1" referente ao processo de elaboração do Plano de Manejo do RVS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas, que vem sendo realizado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 18/2018, de acordo com o Ofício SEI nº 12/2022 - ICMBio Santa Cruz.

Em 14/02/2022, foi protocolado o Relatório Preliminar de Avaliação de Impacto Ambiental de REBIO Comboios (NT).

## **Indicadores**

Os indicadores de resultado do programa passarão por ajuste nas datas de início de medição constante do documento de definição aprovado pela Deliberação 560.

## **PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Conclusão da elaboração e assinaturas do Programas de Regularização Ambiental (PRA) das propriedades piloto em MG
- setembro de 2022 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

525 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 27 (5,1%) imóveis declinaram e 308 ( 58,7% ) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 262 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

## Fatos relevantes do mês

Aprovação da APRO 173/2021 para celebração do acordo de cooperação técnica com o IDAF.



## Indicadores

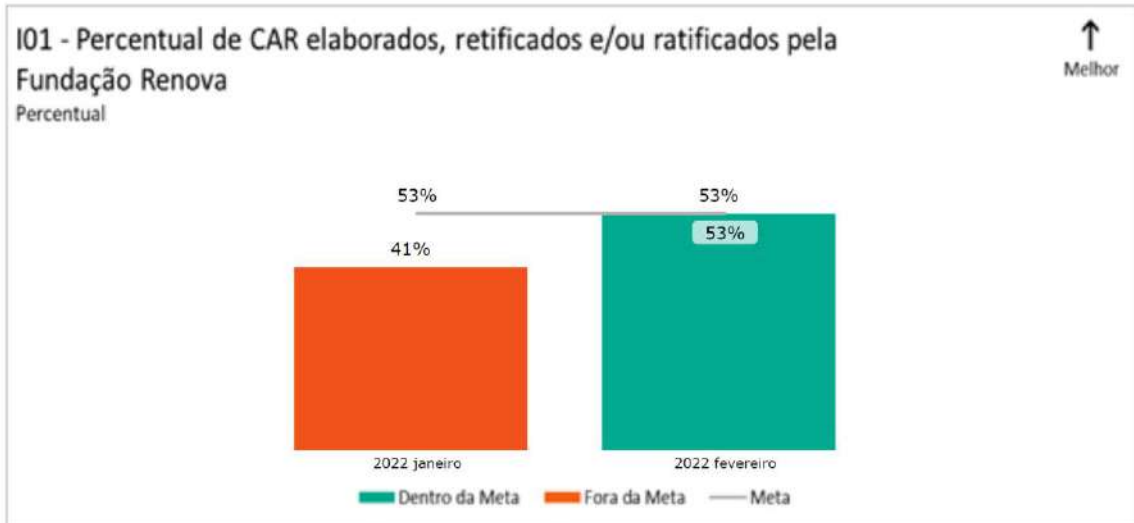


Gráfico 1. Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>102</b>	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
<b>103</b>	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

## **PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir os comprometentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	caput	Em Andamento
Cláusula	142	caput	Em Andamento
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

julho de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - Concluído

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

Os ressarcimentos de gastos públicos extraordinários aos 19 (dezenove) Órgãos Compromitentes e aos 40 (Quarenta) Municípios foram devidamente concluídos com êxito.

Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R\$ 295,43 Mil, referente a 1 órgão comprometente e 1 município (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

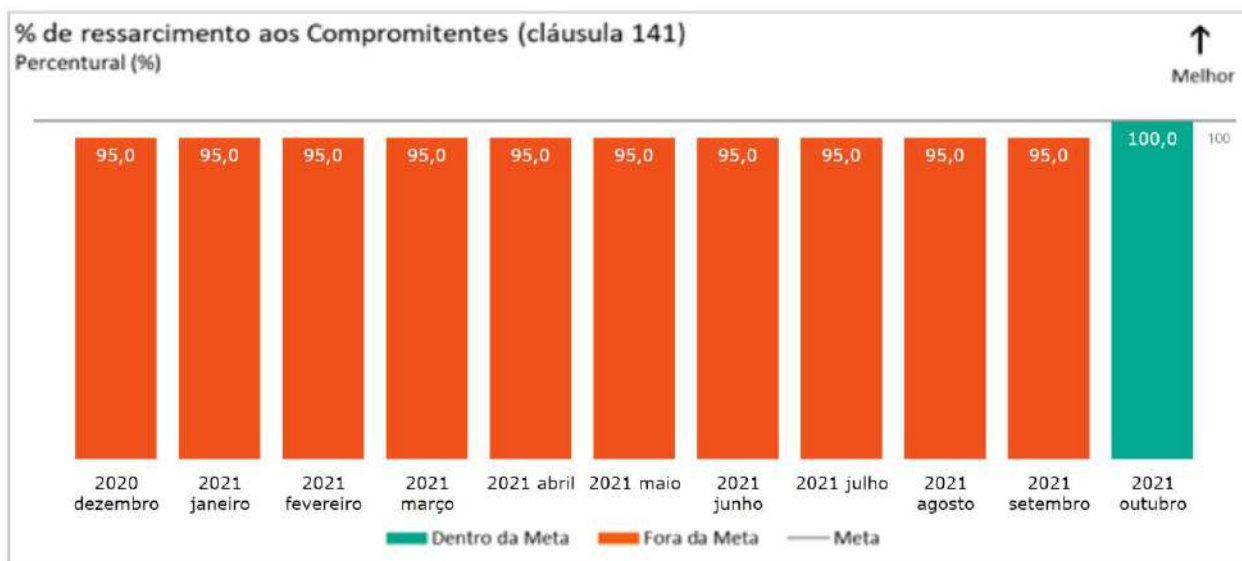


Gráfico 1. % de ressarcimento aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

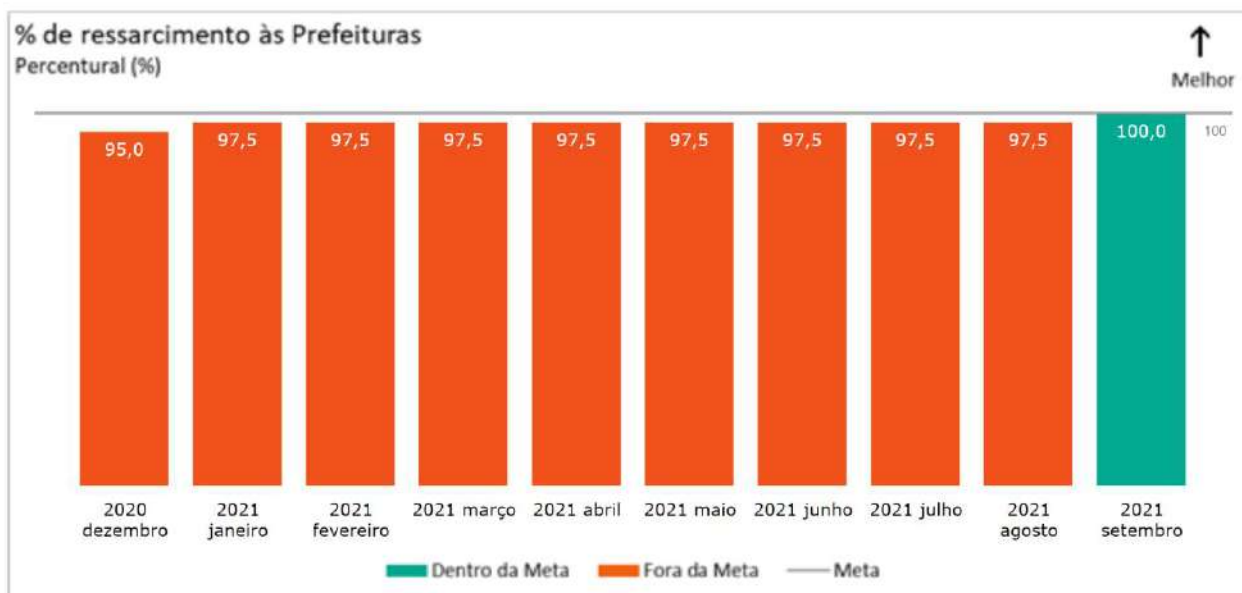


Gráfico 2. % de ressarcimento às Prefeituras. Gráfico Acumulado.






Gráfico 3. % dos ressarcimentos aos Compromitentes. Gráfico Acumulado.

\* 100% se refere às solicitações feitas e já auditadas até fevereiro de 2022.

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.


XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12ª Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

## Taxa de acidentes registrados

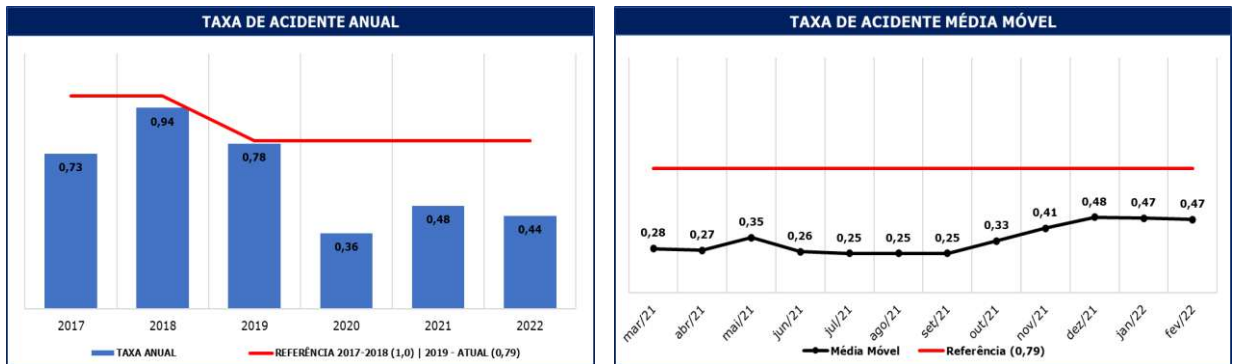

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.



## Gestão Econômica\*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado				
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,4	0,8	-	15,7	-95%	2,0	0,8	1,2	-61%
PG15	INOVAÇÃO	8,1	0,1	-	8,0	-98%	3,1	0,1	3,0	-96%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	21,3	0,1	-	21,2	-99%	1,4	0,1	1,2	-90%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,7	0,4	-	6,3	-94%	1,4	0,4	1,0	-72%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	88,2	7,5	-	80,7	-92%	17,3	7,5	9,8	-57%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	25,0	1,0	-	24,0	-96%	6,0	1,0	5,0	-83%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	37,7	0,3	-	37,4	-99%	1,2	0,3	0,9	-74%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,3	6,2	-	50,1	-89%	8,2	6,2	2,0	-24%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	75,6	3,8	-	71,7	-95%	11,5	3,8	7,7	-67%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22,6	0,2	-	22,4	-99%	1,8	0,2	1,6	-91%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	8,6	0,1	-	8,5	-99%	0,8	0,1	0,7	-86%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5,1	0,1	-	5,0	-98%	0,2	0,1	0,0	-30%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	3,3	0,3	-	3,0	-91%	0,4	0,3	0,1	-26%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	16,0	7,6	-	8,4	-52%	7,6	7,6	0,0	0%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	5,7	0,1	-	5,6	-98%	0,3	0,1	0,2	-63%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	67,6	0,4	-	67,2	-99%	33,6	0,4	33,2	-99%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
<b>Total Compensatórios</b>		<b>464,4</b>	<b>29,1</b>	<b>-</b>	<b>435,3</b>	<b>-94%</b>	<b>96,8</b>	<b>29,1</b>	<b>67,7</b>	<b>-70%</b>
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG01	CADASTRO	23,6	3,9	-	19,7	-83%	5,9	3,9	1,9	-33%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	5.151,9	34,3	-	5.117,6	-99%	2.042,1	34,3	2.007,8	-98%
PG03	POVOS INDÍGENAS	305,0	7,3	-	297,7	-98%	15,0	7,3	7,7	-51%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	39,1	2,4	-	36,8	-94%	0,2	2,4	2,2	1149%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	21,8	0,2	-	22,0	-101%	2,4	0,2	2,6	-107%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	95,8	10,4	-	85,4	-89%	20,7	10,4	10,3	-50%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	10,2	1,0	-	9,2	-90%	1,4	1,0	0,4	-30%
PG08	REASSENTAMENTO	1.787,9	146,7	-	1.641,2	-92%	242,0	146,7	95,2	-39%
PG09	UHE CANDONGA	590,0	34,2	-	555,8	-94%	73,1	34,2	38,9	-53%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	117,0	7,9	-	109,1	-93%	16,4	7,9	8,6	-52%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	7,4	0,6	-	6,8	-92%	1,0	0,6	0,4	-38%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	20,4	1,0	-	19,4	-95%	3,0	1,0	2,0	-67%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	3,6	0,6	-	3,0	-83%	0,3	0,6	0,3	120%
PG14	SAÚDE	18,9	0,3	-	18,6	-99%	2,8	0,3	2,5	-90%
PG16	PESCA	46,7	3,4	-	43,3	-93%	7,1	3,4	3,7	-52%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	151,1	8,7	-	142,4	-94%	25,0	8,7	16,3	-65%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	10,9	1,0	-	9,9	-90%	1,3	1,0	0,2	-18%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	251,8	14,0	-	237,8	-94%	73,5	14,0	59,5	-81%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	226,2	21,0	-	205,2	-91%	33,7	21,0	12,7	-38%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	21,6	0,8	-	20,8	-96%	4,4	0,8	3,6	-82%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	32,1	4,2	-	27,9	-87%	5,3	4,2	1,0	-20%
PG28	BIODIVERSIDADE	101,8	2,5	-	99,3	-98%	5,6	2,5	3,1	-55%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	49,1	3,0	-	46,1	-94%	6,2	3,0	3,2	-51%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	140,0	13,5	-	126,5	-90%	22,8	13,5	9,3	-41%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	36,9	4,7	-	32,2	-87%	5,2	4,7	0,5	-10%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,3	0,6	-	6,7	-92%	1,0	0,6	0,4	-41%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	300,9	46,7	-	254,2	-84%	55,5	46,7	8,7	-16%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-	0%	-	-	-	-	0%
PG99	CONTINGÊNCIA	200,7	-	-	200,7	-100%	40,1	-	40,1	-100%
<b>Total Reparatórios</b>		<b>9.769,9</b>	<b>374,7</b>	<b>-</b>	<b>9.395,2</b>	<b>-96%</b>	<b>2.713,0</b>	<b>374,7</b>	<b>2.338,3</b>	<b>-86%</b>
<b>Total Programas</b>		<b>10.234,2</b>	<b>403,8</b>	<b>-</b>	<b>9.830,5</b>	<b>-96%</b>	<b>2.809,8</b>	<b>403,8</b>	<b>2.406,0</b>	<b>-86%</b>
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	199,2	21,4	-	177,8	-89%	28,91	21,400	7,5	-26%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	23,5	0,7	-	22,9	-97%	4,0	0,7	3,3	-83%
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>222,7</b>	<b>22,1</b>	<b>-</b>	<b>200,7</b>	<b>-90%</b>	<b>32,9</b>	<b>22,1</b>	<b>10,9</b>	<b>-33%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>10.457,0</b>	<b>425,8</b>	<b>-</b>	<b>10.031,1</b>	<b>-96%</b>	<b>2.842,7</b>	<b>425,8</b>	<b>2.416,8</b>	<b>-85%</b>

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição		
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,0	0,5	-0,5	-49%	Postergação: O desvio negativo de R\$ 1,2MM (sem baixa contábil) do Edital Doce não considera o desembolso de 0,36MM entregue aos proponentes e está projetado no orçamento. Considerando o desembolso o desvio real diminui 30%. Ficando em 0,84MM. Plano de Ação: Apoiar os proponentes que já finalizaram as atividades a realizar a prestação de contas e encerramento do projeto com a Fundação. Aprimorar a curva do avança físico e financeiro do projeto.
PG15	INOVAÇÃO	3,0	0,1	-2,9	-96%	Postergação: Chamada 09/2018: Não houve prestação de contas para os repasses. Plano de Ação: A prestação de contas está prevista para março após necessidade de negociação de prazos de análise com a FAPEMIG.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,8	0,0	-0,7	-95%	Postergação: (R\$ 0,7 M) Casa do Empreendedor: Obra paralisada. Plano de Ação: O Programa está aguardando retorno do Suprimentos sobre nova contratação e, em paralelo, analisando nova solução para entrega da Casa do Empreendedor com repasse direto para a Prefeitura de Mariana (MG). (R\$ 0,5 M) Meliponicultura II - Contrato Tetra Mais: Valor da medição muito abaixo do previsto. Mudança no plano de trabalho alterou o cronograma de desembolsos. Plano de Ação: Negociação com o fornecedor para início da compra das colmeias.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,7	0,2	-0,5	-69%	Postergação: (R\$ 0,6 M) Qualificação Profissional: Medição apenas do SENAI-ES, sem medição do SENAI-MG. Retomada gradual das atividades presenciais. Plano de Ação: A retomada dos cursos presenciais vem ocorrendo de forma gradativa nos municípios com menor taxa Covid-19, o que permitiu iniciarmos 07 turmas no mês de março e programar 09 turmas para iniciar em abril. (R\$ 0,4 M) Recoloca Rio Doce: Valor da medição pode variar de acordo com a quantidade de atendimentos. Baixa performance do fornecedor. Plano de Ação: 1. Foi estabelecido um plano de trabalho com o fornecedor estipulando uma meta de entregas e resultados até maio/22. 2. Retomada das capacitações presenciais tendo 09 turmas sendo executadas em março e 11 turmas programadas para abril.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	9,9	3,8	-6,1	-61%	Postergação: (R\$ 5,4MM) Realizado abaixo do planejado devido a atraso na contratação. Era previsto iniciar as mobilizações em novembro 2021, mas ocorreu apenas em janeiro de 2022, o que gerou baixa performance das contratadas. Baixa performance da parceria com CFV ligada ao MST. (R\$ 1,8M) Priorização do processo de mobilização e validação de áreas em detrimento ao cercamento. (R\$1,2 M) - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o CEPAM. (R\$ 1,4 M) Alteração de escopo com redução do orçamento anual em combate à incidência. Plano de Ação: Revisão da curva de desembolso financeiro. Contratação de serviços para execução de cercamento, alternativa para possível baixa de adesão dos produtores.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	3,3	0,1	-3,2	-98%	Postergação: (R\$ 4,3MM) Realizado abaixo do planejado devido a atraso na contratação. Era previsto iniciar as mobilizações em novembro 2021, mas ocorreu apenas em janeiro de 2022, o que gerou baixa performance das contratadas. (R\$ 0,7 M) Priorização do processo de mobilização e validação de áreas em detrimento ao cercamento. Plano de Ação: Revisão da curva de desembolso financeiro. Ajuste no valor pago ao produtor para a execução do cercamento, sendo mais atrativo.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,5	0,3	-0,3	-52%	Postergação: Atividades CETRAS/MG suspensas por solicitação do IBAMA/CIF, através do Ofício nº9/2022/SUPES-MG. Atividades CETRAS/ES paralisadas desde set-21, após manifestação do IBAMA de que a área indicada para construção será alterada. Plano de Ação: Após definição das novas áreas de construção a serem indicadas pelo IBAMA, tanto em MG quanto ES, revisão do cronograma e curva de desembolso econômica.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	3,8	4,9	1,1	28%	Postergação: 2MM - Municípios não apresentaram as medições conforme previsto em orçamento. Há repasses realizados aguardando prestação de contas. Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos. Plano de Ação: Manter rotina de reuniões com os municípios e ampliar a retomada do apoio técnico presencial.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	6,1	2,2	-3,9	-63%	Postergação: (7,7MM) Adutora-GV - Atraso na contratação dos Pacotes 02 e 03 da Adutora, impactando no início das atividades e inércia da Contratada do Pacote 03 para início dos serviços. Plano de Ação: Adutora-GV : Mobilização do Pacote 02 já iniciada e Pacote 03 atuando na recuperação.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,3	0,1	-1,2	-93%	Não foram recebidas informações sobre os desvios da parte do programa
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,4	0,3	-0,7	-160%	Postergação: (R\$0,58 MM): Transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cheias do PG34 para PG38, após aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 ( a previsão era dez/21). (R\$0,17MM): Perícia prevista para os acordos de repasse recursos para a defesa civil ainda não homologada. +R\$0,07MM: Atividades prevista em dez/21 e execução em fevereiro/22 Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a homologação dos acordos e indicação de perícia.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,1	0,0	-0,1	-57%	Postergação: (R\$ 0,1 MM) - CIT Mariana - Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço e da parceria com Prefeitura Municipal. - CIT GV - Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela Prefeitura Municipal. - CIT Linhares - Atraso das obras devido alterações dos projetos básico/conceitual/executivo.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,2	0,0	-19%	Economia: (R\$ 0,1 MM): processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento previsto. Plano de ação: considerando que houve impacto no escopo foi realizado um aditivo para garantir o atendimento do processo. As divergências serão ponto de atenção nos próximos processos concorrenciais.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,4	0,1	-7,3	-98%	Economia: Antecipação: Postergação: Plano de Ação:
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,2	0,0	-0,1	-72%	Postergação: Atraso das atividades relacionadas ao PRA nos estados de MG e ES, em função da morosidade e indisponibilidade do órgão ambiental de MG nas tratativas da parceria; necessidade de adequação contratual nos contratos de ATER no território 2, responsável pelas atividades de CAR para correta apropriação contábil; Atraso na contratação (parceria) com o IDAF com necessidade de APRD, com consequente atraso nas atividades do PRA no Espírito Santo. Plano de Ação: Acionar os órgãos responsáveis para acelerar as ações do PRA e CAR. Envolver o RI de forma a ter uma estratégia institucional de cobrança. Diligenciar de forma estreita a chancela da minuta e assinatura do termo de cooperação técnica junto ao órgão ambiental do ES; finalizar os ajustes contratuais (aditivo, takeoff, etc) nos contratos de ATER para correta apropriação contábil.
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	26,9	0,3	-27,2	-101%	Postergação: (R\$25MM) repasse primeira parcela Apoio SUS: acordo em negociação com os Estados, para posterior homologação da 1ª vara (R\$5MM) repasse obras emergenciais chuvas: aguardando Estados solicitarem aprovação CIF. (R\$2,4MM) perícia AECOM Agenda Integrada: suspensão desde out-21 pela 12ª vara Plano de Ação Acompanhar com o Jurídico a negociação e homologação dos acordos em andamento e status da perícia.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	Economia: Antecipação: Postergação: Plano de Ação:
<b>Total Compensatórios</b>		<b>65,6</b>	<b>12,1</b>	<b>-53,5</b>	<b>-82%</b>	

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG00	<b>MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS</b>	-	-	-	0%	Economia: Antecipação: Postergação: Plano de Ação: Economia: (R\$ 100MM) Economia referente a contratação da Retomada do Cadastro Fase 2.
PG01	<b>CADASTRO</b>	3,2	1,7	1,5	-47%	Antecipação: Postergação: Plano de Ação: Em desenvolvimento.
PG02	<b>PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS</b>	840,0	16,5	823,5	-98%	Plano de Ação: Homologações do Novel paralisadas na 12ª Vara, em razão da troca entre juizes. As indenizações de Mariana ACP foram impactadas pela entrada do município no Novel. Já o PIM Convencional foi impactado pelo andamento ainda tímido dos atendimentos, iniciados em 06/01.
PG03	<b>POVOS INDÍGENAS</b>	8,3	5,2	3,1	-37%	Antecipação: R\$ 0,7 MM fornecimento água Krenak devido às chuvas e dificuldades logísticas, Postergação: (R\$ 1,7 MM) fornecimento alimentação animal Krenak medição dos serviços prestados no período anterior e manutenção de estradas sob demanda Postergação: (R\$ 5,4 MM), alteração de cronograma do SAA Comboios e Tupiniquim, PBA execução comboios, PBA - fundo monetário coletivo comboios, PBA - fundo retomada economica comboios - Ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI Plano de Ação: Para as ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI ponto 3), foi feita a contratação de uma nova consultoria para a construção do documento. Processo que irá se iniciar em março com previsão de termino em abril. Após esse período os desvios tendem a ser corrigidos.
PG04	<b>POVOS TRADICIONAIS</b>	0,1	0,2	0,1	67%	Antecipação: R\$ 2,2 MM sobre os repasses do Acordo para execução do PBAQ pela Comunidade de Degredo, para o encerramento das obrigações de água. Plano de Ação: Acompanhamento do cronograma de desembolso do repasse da gestão da execução do PBAQ
PG05	<b>PROTEÇÃO SOCIAL</b>	2,2	0,3	2,5	-114%	Plano Demais Municípios: (R\$ 0,9 MM) lançamento contábil indevido. Plano Mariana: (R\$ 1,7 MM) prestação de contas não realizada pelo município, devido a não liberação da verba da conta judicial. Plano de Ação: Plano Mariana: reprogramar no Draft 19. Plano Demais Municípios: acompanhar regularização no lançamento contábil (março)
PG06	<b>PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO</b>	11,9	5,0	6,9	-58%	(+) R\$ 0,8 MM - Canais de relacionamento: . Antecipação: Ampliação da capacidade de atendimento do 0800 em atendimento a deliberação. Plano de Ação: antecipação do processo concorrential para manutenção dos serviços. (-) R\$ 0,6 MM - Participação e diálogo: Postergação: Execução a menor decorrente da reprogramação necessária do programa destacando principalmente a realização dos fóruns de prestação de contas e implantação da plataforma interativa. Plano de Ação: Revisão das entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária. (-) R\$ 0,7 MM - Comunicação: Economia: Em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo distribuídos apenas em versão digital, Contratos sob demandas não executados. Postergação: Atividades presenciais que não estão sendo realizados. Plano de Ação: Retorno da distribuição do material impresso gradativamente e reclassificação de lançamento indevido no Dr de Jornal da comunidade. (+) R\$ 0,1 MM - Ouvidoria: Valor realizado superior ao orçado, visto que ocorreram apropriações de gastos referentes aos centros de custos das gerências: Compliance e Ouvidoria. Plano de Ação: Realização de take-off com as áreas envolvidas para correção do contrato (-) R\$ 9,6 MM - Assessorias técnicas: Postergação: Atraso no carregamento de documentos no SAP, em andamento. Contratação das Assessorias técnicas continua judicializada. Plano de Ação: Redimensionar a equipe para ser priorizado o carregamento dos documentos apresentados pelas Assessorias técnicas.
PG07	<b>ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS</b>	0,7	0,2	0,5	-69%	Postergação: Custos com manutenções estruturais nas fazenda, atraso nas medições/emissão de nota de hospital e clínica veterinárias externas; Verba sob demanda destinada à aquisição de animais. Sem ocorrência de aquisição nos meses de jan e fev/22. Plano de Ação: 1. Manutenções estruturais - Em andamento realização de contratação e mobilização de contratos suportes para execução das manutenções; 2. Compra de animais - Aguarda validação da estratégia de compra junto à Diretoria. <b>Economia:</b> - Antecipação: - Novas Moradias Familiar (+7,0MM) - Houve aquisições de Imóveis, Compra Assistidas acima do previsto no período. <b>Postergação:</b> - Novas Moradias Bento (-17,9MM) - Chuva muito acima do previsto para este período do ano; - Novas Moradias Paracatu (-17,6MM) - Desvio em função de rescisão Contratual e Contratadas não performando conforme previsto. - Custos Covid (-15,8MM) - Menor custo realizado no período. A curva será ajustada ao longo de 2022 de acordo com os protocolos sanitários; - Contêntes Bento (-7,9MM) - Chuva muito acima do previsto para este período do ano. - Infraestrutura Bento (-7,9MM) - Obras de infraestrutura remanescente em pacote a ser contratado até Março/2022; - Condicionantes Paracatu (-6,2MM) - Menor valor em Camar / RCC_Ecoponto e Estação Ferroviária MSH - Em fase de contratação; - Gestoria (-4,4MM) - Valor previsto não ocorreu, em função de definições judiciais que paralisaram Compras, Contratações, Obras e Serviços. - Contingência (-4,2MM) - Contingência orçada para o período não utilizada - Instalações Provisórias Bento (-3,9MM) - Crédito referente a reclassificação de custo da SERENG com o pacote Engenharia Bento no ano 2021/2022; - Equip Públicos Paracatu (-2,4MM) - Aguardando definição estratégica para contratação do Pacote de Contratação - Diversos (-2,4) - Valor previsto com a AECOM e não realizado e reajuste de contratos lançados nos pacotes dos serviços. - Aterro Sanitário Bento (-2,2MM) - Chuvas ocorridas em Jan/2022 acima do previsto no planejamento das contratadas. - Outros (-9,4MM) - Iluminação pública Bento (-1,8MM), Benfeitorias Bento (-1,2MM), Iluminação Pública Paracatu (-1,1MM) e outros (-5,3MM). <b>Plano de Ação:</b> - Novas Moradias   Contêntes - Traçar plano de recuperação junto às contratadas. - Custo Covid - A curva será ajustada no Draft19, de acordo com os protocolos sanitários; - Infra Bento e Condicionantes Paracatu - Concluir a contratação ainda em Março/22, permitindo a execução das obras.
PG08	<b>REASSENTAMENTO</b>	132,3	83,1	49,2	-37%	<b>Economia:</b> - Antecipação: - Novas Moradias   Contêntes - Traçar plano de recuperação junto às contratadas. - Custo Covid - A curva será ajustada no Draft19, de acordo com os protocolos sanitários; - Infra Bento e Condicionantes Paracatu - Concluir a contratação ainda em Março/22, permitindo a execução das obras. <b>Economia:</b> Antecipação: Postergação: (R\$ 39MM) Serviços em fase de contratação / mobilização. Menor volume de medições dos serviços da Reparação da UHE; infraestrutura das Pilhas; Reorço do Barramento Principal; serviços de manutenção; limpeza da obra, vegetação meio ambiente. A Remoção de Sedimentos está atrasada em relação ao cronograma inicial. Começou somente em fevereiro não atingindo a produtividade ideal. Plano de Ação: Mobilização de contratadas em andamento. Projeção de aumento da performance de execução a partir do mês de maio. <b>Postergação: (8,6MM)</b> Recons. Estr. Rurais - Baixa performance do fornecedor aliado ao atraso no processo de contratação. Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações sofreram pelo excesso de chuvas e paralisações municipais. Obras das Pontes e Campos de futebol estão prejudicadas pelo atraso no processo de contratação. <b>Plano de Ação:</b> Foram utilizados contratos guarda chuva em andamento, para execução de serviços emergenciais. Novas contratações foram planejadas de forma a mitigar as perdas. Além das ações junto às contratadas visando o ganho de performance. Economia Real: - Aluguel: IGP-M acumulado janeiro menor que o projetado no Draft 18. (-12.000,00) - 1% do desvio total Postergação: - Transporte escolar; Plataforma de Paracatu e Pedagógico: - Serviços realizados, porém não foram medidos e/ou notas fiscais emitidas em tempo hábil no mês de fevereiro/2021. ( R\$232.000,00+ R\$ 80.000,00+ 21.0000,00) - 33,4% do desvio total); - Psicopedagógico Institucional: Dificuldade em realizar o planejamento presencial com as escolas em Barra Longa , devido ao impedimento da entrada da Renova no município (R\$40.000,00) - 4,0% do desvio; Plano de Ação: - Transporte Escolar/ Plataforma de Paracatu Pedagógico: Reforçar com o fornecedor que todo processo de medição e emissão de NF deve acontecer no mês da prestação do serviço. Desvio será corrigido em março/2022; - Psicopedagógico: Maior presença do fornecedor junto as escolas para execução das formações/oficinas a partir de abril/2022- recuperação do desvio em jun/2022.
PG09	<b>UHE CANDONGA</b>	38,3	15,5	22,8	-60%	Postergação: (R\$ 39MM) Serviços em fase de contratação / mobilização. Menor volume de medições dos serviços da Reparação da UHE; infraestrutura das Pilhas; Reorço do Barramento Principal; serviços de manutenção; limpeza da obra, vegetação meio ambiente. A Remoção de Sedimentos está atrasada em relação ao cronograma inicial. Começou somente em fevereiro não atingindo a produtividade ideal. Plano de Ação: Mobilização de contratadas em andamento. Projeção de aumento da performance de execução a partir do mês de maio. <b>Postergação: (8,6MM)</b> Recons. Estr. Rurais - Baixa performance do fornecedor aliado ao atraso no processo de contratação. Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações sofreram pelo excesso de chuvas e paralisações municipais. Obras das Pontes e Campos de futebol estão prejudicadas pelo atraso no processo de contratação. <b>Plano de Ação:</b> Foram utilizados contratos guarda chuva em andamento, para execução de serviços emergenciais. Novas contratações foram planejadas de forma a mitigar as perdas. Além das ações junto às contratadas visando o ganho de performance. Economia Real: - Aluguel: IGP-M acumulado janeiro menor que o projetado no Draft 18. (-12.000,00) - 1% do desvio total Postergação: - Transporte escolar; Plataforma de Paracatu e Pedagógico: - Serviços realizados, porém não foram medidos e/ou notas fiscais emitidas em tempo hábil no mês de fevereiro/2021. ( R\$232.000,00+ R\$ 80.000,00+ 21.0000,00) - 33,4% do desvio total); - Psicopedagógico Institucional: Dificuldade em realizar o planejamento presencial com as escolas em Barra Longa , devido ao impedimento da entrada da Renova no município (R\$40.000,00) - 4,0% do desvio; Plano de Ação: - Transporte Escolar/ Plataforma de Paracatu Pedagógico: Reforçar com o fornecedor que todo processo de medição e emissão de NF deve acontecer no mês da prestação do serviço. Desvio será corrigido em março/2022; - Psicopedagógico: Maior presença do fornecedor junto as escolas para execução das formações/oficinas a partir de abril/2022- recuperação do desvio em jun/2022.
PG10	<b>INFRAESTRUTURA IMPACTADA</b>	8,3	2,3	6,1	-73%	Postergação: (R\$ 39MM) Serviços em fase de contratação / mobilização. Menor volume de medições dos serviços da Reparação da UHE; infraestrutura das Pilhas; Reorço do Barramento Principal; serviços de manutenção; limpeza da obra, vegetação meio ambiente. A Remoção de Sedimentos está atrasada em relação ao cronograma inicial. Começou somente em fevereiro não atingindo a produtividade ideal. Plano de Ação: Mobilização de contratadas em andamento. Projeção de aumento da performance de execução a partir do mês de maio. <b>Postergação: (8,6MM)</b> Recons. Estr. Rurais - Baixa performance do fornecedor aliado ao atraso no processo de contratação. Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações sofreram pelo excesso de chuvas e paralisações municipais. Obras das Pontes e Campos de futebol estão prejudicadas pelo atraso no processo de contratação. <b>Plano de Ação:</b> Foram utilizados contratos guarda chuva em andamento, para execução de serviços emergenciais. Novas contratações foram planejadas de forma a mitigar as perdas. Além das ações junto às contratadas visando o ganho de performance. Economia Real: - Aluguel: IGP-M acumulado janeiro menor que o projetado no Draft 18. (-12.000,00) - 1% do desvio total Postergação: - Transporte escolar; Plataforma de Paracatu e Pedagógico: - Serviços realizados, porém não foram medidos e/ou notas fiscais emitidas em tempo hábil no mês de fevereiro/2021. ( R\$232.000,00+ R\$ 80.000,00+ 21.0000,00) - 33,4% do desvio total); - Psicopedagógico Institucional: Dificuldade em realizar o planejamento presencial com as escolas em Barra Longa , devido ao impedimento da entrada da Renova no município (R\$40.000,00) - 4,0% do desvio; Plano de Ação: - Transporte Escolar/ Plataforma de Paracatu Pedagógico: Reforçar com o fornecedor que todo processo de medição e emissão de NF deve acontecer no mês da prestação do serviço. Desvio será corrigido em março/2022; - Psicopedagógico: Maior presença do fornecedor junto as escolas para execução das formações/oficinas a partir de abril/2022- recuperação do desvio em jun/2022.
PG11	<b>RECUPERAÇÃO ESCOLAS</b>	0,5	0,1	0,4	-71%	Postergação: (R\$ 39MM) Serviços em fase de contratação / mobilização. Menor volume de medições dos serviços da Reparação da UHE; infraestrutura das Pilhas; Reorço do Barramento Principal; serviços de manutenção; limpeza da obra, vegetação meio ambiente. A Remoção de Sedimentos está atrasada em relação ao cronograma inicial. Começou somente em fevereiro não atingindo a produtividade ideal. Plano de Ação: Mobilização de contratadas em andamento. Projeção de aumento da performance de execução a partir do mês de maio. <b>Postergação: (8,6MM)</b> Recons. Estr. Rurais - Baixa performance do fornecedor aliado ao atraso no processo de contratação. Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações sofreram pelo excesso de chuvas e paralisações municipais. Obras das Pontes e Campos de futebol estão prejudicadas pelo atraso no processo de contratação. <b>Plano de Ação:</b> Foram utilizados contratos guarda chuva em andamento, para execução de serviços emergenciais. Novas contratações foram planejadas de forma a mitigar as perdas. Além das ações junto às contratadas visando o ganho de performance. Economia Real: - Aluguel: IGP-M acumulado janeiro menor que o projetado no Draft 18. (-12.000,00) - 1% do desvio total Postergação: - Transporte escolar; Plataforma de Paracatu e Pedagógico: - Serviços realizados, porém não foram medidos e/ou notas fiscais emitidas em tempo hábil no mês de fevereiro/2021. ( R\$232.000,00+ R\$ 80.000,00+ 21.0000,00) - 33,4% do desvio total); - Psicopedagógico Institucional: Dificuldade em realizar o planejamento presencial com as escolas em Barra Longa , devido ao impedimento da entrada da Renova no município (R\$40.000,00) - 4,0% do desvio; Plano de Ação: - Transporte Escolar/ Plataforma de Paracatu Pedagógico: Reforçar com o fornecedor que todo processo de medição e emissão de NF deve acontecer no mês da prestação do serviço. Desvio será corrigido em março/2022; - Psicopedagógico: Maior presença do fornecedor junto as escolas para execução das formações/oficinas a partir de abril/2022- recuperação do desvio em jun/2022.
PG12	<b>MEMÓRIA HISTÓRICA</b>	0,6	0,5	0,1	-15%	Postergação: 12% do desvio é relativo a reprogramação do avanço físico de atividades de educação patrimonial, casa dos saberes e plano de reparação, decorrente da pandemia e 88% mudança de solução decorrente da não formalização da parceria com o Instituto Pedra Plano de Ação: Estabelecer nova parceria com Escola de Ofícios e lançamento do Edital Doce - Modalidade 3, estabelecimento de um contrato de manutenção predial para os imóveis e capelas.
PG13	<b>TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE</b>	0,1	0,4	0,3	198%	Antecipação: início das ações de promoção dos polos turísticos; e do projeto de fomento ao empreendedorismo inicialmente previstas para o segundo semestre de 2022. Plano de Ação: Manter a antecipação ações de promoção e fomento ao empreendedorismo.
PG14	<b>SAÚDE</b>	2,5	0,2	2,3	-92%	Economia: (R\$ 0,2 MM) Plano Mariana Contexto: Os valores planejados à empresa terceirizada Contexto não foram realizados Postergação: (R\$2,2 MM) Plano Mariana: prestação de contas não realizada pelo município, devido a não liberação da verba da conta judicial. Plano de Ação: Reprogramar Draft 19
PG16	<b>PESCA</b>	1,7	1,6	0,1	-7%	Postergação: (R\$ 3,7 MM) Parceria Fundação Espírito Santense de Tecnologia - Regularização contábil (-); Atraso no processo de medição devido inconsistências na documentação apresentada. Plano de Ação: 1. Notificar parceiro para cumprimento do manual de prestação de contas. 2. Medição de 50% do desvio acumulado no mês março/22.

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	12,4	3,8	8,6	-69%	<p>Economia: Encerramento do fornecimento de silagem a montante e redução no fornecimento de 7 produtores a jusante após pericia.</p> <p>Postergação: Atraso no cronograma devido baixa performance de contratadas nas atividades de ATER (elaboração dos projetos de recuperação do solo). Impactos da paralisação por 15 dias das atividades de Barra Longa. Atraso na contratação das mini-etes.</p> <p>Plano de Ação: Para as atividades de ATER, notificar as contratadas quanto a recuperação do atraso das entregas dos projetos. Reuniões diretamente com os prepostos e/ou Diretorias, emitindo notificações quando necessário. As atividades impactadas pela paralisação em Barra Longa, a ação será replanejamento das atividades, mantendo a meta anual.</p> <p>INFRAESTRUTURA:</p> <p>Economia: Eletrificação Rural - A mudança do fornecedor ENGELIG pela contratação direta com a CEMIG, está gerando uma economia de aprox. 50%.</p> <p>Postergação: Estr. Rurais Complexas - A rescisão unilateral da contratada e o atraso na contratação forçaram adiamento do término.</p> <p>Plano de Ação: Estruturas Rurais - Novas contratações em 3 Pacotes, aliado à gestão mais efetiva junto as contratadas.</p>
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,6	0,5	0,1	-20%	<p>Postergação: (R\$ 0,2 M) Assessoria Técnica Foz (Linhares/ES) - Contrato Instituto Euvaldo Lodi: Valor da medição abaixo do previsto (os valores das medições podem variar de acordo com a quantidade de atendimentos no período). Execução menor que a prevista no período devido a dificuldade na mobilização dos negócios onde muitos condicionam qualquer atendimento ao pagamento das indenizações.</p> <p>Plano de Ação: Divulgar os resultados das ações ofertadas aos negócios da primeira fase, atreladas a consultoria do IEL (Insunoms e Equipamentos / Design Gráfico) visando a adesão de novos negócios. Ação em andamento e com a adesão de novos negócios.</p>
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	36,7	5,7	31,1	-85%	<p>Não realização dos laudos e georreferenciamento previstos para o Novel devido as solicitações serem de natureza informal, o que não caracteriza elaboração de Laudo e Georreferenciamento. Paralisação do envio de Cartas do Sistema Identitário devido a solicitantes que ingressaram no Novel, novas localidades e novas categorias de pleitos sentenciados reduzindo assim o número estimado de envio de cartas.</p> <p>BARRAMENTO:</p> <p>Postergação: Desvio de R\$7,3MM. Atrasos nos processos de contratação. Atividades sob demanda, sem execução no período.</p> <p>Plano de ação: Acelerar processos de contratação.</p> <p>PROGRAMA:</p> <p>Postergação:</p>
PG23	MANEJO DE REJEITOS	16,8	9,5	7,2	-43%	<p>-Atividades de risco a saúde humana Postergação devido a não aprovação pela CT-GRSA sobre os documentos de metodologias e técnicas aplicados a análise de risco, o que não permite a execução da etapa 1b prevista no orçamento.</p> <p>Atraso na entrega do memorando técnico em resposta ao questionamento da CT nº21/2021. Sem demanda no período para contratação da EcoSoft ( serviços de consultoria e análises).</p> <p>-Contrato da Novel no processos devidos a não homologação por parte da 12 vara.</p> <p>-Contratos sob demanda (Golder, Tetra Tech e NHC). Golder teve uma entrega do plano de trabalho de monitoramento intracalha no prazo, mas inclusão na medição fora do período. Além de atraso na prestação de contas da Parceria da UFV</p> <p>Plano de Ação:</p> <p>Reprogramação a partir das decisões judiciais sobre os temas projetados no orçamento e cronograma, para os temas judicializados.</p> <p>Gerir junto aos gestores um plano de ação junto às contratadas, aplicar ferramentas contratuais de notificação, diligenciar as contratações de forma a trazer mais aderência física e financeira.</p>
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	2,2	0,1	2,1	-96%	<p>Economia:</p> <p>Antecipação:</p> <p>Postergação: (R\$ 20 MM) Obra do Dique 04 postergada para 2023.</p> <p>Plano de Ação: O projeto básico do descomissionamento S4 já está sendo finalizado. Valor do orçado R\$ 1MM x R\$ 0,8MM realizado.</p>
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,9	2,4	0,5	-17%	<p>Antecipação: R\$ 0,54 M</p> <p>R\$ 0,53 M Pedido Ambiental, que não tinha previsão de desembolso em 2022, foi renovado para manutenção das áreas do PG25 e implantação das nascentes e tributários.</p> <p>R\$ 0,01 M Desembolso Análises (Fund. Arthur Bernardes) maior que o previsto.</p> <p>Postergação: (R\$ 1,58 M)</p> <p>(R\$ 0,15 M) Desembolso Conv. Recup. ecológica área ambiental 1 menor que o previsto.</p> <p>(R\$ 0,14 M) Desembolso Monitoramento Aéreo menor que o previsto. Desembolso Monitoramento Ecológico - 2021 a 2022 não realizado, pois a contratação está atrasada, Kick off foi em 10/02 e a empresa está em mobilização.</p> <p>(R\$ 0,66 M) Desembolso Restauro Florestal menor que o previsto devido às chuvas Jan/22. Previsão de contratação de PUs e Pequenas Compras (PÓS CANDONGA) não realizados.</p> <p>(R\$ 0,18 M) Desembolso previsto PSA Áreas impactadas não realizado. Alteração da data anual de pagamento.</p> <p>(R\$ 0,40 M) Desembolso Manutenção de Cercamento menor que o previsto devido às chuvas Jan/22. Previsão fornecimento de postes de eucalipto não realizado no mês, o pedido foi cancelado.</p> <p>(R\$ 0,03 M) Previsão Vigilância e Segurança Privada MG (Anjos da Guarda/aditivo) não realizado no mês. Valor é rateado entre os programas.</p> <p>(R\$ 0,12 M) Desembolso previsto de Regularização dos Tributários (a contratar) não realizado. Serviço relacionado ao PG23, não será contratado no PG25.</p> <p>Plano de Ação: Revisão do orçamento para adequação conforme cronograma replanejado em alinhamento com a nova estruturação do PG25 e Plano de ação de recuperação do atraso na execução de restauro e cerca.</p>
PG28	BIODIVERSIDADE	2,6	0,6	2,0	-77%	<p>Postergação: (R\$2,17 MM): início das atividades da Ambipar (monitoramento anexo I) iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta pelo ICMBio.</p> <p>(R\$0,37 MM): atraso na execução do Plano de Ação Integrado, em fase de discussão e aprovação na CT-Bio.</p> <p>(R\$ 0,39 MM): contrato SIF UFV com atraso na primeira parcela do desembolso, ocasionado pelo atraso da aprovação da prestação de contas do ACT anterior.</p> <p>(R\$0,11 MM): não houve necessidade da demanda de grupo de especialista planejada.</p> <p>Plano de Ação: Reforçar junto ao Jurídico o pedido de obtenção de ABio para realização das coletas; demais desvios estão sendo tratados administrativamente.</p>
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	4,8	2,1	2,7	-57%	<p>Postergação: (R\$2,45 MM): atraso nas atividades de monitoramento flora e fauna período chuvoso 2021/2022 devido às fortes chuvas de janeiro em MG e impacto COVID</p> <p>(R\$0,34 MM): lançamento contábil para reversão da provisão FBDS realizada em dez/21</p> <p>(R\$0,17 MM): Serviços sob demanda e não houve necessidade de acionamento dos contratos no período</p> <p>(R\$0,19 MM): priorização de produtos de outra parceria da FR, adiou-se a entrega prevista que será incluída na próxima prestação de contas;</p> <p>Plano de Ação: Conclusão das campanhas que estão em execução e efetivação das medições</p>
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	11,7	8,5	3,2	-28%	<p>* Os valores orçados (MOP18/Ago-21) estão acima dos valores contratados para monitoramento</p> <p>Postergação: (9,3MM) Adutora-GV - Atraso na contratação dos Pacotes 02 e 03 da Adutora, impactando no início das atividades e inércia da Contratada do Pacote 03 para início dos serviços. Infra-GV - Atraso na contratação do novo Contrato Guarda-Chuva / MG, no qual estão previstas 2 obras da APRO 153/2021.</p> <p>Engenharia - atividades de sondagem/topografia/batimetria: aguardando decisão judicial</p> <p>Infra RD - Atividades aguardando deliberações externas   baixa performace do fornecedor   Baixa aderência das empresas no processo de contratação.</p> <p>Plano de Ação: Adutora-GV : Mobilização do Pacote 02 já iniciada e Pacote 03 atuando na recuperação. Infra-GV: Reuniões periódicas com a área de Suprimentos da FR visando agilidade no processo de Contratação.</p> <p>Engenharia: atividade sondagem/toografia/batimetria : N/A</p> <p>Infra RD: Suprimentos realizando uma nova rodada de negociação com os fornecedores, setores atuando constantemente em reuniões para conseguir deliberações externas.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	<p>Economia:</p> <p>Antecipação:</p> <p>Postergação:</p>
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	3,0	2,0	0,9	-32%	<p>Plano de Ação:</p> <p>Postergação: R\$0,58 MM: transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cheias do PG34 para PG38, após aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 (a previsão era dez/21).</p> <p>(R\$1,12): atraso na entrega de relatórios técnicos pelas consultorias Rhama/SRK e de laudos do PMQACH.</p> <p>Plano de Ação: Plano de ação juntos aos fornecedores para entrega e medição de relatórios e laudos em atraso.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,4	0,4	0,0	-11%	<p>Reparatório (cláusula 181)</p> <p>Postergação: Readequação do cronograma de entregas que ocasionou o atraso no pagamento do fornecedor.</p> <p>Plano de Ação: Readequar cronograma e promover aprovação de produtos</p>
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	23,3	26,4	3,1	13%	<p>Economia:</p> <p>Antecipação:</p> <p>Postergação:</p> <p>Plano de Ação:</p>
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-	0%	N/A.

Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG99	CONTINGÊNCIA	33,1	-	33,1	-100%	Economia: Antecipação: Postergação: Plano de Ação:
<b>Total Reparatórios</b>		<b>1.201,6</b>	<b>194,2</b>	<b>1.007,4</b>	<b>-84%</b>	
<b>Total Programas</b>		<b>1.267,1</b>	<b>206,2</b>	<b>1.060,9</b>	<b>-84%</b>	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	14,72	10,42	4,30	-29%	- Serviços contratados: Orçamento previsto em Janeiro para Consultoria Jurídica e Honorários Periciais, realizado entrará ao longo do ano de 2022. - Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, salários e encargos. - Replanejamento despesas diversas e despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e continuidade das atividades de forma remota devido ao cenário Covid-19.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	2,0	0,3	1,7	-84%	Economia: (R\$ 2,4 MM) Câmaras Técnicas; (R\$ 0,7 M) Custeio Atingidos Reuniões; (R\$ 0,2 M) CIF; (R\$ 0,1 M) Auditoria.
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>16,7</b>	<b>10,7</b>	<b>6,0</b>	<b>-36%</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>1.283,8</b>	<b>217,0</b>	<b>1.066,8</b>	<b>-83%</b>	

\*Valores em milhões de reais.
