



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Março/2022

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>20</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>27</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>34</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>42</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>51</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>91</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>101</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>118</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>142</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>151</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>160</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>167</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>174</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>181</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>188</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>196</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>207</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>215</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>222</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>230</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>236</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>245</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>252</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>258</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>265</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>272</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>278</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>284</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>297</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>306</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>312</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>319</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>325</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>333</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>343</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>351</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>358</u>
Glossário	<u>365</u>
Gestão Econômica*	<u>372</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em março de 2022, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em março foi realizado o protocolo do Relatório Trimestral de consistência dos dados (QA/QC) do PMQQS referente aos meses de outubro a dezembro/21, da Proposta de Escopo do Projeto de Monitoramento de Cheias do Rio Gualaxo do Norte, em atendimento ao Item 4 da Deliberação CIF nº 572 e protocolo do Relatório Final “Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte”, em atendimento à Deliberação CIF nº 310. Foi realizado ainda reunião com o GTA-PMQQS realizada em 11/03 para discussões sobre o desenvolvimento do novo protótipo do portal Monitoramento Rio Doce (PG038, pág. 333).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 236). Em março, foi realizado reuniões com o GTBaixo Doce – fechamento de 2 anos de estudos na região deltaica do ES, em atendimento a NT CT-GRSA nº 05/2019 e Gerencial CT-GRSA - esclarecimentos Nota Técnica CT-GRSA nº 21/2021 (Item 10.1 do Eixo Prioritário 1). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 118) a qual, até o mês de março, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 91), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 392 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.733 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito (PG017, pág. 196).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 252) e de Nascentes (pág. 258). Em março ocorreu a assinatura do Termo de compromisso com o Governo do Estado do Espírito Santo para a Restauração de 5.190 hectares, sendo 2000 hectares em Baixo Guandu e Afonso Claudio e 3190 hectares para Afonso Claudio e Brejetuba. No âmbito do PG27, houve divulgação dos programas 26 e 27 para a rádio local do município de Mutum – MG.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.916 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.397 famílias e 98.254 pessoas, desde o início do programa até março/2022.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de março, em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 746 indenizações, o que representa 98% do total das 760 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 230), atualmente existem 6.581 pessoas assistidas, com um total de 3.051 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 27) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 34). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, além disso, receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, houve a entrega da versão final do PBAQ, em versões impressa e digital, para a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo e para o sistema CIF, publicação da agenda cultural da comunidade, atividade vinculada ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ, realização de oficinas culturais para planejamento e organização das manifestações “quadrilha” e “fórró”, atividades vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ, Incentivo às manifestações culturais, ensaios do jongo de São Benedito, atividades vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 42) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 174) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve o último repasse financeiro para suplementação de recursos humanos para atendimento às famílias vulneráveis do município de Itueta, além da conclusão do plano de reparação no município de Ipaba.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 51; PG035, pág. 319 e PG036, pág. 325), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 284), em março de 2022 foram repassados R\$ 1.629.337,92 para ações dos municípios de Dionísio, Ipatinga, Rio Doce, São Domingos do Prata e consórcio CONDOESTE.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 142), em março ocorreu Conclusão das instalações dos tanques na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Parque de Exposição de Barra Longa, Conclusão da aplicação de asfalto CBUQ na obra do Acesso ao Parque de Exposição de Barra Longa e conclusão de 5 estruturas rurais complexas pelo contrato RBAR acionado em 17/01/22.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 101) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de março:

Bento Rodrigues — em março, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Paracatu de Baixo — em março, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Gesteira — em março, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em março, não houve fatos relevantes a serem reportados.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	127	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	2	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- maio de 2022 ● Contestações Fluxo Novel
- maio de 2022 ● Finalização do universo de cadastros de impactados remanescentes de Mariana
- maio de 2022 ● Laudos Fluxo Novel
- dezembro de 2022 ● Atender solicitantes de 2017 - 2019

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 167.418 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 34.916 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.397 famílias e 98.254 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Retomada do Cadastro Fase 2 - eixo 7 -conforme decisão judicial da 12o Vara Federal Civil / MG

Total de Cadastros liberados: 1.326

Total de Pesquisas Aplicadas da Lista de 2019 (Universo de 79): 89 pesquisas realizadas

Total de Pesquisas Aplicadas da Lista de 2020 (Universo de 177): 163 pesquisas realizadas

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Gráfico Mensal




Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Gráfico Mensal

Indicadores

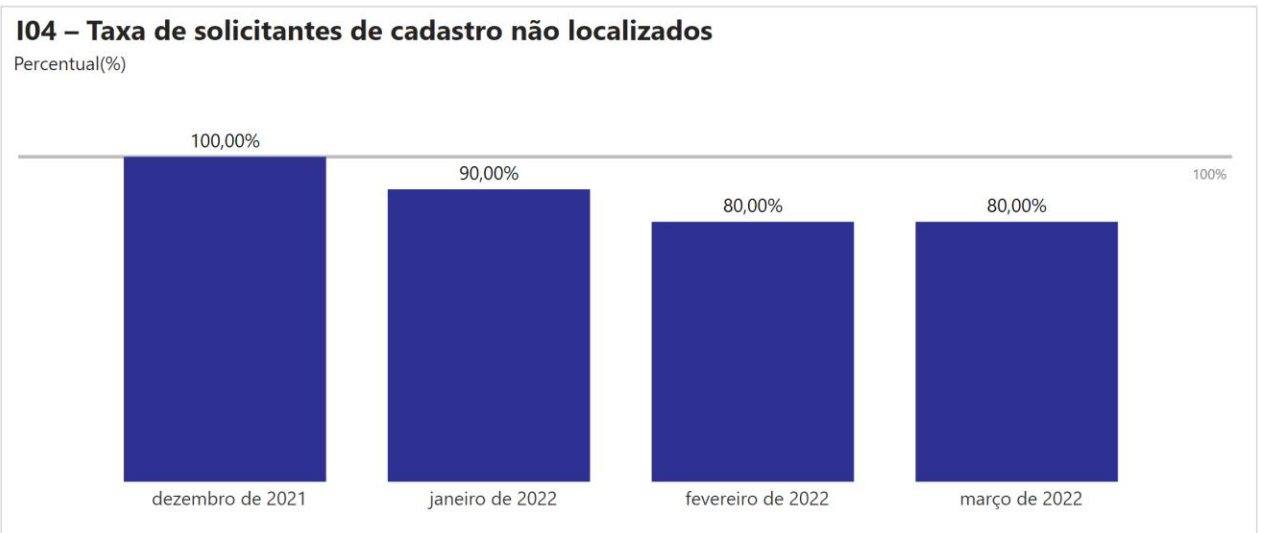


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Gráfico Mensal

Indicadores de Acompanhamento

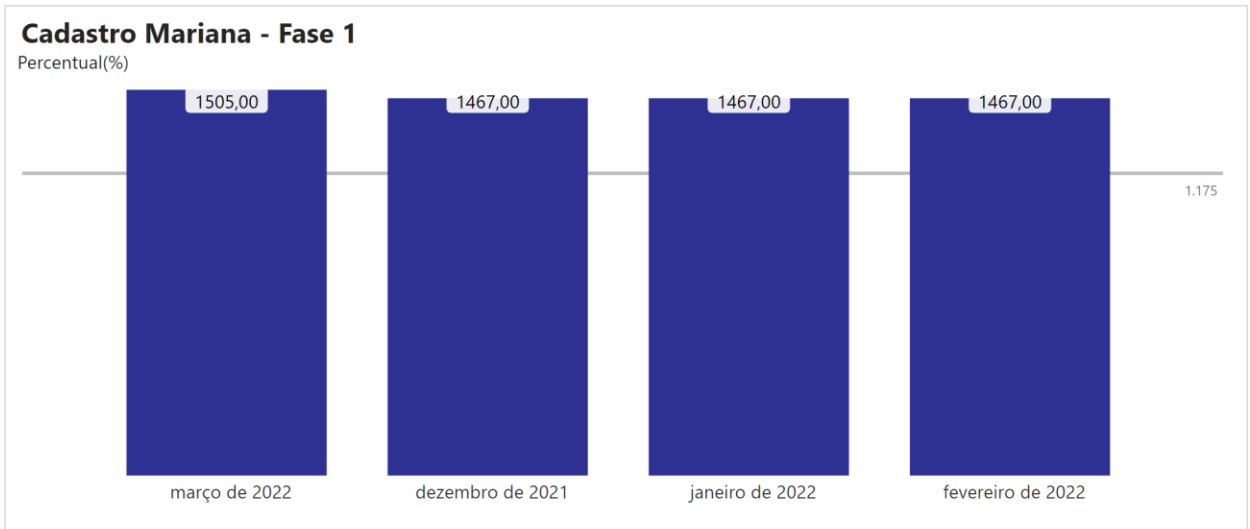


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Gráfico Mensal

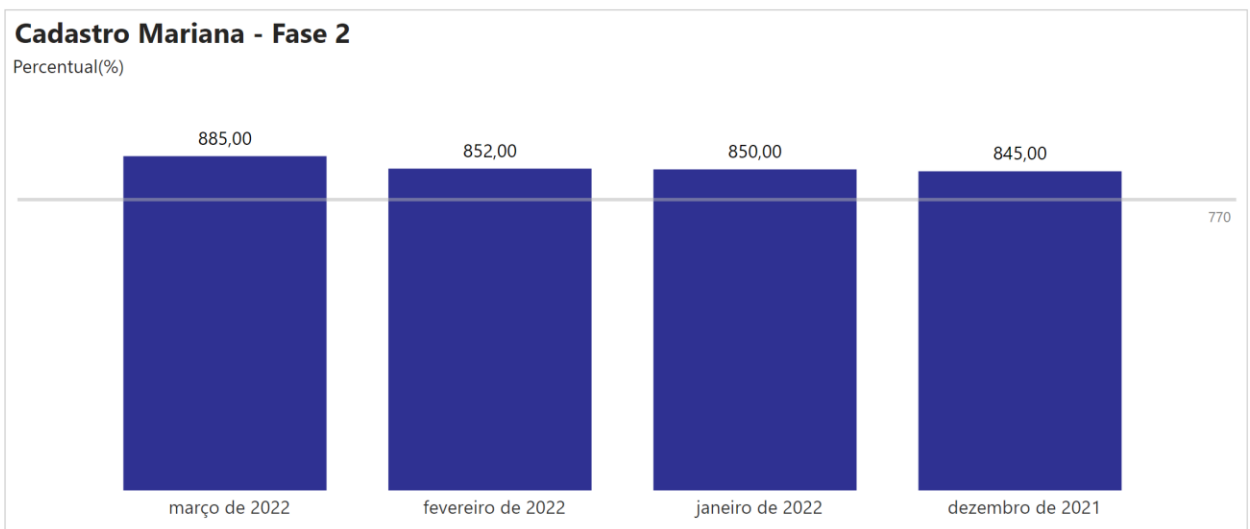


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Gráfico Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 264.996 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 303,76 Mi**.
- **Para Danos Gerais**, 10.624 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.677 já foram pagos (100,5% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.668,41 Mi**.
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 746 indenizações, o que representa 98% do total das 760 propostas aceitas.

Nota: A quantidade de propostas pagas de Dano Água que foi reportada no relatório referente à Fev/22 estava incorreta e o correto é 264.996.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 56.548 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 746 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98% do total das 760 propostas aceitas. Foram 08 indenizações pagas no mês.

Indicadores

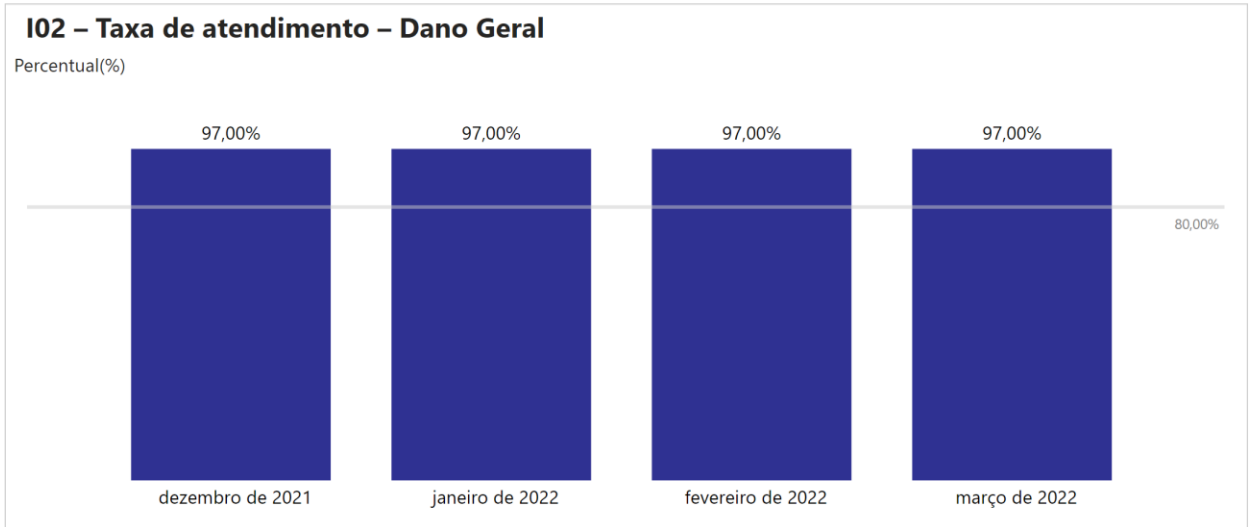


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

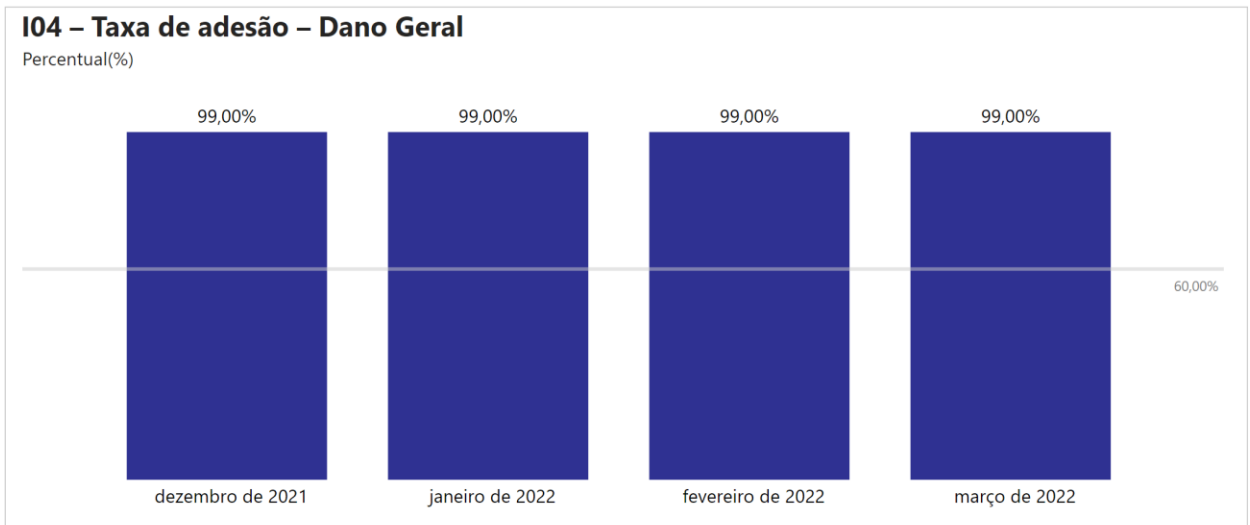


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

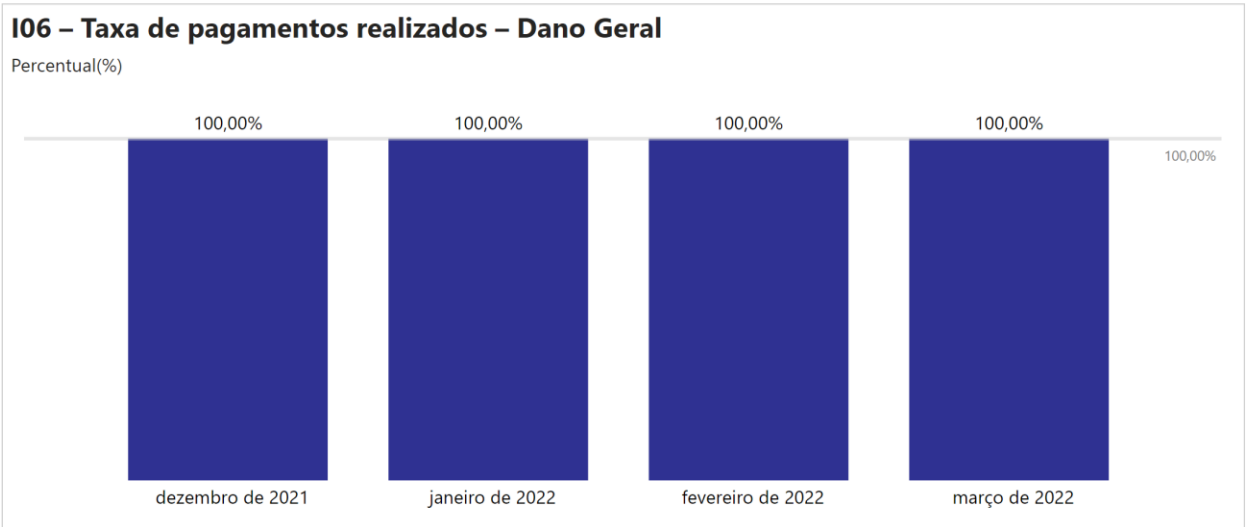


Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- junho de 2022 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- junho de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- junho de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)
- outubro de 2022 ● Finalização da execução da proposta do FAIC

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.043 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.640 m³).

Comboios

No mês de março ocorreram oficinas para revisão participativa do Plano Básico Ambiental (PBA) para a TI Comboios.

Validação de 9 programas presentes no PBAI TI Comboios em 31.03.2022.

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 35.960 litros distribuídos nos dias 24 de fevereiro, 03 10 e 17 de março de 2022 (total de 1798 galões de 20 litros).

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/02/2022 até 20/03/2022. no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/02/2022 até 20/03/2022.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/02/2022 até 20/03/2022.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/02/2022 até 20/03/2022.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo






Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	50	caput	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	355	1	Em Andamento
Deliberação	300	1	Judicializado
Deliberação	300	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Judicializado
Deliberação	493	2	Judicializado
Deliberação	493	3	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado

Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado

Entregas do ano de 2022

- janeiro de 2022  Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
- novembro de 2022  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
- dezembro de 2022  Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Realização de pesquisa etnográfica na comunidade, atividade vinculada ao PG01 – Documentação de referências culturais PBAQ.

Realização de oficinas culturais para planejamento e organização das manifestações “quadrilha” e “forró”, atividades vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ.

Publicação da agenda cultural da comunidade, atividade vinculada ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ

Incentivo às manifestações culturais, ensaios do jongo de São Benedito, atividades vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ.

Entrega da versão final do PBAQ, em versões impressa e digital, para a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo e para o sistema CIF

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Reprogramado
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	533	4	Judicializado

Entregas do ano de 2022

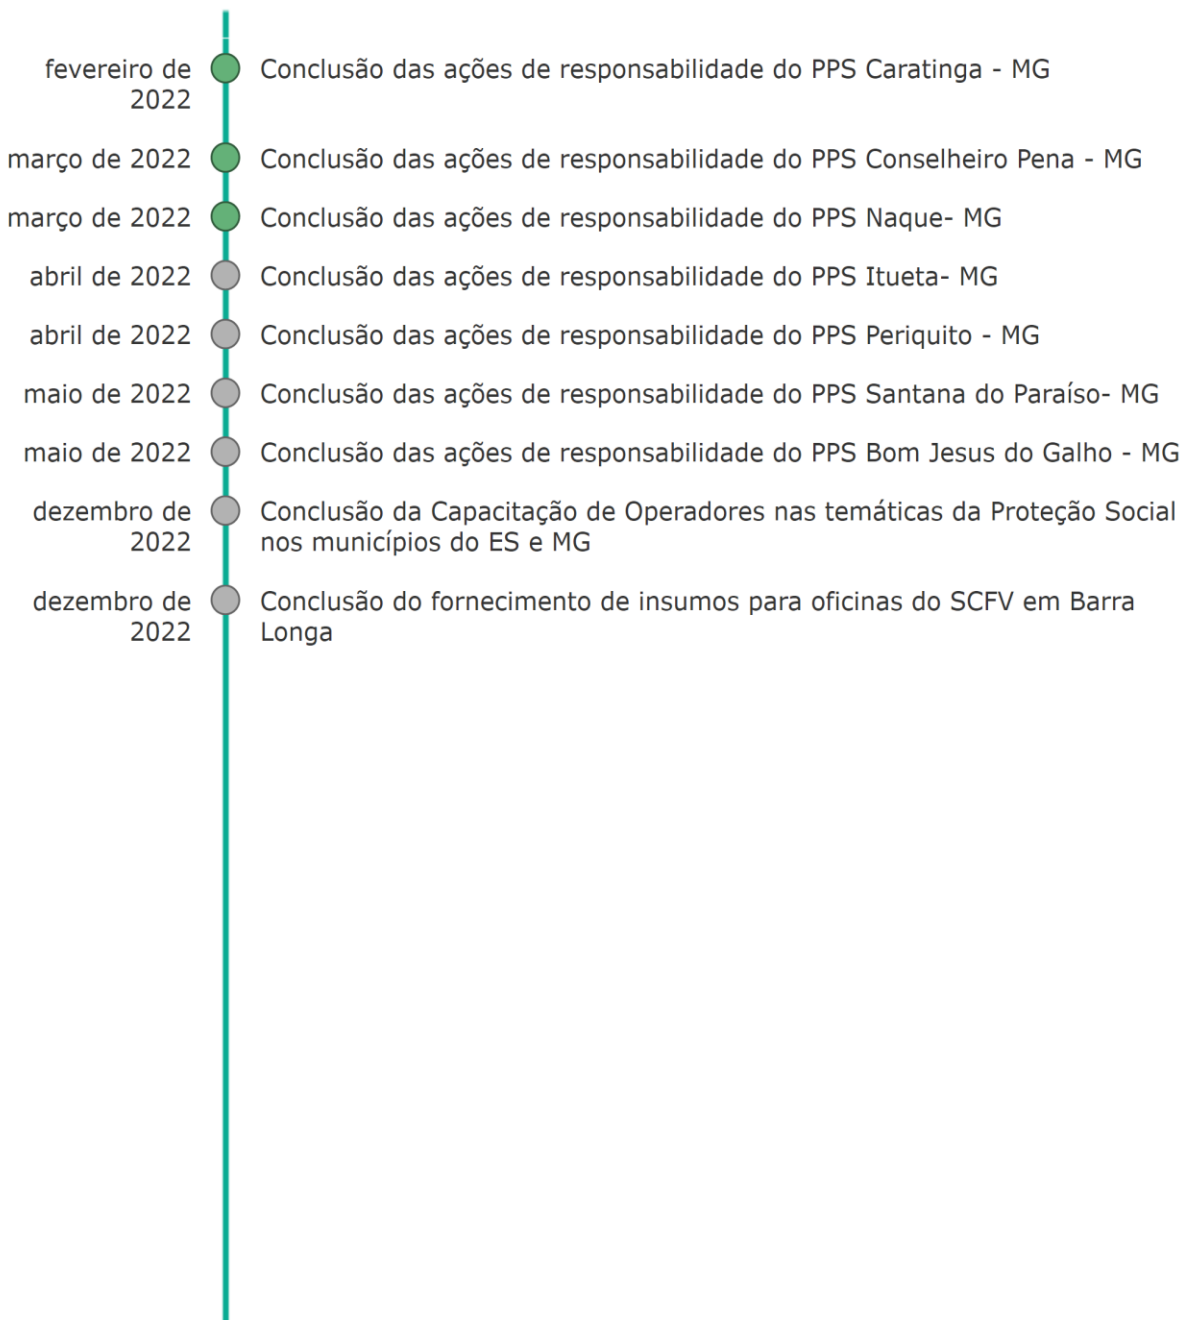

Apesar das ações de responsabilidade do PPS terminarem, as ações de responsabilidade do município (atendimento às famílias, oficinas, dentre outros) continuam até a data prevista no Plano pactuado com o município.

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 132 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairo 101) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de R\$ 8,78 Mi** além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 18 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23370 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Último repasse financeiro para suplementação de recursos humanos para atendimento às famílias vulneráveis do município de Itueta.

Início da capacitação para agentes de proteção social de 14 municípios do estado de MG com a temática "Trabalho Social com famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero".

Implementação do COMAPPS (Comitê de Acompanhamento das Ações do Plano de Proteção Social), com a participação de atingidos, no município de Rio Doce.

Entrega de insumos para realização de oficinas de fortalecimento de vínculo familiar e comunitário do município de Barra Longa.

Conclusão do plano de reparação no município de Ipaba.

Indicadores




Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

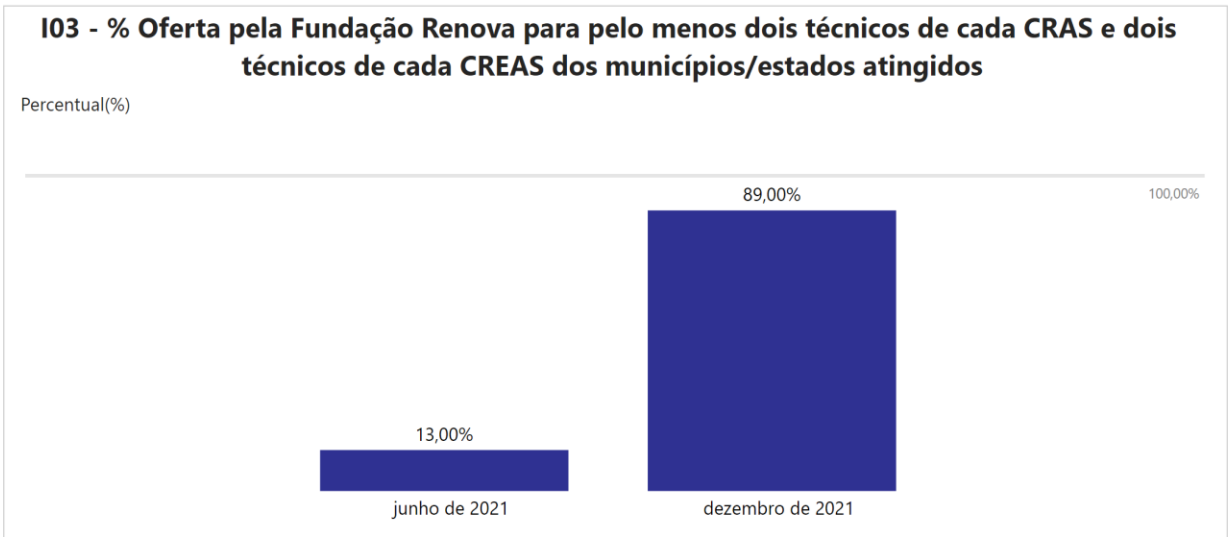


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral




Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

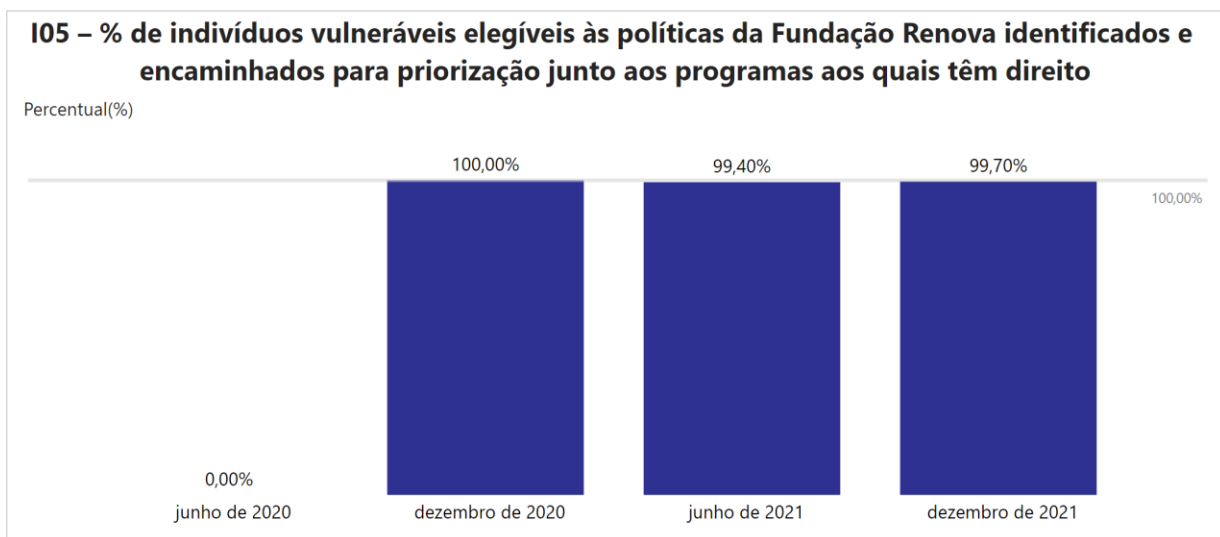


Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

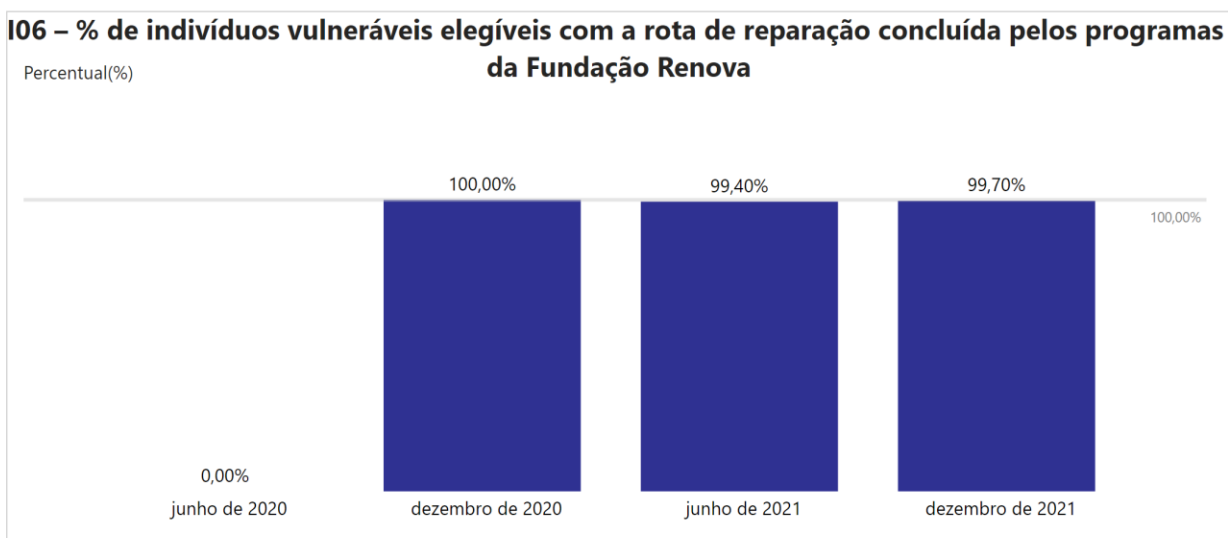


Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Concluído Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	506	3	Concluído Internamente
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente
Deliberação	550	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	●	Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022
dezembro de 2022	●	Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade em 2022
dezembro de 2022	●	Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas , Ativos Locais e suas Redes em 2022.
dezembro de 2022	●	Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	fevereiro de 2022	março de 2022	ACUMULADO
▲ Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	0	16	1.092
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	7	24	3.714
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	124.783

Fatos relevantes do mês

Destaque para a realização de reunião com pescadores de Médio Rio Doce e Espírito Santo para apresentação e esclarecimento de dúvidas sobre o 1º Edital de chamamento público da Fundação Renova para seleção de Projetos para apoio a grupos produtivos na pesca e aquicultura.

Destaque para as ações de divulgação do Edital Doce, que tem como objetivo fomentar ações conjuntas para o fortalecimento de ações nas áreas de Cultura, Turismo, Lazer e Esporte através de um apoio técnico e material.

Em Mariana, foi dada continuidade às visitas presenciais aos Reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo para acompanhamento do status e avanço das obras com a participação das Comissões de Atingidos, além de reunião do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para tratativas gerais sobre o reassentamento. Em Bento Rodrigues (Mariana) foi realizada visita adicional ao terreno com membros da Associação Dos Hortigranjeiros De Bento Rodrigues para avaliação de local para continuidade do plantio da associação.

Foi dada continuidade às ações para fortalecimento do processo de retomada das atividades agropecuárias com realização de diálogo coletivo com produtores rurais elegíveis a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) da comunidade de Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso) para apresentação das ações previstas pelo projeto e reunião como produtores rurais de Tumiritinga (MG) com a mesma finalidade.

Foram realizadas ações do Comitê de Acompanhamento das Ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social (Commaps) em Conselheiro Pena (MG), Naque (MG), Periquito (MG), Tumiritinga (MG), Itueta (MG) e Governador Valadares (MG) para apresentação e discussão das ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social.

Realização de ações de divulgação e esclarecimento sobre o Sistema Indenizatório Simplificado (Fluxo Ágil), incluindo agendas de diálogo coletivo; diálogos individualizados; envio sistemático de materiais informativos e suporte para esclarecimento de dúvidas de atingidos; comunicação estratégica e busca ativa de elegíveis não requerentes ao Fluxo Ágil para informação sobre possibilidade de adesão: em Córrego Novo (MG), Marliéria (MG), Baguari (Governador Valadares), Timoteo (MG); Ipatinga (MG) para esclarecimentos sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Em Barra do Riacho (Aracruz), Baixo Guandu (ES) e Assentamento Sezínio (Linhares) foram realizadas reuniões com moradores para apresentação sobre o TAC Governança.

Indicadores

I10 e I20 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 1: I10 e I20 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I05 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)

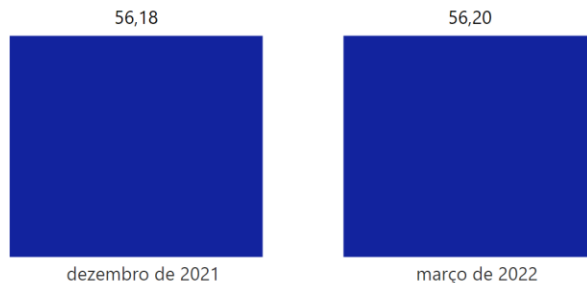


Gráfico 2: I05 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios - Frequência Trimestral

Indicadores

I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)

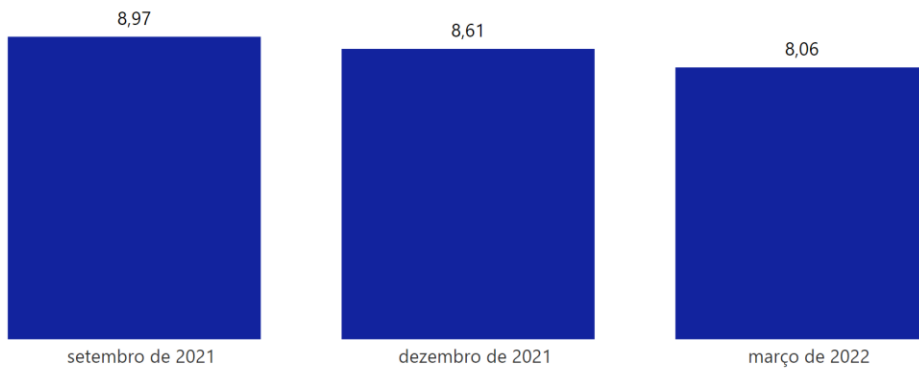


Gráfico 3: I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

I18 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Percentual(%)



Gráfico 4: I18 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Trimestral

Indicadores

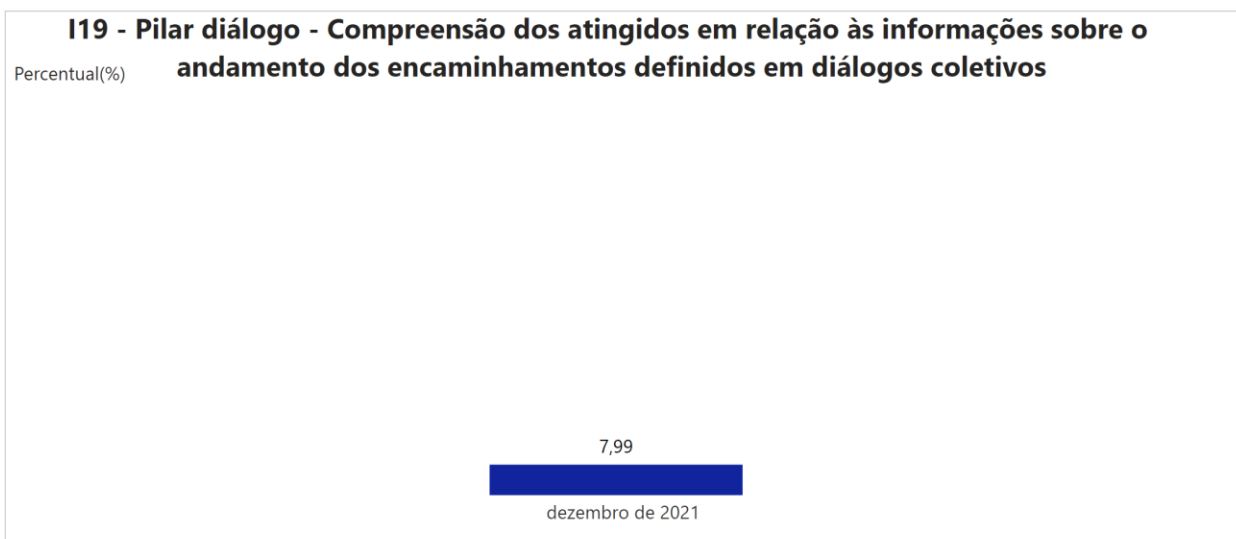


Gráfico 5: I19 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral



Gráfico 6: I21 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores




Gráfico 7: I17 e I32 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual




Gráfico 8: I31 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
14.065,00	182,66

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2022	177	172,67
fevereiro de 2022	131	
março de 2022	210	
		-
		-
		-

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabelas 2 e 3, devido a mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são encaminhadas ao *compliance*, podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os valores, portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

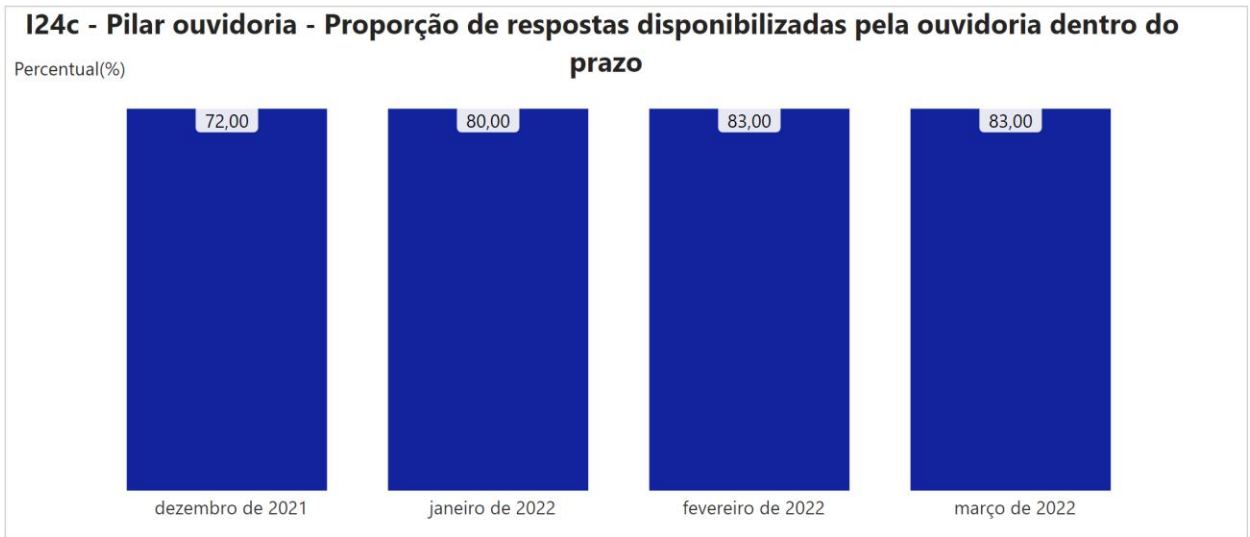


Gráfico 9: I24c - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal

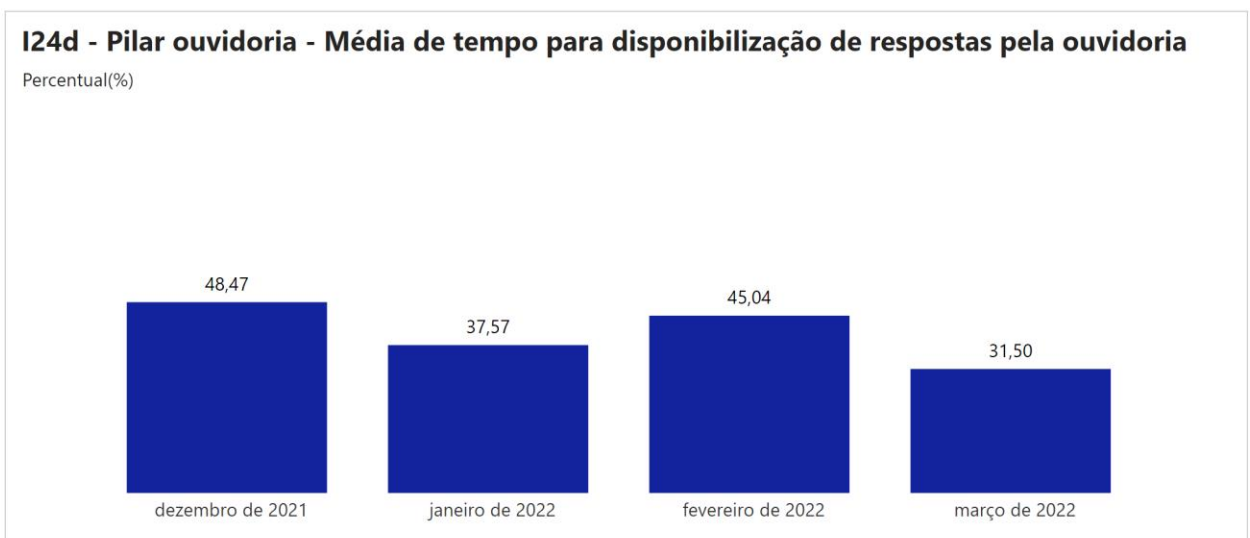


Gráfico 10: I24d - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	fevereiro de 2022	março de 2022
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	270.807	290.840
Canais: Número total de manifestações	1.042.277	1.073.670
Canais: Número de manifestações respondidas	974.049	998.191
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	186.868	192.042
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	41.429	50.688
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.303	14.494
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	799.171	892.042
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	6	14
Canais: Número de manifestações em tratamento	68.231	75.479

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?




Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?





Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● RUIM ● PÉSSIMO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço

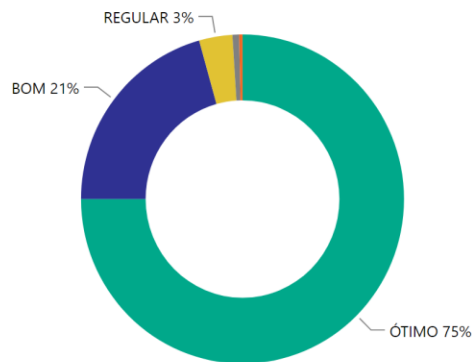

Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● RUIM ● PÉSSIMO

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Apoio ao Programa de Cadastro Integrado para contato com não localizados e atualização de informações pessoais no SGS.

Com a publicação do prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda, foram realizados contatos ativos para orientação sobre a substituição do Informe de Rendimentos com cálculos retificados, bem como a busca de não localizados para entrega do documento.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Ressarcimento e Indenização (PG02), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" e "Moradia Temporária" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce. No Médio Rio Doce foi realizada análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32).

Monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

No mês de março, destaque para a realização de 05 CIAs Móveis, estratégia itinerante dos Centros de Informação e Atendimento, para resolução de dúvidas e acolhimento de manifestações: em 23/03 foi realizado CIA Móvel na comunidade de Regência (Linhares) e no dia 24/03 em Povoação (Linhares) sobre os temas Portal do Advogado, Auxílio Financeiro Emergencial e entrega de Informe de Rendimentos; em 28/03 em Itapina (Colatina) para tratativa sobre os temas Portal do Advogado, esclarecimento de pagamento de indenização por Dano Água e Informe de Rendimento; em 23/03 a 24/03 em São José do Goiabal para esclarecimentos sobre Qualidade da água e do pescado, Auxílio Financeiro Emergencial, critérios de permanência e pagamento do Lucro Cessante, Cadastro Integrado e Sistema Indenizatório Simplificado.

Indicadores

I22 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)




Gráfico 19: I22 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I24a - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)

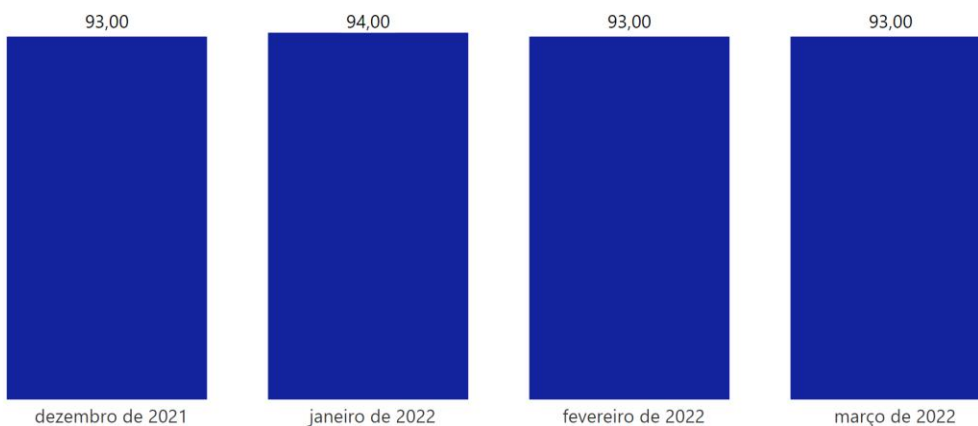


Gráfico 20: I24a - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 21:I24b - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal




Gráfico 22: I2 e I26a - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores

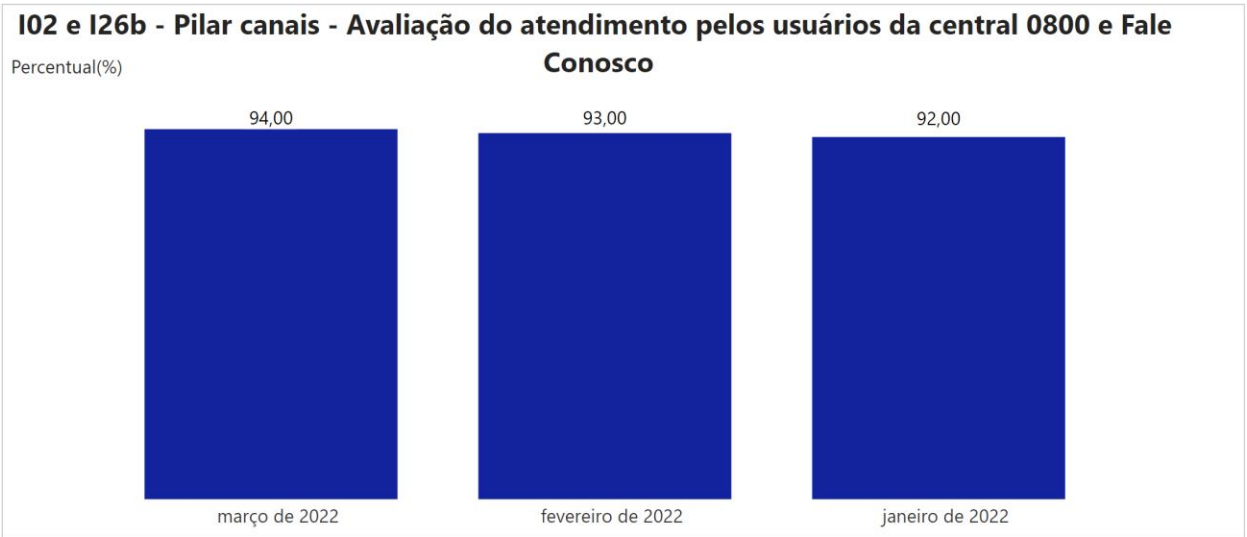


Gráfico 23: I02 e I26b - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e Fale Conosco- Frequência Mensal

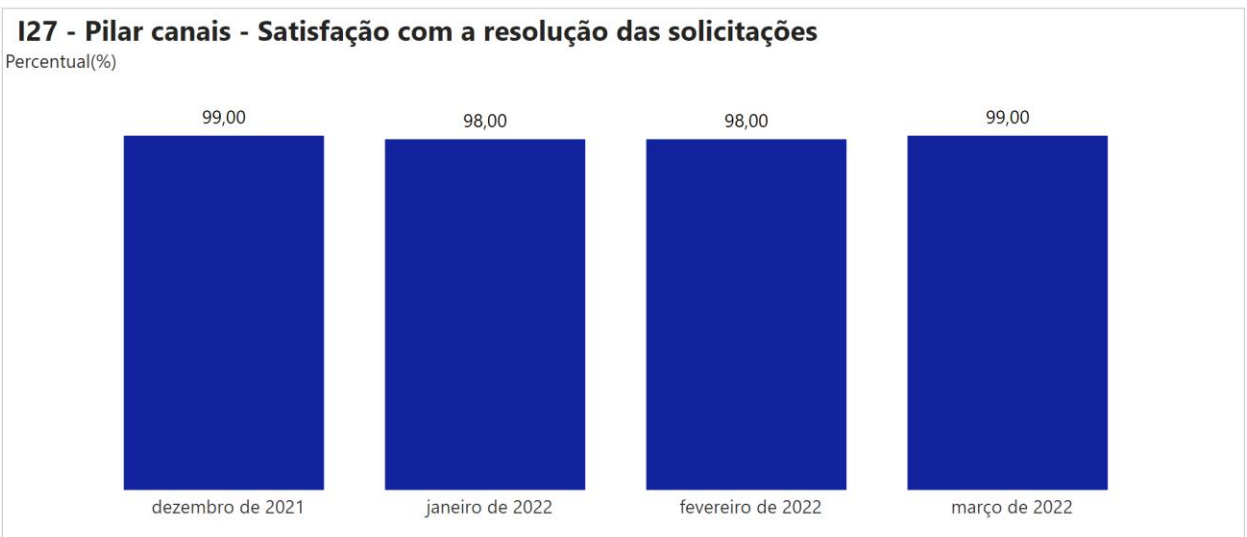


Gráfico 24: I27 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

Indicadores

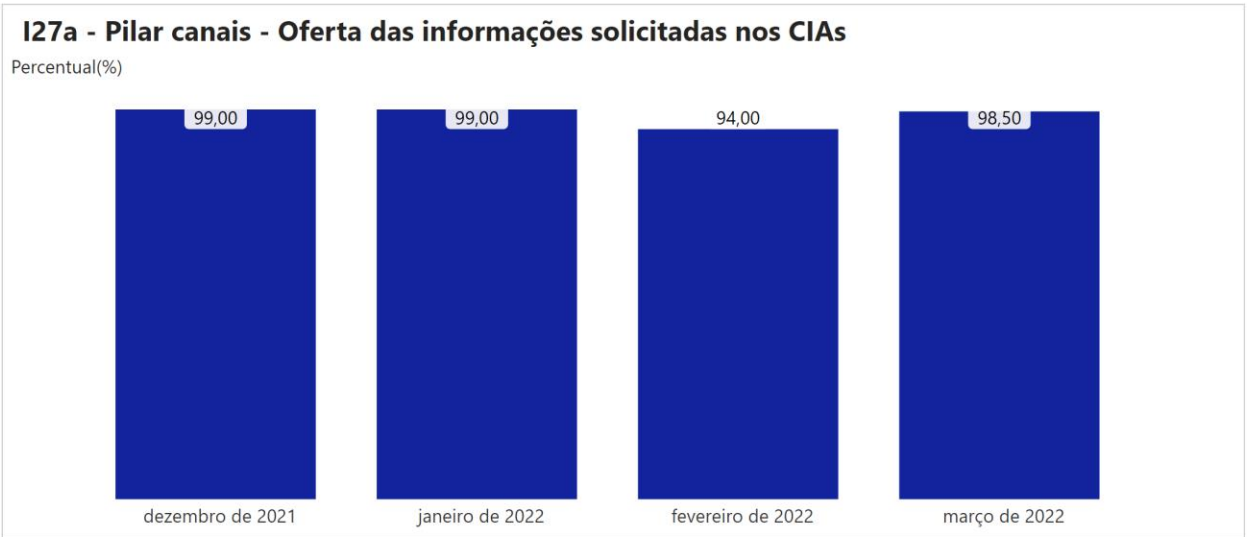


Gráfico 25: I27a - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs - Frequência Mensal

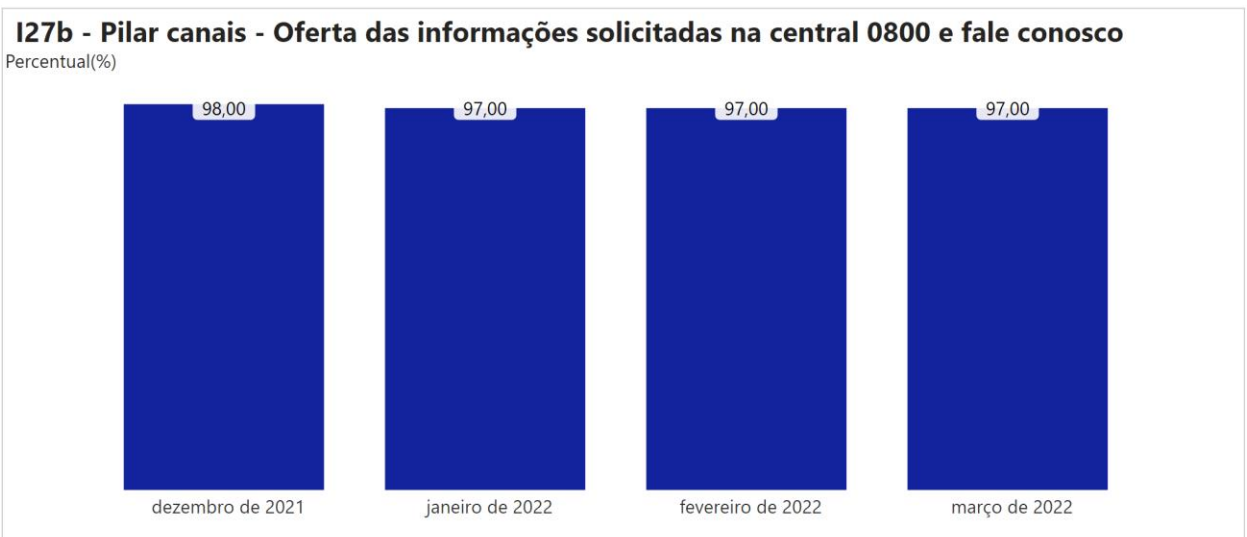


Gráfico 26: I27b - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs

Percentual(%)




Gráfico 27: Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar 1º Semestre de 2022


DADO	jan	fev	mar	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	0	0	0
ÁudioZaps produzidos	0	0		0
Carros de som produzidos	4	1	3	8
Cartazes produzidos	0	0	4	4
Cartilhas produzidos	0	0	1	1
E-mails de Marketing produzidos	0	1	5	6
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	3	7
Jornais da Comunidade produzidos	5	0	20	25
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	15	33	48
Mídias Sociais produzidas	15	3	6	24
Newsletter produzidos	3	3	2	8
Outros itens produzidos	2	1	18	21
Panfletos produzidos	0	0	1	1
Pílulas de whatsapp produzidos	39	21	40	100
Rádios produzidos	18	20	41	79
Vídeoreportagens produzidos	0	0		0
Vídeos produzidos	1	0	1	2
VídeoZaps produzidos	0	0		0

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território


Canais (Em branco) ● Carro de som ● Cartaz ● Cartilha ● E-mail Marketing ● Informe do Re... ● Jornal da Co... ● Matéria - Bol... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pilula ● Rádio ● Vídeo

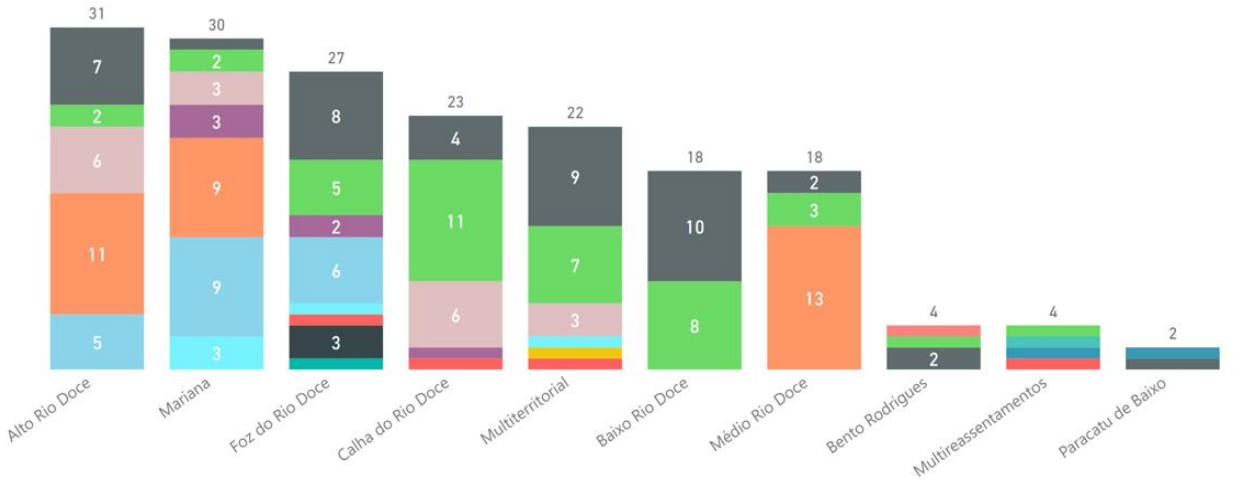

Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

Principais Temas Veiculados

Canais (Em branco) ● Carro de som ● Cartaz ● Cartilha ● E-mail Marketi... ● Informe do R... ● Jornal da Co... ● Matéria - Bol... ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pilula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Baixo Rio Doce

Produção de pílula convidando os jovens do projeto de Formação de Lideranças Jovens para participar de um encontro onde será apresentado o projeto Doce Vivo, que informa sobre o monitoramento e os resultados da qualidade da água do rio Doce.

Produção de pílula para convidar a comunidade de Baixo Guandu para participar de uma reunião comunitária presencial onde a equipe de diálogo apresentará o Edital Doce.

Produção de pílula para convidar a comunidade de Boninsenha, Marilândia para participar de uma reunião comunitária presencial onde a equipe de diálogo apresentará o Edital Doce.

Produção de pílula para convidar a comunidade de Colatina para participar de uma reunião comunitária presencial onde a equipe de diálogo apresentará o Edital Doce.

Produção de pílula para convidar a comunidade de Itapina, Colatina para participar de uma reunião comunitária presencial onde a equipe de diálogo apresentará o Edital Doce.

Produção de pílula para convidar a comunidade de Mascarenhas, Baixo Guandu para participar de uma reunião comunitária presencial onde a equipe de diálogo apresentará o Edital Doce.

Programa de rádio para divulgar que o Cia Móvel irá até Itapina, Colatina para realizar atendimentos.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Baixo Rio Doce

Produção de pílula convidando a comunidade para participar de um encontro onde será apresentado o projeto Doce Vivo. Na reunião será explicado sobre o monitoramento e os resultados da qualidade da água do rio Doce.

Produção de pílula convidando professores e educadores para participar de um encontro onde será apresentado o projeto Doce Vivo. No encontro, os professores poderão solicitar que o projeto seja apresentado nas suas escolas com aulas de educação ambiental em formatos lúdicos, além de explicar sobre o monitoramento e os resultados da qualidade da água do rio Doce.

Calha do Rio Doce

Produção de banner de boas-vindas para o evento Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal.

Produção de bloco de anotação para o evento Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal.

Produção de cartazes para o evento Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal.

Produção de certificado de plantio de mudas para os alunos que participaram dessa ação dentro do Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal.

Produção de panfleto com passatempo para os estudantes que fizeram parte do evento Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal.

Produção de pílula de WhatsApp para o Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal com informações sobre tratamento de esgoto.

Produção de pílula de WhatsApp para o Circuito da Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal informando que a água só pode ser consumida após tratada.

Fatos relevantes do mês

Imprensa

Solução adotada pela Fundação Renova é reconhecida como o Melhor Exemplo em Água pelo Prêmio Hugo Werneck.

Recoloca Rio Doce realiza capacitações para o mercado de trabalho em Linhares.

Projeto de associativismo e cooperativismo desenvolve negócios na bacia do rio Doce_Mariana.

Projeto de associativismo e cooperativismo desenvolve negócios na bacia do rio Doce_ES.

Parcerias auxiliam na recuperação ambiental e estimulam a diversidade econômica na bacia do rio Doce.

Parceria promove curso técnico em Agroecologia para assentados de reforma agrária no ES.

Mais de 200 vagas para cursos profissionalizantes em Mariana (MG).

Gestão Financeira é tema de palestra on-line para empreendedores capixabas.

Edital de Agroecologia e Produção Orgânica está com inscrições abertas para o Espírito Santo.

Bacia do rio Guandu terá R\$ 135 milhões para restauração florestal em mais de 5 mil hectares.

Alunos de São José do Goiabal participam de ações do Circuito da Água Bacia do Rio Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Comunicação com Territórios

Elaboração de matéria para a 21ª edição do Voz da Foz para divulgar alguns serviços prestados pelos moradores das comunidades da Foz

Elaboração de matéria para a 21ª edição do Voz da Foz sobre como as escolas das comunidades se prepararam para receber os alunos de forma presencial

Elaboração de matéria para a 21ª edição do Voz da Foz sobre o período chuvoso e seus impactos nas comunidades da Foz do Rio Doce

Elaboração de matéria para a 21ª edição do Voz da Foz sobre os impactos econômicos nas comunidades em função da não realização do Carnaval

Produção de matéria sobre as oficinas de esclarecimento sobre o Edital Doce

Produção de matéria, convidando as pessoas a participarem da palestra a ser ministrada pelo Programa de Desenvolvimento de Fornecedores

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de matéria para programa de rádio informando que, para ser atendido pelos programas da Fundação Renova, é preciso realizar a entrevista de cadastro. A pílula destaca cuidados de saúde contra a Covid para serem tomados durante as entrevistas.

Produção de pílula de WhatsApp informando que, para ser atendido pelos programas da Fundação Renova, é preciso realizar a entrevista de cadastro. A pílula destaca cuidados de saúde contra a Covid para serem tomados durante as entrevistas.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Publicação de matéria na 1ª edição do Jornada do Médio Rio Doce sobre o funcionamento dos Centros de Informações e Atendimentos (CIAs).

Publicação de matéria na 1ª edição do Jornada do Médio Rio Doce sobre o funcionamento do Sistema PIM/AFE (SPA).

Produção de programa de rádio para divulgar sobre a campanha antifraude.

Produção de programa de rádio para divulgar que o Informe de Rendimento foi enviado pelos Correios aos atingidos.

Produção de programa de rádio para divulgar que no sistema indenizatório simplificado passa a permitir a identificação no requerimento de pessoa falecida.

Produção de pílula de WhatsApp informando que em março atingidos de Mariana começaram a receber indenização pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que em março atingidos de Barra Longa começaram a receber indenização pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre tipos de fraudes.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Publicação de matéria na 10ª edição do Jornada de Governador Valadares sobre o funcionamento do Sistema PIM/AFE (SPA).

Programa de rádio para divulgar onde o atingido pode acessar o informe de rendimento para realizar a declaração de imposto de renda 2022

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre leis antifraude no Brasil, como parte da ação do plano Antifraude.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre falsidade ideológica, como parte da ação do plano Antifraude.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre as medidas antifraude adotadas em todas as etapas do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre pagamento de lucros cessantes em 2022.

Produção de matéria de rádio com informações sobre tipos de fraudes.

Produção de matéria de rádio com informações gerais sobre como acessar o Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de cartaz para os CIAs com informações sobre as medidas antifraude adotadas em todas as etapas do Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Elaboração de matéria para a 21ª edição do Voz da Foz sobre a nova forma de acessar os programas de indenização mediada e auxílio financeiro emergencial

Impressão de cartilhas com informações sobre Declaração Imposto Renda para serem distribuídas na Calha, Médio, Baixo e Foz, durante os CIAs Móveis ou nos escritórios dos CIAs.

Impressão de folder com informações sobre o Portal do Usuário para serem distribuídas na Calha, Médio, Baixo e Foz, durante os CIAs Móveis ou nos escritórios dos CIAs.

Produção de matéria para programa de rádio com informações sobre falsidade ideológica, como parte da ação do plano Antifraude.

Produção de matéria para programa de rádio com informações sobre leis antifraude no Brasil, como parte da ação do plano Antifraude.

Produção de matéria para programa de rádio informando que em março atingidos de Barra Longa começaram a receber indenização pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para programa de rádio informando que em março atingidos de Mariana começaram a receber indenização pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para programa de rádio sobre melhorias no Sistema Indenizatório Simplificado que permitem a identificação no requerimento de pessoa falecida.

Publicação de matéria na 10ª edição do Jornada de Governador Valadares informando que o CIA de GV está aberto para atender os atingidos.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para programa da Rádio Renova com informações sobre as medidas antifraude adotadas em todas as etapas do Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para programa da Rádio Renova com informações sobre o informe de rendimentos para Declaração do Imposto de Renda 2021.

Produção de matéria para programa de rádio com esclarecimentos sobre pagamento de lucros cessantes em 2022.

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Governador Valadares, no dia 30/03, para reunião sobre o Comitê Municipal de Acompanhamento do Programa de Proteção Social.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Tumiritinga, no dia 16/03, para reunião sobre o Comitê Municipal de Acompanhamento do Programa de Proteção Social.

Publicação de matéria na 1ª edição do Jornada do Médio Rio Doce sobre o projeto de Fortalecimento de Vínculos e Práticas Socioculturais e Assistenciais, da Rede Vidas, selecionada no Edital de Proteção Social.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

Divulgação de matéria na 20ª edição do Jornada Mariana sobre o status dos reassentamentos em Mariana

Produção de pílula de WhatsApp em atendimento a condicionante do licenciamento para convidar a comunidade para participar de evento do Dia da Água.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Divulgação de matéria na 20ª edição do Jornada Mariana sobre ações de revegetação do aterro sanitário de Mariana

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Criação de GIF com as pautas do Informe do Reassentamento para chamar atenção do leitor para o recebimento do boletim.

Produção de informativo mensal para as famílias do reassentamento de Bento Rodrigues, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status sobre projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

Produção de pílula para convidar as crianças e adolescentes de Bento Rodrigues a participar da oficina de roda e cinema na escola do reassentamento.

Produção de vídeo com imagens de timelapse apresentando o avanço do reassentamento de Bento Rodrigues naquele mês

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Divulgação de matéria na 18ª edição do Voz da Comunidade de Mariana sobre status das obras do reassentamento de Paracatu de Baixo

Divulgação de matéria na 20ª edição do Jornada Mariana sobre a revitalização da Casa da Banda em Monsenhor Horta

Produção da 38ª edição do informativo com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção de informativo mensal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status sobre projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

Suporte ao PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Divulgação de matéria na 18ª edição do Voz da Comunidade de Mariana sobre reforma das escolas temporárias de Bento e Paracatu

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Divulgação de matéria na 18ª edição do Voz da Comunidade de Mariana sobre manifestações culturais em Ponte do Gama

Produção de calendário de mesa com as datas das manifestações culturais de Barra Longa

Produção de calendário de mesa com as datas das manifestações culturais de Mariana

Produção de calendário de mesa com as datas das manifestações culturais de Rio Doce

Produção de calendário de mesa com as datas das manifestações culturais de Santa Cruz

Produção de calendário de parede com as datas das manifestações culturais de Barra Longa

Produção de calendário de parede com as datas das manifestações culturais de Mariana

Produção de calendário de parede com as datas das manifestações culturais de Rio Doce

Produção de calendário de parede com as datas das manifestações culturais de Santa Cruz

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Divulgação de matéria na 18ª edição do Voz da Comunidade de Mariana sobre a continuidade da Folia de Reis de Paracatu de Baixo

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de matéria para programa de rádio sobre o Aves do Perd, projeto de observação de aves apoiado pelo Edital Doce.

Produção de matéria sobre o início das inscrições para a segunda edição do Edital Doce.

Produção de panfleto informando sobre o Edital Doce

Produção de pílula informando e convidando às comunidades a participarem das oficinas de esclarecimento de dúvidas

Produção de programa de rádio para divulgar que a 2ª edição do Edital Doce será lançado em breve

Produção de programa de rádio sobre o lançamento do segundo Edital Doce e início das inscrições.

Program de rádio, reforçando o início das inscrições para o Edital Doce: 2ª edição

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Divulgação de matéria na 18ª edição do Voz da Comunidade de Mariana sobre 2º Edital Doce

Divulgação de matéria na 20ª edição do Jornada Mariana sobre o lançamento do 2º Edital Doce

Divulgação de matéria na 20ª edição do Jornada Mariana sobre o status da Agência de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo de Turismo de Mariana (Adapro)

Divulgação de matéria na 20ª edição do Jornada Mariana sobre o vídeo turístico de Mariana

Elaboração de matéria para a 21ª edição do Voz da Foz sobre a abertura das inscrições para a segunda edição do Edital Doce

Produção de cartaz informando sobre o Edital Doce

Produção de e-mail marketing sobre o início das inscrições para a segunda edição do Edital Doce.

Produção de pílula sobre o início das inscrições para a segunda edição do Edital Doce.

Produção de spot informando e convidando às comunidades a participarem das oficinas de esclarecimento de dúvidas

Suporte ao PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Produção de pílula de WhatsApp para convidar profissionais da pesca dos territórios Baixo Minas e Médio Rio Doce para a reunião virtual sobre o Edital do Pesca, no dia 28/03.

Indicadores

I6 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território

Percentual(%)




Gráfico 28: I6 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território- Frequência Anual

I7 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território

Percentual(%)



Gráfico 29: I7 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território- Frequência Anual

Indicadores

I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Percentual(%)

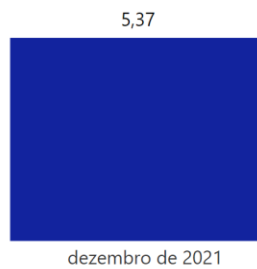


Gráfico 30: I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Percentual(%)




Gráfico 31: I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Concluído Internamente
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Em Andamento
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Em Andamento
Deliberação	563	4	Planejado

Entregas do ano de 2022

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

Grandes números do programa

- 1208 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 160 adoções, 432 devoluções, 181 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 392 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 291 bovinos, 53 equinos, 27 caninos, 18 suínos, 3 cães e 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1733 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

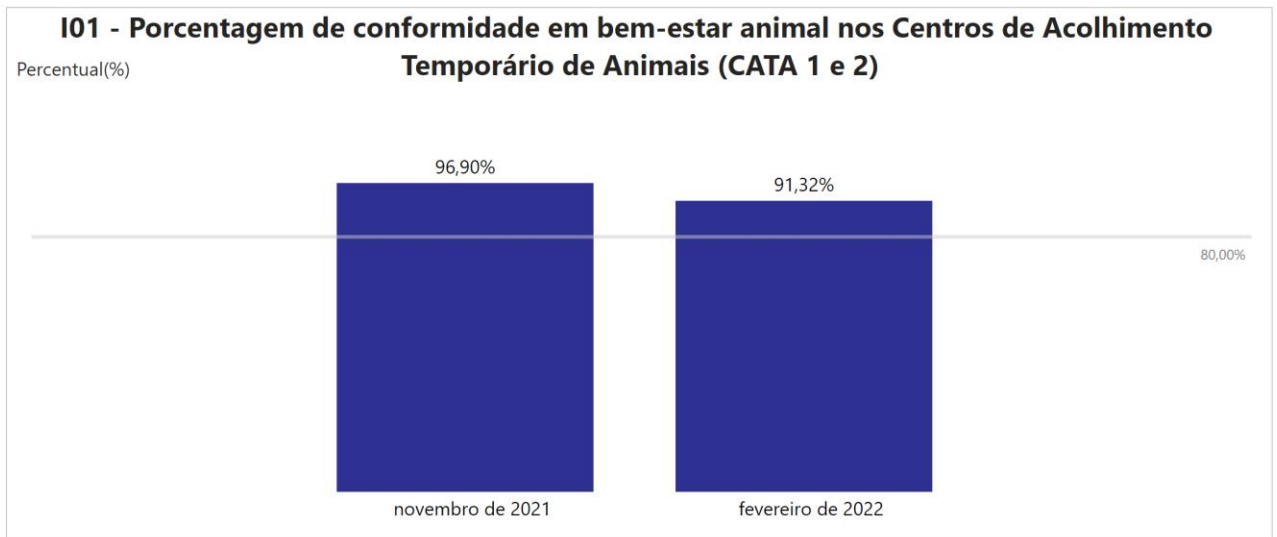


Gráfico 1: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme reportado no mês anterior, os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de verão/22. A queda de 5,6 pontos percentuais se deu pelo aprimoramento e capacidade de refinamento dos critérios avaliados pelos médicos-veterinários após o treinamento em desenvolvimento. Aspectos relacionados à condição de saúde, principalmente para animais idosos e/ou portadores de doenças crônicas foram os itens de maior influência nesta aferição, sem, contudo, deixar de atingir a meta prevista do indicador

O reporte de resultados deste indicador para a estação de outono/22 está previsto para o relatório de junho de 2022 (ref. maio/22)

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

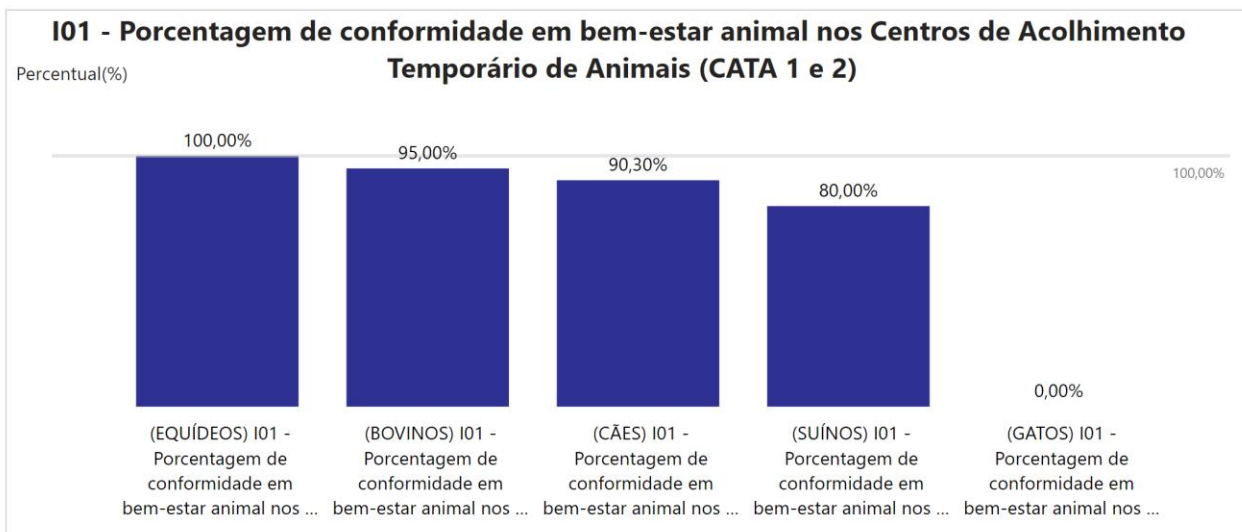


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores




Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme reportado no mês anterior, para o último bimestre avaliado, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, não houve contabilização de novas adoções finalizadas ou óbito de animal disponível para adoção. Para o período do presente relatório, 6 animais estão em acompanhamento pós-adoção e 3 aguardam processos adotivos sob guarda temporária da Fundação Renova.

A próxima atualização deste indicador é prevista para o mês de Maio de 2022 (referência ao bimestre mar./abr. de 2022).

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Percentual(%)

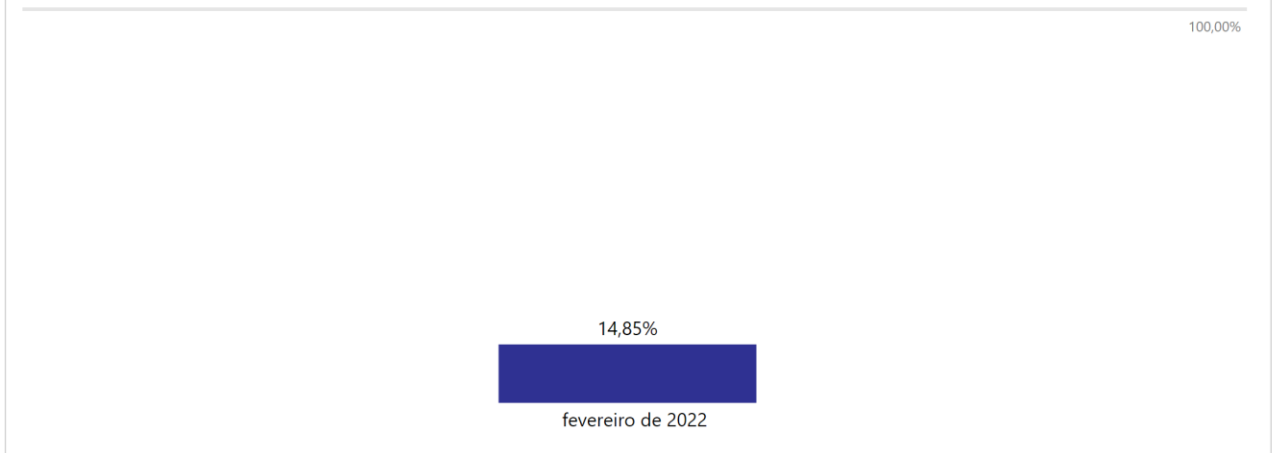


Gráfico 4:I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento - Frequência Bimestral

Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme reportado no mês anterior, foram identificadas a restituição definitiva de 68 animais (5 cães, 62 bovinos e 1 equino). Este quantitativo, somado aos 390 animais que ainda aguardam a devolução aos seus proprietários, perfazem um resultado de 14,85% para o respectivo indicador.

Ressalta-se que, conforme previsto na Definição do Programa, que as diferentes modalidades de reparação de direito à moradia (reassentamento coletivo; reassentamento familiar; reconstrução; e pecúnia) possuem cronogramas de entrega distintos. Neste sentido, a ocorrência de registros de novas entradas de animais (ex.: nascimento de animal sob guarda temporária), podem implicar na redução dos resultados reportados para este indicador ao longo do tempo, até que de fato se inicie a etapa final de restituição de animais prevista para o período de entrega dos reassentamentos coletivos.

Indicadores



Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme reportado no mês anterior, o acompanhamento pós-restituição (I04), é designado para os animais de pequeno porte (cães e gatos) e tem por objetivo dar suporte aos atingidos em eventuais necessidades de adaptação dos animais no retorno ao lar, após o reassentamento.

Esta atividade é um serviço que o Programa oferece ao tutor/proprietário do animal, mas que é opcional e que o atingido pode abrir do acompanhamento se entender que não é necessário. Até o período do presente relatório, foram identificadas a recusa de acompanhamento pós-ocupação na restituição definitiva de 5 cães. Este quantitativo, somado aos 24 animais de pequeno porte que ainda aguardam a devolução aos seus proprietários, perfazem um resultado de 17,24% para o respectivo indicador.

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses. CLÁUSULAS: 76 a 78.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Fatos relevantes do mês – Reconstrução de Vilas

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2022

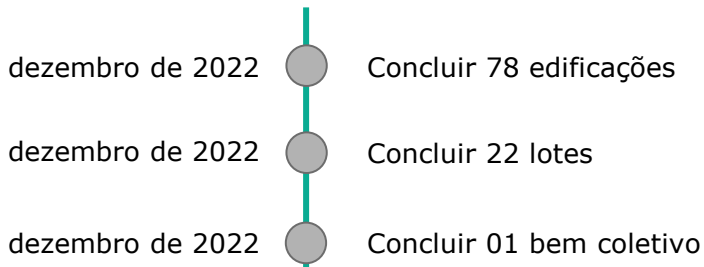

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 202 **famílias**;
- Atendimentos para 9 **famílias de Novos Núcleos**.

Obras:

- Em andamento construção de 100 **edificações**;
- Conclusão de 47 **edificações**;
- Conclusão de 4 **bens coletivos** (Escola, Posto de Serviços, Unidade básica de saúde e ETE);
- Total de 6 **contratos assinados** para construção de edificações.

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 181 edificações, 24 lotes vagos e 15 bens coletivos;
- **Projetos básicos concluídos** ou não necessários para 181 edificações, 24 lotes vagos e 14 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 171 edificações, 23 lotes e 14 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 23 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 171 edificações e para 13 bens coletivos.

Nota 1: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".


Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2022



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 78 **famílias;**
- Atendimentos para 2 **famílias de Novos Núcleos.**

Obra:

- Em andamento construção 28 **edificações;**
- Em andamento construção de 3 bens coletivos (escolas e posto de saúde)

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 62 edificações, 3 lotes vagos e 11 bens coletivos;
- **Projetos básicos concluídos** ou não necessários para 62 edificações, 6 lotes vagos e 11 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 58 edificações, 5 lotes e 11 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 5 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 56 edificações e para 11 bens coletivos.

Nota¹: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2022

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimento para 9 **famílias;**
- Acordos homologados com 28 **famílias;**
- Total de 26 **edificações** adquiridos para famílias que possuem acordo homologado.

Observação: Número de edificações adquiridos para famílias que possuem acordo homologado – temos 23 imóveis adquiridos + 3 pagamentos de acordo integral (Sem aquisição de imóvel).


Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2022

- 
- dezembro de 2022 ● Concluir 03 reformas de edificações;
 - dezembro de 2022 ● Concluir 17 obras de edificações novas.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- Atendimento para 122 **famílias**;
- Atendimento para 9 **famílias de Novos Núcleos**;
- Aquisição de 81 **edificações** para **famílias** que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
- Aquisição de 5 **edificações** para **famílias de Novos Núcleos** que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
- 41 **edificações** para construção;
- 04 **edificações** para construção – **novos núcleos**;
- 30 **edificações** para reforma;
- 01 **edificação** para reforma – **novos núcleos**;
- 10 **lotes** vagos;
- Atendimento a 10 **famílias** na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 13 **edificações** nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções entregues para 6 **edificações** principais nas Comunidades Rurais.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para construções de 41 edificações, para reformas de 28 edificações e 8 lotes vagos;
- **Projetos básicos concluídos** ou não necessários para construções de 40 edificações, para reformas de 28 edificações e 8 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 40 edificações, para reforma de 28 edificações e 8 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 36 construções de edificações, para 26 reformas de edificações e para 8 lotes vagos.

Nota¹: O termo Edificações abrange-se casas e pontos comerciais.

Nota²: O termo "Não necessário", se refere a não obrigatoriedade de alguns documentos por fases e localidades de registros das edificações. Reassentamento Familiar com atendimento em âmbito nacional.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores de acompanhamento



Gráfico 1: Disponibilidade total de atendimentos temporários (compensação financeira, aluguel e hotel) - Frequência Mensal

PG009 Programa de Recuperação UHE Risoleta Neves – Candonga

Referência: MAR/22

Eixo Terra e Água

➤ Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Referência no.	Item	Status
Cláusula 79	Caput	Cumprido internamente (PG-09 FR)
Cláusula 80	Caput	Em andamento
Cláusula 81	Caput	Em andamento
Cláusula 150	§3º	Cumprido parcialmente/Judicializado (Caracterização)
Deliberação	30	N/A Cumprida internamente (Fundação Renova)
Deliberação	80	4.1 Cumprida internamente (Fundação Renova)
Deliberação	80	4.2 Cumprida internamente (Fundação Renova)
Deliberação	225	2 Cumprido internamente (FR) / em andamento
Deliberação	286	3 Cumprida internamente (Fundação Renova)

Timeline de Entregas do Programa



Grandes números do programa

959 mil m³ de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.

FATOS RELEVANTES DO MÊS

✓ Remoção de Sedimentos nas proximidades da UHE

❖ Infraestrutura para Remoção de Sedimentos

- Ponto de Apoio
 - Com a conclusão da baía 1, desmobilização em andamento.
- Baias:
 - Execução de forma e armação das paredes da baía nº 2.



Figura 1 - Vista aérea Ponto de Apoio

- Infraestrutura das bacias para recebimento dos sedimentos



Figura 2 - Vista aérea das bacias



Figura 3 - Áreas de disposição Setor 11

✓ Status atual:

- Início da disposição de sedimentos provenientes das áreas adjacentes e próximas ao Ponto de Apoio (acesso para equipamentos), no setor 11.

❖ **Remoção de Sedimentos**

✓ Status atual:

- Mobilização: mão de obra e equipamentos;
- Montagem dos equipamentos (primeira e segunda frente);
- Transporte dos equipamentos da segunda frente de remoção com escavadeira embarcada;
- Remoção de sedimentos com escavadeira embarcada – primeira frente (acessos);



Figura 4 - Imagem aérea da atividade de remoção de sedimentos

Volume total removido (até 27/03): 3875 m³

➤ Recuperação dos pontos de margens

❖ Pontos de Margens

- ✓ Evolução na execução dos pontos de margens – total de 79
 - Pontos recuperados no período: 147 e 148;
 - Pontos em recuperação: 151, 157, 158 e 159.



Figura 5 - Pontos da margem recuperados no período ME (147 e 148)



Figura 6 - Pontos da margem direita em execução MD (151, 157, 158 e 159)

Notas:

1 – O *As built* do Ponto 115 evidenciou que pode ele ser considerado geotecnicaamente estável do ponto de vista da estabilidade física. Não obstante, no entorno da contenção em cortina atirantada, é possível

visualizar o crescimento de vegetação superficial não sendo necessária a execução de cobertura vegetal.

2 – Os pontos de margens nº 151, 157, 158 e 159 estão previstos para conclusão em abril/22.

RECUPERAÇÃO PONTOS DE MARGEM	Total Previsto	Concluído	A executar
MARGEM ESQUERDA	56 und	38 und*	18 und
MARGEM DIREITA	23 und	16 und	7 und
TOTAL			25 und

Tabela 1 - Status Pontos de Margens

➤ UHE - Risoleta Neves

❖ Reabilitação das UG's

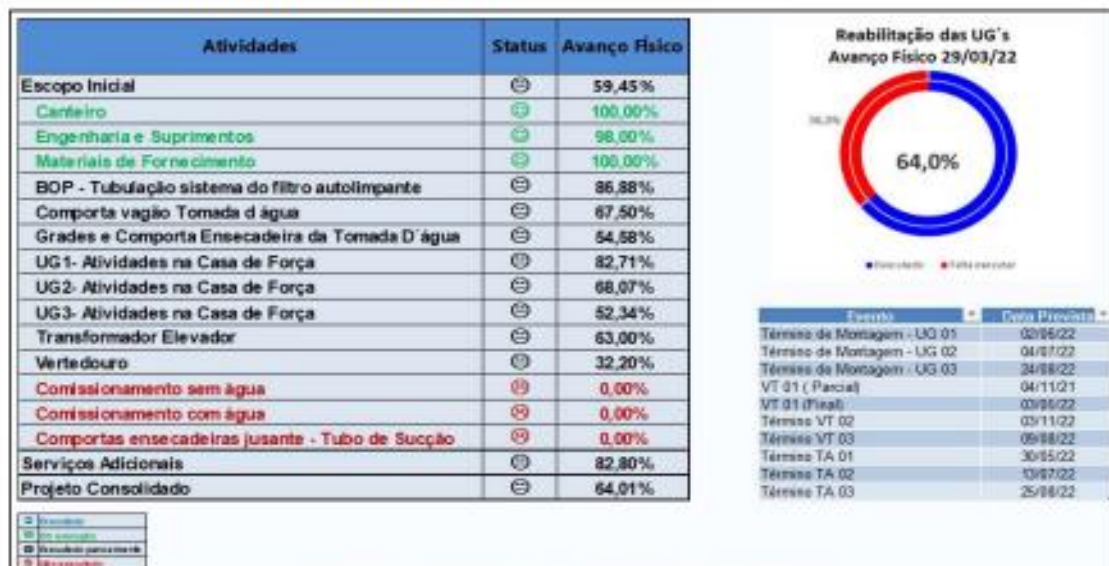


Figura 7 - Avanço Físico Reabilitação das UG's

❖ Atividades de limpeza



Figura 8 - Avanço Físico Limpeza das UG's

✓ **Atividades em andamento no período - Reabilitação UGs e Limpeza:**

- Reparo rotor Kaplan da UG1 (Troca das vedações);
- Reparo rotor Kaplan da UG2 em andamento na fábrica;
- Preparação do poço da turbina da UG1 para receber o conjunto Kaplan;
- Fabricação da tubulação de 4" dos Radiadores da UG2;
- Recuperação (cavitação) das palhetas diretrizes, entrada e saída do Aro Câmara da UG2;
- Preparação dos mancais da UG1;
- Conclusão da desmontagem da turbina da UG3;
- Início da recuperação da caixa espiral e embutidos da UG3;
- Continuação da limpeza do canal sucção da UG1.



Figura 9 – Rotor Kaplan

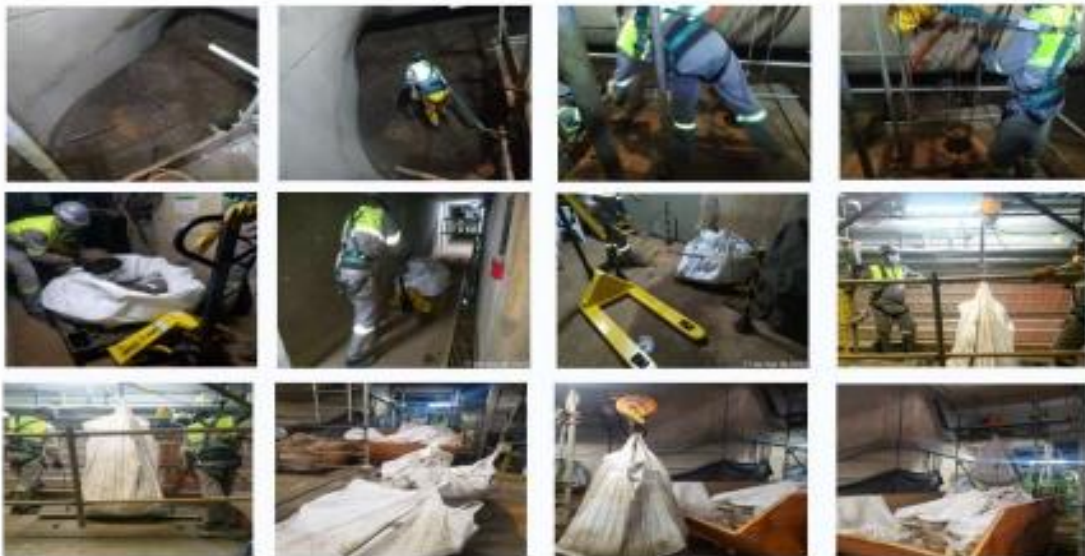


Figura 10 - Teste do hidrojato dentro da UG1, Área de Armazenamento de sedimentos (big bag) e Montagem de Plataforma de Andaime

✓ **Atividades em andamento – Reforço Barramento Principal**

- Executado teste de hidrojateamento;
- Recebimento de Formas e Armação;
- Teste de hidrojateamento (1ª camada do BME2 e BME3);
- Em execução da montagem de canteiro;
- Montagem da linha de vida para acesso por cordas para BME2 e BME3;
- Hidrojateamento BME3 / BME2 / BME4;
- Montagem de Forma parcial 1ª Camada BME3 / BME2;
- Execução de Montagem de Canteiro;
- Montagem de Forma parcial 1ª Camada BME3 / BME2 (Cota 293 a 294);
- Montagem de Forma parcial 1ª Camada BME3 / BME2.



Figura 11 - Execução de pontos de ancoragem e hidrojateamento



Figura 12 - Concretagem 1ª Camada BME3 / BME2

➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ Destaques:

- Com relação à erosão na margem direita do Barramento C, a SPEC esclareceu que o material erodido se trata de um acesso provisório, construído para execução dos trabalhos de recuperação do ponto de margem. Segundo informado pela projetista, sua erosão não causa danos à estrutura do Barramento.
- Diante dos resultados recentes obtidos com os levantamentos de GPR no Barramento B, a SPEC recomendou que o monitoramento seja mantido, com periodicidade mínima quinzenal, até que as condições de vazão permitam a realização de batimetrias a jusante da estrutura.
- Os sensores SAT instalados nos Barramentos Metálicos permaneceram em níveis normais de operação, sem deslocamentos significativos registrados no período.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água apresentou elevação em parte das ilhas de monitoramento. No entanto, com magnitudes inferiores às dos meses anteriores. Todas as leituras permanecem em níveis normais de operação.
- Após os picos registrados no mês de janeiro, houve uma estabilização em quatro dos cinco marcos superficiais instalados na ADME OD, um dos marcos,

no entanto, permanece com tendência de recalque. Os dois extensômetros da estrutura permaneceram sem evolução no período.

- O monitoramento dos marcos superficiais instalados no talude na ombreira direita do contrapilhamento não indica tendência até o momento. Os dois extensômetros instalados nas trincas apresentaram pequena evolução no mês de referência. O monitoramento deste talude será intensificado para a liberação das obras no contrapilhamento.
 - Foi concluído o fechamento da Bacia 5. As trincas não apresentaram evolução significativa no período.
 - Pedreira Corsini: Não foi observada evolução nos escorregamentos da estrutura após esse período. A área segue isolada.
 - Entre os meses de fevereiro e março, foram observadas uma série de anomalias em decorrência de uma movimentação de massa na encosta do campo de futebol de Santana do Deserto. As movimentações causaram rupturas circulares à montante e à jusante do campo, além de trincas, abatimentos, deslocamento de calçada, fechamento de canaleta de drenagem e rompimento de uma adutora existente na região. Em decorrência desse processo, as residências a jusante do talude foram desocupadas pela Defesa Civil. Foi realizada ainda a retirada de um bloco descalçado e a manutenção na referida adutora. Encontra-se em andamento um projeto para estabilização da encosta.
- ✓ **Constatações:**
- Em razão da necessidade de disponibilização de área para lançamento dos sedimentos que serão removidos do reservatório, os sedimentos depositados

na Bacia 2A foram direcionados para armazenamento temporário na Pilha 1. Além disso, foi retirado o septo de divisão entre as Bacias 2A e 2B.

✓ **Recomendações:**

- Verificar a integridade dos tiltmeters, bem como dos cabeamentos, assim que possível;
- Realizar testes nos sensores verticais instalados nos barramentos, de forma semelhante ao realizado nos sensores horizontais;
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

➤ MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nota: Informações referentes ao período da campanha, o qual não necessariamente coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 2

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 1

- Entrada: Bombeamento realizado nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 23, 25 e 28/02 da Bacia 2 para a Bacia 1. Sem desvios para o período.
- Saída: Bombeamento realizado nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16/02 da Saída da Bacia 1. Sem desvios para o período.

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 1:



Figura 13 - Setor 1

✓ Síntese conclusiva:

- Montante e jusante: Sem desvios para o período

✓ Monitoramento e controle: Descomis. Setor 4/Córrego dos Borges



Figura 14 - Montante Setor 4 - Entrada



Figura 15 - Jusante Setor 4 - Saída

Monitoramento dos pontos de montante e jusante do Córrego dos Borges: Desvios de Cor Verdadeira (Montante e Jusante), Manganês (Montante e Jusante) e Turbidez (Montante e Jusante), demonstrando que não há nexos causal com o empreendimento.

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5A:



Figura 16 - Setor 5A

✓ Síntese conclusiva:

- Montante: Diários: Sem desvios no período. Mensal: Ponto seco em 02/02/2022.
- Jusante: Diários: Sem desvios no período. Mensal: Ponto seco em 02/02/2022.

✓ Monitoramento de Efluentes – Setor 5B



Figura 17 - Setor 5B

✓ Síntese conclusiva:

- Diários: Sem desvios no período.

Nota: Como não foi evidenciado em nenhum dia de monitoramento água saindo pelo tubo ou evidência de que tenha havido fluxo na tubulação, a água presente em caixas de efluentes foi atribuída a água de chuvas, não havendo interface com os Setores.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- A fazenda Jerônimo não foi monitorada devido a restrição de acesso imposta pelo proprietário, a qual será justificada no relatório anual, associada ao Anexo II Item 1 da LOC de Candonga.
 - O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA).
 - Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
 - Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o configura como forte indicativo de estes valores encontrados no monitoramento serem background da região
 - Os estudos de valores de referência concluirão sobre estas hipóteses.
- ✓ Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
- O controle de monitoramento hídrico superficial no Córrego Micaela apresentou no período desvios de Cor Verdadeira (Jusante) e Manganês (Montante e Jusante), associados à pluviometria.

✓ **Monitoramento Atmosférico**

- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ **Monitoramento Subterrâneo**



Figura 18 - Localização nascentes Pilha 1 e Pilha 2

▪ **Nascentes 1 e 2 – setor 11**



Figura 19 - Nascentes 1 e 2

✓ **Conclusões / considerações finais**

- A Nascente 1 apresentou desvios de Alumínio e Ferro no período no monitoramento de controle semanal;

- A Nascente 2 apresentou desvios de Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal;

Nota: Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Atividade em andamento.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal e predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 38 pontos de monitoramento dentro da ADA.

➤ INDICADORES

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

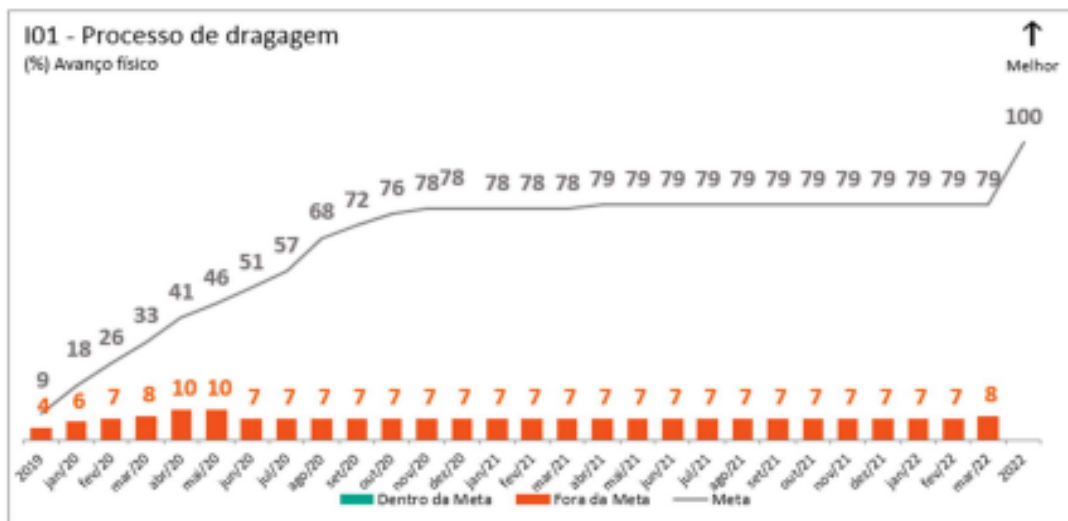


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

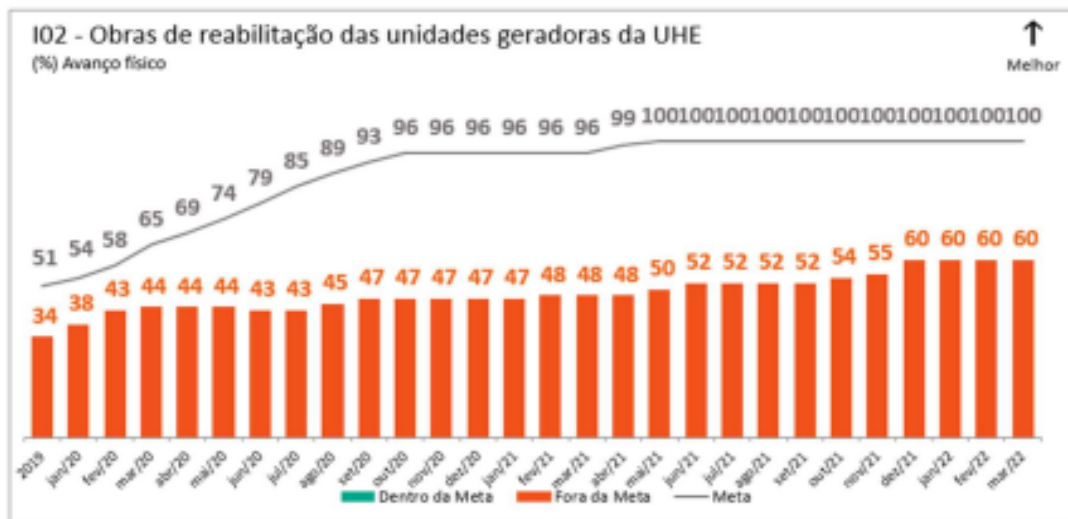


Gráfico 2 - Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

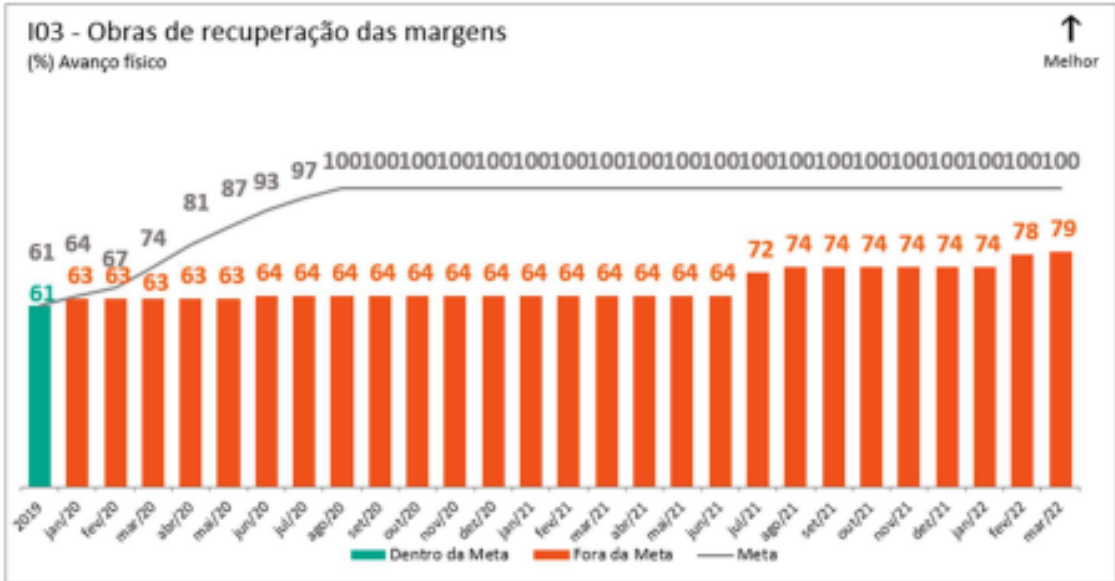


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.



Gráfico 4 -. Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	3	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

julho de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Passarela Campinas Barreto)
agosto de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Curvina)
outubro de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Tiara)
outubro de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Bueno)
novembro de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
novembro de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Juca Ponciano)
novembro de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Borba)
novembro de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
novembro de 2022	●	Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Tomador de Água)
novembro de 2022	●	PF0153 - Reconstrução de Pontes (Barra Longa) - Concluído
novembro de 2022	●	PF0153 - Reconstrução de Pontes (Mariana) - Concluído
novembro de 2022	●	PF0153 - Reconstrução de Pontes Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.739 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 949 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.820 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 82
- Concluído sem termo: 7
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27 :

Fatos relevantes do mês

Realização de reunião de Kick-off no dia 29/03/2022 com a contratada responsável pela execução das reconstruções das pontes em Mariana e Barra Longa;

Proteção de taludes estrutura rurais complexas - Pedido aprovado. Handover realizado em 31/03/22 em Mariana;

Solicitação de OS para instalação de bomba hidráulica na propriedade D014 – Estruturas Rurais Complexas;

Em negociação Fundiária para aquisição do terreno do campo de Pedras em Mariana;

Conclusão de 5 estruturas rurais complexas pelo contrato RBAR acionado em 17/01/22. 3 estruturas concluídas em Março. *Estrutura D63 civil concluída, pendente de instalação de bebedouro.

Conclusão das instalações dos tanques na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Parque de Exposição de Barra Longa;

Conclusão da base e sub base da pavimentação do Acesso ao Parque de Exposição de Barra Longa;

Conclusão da aplicação de asfalto CBUQ na obra do Acesso ao Parque de Exposição de Barra Longa;

Bens Públicos Ponte do Gama - Em fase de aprovação de APRO pelo Comitê, com previsão de kick-off em Abril/22.

Indicadores

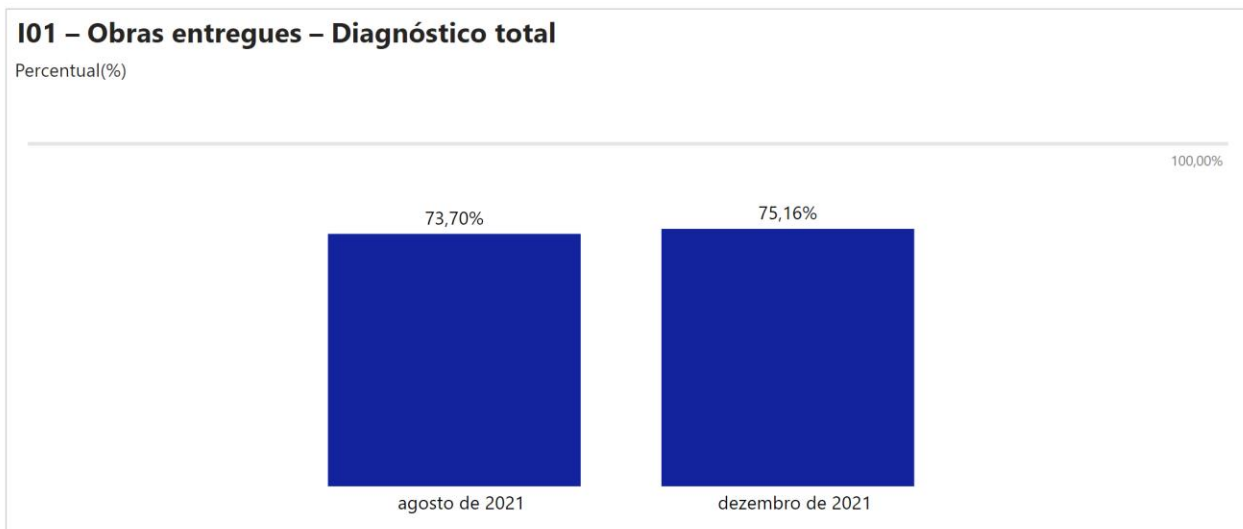


Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

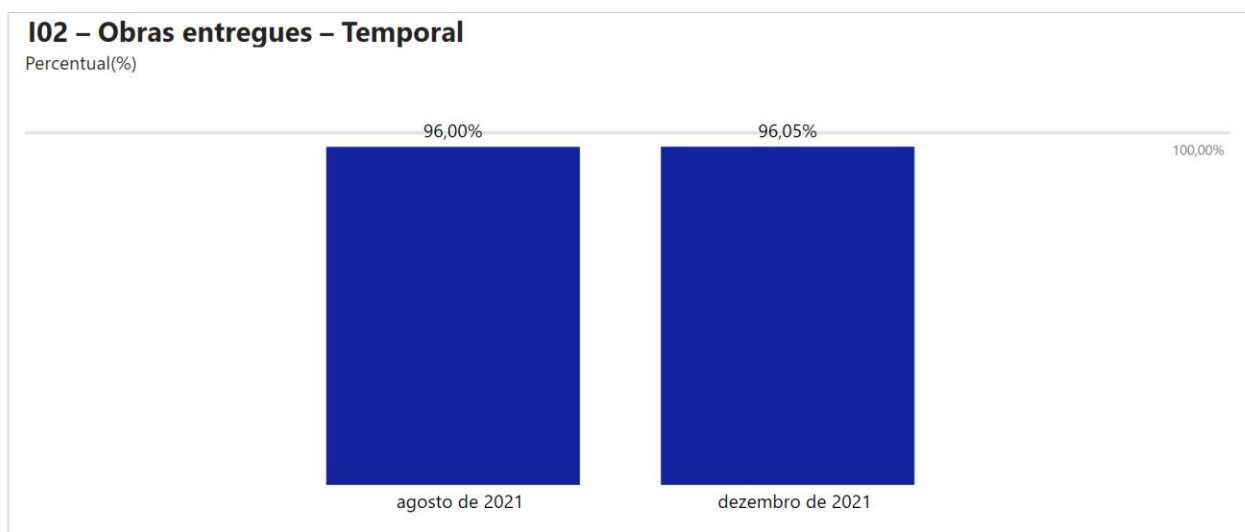


Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)

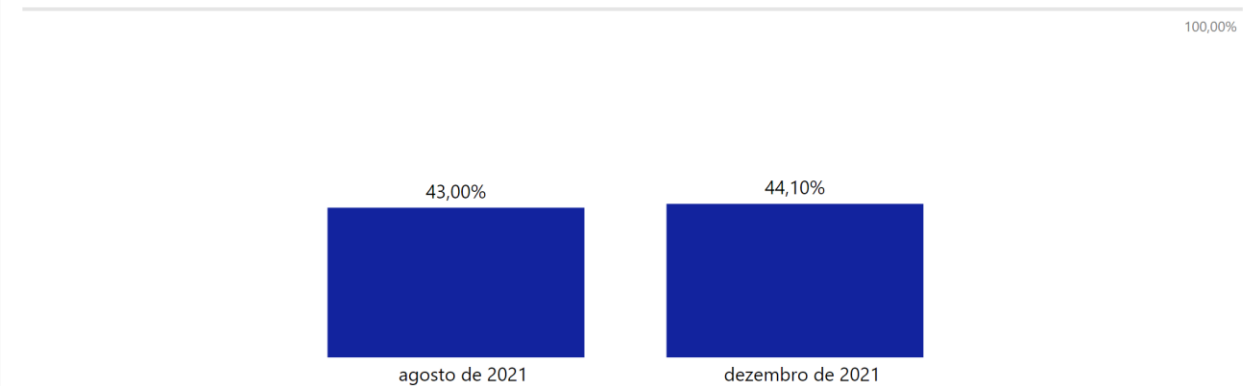


Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Percentual(%)

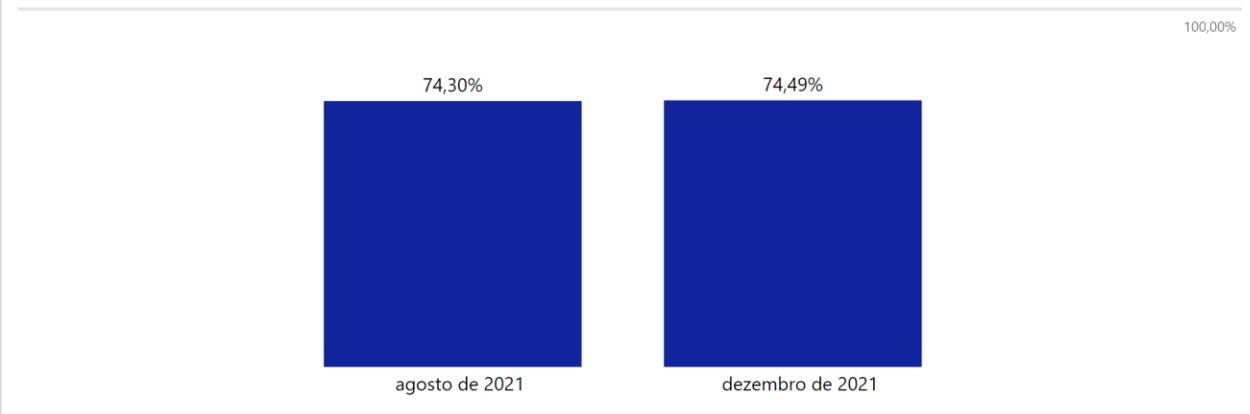


Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

- julho de 2022 Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
- julho de 2022 Conclusão da formação de pedagogos da rede municipal de Mariana
- julho de 2022 Finalização do projeto de apoio pedagógico para rede publica municipal de Mariana
- outubro de 2022 Equipagem da Escola Definitiva de Bento Rodrigues no Reassentamento Coletivo
- dezembro de 2022 Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Bento Rodrigues
- dezembro de 2022 Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
- dezembro de 2022 Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
- dezembro de 2022 Finalização da manutenção predial e ar condicionado- Escola Temporária Bento Rodrigues
- dezembro de 2022 Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2022)
- dezembro de 2022 Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2022)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Entrega dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas Monsenhor José Cota, Sinhô Machado e Wilson Pimenta em Mariana.

Início das formações com os professores da rede municipal Mariana e estadual de Barra Longa (Claudionor Lopes) no âmbito do projeto de Apoio Psicopedagógico.

Realização de oficinas com os alunos da EM Bento Rodrigues com a temática de transição para o reassentamento

Indicadores



Gráfico 1: I01 -Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

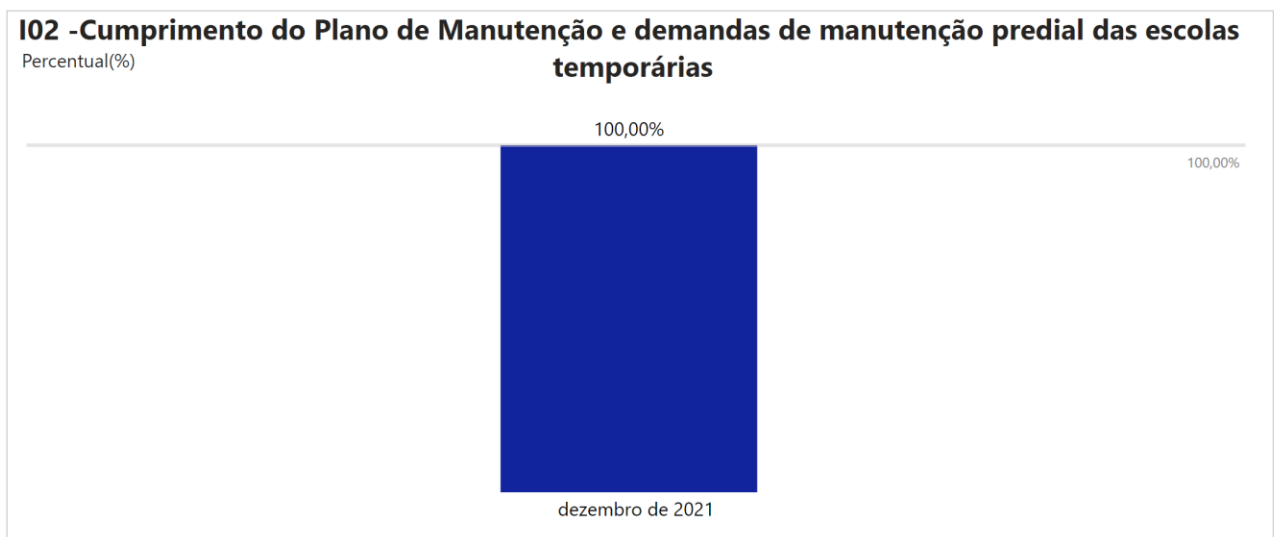


Gráfico 2: I02 -Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral




Gráfico 6: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicadores

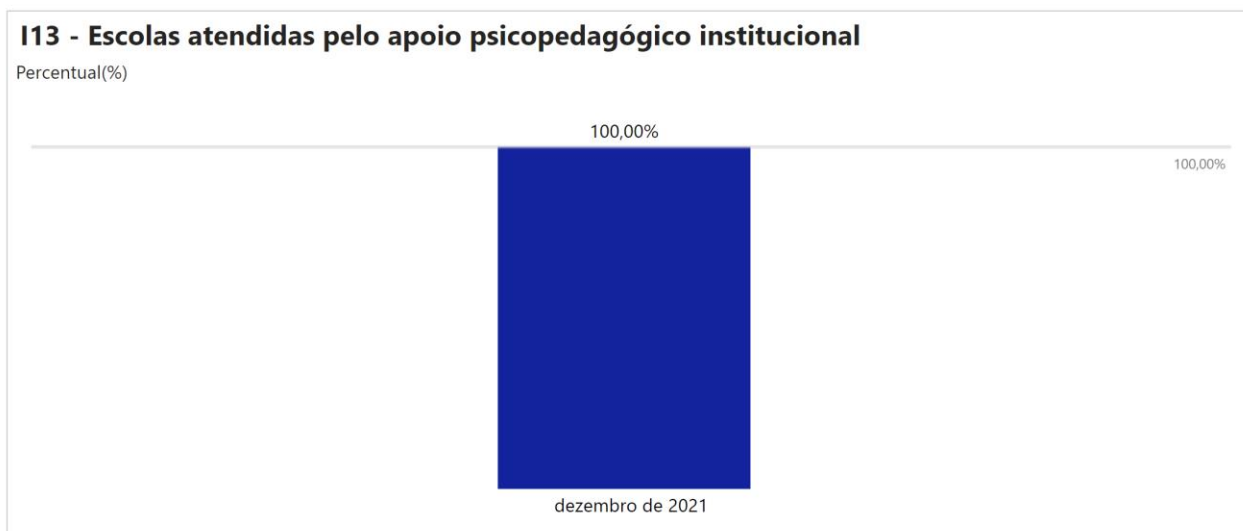


Gráfico 7: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Em Andamento
Cláusula	97	caput	Em Andamento
Cláusula	98	a	Em Andamento
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	3	Planejado

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2022 ● Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
- dezembro de 2022 ● Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
- dezembro de 2022 ● Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingidas
- dezembro de 2022 ● Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades¹

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Restauro de 10 peças na Reserva Técnica, atingindo 34% da obrigação total (que se encerra em outubro de 2024).

Lançamento do Edital Doce com linha reparatória das Referências Culturais (com avanço no cumprimento da cláusula 99 do TTAC): previsão de investimento de 23 milhões de reais e apoio a cerca de 300 projetos. Pelo PG12, previsão de investimento de 2 milhões de reais e apoio a aproximadamente 20 projetos.

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

O detalhamento dos indicadores, com a ficha daqueles consensuados, está em processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Concluído Internamente
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- agosto de 2022 ● Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
- setembro de 2022 ● Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo
- dezembro de 2022 ● Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas
- dezembro de 2022 ● Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
- dezembro de 2022 ● Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
- dezembro de 2022 ● Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Finalização da primeira etapa do desenvolvimento do empreendedorismo turístico nos municípios polos, com a construção dos Arranjos Produtivos Locais de Turismo nos 4 municípios polo.

Lançamento da Segunda edição do Edital Doce com linha reparatória do Lazer (com avanço no cumprimento da cláusula 104d do TTAC): previsão de investimento de 23 milhões de reais e apoio a cerca de 300 projetos. Nesta linha, previsão de investimento de 9 milhões de reais e apoio a aproximadamente 50 projetos.

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

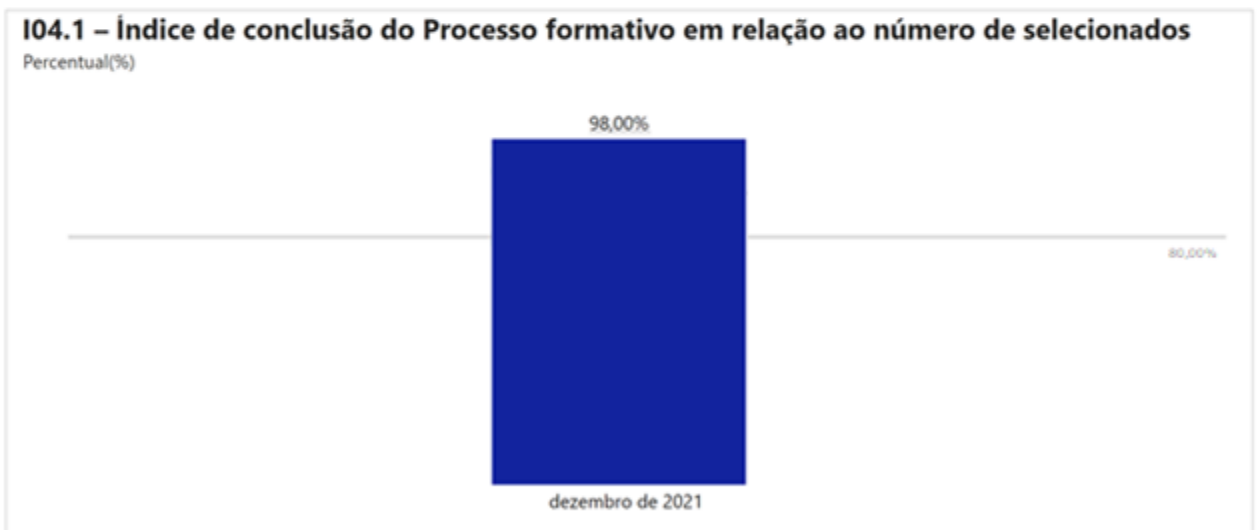


Gráfico 2: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

Indicadores

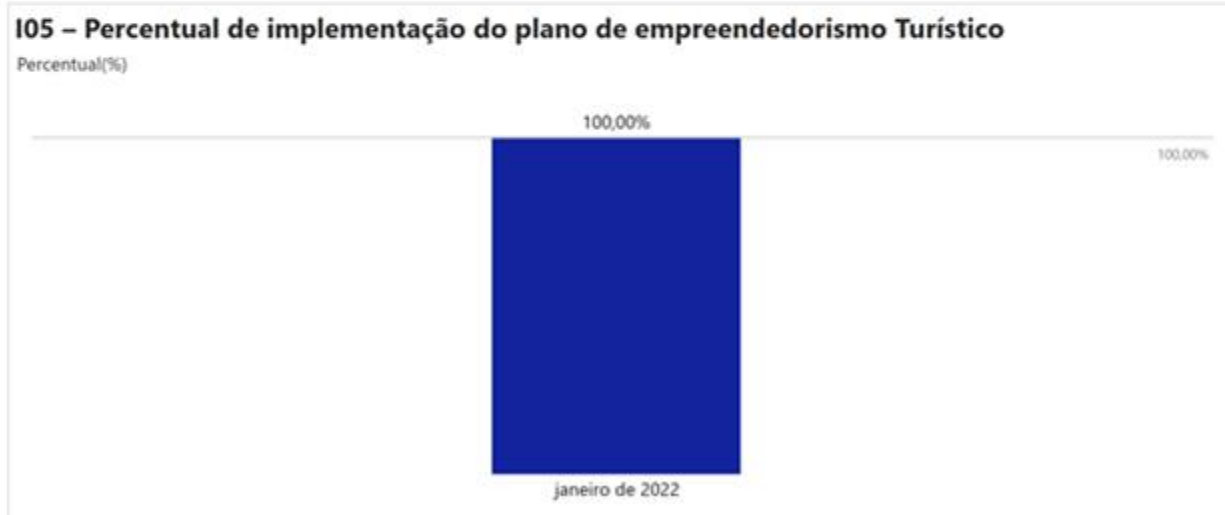


Gráfico 3: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual




Gráfico 4: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Concluído Internamente
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- agosto de 2022 ● Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
- setembro de 2022 ● Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo
- dezembro de 2022 ● Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas
- dezembro de 2022 ● Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
- dezembro de 2022 ● Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
- dezembro de 2022 ● Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Finalização da primeira etapa do desenvolvimento do empreendedorismo turístico nos municípios polos, com a construção dos Arranjos Produtivos Locais de Turismo nos 4 municípios polo.

Lançamento da Segunda edição do Edital Doce com linha reparatória do Lazer (com avanço no cumprimento da cláusula 104d do TTAC): previsão de investimento de 23 milhões de reais e apoio a cerca de 300 projetos. Nesta linha, previsão de investimento de 9 milhões de reais e apoio a aproximadamente 50 projetos.

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual



Gráfico 2: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

Indicadores

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Percentual(%)




Gráfico 3: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Percentual(%)




Gráfico 4: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- fevereiro de 2022 ● Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das pesquisas mineiras da Chamada 09/2018
- maio de 2022 ● Finalização do Hub de Inovação em Mariana - Rodada I
- novembro de 2022 ● Celebração dos Convênios dos projetos selecionados da Chamada Agroecologia ES
- novembro de 2022 ● Celebração dos Convênios dos projetos selecionados da Chamada Agroecologia MG
- dezembro de 2022 ● Finalização do Rio Doce Digital (Empreende Rio Doce Rodada I Mariana)
- dezembro de 2022 ● Finalização do Empreendedorismo Universitário (Empreende Rio Doce Rodada I Mariana)
- dezembro de 2022 ● Finalização do Empreendedorismo Universitário (Empreende Rio Doce Rodada II - Médio e Foz)
- dezembro de 2022 ● Finalização do Projeto de Capacitação de Gestores Públicos para Inovação (Empreende Rio Doce)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Lançamento da Chamada Pública de Agroecologia e Produção Orgânica no Espírito Santo, em parceria com a FAPES, em 25/03/2022

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Número




Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor atualizado e auditado passa a ser de 13,77%. Este valor será reportado até novo período de medição do indicador.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero.

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IV
abril de 2022		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce
abril de 2022		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce
abril de 2022		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce
abril de 2022		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral
abril de 2022		Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce
abril de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral II
junho de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral V
julho de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual I
setembro de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VI
outubro de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral III
dezembro de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VII
dezembro de 2022		Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual II

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades:
 - 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
 - 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro:
 - 8880 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
 - 4 Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES;
 - 1 Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
 - 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 162 pessoas beneficiadas;
 - 7 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
 - 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
 - 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
 - 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
 - 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
 - 4 associações beneficiadas:
 - 30 ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77 ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38 APIGUA (Guaxe)
 - 52 APAP (Povoação);
 - 2 associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
 - 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
 - 4 Planos de negócio entregues.

- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado:
 - 3090 Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais.

Fatos relevantes do mês

- Conclusão de 10 books municipais (Baixo Guandu, Conceição da Barra, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Itueta, Marliéria, São Domingos do Prata, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe e Timóteo) - Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca.
- Entrega do quarto informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	STATUS
I01	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de exercer atividades alternativas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os pescadores e aquicultores em atividades alternativas nos projetos Cultivando para Pescar, Associativismo e Cooperativismo e, de acordo com os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I02	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) em condições de retomar o exercício das atividades produtivas	100%	dez/25	O indicador será medido considerando os projetos beneficiados no 1º e 2º edital de apoio e, de acordo com os resultados obtidos através das atividades de campo da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro. A base do indicador será reformulada para melhor apuração dos resultados.
I03	Percentual de pescadores(as)/aquicultores(as) atendidos(as) pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	dez/24	O indicador será medido após início da execução das atividades da ATER e coleta das assinaturas dos termos de adesão/recusa. Ressalta-se que estamos aguardando manifestação da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta técnica apresentada pela Fundação Renova.

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
Apoio à liberação da pesca de algumas espécies, pelo IEF, por meio da Portaria N40, que atende a uma demanda da colônia Z-19 de Governador Valadares Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 116.	PG016.001: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de apoio ao processo de liberação da pesca de algumas espécies de peixes, em atendimento a uma demanda da colônia de pescadores Z-19 de Governador Valadares, conforme reportado no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Possível erro de reporte. Ação foi conduzida pela Colônia Z-19 e outros grupos de pescadores sem a participação da Fundação Renova, pois a Portaria 78/2016, revogada pela Portaria 40/2017, ambas do IEF, os descaracterizavam na categoria de segurança especial, impedindo-os de acessar o seguro defeso e consequentemente impactando nas questões previdenciárias da classe.
Articulação interinstitucional em apoio a alternativas produtivas com o Incaper-ES para Aracruz e Linhares Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 117.	PG016.002: As evidências disponibilizadas pela Fundação Renova não demonstram a realização de articulação interinstitucional com o Incaper em outubro de 2017, data do reporte da ação no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Possível erro de reporte da data de realização da ação que de fato ocorreu com comprovado por documentação, porém em novembro de 2017. Em relação à Aracruz, cabe esclarecer que ocorreu a participação de um técnico do INCAPER cujo local de trabalho é a base do referido órgão em Aracruz e que apoiou o desenvolvimento das ações descritas e reportadas em Linhares.
Realização de painéis técnicos sobre atividades pesqueiras, retomada das atividades aquícolas e estabelecimento de relação com os stakeholders em Minas Gerais e Espírito Santo Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017	PG016.003: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes para corroborar a realização do painel técnico de retomada das atividades aquícolas em Minas Gerais, conforme reportado no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Foram apresentadas evidência da comunicação realizada no site da Fundação Renova referente a realização do Painel Técnico em Minas Gerais em 23/01/2017 conforme link a seguir: https://www.fundacaorenova.org/noticia/solucoes-para-retomada-da-pesca-sao-discutidas-em-evento-com-especialistas-em-bh/
Apresentação das propostas técnicas do programa, objetivando a construção coletiva para as comunidades pesqueiras impactadas Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 116.	PG016.004: A Fundação Renova não apresentou evidências de realização de apresentação do PG016 à associação de pescadores da comunidade do Guaxe, conforme ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Possível erro de reporte em relação a realização de evento na comunidade do Guaxe. Para todas as demais localidades foram apresentadas as evidências.
Apresentação das propostas técnicas do programa, objetivando a construção coletiva para as comunidades pesqueiras impactadas Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017.	PG016.005: A Fundação Renova não apresentou evidências da realização de apresentação das propostas técnicas do programa PG016 para as comunidades pesqueiras impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017.	PG016.005: Foram identificadas novas evidências em relação as reuniões que foram realizadas com participação do PG16 com comunidades pesqueiras impactadas durante o ano de 2017 que foram encaminhadas a EY para reanálise e encerramento do ponto de auditoria identificado.
Ação de engajamento para continuidade do processo de implantação dos projetos de geração de renda alternativa - aquaponia, horta comunitária e piscicultura - realizado com os pescadores e pescadoras das comunidades de Povoação e Regência Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 117.	PG016.006: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes para demonstrar a realização de ações de engajamento sobre a implementação de projetos de geração de renda alternativas com os pescadores de Povoação em setembro de 2017, conforme ação reportada como concluída no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Possível erro de reporte cabe esclarecer que as reuniões aconteceram em Novembro conforme evidências encaminhadas a EY.
Processo de definição, planejamento, aprovação e implementação dos projetos de aquaponia no estado do Espírito Santo Fonte Relatórios Anuais de 2017 e 2018 e do Relatório Mensal de Atividades de maio de 2019. Verificação das evidências de início da implementação do projeto "Cultivando para Pescar" Fonte: Relatório Mensal de Atividades de maio de 2019.	PG016.007: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar que a implementação do projeto "Cultivando para Pescar" teve seu início até maio de 2019, conforme ação reportada como iniciada no Relatório Mensal de Atividades de maio de 2019.	Possível erro de reporte cabe esclarecer que previamente ao início da execução/implantação do Projeto, durante os anos de 2017 e 2018, foram realizadas as fases de definição, planejamento e aprovação no CIF do plano de trabalho a ser executado. O contrato de parceria foi assinado em 5 de abril de 2019, o kick off do projeto ocorreu em 15 de abril de 2019 e a Publicação no Diário Oficial da União em 20 de maio de 2019. Apenas após a publicação no DOU que o projeto pode de fato iniciar a sua execução conforme evidências encaminhadas a EY.
Processo de implementação do projeto de piscicultura e horta comunitária Inova Pesca na comunidade de Regência Fonte: Relatórios Anuais de Atividades de 2017 e 2018.	PG016.008: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de articulação com a APARD para apoio ao projeto Inova Pesca, o início da operação do projeto em parceria com a ASPER e Incaper, e a assinatura de termo de compromisso entre as partes envolvidas, conforme reportado nos Relatórios Anuais de Atividades de 2017 e 2018.	Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a APARD está instalada em localidade diferente (Governador Valadares) de onde o projeto Inova Pesca foi implementado. Retiramos que quanto ao projeto INOVAPESCA a Fundação Renova não tem qualquer responsabilidade técnica ou de execução, pois esse projeto foi financiado pela Fundação Banco do Brasil.
Apresentação do programa de criação de pescado em tanques-redes como alternativa produtiva para a APARD - Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 117.	PG016.009: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de apresentação do programa de criação de pescado em tanques-redes como alternativa produtiva para a APARD, ação reportada como concluída em julho de 2017 no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a apresentação foi realizada pela APARD em relação a projeto que ja desenvolvia e que fora construído com apoio de especialista da UFJF de criação de pescado em tanques-redes como alternativa produtiva a pesca.
Parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para proposta de arranjo sócio produtivo da piscicultura em tanques-rede e pesquisa sobre as condições do rio Doce Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017.	PG016.010: A Fundação Renova não apresentou evidências da realização de parceria com a UFJF para proposta de arranjo sócio produtivo da piscicultura em tanques-rede e pesquisa sobre as condições do rio Doce, ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a apresentação foi realizada pela APARD em relação a projeto que ja desenvolvia e que fora construído com apoio de especialista da UFJF de criação de pescado em tanques-redes como alternativa produtiva a pesca. Não foi gerado registro em ata, somente registro fotográfico que foi encaminhado a EY. Observa-se também que o PG16 é um programa reparatório não financia projetos de pesquisa.
Processos de elaboração e aprovação dos projetos conceituais e início da implantação da miniestação de energia limpa e da rampa de subida de barco (miniestaleiro) em Regência, no Espírito Santo Fonte Páginas 127 e 129 do Relatório Anual de Atividades de 2018.	PG016.011: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes que corroborem a aprovação do projeto conceitual da construção da rampa para subida de barco na sede da ASPER em Regência, conforme reportado no Relatório Anual de Atividades de 2018.	A aprovação junto à comunidade ocorreu em 27/02/2018 e, em assembleia para aprovação ampliada dos Projetos na Foz em 25/09/2018, o projeto conceitual foi novamente apresentado a ASPER não havendo objeções conforme registro da reunião encaminhada a EY.
Verificação das evidências da contratação de fornecedor para elaboração de projeto conceitual da miniestação de energia limpa Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2018	PG016.012: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes que corroborem a contratação de fornecedor responsável pela elaboração de projeto conceitual referente à implantação de miniestação de energia limpa na sede da ASPER em Regência, ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2018.	Foram identificadas evidências em relação a contratação de fornecedores pela Engenharia da Fundação Renova para elaboração do projeto conceitual da micro estação de energia limpa na ASPER no ano de 2018 que foram encaminhadas a EY para reanálise e encerramento do ponto de auditoria identificado.
Articulação junto a Universidade Federal do Espírito Santo para parcerias com projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de censo, estatística, monitoramento e ordenamento pesqueiro Fonte: Página 117 do Relatório Anual de Atividades de 2017.	PG016.013: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de articulação junto a UFES para parcerias com projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de censo, estatística, monitoramento e ordenamento pesqueiro, ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Possível erro de reporte de data, considerando que há evidências da articulação junto a UFES para o período de 2019 que culminaram em assinatura de parceria para realização da caracterização socioeconômica e monitoramento pesqueiro no rio Doce conforme evidência encaminhada a EY.
Orientação à APARD sobre cooperativismo, associativismo e modelos de negócio para auxiliar na constituição da cooperativa ligada ao setor da pesca Relatório Anual de Atividades de 2017.	PG016.014: A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar que prestou orientação à APARD sobre cooperativismo, associativismo e modelos de negócio para auxiliar na constituição da cooperativa ligada ao setor da pesca, a ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017.	Não foram encontradas evidências que identifique a realização dessa ação da forma como reportado.
Manifestações direcionadas ao Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	PG016.015: Não foram identificados no sistema SGS registros de respostas aos manifestantes para os protocolos de manifestação 175-20170726 e 729-20171107, apesar dos mesmos possuírem a classificação no campo "Status manifestação" como Respondido no ato.	Cabe destacar que as referidas manifestações foram respondidas no ato, por telefone, e por isso não têm anexos registrados. Apenas do encerramento da solicitação conforme evidência encaminhada a EY.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado
Cláusula	74	c	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
- dezembro de 2022 ● Término dos contratos de aluguel de pastagem

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 195 são do PASEA planejados sendo que 195 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 2 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 32 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.962,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 13.628,7 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 135 propriedades;
- 459 barraginhas realizadas;
- 902 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.183 hectares de reestruturação produtiva executados.

- Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 5.642 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 10.244 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 48.149 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.856 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 5.282 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 216 toneladas no mês.

Parcerias

- 33 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 22 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)

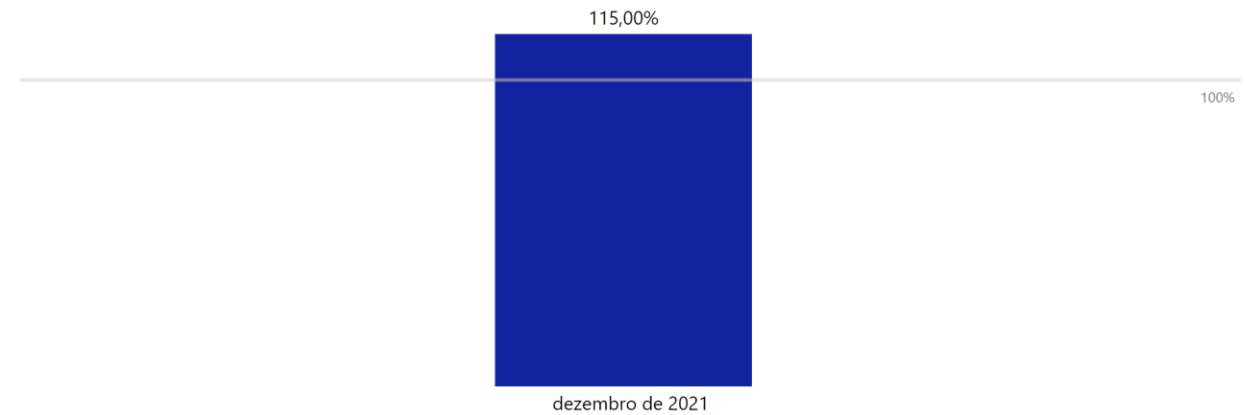


Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benefeitorias Impactadas

Percentual(%)

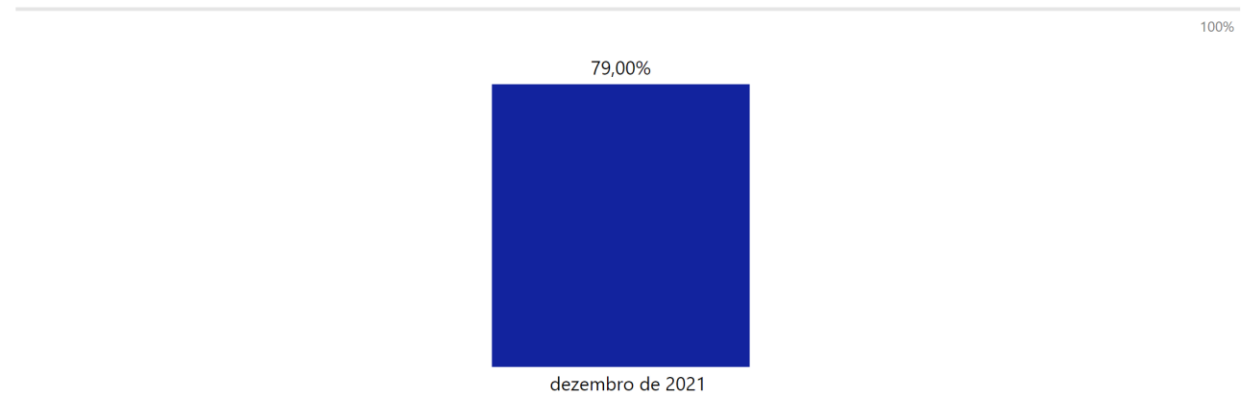


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benefeitorias Impactadas - Frequência Anual

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
13	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
14	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	Nº de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / nº de produtores participantes do Programa	%
15	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
16	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
17	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	Nº de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
18	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas) / (Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)	%

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente
Deliberação	503	3	Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- maio de 2022 ● Repasse Recursos para o BDMG - Diversifica Mariana (Marco CIF 2022)
- junho de 2022 ● Entrega das Colméias
- agosto de 2022 ● Repasse do recurso Renova - BDMG
- outubro de 2022 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Baixa Verde / Dionisio (Marco CIF 2022)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 61,97 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 51 milhões foram **desembolsados** para 1531 contratos e 1174 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 11 milhões foram **desembolsados** para 435 contratos e 409 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Ref. Fevereiro/2022

Fatos relevantes do mês

Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce (MG) - Protocolado abertura para licenciamento ambiental da agroindústria.

Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce (MG) - Conclusão de 86 diagnóstico individual da propriedade para implantação da cadeia produtiva da fruticultura nos assentamentos participantes do projeto para total de 166 famílias.

Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce (ES) - Execução da Obra Civil - construção de um galpão, armazém e escritório - 466,13 m² no Assentamento Valdício.

Por ser um programa compensatório, o PG 18 necessita das deliberações do CIF para a execução dos seus projetos. Conforme a NT 095/2021, o projeto Banco Comunitário foi recomendado pela CTEI em 10/11/2021 e até hoje não foi deliberado pelo CIF, gerando atrasos no planejamento e execução do programa em 2022. Conforme a NT 102/2022, o projeto Distrito Empresarial foi recomendado pela CTEI em 14/01/2022 e também sem pauta para deliberação do CIF. Essa demora compromete todo o planejamento e a aderência financeira de 2022, com repasse previsto de R\$ 14.778.628,44.

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Percentual(%)

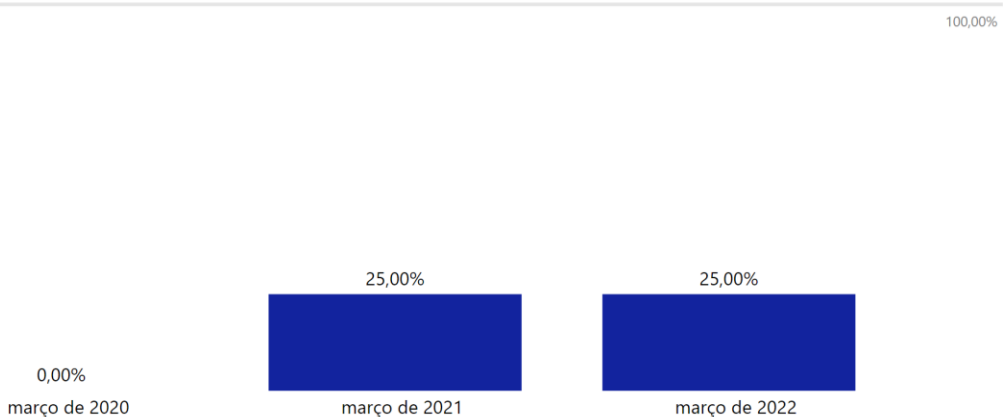


Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

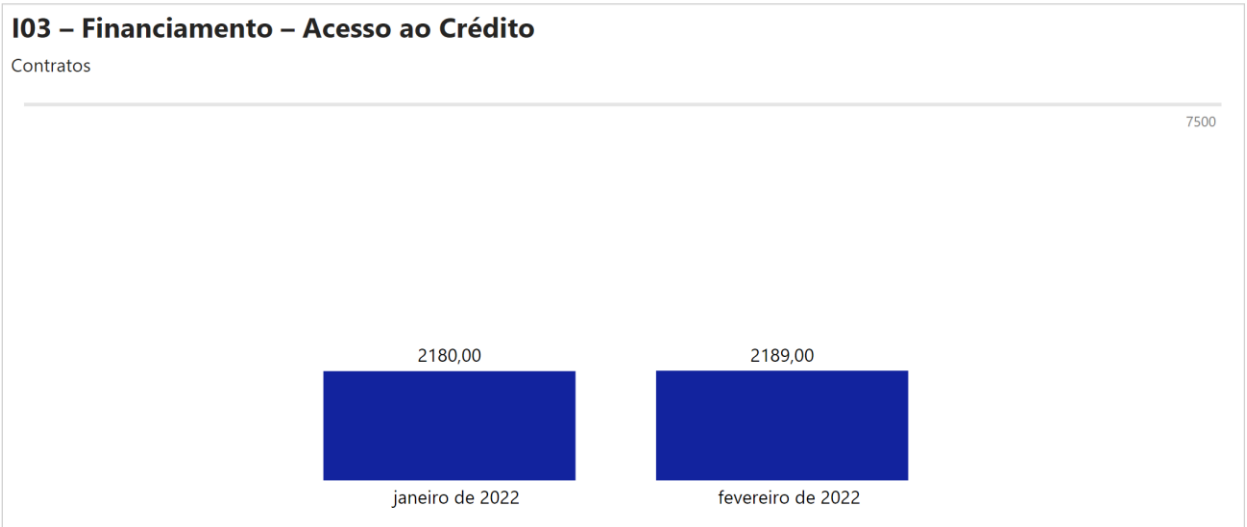


Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal




Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios- Frequência Mensal

Indicadores

I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Atendimentos

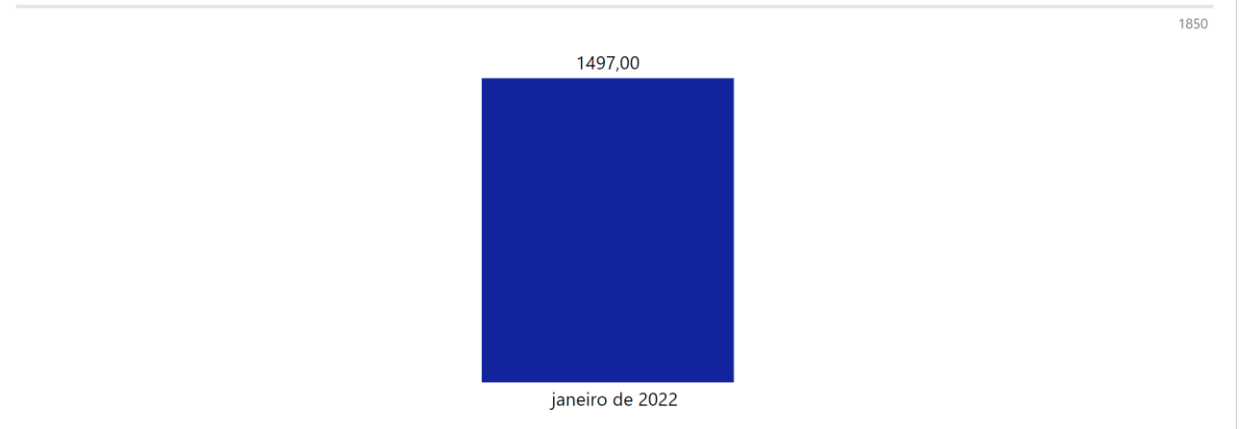


Gráfico 5:I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Atendimentos

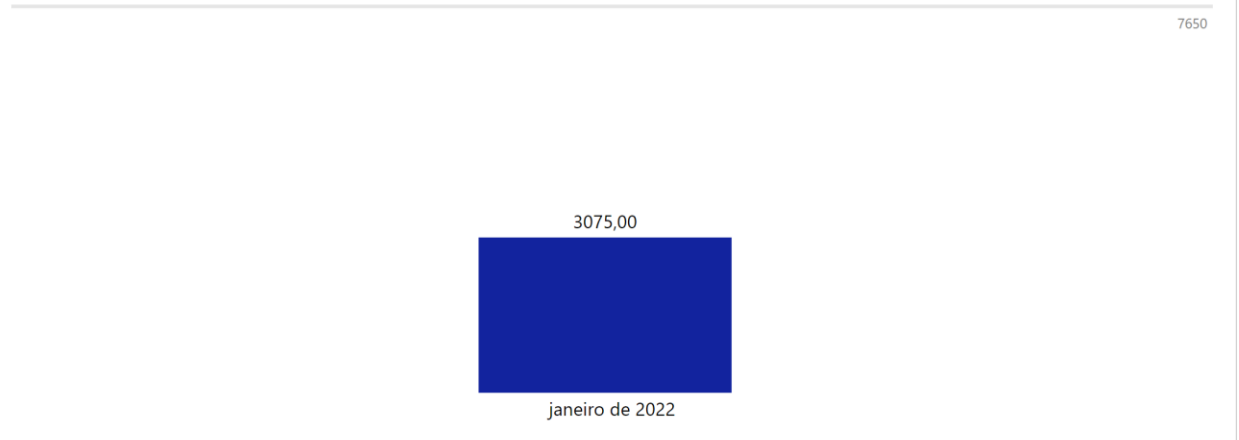


Gráfico 6:I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- junho de 2022 ● Finalização - assessoria técnica e implementação de melhorias para 40 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação.
- julho de 2022 ● Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 50 negócios atingidos
- julho de 2022 ● Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 50 negócios.
- agosto de 2022 ● Finalização de assessoria técnica para 30 negócios impactados nos Reassentamentos e ARD.
- outubro de 2022 ● Finalização da fase 1 do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação
- novembro de 2022 ● Finalização - Reposição de insumos e equipamentos para 10 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2022 ● Finalização de atendimentos de 120 negócios pelo PG-19
- dezembro de 2022 ● Finalização dos atendimentos de assessoria técnica para 10 negócios em Empreendedorismo Jovem do Reassentamento
- dezembro de 2022 ● Reposição de insumos e equipamentos para 10 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

411 **micro e pequenos negócios atendidos**, deste total, 585 refere-se a quantidade de **assessoramento e planejamento de negócios**, 16 a quantidade de **aluguéis**, 192 o número de **reposições de equipamentos e insumos** e 6 **reforma e/ou adequação de infraestrutura**.

Nota-se que a soma dos atendimentos por tipo (799) ultrapassa a quantidade total de atendidos (411). O motivo dessa diferença é que um atingido pode receber mais de um tipo de atendimento para o mesmo estabelecimento.

Fatos relevantes do mês

Lançamento Cartilha Formalização de Negócios em Março de 22.

Lançamento Cartilha Acesso a Crédito em Março de 22.

Indicadores



Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

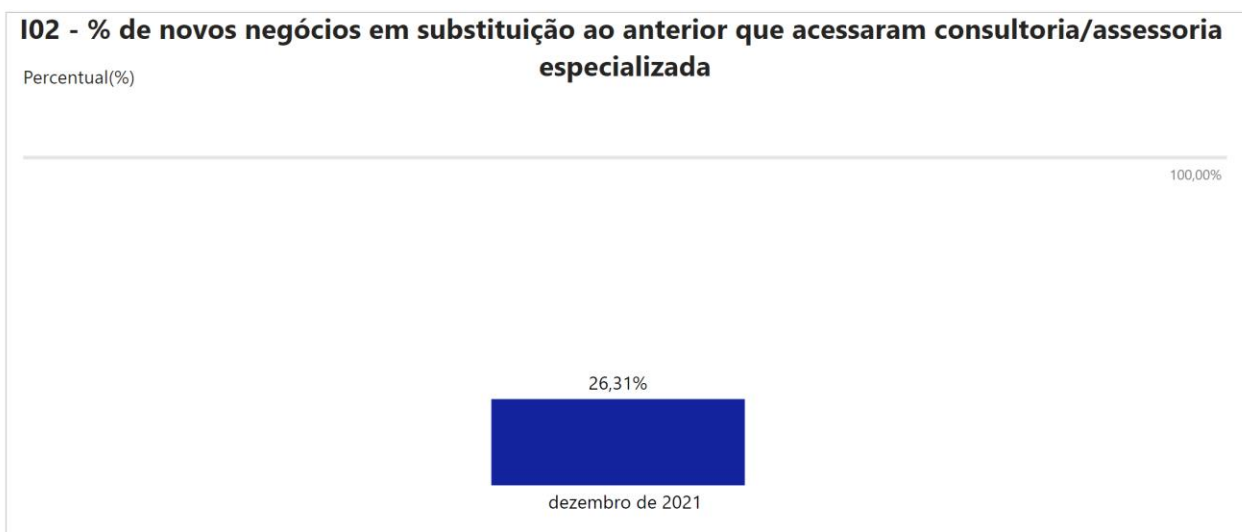


Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores




Gráfico 1: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

¹ O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do cadastro da Fundação Renova.

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- agosto de 2022 ● Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana (marco CIF-Planejamento 2022)
- novembro de 2022 ● Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF- Planejamento 2022)
- dezembro de 2022 ● Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2022)

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes Números

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.335 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.208 **reprovadas** e 2.617 **evadidos**. *
- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 149 **turmas, abertas** 4.041 **vagas**, 3.565 **pessoas matriculadas**, 304 **concluintes**, 1.888 **reprovadas** e 1.182 **evadidos**.
- **R\$ 2.101.830** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

*Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.

Fatos relevantes do mês

Desenvolvimento de Fornecedores:

Realizadas no mês de março, as palestras com os seguintes temas: Gestão da Produtividade e Gestão Financeira com Foco em Resultados para as 20 empresas participantes da 2ª turma do Espírito Santo.

Contratação Local:

Realizada a contratação de 428 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 231 contratações locais e 197 contratações não locais. Dessas 201 contratações, 341 profissionais são de Minas Gerais, 16 do Espírito Santo e 71 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 158 currículos e prospectadas 58 vagas de emprego no mês. No acumulado, 3.632 currículos estão cadastrados e 2.803 vagas já foram captadas.

Capacitação Profissional Presencial:

Foram realizados sete workshops no mês de março com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana/ (Bento Rodrigues/ Paracatu), Linhares Sede, Regência, Povoação, Ipatinga e Governador Valadares. 175 vagas foram ofertadas, 134 inscritos e 72 participantes.

Em março iniciamos duas turmas do curso de Assistente Administrativo para as comunidades de Regência e Povoação | ES. Foram ofertadas 50 vagas e tivemos 17 inscritos em cada distrito.

Em Mariana iniciamos uma turma do curso de Eletricista de Instalações Prediais. Foram ofertadas 25 vagas e 23 inscritos.

Indicadores

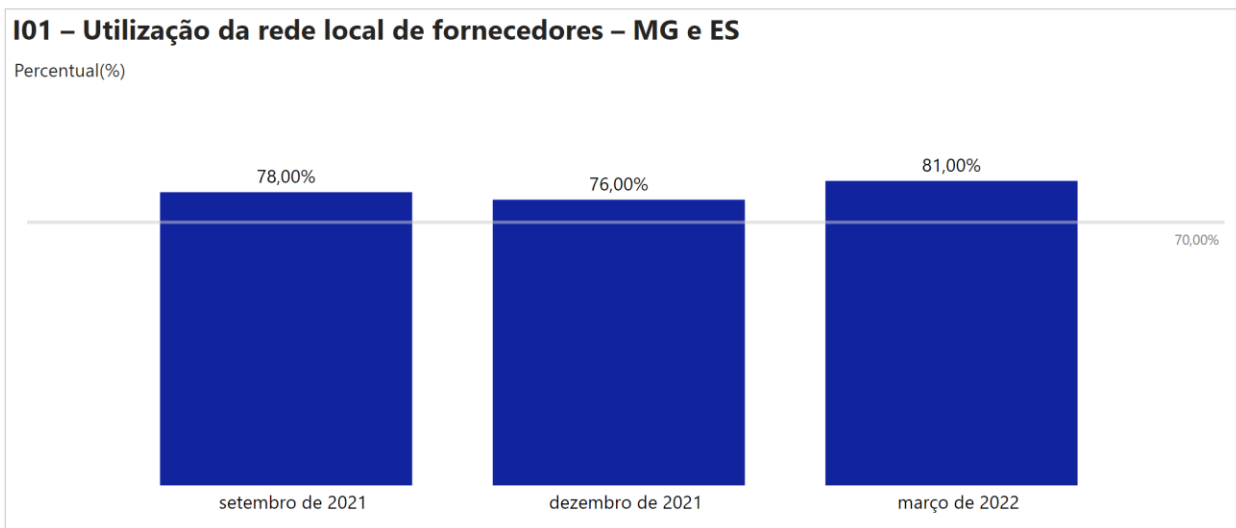


Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

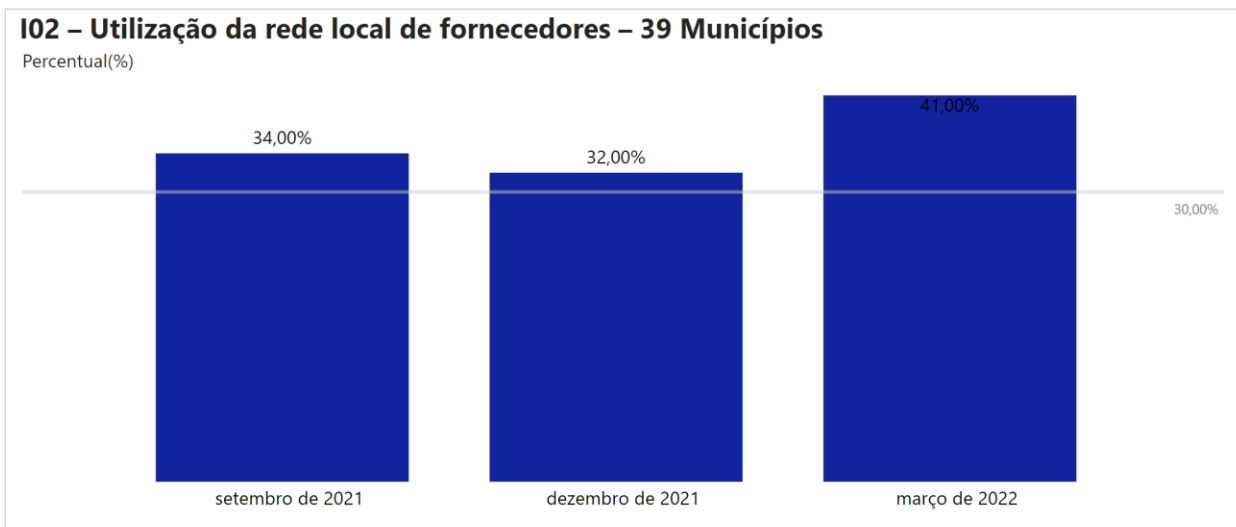


Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

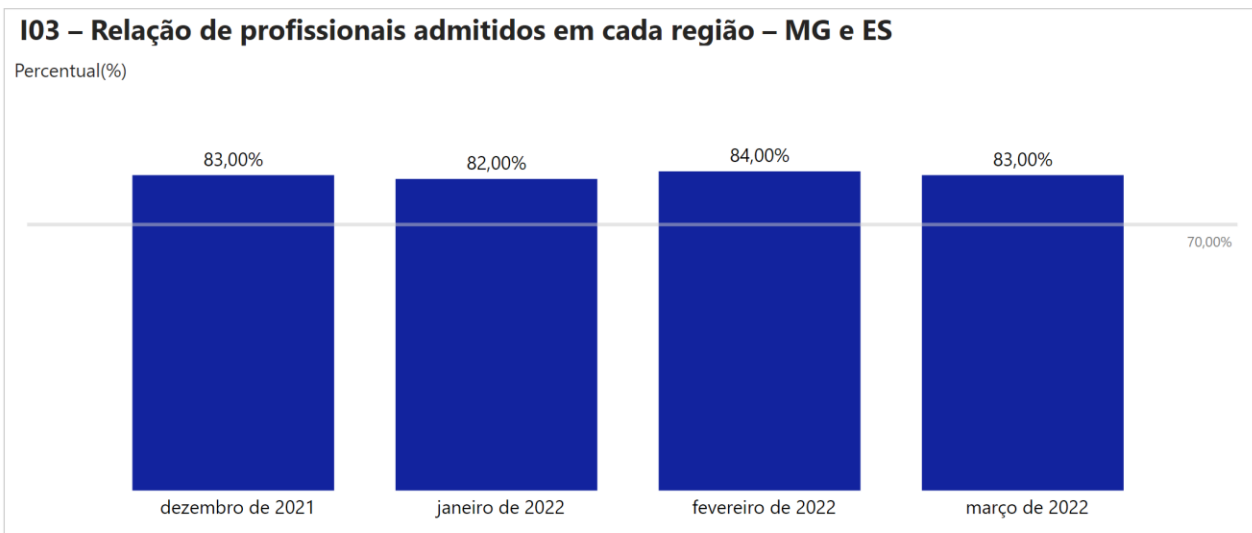


Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

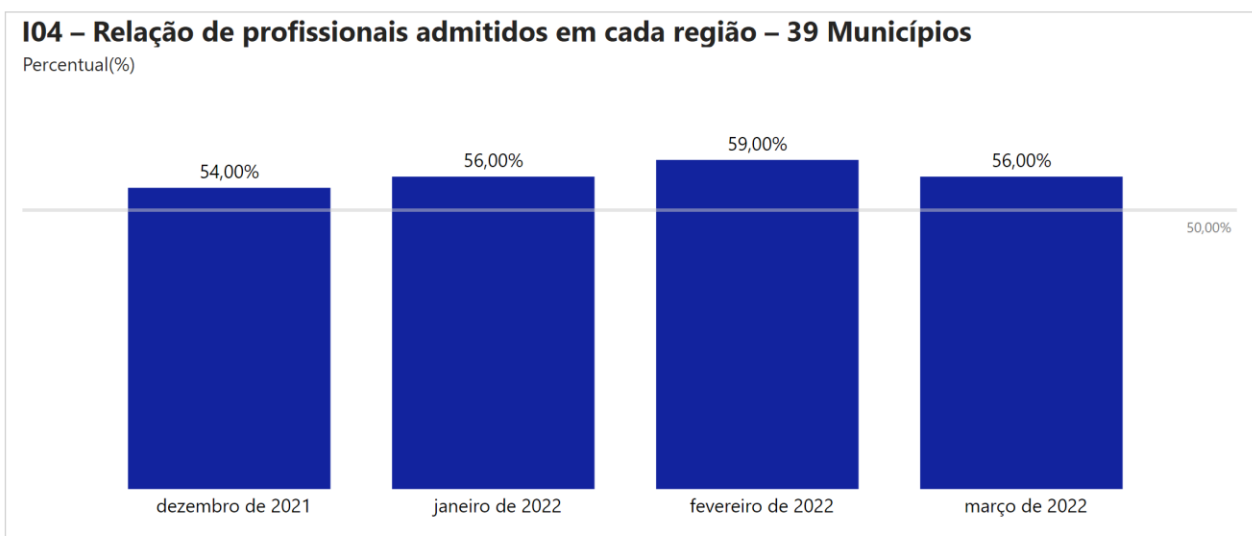


Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Quantidade

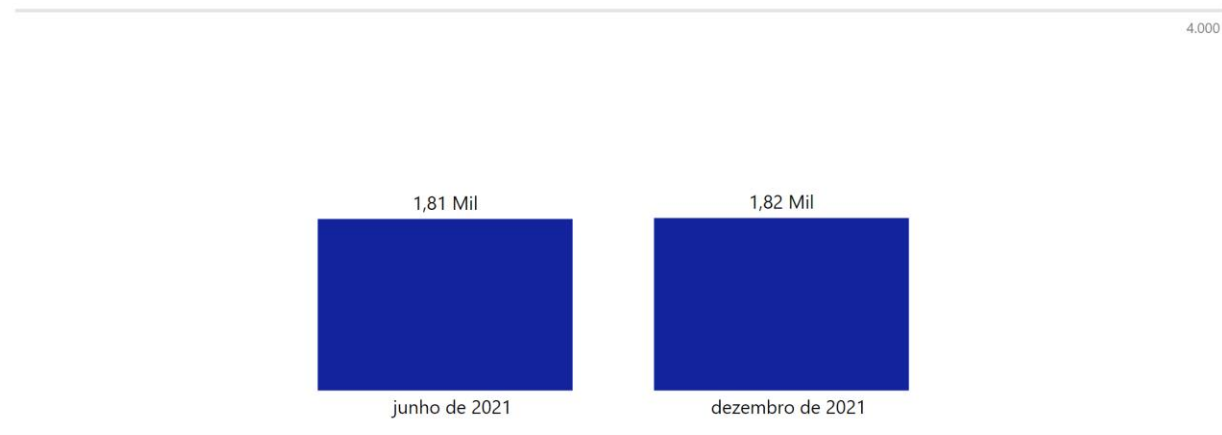


Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadual área de atuação da Renova

Percentual(%)

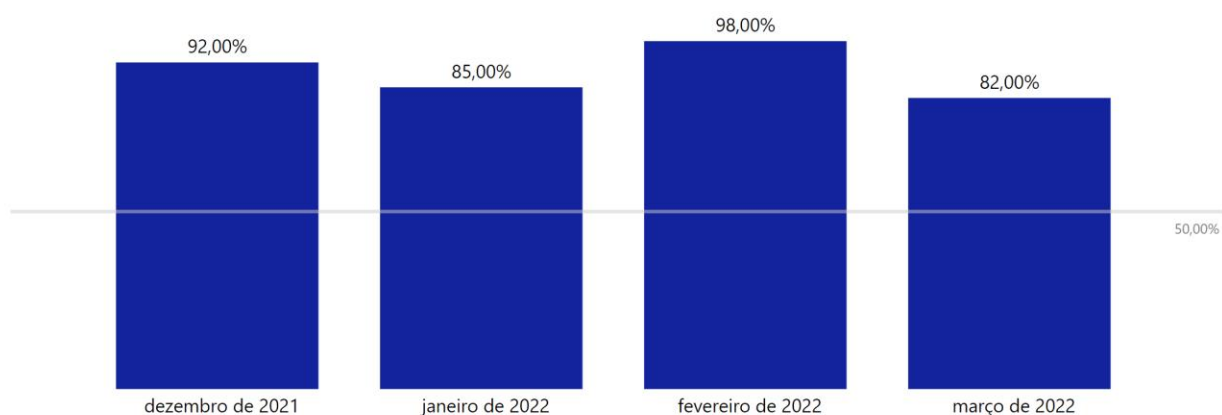


Gráfico 6: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadual área de atuação da Renova - Frequência Mensal

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2b	Judicializado
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 3.051 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 6.581 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$ 1.713,2 Mi** .

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 2 auxílios.

Exclusão de 684 auxílios.

Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

Indicadores

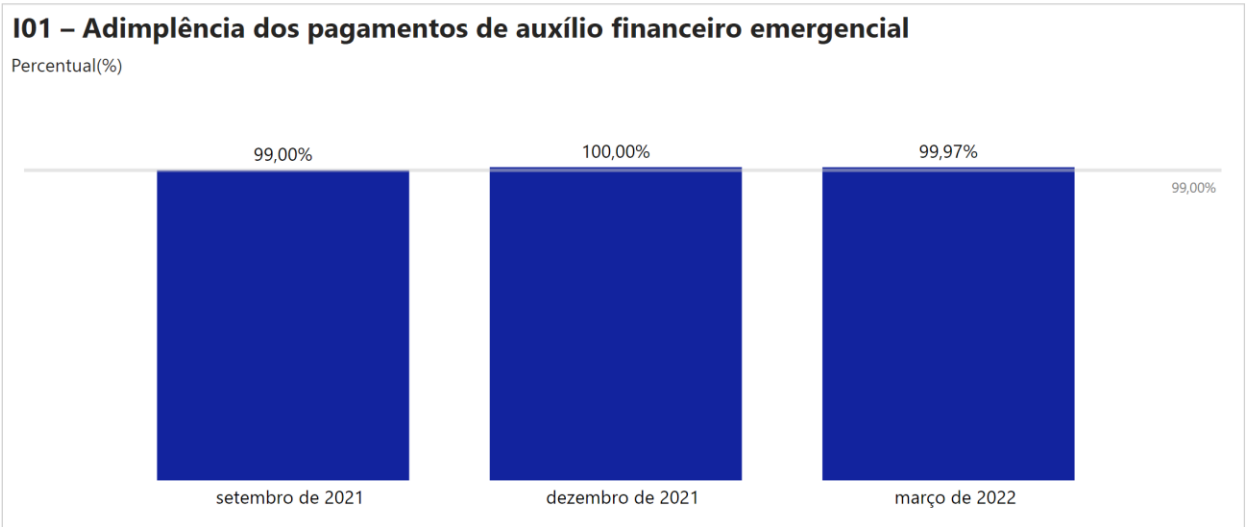


Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

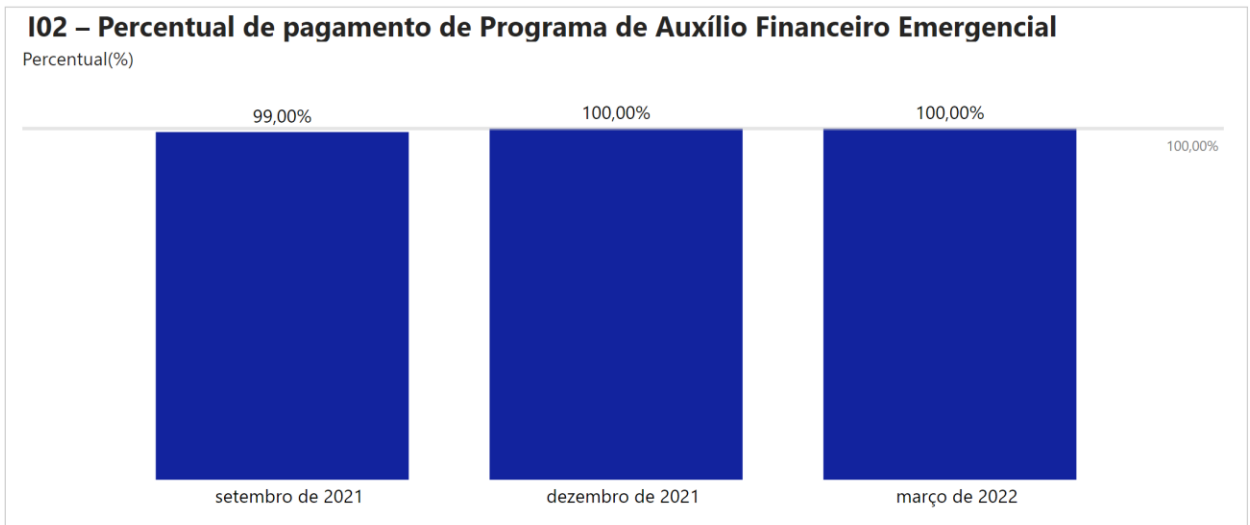


Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Em Andamento
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente

Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	4	Concluído Internamente

Deliberação	488	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	3	Concluído Internamente
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	544	2	Concluído Internamente
Deliberação	544	3	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- 
- maio de 2022 ● Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica
 - julho de 2022 ● Conclusão dos Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias (Monitoramento da Vegetação e Monitoramento de Processos Erosivos) - 4º Ano hidrológico
 - dezembro de 2022 ● Conclusão dos serviços de Monitoramento de e solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Reunião GTBaixo Doce – fechamento de 2 anos de estudos na região deltaica do ES, em atendimento a NT CT-GRSA nº 05/2019

Reunião Gerencial CT-GRSA - esclarecimentos Nota Técnica CT-GRSA nº 21/2021 (Item 10.1 do Eixo Prioritário 1)

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Em Andamento
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022	●	Conclusão do convênio UFV-SIF - Prof. Venâncio (Acompanhamento técnico, definição de indicadores, metas e monitoramento das ações de restauração florestal da Área Ambiental 1)
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2022

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

Conclusão do levantamento aerofotogramétrico da campanha RPA07

Indicadores

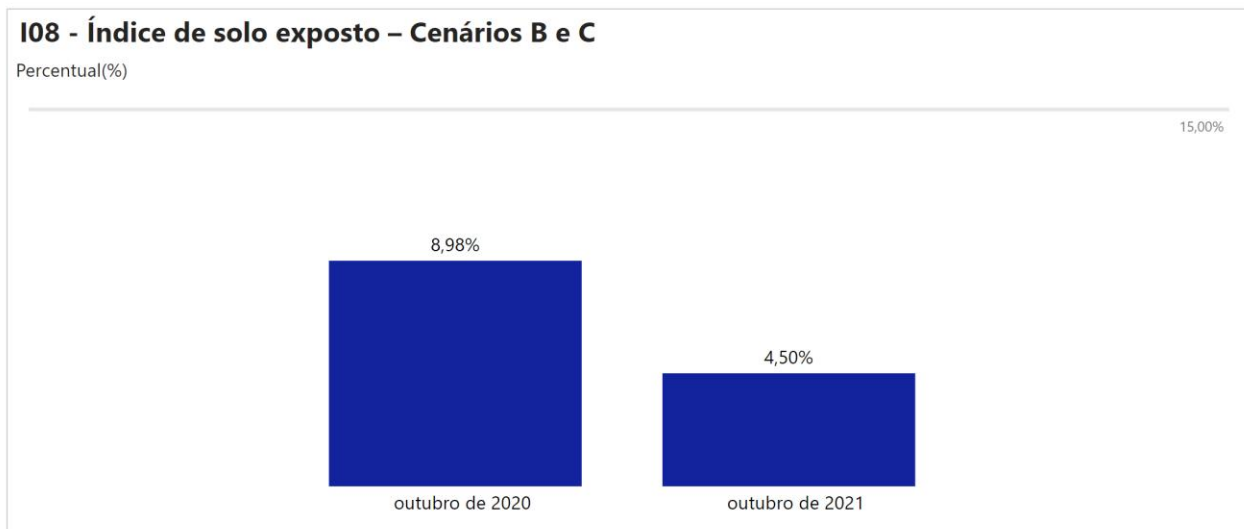


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianaual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 21/22
fevereiro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pancas - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Manhuaçu - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pancas - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Suaçuí - 22/23

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1634,3 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 280 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 23,3 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R\$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 14 Mil hectares validados.

Fatos relevantes do mês

Abertura dos editais de contratação de serviços técnicos, científicos e operacionais referente à restauração florestal de 3192,52 ha composto por 4 lotes de 798,13 hectares, na Bacia do Guandu no estado do Espírito Santo e recurso financeiro máximo definido de R\$ 102.547.563,20.

Apresentação da proposta de revisão das metas do Programa 26 para o Comitê de Bacias do Manhuaçu – CBH Manhuaçu.

Assinatura do Termo de compromisso com o Governo do Estado do Espírito Santo para a Restauração de 5.190 hectares, sendo 2000 hectares em Baixo Guandu e Afonso Claudio e 3190 hectares para Afonso Claudio e Brejetuba.

Vistoria de campo com membros do CBH Manhuaçu nas áreas contempladas pelo programa 26 e durante a visita os trabalhos executados foram muito elogiados.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Riqueza de espécies	(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade de regenerantes	Número de indivíduos / Total da área amostral	Nº de indivíduos / ha
I03	Cobertura do dossel	(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total da área amostral) x 100	%

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
janeiro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 21/22
abril de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 19/21
abril de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Assentamentos MG e TI Krenak - 19/21
maio de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 19/21
junho de 2022	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 22/23
julho de 2022	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 22/23
julho de 2022	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
julho de 2022	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24
julho de 2022	●	Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 22/23
julho de 2022	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
julho de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 19/21
setembro de 2022	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
outubro de 2022	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 22/23

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1212 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 489 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 3 Mil **nascentes** inscritas no edital;
- R\$ 183 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 2 Mil Nascentes Validadas

Fatos relevantes do mês

Divulgação dos programas 26 e 27 para a rádio local do município de Mutum – MG.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Riqueza de espécies	(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade de regenerantes	Número de indivíduos / Total da área amostral	Nº de indivíduos / ha
I03	Cobertura do dossel	(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total da área amostral) x 100	%

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Reprogramado
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado
Cláusula	166	§1º	Reprogramado
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente

Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	●	Protocolo dos relatórios finais das linhas temáticas I a VI
janeiro de 2022	●	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2022	●	Conclusão do Ciclo 3 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
março de 2022	●	Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática
abril de 2022	●	Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática - Versão revisada
junho de 2022	●	Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI
junho de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto IV - SIF/UFV
junho de 2022	●	Realização da Oficina I de Elaboração do PA Integrado
julho de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto I - SIF/UFV
agosto de 2022	●	Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
setembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto II - SIF/UFV
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto III-B - SIF/UFV
novembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 5 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2022	●	Realização da Oficina II de Elaboração do PA Integrado

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização da 1ª reunião com o GAT (Grupo Assessor Técnico) do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce, dando início ao prazo de vigência de execução das ações.

Aprovação do documento de definição do Programa de Conservação da Biodiversidade Aquática (PG28), Cláusulas 164 a 166 do TTAC, por meio da Deliberação CIF no 583, de 25 de março de 2022.

Apresentação dos relatórios mensais das atividades da FUNDAÇÃO PRO-TAMAR, que compreendem as atividades desenvolvidas em Fevereiro e Março de 2022.

Indicadores

Quatro indicadores de eficácia foram aprovados no documento de Definição do Programa, visando promover o acompanhamento dos processos estabelecidos pelo programa, no entanto, novos indicadores que visem a mensuração dos resultados das ações do programa deverão ser definidos, assim que possível, e incluídos por deliberações do sistema CIF, para atender a Nota Técnica nº 12/2021/CTBio/DIBIO/ICMBio.

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente
Deliberação	554	1	Planejado

Entregas do ano de 2022

novembro de 2022	●	Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES
dezembro de 2022	●	Início da execução das obras do CETRAS MG

* Prazos de entregas baseados na premissa de que haverá definição dos terrenos do CETRAS-MG e CETRAS-ES até junho de 2022.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultados do programa foram aprovados em dezembro de 2021 pela Deliberação CIF 553, porém por solicitação do IBAMA, as ações deste programa estão paralisadas devido a indefinição sobre as áreas a serem construídos os CETRAS, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Desta forma, não será possível a medição dos indicadores até a retomada das ações ainda sem previsão.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrado
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrado
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

abril de 2022	●	Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento
julho de 2022	●	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna
agosto de 2022	●	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna
agosto de 2022	●	Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.
novembro de 2022	●	Protocolo do primeiro relatório semestral do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS.
novembro de 2022	●	Publicação da chamada do edital de pesquisas via Parceria com Funbio

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Percentual(%)

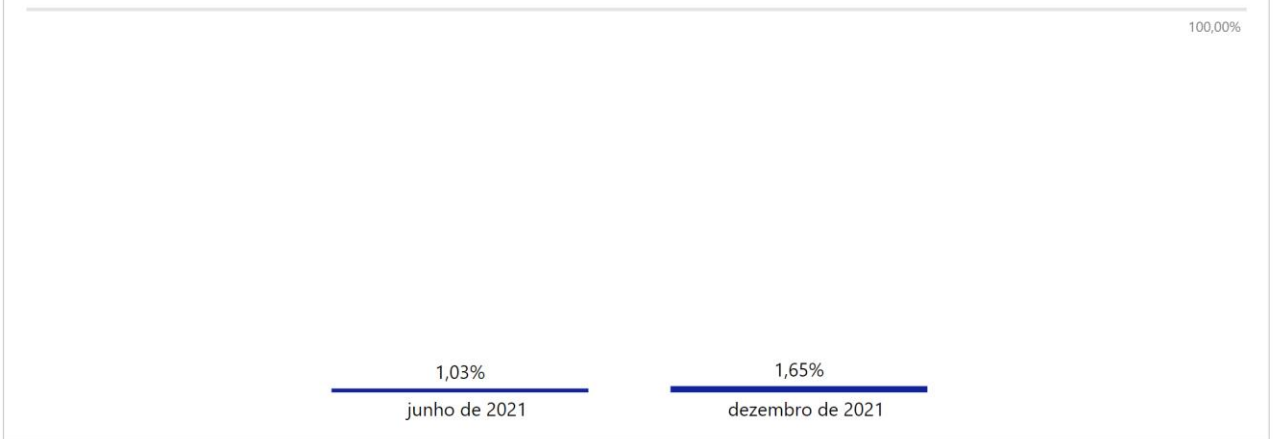


Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrado
Cláusula	170	Inc I	Encerrado
Cláusula	170	Inc II	Encerrado
Cláusula	170	Inc III	Encerrado
Cláusula	170	Inc IV	Encerrado
Cláusula	170	Inc V	Encerrado
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito ALPESPJ01 -Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01-Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança e empilhadeira manual hidráulica
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
abril de 2022	●	Conclusão do repasse Pleito RICESAO01-Construção de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
maio de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito GALESCT01-Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
maio de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB03-Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes
maio de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03-Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito NAQESPJ02-Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Tumiritinga TUMESCT01 para aquisição de terreno para SES da sede do município
julho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMRSPJ01-Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito AIMESCT02 -Aquisição de terreno para implantação de SES
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito PIARSAB01-Aquisição de triturador de resíduos orgânicos e galhos
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01-Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito IPAESOB03-Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito PERRSOB02-Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito MREESCT01-Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2022

setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito GALESPJ01- Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESOB03 -Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Barra Longa BALRSCT01 para aquisição de terreno para implantação de Usina de Triagem e Compostagem
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito NAQESPM01-Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito BEORSAB01-Aquisição de equipamentos e veículos
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito BUGESPJ02-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01-Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC)
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito TUMESPJ01-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito CVPRSAB01-Aquisição de 29 contêineres caçamba tipo roll on off de capacidade mínima de 30m ³
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito BALEST01-Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês **março de 2022** , foram repassados R\$ **1.629.337,92** para ações dos municípios*;
- No mês **março de 2022** foram ofertadas **0** **oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **março de 2022** a equipe técnica realizou **82** **visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

Nota:

*Repasses para ações dos municípios de Dionísio, Ipatinga, Rio Doce, São Domingos do Prata e consórcio CONDOESTE.

Fatos relevantes do mês

Em março de 2022, foi realizado repasse ao consórcio Condoeste, no valor de R\$ 671.474,58, referente a execução de obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos;

Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R\$ 328.000,00, referente a aquisição de bens.

Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 130.023,06, referente a execução de obras de sistema de esgotamento sanitário;

Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 29.349,18, referente a execução de obras de sistema de esgotamento para o distrito de Jorge;

Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 33.302,55, referente a execução de obras de sistema de esgotamento para o distrito de Matadouro;

Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R\$ 96.714,72, referente a execução de obras de sistema de esgotamento para o distrito de São José de Entre Montes;

Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$ 340.473,83, referente a execução de obras de sistema de esgotamento sanitário;

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Percentual(%)

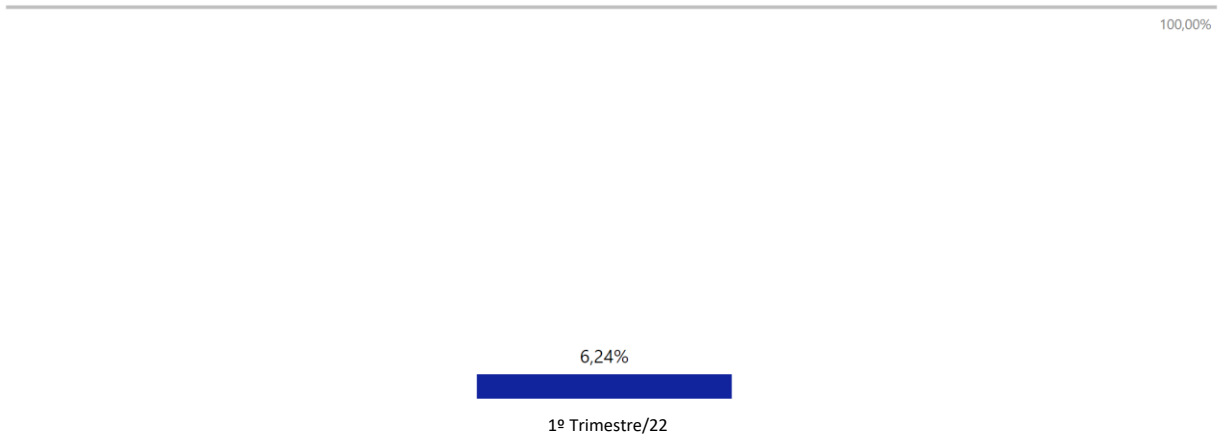


Gráfico 1: I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Percentual(%)

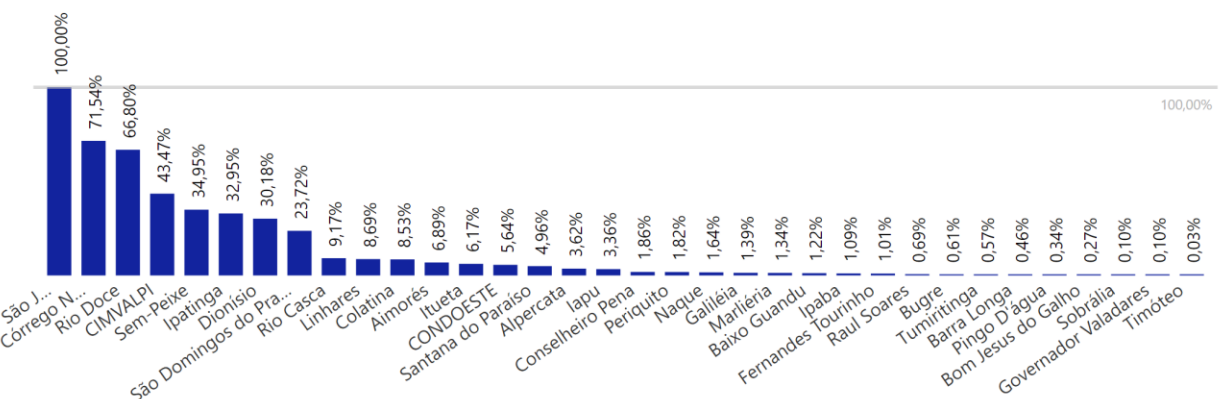


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Nota:

O Valor total dos recursos do Programa é a soma dos 517 milhões do teto e R\$ 168.333.174,70 de correção pelo IPCA (data base dez/2021).

Indicadores de Resultados

I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Percentual(%)




Gráfico 3:I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

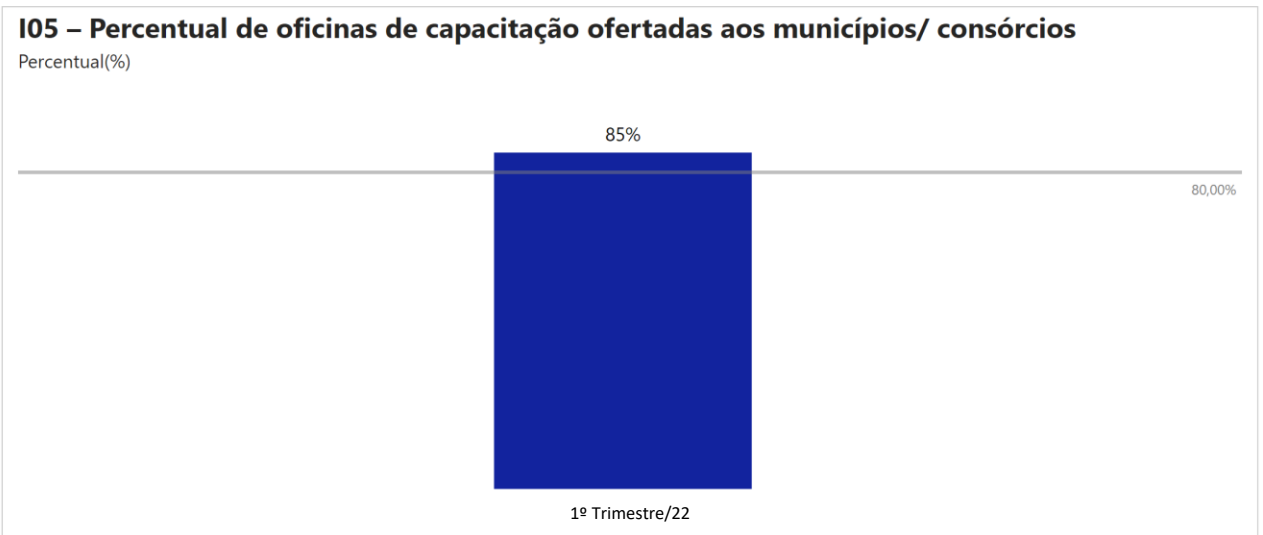


Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

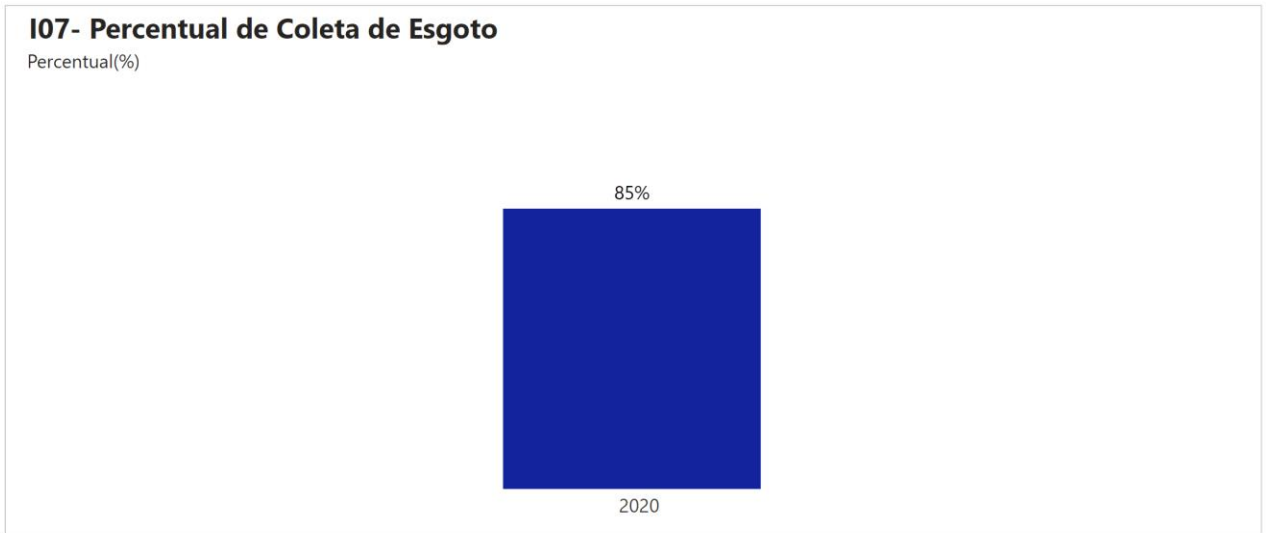


Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

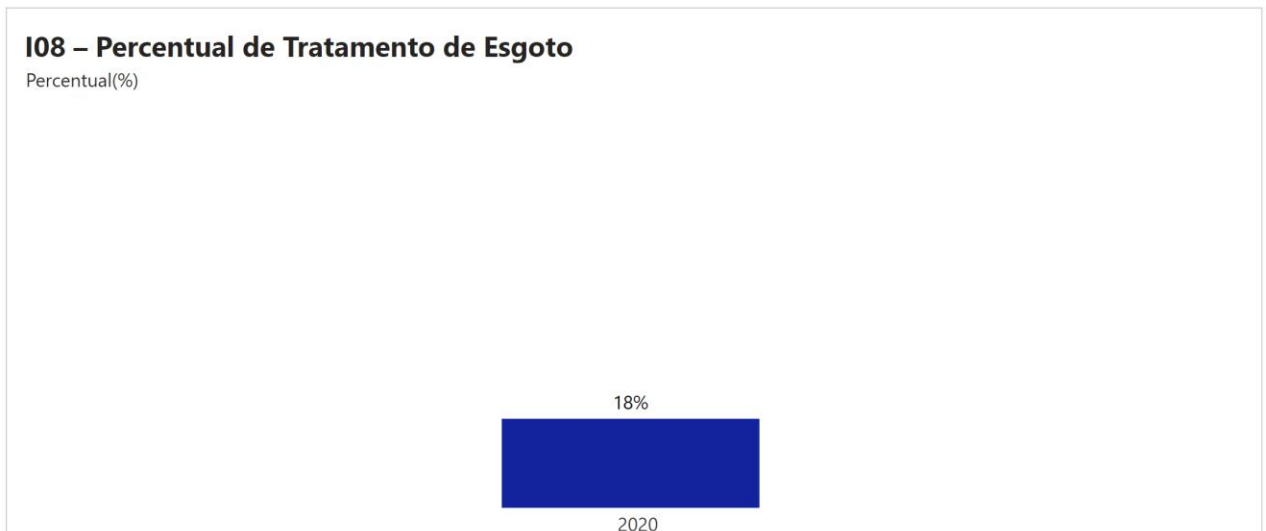


Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS;
- **I07**-No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I08**-No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)



Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS;
- **I09**-No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I10**-No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

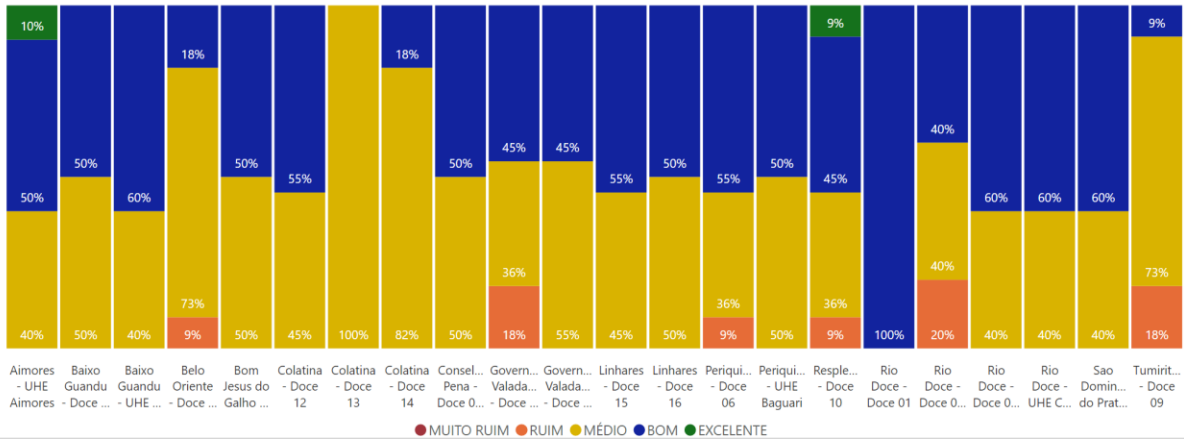


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

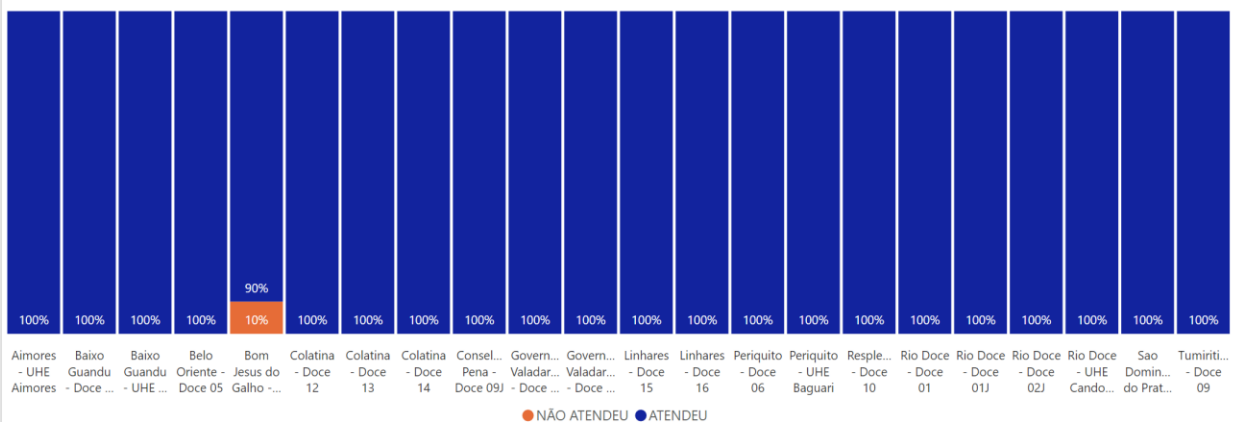


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

Percentual(%)

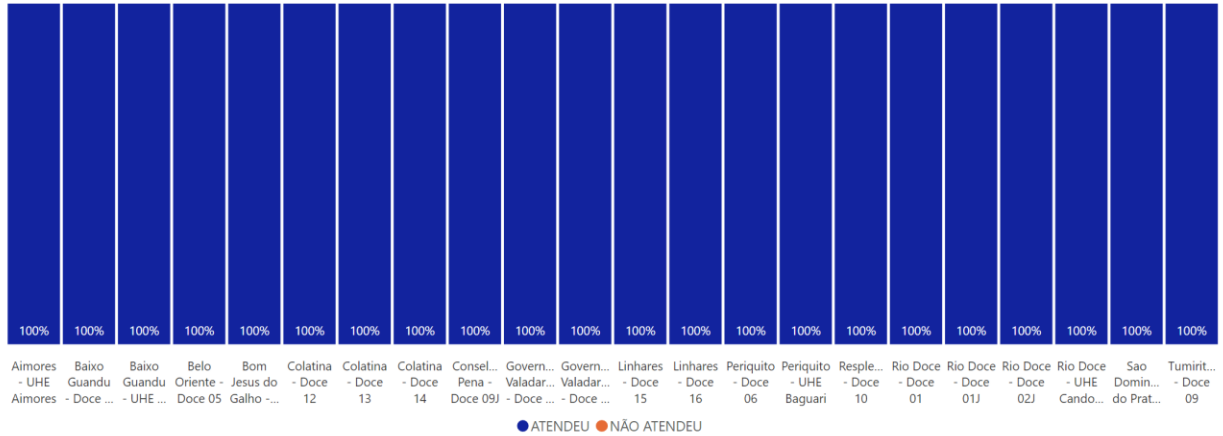


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	123	3	Judicializado
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	325	1	Judicializado
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado

Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

maio de 2022	●	Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama
dezembro de 2022	●	Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede
dezembro de 2022	●	Conclusão das Obras - Captação Alternativa - Tumiritinga Sede

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do Programa

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Fatos relevantes do mês

No dia 08 de março de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Santo Antônio do Rio Doce, município de Aimorés/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

No dia 07 de março de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

Foi concluída a perfuração do poço Marilândia- Boninsegna em 19/03.

Foi concluída a perfuração do poço de Baixo Guandu-Mascarenhas em 16/03.

* As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

* Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Indicadores

I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

Indicadores

I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas

Percentual(%)

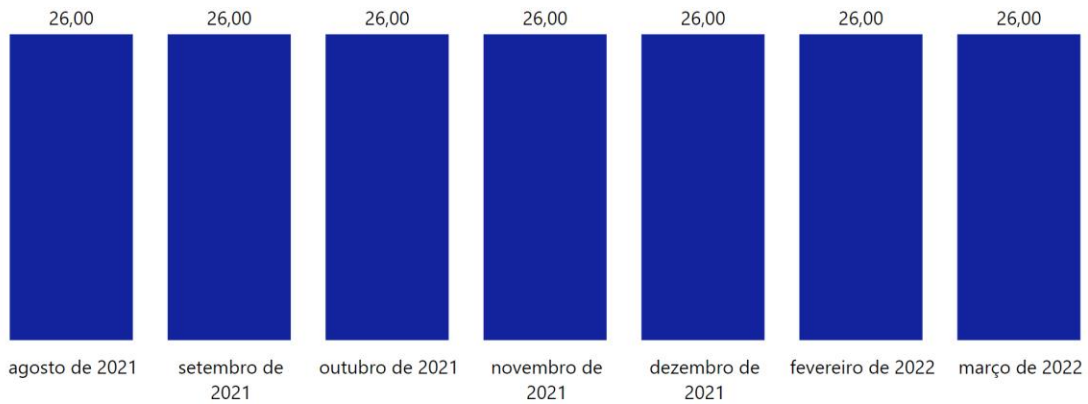


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água

Percentual(%)

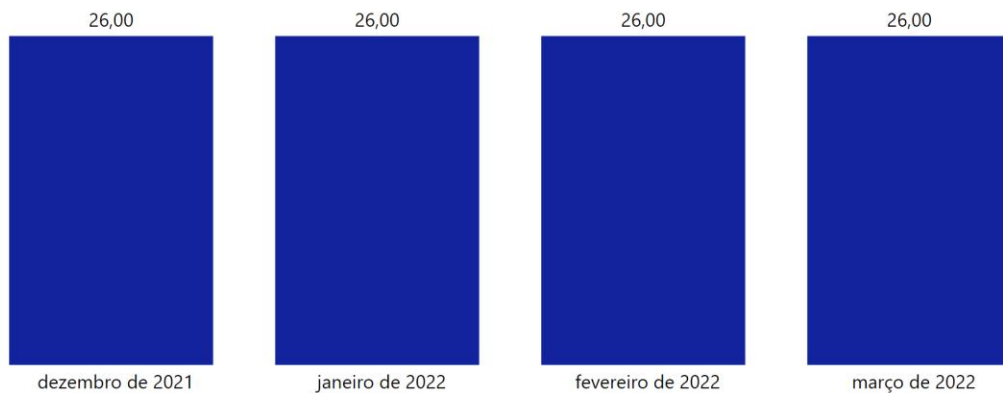


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Percentual(%)

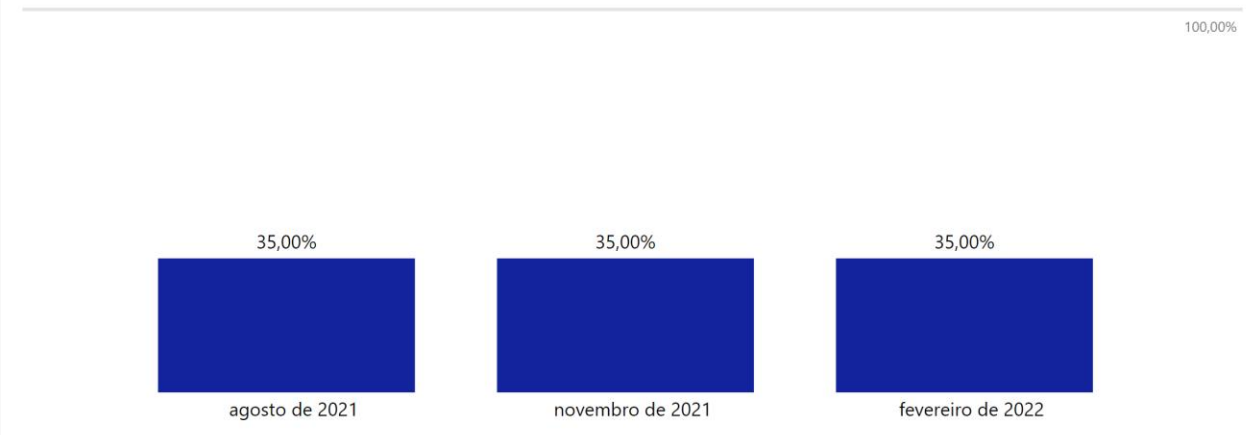


Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Percentual(%)

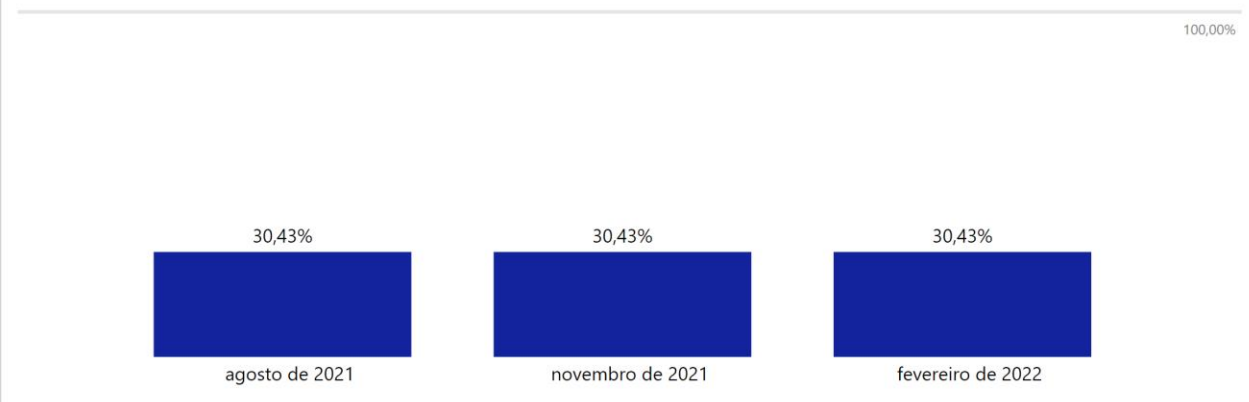


Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	549	2	Planejado

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	●	Conclusão da Formação em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária (Nível Formadores) – MG
maio de 2022	●	Finalização do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
outubro de 2022	●	Finalização da realização do curso de aperfeiçoamento na Turma 1 com parceria da UFMG/UFOP
dezembro de 2022	●	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 2) de Assentados da Reforma Agrária - ES
dezembro de 2022	●	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 3) de Assentados da Reforma Agrária - MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Início da turma do curso técnico em agroecologia do Centro de Formação Maria Olinda - CEFORMA.

Indicadores

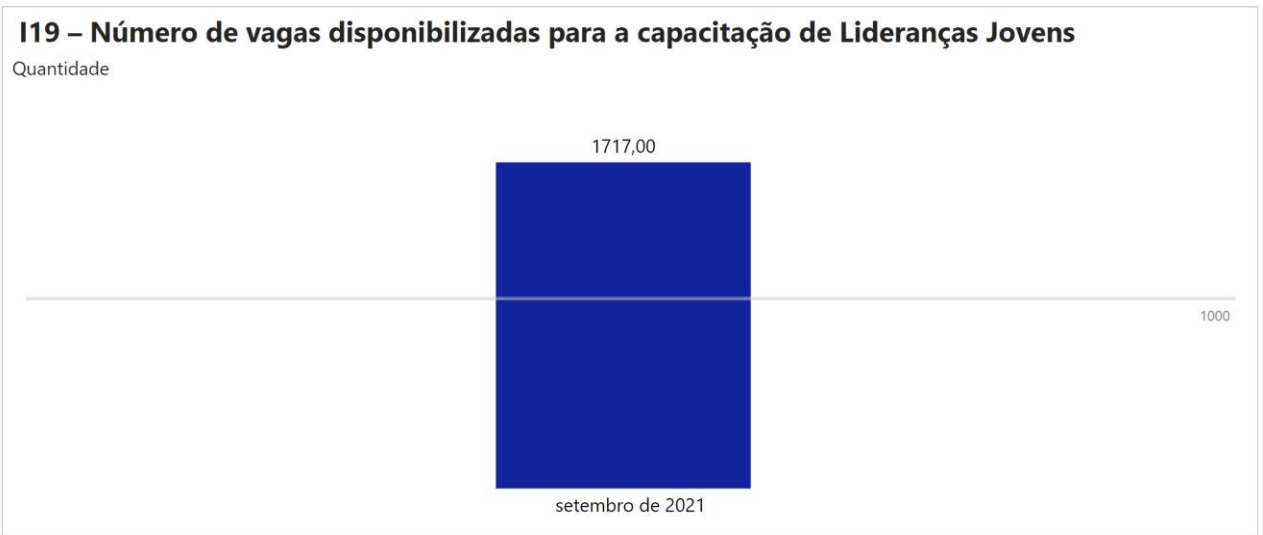


Gráfico 1: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022	● Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração
julho de 2022	● Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
dezembro de 2022	● Conclusão da Adequação das 10 escolas do projeto Escola Segura no âmbito de sinalização e segurança.
dezembro de 2022	● Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos (CGR) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	● Conclusão da Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	● Realização do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Validado pelas Defesas Cíveis a proposta de Plano de Trabalho para 2022, dos projetos Escola Segura, Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC e Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC

Realizado Aula Inaugural dos Cursos de tecnólogos de Gestão Pública e Segurança Pública do projeto Ciclo de Formação Continuada das Defesas Cíveis

Indicadores

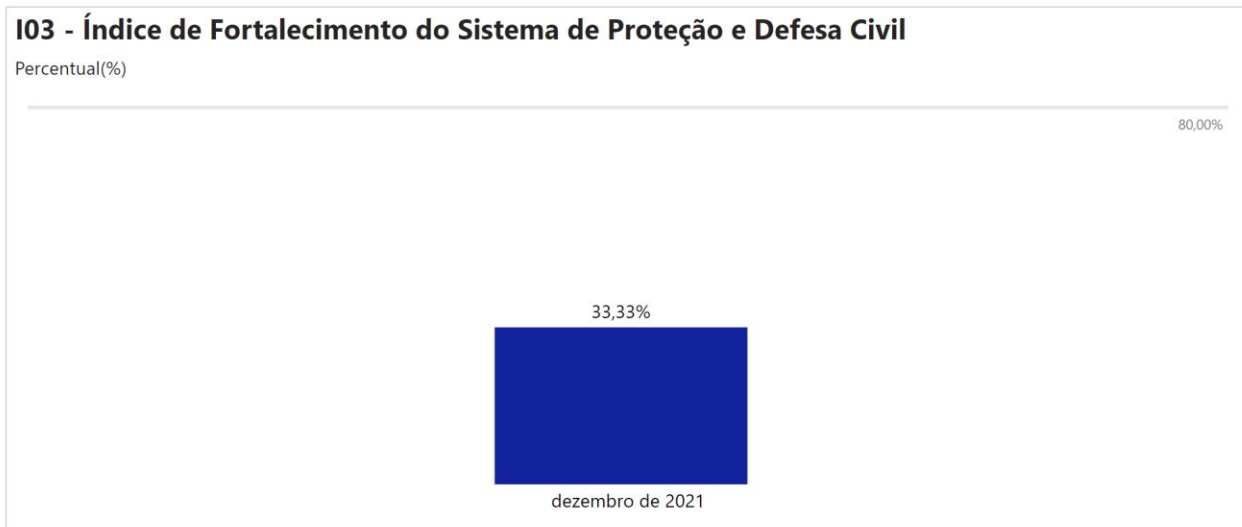


Gráfico 1: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual




Gráfico 2: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/22

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Salvaguardar e dar acesso às informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo:

- (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação; aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços físicos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e
- (ii) processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos, sobre o modo de vida e memória.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Em Andamento
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2021

- abril de 2022 ● Elaboração do e-book com os artigos/trabalhos apresentados nos processos de itinerância e descentralização 2021
- julho de 2022 ● Finalização da Contratações para Execução do Projeto do CIT Governador Valadares
- outubro de 2022 ● Finalização da Contratação de Empresa Especializada em Expografia e Conteúdos Multimídia para o CIT Linhares
- outubro de 2022 ● Início das Obras de Reforma do CIT Linhares

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

INDICADOR	fevereiro de 2022	março de 2022	ACUMULADO
Quantidade de acessos à plataforma interativa	117	335	886
Quantidade de atividades nos territórios	0	0	0

Fatos relevantes do mês

No dia 16 de março de 2022, a equipe técnica do PG35 e a equipe do ICMBio reuniram-se, online, para construir em conjunto as ações do programa a serem realizadas no local este ano.

O Programa 35 realizou, nos dias 17 e 18 de março, treinamento com os atendentes CIAs de Mariana e de Governador Valadares, respectivamente, com o objetivo de apresentar-lhes a Plataforma Interativa do CIT e os Pontos de Acesso, bem como, alinhar orientações e procedimentos gerais, de modo a capacitá-lo a oferecer aos usuários do CIA informações que os instrumentalizem a fazer uso destes recursos.

Reunião realizada em 17 de março de 2022, às 10h, com o PG15 e PG38, para alinhamento sobre a proposta de parceria recebida do grupo "Enredeando Saberes" da Universidade Federal de Viçosa com vistas à construção conjunta de ações integradas de divulgação técnico-científica com o CIT – Centro de Informação Técnica.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades





Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	530	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022  Conclusão da atualização e manutenção dos mecanismos relacionados à acessibilidade do site, seguindo como critério recomendações do guia WCAG 2.0 (Web ContentAccessibilityGuidelines) e/ou padrão E-MAG em 2022
- dezembro de 2022  Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022
- dezembro de 2022  Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022
- dezembro de 2022  Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	fevereiro de 2022	março de 2022	ACUMULADO 2022	ACUMULADO (2016 - 2022)
Acesso ao Site (mês)	175.968	388.233	764.568	7.910.550
Documentos no site (mês)	11	9	35	498
Notícias Publicadas (mês)	11	16	32	919
Vídeos (mês)	9	10	26	608

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site

Unidade




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

I02 – Visualizações de páginas de serviço

Unidade

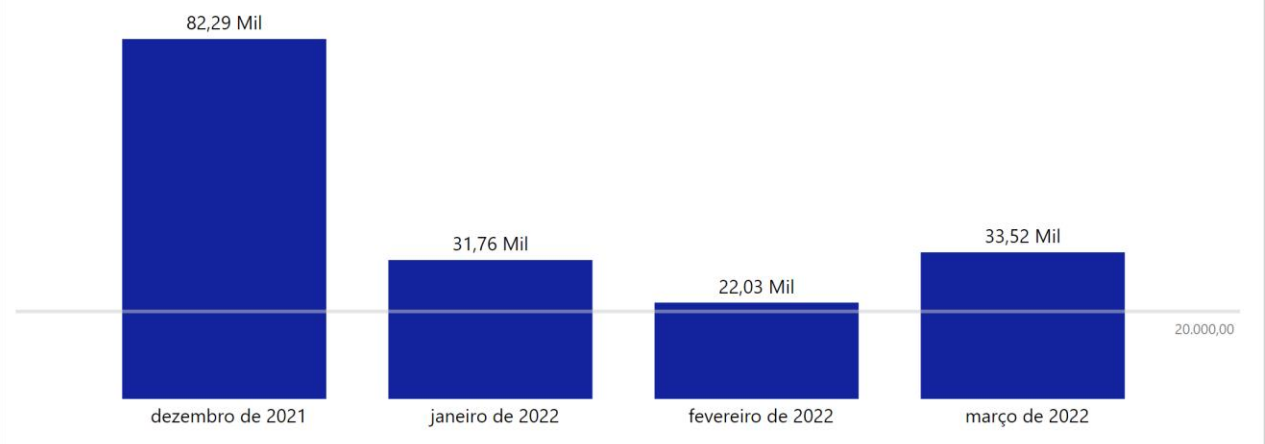


Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal




Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook - Frequência Mensal




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrado
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Em Andamento
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente

Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	572	3	Planejado
Deliberação	572	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

março de 2022		Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
abril de 2022		Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez_21)
abril de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/22
abril de 2022		Protocolo do 5º Boletim PMQACH (Campanha 37, 38, 39 e 40)
abril de 2022		Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce
maio de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/22
junho de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/22
junho de 2022		Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar_22)
junho de 2022		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/22 a Mar/22
julho de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/22
agosto de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/22
setembro de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/22
setembro de 2022		Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun_22)
setembro de 2022		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/22 a Jun/22
outubro de 2022		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2021 à Junho 2022
outubro de 2022		Protocolo do 6º Boletim PMQACH (Campanha 41, 42, 43 e 44)
outubro de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/22
novembro de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/22
dezembro de 2022		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/22 a Set/22
dezembro de 2022		Finalização do Plano de Capacitação Presencial PMQQS

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
- dezembro de 2022 ● Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set_22)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2022 está aprovado um orçamento de **R\$ 36.917.467** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático (PMQQS)

- Anualmente são gerados 1,7 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em www.monitoramentoriadoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 250 pontos, sendo 35 com tratamento e 215 sem tratamento em 29 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Reunião com o GTA-PMQQS realizada em 11/03 para discussões sobre o desenvolvimento do novo protótipo do portal Monitoramento Rio Doc

Protocolo do Relatório Trimestral de consistência dos dados (QA/QC) do PMQQS referente aos meses de outubro a dezembro/21.

Protocolo do Relatório Final "Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte", em atendimento à Deliberação CIF nº 310

Protocolo da Proposta de Escopo do Projeto de Monitoramento de Cheias do Rio Gualaxo do Norte, em atendimento ao Item 4 da Deliberação CIF nº 572

Indicadores

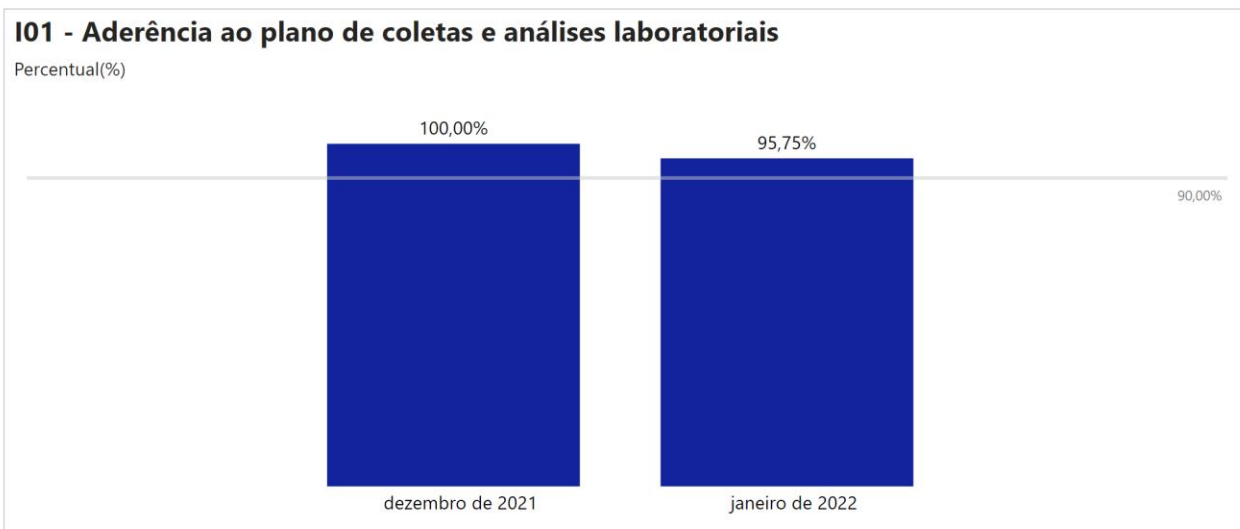


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

* O Indicador I01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação do banco de dados.

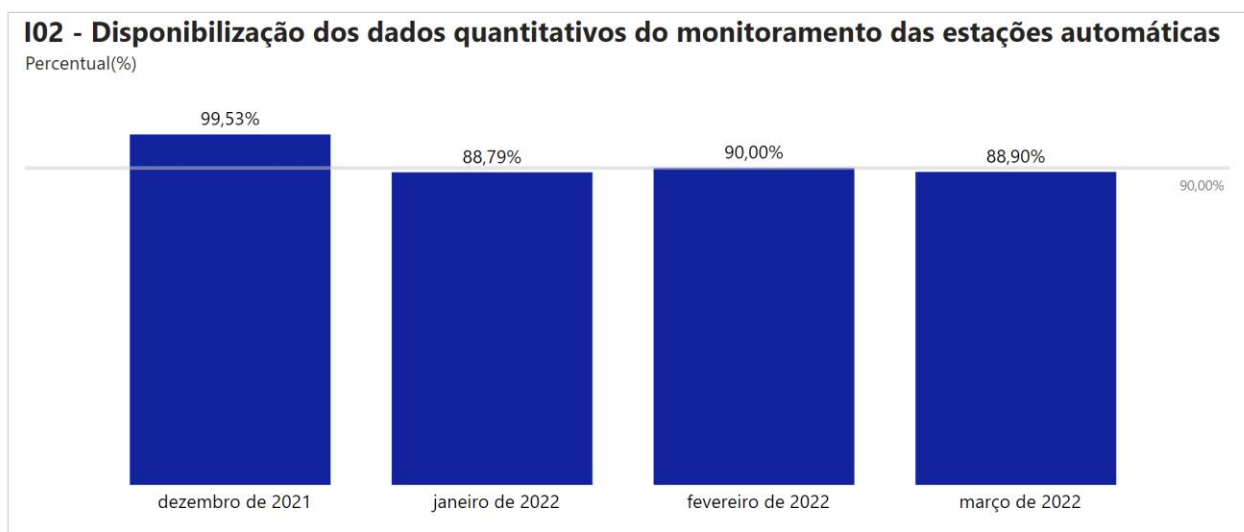


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

* Devido a elevação dos níveis dos rios, diversas estações foram danificadas e sua transmissão de dados foi prejudicada, conforme comunicado por meio dos ofícios FR.2022.0047 e FR.2022.0047-02 a CT-SHQA.

Indicadores

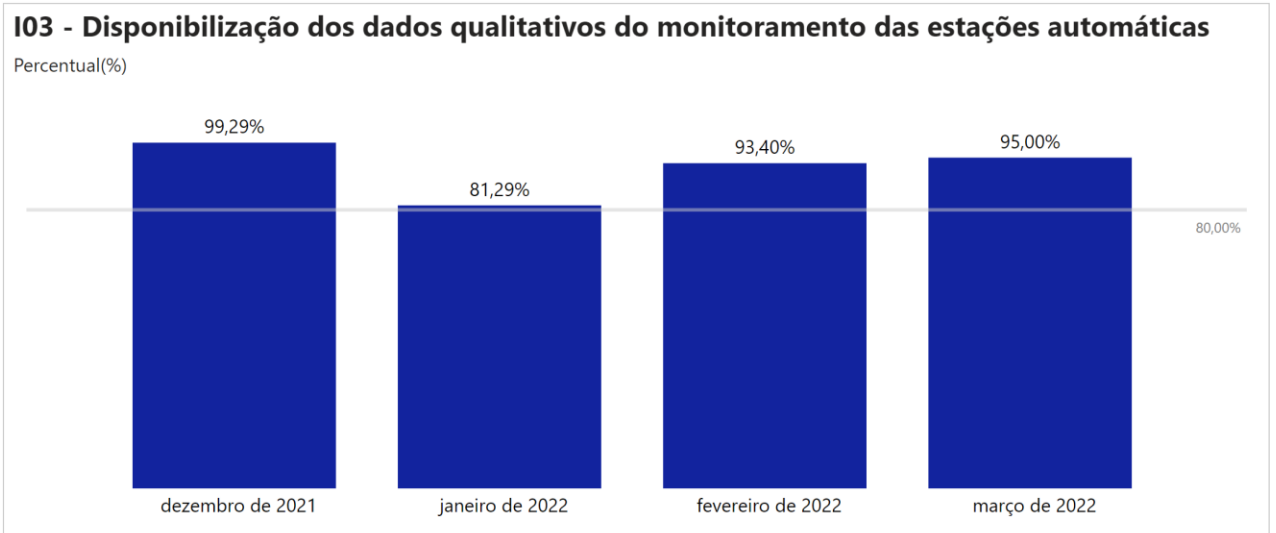


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

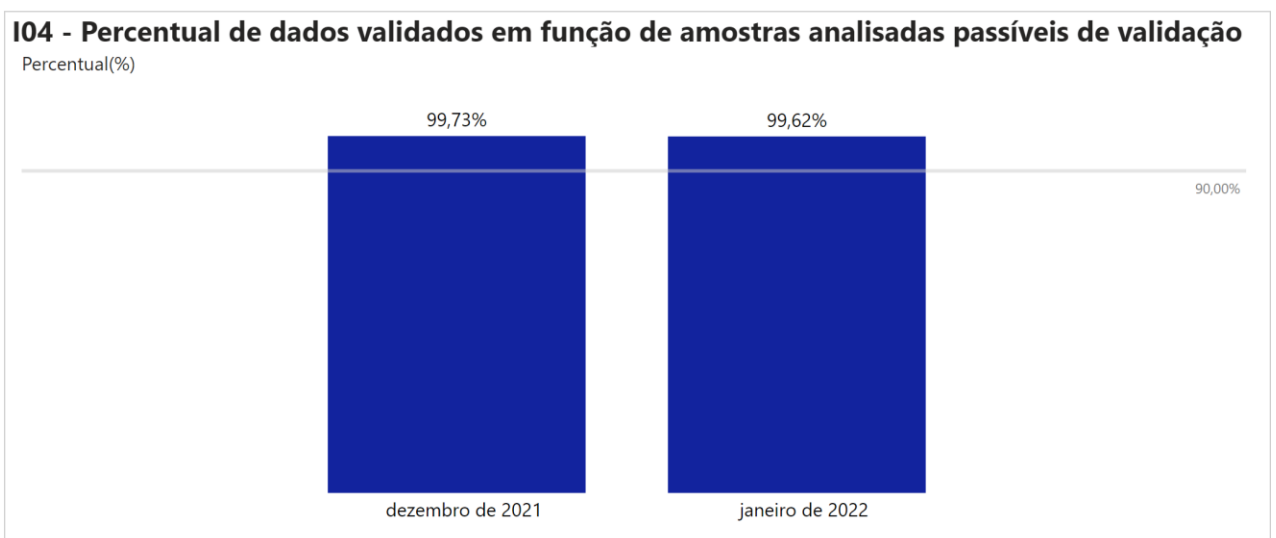


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

* O Indicador I04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação do banco de dados.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água





























Objetivo


- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Reprogramado
Cláusula	182	Caput	Reprogramado
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Em Andamento
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	6	Planejado

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022		Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD
fevereiro de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
março de 2022		Protocolo do Relatório Final AIA PERD
abril de 2022		Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
abril de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
abril de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar AIA REVIS Santa Cruz
maio de 2022		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
maio de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 2
maio de 2022		Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
maio de 2022		Protocolar Plano de ação de reparação Rebio Comboios
maio de 2022		Protocolar Plano de ação de reparação PERD
maio de 2022		Realizar Reunião Devolutiva REVIS Santa Cruz
maio de 2022		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 2
junho de 2022		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
junho de 2022		Protocolar Plano de ação de reparação APA Costas das Algas e REVIS
junho de 2022		Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
junho de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 6
junho de 2022		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
julho de 2022		Finalização da contratação edital da equipe técnica e administrativa do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz
agosto de 2022		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
agosto de 2022		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
setembro de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
setembro de 2022		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
setembro de 2022		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
outubro de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
outubro de 2022		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
novembro de 2022		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
novembro de 2022		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)
- dezembro de 2022 ● Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
- dezembro de 2022 ● Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
- julho de 2022 ● Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS
- julho de 2022 ● Realização da Reunião Devolutiva Grupo 6
- dezembro de 2022 ● Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 29/03/2022, foi aprovado o relatório de Avaliação dos Impactos do Rompimento da Barragem de Fundão nas Unidades de Conservação - Parque Estadual do Rio Doce, conforme deliberação 584.

Entre os dias 14 e 18 de março, foram realizadas reuniões com o Setor Pesqueiro para coletar contribuições que possam subsidiar o manejo das UCs – Etapa de Elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas

Indicadores

I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Percentual(%)

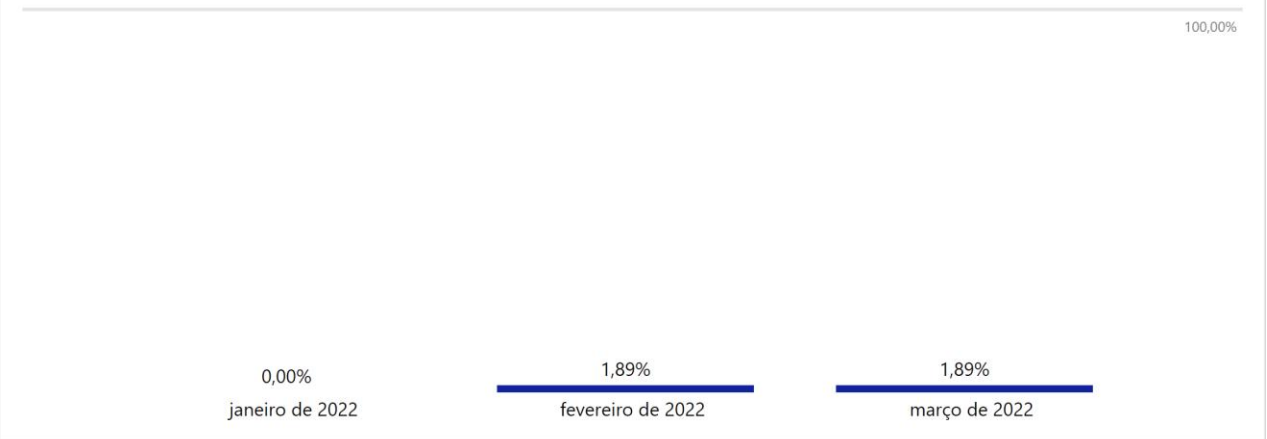


Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal - **Resultado acumulado**

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Percentual(%)

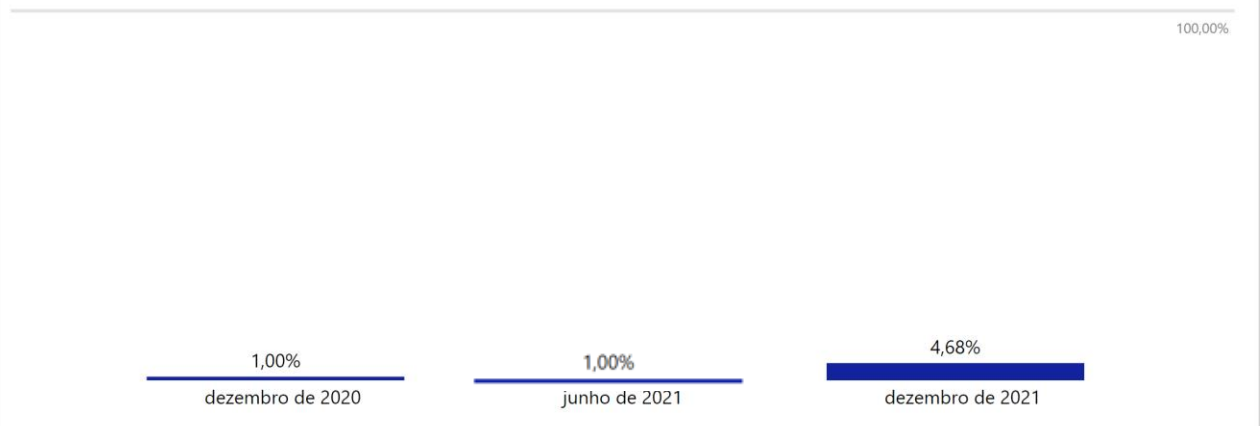


Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)- Frequência Semestral **Resultado acumulado**

Indicadores

I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Percentual(%)

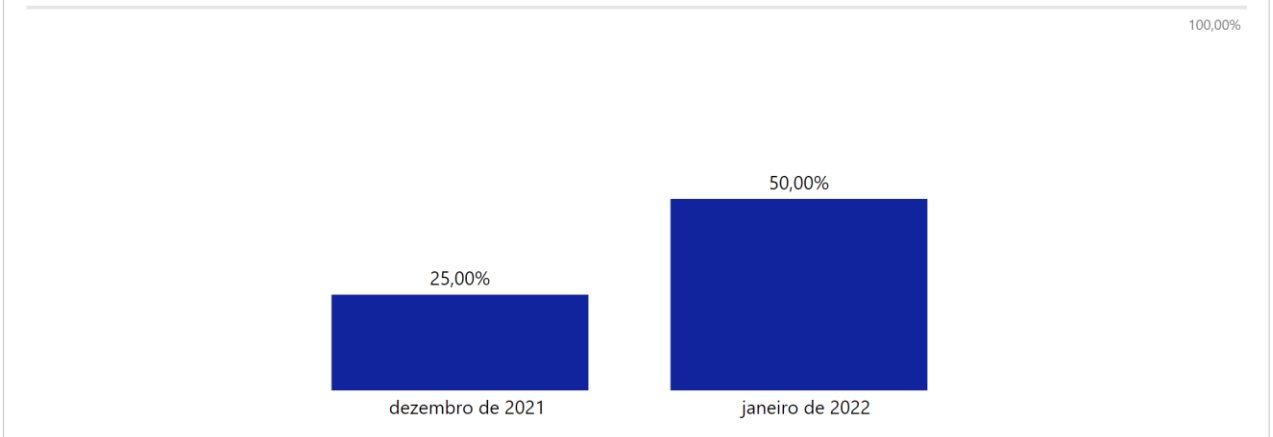


Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Semestral

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Conclusão da elaboração e assinaturas do Programas de Regularização Ambiental (PRA) das propriedades piloto em MG
- setembro de 2022 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

Grandes números do programa

540 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 27 (5,0%) imóveis declinaram e 325 (60,2%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 278 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) no Espírito Santo e participação em evento governamental sobre o tema.

Indicadores

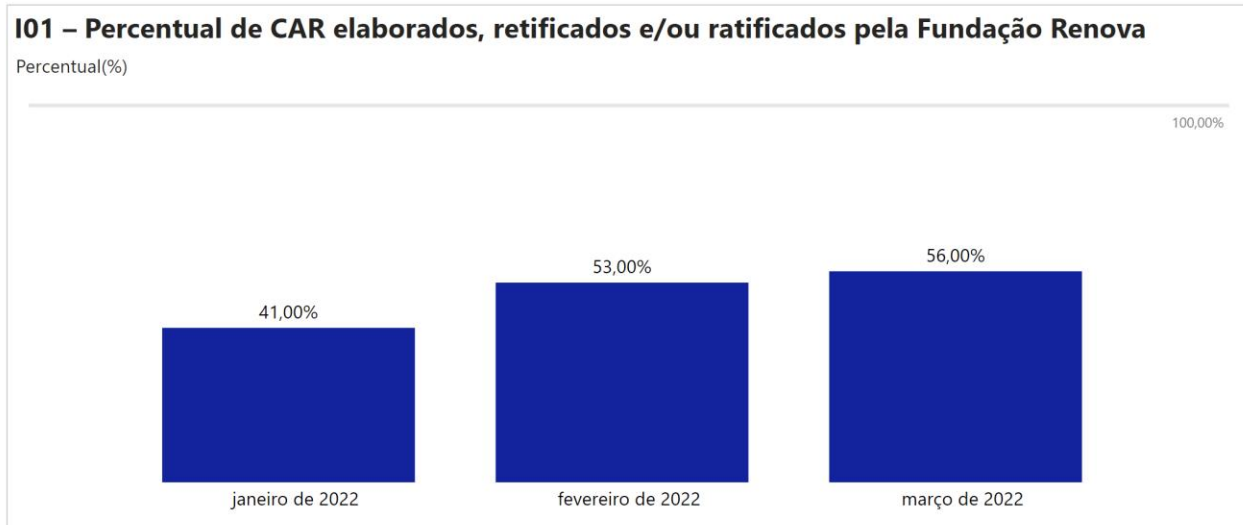


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
102	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
103	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	caput	Em Andamento
Cláusula	142	caput	Em Andamento
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

julho de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Os ressarcimentos de gastos públicos extraordinários aos 19 (dezenove) Órgãos Compromitentes e aos 40 (Quarenta) Municípios foram devidamente concluídos com êxito.

Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R\$ 295,43 Mil, referente a 1 órgão comprometente e 1 município (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

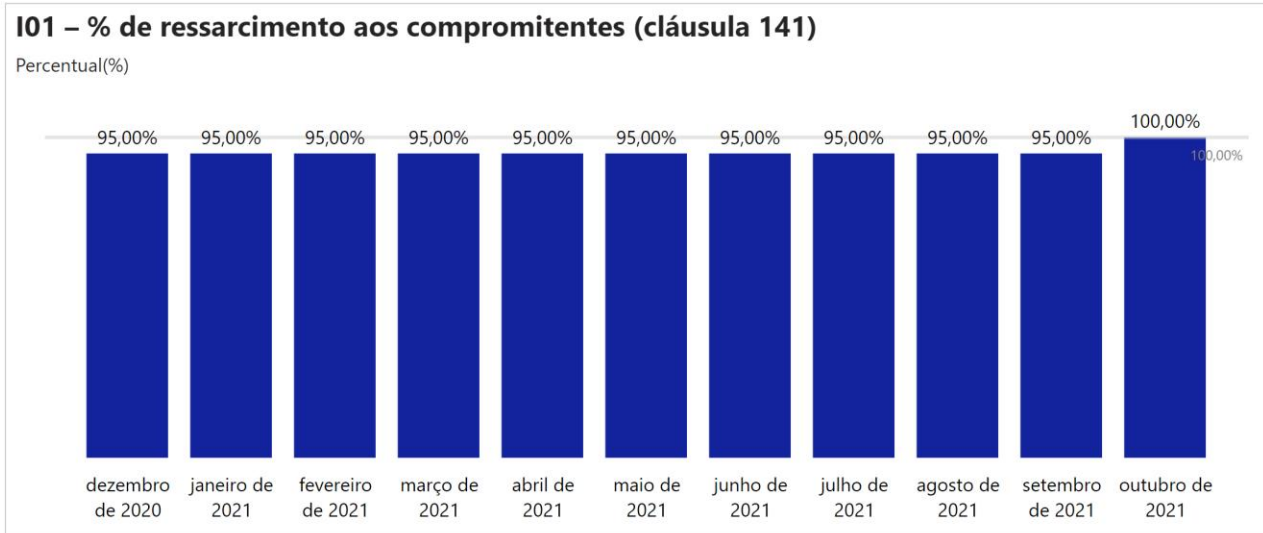


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

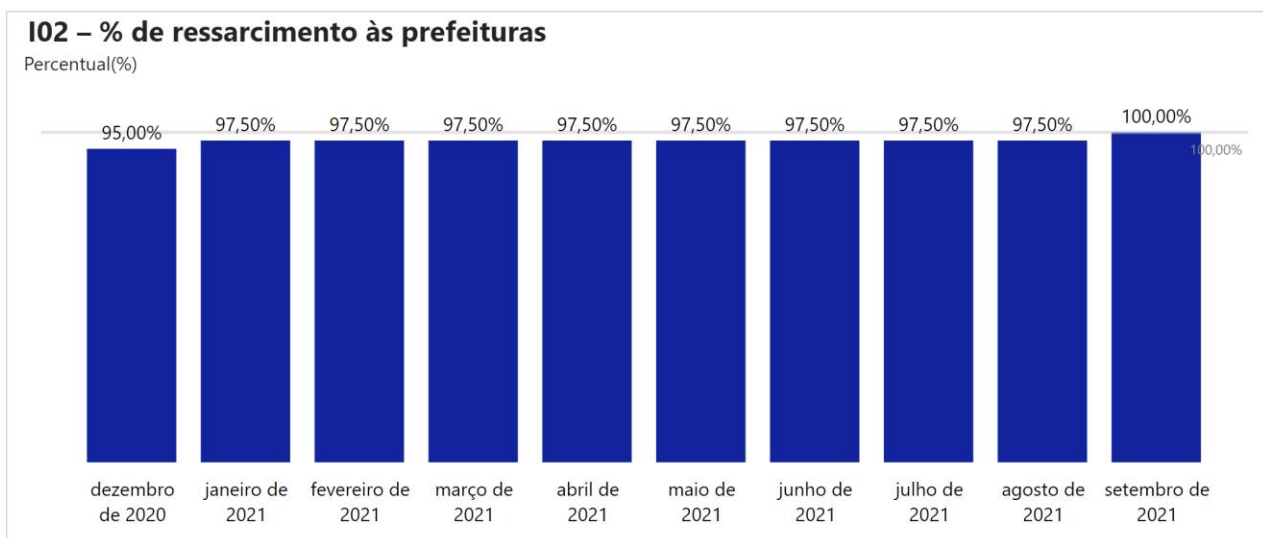


Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

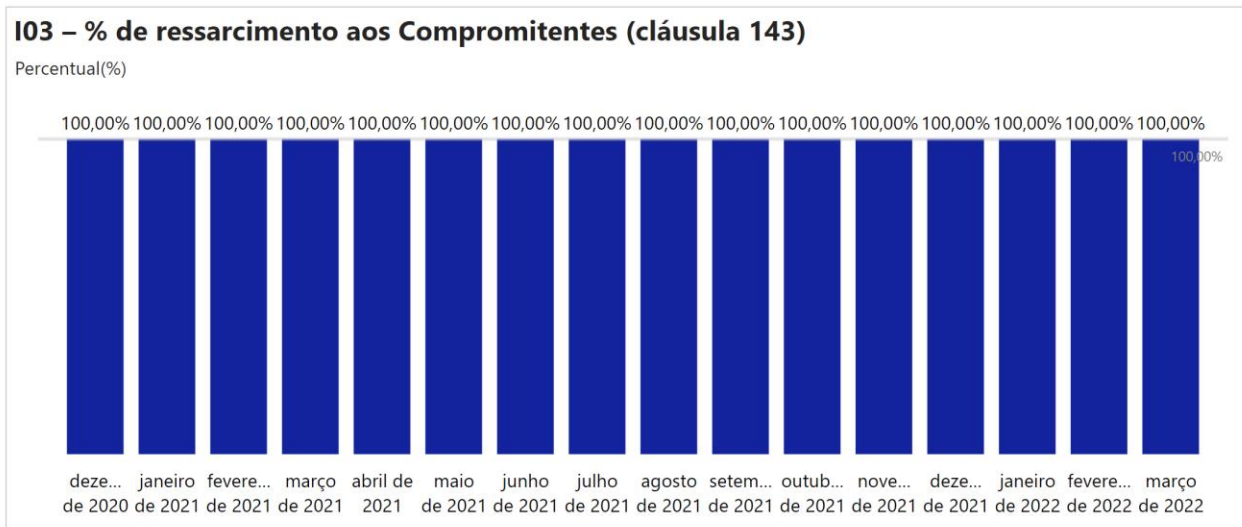


Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

* 100% se refere às solicitações feitas e já auditadas até março de 2022.

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobralia, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12ª Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

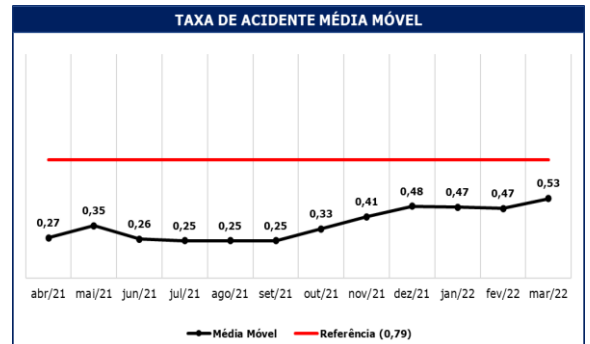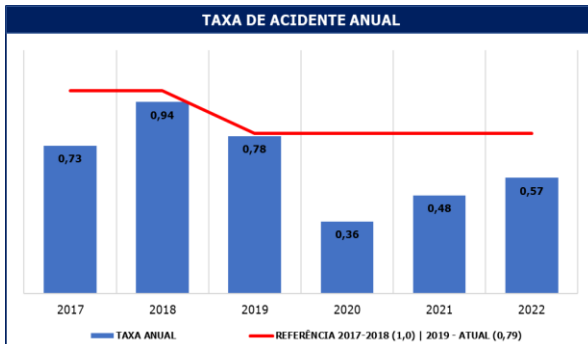

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,4	1,4	15,1	-92%	2,9	1,4	1,6	
PG15	INOVAÇÃO	8,1	0,2	7,9	-98%	3,4	0,2	3,2	
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	21,3	0,7	20,6	-97%	2,6	0,7	1,8	
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,7	0,8	5,9	-88%	2,2	0,8	1,4	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	88,2	10,9	77,2	-88%	27,0	10,9	16,0	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	25,0	1,9	23,1	-92%	8,5	1,9	6,6	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	37,7	0,7	37,0	-98%	1,7	0,7	1,0	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,3	8,3	48,0	-85%	11,5	8,3	3,2	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	75,6	7,9	67,7	-90%	18,4	7,9	10,5	
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22,6	2,5	20,1	-89%	3,1	2,5	0,6	
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	8,6	0,5	8,2	-95%	1,3	0,5	0,8	
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5,1	0,2	5,0	-97%	0,5	0,2	0,3	
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	3,3	0,5	2,8	-85%	0,7	0,5	0,2	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	16,0	7,7	8,4	-52%	8,3	7,7	0,6	
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	5,7	0,2	5,6	-97%	0,6	0,2	0,4	
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIA S	67,6	1,0	66,6	-99%	37,6	1,0	36,6	
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	
Total Compensatórios		464,4	45,1	419,2	-90%	130,0	45,1	84,8	

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	
Total Compensatórios		464,4	45,1	419,2	-90%	130,0	45,1	84,8	
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	-	-	-	
PG01	CADASTRO	23,6	6,7	16,9	-71%	9,0	6,7	2,3	
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	5.151,9	628,8	4.523,1	-88%	2.933,3	628,8	2.304,5	
PG03	POVOS INDÍGENAS	305,0	10,4	294,6	-97%	25,9	10,4	15,5	
PG04	POVOS TRADICIONAIS	39,1	2,8	36,4	-93%	0,3	2,8	2,5	
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	21,8	0,7	21,1	-97%	8,5	0,7	7,8	
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	95,8	14,7	81,1	-85%	25,7	14,7	11,0	
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	10,2	1,8	8,4	-83%	2,3	1,8	0,5	
PG08	REASSENTAMENTO	1.787,9	217,4	1.570,6	-88%	393,8	217,4	176,5	
PG09	UHE CANDONGA	590,0	72,2	517,8	-88%	106,9	72,2	34,6	
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	117,0	12,9	104,1	-89%	25,3	12,9	12,4	
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	7,4	1,4	6,0	-82%	1,5	1,4	0,1	
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	20,4	1,6	18,7	-92%	3,5	1,6	1,9	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	3,6	0,7	2,9	-81%	0,4	0,7	0,3	
PG14	SAÚDE	18,9	0,3	18,6	-98%	3,7	0,3	3,3	
PG16	PESCA	46,7	5,7	41,0	-88%	8,4	5,7	2,8	
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	151,1	14,2	136,9	-91%	39,4	14,2	25,2	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	10,9	1,5	9,4	-86%	2,2	1,5	0,6	
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	251,8	35,1	216,7	-86%	110,2	35,1	75,1	
PG23	MANEJO DE REJEITOS	226,2	30,3	195,9	-87%	51,4	30,3	21,2	
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	21,6	1,0	20,7	-96%	6,1	1,0	5,2	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	32,1	5,8	26,2	-82%	8,3	5,8	2,5	
PG28	BIODIVERSIDADE	101,8	7,3	94,5	-93%	11,1	7,3	3,7	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	49,1	7,7	41,4	-84%	12,4	7,7	4,7	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	140,0	21,7	118,3	-85%	35,2	21,7	13,5	
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	36,9	7,1	29,9	-81%	8,1	7,1	1,0	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,3	1,4	5,9	-81%	1,6	1,4	0,2	
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	300,9	74,2	226,7	-75%	83,0	74,2	8,8	
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-	0%	-	-	-	
PG99	CONTINGÊNCIA	200,7	-	200,7	-100%	50,7	-	50,7	
Total Reparatórios		9.769,9	1.185,3	8.584,6	-88%	3.968,1	1.185,3	2.782,8	
Total Programas		10.234,2	1.230,4	9.003,8	-88%	4.098,1	1.230,4	2.867,7	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	200,3	33,7	166,6	-83%	45,42	33,685	11,7	
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	23,5	0,9	22,6	-96%	6,0	0,9	5,1	
Total Despesas Administrativas		223,8	34,6	189,2	-85%	51,4	34,6	16,8	
Total Geral		10.458,0	1.265,0	9.193,0	-88%	4.149,5	1.265,05	2.884,4	

PG	Programas	Mensal		Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado			
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,9	0,6	0,4	-38%	Postergação: Prestação de contas de terceiros: O edital Doce formalizou 199 parcerias. O desvio negativo de R\$ 1,6MM (sem baixa contábil) do Edital Doce não considera o desembolso de 0,2 MM entregue aos proponentes e está projetado no orçamento. Constatando o desvio do desvio real diminui 12,5%. Ficando em 1,4MM. Plano de Ação: Apoiar os proponentes que já finalizaram as atividades a realizar a prestação de contas e encerramento do projeto com a Fundação. Aprimorar a curva do avança físico e financeiro do projeto.
PG15	INOVAÇÃO	0,2	0,0	0,2	-79%	Postergação: (-R\$ 2,8 MM) Chamada 09/2018: Não houve prestação de contas das 1ªs parcelas dos projetos. Plano de Ação: 1) Solicitar prazo limite à FAREMIG para envio dos pareceres técnicos e científicos sobre as prestações de contas de todos os projetos. Prazo: 13/04/22. 2) Apoiar os prepostos no envio das documentações no sistema FIORI. Prazo: 29/04/22. Desvio será recuperado parcialmente em maio/22 (não será completamente recuperado, visto que a execução do recurso pelos pesquisadores para o 1º ano de projeto não foi realizada integralmente). (-R\$ 0,2 M) Empreende Rio Doce: Atraso no início do projeto. Aguardando deliberação CIF. Plano de Ação: Emissão das OSs para início dos projetos até o limite de execução do orçamento aprovado no Documento de Definição do Programa. Concluído. Desvio será amortizado ao longo do ano. (-R\$ 0,1 M) Serviço Desenvolvimento Escala TRL: Atraso no início do projeto. Plano de Ação: Ajustes em cronograma nas tarefas de responsabilidade do Programa durante o processo de contratação.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	1,2	0,6	0,6	-50%	Postergação: (R\$ 1,1 M) Casa do Empreendedor: Obra paralisada. Plano de Ação: O Programa está aguardando retorno do Suprimentos sobre nova contratação e, em paralelo, analisando nova solução para entrega da Casa do Empreendedor com repasse direto para a Prefeitura de Mariana (MG). (R\$ 0,5 M) Meliponicultura II - Contrato Tetra Mais: Valor da medição muito abaixo do previsto. Mudança no plano de trabalho alterou o cronograma de desembolsos. Plano de Ação: Negociação com o fornecedor para início da compra das colmeias. (R\$ 0,1 M) Projeto Agroecológico MG: Não foi realizada a prestação de contas no período. Plano de ação: Prestação de contas em abril/2022.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,8	0,4	0,4	-51%	Postergação: (R\$ 0,8 M) Qualificação Profissional: Medição apenas do SENAI-ES, sem medição do SENAI-MG. Retomada gradual das atividades presenciais. Plano de Ação: A retomada dos cursos presenciais vem ocorrendo de forma gradativa conforme as negociações com as comunidades/fornecedor e equipe de diálogo. Em abril, já temos 03 turmas confirmadas e em maio a previsão de 04 turmas. (R\$ 0,5 M) Recoloca Rio Doce: Valor da medição pode variar de acordo com a quantidade de atendimentos. Baixa performance do fornecedor. Plano de Ação: Foi estabelecido um plano de trabalho com o fornecedor estipulando uma meta de entregas e resultados até maio/22. (R\$ 0,1 M) Estudo mapeamento mão de obra: Aguardando deliberação do CIF. Plano e Ação: No início do mês de abril enviamos um ofício ao CIF e CT-EI solicitando prioridade na aprovação do projeto e durante a 64ª CT-EI, voltamos a solicitar priorização.
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	9,6	3,4	6,2	-64%	Postergação: - R\$ 10,75MM - Realizado abaixo do planejado devido a atraso no processo de contratação (não se limitando ao suprimentos). Era previsto iniciar as mobilizações em novembro 2021, mas estas só ocorreram no primeiro trimestre de 2022; bem como baixa performance das contratadas devido a curva de maturidade, pois mobilizaram tem pouco tempo. Plano de ação: Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais), bem como, reforçar junto as contratadas o plano de ataque para aumento da produção. - R\$ 2,8MM - Priorização do processo de mobilização e validação de áreas em detrimento a atividade de cercamento. Plano de ação: Contratação dos 5 lotes exclusivo para execução de cercamento. - R\$ 1,5MM - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o CEPAM
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,5	0,9	1,6	-65%	Plano de ação: Revisão do cronograma físico e da curva de desembolso financeiro; visando replanejamento de atividades da Rede de Sementes e Mudanças no intuito da gestão e operação ser realizada pela própria Renova (Gerenciadora). Postergação: - R\$ 4,95MM - Realizado abaixo do planejado devido a atraso no processo de contratação (não se limitando ao suprimentos). Era previsto iniciar as mobilizações em novembro 2021, mas estas só ocorreram no primeiro trimestre de 2022; bem como baixa performance das contratadas devido a curva de maturidade, pois mobilizaram tem pouco tempo. Plano de ação: Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais), bem como, reforçar junto as contratadas o plano de ataque para aumento da produção. - R\$ 0,9MM - Mobilização Mão de Obra para gerenciamento abaixo do previsto, por não termos os contratos de contratação de implantação florestal em seu volume total operacional. - R\$ 0,7MM - Redução no escopo do contrato com Instituto Terra, gerando um estorno do recurso aportado. Plano de ação: Revisão da curva de desembolso financeiro para correção deste estorno gerado na DR. - R\$ 0,16MM - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o CEPAM
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,5	0,4	0,1	-21%	Postergação: Atividades CETRAS/MG suspensas por solicitação do IBAMA/CIF, através do Ofício nº99/2022/SUPES-MG. Atividades CETRAS/ES paralisadas desde set-21, após manifestação do IBAMA de que a área indicada para construção será alterada. Plano de Ação: Após definição das novas áreas de construção a serem indicadas pelo IBAMA, tanto em MG quanto ES, revisão do cronograma e curva de desembolso econômica.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	3,3	2,1	1,2	-36%	Postergação: 2MM - Municípios não apresentaram as medições conforme previsto em orçamento. Há repasses realizados aguardando prestação de contas. Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	6,8	4,0	2,8	-41%	Plano de Ação: Manter rotina de reuniões com os municípios e ampliar a retomada do apoio técnico presencial. Postergação: (7,7MM) Adutora-GV - Atraso na contratação dos Pacotes 02 e 03 da Adutora, impactando no início das atividades e inércia da Contratada do Pacote 03 para início dos serviços. Plano de Ação: Adutora-GV - Mobilização do Pacote 02 já iniciada e Pacote 03 atuando na recuperação.
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,3	2,3	1,0	76%	Postegação: O desvio registrado refere-se ao atraso na formalização da parceria com o IFES, já que o Draft 18 previa uma medição para março/22 no valor de R\$ 470.171,00 e na realidade, considerando a periodicidade, a medição deverá ocorrer em agosto/22, pela alteração do cronograma de desembolso da FGPA e não finalização de PC do CIEDS e CPD, totalizando R\$ 311.592,00. Plano de ação: para o desvio junto ao IFES, realizar gestão junto ao fornecedor para que a medição ocorra no prazo: agosto/2022; para as instituições integrantes do projeto Lideranças Jovens, a equipe técnica irá monitorar a execução da parceria e garantir que as medições ocorram no prazo.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,5	0,4	0,1	-25%	Postergação: (R\$0,58 MM): Transfêrencia de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cheias do PG34 para PG38, após aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 (a previsão era dez/21). (R\$0,25MM): Perícia prevista para os acordos de repasse recursos para a defesa civil ainda não homologada. Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a homologação dos acordos e indicação de perícia. Postergação: (R\$ 0,3MM) - CIT Mariana - Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço e da parceria com Prefeitura Municipal. - CIT GV - Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela Prefeitura Municipal. - CIT Linhares - Atraso das obras devido alterações dos projetos básico/conceitual/executivo. Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades. Economia: (R\$ 0,2 MM): processo concorrential do fee mensal negociado abaixo do orçamento previsto. Plano de ação: considerando que houve impacto no escopo foi realizado um aditivo para garantir o atendimento do processo. As divergências serão ponto de atenção nos próximos processos concorrentiais.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,3	0,1	0,3	-85%	Compensatório (cláusula 182) Postergação: Atraso no recebimento dos termos de referência, impossibilitaram as contratações previstas no período e, consequentemente, geraram a postergação de atividades/medições do RVS. Plano de Ação: Envolver PER para achar solução com relação ao atraso na emissão do termo de referência pela gestão da UC
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,2	0,2	0,1	-29%	Postergação: - R\$ 0,22 MM - Atraso nas atividades devido atraso na celebração de parceria junto ao IDAF/ES; e indisponibilidade do parceiro IEF/MG nas tratativas do plano de trabalho (alteração de equipe e greve). Plano de ação: Replanejamento das ações do plano de trabalho das parcerias com reprogramação de cronograma junto ao IEF/MG; início do processo de contratação das consultorias para execução do ACT do IDAF/ES. - R\$ 0,17MM - Apropriação indevida da execução dos CAR's no contratos de ATER (Teritório 2) em outro diagrama de rede.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,7	0,0	0,6	-94%	Plano de ação: Ajuste dos DIRs apropriados no SAP e posterior remanejamento. - R\$ 0,03MM - Medição dos serviços de gerenciamento abaixo do previsto. Plano de ação: Replanejamento dos desembolsos conforme demandas. Postergação: (R\$36,6MM) repasse primeira parcela Apoio SUS: acordo em negociação com os Estados, para posterior homologação da 12ª vara (R\$5MM) repasse obras emergenciais chuvas: aguardando Estados solicitarem aprovação CIF. (R\$3,2MM) perícia ACDM Agência Integrada: suspensão de out-21 pela 12ª vara (R\$2,4MM) ações socioeconomia Covid-19: em avaliação 12ª vara curva CP ou RE (R\$0,2MM) perícia orçada para repasse Base Integrada, que foi previsto em dez-21. O repasse está em fase final de negociação e posteriormente será homologado. (R\$0,8MM) outras ações em medidas compensatórias que tiveram realizado abaixo do orçamento: obras aterro Mariana, SAA Degredo, Gerenciamento Escritório Fórum Prefeitos.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,3	0,0	0,2	-84%	Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a negociação e homologação dos acordos em andamento e status da perícia. Economia: Antecipação: Postergação: Plano de Ação:
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	4,0	0,6	3,4	-85%	
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	
Total Compensatórios		33,2	16,1	17,1	-52%	

PG	Programas MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG00		-	-	-	0%	NA
PG01	CADASTRO	3,2	2,8	0,4	-12%	Economia: (R\$ 2,3MM) - Postergação - Extensão do prazo para solicitações de Contestação e Reenquadramento no fluxo Novel . Valor será remanejado e utilizado nas demandas da primeira etapa da Judicialização da Retomada do Cadastro e extensão do prazo solicitado pela Cáritas para o Cadastro de Mariana. Mudança de solução - Atendimento as demandas da primeira etapa da Judicialização da Retomada do Cadastro.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	891,2	594,5	296,7	-33%	Postergação: (I) Novel Território (53%); 23% Paralisação de Homologação pela 12ª Vara 5% Achatamento Curva de Ingresso 25% Baixa Qualificação; (II) Novel Mariana (37%); 3% Paralisação de Homologação pela 12ª Vara 8% Achatamento Curva de Ingresso 26% Baixa Qualificação; (III) Diversos (10%); 2% Atraso de Atendimento devido Discussão de estratégia de Atendimento LC21 1% PUD LC (Suspensão da Estratégia) 3% referente a indenização aos parentes de vítimas fatais à época do rompimento. 2% Indenização Mariana PIM: redução de ticket médio, e maior avanço em negativas do que em pagamentos, nos atendimentos mas recentes. 2% outros
PG03	POVOS INDÍGENAS	10,9	3,1	7,8	-72%	Postergação: (R\$ 1,45 MM) Impactos no transporte de água devido as grandes chuvas no mês de março/22 prejudicando os acessos a Terra Indígena e reduzindo temporariamente o fornecimento na localidade. Postergação: (R\$ 1,57 MM) Atividades do ponto crítico 30 paralisadas devido a pandemia e o contrato com a empresa encerrado para evitar novos pleitos.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,1	0,4	0,3	282%	Postergação: (R\$ 9,76 MM), alteração de cronograma do SAA Comboios e Tupiniquim, PBA execução comboios, PBA fundo monetário coletivo comboios, PBA fundo retomada econômica comboios; As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI Plano de Ação: Para as ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI ponto 3), foi feita a contratação emergencial de uma consultoria para a finalização do PBA conceitual (previsto para final de abril). Iniciado também o processo de contratação pretendida de nova consultoria para detalhamento executivo e execução de programas do PBAI. Após esse período os desvios começaram a ser corrigidos. Antecipação: R\$ 2,5 MM Antecipação de parte do valor total, devido a negociação em tomo do petição conjunto do acordo judicial; e Por solicitação dos comunitários, o repasse da gestão do PBAQ precisou ser postergado, gerando uma medição extra com as empresas contratadas. Plano de Ação: Acompanhamento do cronograma de desembolso do repasse da gestão da execução do PBAQ
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	6,0	0,9	5,2	-86%	Postergação: (R\$ 0,3 MM); i. Prestação de contas com valor menor do que o previsto, devido à diferença salarial informada pelo município. ii. Prestação de contas de algumas entidades a ser realizada posteriormente porque foram contratadas para repor projetos de entidade que solicitou distrato. Plano Mariana (R\$ 1,7 MM); Prestação de contas não realizada pelo município, devido a liberação judicial da verba ter ocorrido somente em mar/22 (prestação de contas quadrimestral, portanto prevista para jul/22). Planos Estaduais (R\$5,8 MM); Plano estadual de MG não será executado porque o estado declinou da negociação por entender que está sendo negociado no âmbito da repactuação. Plano de Ação: Plano Mariana: Reprogramar no Draft 19. Plano Demais Municípios: i. Reprogramar no Draft 19. ii. Contratação concorrencial de novas entidades com medição mensal. Planos Estaduais: Reprogramar no Draft 19. (-) R\$ 9,8 MM- Assessoria técnicas: Postergação: Atraso no carregamento de documentos no SAP, em andamento. Contratação das Assessorias técnicas continua judicializada. Plano de Ação: Redimensionar a equipe para ser priorizado o carregamento dos documentos apresentados pelas Assessorias técnicas. (+) R\$ 0,9 MM -Canais: Antecipação: Ampliação da capacidade de atendimento do 0800 em atendimento a demanda. Plano de Ação: antecipação do processo concorrencial para manutenção dos serviços Solicitação de reclassificação dos gastos dos CIAs vinculando os contratos de prestação de serviço nos corretos DRs.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	4,9	4,3	0,7	-13%	(-) R\$ 1,2 MM - Diálogo : Postergação: Execução a menor decorrente da reprogramação necessária do programa destacando a realização dos fóruns de prestação de contas e implantação da plataforma interativa. Plano de Ação: Revisão das entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária e adequação do orçamento previsto no Draft 19. (-) R\$ 0,8 MM -Comunicação: Economia: Em razão da pandemia, os materiais impressos estavam sendo distribuídos apenas em versão digital, Contratos sob demandas não executados. Plano de Ação: Retorno da distribuição do material impresso e de atividades presenciais gradativamente, revisão orçamentária no draft 19/Jornal da comunicada.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,8	0,8	0,1	-11%	Postergação (R\$ 0,5 MM): Custos com manutenções estruturais nas fazenda; e verba sob demanda destinada à aquisição de animais. Sem ocorrência de aquisições no primeiro trimestre de 2022. Plano de Ação: 1. Manutenções estruturais - Em andamento realização de contratação e mobilização de contratos suportes para execução das manutenções; 2. Compra de animais - Aguarda validação da estratégia de compra junto à Diretoria. Economia: Antecipação: - Novas Moradias Familiar (+6,6MM) - Houve aquisições de Imóveis, Pecunias, Reformas e Construções acima do previsto no período; Postergação: - Novas Moradias Bento (-38,0MM) - Chuva muito acima do previsto para este período do ano e redistribuição de IDs entre as contratadas.; - Novas Moradias Paracatu (-27,4MM) - Desvio em função de rescisão Contratual e Contratadas não performando conforme previsto. Aguardando finalização de Contratação do Pacote P4; - Custos Covid (-23,6MM) - Menor custo realizado no período e parte dos custos alocados nas linhas dos serviços; - Infraestrutura Bento (-13,2MM) - Obras de infraestrutura remanescente não iniciada - em fase final de contratação; - Contêineres Bento (-12,6MM) - Chuva muito acima do previsto para este período do ano. - Condicionantes Paracatu (-12,6MM) - Menor valor em Camar / RCC_Ecoponto e Estação Ferroviária MSH - Em fase final de contratação; - Gesteira (-9,5MM) - Valores não realizados, em função de definições judiciais; - Contingência (-9,2MM) - Contingência orçada para o período não utilizada - Diversos (-8,4) - AECOM não realizado e reajuste de contratos lançados nos pacotes dos serviços. Não realizado acesso bento camargos, acesso pedras. - Instalações Provisórias Bento (-4,3MM) - Reclassificação de custo da SERENG para o pacote Engenharia no ano 2021/2022; - Equip Públicos Paracatu (-3,7MM) - Aguardando definição estratégica para novo Pacote de Contratação. P4 em negociação final; - Aterro Sanitário Bento (-3,4MM) - Processo de take off em fase final - Solução definida para as contenções. - Iluminação Pública Bento (-3,4MM) - Mudança estratégica do período de contratação deste pacote. - Outros (-13,7MM) - Beneficiárias Bento (-2,9MM), Paisagismo Paracatu (-2,6MM), Beneficiárias Paracatu (-2,4MM), Equip Públicos Bento (-1,5MM), Iluminação Pública Paracatu (-1,8MM) e outros (-2,5MM). Plano de Ação: - Novas Moradias Contêineres - Traçar plano de recuperação junto às contratadas. - Custo Covid - A curva será ajustada no Draft19, de acordo com os protocolos sanitários; - Infra Bento e Condicionantes Paracatu - Concluir a contratação ainda em Março/22, permitindo a execução das obras. Postergação: (R\$ 34,6MM) Serviços em fase de contratação / mobilização na recuperação da UHE devido a mudanças na metodologia de execução, com condicionantes e custos de apoio. Serviços de reforço do Barramento e infraestrutura das pilhas contratados e em fase de mobilização.
PG08	REASSENTAMENTO	151,9	70,6	81,3	-54%	Plano de Ação: Mobilização de contratadas em andamento. Projeção de aumento da performance de execução a partir do mês de maio. Postergação: (8,6MM) Recons. Estr. Rurais - Baixa performance do fornecedor aliado ao atraso no processo de contratação. Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações sofreram pelo excesso de chuvas e paralisações municipais. Obras das Pontes e Campos de futebol estão prejudicadas pelo atraso no processo de contratação. Plano de Ação: Foram utilizados contratos guarda chuva em andamento, para execução de serviços emergenciais. Novas contratações foram planejadas de forma a mitigar as perdas. Além das ações junto às contratadas visando o ganho de performance.
PG09	UHE CANDONGA	33,7	38,0	4,3	13%	Postergação: Devido à fatores externos, houve a postergação do Curso de Férias de janeiro para julho/ 22. Além disso, a Medição da formatura foi prevista para jan/22 e realizada em dezembro, ainda na vigência do draft 17. Plano de ação: Reprogramação do curso de férias para julho/22 e realização da festa da família no reassentamento de Bento em maio/22
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	8,9	5,0	3,8	-43%	Postegação: Mudança de Solução: 5% do desvio é relativo a reprogramação da execução de atividades de educação patrimonial, casa dos saberes e do plano de reparação, decorrente da pandemia e de mudança de solução, 88% mudança de solução decorrente da não formalização da parceria com o Instituto Pedra e 5% em relação a contratos de obras sob demanda. Plano de Ação: Estabelecer nova parceria com Escola de Ofícios e lançamento do Edital Doce - Modalidade 3, estabelecimento de um contrato de manutenção predial para os imóveis e capelas e estabelecimento de acordo com a Arquidiocese
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,5	0,8	0,3	62%	Antecipação: Execução +. Início das ações de promoção dos polos turísticos; e do projeto de fomento ao empreendedorismo inicialmente previstas para o segundo semestre de 2022. Plano de Ação: Manter a antecipação ações de promoção e fomento ao empreendedorismo. Economia: R\$ 0,2 MM Plano Mariana Contexto: Os valores planejados à empresa tercerizada Contexto não foram realizados
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	0,6	0,7	0,1	17%	Postergação: (R\$ 3,4 MM) Plano Mariana: R\$ 2,9 MM prestação de contas não realizada pelo município, devido a não liberação da verba da conta judicial. Plano Barra Longa: R\$ 0,5 MM prestação de contas da competência março será registrada em abril. Plano de Ação: Reprogramar Draft 19 e realizar gestão junto a Prefeitura de Mariana para alinhamento da pretasção de contas do município.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,1	0,1	0,1	-53%	Postergação: (R\$ 2,8 MM) Parceria Fund. Espírito Santense de Tecnologia. Atraso no processo de medição devido inconsistências na documentação apresentada e impacto da regularização contábil. Plano de Ação: Notificar parceiro para cumprimento do manual de prestação de contas. Com a prestação de contas de março/22, a aderência orçamentária aumentou de 48% para 67%.
PG14	SAÚDE	0,9	0,1	0,8	-92%	
PG16	PESCA	1,4	2,3	0,9	70%	

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
						Postergação: - R\$ 0,18MM - Parceria, com desembolsos trimestrais, sendo que a prestação de contas foi a menor que o previsto. Plano de ação: Já foi realizado Termo aditivo (assinado em fevereiro/2022) com revisão das parcelas. - R\$ 7,68 MM - Atraso nas atividades de reparação dos danos a jusante por baixa performance do fornecedor (elaboração e implantação dos FTIP's e dessedentação animal). Baixa performance das contratadas por conta da Paralisação por decreto da prefeitura de Barra Longa e interdição dos acessos em função das chuvas do início do ano. Plano de ação: Consolidação de PU's junto aos produtores a jusante, e contratação de empresas para execução. Ação forte junto as contratadas que estão com baixa performance visando a elaboração de plano de ação para atuação no período de seca. - R\$ 2,37MM - Atraso na contratação dos serviços de Saneamento Rural; Atraso da celebração de parceria junto ao WR; bem como, atividades sob demanda que até o momento foram executadas abaixo que o previsto. Plano de ação: Expectativa de início das atividades em julho, com reprogramação dos desembolsos (a serem revisados no draft 19). - R\$ 1,67MM - Encerramento de fornecimento de silagem no ARD; e redução no fornecimento de silagem no território 2 (Médio e Baixo Doce). Alguns produtores tiveram o pagamento suspenso por decisão do juízo da 12ª vara, após identificação pelo perito de irregularidades praticadas por produtores. Plano de ação: O orçamento previsto para o ARD será remanejado para os custeio de silagem a jusante (ACP). INFRAESTRUTURA (R\$13,3MM) Economia: Eletrificação Rural - A mudança do fornecedor ENGELIG pela contratação direta com a CEMIG, está gerando uma economia de aprox. 50%. Postergação: Estr. Rurais Complexas - A rescisão unilateral da contratada e o atraso na nova contratação forçaram adiamento do término desse escopo. Plano de Ação: Estruturas Rurais - Novas contratações em andamento foram canceladas. Novo processo de pecúnia foi inicializado.
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	14,4	5,5	8,9	-62%	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,9	0,5	0,4	-46%	Postergação: (R\$ 0,5 M) Assessoria Técnica Foz (Linhares/ES) - Contrato Instituto Euvaldo Lodi: Valor da medição abaixo do previsto (os valores das medições podem variar de acordo com a quantidade de atendimentos no período). Execução menor que a prevista no período devido a dificuldade na mobilização dos negócios onde muitos condicionam qualquer atendimento ao pagamento das indenizações. Plano de Ação: Divulgar os resultados das ações ofertadas aos negócios da primeira fase, atreladas a consultoria do IEL (Insumos e Equipamentos / Design Gráfico) visando a adesão de novos negócios. Ação em andamento e com a adesão de novos negócios. (R\$ 0,1 M) Marketing Territorial/Marketplace: Reprogramação da execução (não houve custos no período/ atraso no processo de compras devido à aprovação de apenas uma proposta técnica). Plano de Ação: Reabertura do processo de compras em busca de novas propostas técnicas/ comerciais.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	36,7	21,1	15,6	-43%	Postegação: Concessões de AFE impactadas pelo andamento ainda tímido dos atendimentos do PIM Convencional, em razão do avanço do novo sistema de indenização SPA. BARRAMENTO: - R\$11,64MM Postergação: Redução das atividades medidas (alçamento); engenharia menor demanda do que planejado. Provavelmente tenha uma economia no final do ano. Plano de ação: Readequação orçamentária no draft 19. Pois depende de ações no âmbito das ações judiciais.
PG23	MANEJO DE REJEITOS	17,7	9,3	8,4	-48%	MANEJO Postergação: - R\$ 6,11MM - Postergado por questões Judiciais: Atraso na deliberação externa do risco a saúde humana. Não aprovação pela CT-GRSA sobre os documentos de metodologias e técnicas aplicados a análise de risco, o que não permite a execução da etapa 1b prevista no orçamento e ainda não iniciou a atualização dos estudos geomorfológicos a jusante de cangoga no balanço de massa em discussão interna ao atendimento ou não da NT 17 e 18 /2021. Plano de ação: Reprogramação a partir das decisões judiciais sobre os temas projetados no orçamento e cronograma. - R\$ 1,07MM - Impacto das atividades nos meses de janeiro e fevereiro por conta das chuvas e paralisação por manifestação da prefeitura de Barra Longa. Plano de ação: Reprogramação do orçamento do ano, pois a previsão era atividades até o meio do ano, agora estaremos redistribuindo ao longo do ano. Iniciar um novo contrato em substituição ao atual, para executar as ações impactadas pelo atual período chuvoso. - R\$ 0,5MM - Impacto medição e registro contábil (atraso na prestação de contas) das parcerias com as universidades. Plano de ação: Gerir junto aos gestores um plano de ação em conjunto com as parceiras. - R\$ 1,8MM - Atividades sob demanda. Até o momento as demandas foram abaixo do previsto. É uma característica dos contratos do manejo que temos que ter previsto caso venham demandas judiciais. Plano de ação: Diligências os Contratos e /ou contratações de forma a trazer mais aderência física e financeira (Readequação orçamentária no DRAFT 19). - R\$ 0,04MM - Atraso na entrega dos relatórios (Impacto na medição / registro dentro do período contábil). Plano de ação: Gerir junto aos gestores um plano de ação em conjunto com as contratadas, bem como, aplicar ferramentas contratuais de notificação.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	1,7	0,2	1,6	-90%	Postergação: (R\$ 20 MM) Obra do Dique 04 postergada para 2023.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	3,1	1,6	1,4	-47%	Postergação -R\$ 0,18MM: Desembolso previsto de Regularização dos Tributários não realizado (Rateio da Gerência de Licenciamento). Serviço relacionado ao PG23 e não será contratado no PG25. Plano de Ação: Redirecionar demanda do PG correto (remanejado) o desembolso no DRAFT 19). - R\$ 1,8MM - Desembolso menor que o previsto: para os serviços de restaruro florestal e manutenção de cercamento devido às chuvas do início do ano, bem como, baixa performance das contratadas; já para os serviços de monitoramento e sistemas de irrigação devido a postergação da contratação. Plano de Ação: Cronograma replanejado, junto as contratadas visando a recuperação do atraso na execução, bem como, aplicação das ferramentas contratuais de notificação para as empresas com baixa performance. - R\$ 0,34MM - Desembolso Convênio recuperação ecológica área ambiental 1 menor que o previsto, devido a atraso no processo de parceria (nova parceria e/ou aditivo). Plano de Ação: Cronograma replanejado visando a recuperação do atraso na Execução. - R\$ 0,18MM - Desembolso previsto para o PSA Áreas Impactadas (Mariana/Barra Longa/Ponte Nova/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce) não realizado. Plano de Ação: Alteração da data anual de pagamento (Cronograma replanejado).
PG28	BIODIVERSIDADE	5,4	4,8	0,7	-12%	Postergação: (R\$3,25 MM): início das atividades da Ambipar (monitoramento anexo I) iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta pelo ICMBio. (R\$0,55 MM): atraso na execução do Plano de Ação Integrado, em fase de discussão e aprovação na CT-Bio. (R\$0,29 MM): contrato SIF UVF com atraso na primeira parcela do desembolso, ocasionado pelo atraso da aprovação da prestação de contas do ACT anterior. (R\$0,21 MM): não houve necessidade da demanda de grupo de especialista planejada. (R\$1,10 MM): readequação de cronograma para o desenvolvimento de software da Biodiversidade. (R\$1,03 MM): postergação na definição de estratégia de atendimento as lacunas deixadas pelo edital FAPEMIG em atendimento a NT007/2017 IEF. (R\$0,40 MM): contratação em definição, para execução do PAN, pendente estratégia de definição do parceiro. R\$3,37MM: Aprovação de prestação de contas de Dez/21 FEST.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	6,3	4,7	1,6	-25%	Plano de Ação: Reforçar junto ao Jurídico o pedido de obtenção de ABIO para realização das coletas; demais desvios estão sendo tratados administrativamente. Postergação: Atraso da execução da campanha em função das fortes chuvas de janeiro em MG; Diagnosticos de Covid na equipe e atraso na aberturas das trilhas, - Atraso nas contratações da Parceria para implementação do Banco de Dados e do Portal - Adianto de entrega prevista pela FBDS devido a priorização de produtos da outra Parceria; (R\$0,34 MM): lançamento contábil para reversão da provisão FBDS realizada em dez/21
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	12,4	8,2	4,2	-34%	Plano de Ação: Conclusão das campanhas que estão em execução e efetivação das medições * Os valores orçados (MOP18/Ago-21) estão acima dos valores contratados para monitoramento Postergação: (9,3MM) Adutora-GV - Atraso na contratação dos Pacotes 02 e 03 da Adutora, impactando no início das atividades e inércia da Contratada do Pacote 03 para início dos serviços. Infra-GV - Atraso na contratação do novo Contrato Guarda-Chuva / MG, no qual estão previstas 2 obras da APRO 153/2021. Engenharia - atividades de sondagem/topografia/batimetria: aguardando decisão judicial Infra RD - Atividades aguardando deliberações externas baixa performance do fornecedor Baixa aderência das empresas no processo de contratação. Plano de Ação: Adutora-GV : Mobilização do Pacote 02 já iniciada e Pacote 03 atuando na recuperação. Infra-GV: Reuniões periódicas com a área de Suprimentos da FR visando agilidade no processo de Contratação. Engenharia: atividade sondagem/toografia/batimetria : N/A Infra RD: Suprimentos realizando uma nova rodada de negociação com os fornecedores, setores atuando constantemente em reuniões para conseguir deliberações externas.
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	NA
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,8	2,4	0,5	-17%	Postergação: R\$0,58 MM: transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Chieis do PG34 para PG38, após aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 (a previsão era dez/21). (R\$1,1): Serviços sob demanda ainda não iniciados aguardando definição estratégica e laudos pendentes de medição do PMOACH.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,5	0,8	0,2	39%	Plano de Ação: Plano de ação juntos aos fornecedores para executar serviços sob demanda e medição de laudos em atraso. Reparatório (cláusula 181) Postergação: Readequação do cronograma de entregas que ocasionou o atraso no pagamento do fornecedor. Plano de Ação: Readequar o cronograma com revisão da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento

PG	Programas	Mensal			%	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação		
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	27,5	27,5	0,1	0%	Postergação: (R\$ 4,6 MM) Replanejado Serviços de TI: (R\$ 3,6MM OFFICE 365 WINDOWS AZURE diferença orçamentaria será compensada com a entrada da segunda parcela no final do ano, R\$ 0,5MM transcrição de áudio, R\$ 0,2MM Concur, R\$ 0,1 MM Success Factors, R\$ 0,2 MM Manutenção e Hospedagem de Sistema); (R\$ 1,2 MM): atraso de medição da auditoria (R\$ 1,3 MM): atraso na entrada do aluguel de veículos, provavelmente teremos esse gasto no PG41 somente em Abril. Processo de mobilização de novo contrato fornecedor Unidas em andamento (R\$ 1,1 MM) Postergação de contratos sob demanda como serviços de contratação de temporários. (R\$ 0,3 MM) Contrato PMO Específico em processo de contratação; (R\$ 0,2 MM) Outras Postergações de Diversas Áreas. Plano de ação: As contratações estão em andamento e serão realizadas ainda no exercício de 2022. Na Draft 19 a área irá realizar uma revisão do fluxo econômico
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-	0%	N/A.
PG99	CONTINGÊNCIA	10,6	-	10,6	-100%	N/A.
Total Reparatórios		1.255,1	810,6	444,5	-35%	
Total Programas		1.288,3	826,7	461,7	-36%	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	16,46	12,28	4,18	-25%	Postergação: Serviços Contratados: (R\$ 8,9 MM) - Consultoria jurídica e pericia (R\$ 2,7 MM), consultoria de Compliance (R\$ 1,2MM), auditorias e controles internos (R\$ 0,6), serviços de Comunicação (R\$ 3,2 MM), contratos sob demanda RH (R\$ 0,5 MM), Atraso na entrada da nota fornecedor Seidor - TI (R\$ 0,4 MM) e outros serviços de diversas áreas (R\$ 0,3 MM). Despesas Diversas (R\$ 0,5 MM) seguros, viagens e infraestrutura de escritórios, Despesa de Pessoal (R\$ 1,7 MM) Vagas em aberto e variação de HE no período para as áreas administrativas. Economia: (R\$ 0,4 MM) Despesas com viagens e (R\$ 0,2) Ativo Fixo.(R\$ 5,1 MM)
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	2,0	0,3	1,7	-86%	Economia: (R\$ 3,7 MM) Câmaras Técnicas; (R\$ 1,0 M) Custeio Atingidos Reuniões; (R\$ 0,3 M) CIF; (R\$ 0,1 M) Auditoria/ Gerenciadora.
Total Despesas Administrativas		18,4	12,6	5,9	-32%	
Total Geral		1.306,8	839,2	467,6	-36%	

*Valores em milhões de reais.
