



FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Maio/2022

## Sumário

<b>Apresentação .....</b>	<b><u>5</u></b>
<b>Sumário Executivo .....</b>	<b><u>6</u></b>
<b>PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados .....</b>	<b><u>12</u></b>
<b>PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados .....</b>	<b><u>20</u></b>
<b>PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas .....</b>	<b><u>27</u></b>
<b>PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais .....</b>	<b><u>36</u></b>
<b>PG005 Programa de Proteção Social .....</b>	<b><u>44</u></b>
<b>PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social .....</b>	<b><u>54</u></b>
<b>PG007 Programa de Assistência aos Animais .....</b>	<b><u>94</u></b>
<b>PG008 Reconstrução de Vilas .....</b>	<b><u>104</u></b>
<b>PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .....</b>	<b><u>121</u></b>
<b>PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga .....</b>	<b><u>144</u></b>
<b>PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>153</u></b>
<b>PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística .....</b>	<b><u>162</u></b>

<b>PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer .....</b>	<b><u>168</u></b>
<b>PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada .....</b>	<b><u>176</u></b>
<b>PG015 Promoção da Inovação .....</b>	<b><u>185</u></b>
<b>PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras .....</b>	<b><u>192</u></b>
<b>PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias .....</b>	<b><u>198</u></b>
<b>PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica .....</b>	<b><u>208</u></b>
<b>PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios .....</b>	<b><u>216</u></b>
<b>PG020 Estímulo à Contratação Local .....</b>	<b><u>223</u></b>
<b>PG021 Auxílio Financeiro Emergencial .....</b>	<b><u>231</u></b>
<b>PG023 Manejo de Rejeitos .....</b>	<b><u>237</u></b>
<b>PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 .....</b>	<b><u>245</u></b>
<b>PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas .....</b>	<b><u>252</u></b>
<b>PG027 Programa de Recuperação de Nascentes .....</b>	<b><u>258</u></b>
<b>PG028 Conservação da Biodiversidade .....</b>	<b><u>265</u></b>
<b>PG029 Recuperação da Fauna Silvestre .....</b>	<b><u>272</u></b>
<b>PG030 Fauna e Flora terrestre .....</b>	<b><u>278</u></b>
<b>PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos .....</b>	<b><u>284</u></b>
<b>PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .....</b>	<b><u>297</u></b>

<b>PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) .....</b>	<b><u>306</u></b>
<b>PG034 Preparação para Emergências Ambientais .....</b>	<b><u>312</u></b>
<b>PG035 Programa de Informação para a População .....</b>	<b><u>319</u></b>
<b>PG036 Comunicação Nacional e Internacional .....</b>	<b><u>326</u></b>
<b>PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce .....</b>	<b><u>334</u></b>
<b>PG039 Unidades de Conservação .....</b>	<b><u>343</u></b>
<b>PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA .....</b>	<b><u>351</u></b>
<b>PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários .....</b>	<b><u>358</u></b>
<b>Glossário .....</b>	<b><u>365</u></b>
<b>Taxa de Acidentes Registrados .....</b>	<b><u>371</u></b>
<b>Gestão Econômica* .....</b>	<b><u>372</u></b>



## **Apresentação**

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

## Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em maio de 2022, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

### Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em maio foi encaminhado ao GTA-PMQQS os ajustes realizados no Projeto de revisão do Portal de Monitoramento (PG038, pág. 334).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos, em maio ocorreu a entrega do relatório final dos dois anos de estudo da Região Deltaica e instalação das duas novas estações de monitoramento da qualidade do ar em Acaica e Dom Silvério. (PG023, pág. 237). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 121) a qual, até o mês de maio, bombeou cerca de 959 mil m<sup>3</sup> de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 94), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 405 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.761 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito, além da realização de oficina de Fertilidade do Solo e Nutrição das Plantas em Colatina-ES, curso de Melhoramento Genético em Tumiritinga, o primeiro curso presencial para os produtores rurais pós pandemia e ministrado Curso sobre Recuperação de Pastagem para produtores de Conselheiro Pena – MG pela EMATER. (PG017, pág. 198).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 252) e de Nascentes (pág. 258).

## **Eixo Pessoas e Comunidades**

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 35.317 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.579 pessoas, desde o início do programa até maio/2022.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de maio, em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 760 indenizações, o que representa 98% do total das 771 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 231), atualmente existem 5.663 pessoas assistidas, com um total de 2.644 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 27) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 36). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, além disso, receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, houve a realização de pesquisa etnográfica na comunidade, atividade vinculada ao PG01 – Documentação de referências culturais PBAQ, oficina Cultural e Entrega de Certificados das oficinas de Jongo - Atividade vinculada ao PG02 - Incentivo as práticas culturais do Degredo PBAQ e ensaios das quadrilhas infantil e adultos - Atividade vinculada ao PG02 - Incentivo as práticas culturais do Degredo PBAQ.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 44) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 176) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a conclusão das atividades de responsabilidade da Fundação Renova do plano do município de Bom Jesus do Galho e obtenção do "de acordo" do município de Aimorés para seguir com a pactuação do plano de reparação em proteção social.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 54; PG035, pág. 319 e PG036, pág. 326), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

## **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 284), em maio de 2022 foram repassados R\$ 849.633,52 para ações dos municípios de Resplendor, Barra Longa, Ipaba, Rio Casca, Bugre, Dionísio, Condoeste e Periquito, Ipatinga.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 144), em maio ocorreu o início da supressão vegetal de Bens Públicos Ponte do Gama, início das atividades em campo - Talude das Complexas.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 104) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de maio:

***Bento Rodrigues*** — em maio, não houve fatos relevantes a serem reportados.

***Paracatu de Baixo*** — em maio, não houve fatos relevantes a serem reportados.

***Gesteira*** — em maio, não houve fatos relevantes a serem reportados.

***Reassentamento Familiar e Reconstruções*** — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem).

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

## **PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializado
Cláusula	20	Caput	Judicializado
Cláusula	22	Caput	Em Andamento
Cláusula	25	Caput	Em Andamento
Cláusula	26	Caput	Em Andamento
Cláusula	28	Caput	Em Andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	127	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Concluído Internamente
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	2	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

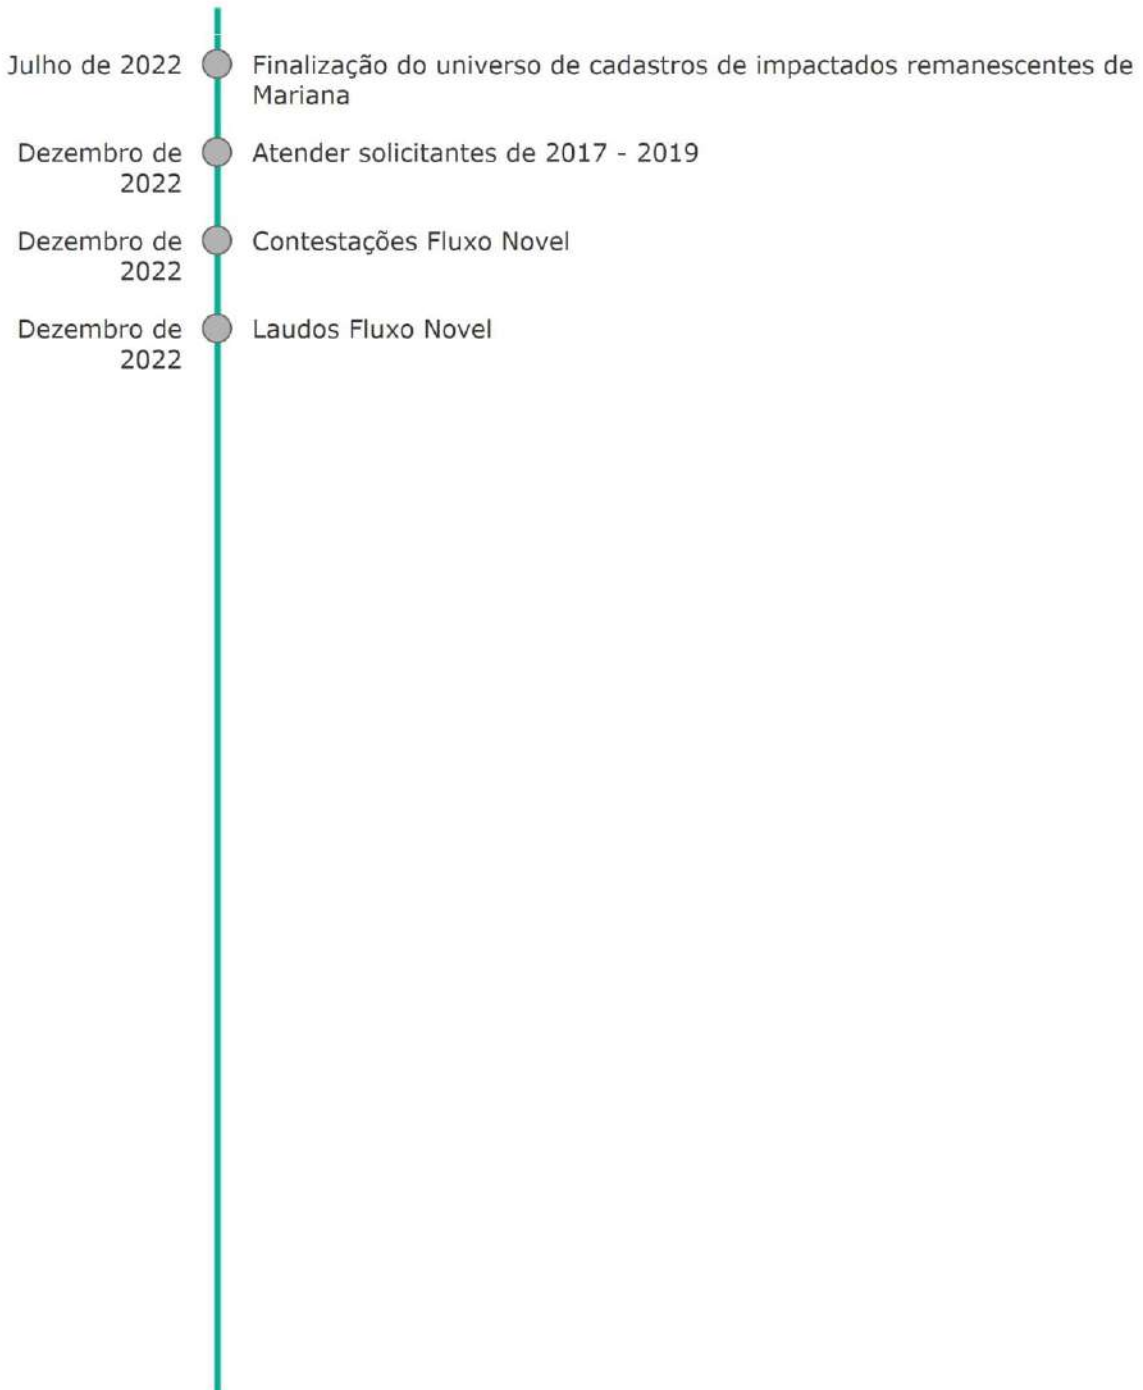

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

- 176.931 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.579 pessoas, desde o início do programa até o momento.

## Fatos relevantes do mês

Finalização da aplicação do cadastro de Mariana - Lista de 2020:

- . 100% das pesquisas aplicadas.
- . 158 pesquisas completas aplicadas.
- . 19 tratativas.

## Indicadores

### I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Percentual(%)

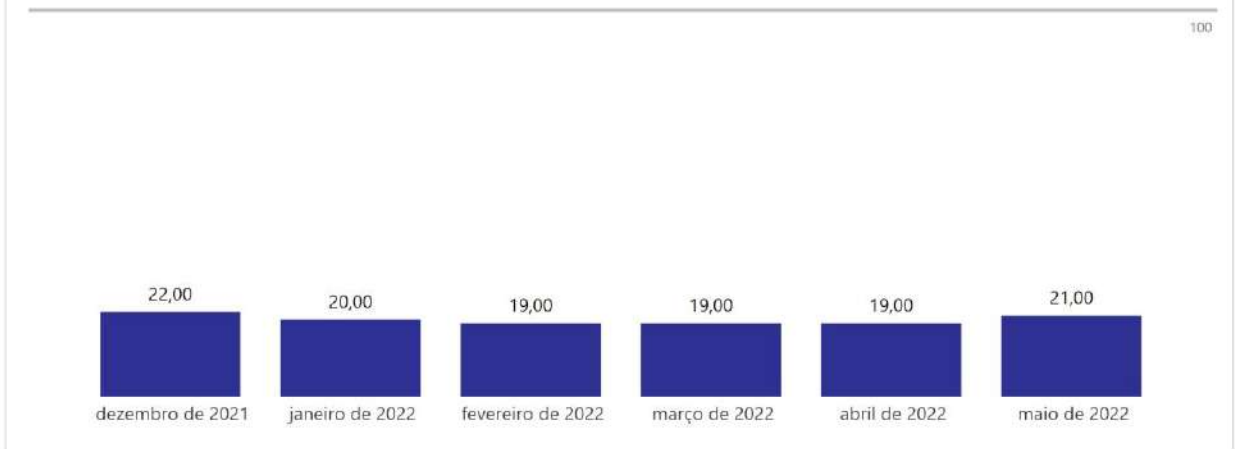


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

### I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Percentual(%)

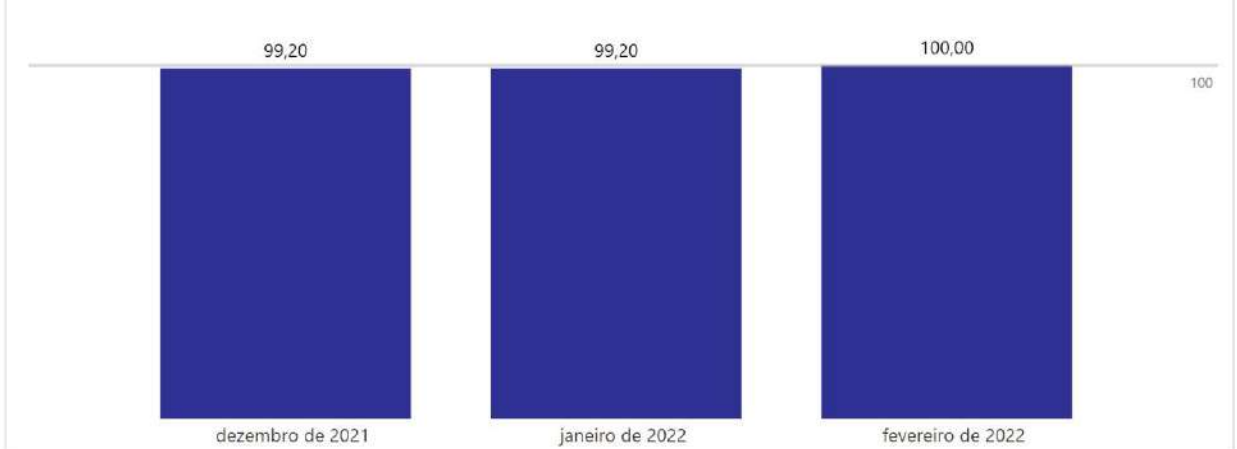


Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

O Programa de Cadastro realizou uma força tarefa para conclusão do atendimento aos solicitantes de cadastro do período emergencial. Tal atividade foi concluída operacionalmente em fevereiro, sendo realizado o cadastramento de 84 pessoas contempladas, e 152 pessoas contempladas com tratativas e justificativas do motivo da não realização do cadastro. Por um atraso na atualização do banco de dados esses atendimentos não foram registrados no relatório de fevereiro e março de 2022.

## Indicadores

### I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

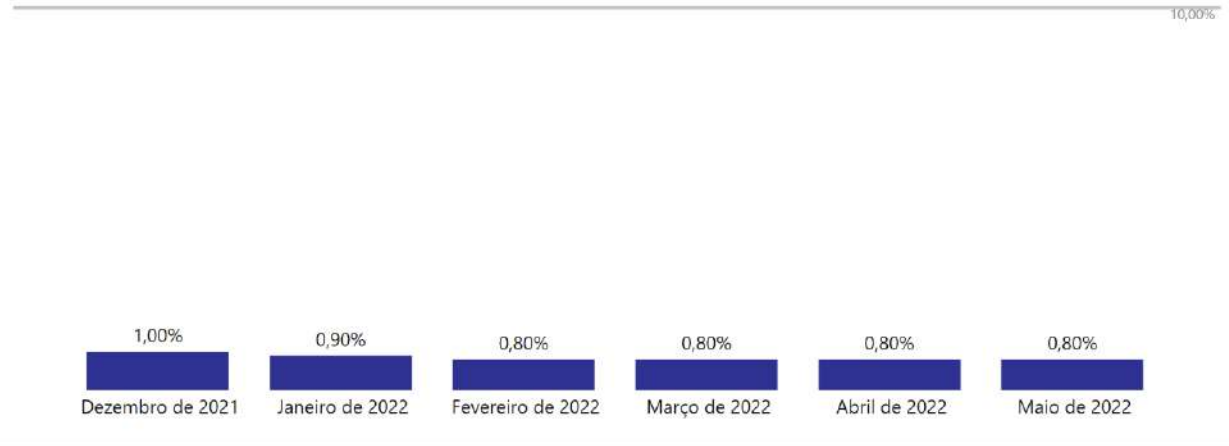


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

## Indicadores de Acompanhamento

### Cadastro Mariana - Fase 1

Número de entrevistas

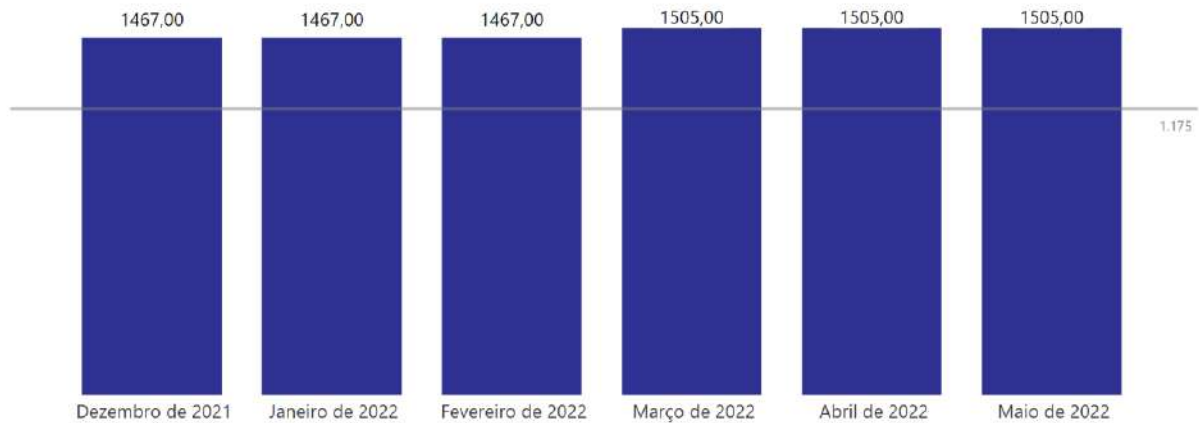


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

### Cadastro Mariana - Fase 2

Número de vistorias

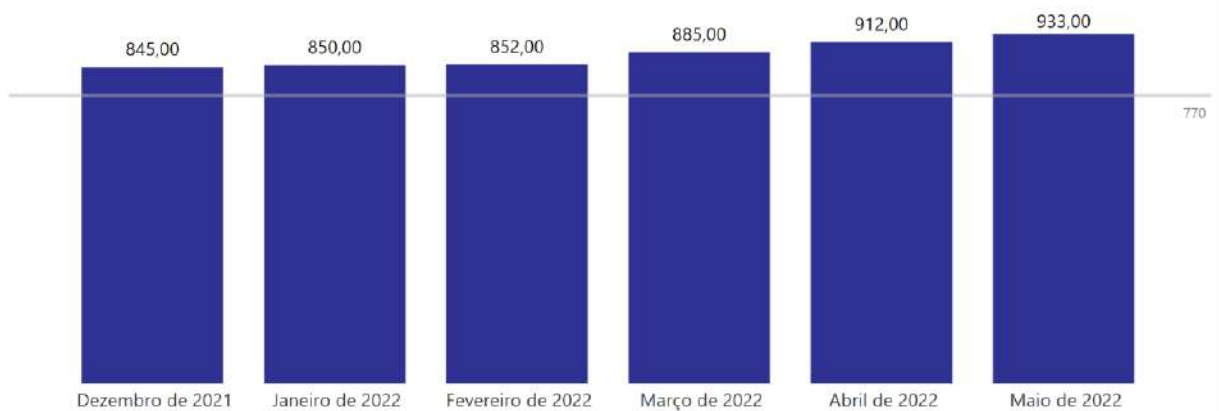


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

## **PG002    Ressarcimento    e    Indenização    dos Impactados**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializado
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializado
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-b	Concluído Internamente
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

## **Entregas do ano de 2022**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

## Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 264.996 propostas já foram pagas ( 98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 304,05 Mi** .
- **Para Danos Gerais**, 10.686 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.640 já foram pagos ( 99,6% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.740,85 Mi** .
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 760 indenizações, o que representa 99% do total das 771 propostas aceitas.

## **Fatos relevantes do mês**

Até 31/05/2022, 61.200 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até 31/05/2022, foi realizado o pagamento de 760 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,6% do total das 771 propostas aceitas. Foram 13 indenizações pagas no mês.

## Indicadores

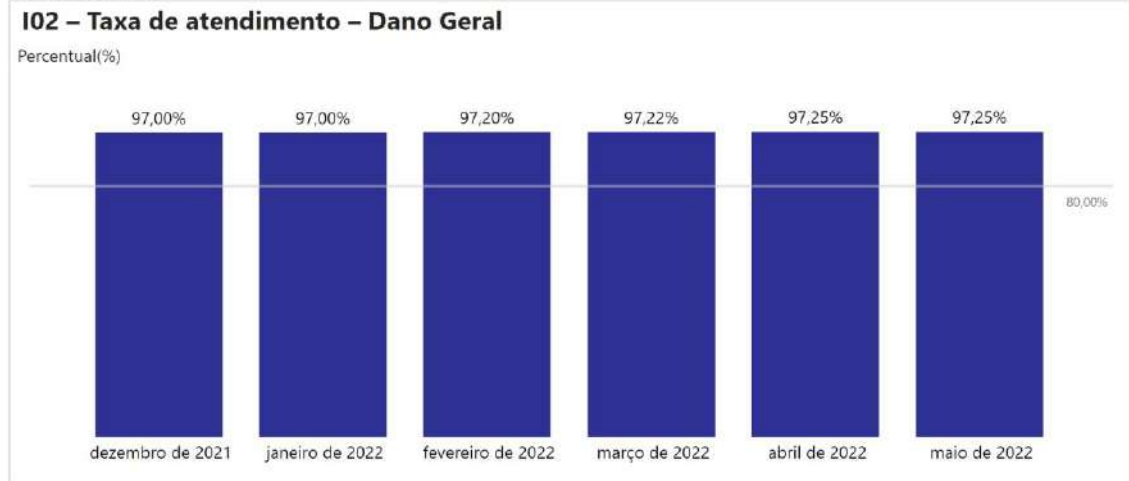


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

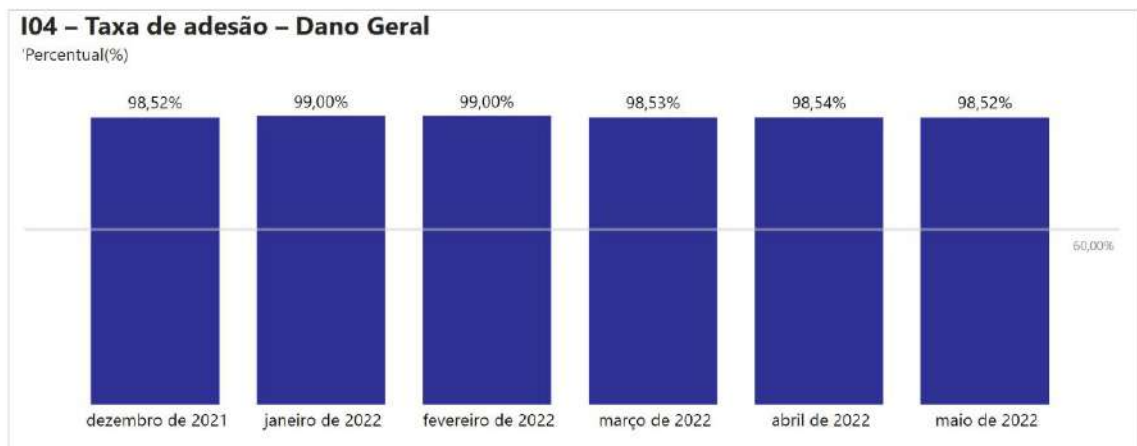


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

## Indicadores

### I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

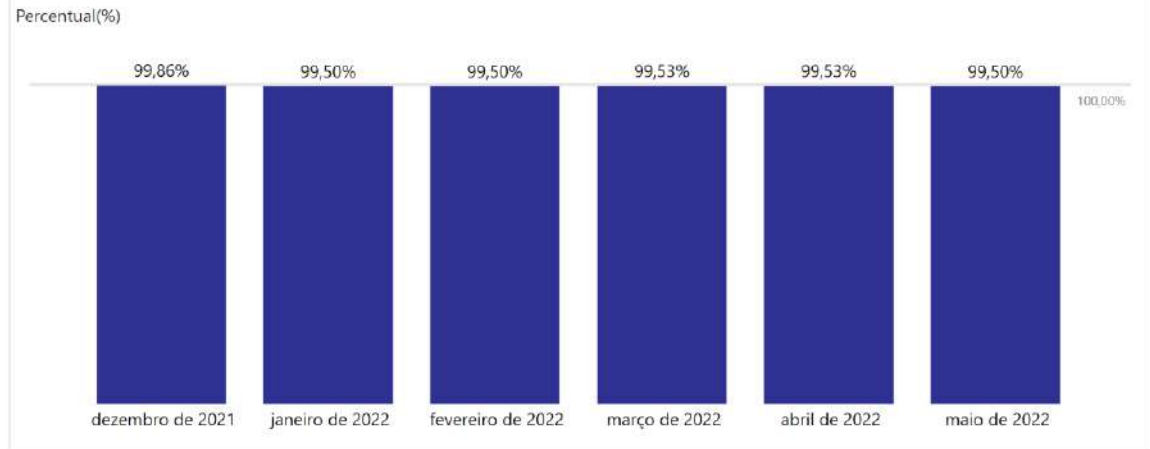


Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

## **PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**




Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	43	§1º	Em Andamento
Cláusula	43	Inc I	Em Andamento
Cláusula	43	Inc II	Em Andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluído Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Planejado
Cláusula	43	Inc V	Planejado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em Andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluído Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em Andamento
Cláusula	44	Inc V	Planejado
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- outubro de 2022  Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- outubro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- outubro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa

- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.392 m<sup>3</sup>);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.652 m<sup>3</sup>).

## **Fatos relevantes do mês**

### **Tupiniquim-Guarani**

Foi iniciado o processo de revisão participativa do PBAI entre consultoria independente e Comissão de Caciques Tupiniquim Guarani.

## **Três Palmeiras**

Foi elaborado entre consultoria independente e indígenas o PBAI conceitual da aldeia de Três Palmeiras. A elaboração contou com ampla participação social dos indígenas e foram definidos linhas e premissas para o desenvolvimento de 09 programas.

## **Comboios**

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 41.580 litros distribuídos nos dias 21 e 28 de Abril, 05, 12 e 19 de Maio de 2022 (total de 2079 galões de 20 litros).

A execução do Programa de Retomada Econômica marca o início das ações do Plano Básico Ambiental Indígena. O programa foi construído em conjunto com os indígenas Tupiniquim de Comboios e consultoria independente e tem por objetivo estimular o desenvolvimento de ações para retomada econômica das famílias. Foram repassados, por meio da Associação Indígena Tupiniquim de Comboios, o recurso financeiro para 293 famílias indígenas de Comboios.

## **Resplendor**

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/04/2022 até 20/05/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/04/2022 até 20/05/2022.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/04/2022 até 20/05/2022.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/04/2022 até 20/05/2022

## **Indicadores**

Os indicadores do Programa estão em revisão.

## **PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.








## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	46	§1º	Em Andamento
Cláusula	50	caput	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	355	1	Em Andamento
Deliberação	300	1	Judicializado
Deliberação	300	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Judicializado
Deliberação	493	2	Judicializado
Deliberação	493	3	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado

Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado

## Entregas do ano de 2022

- janeiro de 2022  Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
- novembro de 2022  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
- dezembro de 2022  Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

### **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Quilombolas**

Realização de pesquisa etnográfica na comunidade, atividade vinculada ao PG01 – Documentação de referências culturais PBAQ

Oficina Cultural e Entrega de Certificados das oficinas de Jongo - Atividade vinculada ao PG02 - Incentivo as práticas culturais do Degredo PBAQ

Ensaio das quadrilhas infantil e adultos - Atividade vinculada ao PG02 - Incentivo as práticas culturais do Degredo PBAQ

## **Fiscadores**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão

## **PG005 Programa de Proteção Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	caput	Em Andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Concluído Internamente
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	533	4	Judicializado

## Entregas do ano de 2022

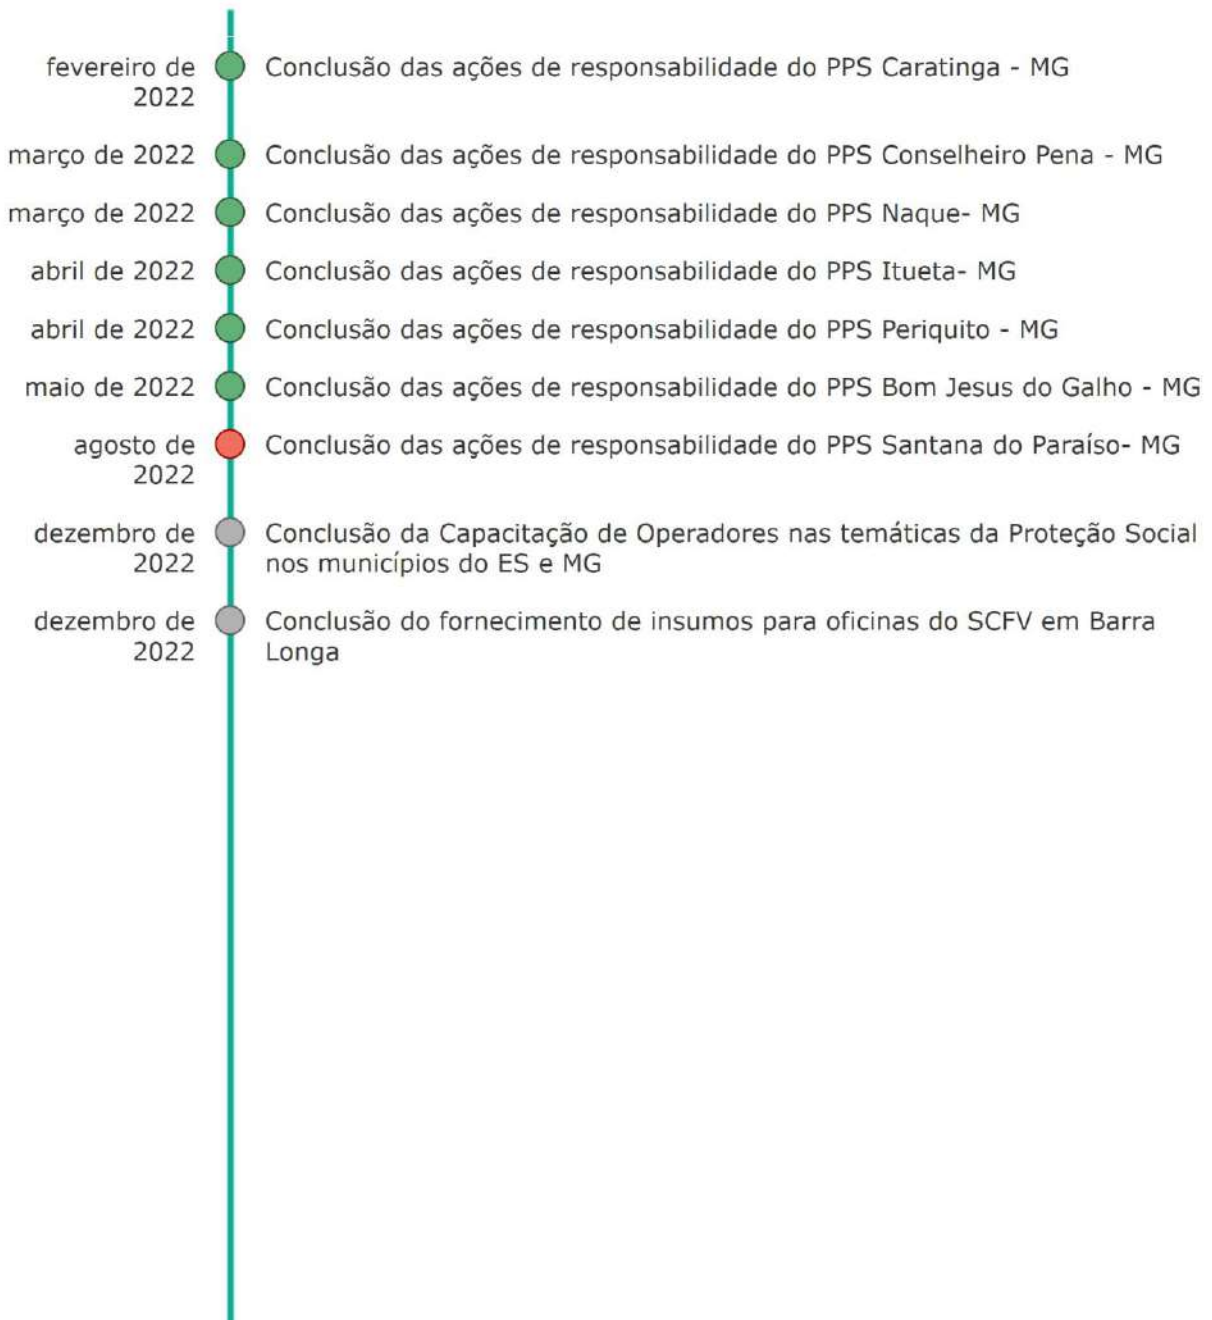

### Nota:

Apesar das ações de responsabilidade do PPS terminarem, as ações de responsabilidade do município (atendimento às famílias, oficinas, dentre outros) continuam até a data prevista no Plano pactuado com o município.

● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 91 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de R\$ 10,04 Mi**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de 14 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23370 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

## **Fatos relevantes do mês**

Reunião do COMAPPS, para acompanhamento das atividades do plano de reparação em proteção social, com a participação de representantes dos signatários do termo e atingidos, no município de Linhares.

Obtenção do "de acordo" do município de Aimorés para seguir com a pactuação do plano de reparação em proteção social.

Conclusão das atividades de responsabilidade da Fundação Renova do plano do município de Bom Jesus do Galho.

## Indicadores

### I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social




Gráfico 1:I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

Seguem comprovantes de repasses efetuados no período de 2021.

Memória de cálculo Programa  
– 37/37 (36 municípios e 01 estado)

### I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos




Gráfico 2:I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Memória de cálculo  
92 vagas previstas e 111 vagas ofertadas  
92/111

## Indicadores

### I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa  
484 vagas previstas e 431 vagas ofertadas  
431/484

### I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)

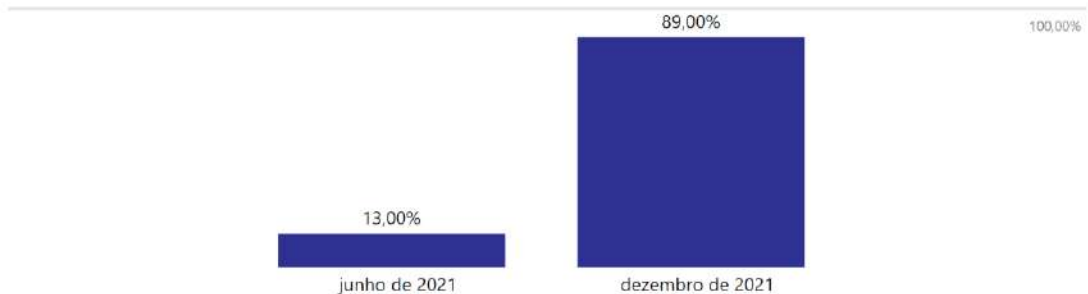


Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa  
484 vagas previstas e 431 vagas ofertadas  
431/484



## Indicadores

### I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Percentual(%)



Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa  
13.326 elegíveis/ 12.955 priorizados

### I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Percentual(%)

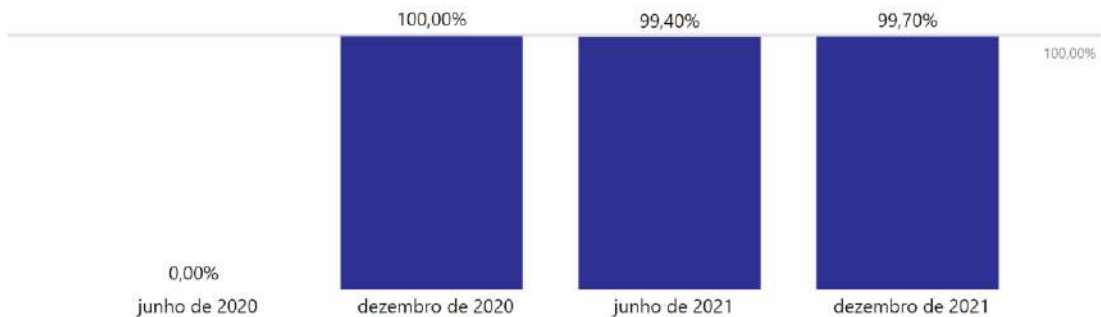


Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa  
13.326 elegíveis/ 12.955 priorizados

## Indicadores

**I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)**

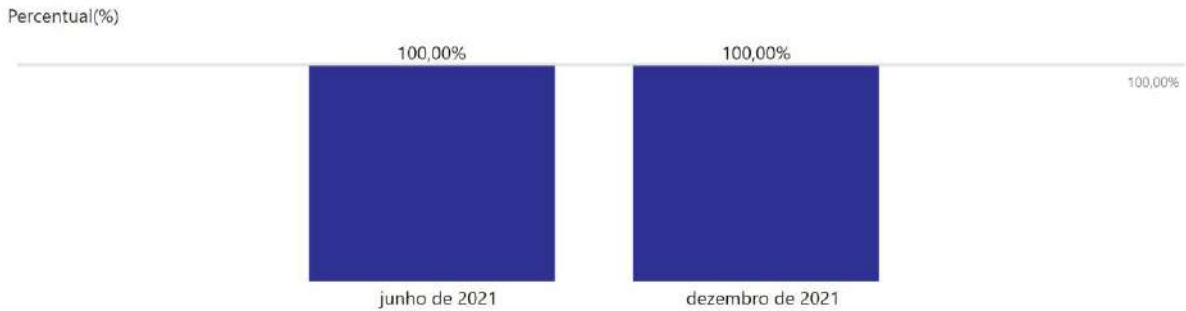


Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa

07 – 92 (barramento) + 176 (reassentamento) = 268 famílias (todas acompanhadas)



## Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
<p>Relatório Mensal de Atividades – fevereiro de 2022 Item: Grandes Números Subitem: Repasse financeiro</p>		<p>No relatório mensal do ano 2022 mês fevereiro, foi reportado que o repasse financeiro até o presente foi de R\$ 8,69 Mi, porém o correto é R\$ 8 Mi. Essa diferença foi pelo fato do parceiro Fa.Vela ter solicitado resilição e feito devolução de recursos financeiros no mês de fevereiro de 2022.</p>
<p>Relatório Mensal de Atividades – março de 2022 Item: Grandes Números Subitem: Repasse financeiro</p>		<p>No relatório mensal do ano 2022 mês março, foi reportado que o repasse financeiro até o presente foi de R\$ 8,78 Mi, porém o correto é R\$ 8.12 Mi. Essa diferença foi pelo fato do parceiro Fa.Vela ter solicitado resilição e feito devolução de recursos financeiros no mês de fevereiro de 2022.</p>
<p>Relatório Mensal de Atividades – abril de 2022 Item: Grandes Números Subitem: Repasse financeiro</p>		<p>No relatório mensal do ano 2022 mês abril, foi reportado que o repasse financeiro até o presente foi de R\$ 9.58 Mi, porém o correto é R\$ 8.92 Mi. Essa diferença foi pelo fato do parceiro Fa.Vela ter solicitado resilição e feito devolução de recursos financeiros no mês de fevereiro de 2022.</p>

## **PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**












#### **Objetivos**

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em Andamento
Cláusula	63	§único	Em Andamento
Cláusula	63	Caput	Em Andamento
Cláusula	68	Caput	Concluído Internamente
Cláusula	71	Caput	Em Andamento
Cláusula	72	Caput	Em Andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Concluído Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	506	3	Concluído Internamente
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente
Deliberação	550	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022		Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas , Ativos Locais e suas Redes em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.

 Concluído     Planejado     Reprogramado

## DIÁLOGO

### Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	abril de 2022	maio de 2022	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	8	9	1.110
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês )	26	18	3.759
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	126.216



## Fatos relevantes do mês

Ainda no Espírito Santo, foram realizadas agendas coletivas presenciais com moradores e lideranças das comunidades de Linhares, Baixo Guandu, e Colatina, para discussão sobre as possibilidades de cursos de qualificação profissional nos municípios. Em Regência, Povoação e Linhares foram realizadas agendas com moradores e lideranças para apresentação sobre o TAC-Governança.

Na Calha do Rio Doce, destaque para as ações de esclarecimento, junto aos atingidos, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado. Para isso foram realizados: I) diálogo coletivo presencial junto a atingidos de Santana do Paraíso; II) diálogo coletivo remoto junto a atingidos de Sem Peixe; III) envio sistemático de materiais (pílulas, áudios e vídeos por WhatsApp) para atingidos do território. Ainda no território, foi prestado apoio na oferta de esclarecimentos sobre o processo de implantação do Banco Comunitário de Baixa Verde (Dionísio/MG) junto a moradores e lideranças por meio da realização de dois diálogos coletivos presenciais na comunidade. Em São José do Goiabal houve também encontro coletivo para articular a participação da população no encontro presencial do projeto VimVer Lideranças, previsto para junho/22.

No Alto Rio Doce, foram realizadas reuniões coletivas realizadas em Barra Longa (MG), nas comunidades do Morro Vermelho, Volta da Capela, Centro, Gesteira e Áreas Rurais para apresentação de pautas judicializadas no território. Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado foram realizados encontros para repasse de informações sobre os Canais de Comunicação da Fundação Renova.

No Médio Rio Doce foram feitas diversas visitas presenciais no mês de maio: acompanhamento de visitas in loco com o Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG38) e representantes da comunidade local, para entendimento da coleta da qualidade da água no rio Doce, em Aimorés (MG) e Tumiritinga (MG). Houve também visita técnica no Assentamento Liberdade (Periquito, MG) junto dos programas de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas (PG26) e Recuperação de Nascentes (PG27).

No território do Espírito Santo, destaque para a Realização de atividade de campo para acompanhamento das coletas de líquidos e sedimentos nos rios Piraquê-Açu e rio Riacho na comunidade de Barra do Riacho (Aracruz), em 11/05/2022 e 12/05/2022. A ação faz parte do Plano de Ação do Grupo de Trabalho de Monitoramento da água em Aracruz/ Barra do Riacho, constituído por lideranças comunitárias, equipes do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06) e Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG038), e tem por objetivo promover a participação e controle social sobre as ações do Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS).

## Indicadores

### I10 e I20 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)



Gráfico 1: I10 e I20 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

### I05 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 2: I05 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

## Indicadores

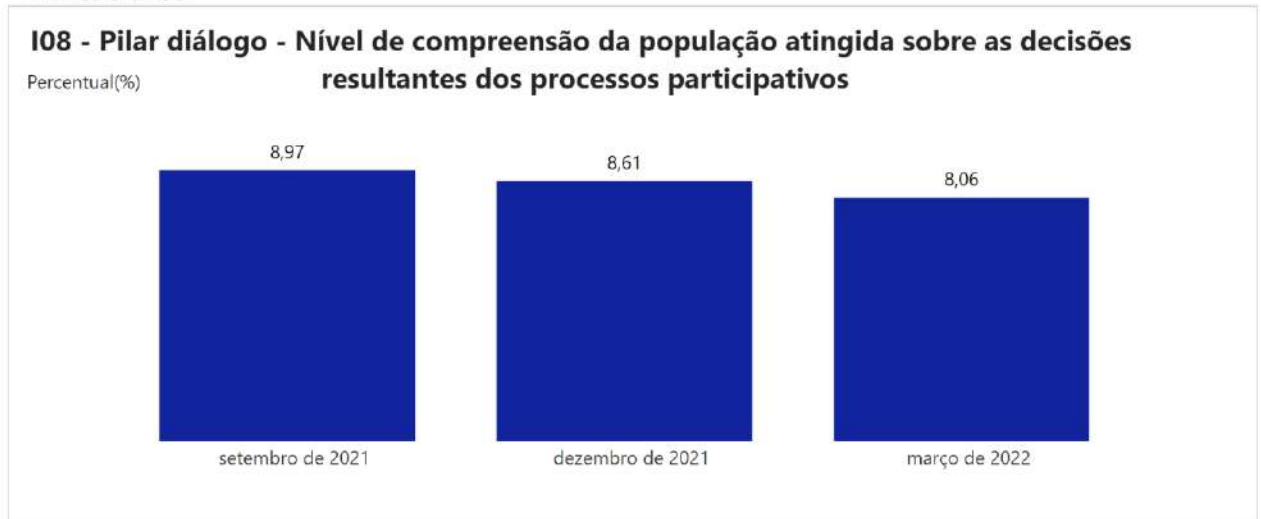


Gráfico 3: I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral




Gráfico 4: I18 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral



## Indicadores

### I19 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos

Percentual(%)



Gráfico 5: I19 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

### I21 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)




Gráfico 6: I21 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

## Indicadores

### I17 e I32 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)




Gráfico 7: I17 e I32 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

### I31 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 8: I31 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

## Indicadores

### I09 e I15 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 e I15 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

### I16 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios

Percentual(%)

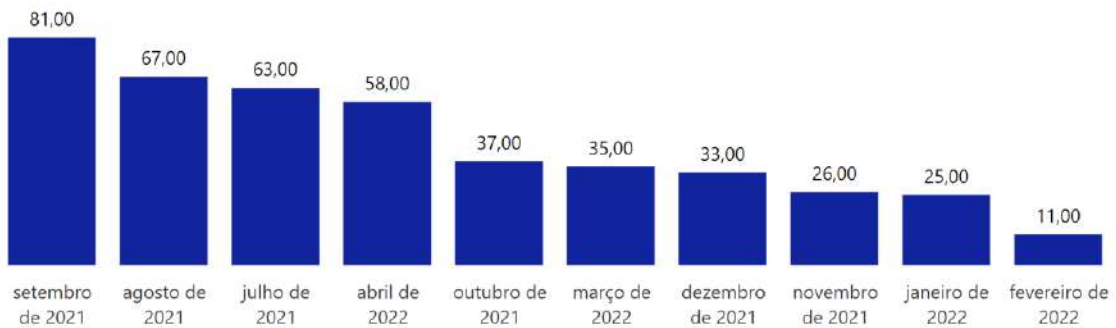


Gráfico 10: I16 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

## OUVIDORIA

### Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO</b>	<b>MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA</b>
14.458,00	183,01

Tabela 3. Manifestações recebidas.

<b>MÊS/ANO</b>	<b>REALIZADO MENSAL</b>	<b>MÉDIA ACUMULADA ANUAL</b>
janeiro de 2022	177	172,67
fevereiro de 2022	131	
março de 2022	210	196,50
abril de 2022	206	
maio de 2022	187	-
		-

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores




Gráfico 9: I24c - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal

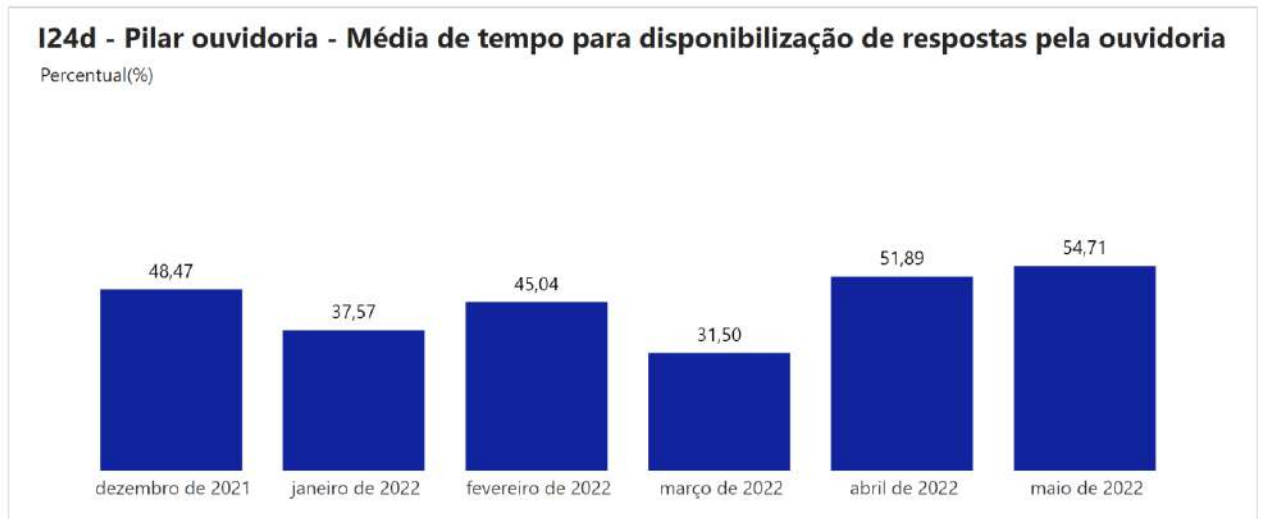


Gráfico 10: I24d - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

## CANAIS DE RELACIONAMENTO

### Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	abril de 2022	maio de 2022
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	293.893	297.207
Canais: Número total de manifestações	1.094.599	1.113.015
Canais: Número de manifestações respondidas	1.023.723	1.045.844
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	149.551	151.420
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	55.147	58.575
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	13.901	13.979
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	819.265	831.335
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	17	18
Canais: Número de manifestações em tratamento	70.876	67.171
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	56.735	57.706

### Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

### Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1



### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1 = Sim.

### Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

## Pesquisa CIAs

Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?




Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?





Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

## Fatos relevantes do mês

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; análise, tratativa e finalização de manifestações com ênfase nas demandas para informe de rendimentos, atendendo todas as solicitações para envio de informe.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Ressarcimento e Indenização (PG02), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" e "Moradia Temporária" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce. No Médio Rio Doce foi realizada análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Aduadora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32).

No mês de abril, destaque para a realização de 06 CIAs Móveis, estratégia itinerante dos Centros de Informação e Atendimento, para resolução de dúvidas e acolhimento de manifestações: em 17/05, 24/05 e 31/05 foi realizado CIA Móvel na comunidade de Regência (Linhares); nos dias 19/05 e 26/05 na comunidade de Povoação (Linhares); e em 05/04 na comunidade de Ilha do Rio Doce, Caratinga.

Participação dos atendentes CIAs em treinamento para qualificação e aperfeiçoamento dos atendimentos sobre o processo de reparação e compensação: Ambientação Técnica | Processos e Produtos (23/05).

## Indicadores

### I22 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)



Gráfico 19: I22 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

### I24a - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)

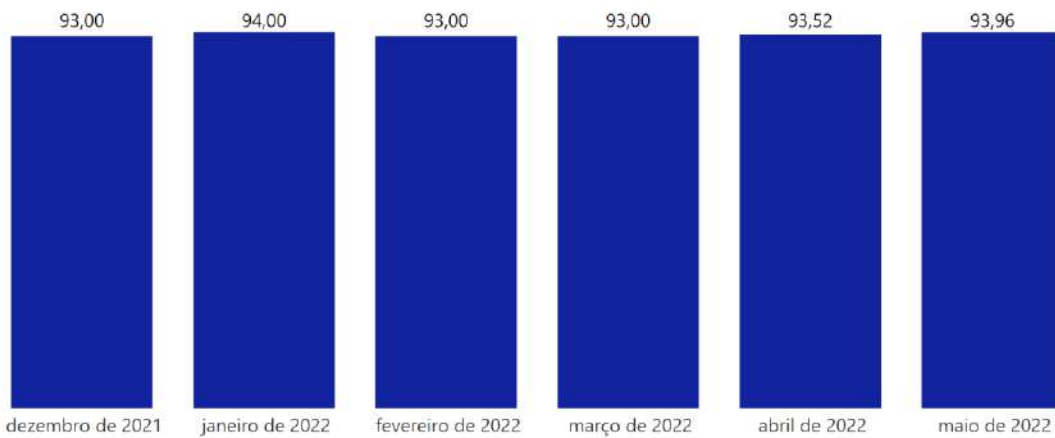


Gráfico 20: I24a - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

## Indicadores

### I24b - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Percentual(%)

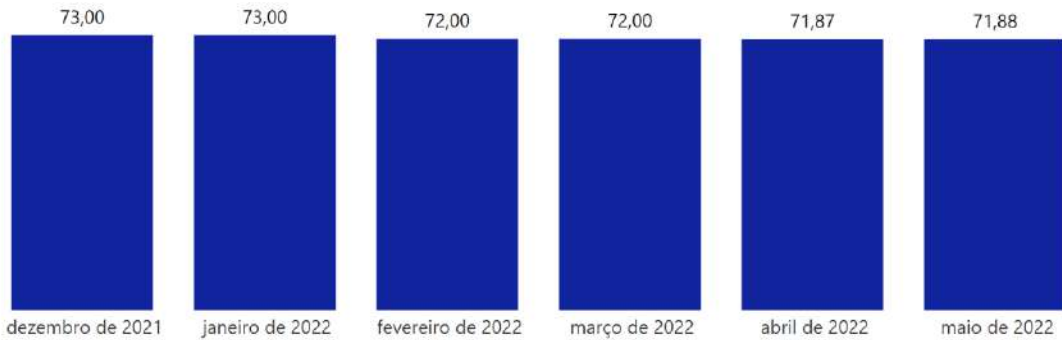


Gráfico 21: I24b - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

### I2 e I26a - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias

Percentual(%)

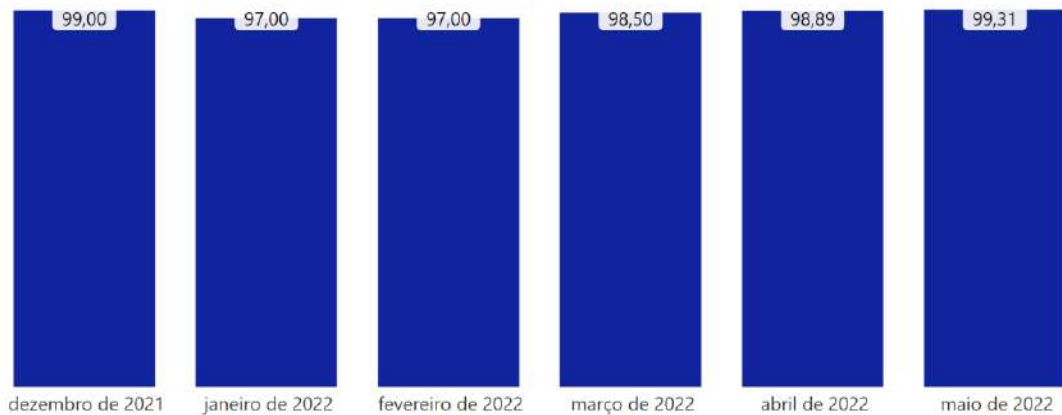


Gráfico 22: I2 e I26a - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

## Indicadores

### I27 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações

Percentual(%)




Gráfico 24: I27 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

### I02 e I26b - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e Fale Conosco

Percentual(%)

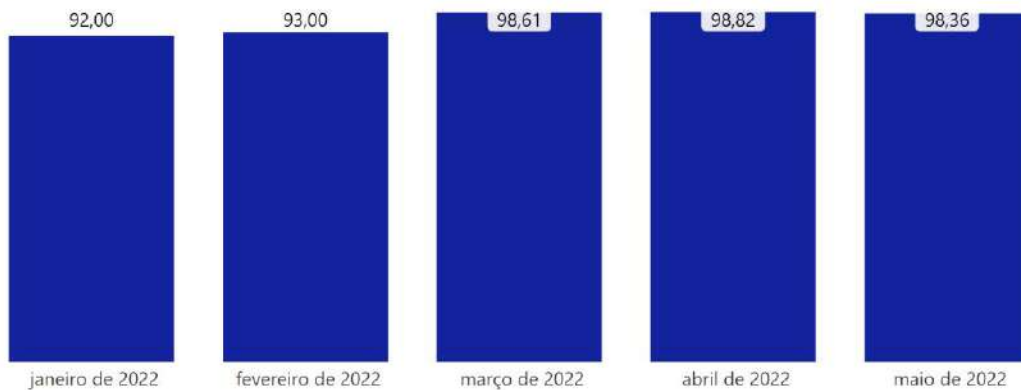


Gráfico 23: I02 e I26b - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e Fale Conosco - Frequência Mensal

## Indicadores

### I27a - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs

Percentual(%)

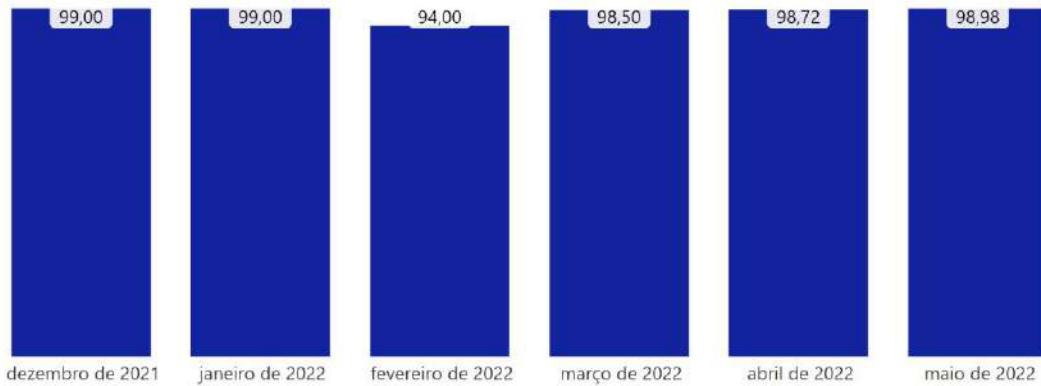


Gráfico 25: I27a - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs - Frequência Mensal

### I27b - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)

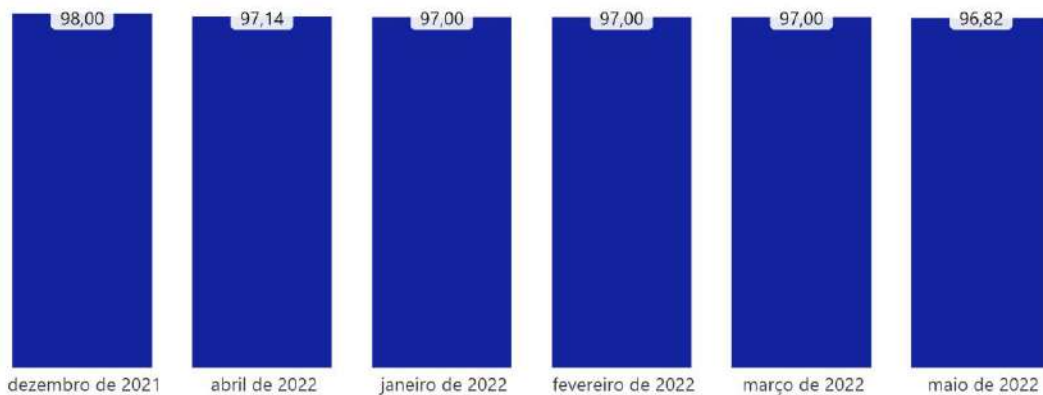


Gráfico 26: I27b - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal



## Indicadores

### Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs

Percentual(%)

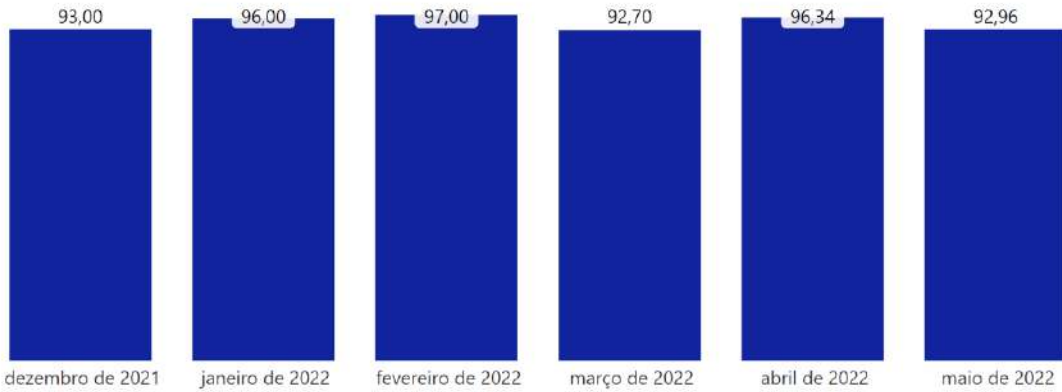


Gráfico 27: Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs - Frequência Mensal

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### 1º Semestre de 2022


DADO	jan	fev	mar	abr	mai	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	0	0	1	0	<b>1</b>
Carros de som produzidos	4	1	3	0	2	<b>10</b>
Cartazes produzidos	0	0	4	0	3	<b>7</b>
Cartilhas produzidos	0	0	1	1	2	<b>4</b>
E-mails de Marketing produzidos	0	1	5	2	0	<b>8</b>
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	3	2	3	<b>12</b>
Jornais da Comunidade produzidos	5	0	20	0	16	<b>41</b>
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	15	33	10	33	<b>91</b>
Mídias Sociais produzidas	15	3	6	2	1	<b>27</b>
Newsletter produzidos	3	3	2	2	4	<b>14</b>
Outros itens produzidos	2	1	18	6	14	<b>41</b>
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	<b>2</b>
Pílulas de whatsapp produzidos	39	21	40	36	26	<b>162</b>
Rádios produzidos	18	20	41	40	48	<b>167</b>
Vídeos produzidos	1	0	1	1	15	<b>18</b>

## COMUNICAÇÃO

### Grandes números do pilar

#### Publicações por Território


Canais: Carro de som, Cartaz, Cartilha, Informe do Reassentamento, Jornal da Comunidade, Matéria - Boletim Jornada, Mídia Social, Newsletter, Outros, Panfleto, Pílula, Rádio, Vídeo

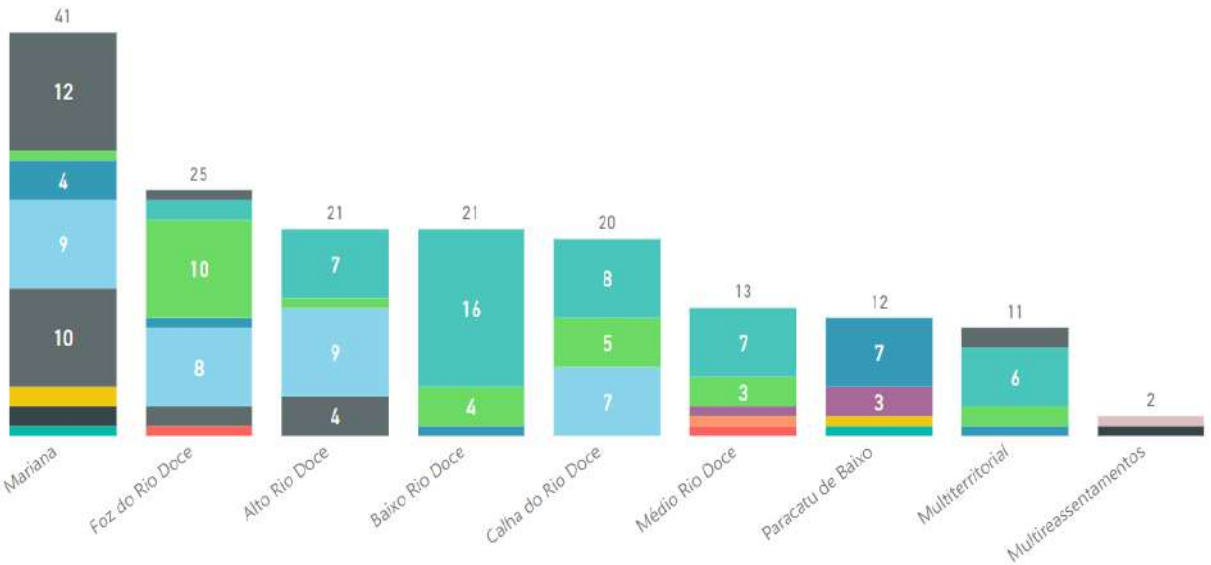

Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

#### Principais Temas Veiculados

Canais: Carro de som, Cartaz, Cartilha, Informe do Reassentamento, Jornal da Comunidade, Matéria - Boletim Jornada, Mídia Social, Newsletter, Outros, Panfleto, Pílula, Rádio, Vídeo

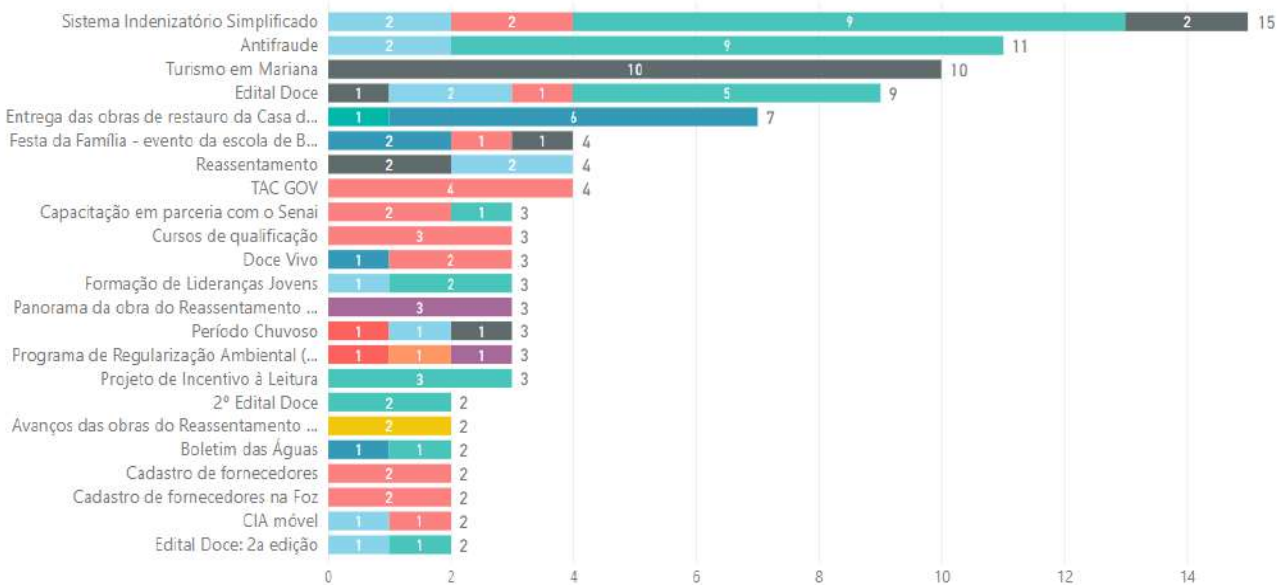

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Alto Rio Doce

Produção de matéria para a 21ª edição do jornal Terra da Gente em continuação à série sobre a judicialização no município de Barra Longa. Dessa vez, sobre o Eixo 10, das assessorias técnicas.

Produção de matéria para a edição 13 do boletim Jornada de Barra Longa sobre as rodas de conversa que aconteceram nos quatro principais bairros da cidade.

Produção de matéria para programa de rádio sobre as rodas de conversa a respeito da judicialização em Barra Longa.

#### Baixo Rio Doce

Produção de pílula convidando a comunidade de Resplendor, Itueta e Aimorés para conhecer o projeto Doce Vivo e apresentar dados sobre a qualidade da água do rio Doce.

#### Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Ilha do Rio Doce, comunidade de Caratinga, para o CIA Móvel no dia 25/05.

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Sem-Peixe para reunião virtual, no dia 31/05, sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

Publicação de matéria na edição de maio do Jornada da Calha sobre o CIA Móvel realizado em São José do Goiabal.

Publicação de matéria na edição de maio do Jornada da Calha sobre o Circuito da Água Bacia do Rio Doce realizado em São José do Goiabal.

## Fatos relevantes do mês

### Territórios

#### Calha do Rio Doce

Publicação de matéria na edição de maio do Jornada da Calha sobre o novo número do 0800 para atendimento exclusivo a deficientes auditivos.

#### Foz do Rio Doce

Produção de cartilha, com conteúdo explicativo, sobre os alagamentos em Patrimônio da Lagoa (Sooretama)

Produção de matéria para a edição 2 do boletim Jornada (Foz e Juparanã ) sobre a mudança de número do telefone 0800 para portadores de deficiência auditiva

Produção de matéria para a edição 2 do boletim Jornada (Foz e Juparanã) esclarecendo sobre a não relação entre a enseadeira e os alagamentos em Patrimônio da Lagoa

Produção de matéria para a edição 2 do boletim Jornada (Foz e Juparanã) sobre a entrega de uma viatura, equipada, para a Defesa Civil de Linhares

Produção de pílula convidando a comunidade de Povoação para participar de uma reunião comunitária para tratar do TAC GOV.

Produção de pílula convidando a comunidade de Regência para participar de uma reunião comunitária para tratar do TAC GOV.

Produção de pílula/convite para apresentação do TAC GOV em Povoação

Produção de pílula/convite para apresentação do TAC GOV em Regência

Produção de vídeo explicativo sobre os alagamentos em Patrimônio da Lagoa (Sooretama)

## Fatos relevantes do mês

### Imprensa

Projeto de Meliponicultura inicia entrega de colmeias na foz do rio Doce.

Projeto de Incentivo à Leitura vai distribuir 18 mil livros para 32 bibliotecas públicas.

Projeto de empreendedorismo para jovens dos reassentamentos tem inscrições abertas.

Obras nos reassentamentos têm mais de 500 oportunidades de emprego.

Obras nos reassentamentos têm mais de 400 oportunidades de emprego.

Obras nos reassentamentos têm mais de 260 oportunidades de emprego.

Institutos promovem ações sociais em Governador Valadares.

Inscrições para segunda edição do Edital Doce são prorrogadas até 11 de maio.

Inscrições para curso de capacitação profissional estão abertas em Ipatinga.

Indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado chegam a R\$ 67 milhões em Mariana e Barra Longa.

Fundação Renova investe R\$ 60 milhões em restauração florestal na bacia do rio Corrente.

Fundação Renova investe R\$ 540 mi em restauração florestal em área superior a 16 mil hectares em MG e no ES.

Escola do Rio Doce inicia curso de aperfeiçoamento para 6 mil professores.



## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

Produção de matéria para 21ª edição do Jornada Mariana sobre status das obras dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo

#### Suporte ao Licenciamento

Produção de matéria para a 21ª edição do Jornada Mariana sobre atividades de educação ambiental em Mariana

#### Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para programa de rádio com informações sobre como ingressar no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para programa de rádio com informações sobre leis antifraude no Brasil, como parte da ação do plano Antifraude.

Produção de matéria para programa de rádio da ação Antifraude com informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Produção de matéria para programa de rádio sobre a prorrogação de prazo para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de pílula de WhatsApp informando que os atingidos que possuem conta na Caixa na modalidade Poupança Caixa Fácil precisam solicitar a mudança no tipo da conta para a Renova conseguir fazer o pagamento da indenização.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Publicação de matéria na edição de maio do Jornada da Calha sobre a prorrogação do prazo de acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado para 30/06.

Publicação de matéria na edição de maio do Jornada da Calha com dicas sobre como se proteger de fraudes.

Programa de rádio sobre sistema Antifraude

Produção de vídeo da série Conhecendo do Sistema Indenizatório Simplificado sobre o tema Solicitação de Ingresso

Produção de vídeo da série Conhecendo do Sistema Indenizatório Simplificado sobre o tema Matriz de Documentos.

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre a troca de advogados para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de narrativa para as equipes de diálogo, R.I e canais utilizar como suporte em conversas individualizadas sobre a suspensão do Novel Infraestrutura no Eixo 4.



## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Programa de rádio sobre Sistema Indenizatório Simplificado

Produção de matéria para a Rádio Renova informando que os atingidos que possuem conta na Caixa na modalidade Poupança Caixa Fácil precisam solicitar a mudança no tipo da conta para a Renova conseguir fazer o pagamento da indenização.

Produção de matéria para a Rádio Renova informando que o prazo de adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado foi prorrogado até 30/06.

Produção de matéria para a edição 2 do boletim Jornada (Foz e Juparanã) sobre o prazo final de entrega da declaração de imposto de renda

Produção de matéria para a edição 13 do boletim Jornada de Barra Longa sobre os primeiros pagamentos do Sistema Indenizatório Simplificado no município.

Produção de matéria de rádio com orientações sobre como identificar possíveis situações de golpes ou fraudes, como parte da ação do plano Antifraude.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de matéria para a 19ª edição do Voz da Comunidade sobre modalidades de indenização em Mariana

Produção de matéria para a 21ª edição do Jornada Mariana sobre alertas e orientações para combater a fraude nas indenizações

Produção de matéria para a 22ª edição do Jornal Voz da Foz sobre os questionamentos de pescadores relacionados às novas exigências após o corte do AFE

Produção de matéria para a edição 2 do boletim Jornada (Foz e Juparanã) sobre dicas para não cair em fraudes

Produção de matéria para a Rádio Renova com informações sobre os principais tipos de fraude.

Produção de matéria para a Rádio Renova sobre a possibilidade de troca de advogados no Sistema Indenizatório Simplificado.

#### Suporte ao PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Produção de matéria para a edição 13 do boletim Jornada de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce sobre a capacitação que está sendo realizada com os moradores e moradoras do local.

#### Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Produção de matéria para a edição 2 do boletim Jornada (Foz e Juparanã) sobre a parceria firmada com a Prefeitura de Linhares para a construção da estação de tratamento de água em Degredo

Produção de matéria para o Momento Renova sobre a parceria com a Prefeitura de Linhares para a construção da estação de tratamento de água de Degredo

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte ao PG007 Programa de Assistência aos Animais**

Produção de matéria para a 19ª edição do Voz da Comunidade sobre dúvidas para atendimento veterinário em Mariana

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas**

Produção de matéria para 19ª edição do Voz da Comunidade de Mariana sobre status das obras dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues**

Carro de som durante 3 dias da semana com disseminação de informação de segurança e conscientização sobre os cuidados com a linha energizada de alta tensão dos postes do reassentamento.

Cartaz nas frentes de obra do reassentamento de Bento Rodrigues para informar e conscientizar sobre os cuidados com a linha energizada de alta tensão dos postes do reassentamento.

Produção de fundo de palco em apoio à Festa da Família, evento do calendário escolar da comunidade de Bento Rodrigues.

Produção de GIF com as manchetes do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues

Produção de vídeo sobre a história da escola, em apoio à Festa da Família, evento do calendário escolar da comunidade de Bento Rodrigues.

Produção e distribuição do informativo sobre o reassentamento para as famílias de Bento Rodrigues.

Produção e distribuição do primeiro vídeo da série mensal do Reassentamento de Bento Rodrigues em 1 min, com avanços do período

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues**

Produção de brinde, em apoio à Festa da Família, evento do calendário escolar da comunidade de Bento Rodrigues.

Produção de convite em apoio à Festa da Família, evento do calendário escolar da comunidade de Bento Rodrigues.

Produção de matéria para 19ª edição do Voz da Comunidade de Mariana sobre atividades de reintegração da comunidade no reassentamento de Bento Rodrigues

Produção de matéria para 21ª edição do Jornada Mariana sobre atividades de reintegração da comunidade no reassentamento de Bento Rodrigues

#### **Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu**

Produção de informativo mensal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status sobre projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

Produção de matéria para 21ª edição do Jornada Mariana sobre as obras de revitalização da Estação de Monsenhor Horta

Produção de matéria para a 19ª edição do Voz da Comunidade sobre entrega da obra da Casa da Banda

Produção de painel no tamanho 2x1 com informações sobre as obras de restauração do Museu Escola Sociedade Musical São Caetano (Casa da Banda), em Monsenhor Horta.

Produção de Spot de Carro de Som para divulgação da data do evento de entrega das obras de restauração do Museu Escola Sociedade Musical São Caetano (Casa da Banda), em Monsenhor Horta.



## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Criação de GIF com as pautas do Informe do Reassentamento para chamar atenção do leitor para o recebimento do boletim.

Produção da 41ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 42ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 43ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção de folder A4 com informações sobre as obras de restauração do Museu Escola Sociedade Musical São Caetano (Casa da Banda), em Monsenhor Horta.

Produção de fundo de palco no tamanho 6x2m50 com informações sobre as obras de restauração do Museu Escola Sociedade Musical São Caetano (Casa da Banda), em Monsenhor Horta.

Produção de moldura fotográfica 15x10 para entrega à comunidade com informações sobre as obras de restauração do Museu Escola Sociedade Musical São Caetano (Casa da Banda), em Monsenhor Horta.

Produção de painel no tamanho 2x2,20 com informações sobre as obras de restauração do Museu Escola Sociedade Musical São Caetano (Casa da Banda), em Monsenhor Horta.

Produção de painel no tamanho 3x2,20 com informações sobre as obras de restauração do Museu Escola Sociedade Musical São Caetano (Casa da Banda), em Monsenhor Horta.

## **Fatos relevantes do mês**

### **Suporte aos Programas**

#### **Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas**

Produção de matéria para a 19ª edição do Voz da Comunidade sobre o início das obras da estação Ferroviária de Monsenhor Horta

Produção de matéria para a 21ª edição do jornal Terra da Gente sobre o andamento das obras do Parque de Exposições, em Barra Longa.

Produção de matéria para a edição 13 do boletim Jornada de Barra Longa sobre as obras do Parque de Exposições.

#### **Suporte ao PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar**

Produção de matéria para 21ª edição do Jornada Mariana sobre reforma das escolas temporárias para retorno às aulas

Produção de matéria para a edição 13 do boletim Jornada de Barra Longa sobre os próximos passos do Edital Doce em Barra Longa.

#### **Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística**

Produção de matéria para a 19ª edição do Voz da Comunidade sobre atividades culturais na Casa do Saberes

Produção de matéria para a 21ª edição do jornal Terra da Gente sobre a manifestação cultural - grupo de capoeira - de Barra Longa.

#### **Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

Produção de matéria para programa de rádio com informações sobre o projeto de Incentivo à Leitura no município de Barra Longa.

Produção de matéria para programa de rádio sobre a prorrogação das inscrições para o Edital Doce.

## Fatos relevantes do mês

### Suporte aos Programas

#### Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Edição de vídeo de 30segundos roteiro esporte para divulgação do turismo em Mariana nas redes sociais da Renova

Edição de vídeo de 5segundos roteiro esporte para divulgação do turismo em Mariana nas redes sociais da Renova

Edição de vídeo de 5segundos roteiro turismo para divulgação do turismo em Mariana nas redes sociais da Renova

Edição de vídeo de 60segundos roteiro turismo para divulgação do turismo em Mariana nas redes sociais da Renova

Produção de matéria para a 21ª edição do jornal Terra da Gente fazendo um balanço do número de inscritos no Edital Doce de 2022.

Produção de matéria para a edição 13 do boletim Jornada de Barra Longa sobre os próximos passos do Edital Doce em Barra Longa.

Produção de matéria para a edição 2 do boletim Jornada (Foz e Juparanã) sobre a prorrogação das inscrições na segunda edição do edital Doce

Produção de matéria para o Momento Renova sobre as inscrições da segunda edição do Edital Doce

Produção de matéria para o Momento Renova sobre o projeto de lideranças jovens de Aracruz

Programa de rádio sobre o projeto de Incentivo a Leitura

## Indicadores

### **I6 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território**

Percentual(%)



Gráfico 28: I6 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

### **I7 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território**

Percentual(%)




Gráfico 29: I7 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual



## Indicadores

### I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Percentual(%)

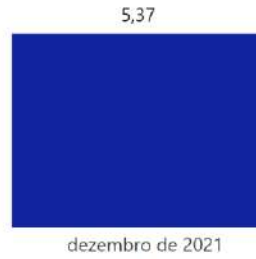


Gráfico 30: I25a - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

### I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Percentual(%)

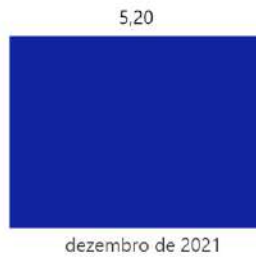


Gráfico 31: I25b - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

## **PG007 Programa de Assistência aos Animais**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Concluído Internamente
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Em Andamento
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Em Andamento
Deliberação	563	4	Planejado

## **Entregas do ano de 2022**

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

## **Grandes números do programa**

- 1226 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 160 adoções, 1437 devoluções, 181 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 405 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 304 bovinos, 53 equinos, 27 caninos, 18 suínos, 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1761 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

## **Fatos relevantes do mês**

Realização de curso de capacitação em Doma Racional de Equídeos - Item 3 da Deliberação 328/2019 - CIF.

Realização de curso de capacitação em Melhoramento Genético de Bovinos em parceria com Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Emater Minas Gerais - Item 3 da Deliberação 328/2019 - CIF.

## Indicadores

### I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de outono/22.

O reporte de resultados deste indicador para a estação de inverno/22 está previsto para o relatório de setembro de 2022 (ref. agosto/22).

## Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:




Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar



## Indicadores

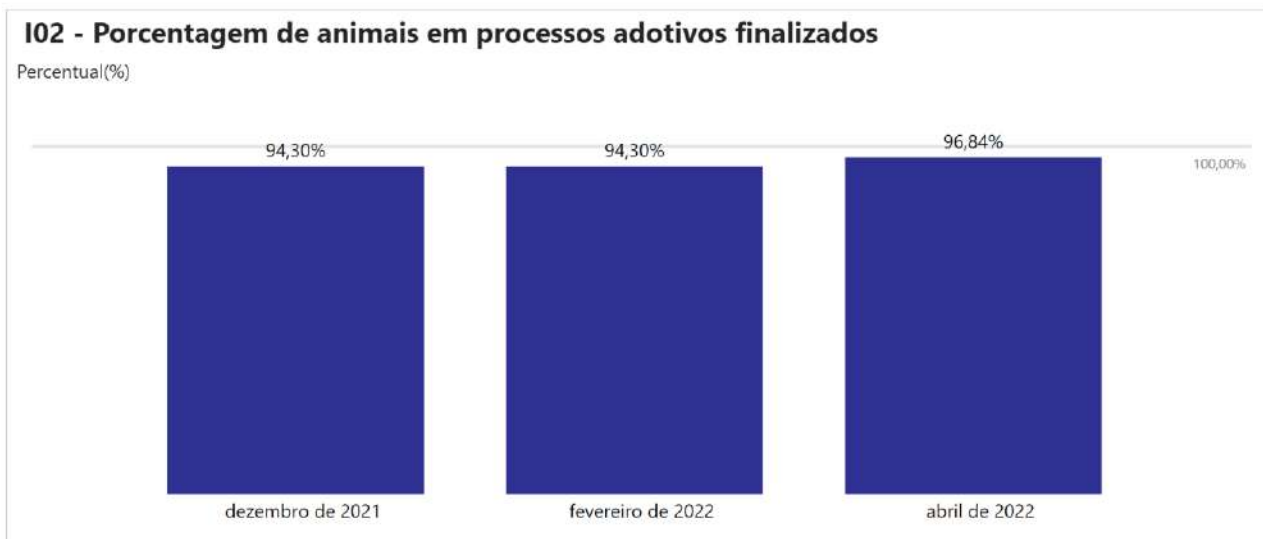


Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

Conforme reportado na última atualização deste indicador, a próxima verificação deste está prevista para o mês de julho de 2022 (referência ao bimestre mai./jun. de 2022).

## Indicadores

### I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Percentual(%)

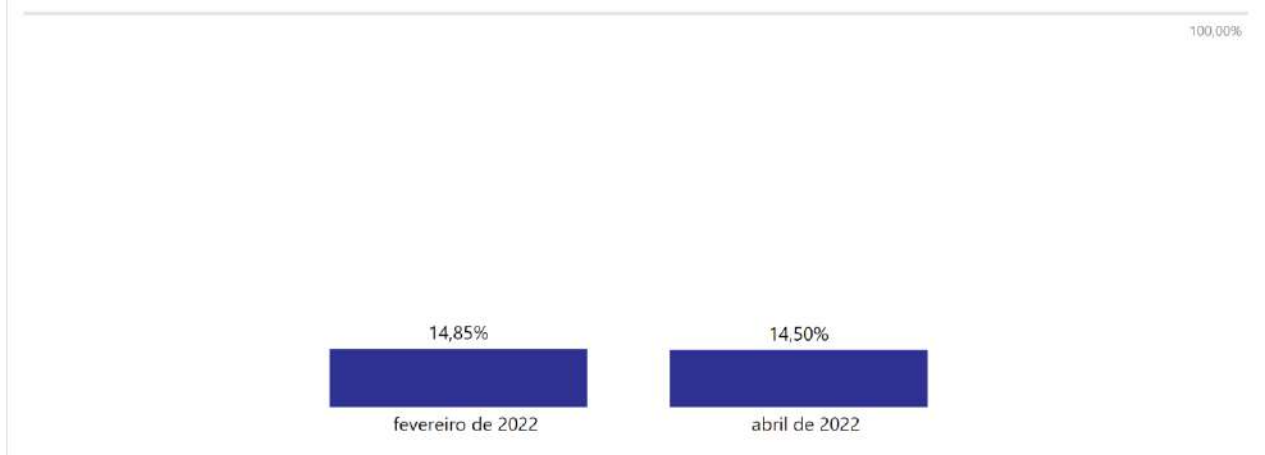


Gráfico 4:I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento - Frequência Bimestral

Conforme reportado na última atualização deste indicador, a próxima verificação deste está prevista para o mês de julho de 2022 (referência ao bimestre mai./jun. de 2022).

## Indicadores

### I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Percentual(%)

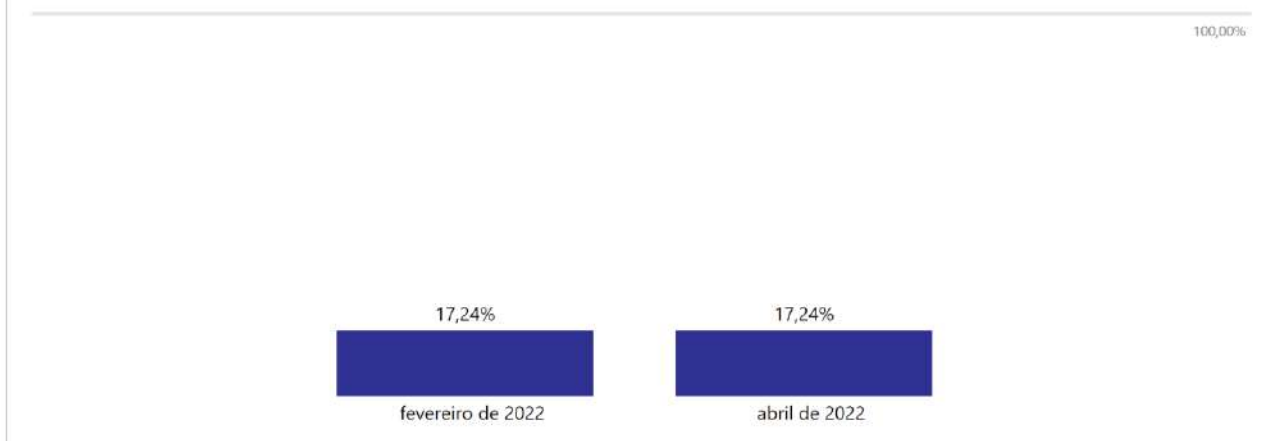


Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

Conforme reportado na última atualização deste indicador, a próxima verificação deste está prevista para o mês de julho de 2022 (referência ao bimestre mai./jun. de 2022).

## **PG008 Reconstrução de Vilas**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses. CLÁUSULAS: 76 a 78.

## Projeto Reconstrução de Vilas

### Status de Cláusulas e Deliberações


Cláusula	76	caput	Judicializado
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

## **Fatos relevantes do mês - Reconstrução de Vilas**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Entregas para o ano de 2022



dezembro de 2022	●	Concluir 78 edificações
dezembro de 2022	●	Concluir 22 lotes
dezembro de 2022	●	Concluir 01 bem coletivo

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

### Grandes números do projeto

#### Social:

- Atendimentos para 200 **famílias**;
- Atendimentos para 9 **famílias de Novos Núcleos**.

#### Obras:

- Em andamento construção de 103 **edificações**;
- Em andamento construção de 2 **bens coletivos**;
- Conclusão de 47 **edificações**;
- Conclusão de 4 **bens coletivos** (escola, posto de serviços, unidade básica de saúde, ETE);
- Total de 6 **contratos assinados** para construção de edificações.

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 186 edificações, 24 lotes vagos e 15 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 182 edificações, 24 lotes vagos e 14 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 173 edificações, 23 lotes e 14 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 23 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 171 edificações e para 13 bens coletivos.

Nota<sup>1</sup>: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".




## **Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Entregas para o ano de 2022

- 
- dezembro de 2022 ● Concluir 38 edificações
  - dezembro de 2022 ● Concluir 01 bem coletivo

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

### Grandes números do projeto

#### Social:

- Atendimentos para 78 **famílias**;
- Atendimentos para 5 **famílias de Novos Núcleos**.

#### Obras:

- Em andamento construção de 36 **edificações**;
- Em andamento construção de 4 **bens coletivos**;

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 63 edificações, 3 lotes vagos e 12 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 63 edificações, 6 lotes vagos e 12 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 61 edificações, 5 lotes e 11 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 5 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 61 edificações e para 11 bens coletivos.

Nota<sup>1</sup>: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".

## **Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Entregas para o ano de 2022**

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

## Projeto Reconstrução de Gesteira

### Grandes números do projeto

#### Social:

- Atendimentos para 8 **famílias;**
- Acordos homologados com 29 **famílias;**
- Número de atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado - Temos 23 **imóveis adquiridos** + 3 **pagamentos de acordos integrais** (sem aquisição de imóvel);


## **Projeto Reconstrução de Gesteira**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Entregas para o ano de 2022

- 
- dezembro de 2022 ● Concluir 03 reformas de edificações;
  - dezembro de 2022 ● Concluir 17 obras de edificações novas.

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

### Grandes números do Familiar

#### Obras:

- Em andamento construções de 47 **edificações novas;**
- Em andamento reformas de 30 **edificações;**
- Em andamento estruturações de 10 **lotes vagos;**
- Em andamento reconstruções de 16 **edificações;**

#### Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para construções de 43 edificações, para reformas de 29 edificações e 8 lotes vagos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para construções de 42 edificações, para reformas de 29 edificações e 8 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 41 edificações, para reformas de 29 edificações e 8 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás**, dispensa emitidos pela prefeitura ou não necessários para 38 construções de edificações, para 28 reformas de edificações e para 8 lotes vagos.

## Projeto Reconstrução de Familiar e Reconstruções

### Grandes números do Familiar

#### Social:

- Atendimento para 114 **famílias**;
- Aquisição de 82 **edificações** para **famílias** que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
  - Construção para 42 **edificações**;
  - Reforma para 30 **edificações**;
  - Previsão de entregas para 10 **lotes vagos**;
- Atendimento para 7 **famílias de Novos Núcleos**;
- Aquisição de 5 **edificações** para **famílias de Novos Núcleos** que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia;
  - Construção para 4 **edificações de Novos Núcleos**;
  - Reforma para 1 **edificações de Novos Núcleos**;
- Atendimento a 10 **famílias** na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 13 **edificações** nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções entregues para 6 **edificações** principais nas Comunidades Rurais.

## **Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções**

### **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores de acompanhamento



Gráfico 1: Disponibilidade total de atendimentos temporários (compensação financeira, aluguel e hotel) - Frequência Mensal

## **PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves**

**Referência: MAI/22**

### **Eixo Terra e Água**


#### **Objetivo**

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído Internamente

## Entregas do Ano de 2022

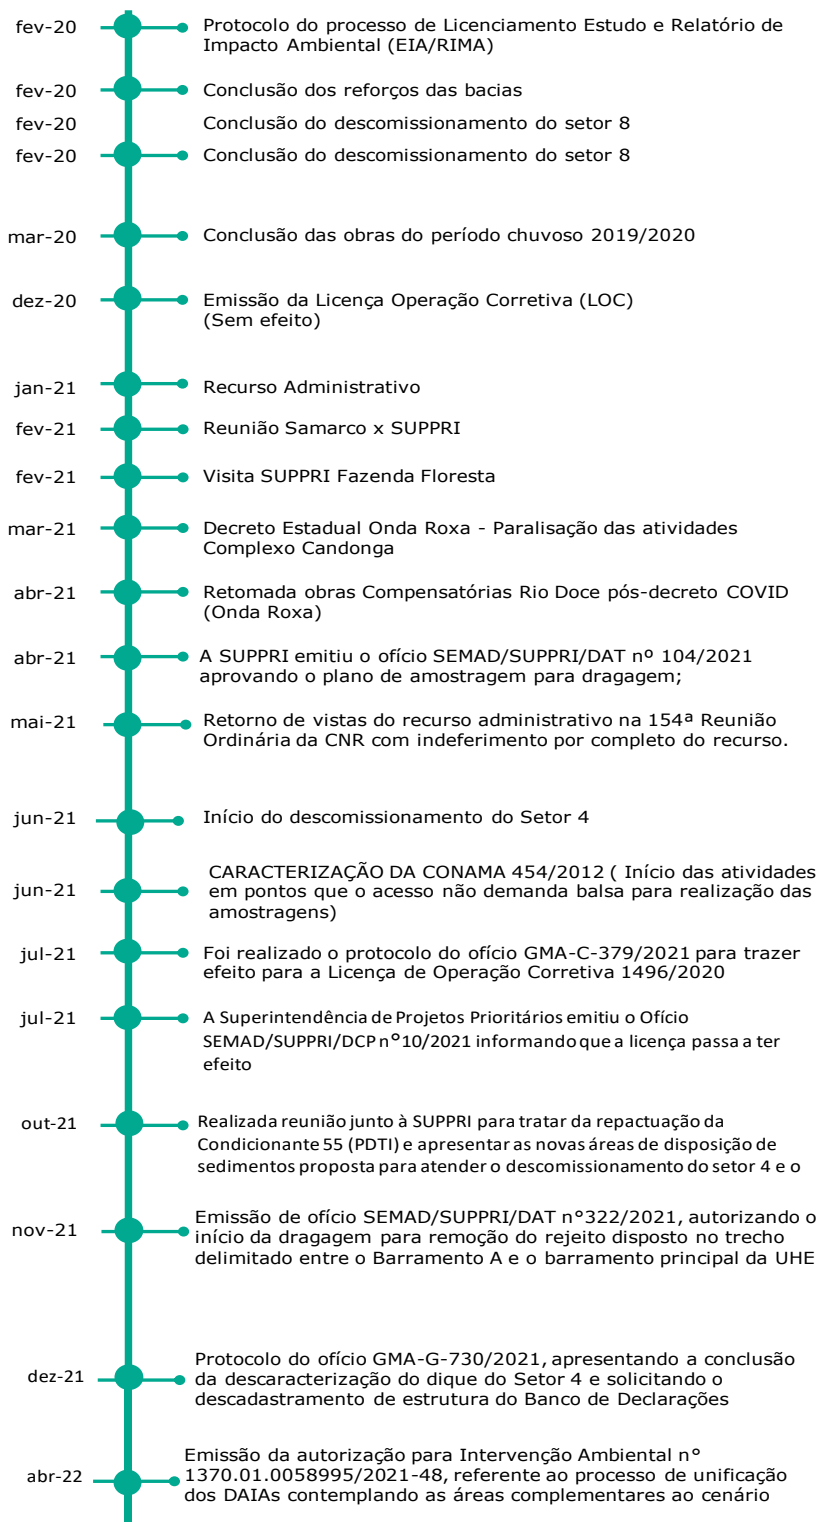

## Grandes números do programa

- **1ª fase** – período emergencial - 959 mil m<sup>3</sup> de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves;
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020), após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves. O volume de sedimentos removidos do reservatório passará a ser reportados no relatório CIF ref. Maio/22.

Até a data de 29/05/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de 64.619 m<sup>3</sup>.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados 1.586m<sup>3</sup> de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3 e BME4.



## Fatos relevantes do mês

- ✓ **Remoção de sedimentos – proximidades do barramento principal da UHE (na região dos 400M)**
- Infraestrutura das baias para transbordo do material removido para o Ponto de Apoio



*Figura 1 – Execução de forma das paredes da baia nº 3*

- Infraestrutura área de contrapilamento OE Dique Principal (setor 11) para recebimento dos sedimentos



*Figura 2 – Execução de Berma de equilíbrio*

- Remoção de Sedimentos



Figura 3 – Ciclo de Atividades de descarga nas baias localizadas no Ponto de Apoio



Figura 4 - Remoção de sedimentos dos conjuntos escavadeiras/ balsa e do conjunto guindaste/ balsa





Figura 5 – Lançamento do conjunto balsa / guindaste no reservatório UHE

✓ Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

- Áreas de Desaguamento Primário e Secundário



Figura 6 - Foto aérea das área de desaguamento primário e secundário do Setor 11

- Infraestrutura Sistema de Drenagem



*Figura 7 - Dreno DP1 (Setor 11)*

- Disposição final de Sedimentos



*Figura 8 - Compactação de Sedimentos O.E Dique Principal*



*Figura 9 - Disposição de Sedimentos Bacia 2*

✓ Recuperação dos pontos de margens

- ✓ Dentre os 79 pontos identificados como necessitados de algum tipo de recuperação, têm-se a seguinte situação:

Pontos já executados em recuperação	Obras Entregues	Obras em Andamento	Obras a Iniciar
• 33	• 29	• 13	• 4

▪ Destaque: Ponto 23

- ✓ Status atual:

Perfurações em andamento;

Próximos passos:

- Liberação do conjunto de injeção;
- Sequência no processo de perfuração, instalação e injeção da 1ª fase de tirantes.





*Figura 10 - Vista aérea ponto 23 em recuperação*



*Figura 11 - Perfuração terreno natural*

➤ UHE Candonga

- Reforço Barramento Principal UHE



Figura 12 – Concretagem do bloco BME2



Figura 13 – Montagem forma bloco BME5



Figura 14 - Montagem forma bloco BME1

▪ Limpeza Canal de Sucção



Figura 15 - Limpeza túneis Esquerdo e Direito – UG1



Figura 16 - Limpeza túneis Esquerdo e Direito – UG2

Atividade de Limpeza	UG#1	UG#2	UG#3	Avanço Físico
<b>Projeto Total</b>		☺		<b>79,9%</b>
Limpeza das Galerias dos Stop Log	☺	☺	☺	100%
Desobstrução das ranhuras	☺	☺	☺	100%
Limpeza da pista de contato da comporta	☺	☺	☺	100%
Descida do Stop Log	☺	☺	☺	100%
Drenagem das Máquinas	☺	☺	☺	100%
Limpeza da Caixa espiral	☺	☺	☺	100%
Limpeza do tubo de sucção	☺	☺	☺	100%
Retirada das grades de Montante	☹	☹	☹	66,7%
Limpeza final da sucção	☹	☹	☹	58,4%
Limpeza dos drenos	☹	☹	☹	66,0%
Dragagem do canal de fuga e saída d água		☹		0,0%

Atividade	Peso	Avanço	Ponderado
Mobilização	7%	100%	7%
Avanço UG1	14%	94%	13%
Avanço UG2	14%	100%	14%
Avanço UG3	32%	34%	11%
Poço de Drenagem	8%	44%	3%
Poço de Esvaziamento	7%	0%	0%
Tubulação de Drenagem	15%	66%	10%
Desmobilização	3%	0%	0%
<b>Geral</b>	<b>100%</b>		<b>58,43%</b>



Figura 17 - Avanço Físico Limpeza das UG's



## Reabilitação das UG's

Atividades	Status	Avanço Físico
Escopo Inicial	☹️	57,41%
Canteiro	😊	100,00%
Engenharia e Suprimentos	😊	98,00%
Materiais de Fomecimento	😊	100,00%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	😊	100,00%
Comporta vagão Tomada d`água	☹️	53,00%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água	☹️	26,50%
UG1- Atividades na Casa de Força	☹️	89,00%
UG2- Atividades na Casa de Força	☹️	86,00%
UG3- Atividades na Casa de Força	☹️	62,00%
Transformador Elevador	☹️	55,67%
Vertedouro	☹️	41,00%
Comissionamento sem água	☹️	0,00%
Comissionamento com água	☹️	0,00%
Comportas ense cadeiras jusante - Tubo de Sucção	☹️	0,00%
Serviços Adicionais	☹️	88,84%
Projeto Consolidado	☹️	63,43%



Figura 18 – Avanço Físico Reabilitação das UG's

### ✓ Status atual:

- Montagem da máquina UG1 no poço da máquina;
- Reparo rotor Kaplan da UG2 e UG3 em andamento na fábrica;
- Montagem da tubulação de 4" dos Radiadores da UG2;
- Montagem da tubulação do sistema de resfriamento;
- Retomada dos serviços no vertedouro;
- Recuperação metalúrgica da caixa espiral da UG3.

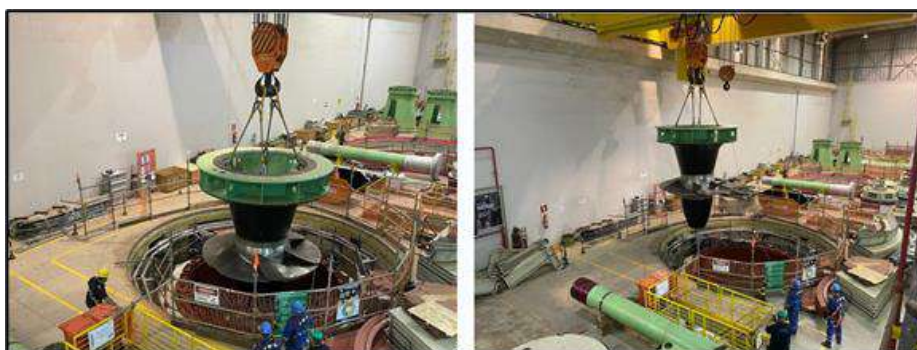


Figura 19 - Recuperação das Unidades de Geração - Rotor Kaplan

- Limpeza à Jusante da Casa de Força



*Figura 20 - Mobilização conjunto draga/ balsa*

## ➤ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

**Nota:** As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

### ✓ Destaques:

- A SPEC recomendou que seja realizado o lançamento de enrocamento para recomposição das cotas a jusante do Barramento C ainda nesse período seco. Foram propostos dois cenários (com enchimento do reservatório em outubro ou com a passagem de outro período chuvoso com o reservatório deplecionado). A atividade será realizada assim que as vazões do Rio Doce estiverem favoráveis à realização da ensecadeira (vazões iguais ou inferiores a 80 m<sup>3</sup>/s).
- As análises de sensibilidade para os Barramentos B e C, considerando as cotas de sedimento dos levantamentos recentes de GPR, encontram-se em andamento pela SPEC.
- Não foram registrados deslocamentos significativos nos sensores SAT dos barramentos no período.
- O monitoramento dos níveis d'água e piezômetros segue apresentando estabilização ou redução dos níveis.
- Um marco da ADME OD permanece com tendência de recalque. O monitoramento diário dos marcos segue em andamento com o apoio da ERG. Os *crack meters* (antes chamados de extensômetros) da estrutura se encontram estáveis.

Os marcos superficiais da ombreira direita do contrapilamento permaneceram sem deslocamentos significativos no mês de abril. Os *crack meters* se

- apresentaram estáveis e em seguida, ainda nesse período, foi observado um princípio de retração nas trincas.
- O monitoramento da tenda da Samarco permanece sem indicar tendências de deslocamento. Não foram identificadas anomalias no local.
- Os marcos superficiais da Pedreira Corsini começam a apresentar estabilização após as movimentações dos meses anteriores, e reitera a influência da água no avanço dos escorregamentos. Não foram identificadas variações visuais nos escorregamentos no período. A área segue isolada.
- Não houve evolução significativa na abertura das trincas no talude de Santana do Deserto no período. Foi solicitada à projetista a elaboração de um plano de monitoramento do talude durante as obras de estabilização.

### ✓ **Recomendações:**

- Realizar a recomposição das cotas de sedimento a jusante do Barramento C ainda neste período seco.
- Finalizar as análises de sensibilidade para os Barramentos B e C, considerando as cotas de sedimento a jusante obtidas com o GPR.
- Realizar testes nos sensores verticais instalados nos barramentos, de forma semelhante ao realizado nos sensores horizontais. Além disso, finalizar os testes em longos períodos nos sensores horizontais com comportamentos anômalos.
- Dar início à campanha de investigação geológico-geotécnica da ADME OD, que irá subsidiar as análises de estabilidade da estrutura.
- Elaborar o plano de monitoramento do talude de Santana do Deserto, que deverá ocorrer em concomitância com a obra de estabilização.
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

## ➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

**Nota:** Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha (abril/22), o qual não coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados e visam representar os locais quando da realização das amostragens

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

### ✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Bombeamento realizado nos dias 04, 05, 08, 13, 25 e 27/04 da Bacia 2 para a Bacia 1. Desvio pontual de turbidez nos dias 05, 08 e 13/04. Como não houve bombeamento ou vertimento deste efluente para o rio Doce, o efluente turvo ficou contido na Bacia 1.
- Saída: Ponto seco, haja vista que não houve bombeamento ou vertimento deste efluente para o rio Doce

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- A fazenda Jerônimo não foi monitorada devido a restrição de acesso imposta pelo proprietário, a qual será justificada no relatório anual, associada ao Anexo II Item 1 da LOC de Candonga.
- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA).
- Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o configura como forte indicativo de estes valores encontrados no monitoramento serem background da região
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre estas hipóteses.

✓ **Síntese conclusiva – Córrego Micaela:**

- Desvios de Cor Verdadeira (Montante e Jusante) e Manganês (Montante e Jusante).



- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
  - Desvio de Manganês (Montante e Jusante).
- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
  - Desvios de Fósforo (Jusante) e Manganês (Montante e Jusante).
  - Estes resultados não tem associação com o empreendimento haja vista não haver potencial influência no rio de Peixe.

#### ✓ Monitoramento Atmosférico

- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

#### ✓ Monitoramento Subterrâneo



*Figura 21 - Localização nascentes Pilha 1 e Pilha 2*



*Figura 22 - Nascentes 1 e 2*

✓ Conclusões / considerações finais

- A Nascente 1 apresentou desvios de Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal;
- A Nascente 2 apresentou desvios de Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal;

**Nota:** Os estudos em desenvolvimento levantarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Atividade em andamento.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal.



Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 38 pontos de monitoramento dentro da ADA.

## INDICADORES

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

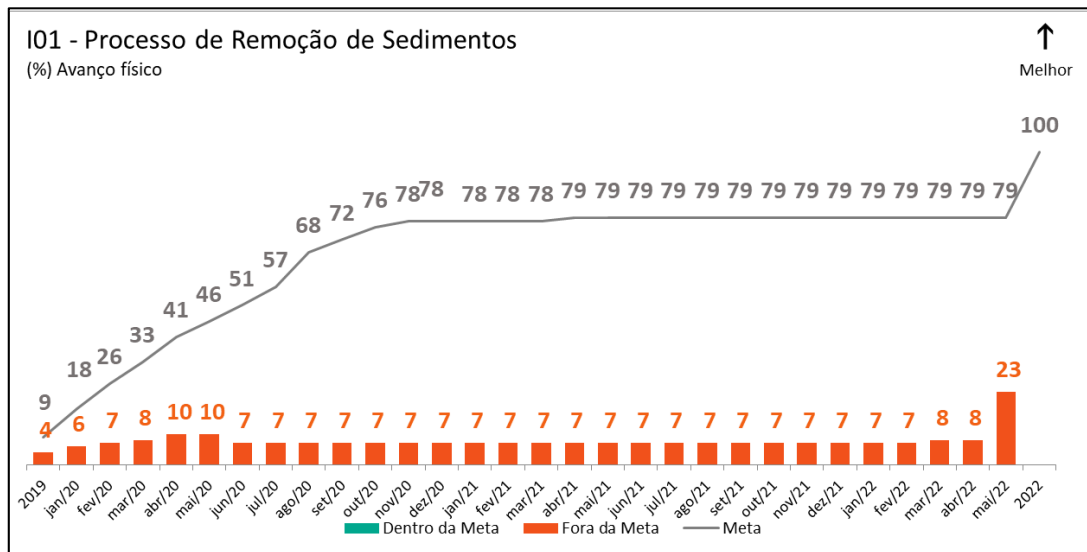


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

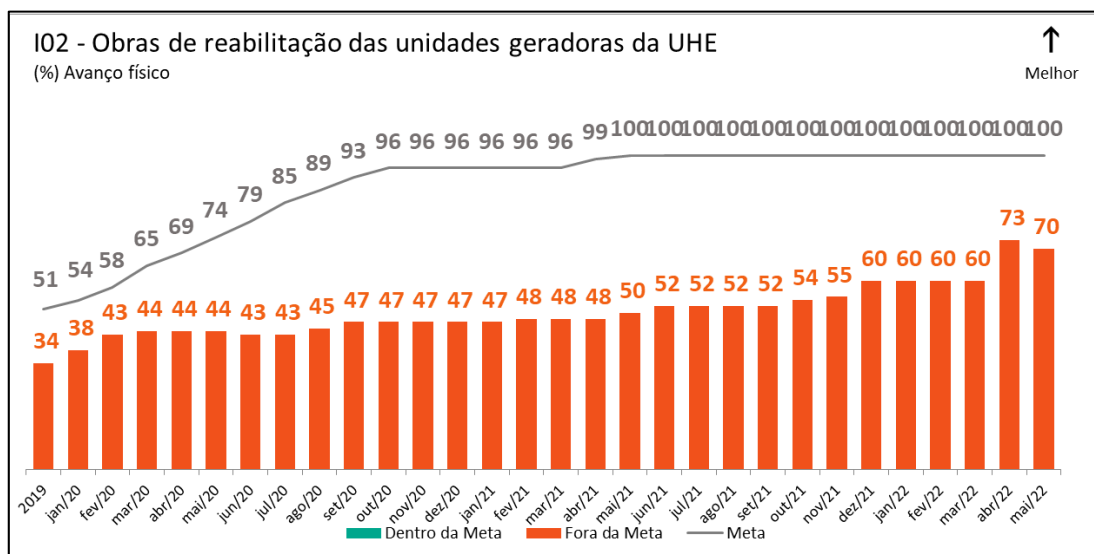


Gráfico 2 - Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

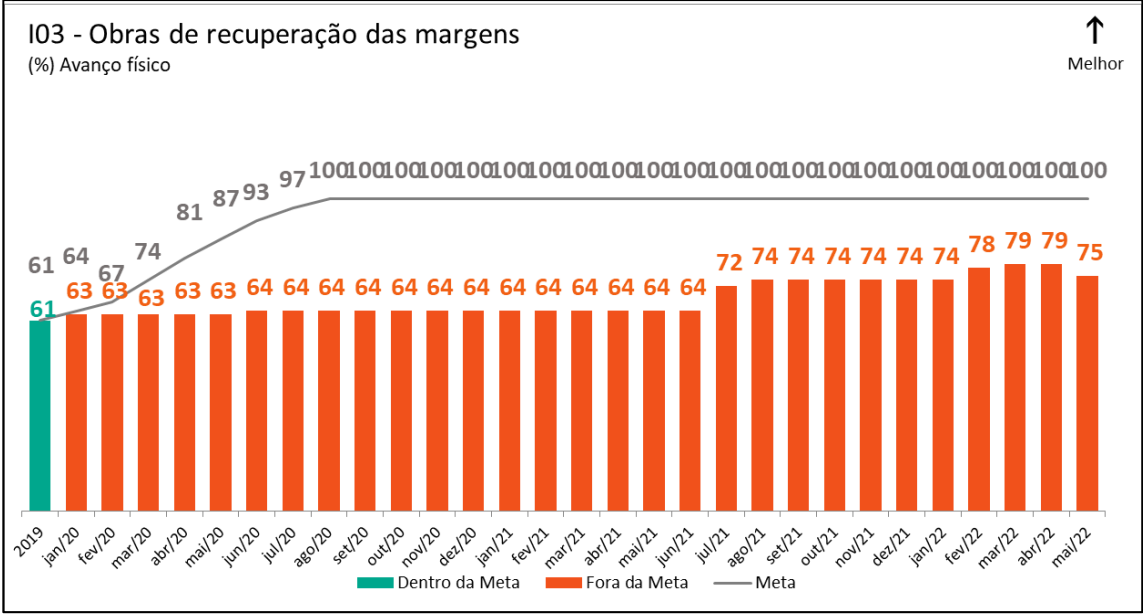


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

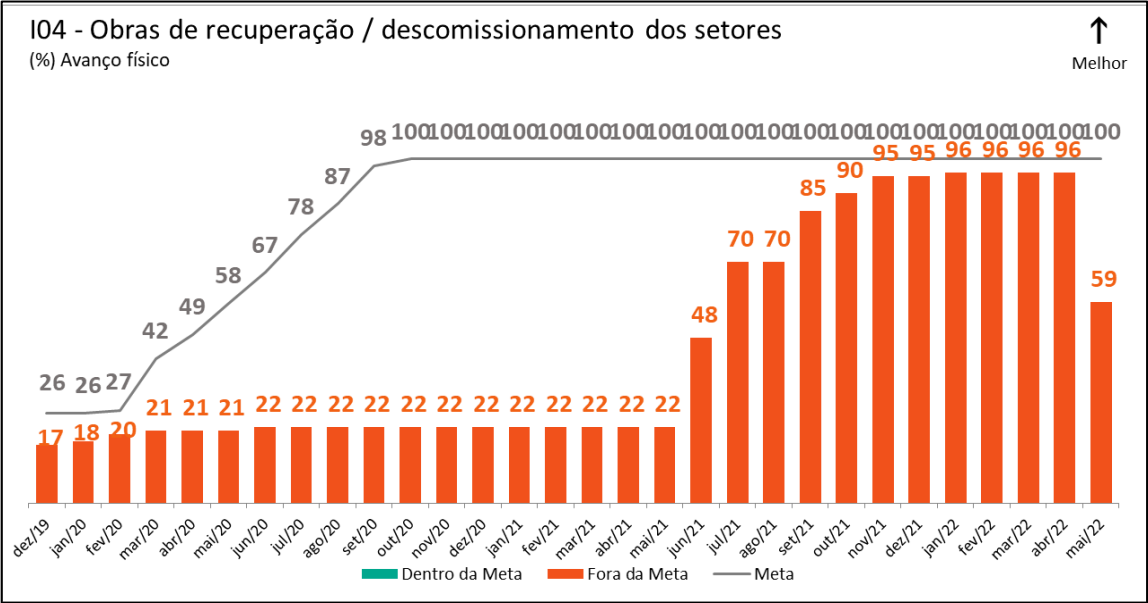


Gráfico 4 - Avanço físico das obras de reabilitação / descomissionamento

**Nota:** Indicadores compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas todas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autoriza prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina, até que seja entregue, analisado e aprovado o projeto relativo ao cenário de remoção total (Cond.2).

## **PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializado
Cláusula	82	§3º	Judicializado
Cláusula	82	Caput	Judicializado
Cláusula	84	a	Concluído Internamente
Cláusula	84	b	Em Andamento
Cláusula	84	c	Em Andamento
Cláusula	84	d	Em Andamento
Cláusula	84	e	Em Andamento
Cláusula	84	f	Em Andamento
Cláusula	84	g	Em Andamento
Cláusula	84	h	Em Andamento
Cláusula	84	i	Em Andamento
Cláusula	84	j	Em Andamento
Cláusula	84	k	Em Andamento
Cláusula	84	l	Em Andamento
Cláusula	84	m	Judicializado
Cláusula	84	n	Em Andamento
Cláusula	84	o	Em Andamento
Cláusula	84	p	Em Andamento
Cláusula	84	q	Em Andamento
Cláusula	84	r	Em Andamento
Cláusula	84	s	Concluído Internamente
Cláusula	87	Caput	Em Andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializado

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em Andamento
Deliberação	217	3	Em Andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em Andamento
Deliberação	24	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Curvina)
- setembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Passarela Campinas Barreto)
- novembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Bueno)
- novembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Tiara)
- dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Juca Ponciano)
- dezembro de 2022 ● PF0153 - Reconstrução de Pontes (Mariana) - Concluído
- dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
- dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Borba)
- dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.753 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 958 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.866 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 213 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

### **Barra Longa:**

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.



**Mariana:**

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

**Termos de entrega para Moradias e Comércio:**

**Moradias Barra Longa:**

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

**Comércio Barra Longa:**

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27 :

## **Fatos relevantes do mês**

Talude das Complexas - Início das atividades em campo;

Talude das Complexas - conclusão da D035

Manutenção em 46,50 Km de vias não pavimentadas;

Início das obras nas pontes Tiara e Curvinas;

Bens Públicos Ponte do Gama - início da supressão vegetal;

## Indicadores

### I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)

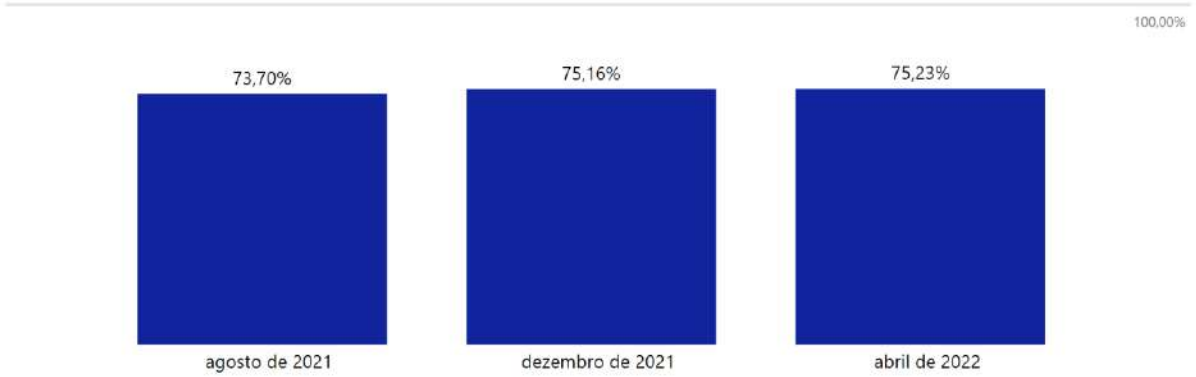


Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

### I02 – Obras entregues – Temporal

Percentual(%)

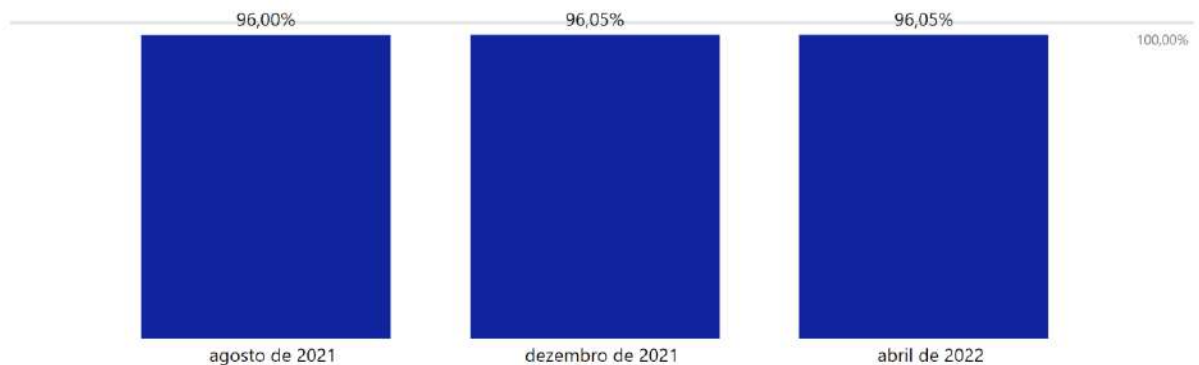


Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

## Indicadores

### I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)

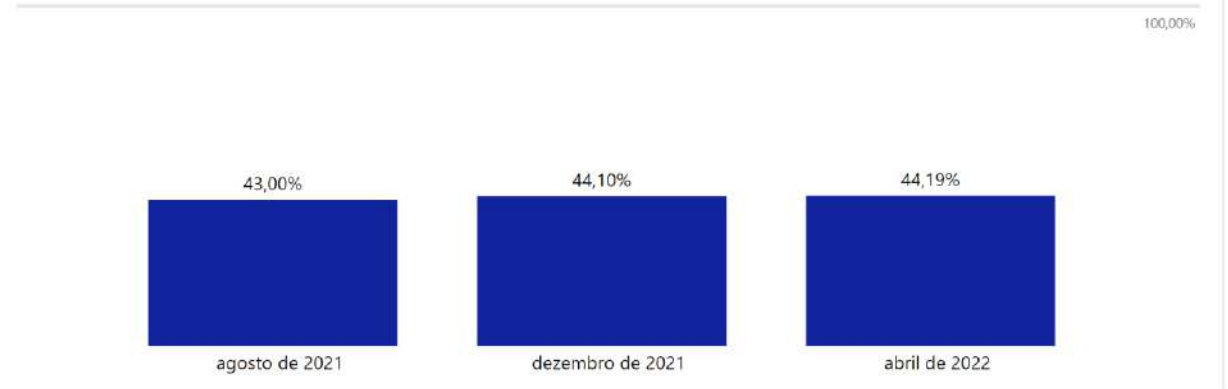


Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

### I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Percentual(%)

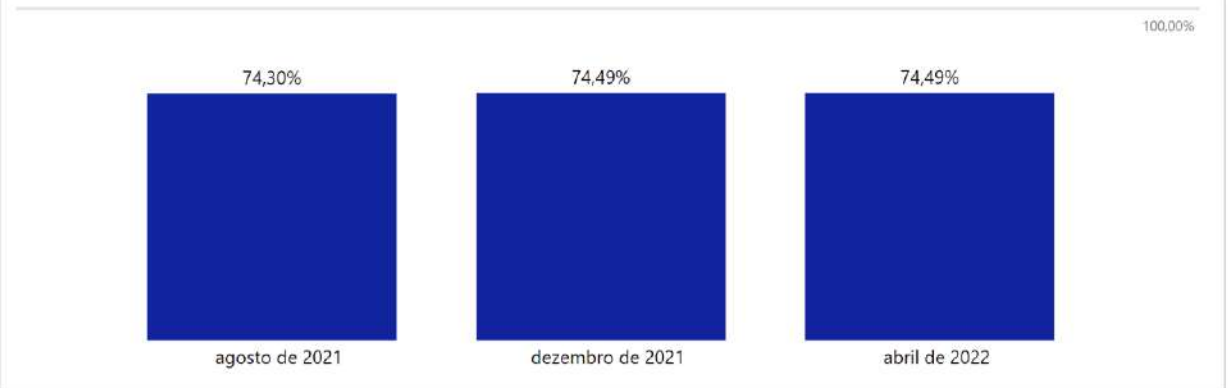


Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

## **PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Em Andamento
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022



● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.



## **Fatos relevantes do mês**

Finalizadas as visitas dos alunos da escola de Bento Rodrigues à nova escola - VimVer. Durante os meses de abr22 e mai22, 139 crianças foram apresentadas ao novo espaço e tiveram oportunidade de conhecer como a escola ficará após a equipagem validada pela Secretaria de Educação.

Realização da Festa da Família da comunidade escolar de Bento Rodrigues, na nova escola do Reassentamento. Cerca de 280 pessoas participaram do evento, que contou com apresentações das turmas da educação infantil e anos iniciais. Para alunos dos anos finais, foram realizadas oficinas de grafite e lettering.

## Indicadores

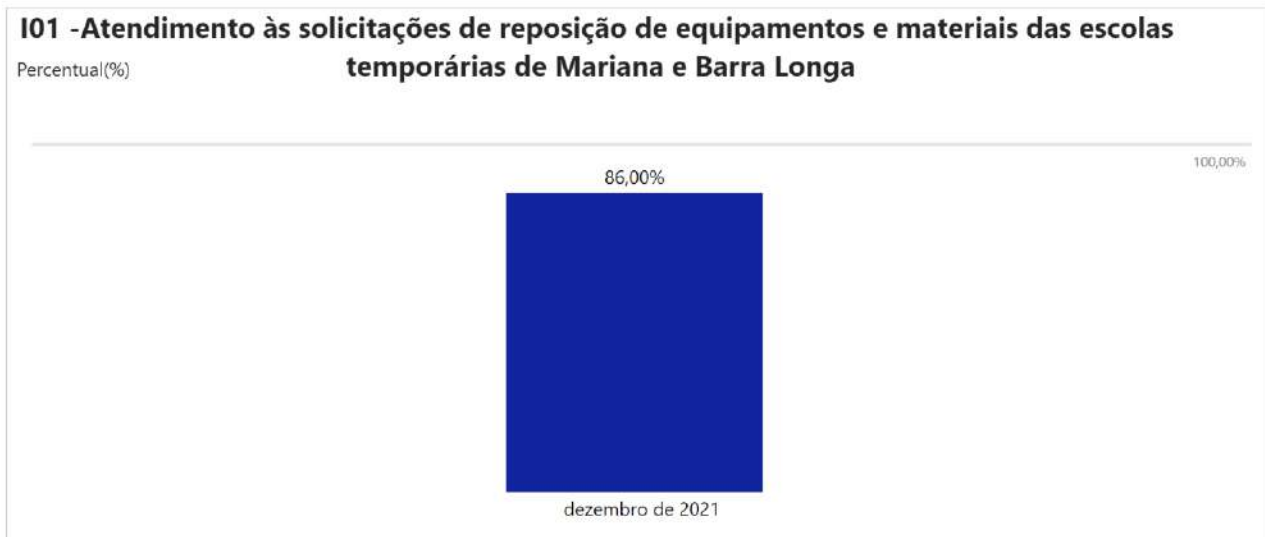


Gráfico 1: I01 -Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

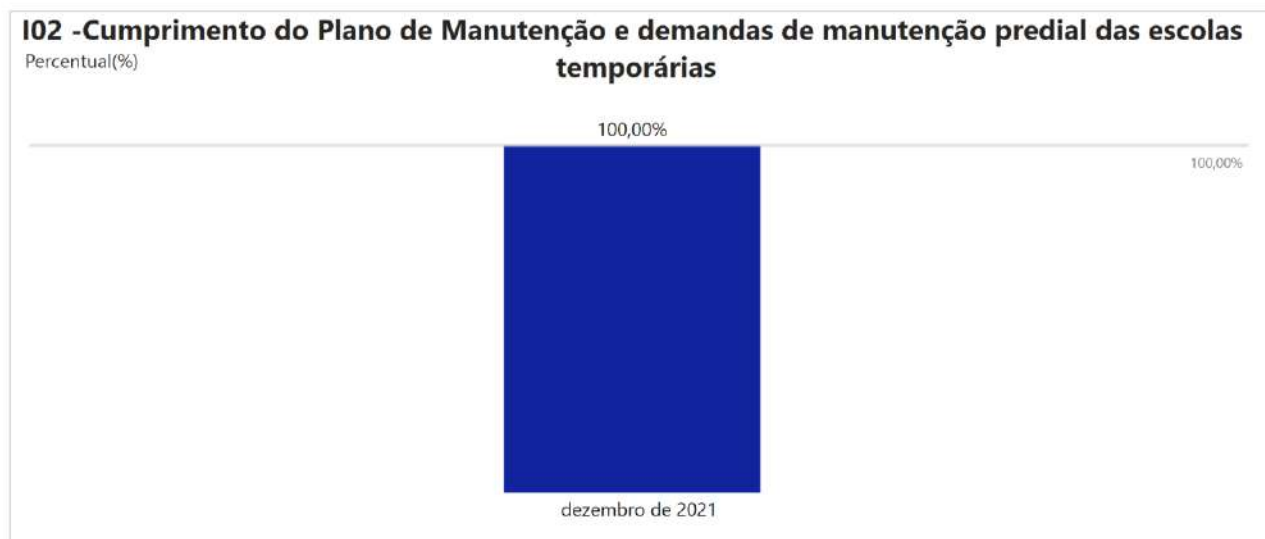


Gráfico 2: I02 -Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

## Indicadores

### I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Percentual(%)

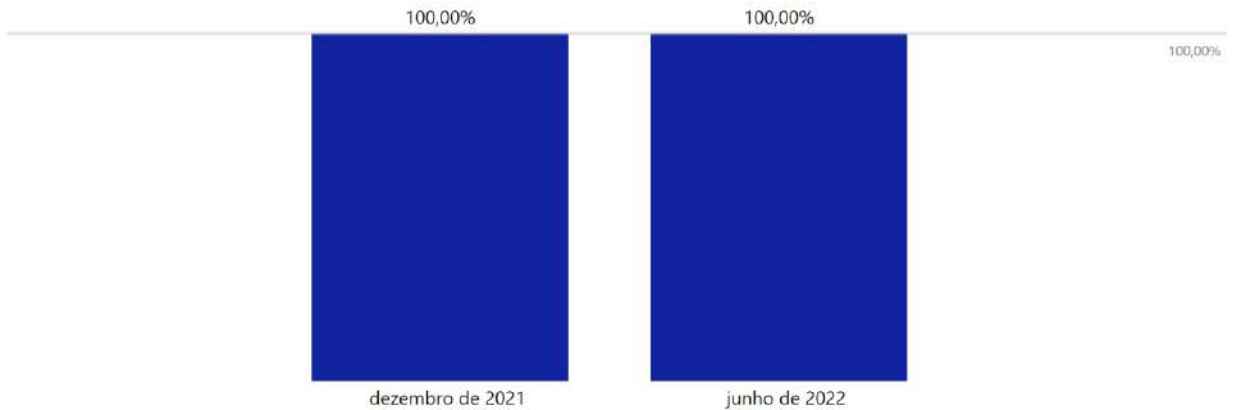


Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

### I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Percentual(%)

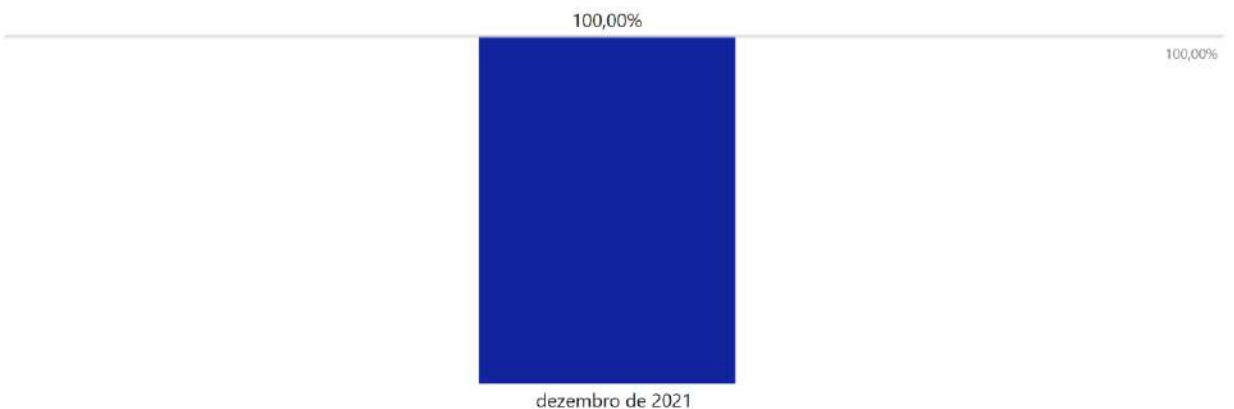


Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

## Indicadores

### I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

### I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Percentual(%)




Gráfico 6: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

## Indicadores

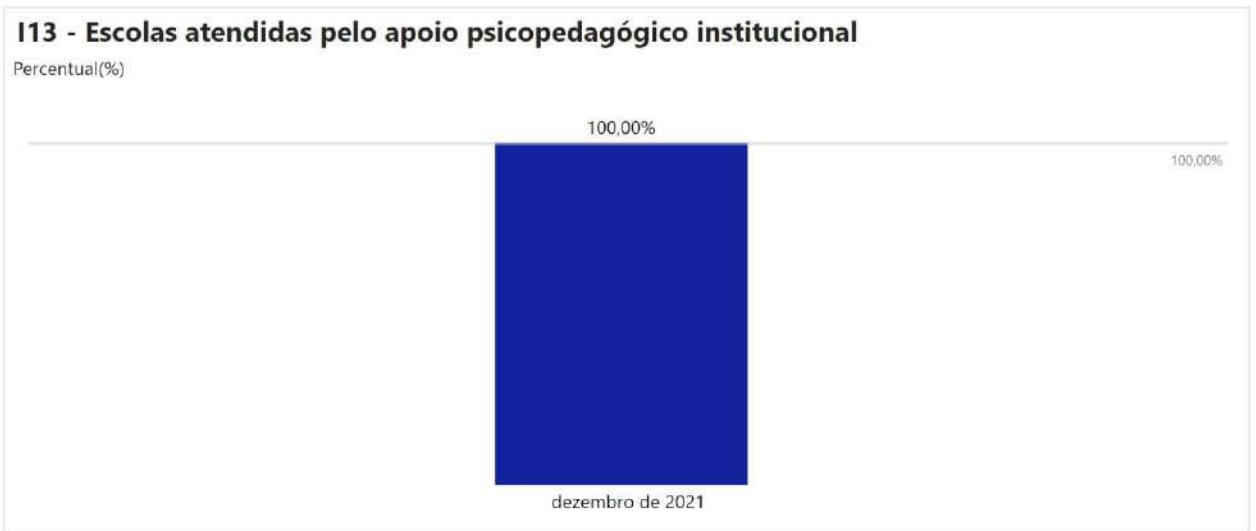


Gráfico 7: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

## **PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Em Andamento
Cláusula	97	caput	Em Andamento
Cláusula	98	a	Em Andamento
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	3	Planejado



## Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2022 ● Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
- dezembro de 2022 ● Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica
- dezembro de 2022 ● Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades<sup>1</sup>
- dezembro de 2022 ● Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
- dezembro de 2022 ● Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingidas

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Encerramento das inscrições para a segunda edição do Edital Doce: 76 propostas inscritas para a modalidade 3 (Reparação das Referências Culturais). Este instrumento garante a finalização do cumprimento da cláusula 99 do TTAC.

## **Indicadores**

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

O detalhamento dos indicadores, com a ficha daqueles consensuados, está em processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.

## **PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	caput	Concluído Internamente
Cláusula	102	caput	Concluído Internamente
Cláusula	103	caput	Em Andamento
Cláusula	104	a	Em Andamento
Cláusula	104	b	Concluído Internamente
Cláusula	104	c	Em Andamento
Cláusula	104	d	Em Andamento
Cláusula	104	e	Planejado
Cláusula	104	f	Planejado
Cláusula	104	g	Planejado
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em Andamento
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- agosto de 2022 ● Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
- setembro de 2022 ● Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
- novembro de 2022 ● Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo
- dezembro de 2022 ● Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas
- dezembro de 2022 ● Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
- dezembro de 2022 ● Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
- dezembro de 2022 ● Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## Fatos relevantes do mês

Realização do Primeiro Seminário do Arranjo Produtivo Local de Turismo da Foz, com a participação de 42 representantes das comunidades da Foz, entre empresários do setor de turismo, lideranças locais, artesãos e interessados no tema. Trata-se de uma ação estruturante definida pela EGL e representa um avanço na construção do Arranjo Produtivo Local de turismo.

Finalização do Projeto de Fortalecimento Institucional da Cultura e Esporte – FICE, com o encerramento dos módulos de capacitação dos gestores públicos da temática de Cultura e Esporte, e a elaboração por esses gestores de projetos de para a captação de recursos para fomento dessas temáticas nos municípios. Medição dos indicadores I08 (Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos) e I08.1 (Percentual de implementação do plano de Fortalecimento institucional para a Cultura e para o Esporte).

Encerramento das Inscrições para a segunda edição do Edital Doce: 808 propostas inscritas para a modalidade 1 (projetos sociais de promoção de cultura, esporte, cultura e lazer) e 121 para a modalidade 2 (reparação do lazer). O Edital é uma importante ferramenta de apoio ao atingidos no desenvolvimento de projetos e ações no território e no caso da modalidade 2, está diretamente vinculada à cláusula 104d, relativa à reparação às perdas do ambiente de lazer. Total de propostas nas modalidades do PG13: 929.

## Indicadores

### I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

### I04 - Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Percentual(%)

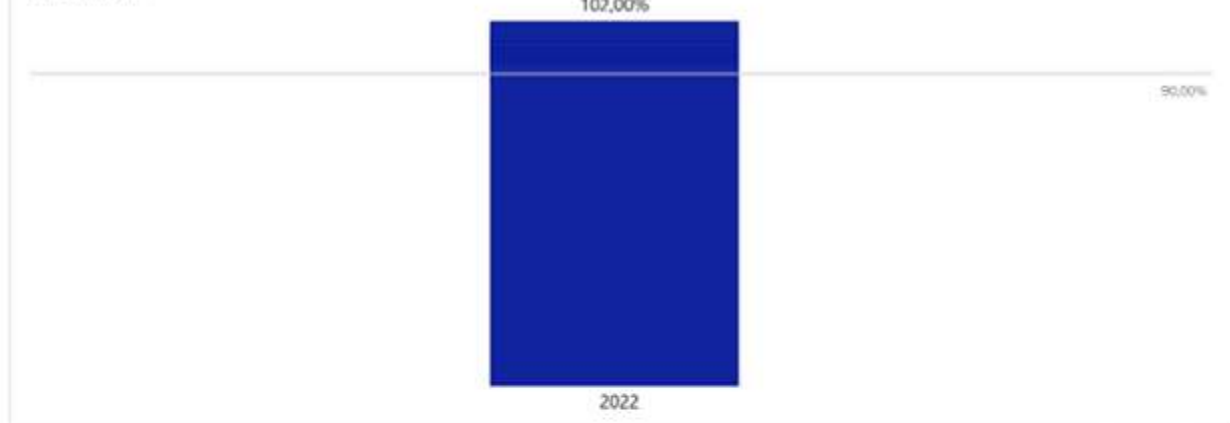


Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

## Indicadores

### I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Percentual(%)

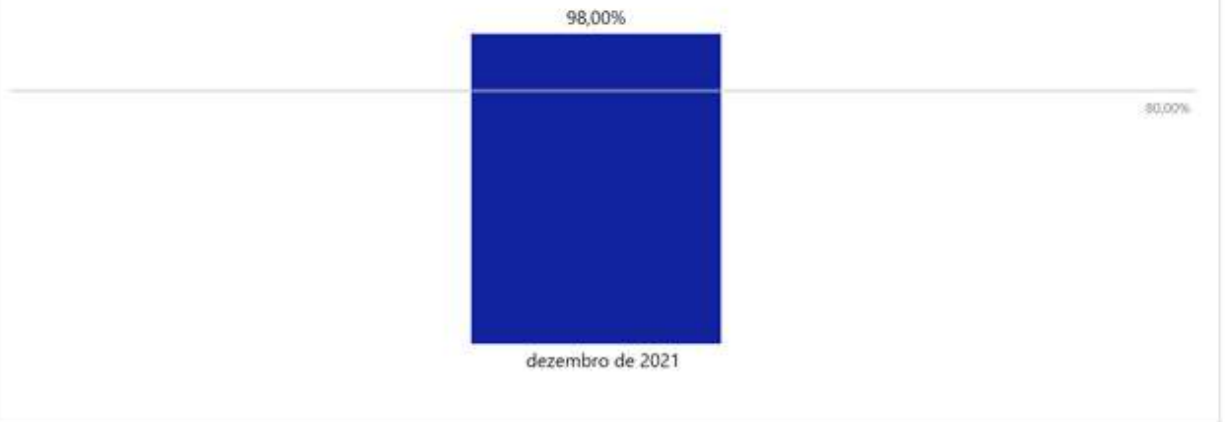


Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

### I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Percentual(%)

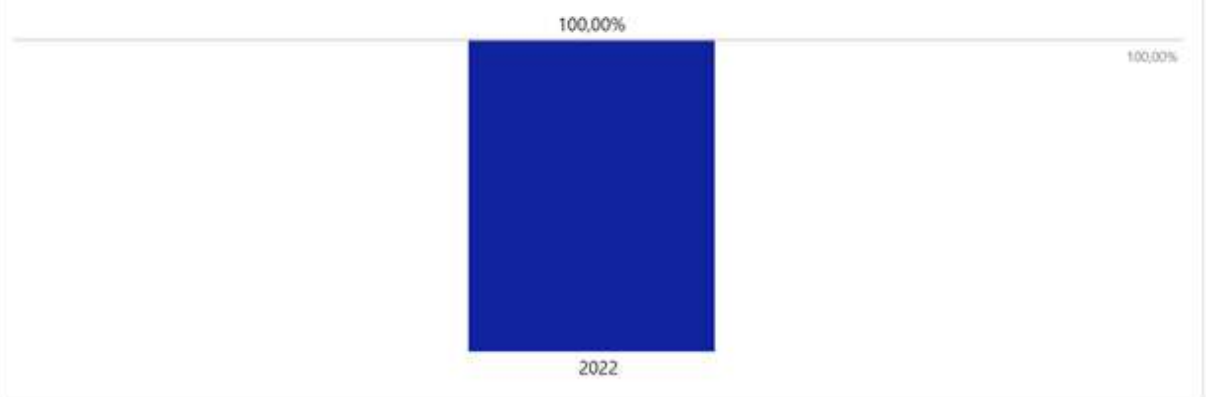


Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

As metas de execução são anuais.

## Indicadores

### I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Percentual(%)

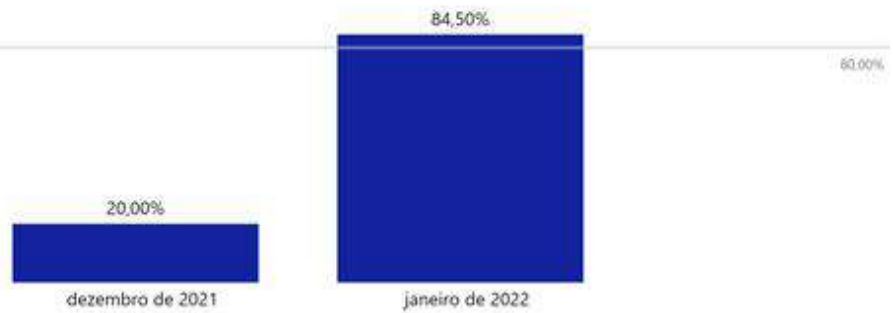


Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para conclusão do mesmo.

## **PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC. \*

\* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo ("CIF") nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 ("TTAC") e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.







## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Concluído Internamente
Deliberação	416	4	Concluído Internamente
Deliberação	434	1	Judicializado
Deliberação	435	1	Judicializado
Deliberação	436	1	Judicializado
Deliberação	452	2	Judicializado
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializado
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	73	1	Em Andamento



## Entregas do ano de 2022

- março de 2022  Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
- junho de 2022  Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
- agosto de 2022  Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
- setembro de 2022  Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 7º Repasse financeiro para contratação de RH e Conclusão dos repasses financeiros de RH para o município de Barra Longa
- outubro de 2022  Finalização das Área temáticas de capacitação dos profissionais do SUS
- dezembro de 2022  Acompanhamento do plano de Mariana – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## Grandes números do programa\*

- 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG ( 34 **profissionais**) e Barra Longa/MG ( 14 **profissionais**).

\* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

## Fatos relevantes do mês

### Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

No relatório semestral apresentado pelo Município, referente ao período de outubro/21 a abril/22, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 4.709 consultas (média de 784 por mês) e 1059 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para testes COVID-19, entre outros (média de 176 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

No relatório supracitado, a Secretaria de Saúde relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com o valor de R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.



## Fatos relevantes do mês

### Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

## **Fatos relevantes do mês**

Finalização da capacitação "Levantamento do Histórico Completo de Exposição por Metais" para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

Apresentação à Sala de Situação/Fundação Renova de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

## **Indicadores**

Os indicadores do programa estão em revisão

## **PG015 Promoção da Inovação**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- 
- fevereiro de 2022 ● Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das pesquisas mineiras da Chamada 09/2018
  - junho de 2022 ● Finalização do Hub de Inovação em Mariana - Rodada I
  - dezembro de 2022 ● Finalização do Rio Doce Digital (Empreende Rio Doce Rodada I Mariana)
  - dezembro de 2022 ● Celebração dos Convênios dos projetos selecionados da Chamada Agroecologia MG
  - dezembro de 2022 ● Celebração dos Convênios dos projetos selecionados da Chamada Agroecologia ES

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## Indicadores

### I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Número

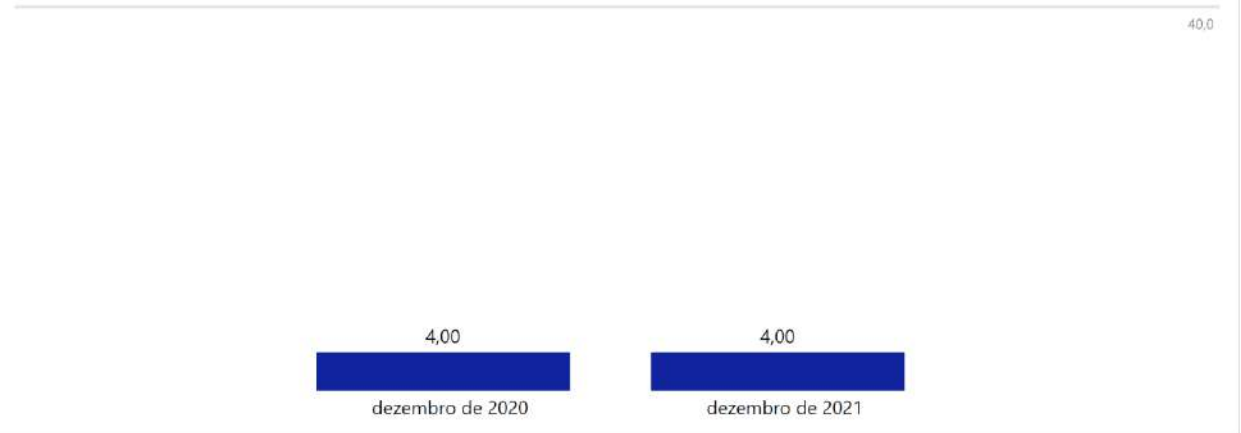


Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

Não houve avanço do indicador no período, valor refere-se ao acumulado do programa.

### I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Não houve avanço do indicador no período, valor refere-se ao acumulado do programa.

## Indicadores

### I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Percentual(%)

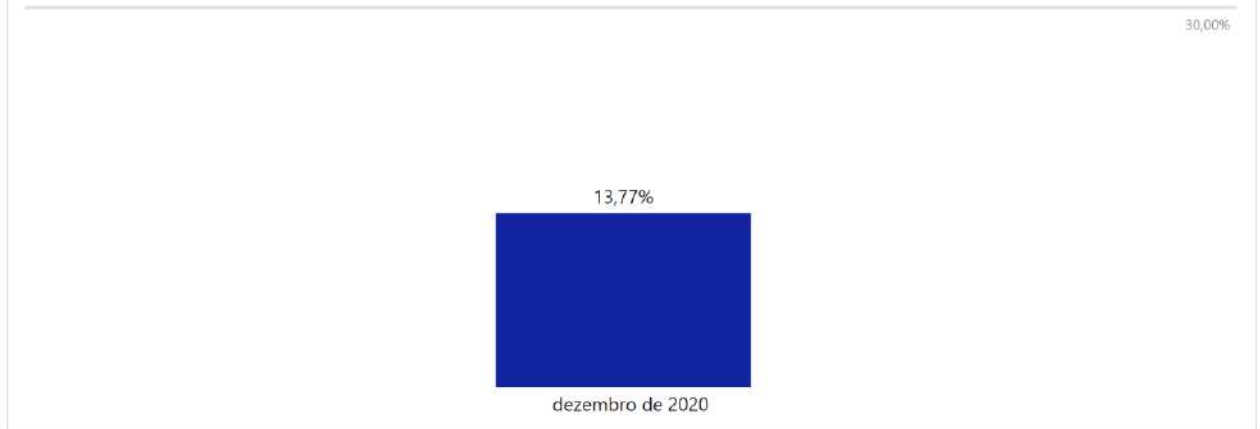


Gráfico 3:I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor atualizado e auditado passa a ser de 13,77%. Este valor será reportado até novo período de medição do indicador.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero

## **PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**

### **Eixo Pessoas e comunidade**

#### **Objetivo**


Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

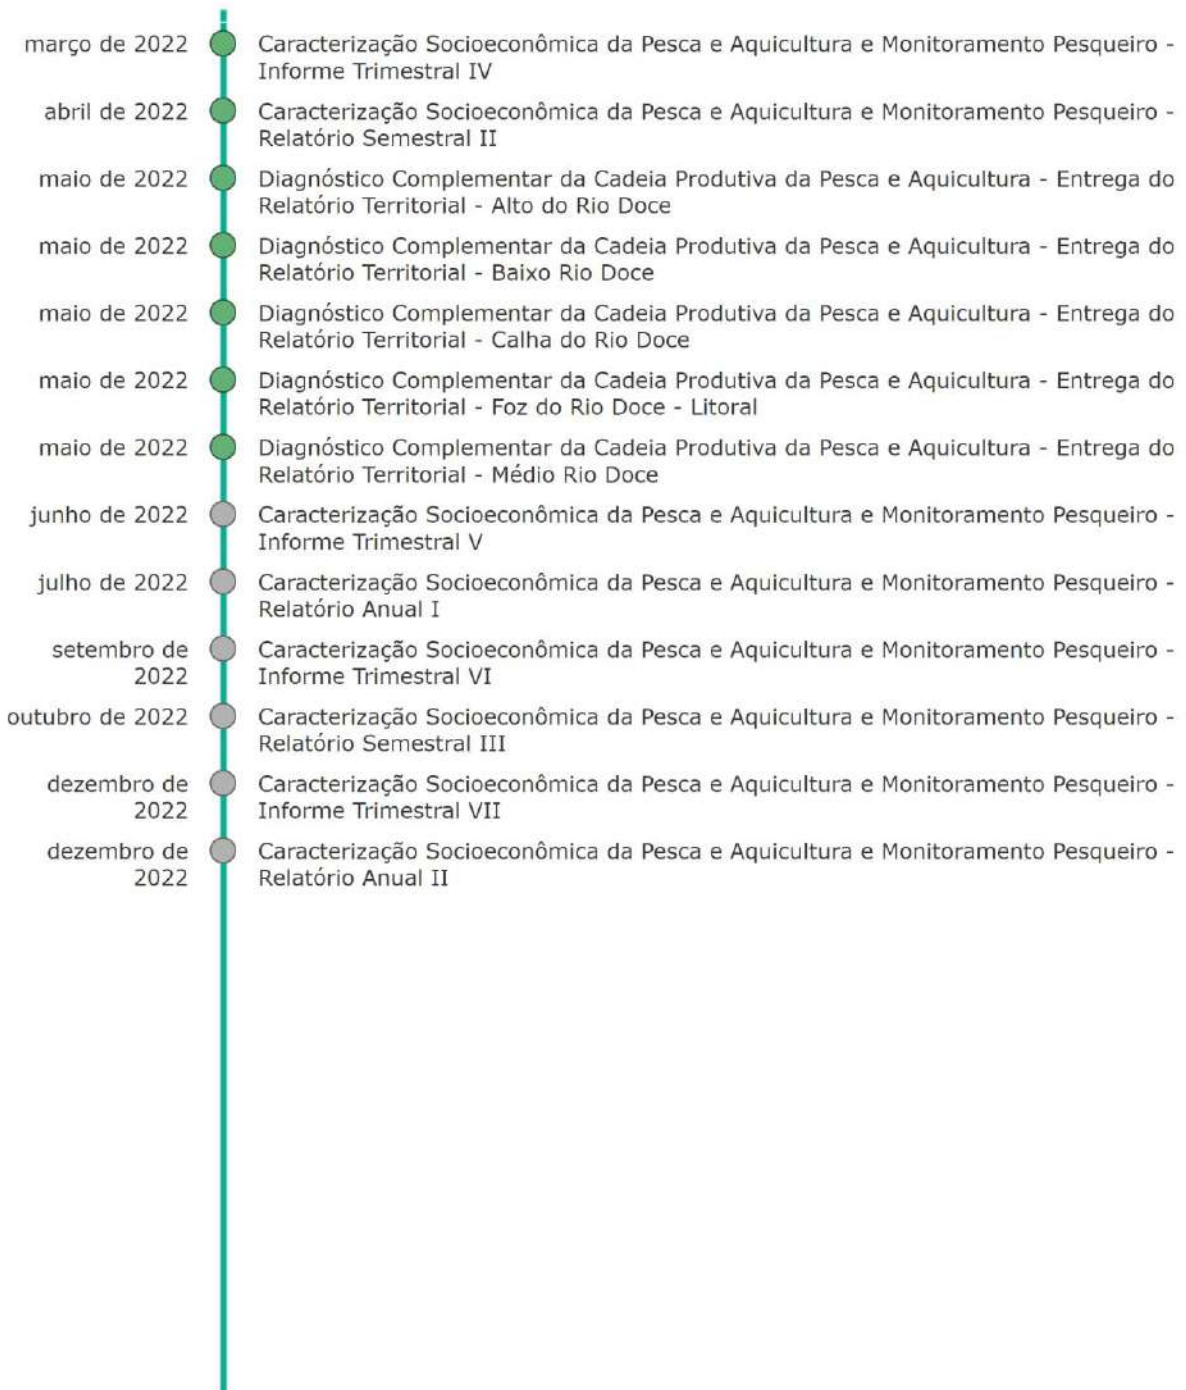

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades:
  - 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientes nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
  - 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro:
  - 8880 formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
  - 4 Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES;
  - 2 Relatórios Semestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

### Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
  - 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 162 pessoas beneficiadas;
  - 7 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
  - 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
  - 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.
- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
  - 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
  - 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
  - 4 associações beneficiadas:
    - 30 ASPERDOCE ( Rio Doce )
    - 77 ASPIPEC ( Pedra Corrida )
    - 38 APIGUA ( Gauze )
    - 52 APAP ( Povoação );
  - 2 associações formalizadas em MG ( ASPIPEC e ASPERDOCE );
  - 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação ( ASPERDOCE e ASPIPEC );
  - 4 Planos de negócio entregues.
- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado:
  - 3090 Entrevistas realizadas para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais.

## **Fatos relevantes do mês**

Retomada da montagem do sistema de aquaponia na APAP, em Povoação.

Início da execução da 1ª fase da Micro Estação Fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência.

Conclusão de 5 relatórios territoriais do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca.

## Indicadores

#	INDICADOR	META	PRAZO	MÉTODO DE MEDIÇÃO
I01	Percentual de pescadores (as) e aquicultores (as) elegíveis contemplados nas ações de fomento de apoio a grupos produtivos	100%	jul/25	O indicador será medido considerando o público regularizado, devidamente comprovado por documentação. A coleta do parâmetro será o consolidado de pescadores e aquicultores elegíveis ao Programa da Pesca que inscreveram projetos por meio das ações de fomento de apoio a grupos produtivos ofertados pelo programa e que foram aprovados e contemplados com recursos financeiros. Será considerado o público beneficiado pelas ações e que estão vinculados a Grupos Produtivos Formais de Pesca e Aquicultura.
I02	Percentual de pescadores(as) e aquicultores(as) atendidos pela assessoria e assistência técnica de ATER	100%	jul/25	O indicador será medido considerando o público regularizado devidamente comprovado por documentação. A coleta será feita a partir da relação de pescadores e aquicultores elegíveis ao Programa da Pesca que assinaram o Termo de Aceite para ATER. Serão considerados na amostra apenas o público-alvo aderente ao projeto, devendo ser desconsiderado da amostra os pescadores (as) e aquicultores (as) que desistiram do projeto e formalizaram a desistência por meio de contato telefônico, e-mail, carta, ou ainda pela ausência em reunião de acompanhamento, frequência do curso de capacitação inferior a 75%, ou por solicitação de paralisação de atendimento formal.
I03	Percentual de areeiros elegíveis com quitação definitiva	100%	ago/25	O indicador será medido considerando o público regularizado devidamente comprovado por documentação. A coleta será feita na Base de dados do SGS relacionando os areeiros cadastrados e elegíveis ao Programa da Pesca que assinaram o Termo de Quitação Definitiva de Danos e foram indenizados

Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI.

## **PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

### Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado
Cláusula	74	c	Em Andamento
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
- dezembro de 2022 ● Término dos contratos de aluguel de pastagem

## Grandes números do programa

### Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.962,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 14.782,5 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 137 propriedades;
- 459 barraginhas realizadas;
- 903 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.371 hectares de reestruturação produtiva executados.



- Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

### **Médio Rio Doce**

- 6.256 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 12.961 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 51.990 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.917 toneladas no mês.

## **Baixo Rio Doce**

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 5.713 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 216 toneladas no mês.

## Parcerias

- 43 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 26 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

## Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
ALTO DOCE: Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores impactados no mês.		0 As entregas de silagem no ARD já se encerraram.

## Fatos relevantes do mês

### **Baixo Rio Doce**

Realizada oficina de Fertilidade do Solo e Nutrição das Plantas em Colatina- ES.

### **Médio Rio Doce**

Ministrado Curso sobre Recuperação de Pastagem para produtores de Conselheiro Pena – MG pela EMATER.

Realizado Curso de Melhoramento Genético em Tumiritinga, o primeiro curso presencial para os produtores rurais pós pandemia.

## Indicadores

### I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)

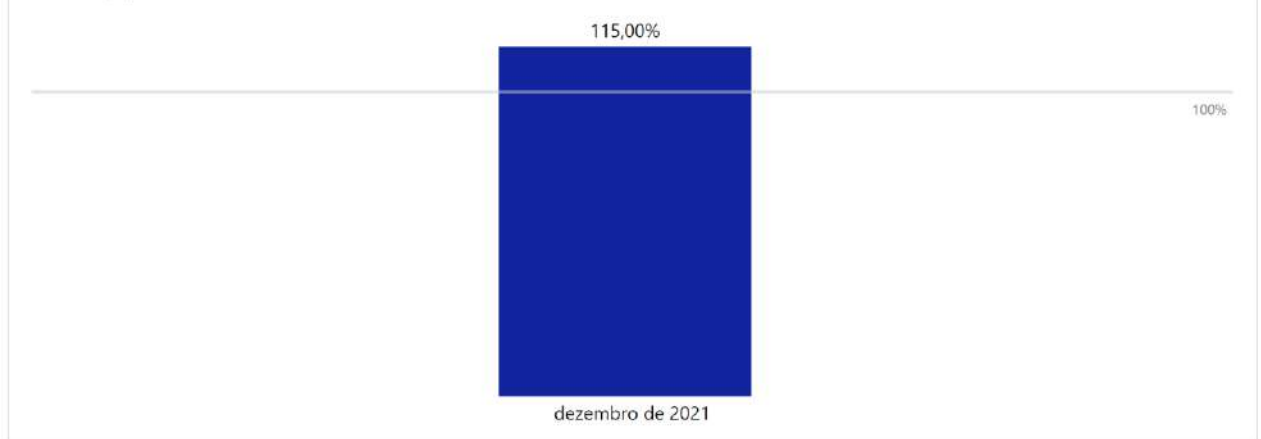


Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

### I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Percentual(%)

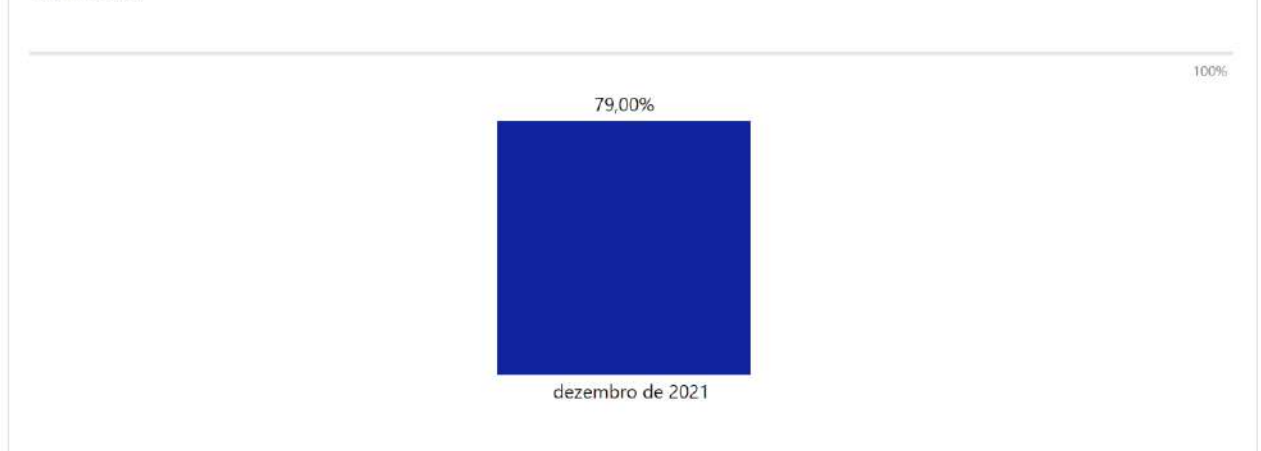


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>FÓRMULA DE CÁLCULO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
<b>I3</b>	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais à montante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
<b>I4</b>	Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais à montante de Candonga	Nº de produtores com ISA maior ou igual a 0,7 / nº de produtores participantes do Programa	%
<b>I5</b>	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Individuais) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
<b>I6</b>	Taxa de Assistência Técnica a Produtores Rurais (Coletivas) à jusante de Candonga	Número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / número de famílias atendidas	h/ano
<b>I7</b>	Reparação e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área à jusante de Candonga	Nº de áreas produtivas reparadas e ou adequadas / Total de unidade de área necessário para reparação e ou adequação	%
<b>I8</b>	Reconstrução e/ou Reforma de Equipamentos danificados (Sistemas de Irrigação) à jusante de Candonga	(Quantitativo de benfeitorias construídas/instaladas) / (Quantitativo de benfeitorias danificadas ou destruídas para adequação)	%

## **PG018    Desenvolvimento    e    Diversificação Econômica**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**


Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	343	1,4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente
Deliberação	503	3	Reprogramado
Deliberação	589	2	Planejado

## Entregas do ano de 2022

- 
- maio de 2022 ● Entrega das Colméias - Cadeia da Meliponicultura
  - julho de 2022 ● Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial
  - julho de 2022 ● Repasse Recursos para o BDMG - Fundo Diversifica Mariana
  - agosto de 2022 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Baixa Verde / Dionisio
  - dezembro de 2022 ● Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes números do programa

### Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 65,18 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 54 milhões foram **desembolsados** para 1589 contratos e 1192 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 12 milhões foram **desembolsados** para 438 contratos e 410 empresas.

### Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

### Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

*Ref. Abril/2022*

## **Fatos relevantes do mês**

Projeto agroecológico do ES – Conclusão da primeira etapa da obra no assentamento Valdício Barbosa em Conceição da Barra.

Entrega de 100 colmeias para as famílias participantes do projeto Cadeia Produtiva da Meliponicultura

Apresentação e início das atividades do projeto Microcrédito - Banco Comunitário na comunidade de Baixa Verde, município de Dionísio.

- Projeto agroecológico do ES – Conclusão da Unidade de Beneficiamento de Pimenta do Reino em São Mateus

## Indicadores

### I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

### I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Percentual(%)

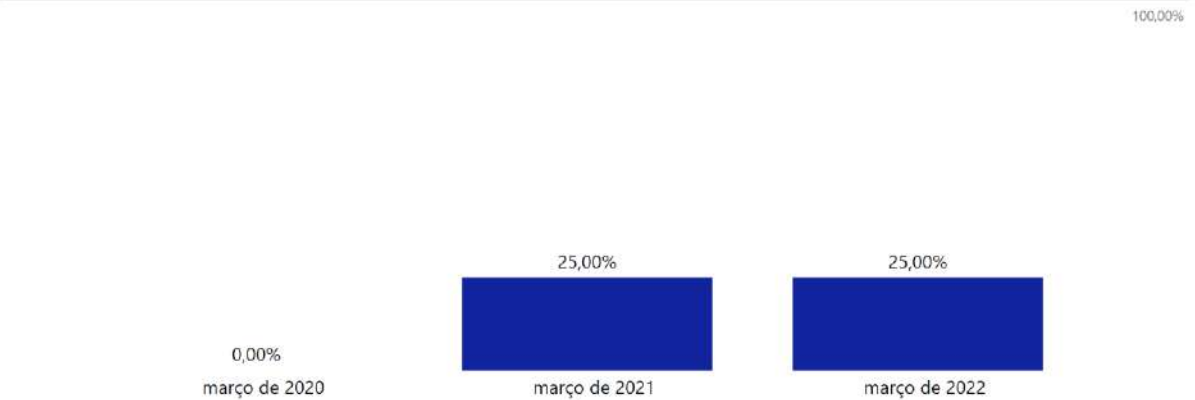


Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

## Indicadores

### I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

### I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Percentual(%)

90,00%

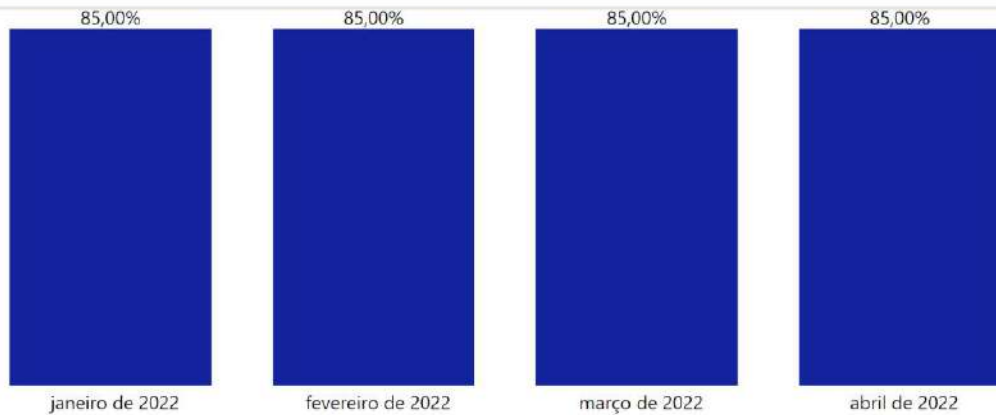


Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

## Indicadores

### I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Atendimentos




Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

### I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Atendimentos



Gráfico 6: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

## **PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em Andamento
Cláusula	133	Caput	Em Andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- junho de 2022 ● Finalização - assessoria técnica e implementação de melhorias para 40 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação.
- julho de 2022 ● Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 50 negócios atingidos
- julho de 2022 ● Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 50 negócios.
- agosto de 2022 ● Finalização de assessoria técnica para 30 negócios impactados nos Reassentamentos e ARD.
- outubro de 2022 ● Finalização da fase 1 do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação
- novembro de 2022 ● Finalização - Reposição de insumos e equipamentos para 10 negócios impactados no Alto Rio Doce
- dezembro de 2022 ● Finalização de atendimentos de 120 negócios pelo PG-19
- dezembro de 2022 ● Finalização dos atendimentos de assessoria técnica para 10 negócios em Empreendedorismo Jovem do Reassentamento
- dezembro de 2022 ● Reposição de insumos e equipamentos para 10 negócios impactados no Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

840 atendimentos realizados a 414 micro e pequenos negócios, por meio de 603 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 16 locações de espaços comerciais, 215 reposições de insumos e equipamentos e 6 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

## **Fatos relevantes do mês**

Lançamento do Projeto Rio Doce Doce Mar em Regência/ES em maio de 22.

Lançamento do Projeto Rio Doce Doce Mar em Povoação/ES em maio de 22.

## Indicadores

### I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Percentual(%)

100,00%

11,40%

dezembro de 2021

Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

Foram 30 atendimentos encerrados de 263 elegíveis.

### I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Percentual(%)

100,00%

26,31%

dezembro de 2021

Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Foram 30 atendimentos encerrados de 114 elegíveis.

## Indicadores

### I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Percentual(%)

100,00%

15,91%

dezembro de 2021

Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

Foram 60 atendimentos encerrados de 377 elegíveis.

## **PG020 Estímulo à Contratação Local**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- agosto de 2022 ● Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF- Planejamento 2022)
- agosto de 2022 ● Conclusão das capacitações de preparação para o Mercado de Trabalho (Recoloca Rio Doce)

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado

## Grandes Números

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.335 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.208 **reprovadas** e 2.617 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 172 **turmas, abertas** 4.824 **vagas**, 4.148 **pessoas matriculadas**, 2.211 **concluintes**, 311 **reprovadas** e 1.390 **evadidos**.
- **R\$ 2.260.325** de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

### Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de vagas foram abertas nos cursos de qualificação presencial	4.824	Memória de cálculo Vagas abertas= SENAI (Iniciaram) + Workshop (listas)
Número de pessoas matriculadas nos cursos de qualificação presencial	4.148	Memória de cálculo Matriculados= SENAI (Iniciaram) + Workshop (Inscritos)
Número de concluintes nos cursos de qualificação presencial	2.211	Memória de cálculo Concluintes= SENAI (Formaram)+ Workshop (listas)
Número de evadidos nos cursos de qualificação presencial	1.390	Memória de cálculo Evadidos= SENAI (Formaram)+ Workshop (Inscritos)
Número de reprovados nos cursos de qualificação presencial	311	Sem reprovados neste ciclo, mantendo o número em 311.
Número de turmas ofertadas nos cursos de qualificação presencial	172	Memória de cálculo Turmas ofertadas= SENAI (Iniciaram) + Workshop (listas de presença)

## Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o mercado de trabalho:

RECOLOCA: Foram realizados sete eventos no mês de maio com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana, Barra Longa, Santa Cruz, Governador Valadares, Antônio Pereira e Ponte do Gama distrito de Mariana. Onde foram ofertadas 318 vagas, 235 inscritos e 202 participantes.

SENAI: No mês de maio iniciamos duas turmas de capacitação profissional uma em Mariana (Eletricista Industrial) e outra em Ipatinga (Montador de Andaime), no total foram ofertadas 50 vagas e tivemos 35 alunos matriculados.

Desenvolvimento de Fornecedores:

Realizada no mês de maio, as palestras e seminários com os seguintes temas: "SST e Responsabilidade Social" e "Gestão de Pessoas" para as 18 empresas participantes da 2º turma do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores | PDF, do Espírito Santo.

Contratação Local:

Realizada a contratação de 168 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 124 contratações locais e 44 contratações não locais. Dessas 168 contratações, 119 profissionais são de Minas Gerais, 41 do Espírito Santo e 08 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 438 currículos e prospectadas 313 vagas de emprego no mês. No acumulado, 4.311 currículos estão cadastrados e 4.073 vagas já foram captadas.

Realizado nos dias 18 e 19/05 o cadastramento de fornecedores nas comunidades de Regência e Povoação no Espírito Santo. Ação viabilizada com o objetivo de orientar e tirar dúvidas dos empreendedores e negócios locais sobre o cadastramento para se tonar fornecedores ou subfornecedores da Fundação Renova.

Resultados:

- 47 empresas cadastradas em Regência
- 16 empresas cadastradas em Povoação

## Indicadores

### I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual(%)

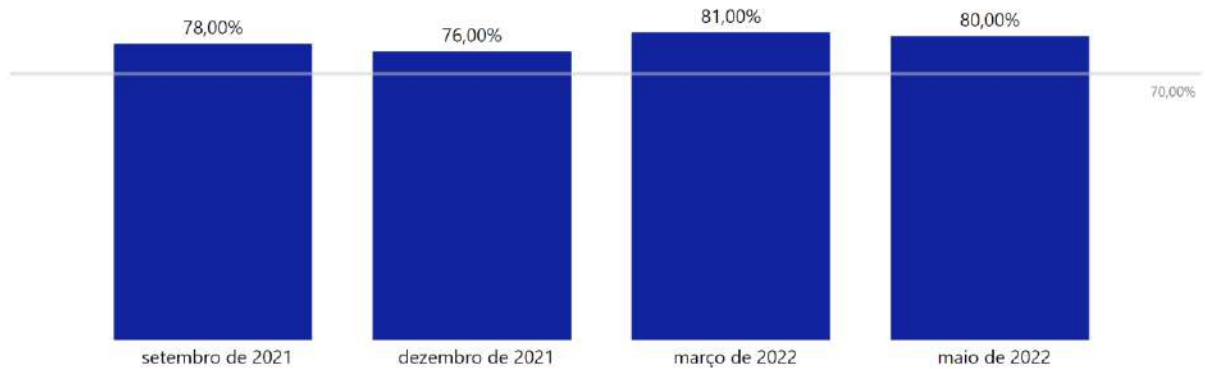


Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

### I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

## Indicadores

### I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual(%)

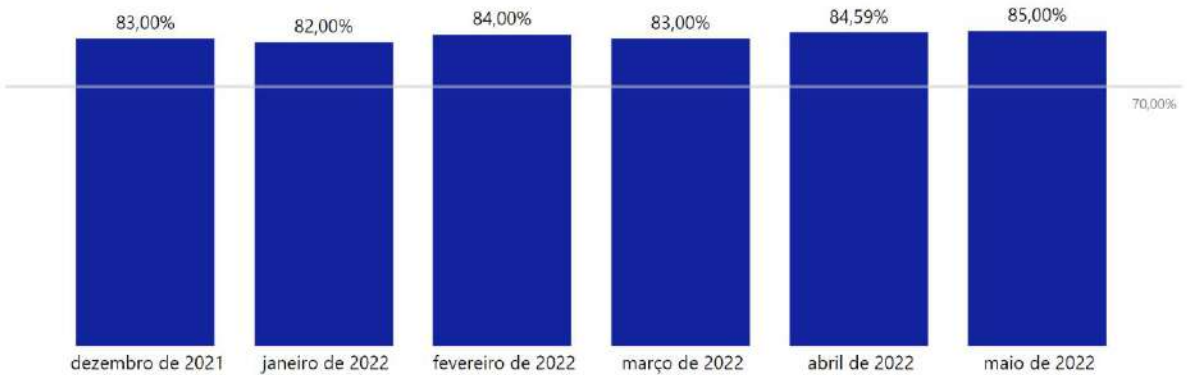


Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

### I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal

## Indicadores

### 105 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Quantidade

4.000




Gráfico 5: 105 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

### IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadualna área de atuação da Renova

Percentual(%)

50,00%




Gráfico 6: IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadualna área de atuação da Renova - Frequência Mensal

Memória de Cálculo

Total de Imposto Retido em Municípios Atingidos R\$ 5.95.984,31/ Total de Imposto Retido R\$ 6.050.622,09

## **PG021 Auxílio Financeiro Emergencial**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2b	Concluído Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente



## **Entregas do ano de 2022**

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

## Grandes números do programa

- Atualmente há 2.644 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 5.663 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.724,7 Mi .

## **Fatos relevantes do mês**

Inclusão de 6 auxílios.

Exclusão de 230 auxílios.

Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

## Indicadores

### I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

### I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Percentual(%)

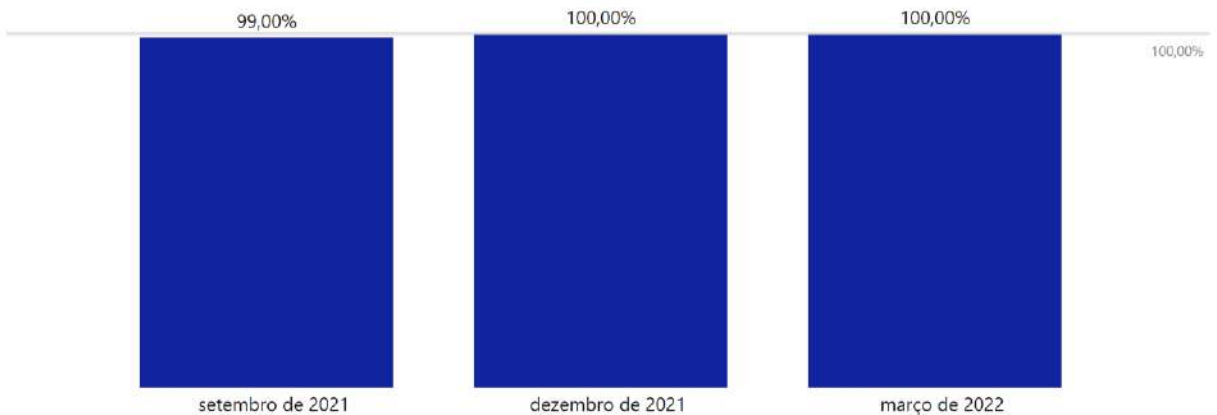


Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

## **PG023 Manejo de Rejeitos**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

## Status de Cláusulas e Deliberações




Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Em Andamento
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Em Andamento
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente

Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	384	1	Concluído Internamente

Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	2	Concluído Internamente
Deliberação	488	4	Concluído Internamente
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	3	Concluído Internamente
Deliberação	516	2	Em Andamento
Deliberação	516	3	Em Andamento
Deliberação	544	2	Concluído Internamente
Deliberação	544	3	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- maio de 2022  Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica
- julho de 2022  Conclusão dos Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias (Monitoramento da Vegetação e Monitoramento de Processos Erosivos) - 4º Ano hidrológico
- dezembro de 2022  Conclusão dos serviços de Monitoramento de e solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Instalação das duas novas estações de monitoramento da qualidade do ar em Acaica e Dom Silvério.

Entrega do relatório final dos dois anos de estudo da Região Deltaica.

## **Indicadores**

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

## **PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1**

### **Eixo Terra e Água**

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Em Andamento
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

março de 2022	●	Conclusão do convênio UFV-SIF - Prof. Venâncio (Acompanhamento técnico, definição de indicadores, metas e monitoramento das ações de restauração florestal da Área Ambiental 1)
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2022
dezembro de 2022	●	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2022

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.



## **Fatos relevantes do mês**

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

## Indicadores

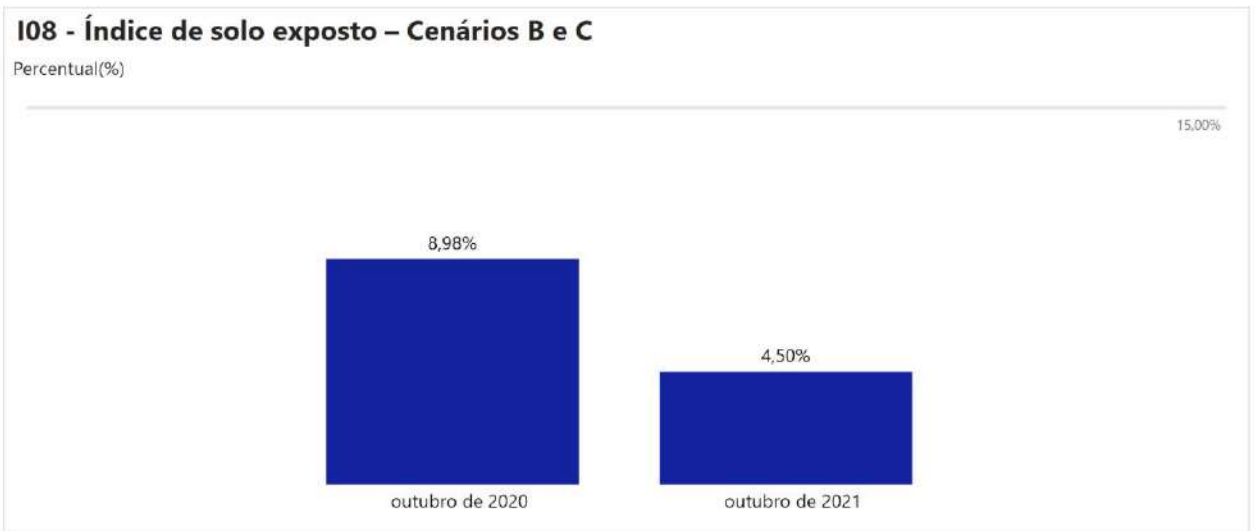


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>I01</b>	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I02</b>	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%
<b>I03</b>	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDVI2}) + (-0,008 * \text{Banda } 3 * \text{NDVI2})$	t/ha
<b>I04</b>	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) * 100$	%
<b>I05</b>	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%
<b>I06</b>	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
<b>I07</b>	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%

## **PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

## Indicadores

### Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 21/22
fevereiro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pancas - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos MG e TI Krenak - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Manhuaçu - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pancas - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23
dezembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Suaçuí - 22/23

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 2826,2 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 213 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 24,9 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R\$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 16,6 Mil hectares validados.



## Fatos relevantes do mês

Assinatura do termo de Compromisso entre Fundação Renova, IBAMA, SEMAD-MG, IEF-MG, CBH-Doce, CBH-Suaçuí e Prefeitura de Governador Valadares, garantindo aplicação de recursos, na ordem de R\$58,5 milhões, para Restauração Florestal de 1.796 hectares na bacia hidrográfica do rio Corrente Grande\_PG 26;

Evento de lançamento do edital de restauração florestal em Manhuaçu, com investimento de R\$300 Milhões\_PG26;

Mobilização da RPPN Feliciano Abdala\_PG26;

Participação na elaboração do Plano de ação para conservação e recuperação do Parque Estadual do rio Doce\_PG26;

Participação na Reunião do Comitê da Bacia do Rio Guandu para apresentação dos programas 26 e 27, realizado em Baixo Guandu-ES;

Participação no dia de campo "Subsolagem em Pastagem na Bacia do Rio da Prata", em São Domingos do Prata/MG\_PG's 26 e 27;

Publicação de matéria no Valor Econômico, assinada pelo editor Ivo Ribeiro, a respeito dos investimentos em restauração florestal em MG e ES\_PG's 26 e 27;

Reunião com a Sociedade para Conservação do Muriqui para Restauração Florestal na RPPN do projeto\_PG26;

Reunião com equipe gestora do Parque Estadual Rio Doce para desenvolver as ações de coleta de sementes, produção de mudas e corredores ecológicos\_ PG-26;

Visita ao corredor Ecológico RPPN Sossego a RPPN Feliciano Abdala e outras APP na bacia do Manhuaçu\_PG26;

Visita do diretor, Luiz Scavarda, nas áreas de trabalho do Pg26 e Pg27 no ES;

Visita técnica das empresas concorrentes aos processos das contratações para execução de cercamento de áreas do PG 26;

Visita Técnica Edital de Restauração Florestal Bacia Manhuaçu, Lotes 10 a 21\_PG26;



## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Riqueza de espécies	(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade de regenerantes	Número de indivíduos / Total da área amostral	Nº de indivíduos / ha
I03	Cobertura do dossel	(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total da área amostral) x 100	%

## **PG027 Programa de Recuperação de Nascentes**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022



● Concluído     
 ● Planejado     
 ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 23/24
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 22/23

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

- 1272 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 507 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 3749 **nascentes** inscritas no edital;
- R\$ 184413 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 2208 Nascentes Validadas

## **Fatos relevantes do mês**

Participação na Reunião do Comitê da Bacia do Rio Guandu para apresentação dos programas 26 e 27, realizado em Baixo Guandu-ES;

Participação no dia de campo "Subsolagem em Pastagem na Bacia do Rio da Prata", em São Domingos do Prata/MG\_PG's 26 e 27;

Publicação de matéria no Valor Econômico, assinada pelo editor Ivo Ribeiro, a respeito dos investimentos em restauração florestal em MG e ES\_PG's 26 e 27;

Visita do diretor, Luiz Scavarda, nas áreas de trabalho do Pg26 e Pg27 no ES;

## Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Riqueza de espécies	(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I02	Densidade de regenerantes	Número de indivíduos / Total da área amostral	Nº de indivíduos / ha
I03	Cobertura do dossel	(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total da área amostral) x 100	%



## **PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado
Cláusula	166	§1º	Em Andamento
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente

Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente
Deliberação	578	2	Concluído Internamente
Deliberação	579	1	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	●	Protocolo dos relatórios finais das linhas temáticas I a VI
janeiro de 2022	●	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2022	●	Conclusão do Ciclo 3 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
março de 2022	●	Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática
abril de 2022	●	Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática - Versão revisada
junho de 2022	●	Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI
junho de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto IV - SIF/UFV
julho de 2022	●	Realização da Oficina I de Elaboração do PA Integrado
julho de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto I - SIF/UFV
agosto de 2022	●	Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
setembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto II - SIF/UFV
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto III-B - SIF/UFV
novembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 5 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2022	●	Realização da Oficina II de Elaboração do PA Integrado

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Protocolo da revisão do documento de definição, a partir da consolidação das contribuições da CT-Bio.

Aprovação da proposta de atualizações metodológicas do PMBA para os ambientes Dulcícola e Marinho pela CTBio em 03 de maio de 2022, pelo Ofício SEI nº 30.2022/CTBio/DIBIO/ICMBio

Apresentação do relatório mensal das atividades da FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR, que compreendem as atividades desenvolvidas no período de 16 de abril a 15 de maio de 2022.

## **Indicadores**

Quatro indicadores de eficácia foram aprovados no documento de Definição do Programa, visando promover o acompanhamento dos processos estabelecidos pelo programa, no entanto, novos indicadores que visem a mensuração dos resultados das ações do programa deverão ser definidos, assim que possível, e incluídos por deliberações do sistema CIF, para atender a Nota Técnica nº 12/2021/CTBio/DIBIO/ICMBio.

## **PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente
Deliberação	554	1	Planejado

## Entregas do ano de 2022

dezembro de  
2022

● Início da execução das obras do CETRAS MG

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Não houve fatos relevantes no mês.

## **Indicadores**

Os indicadores de resultados do programa foram aprovados em dezembro de 2021 pela Deliberação CIF 553, porém por solicitação do IBAMA, as ações deste programa estão paralisadas devido a indefinição sobre as áreas a serem construídos os CETRAS, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Desta forma, não será possível a medição dos indicadores até a retomada das ações ainda sem previsão.

## **PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrado
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrado
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

abril de 2022	●	Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento
agosto de 2022	●	Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.
setembro de 2022	●	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna
outubro de 2022	●	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de flora
novembro de 2022	●	Protocolo do primeiro relatório semestral do Projeto "Conservação e Manejo de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFV/CCSS.

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado



## **Grandes números do programa**

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

## **Fatos relevantes do mês**

Como parte de execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade terrestre, foi concluído o acordo de parceria entre as Instituições de Ensino e UNESCO para o Projeto Piloto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade:

- 1- UNIVALE - Curso de Eng. Civil e Ambiental – Governador Valadares/ MG
- 2- IEF/ Parque Estadual Sete Salões – Conselheiro Pena/ MG
- 3- EEEFM N. Sra da Conceição – Linhares/ES
- 4- CEEFMTI Bartouvino Costa – Linhares /ES
- 5 - IFES/ Campus Colatina - Curso Técnico em Meio Ambiente – Colatina/ES

## Indicadores

### I01 – Execução do Plano de Ação

Percentual(%)

100,00%



Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

## **PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

#### **Objetivo**

##### Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

##### Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	caput	Em Andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrado
Cláusula	170	Inc I	Encerrado
Cláusula	170	Inc II	Encerrado
Cláusula	170	Inc III	Encerrado
Cláusula	170	Inc IV	Encerrado
Cláusula	170	Inc V	Encerrado
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022




fevereiro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Alpercata ALPESPJ01 -Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Itueta ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba
maio de 2022	●	Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Timóteo TIMRSPM03-Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Naque NAQESPJ02-Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá
junho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
julho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOESCT01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio
julho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB03-Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes
julho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
julho de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem – UTC
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Aimorés AIMESCT02 -Aquisição de terreno para implantação de SES.
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Marliéria MREESCT01-Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Periquito PERRSOB02-Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Iapu IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante
outubro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Ipatinga IPAESOB03-Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Galiléia GALESCOT01-Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOESOB03 -Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Tumiritinga TUMESPJ01-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga
dezembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Galiléia GALESPJ01-Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022  Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIORSAB01-Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança e empilhadeira manual hidráulica
- dezembro de 2022  Conclusão do repasse do Pleito de Barra Longa BALRSPJ01-Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC)
- dezembro de 2022  Conclusão do repasse do Pleito de Córrego Novo CONESOB01-Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município

### Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2022 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2023 e por isso não aparecem mais na *timeline*.

Pleito de Aimorés AIMESPJ03-Elaboração de projeto, Barra Longa BALESCT01- Aquisição de terreno, Bugre BUGESPJ02-Elaboração de projetos, Naque NAQESPM01-Revisão do PMSB, Pingo d'Água PIARSAB01-Aquisição de bem, Raul Soares RASESPJ02-Elaboração de projetos, Santana do Paraíso SAPRSPM01-Revisão do PGIRS e do CIMVALPI CVPRSAB01-Aquisição de bem.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

## Grandes números do programa

- No mês **maio de 2022** foram repassados R\$ **849.633,52** para ações dos municípios\*;
- No mês **maio de 2022** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **maio de 2022** a equipe técnica realizou **87 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

Nota :

\* Repasses para ações dos municípios de Resplendor, Barra Longa, Ipaba, Rio Casca, Bugre, Dionísio, Condoeste e Periquito, Ipatinga.



## Fatos relevantes do mês

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Resplendor , no valor de R\$2.461,1, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Barra Longa , no valor de R\$13.347,90, referente a elaboração de projeto de tratamento de resíduos

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Bugre , no valor de R\$ 19.200,10 , referente a elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário;

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Condoeste , no valor de R\$80.319,73, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento de obra.

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Dionísio , no valor de R\$ 623.262,76 referente a execução de obras do sistema de esgotamento sanitário;

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Ipaba , no valor de R\$45.670,65, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Ipatinga , no valor de R\$ 1.053,65, referente a execução de obras do sistema de esgotamento sanitário;

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Periquito , no valor de R\$ 57.824,93 referente a execução de obras do sistema de esgotamento sanitário;

Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Casca , no valor de 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento de obra;

## Indicadores de Resultados

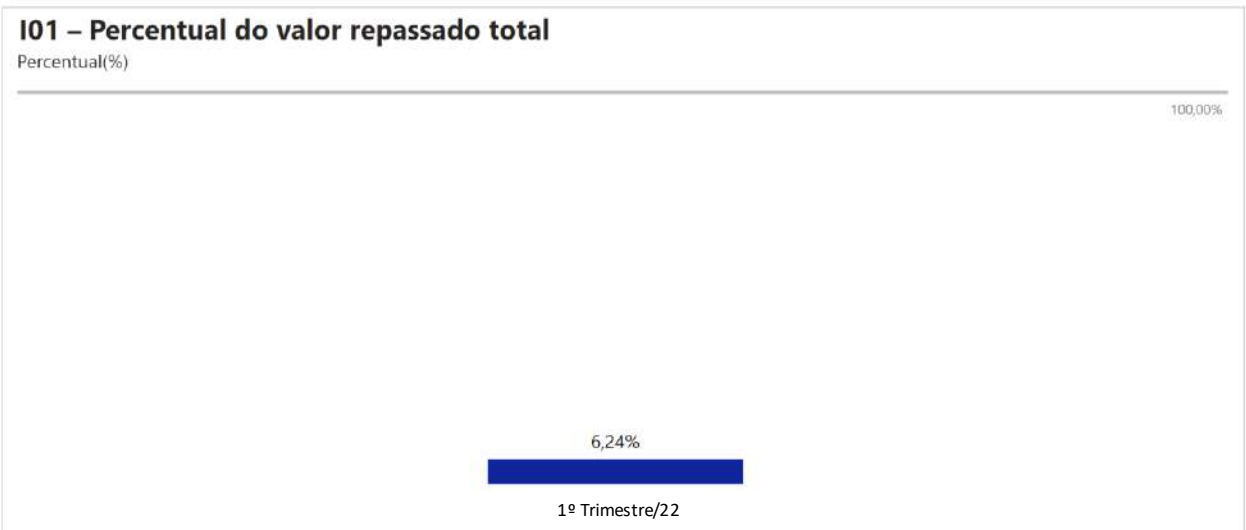


Gráfico 1: I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

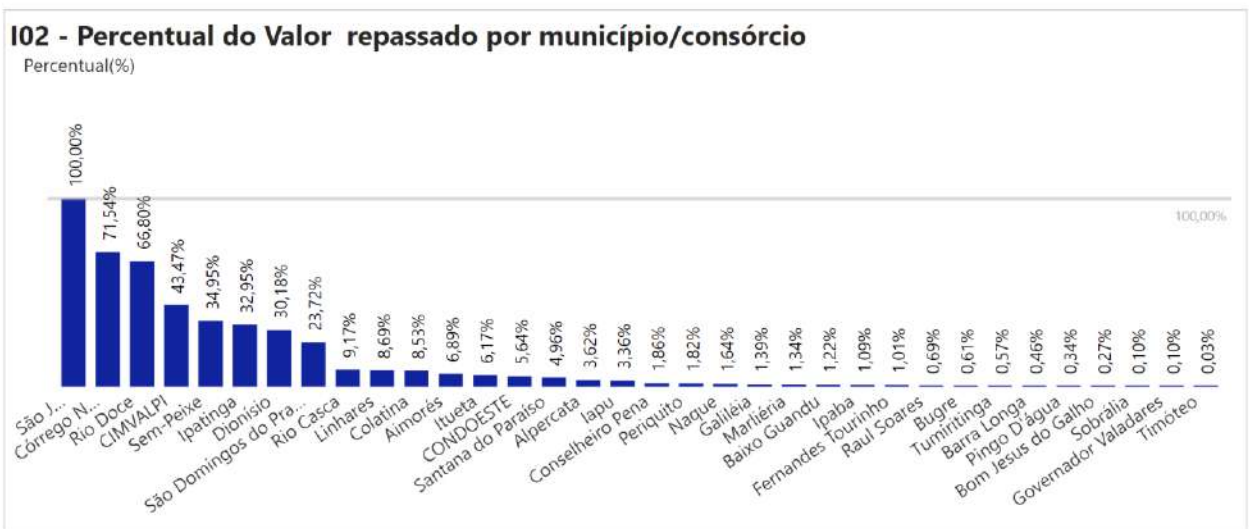


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

### Nota:

O Valor total dos recursos do Programa é a soma dos 517 milhões do teto e R\$ 168.333.174,70 de correção pelo IPCA (data base dez/2021).

## Indicadores de Resultados

### I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Percentual(%)

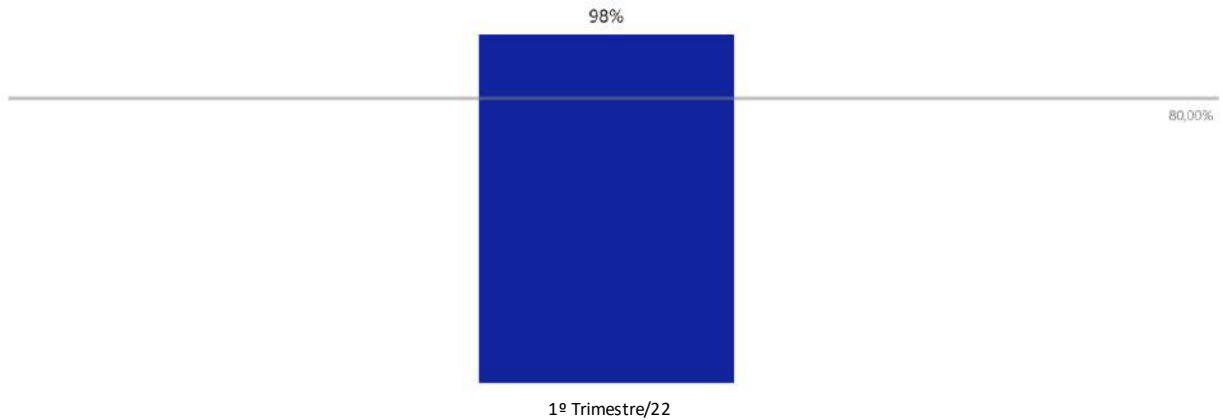


Gráfico 3:I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

### I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Percentual(%)

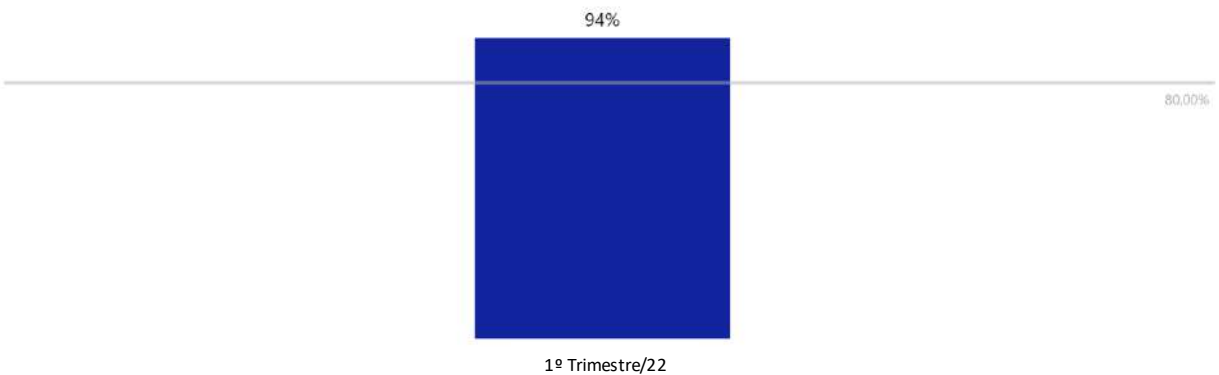


Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

## Indicadores de Resultados

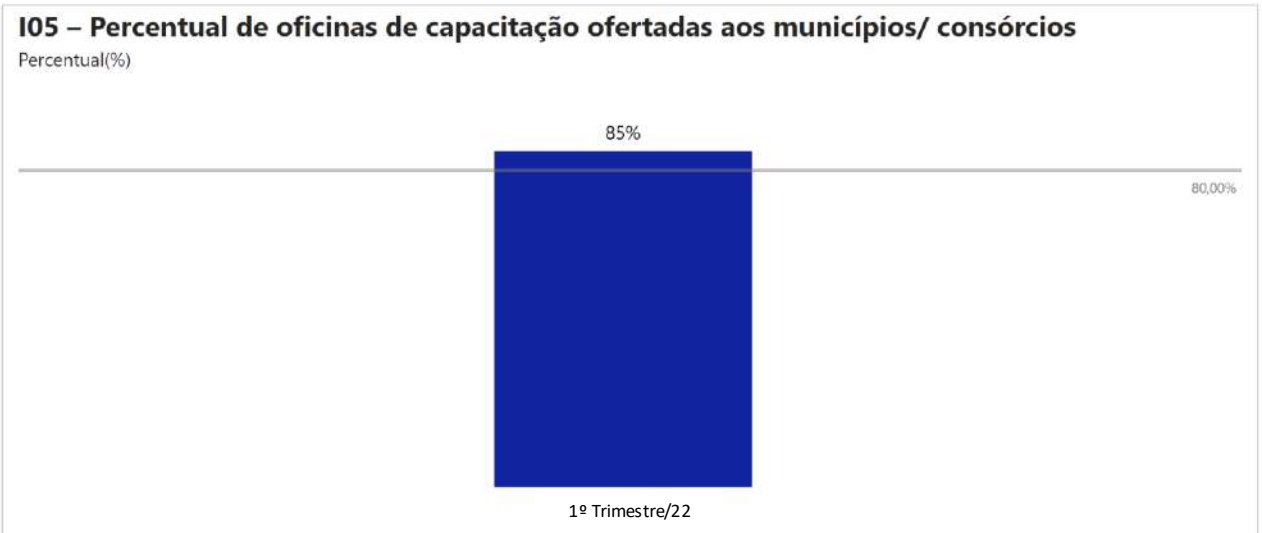


Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios – Frequência Trimestral




Gráfico 6:I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

### I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)




Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

#### Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS;
- **I07**-No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I08**-No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

### I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)



Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

#### Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS;
- **I09**-No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I10**-No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Av. Getúlio Vargas 671 4º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | [fundacaorenova.org](http://fundacaorenova.org)

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

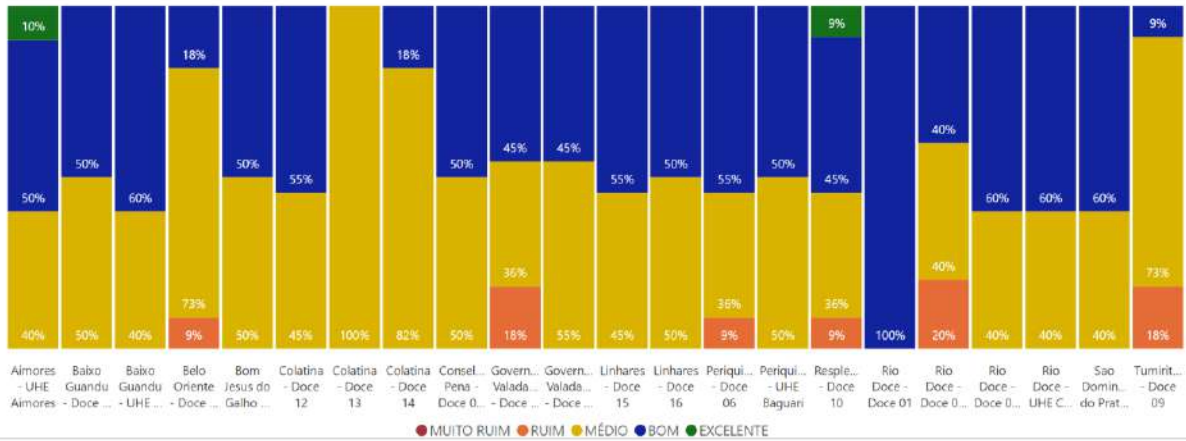


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

### I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

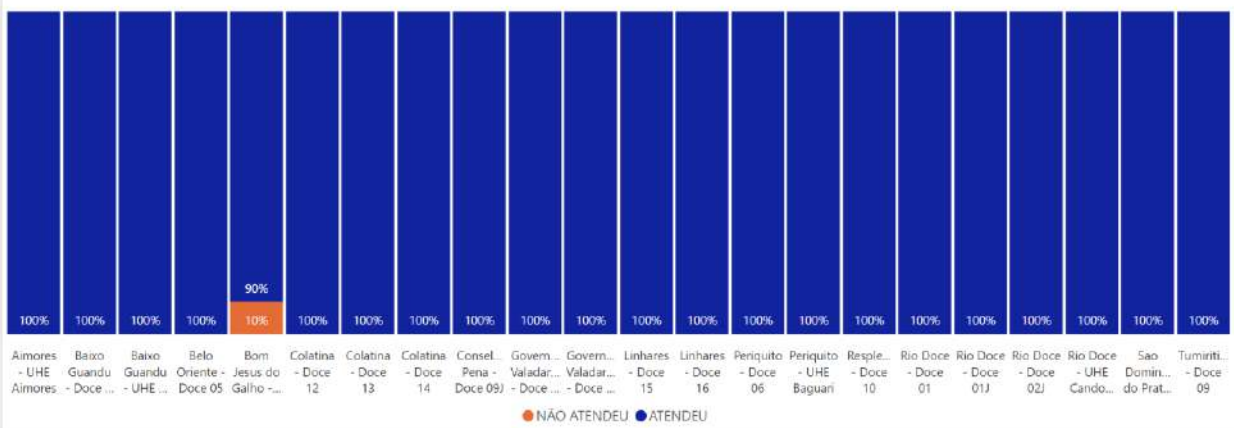


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

## Indicadores Físicos e Qualidade da Água

### I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

Percentual(%)

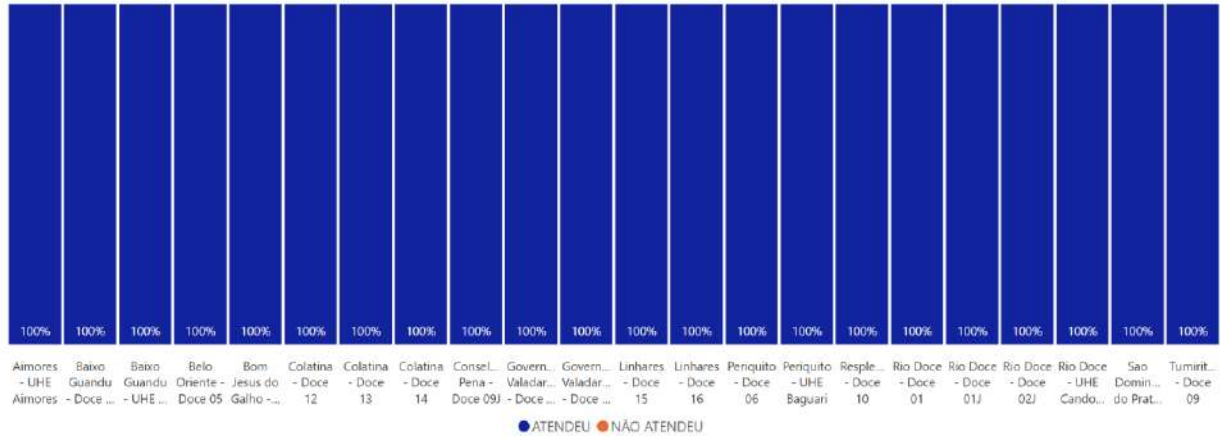


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual



## **PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água**

### **Eixo Reconstrução e Infraestrutura**

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	123	3	Judicializado
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	325	1	Judicializado
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado

Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

- junho de 2022 ● Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama
- dezembro de 2022 ● Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede
- dezembro de 2022 ● Conclusão das Obras - Captação Alternativa - Tumiritinga Sede

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do Programa**

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

## Fatos relevantes do mês

Nos dias 11 e 12 de maio de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG, para avaliação e acompanhamento das atividades de execução de obra realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3, Obras, Comissionamento e Monitoramento.

No dia 31 de maio de 2022, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Gesteira, município de Barra Longa/MG.

No dia 20 de maio de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo o Relatório Nº15 – Desenvolvimento das Atividades de Monitoramento da Qualidade da Água (ID 1093544271), informando as atividades desenvolvidas pela equipe de perícia para o início do monitoramento da qualidade da água.

No dia 04 de maio de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG (ID 1057863265).

Nas semanas do dia 02, 09 e 23 de maio de 2022, a equipe de perícia realizou as visitas técnicas periciais nas localidades e casas dos beneficiários contemplados no programa de abastecimento de água da Fundação Renova no Território VI.

No dia 09 de maio de 2022 a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

\* As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

\* Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

## Indicadores

**I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água:** indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

**I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos:** indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

## Indicadores

### I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas

Percentual(%)

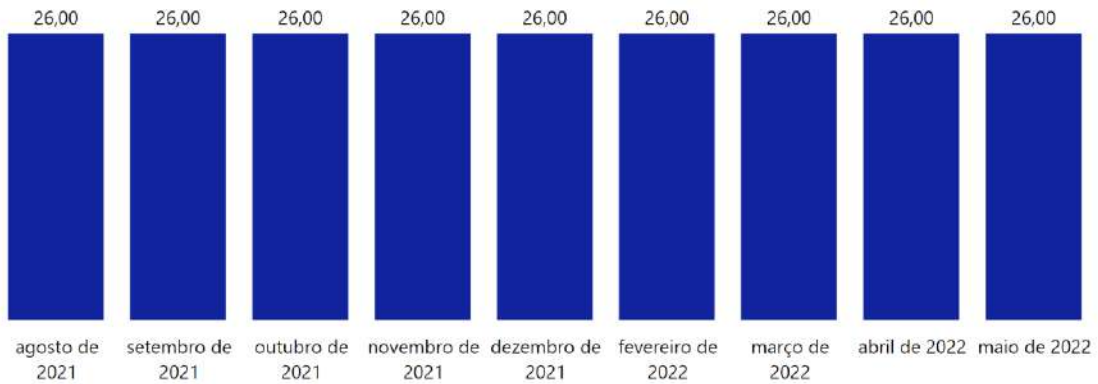


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

### I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água

Percentual(%)

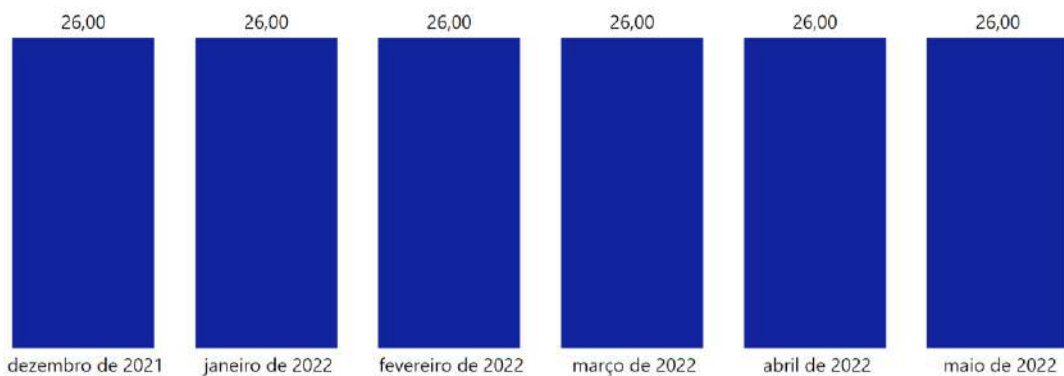


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal



## Indicadores

### I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Percentual(%)

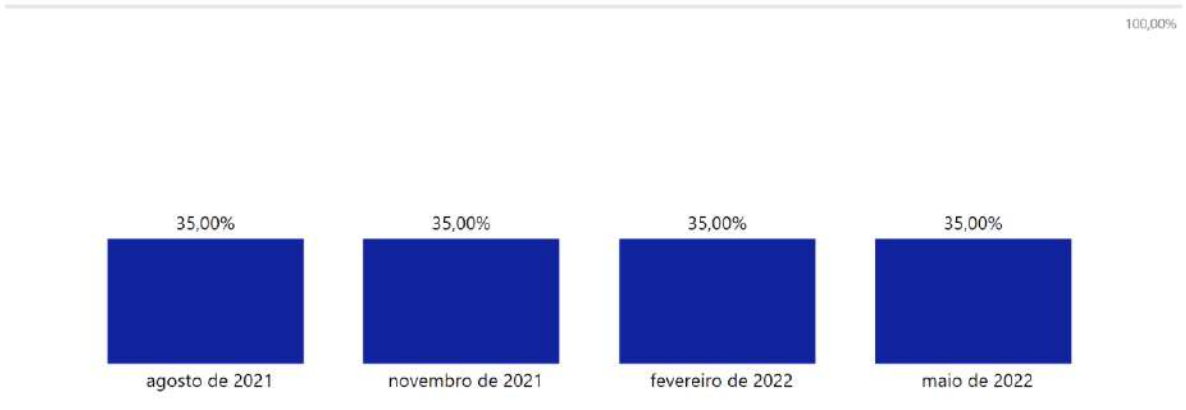


Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

### I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Percentual(%)

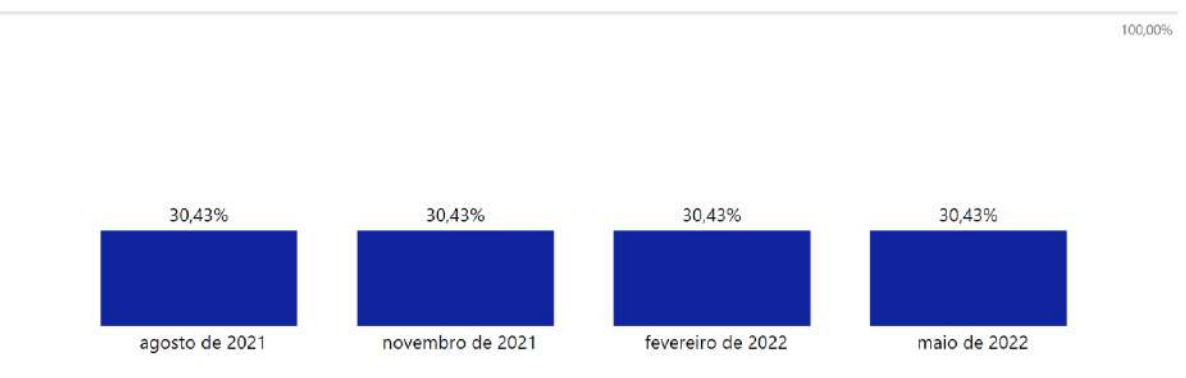


Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

## **PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	549	2	Planejado

## Entregas do ano de 2022



● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Implementação dos projetos selecionados nas áreas 1(CPCD) e 5(LUMIAR) do projeto Lideranças Jovens.

## Indicadores

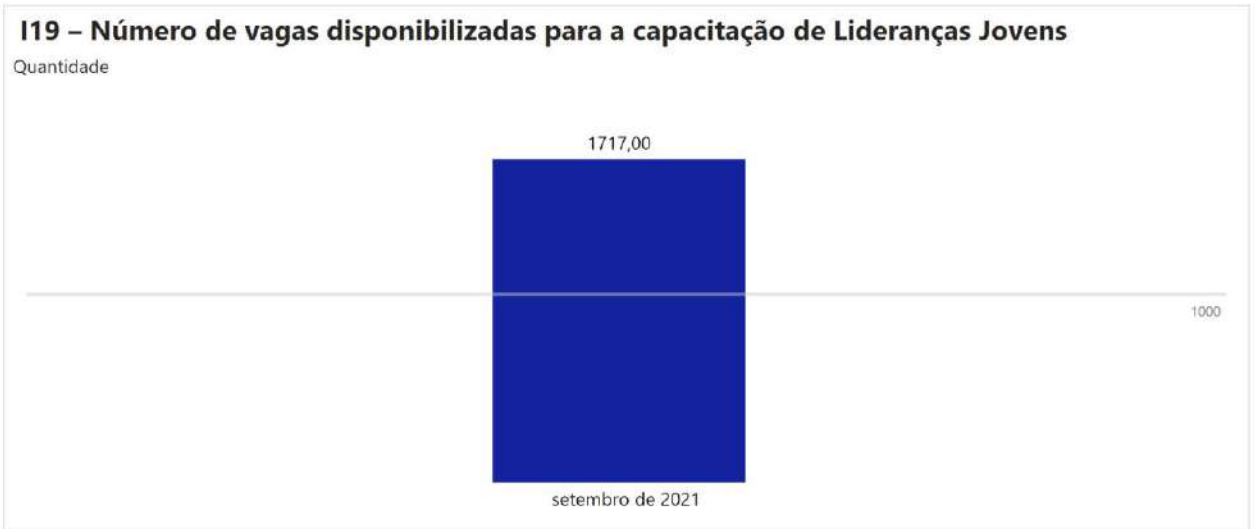


Gráfico 1: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

## **PG034 Preparação para Emergências Ambientais**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**








Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.



## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	173	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

março de 2022		Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração
setembro de 2022		Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
dezembro de 2022		Conclusão da Adequação das 10 escolas do projeto Escola Segura no âmbito de sinalização e segurança.
dezembro de 2022		Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos (CGR) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022		Conclusão da Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022		Conclusão da Capacitação do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG.
dezembro de 2022		Realização do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

 Concluído       Planejado       Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Conclusão o Curso de capacitação On-line de Sistema de Comando em Operações – SCO

Conclusão da revisão da etapa de Identificação e Mapeamento de Riscos Geológicos e Hidrológicos, dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) dos municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Revisão da etapa, devido a mudança do cenário ocasionada pelas as chuvas intensas ocorridas em 2022.

Conclusão da etapa de Capacitação dos Técnicos municipais em Mapeamento e Gestão de Risco, dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) os municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

## Indicadores

### I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Percentual(%)

80,00%

33,33%

dezembro de 2021

Gráfico 1: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Número de solicitações atendidas: Sem solicitações da Defesa Civil para apoio a eventos em 2021. (0%)

Cobertura das áreas de risco realizada: Mapeamento em andamento. (0%)

Planos de Contingência: atualizado 08 planos o que corresponde a 33,33%.

### I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis

Percentual(%)

100,00%

100,00%

dezembro de 2021

Gráfico 2: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

O cálculo do I04 – Número de medidas cumpridas / Total de medidas planejadas, consiste no total de 5 medidas planejadas.

Sendo 3 já foram entregues até 2020, que são elas:

- Entrega de kit de equipamentos para reestruturação das defesas civis
- Digitalização da rede de rádio para Segurança Pública
- Digitalização da rede de rádio para Defesa Civil de Mariana

Sendo 2 medidas a serem entregues até Dez/21, que são elas:

- Repasse de recurso para a construção/reforma da sede das Defesas Civis de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce - Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civis.

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>INÍCIO DA MEDIÇÃO</b>
<b>I01</b>	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
<b>I02</b>	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/22

## **PG035 Programa de Informação para a População**

### **Eixo Pessoas e Comunidade**

#### **Objetivo**

Salvaguardar e dar acesso às informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo:

- (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação; aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços físicos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e
- (ii) processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos, sobre o modo de vida e memória.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em Andamento
Cláusula	174	Caput (ação 1)	Em Andamento
Cláusula	65	caput	Em Andamento
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- abril de 2022 ● Elaboração do e-book com os artigos/trabalhos apresentados nos processos de itinerância e descentralização 2021
- novembro de 2022 ● Finalização da Contratação de Empresa Especializada em Expografia e Conteúdos Multimídia para o CIT Linhares
- novembro de 2022 ● Início das Obras de Reforma do CIT Linhares

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Grandes números do programa

Dado	abril de 2022	maio de 2022	Acumulado 2022	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	859	618	1477	2192
Quantidade de atividades nos territórios	0	0	0	10

## Fatos relevantes do mês

No dia 03 de maio de 2022, foi realizada uma reunião entre a equipe técnica do programa e a equipe de Diálogo Social do Médio Rio Doce para o planejamento tático das ações de Descentralização e Itinerância naquele território.

A equipe técnica do PG35 reuniu-se com a equipe de Diálogo Social do Espírito Santo para o planejamento tático das ações de Descentralização e Itinerância no território, no dia 09 de maio de 2022.

No dia 11 de maio de 2022, a equipe técnica do programa reuniu-se também, com o mesmo objetivo, com a equipe de Diálogo de Mariana.

Em conformidade com o cronograma de manutenção e aprimoramento da Plataforma Interativa do CIT, a equipe técnica do programa realizou, no dia 25/05/2022, uma reunião com representantes da Digital Pixel e da Enable Venture com objetivo de implementar melhorias no conteúdo do site.

## **Indicadores**

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

## Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
Quantidade de visitantes no CIT de Mariana	<b>PG35.001</b> Do total de 4.667 visitantes no CIT de Mariana (Casa do Jardim) reportados pela Fundação Renova até o mês de maio de 2019, a EY identificou 3.283 visitantes nas planilhas de controle encaminhados pelo Programa, o que representa 70,3% do total reportado pela Fundação Renova nos Relatórios de Atividades enviados ao CIF.	No Relatório Anual de Atividades de 2020, emitido pela Fundação Renova em janeiro de 2021, foi reportada a quantidade de visitantes no CIT de Mariana (MG) até o dia 15 de março de 2020, mas não foi publicada a correção dos dados divulgados anteriormente. <b>NOTA EXPLICATIVA:</b> "Esclarecemos que a diferença existente entre os quantitativos de visitantes reportados nos Relatórios de Atividades anteriores e os evidenciados é decorrente do número estimado de visitantes que não assinaram as listas de presença no CIT de Mariana."
Quantidade de visitantes no CIT de Mariana	<b>PG35.002</b> Do total de 4.667 visitantes no CIT de Mariana (Casa do Jardim) reportados pela Fundação Renova até o mês de maio de 2019, a EY identificou o registro de 2.620 visitantes nos arquivos digitalizados dos cadernos de registro de presença encaminhados pelo Programa, o que representa 56,1% do total reportado pela Fundação Renova nos Relatórios de Atividades enviados ao CIF.	No Relatório Anual de Atividades de 2020, emitido pela Fundação Renova em janeiro de 2021, foi reportada a quantidade de visitantes no CIT de Mariana (MG) até o dia 15 de março de 2020, mas não foi publicada a correção dos dados divulgados anteriormente. <b>NOTA EXPLICATIVA:</b> "Esclarecemos que a diferença entre os quantitativos de visitantes reportados anteriormente e os evidenciados é decorrente do número estimado de visitantes que não assinaram as listas de presença no CIT de Mariana."
Quantidade de participantes da oficina de nº 17	<b>PG35.004</b> Foi identificado pela EY, na ata elaborada pela Fundação Renova para a oficina de nº 17, a informação de que não houve lista de presença. Entretanto, foi reportada pela Fundação Renova no Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio de 2019 a quantidade de 15 participantes para a referida oficina.	O Relatório Mensal de Atividades do mês de maio de 2019 reporta que 15 pessoas participaram da 17ª oficina realizada embora conste em Ata que não houve lista de presença neste encontro. <b>NOTA EXPLICATIVA:</b> "Declaramos que não houve lista de presença para o registro dos participantes na 17ª oficina. O número de participantes reportado no Relatório Mensal de Atividades de 2019 foi aferido a partir de registros fotográficos realizados durante a oficina"
Utilização do CIT Mariana, instalado na Casa do Jardim, pelo PG008	<b>PG35.006</b> A EY identificou inconsistências no Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio de 2019, emitido pela Fundação Renova, que contemplou, na seção dedicada ao PG035, ações relacionadas ao Programa PG008, que segundo a própria Fundação Renova estão fora do âmbito de atuação deste Programa.	O Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de maio de 2019 reportou ações do PG008 realizadas na Casa do Jardim sem, contudo, ressaltar que a atividade é de responsabilidade daquele programa. <b>NOTA EXPLICATIVA:</b> "Declaramos que o "Plantão do Reassentamento" reportado no Relatório Mensal de Atividades de Maio de 2019 é de responsabilidade do PG008. O Programa 35 apenas cedeu o espaço da Casa do Jardim para sua realização."

## **PG036 Comunicação Nacional e Internacional**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**





#### **Objetivo**

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	530	1	Em Andamento

## Entregas do ano de 2022

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção dos mecanismos relacionados à acessibilidade do site, seguindo como critério recomendações do guia WCAG 2.0 (Web ContentAccessibilityGuidelines) e/ou padrão E-MAG em 2022                                 |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022   |
| dezembro de 2022 |  | Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022 |

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado



## Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

INDICADOR	abril de 2022	maio de 2022	ACUMULADO 2022	ACUMULADO (2016 - 2022)
Acesso ao Site (mês)	292.973	278.290	1.335.831	8.481.813
Documentos no site (mês)	7	7	49	512
Notícias Publicadas (mês)	9	14	55	942
Vídeos (mês)	15	14	55	637

## **Fatos relevantes do mês**

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

## Indicadores



Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

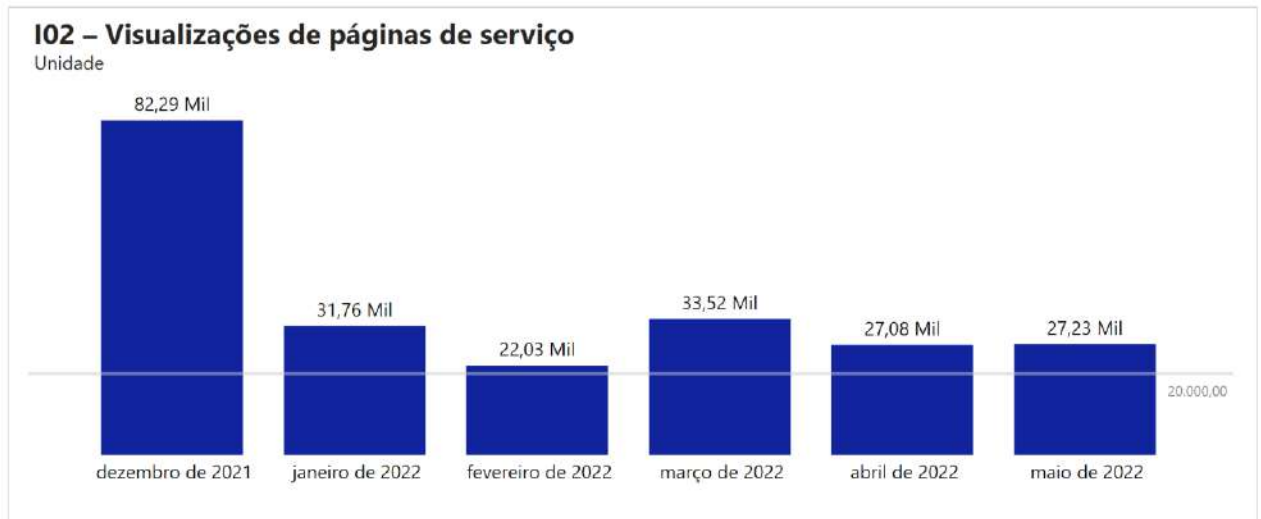


Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 – Tempo de resposta

Hora

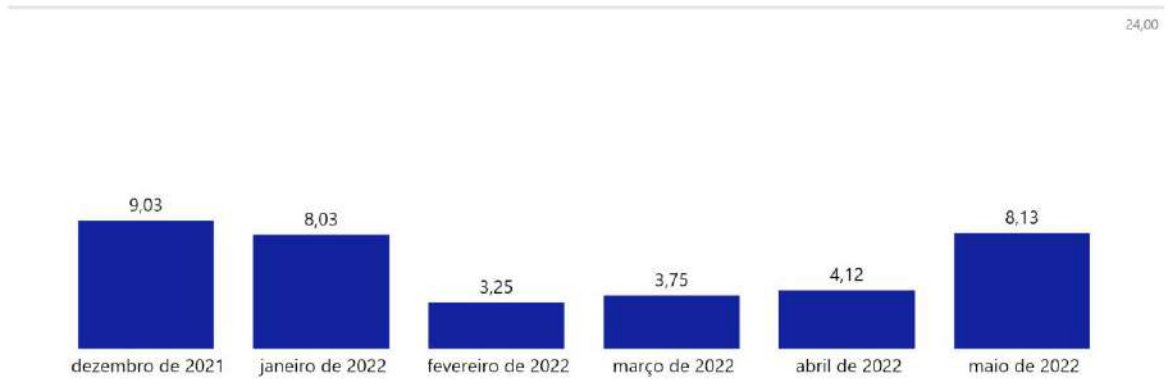


Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

### I04 – Alcance Orgânico LinkedIn

Unidade




Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

## Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

## **PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrado
Cláusula	177	Caput	Em Andamento
Cláusula	178	Caput	Em Andamento
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em Andamento
Deliberação	198	1	Em Andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em Andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em Andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em Andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente

Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	572	3	Concluído Internamente
Deliberação	572	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em Andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em Andamento



## Entregas do ano de 2022

março de 2022		Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
abril de 2022		Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2021)
abril de 2022		Protocolo do 5º Boletim PMQACH (Campanha 37, 38, 39 e 40)
maio de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/22
junho de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/22
junho de 2022		Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2022)
junho de 2022		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/22 a Mar/22
julho de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/22
julho de 2022		Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce
agosto de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/22
setembro de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/22
setembro de 2022		Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
setembro de 2022		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/22 a Jun/22
outubro de 2022		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2021 à Junho 2022
outubro de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/22
novembro de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/22
dezembro de 2022		Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/22
dezembro de 2022		Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
dezembro de 2022		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/22 a Set/22
dezembro de 2022		Finalização do Plano de Capacitação Presencial PMQQS

 **Concluído**
 **Planejado**
 **Reprogramado**

## Grandes números do programa

Em 2022 está aprovado um orçamento de **R\$ 36.917.467** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

### Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados 1,7 milhão de **dados** pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações estão disponíveis em [www.monitoramentoriodoce.org](http://www.monitoramentoriodoce.org);
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

## Grandes números do programa

### Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 242 pontos, sendo 35 com tratamento e 207 sem tratamento em 29 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

**Nota:**

*No mês de Abril/2022 o PMACH monitorou 29 municípios, em 245 pontos, sendo 35 tratamento e 210 sem tratamento.*

## **Fatos relevantes do mês**

Em 17/05 foi encaminhado ao GTA-PMQQS os ajustes realizados no Projeto de revisão do Portal de Monitoramento

## Indicadores

### I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Percentual(%)

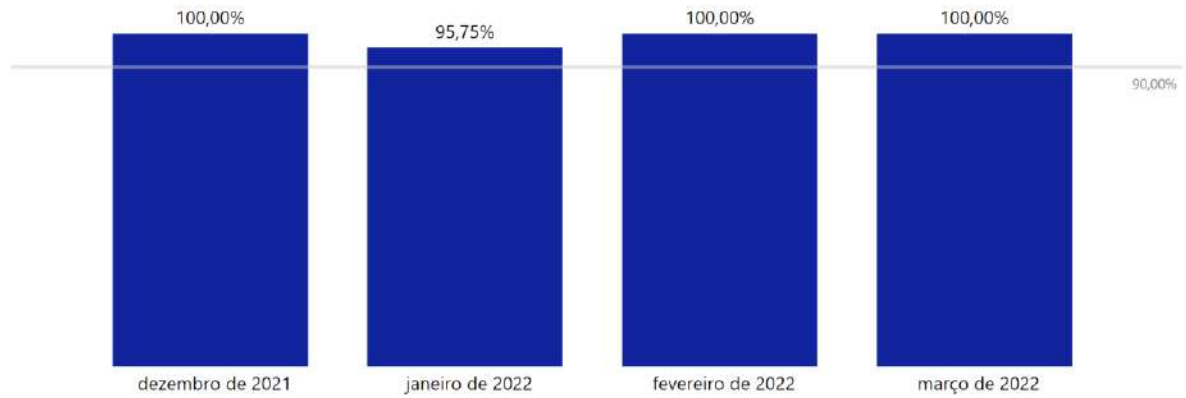


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

### I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)

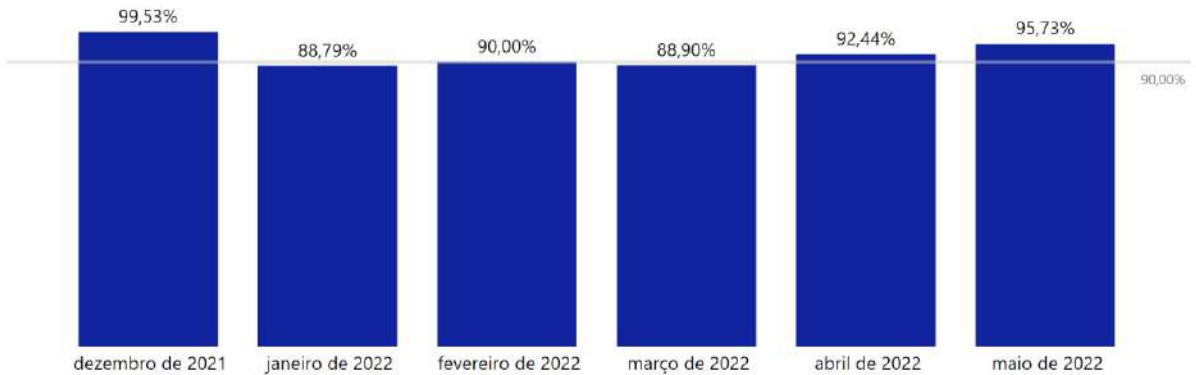


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)

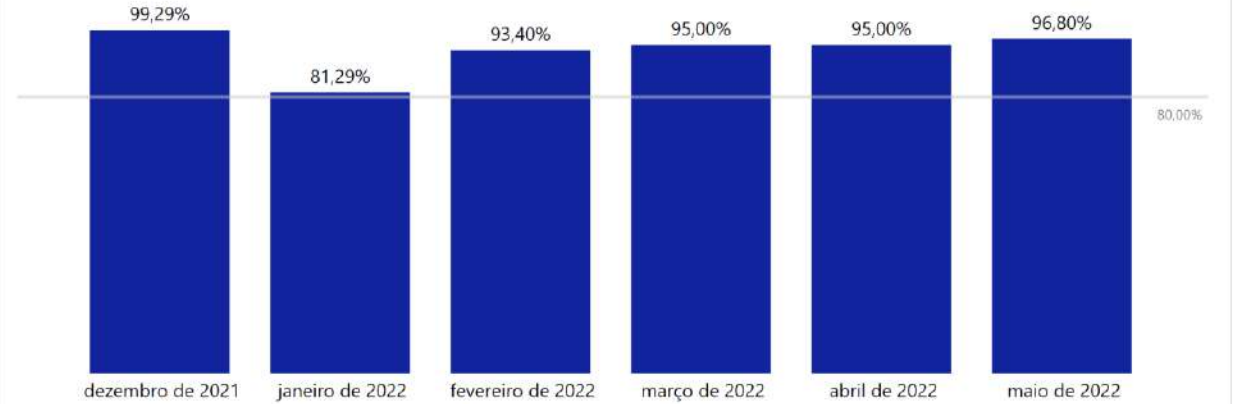


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

### I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Percentual(%)

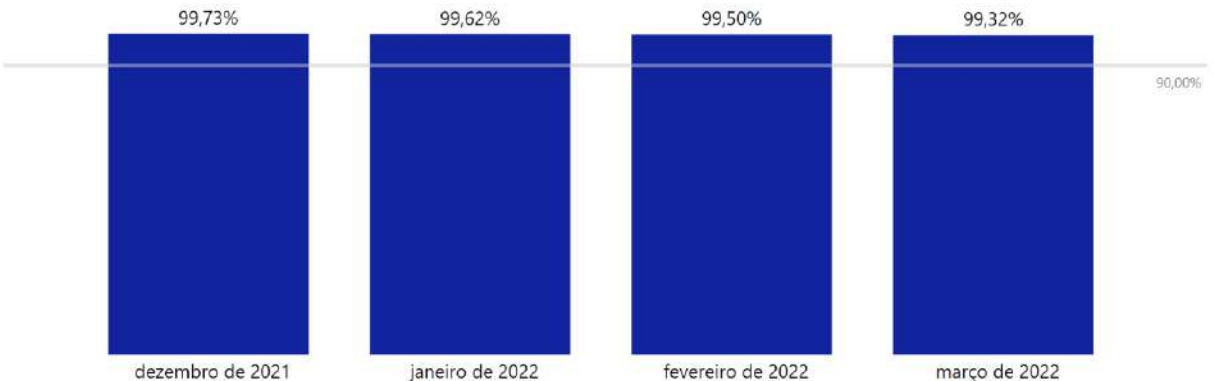


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal



## **PG039 Unidades de Conservação**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em Andamento
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Concluído Internamente
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	6	Planejado
Deliberação	584	2	Planejado



## Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	●	Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD
fevereiro de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
março de 2022	●	Protocolo do Relatório Final AIA PERD
abril de 2022	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
abril de 2022	●	Finalização da contratação edital da equipe técnica e administrativa do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz
maio de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
maio de 2022	●	Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
junho de 2022	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
junho de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 2
junho de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA REVIS Santa Cruz
julho de 2022	●	Protocolar Plano de ação de reparação PERD
julho de 2022	●	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 2
julho de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 6
julho de 2022	●	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
julho de 2022	●	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 6
julho de 2022	●	Realizar Reunião Devolutiva REVIS Santa Cruz
agosto de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS
agosto de 2022	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
agosto de 2022	●	Protocolar Plano de ação de reparação Rebio Comboios
agosto de 2022	●	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
agosto de 2022	●	Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
setembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
setembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
setembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
setembro de 2022	●	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS

● Concluído      ● Planejado      ● Reprogramado

## Entregas do ano de 2022

- outubro de 2022 ● Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
- outubro de 2022 ● Protocolar Plano de ação de reparação APA Costas das Algas e REVIS
- novembro de 2022 ● Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
- novembro de 2022 ● Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
- dezembro de 2022 ● Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
- dezembro de 2022 ● Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
- dezembro de 2022 ● Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)
- dezembro de 2022 ● Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

## **Grandes números do programa**

O programa não possui grandes números.

## **Fatos relevantes do mês**

Nos dias 11 e 12 de maio, foi realizada a oficina de validação do plano de ação para o PERD.

No dia 09 de maio, foram protocolados os relatórios preliminares de AIA das UCs dos grupos 3 e 4.

Em 27 de maio, foi recebido pelo ICMBio, o termo de referência para contratação de aluguel de embarcações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.

Em 27 de maio, foi enviado ofício para revisão do documento de definição do PG, a partir da consolidação das contribuições da CT-Bio.

Em 24 de maio, a coordenação da CTBio/CIF, encaminhou a Nota Técnica nº 6/2022/CTBio/DIBIO/ICMBio em aprovação ao relatório de AIA de REBIO Comboios.

## Indicadores

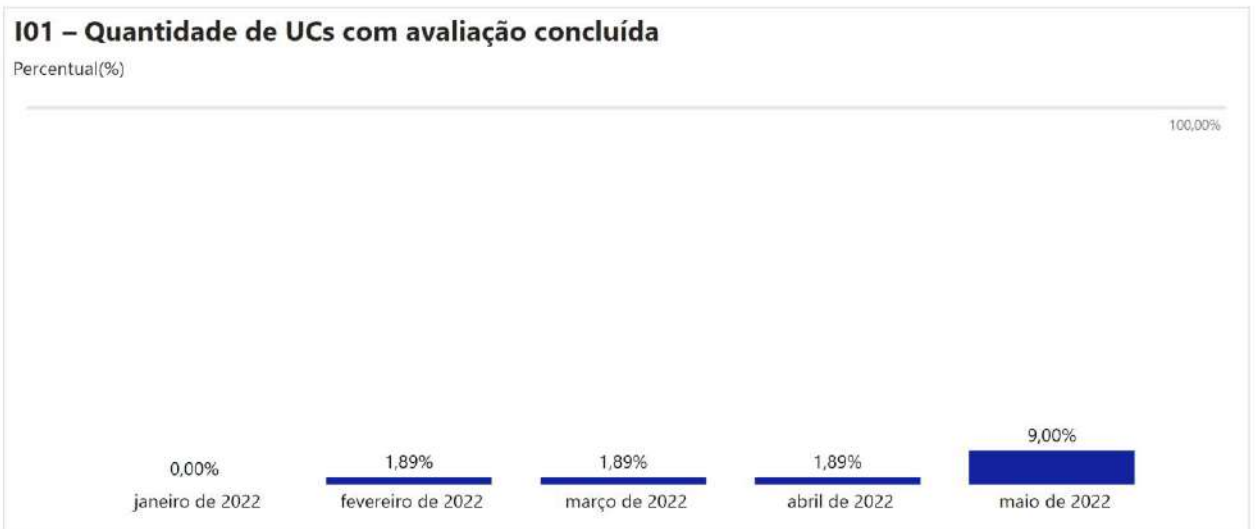


Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

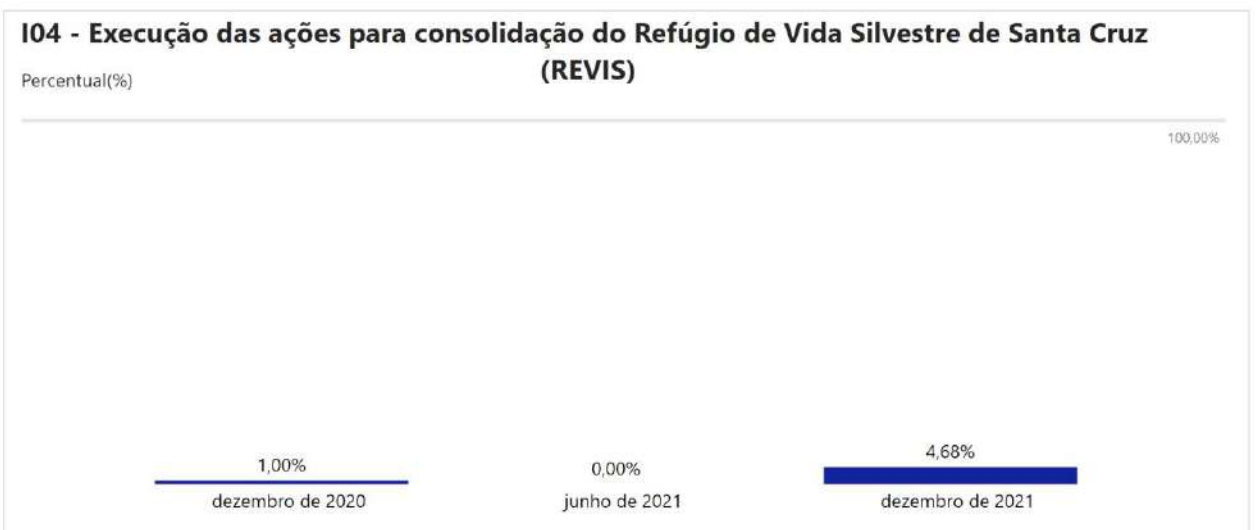


Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

## Indicadores

### I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Percentual(%)

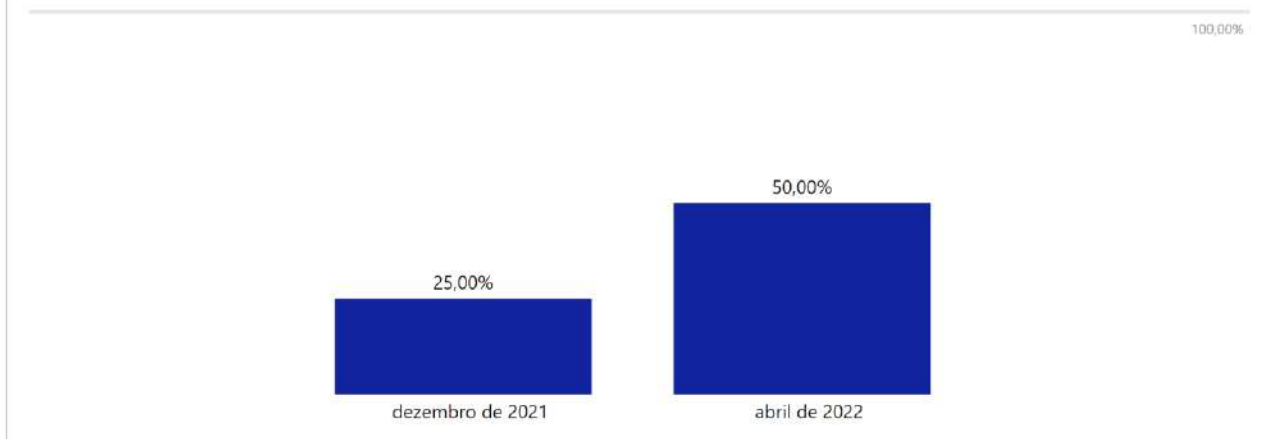


Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Anual

## **PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA**

### **Eixo Terra e Água**

#### **Objetivo**

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente



## Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Conclusão da elaboração e assinaturas do Programas de Regularização Ambiental (PRA) das propriedades piloto em MG
- setembro de 2022 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

## **Grandes números do programa**

540 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 31 (5,7%) imóveis declinaram e 482 (89,3%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 286 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

## **Fatos relevantes do mês**

Realizado evento de regularização ambiental de propriedades rurais em Barra Longa, no dia 05 de maio.

Publicação das Cartilhas do PRA no sistema do IEF - MG.

## Indicadores

### I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Percentual(%)

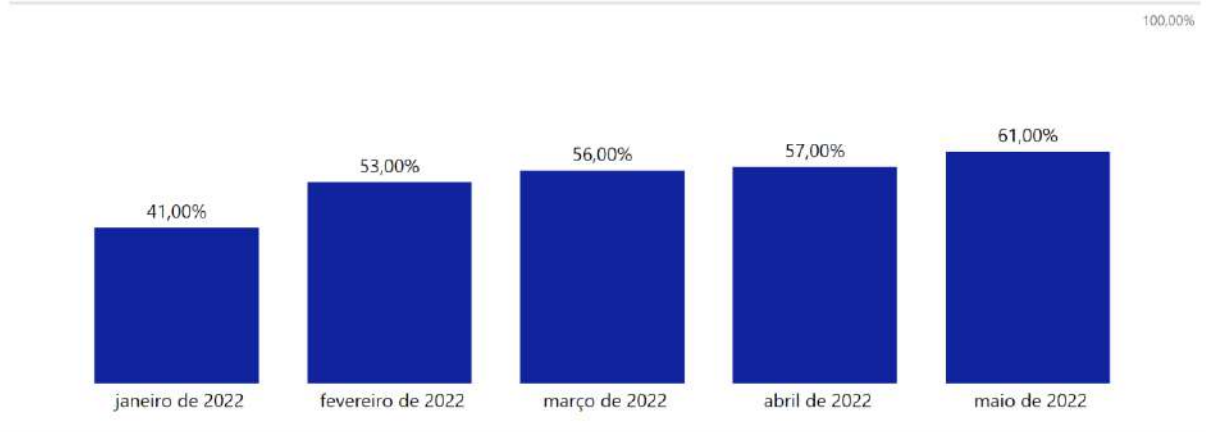


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
<b>102</b>	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
<b>103</b>	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

## **PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários**

### **Eixo Pessoas e Comunidades**

#### **Objetivo**

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

## Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	caput	Concluído Internamente
Cláusula	142	caput	Concluído Internamente
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

## Entregas do ano de 2022

julho de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - Concluído

● Concluído    ● Planejado    ● Reprogramado



## Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**.
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97** milhões pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

### Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valor Ressarcido aos Compromitentes	30	Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R\$ 545,24 Mil, referente a 2 órgãos comprometentes e 1 município (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

## **Fatos relevantes do mês**

Protocolada pela CT-EI Nota Técnica de aprovação do encerramento da cláusula 142 do TTAC em maio de 2022.

## Indicadores

### I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)

Percentual(%)

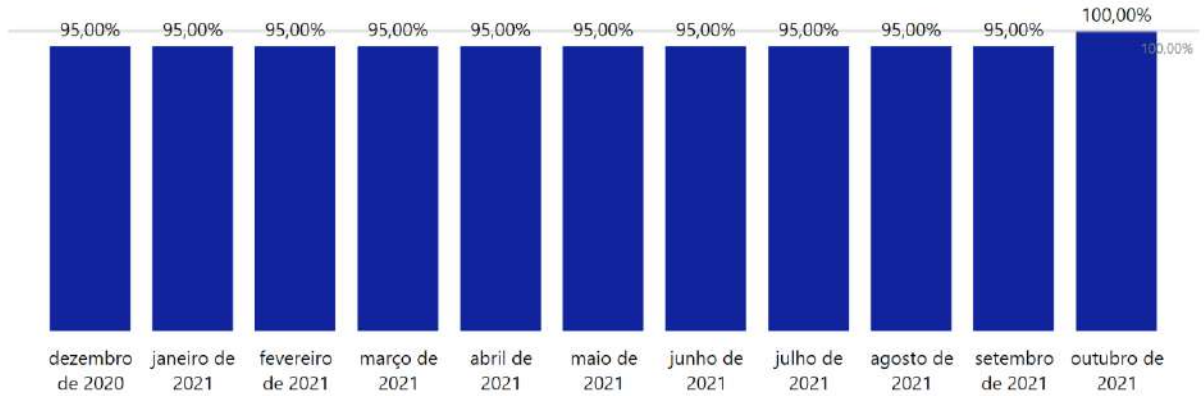


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

### I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Percentual(%)

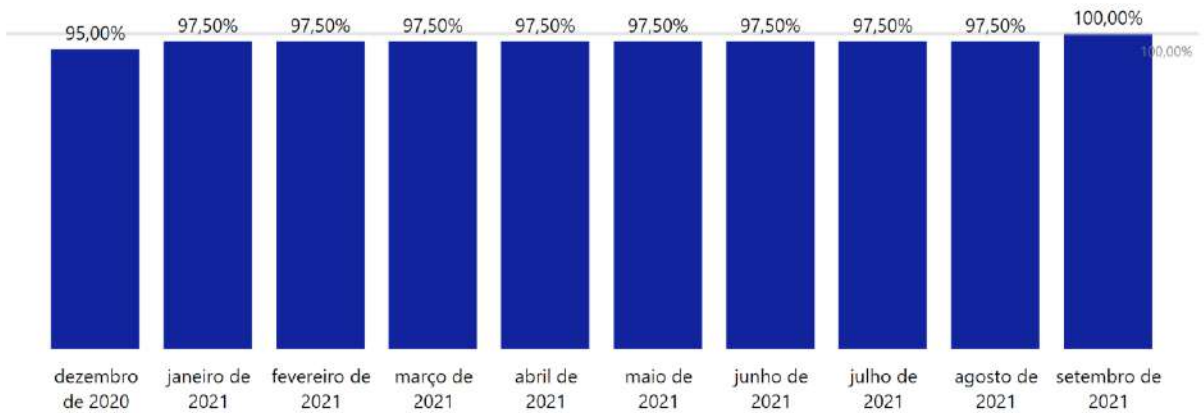


Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

## Indicadores

### I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Percentual(%)

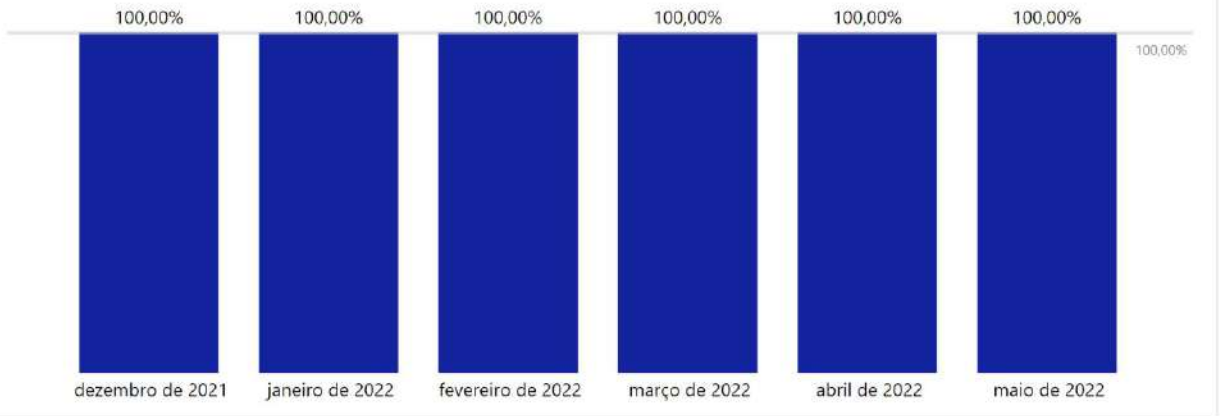


Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) – Frequência Mensal

100% se refere às solicitações feitas e já auditadas até maio de 2022.

## Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
  - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
  - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
  - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
  - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
  - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
  - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
  - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.



XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12<sup>o</sup> Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

## Taxa de acidentes registrados

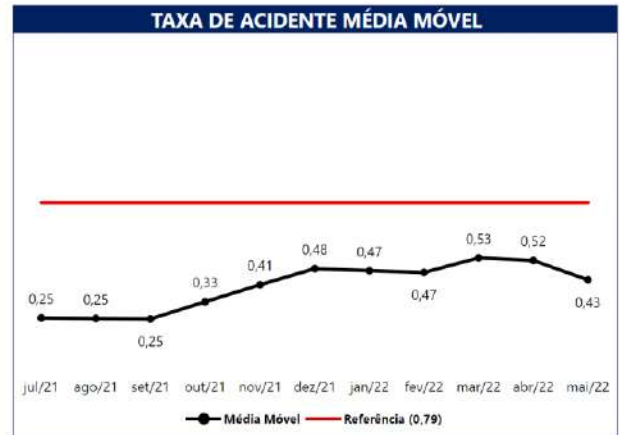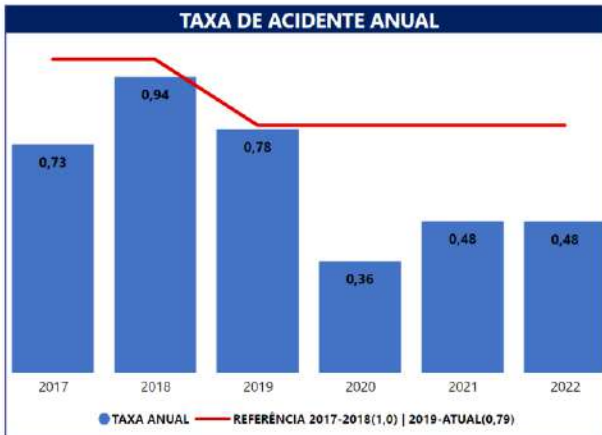

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

\* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

### Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

## Gestão Econômica\*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado				
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,4	3,4	-13,04034696	-79,295	4,79252631	3,40494753	-1,3875788	-28,953	
PG15	INOVAÇÃO	8,1	0,3	-	7,7	-96%	4,5	0,3	-4,2	-93%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	21,3	1,3	-	20,0	-94%	16,3	1,3	-15,0	-92%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,7	1,8	-	4,9	-73%	3,5	1,8	-1,7	-49%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	88,2	24,4	-	63,8	-72%	45,8	24,4	-21,5	-47%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	25,0	4,4	-	20,6	-83%	12,2	4,4	-7,8	-64%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	37,7	2,4	-	35,3	-94%	2,0	2,4	0,4	17%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,2	11,2	-	45,2	-80%	18,6	11,2	-7,4	-40%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	75,6	15,3	-	60,2	-80%	39,8	15,3	-18,5	-55%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22,6	5,4	-	17,2	-76%	8,7	5,4	-3,3	-38%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	8,6	1,3	-	7,4	-86%	3,1	1,3	-1,8	-60%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5,1	0,4	-	4,8	-93%	1,3	0,4	-1,0	-74%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	3,2	0,8	-	2,5	-75%	1,2	0,8	-0,4	-34%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	16,0	7,7	-	8,3	-52%	9,6	7,7	-1,9	-20%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	5,7	0,3	-	5,4	-95%	1,4	0,3	-1,0	-77%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	67,6	1,0	-	66,6	-98%	52,9	1,0	-51,8	-98%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
<b>Total Compensat. UCs</b>		<b>464,4</b>	<b>81,3</b>	<b>-</b>	<b>383,0</b>	<b>-82%</b>	<b>219,9</b>	<b>81,3</b>	<b>-138,6</b>	<b>-83%</b>
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAS	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
PG01	CADASTRO	23,6	11,5	-	12,1	-51%	14,5	11,5	-3,0	-20%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	5.151,9	1.096,4	-	4.055,5	-79%	4.325,9	1.096,4	-3.229,6	-75%
PG03	POVOS INDÍGENAS	305,0	20,4	-	284,6	-93%	60,0	20,4	-39,6	-66%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	39,1	3,5	-	35,6	-91%	38,2	3,5	-34,7	-91%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	21,8	1,7	-	20,1	-92%	10,6	1,7	-9,0	-84%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	95,8	49,8	-	46,0	-48%	39,6	49,8	10,2	26%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	10,2	3,4	-	6,8	-67%	4,4	3,4	-1,0	-23%
PG08	REASSENTAMENTO	1.787,9	397,7	-	1.390,3	-78%	711,1	397,7	-313,5	-44%
PG09	UHE CANDONGA	590,0	137,7	-	452,3	-77%	203,5	137,7	-65,8	-32%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	117,0	23,5	-	93,5	-80%	46,9	23,5	-23,4	-50%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	7,4	2,5	-	4,9	-67%	3,0	2,5	-0,5	-18%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	20,4	2,9	-	17,5	-86%	7,3	2,9	-4,4	-60%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	3,6	1,0	-	2,6	-72%	0,7	1,0	0,3	44%
PG14	SAÚDE	18,9	0,8	-	18,1	-96%	4,8	0,8	-4,0	-83%
PG16	PESCA	46,7	12,6	-	34,2	-73%	18,7	12,6	-6,1	-33%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	151,1	24,0	-	127,1	-84%	74,9	24,0	-50,9	-68%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	10,9	2,9	-	8,0	-73%	4,1	2,9	-1,2	-28%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	251,8	47,0	-	204,7	-81%	178,7	47,0	-131,7	-74%
PG23	MANEJO DE REJETOS	226,2	50,7	-	175,5	-78%	92,4	50,7	-41,7	-45%
PG24	CONTINÇÃO DE REJETOS	21,6	1,1	-	20,6	-95%	9,6	1,1	-8,5	-89%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	32,1	10,1	-	22,0	-68%	13,6	10,1	-3,5	-26%
PG28	BIODIVERSIDADE	101,8	36,1	-	65,7	-65%	50,8	36,1	-14,7	-29%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	49,1	10,0	-	39,1	-80%	16,6	10,0	-6,6	-40%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	140,0	36,4	-	103,6	-74%	61,6	36,4	-25,2	-41%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	36,9	14,0	-	23,0	-62%	14,9	14,0	-0,9	-6%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,3	1,4	-	5,9	-80%	3,7	1,4	-2,2	-61%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	300,9	120,0	-	180,9	-60%	132,4	120,0	-12,4	-9%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-	0%	-	-	-	0%	
PG99	CONTINGÊNCIA	200,7	-	-	200,7	-100%	80,9	-	-80,9	-100%
<b>Total Reparatórias</b>		<b>9.769,9</b>	<b>2.119,1</b>	<b>-</b>	<b>7.650,7</b>	<b>-78%</b>	<b>6.223,4</b>	<b>2.119,1</b>	<b>-4.104,3</b>	<b>-66%</b>
<b>Total Programas</b>		<b>10.234,2</b>	<b>2.200,5</b>	<b>-</b>	<b>8.033,8</b>	<b>-78%</b>	<b>6.443,3</b>	<b>2.200,5</b>	<b>-4.242,9</b>	<b>-66%</b>
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	199,2	58,2	-	141,0	-71%	80,63	58,2	-22,5	-28%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	23,5	1,5	-	22,0	-93%	9,9	1,5	-8,3	-84%
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>222,7</b>	<b>59,7</b>	<b>-</b>	<b>163,0</b>	<b>-73%</b>	<b>90,5</b>	<b>59,7</b>	<b>-30,9</b>	<b>-31%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>10.457,0</b>	<b>2.260,2</b>	<b>-</b>	<b>8.196,8</b>	<b>-78%</b>	<b>6.533,8</b>	<b>2.260,2</b>	<b>-4.233,7</b>	<b>-65%</b>



Mensal						
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGADORIAS EMERGENCIAIS	-	-	-	0%	NA
PG01	CADASTRO	2,2	1,9	0,3	-14%	<b>Postergação:</b> (R\$ 3,0MM) - Extensão do prazo para solicitações de Contestação e Reequadramento no fluxo Novel. Valor será remanejado para atendimento das demandas da primeira etapa da Judicialização da Retomada do Cadastro e extensão do prazo solicitado pela Cárta para o Cadastro de Mariana. <b>Plano de Ação:</b> Atendimento a demandas da primeira etapa da Judicialização da Retomada do Cadastro.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	645,3	114,0	531,3	-82%	<b>Postergação:</b> (i) 48% Novel Território: Paralisação de Homologação pela 12ª Vara; (ii) 43% refere-se ao Novel Mariana com a Paralisação de Homologação pela 12ª Vara e achatamento Curva de Ingresso e baixa Qualificação (iii) 9% relacionado a motivos diversos como atraso de Atendimento devido Discussão de estratégia de Atendimento LC21, PUD LC (Suspensão da Estratégia) e Indenização de Mariana pelo PIM, redução de ticket médio e maior avanço em negativas do que em pagamentos nos atendimentos mais recentes. <b>Postergação:</b> (R\$ 2,3 MM) O contrato 4800020507 foi medido parcialmente, no período de 21/03 a 20/04, visto a inexistência de saldo contratual e consequente necessidade regularização. Um novo contrato pretendido entrou em vigência em 21/04 e com possibilidade de medição a partir de 20/06. <b>Postergação:</b> (R\$ 2,7MM) Atividades do ponto crítico 30 paralisadas devido a pandemia e o contrato com a empresa encerrado para evitar novos pleitos.
PG03	POVOS INDÍGENAS	19,5	4,1	15,4	-79%	<b>Postergação:</b> (R\$ 30,2 MM), alteração de cronograma do SAA Comboios e Tupiniquim, PBA execução Comboios e Tupiniquim - Guarani, PBA Fundo Monetário Coletivo Comboios e Tupiniquim-Guarani, PBA Fundo Retomada Econômica Comboios e Tupiniquim-Guarani: As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBA. <b>Plano de Ação:</b> Para as ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental Indígena (PBAi ponto 3), foi feita a contratação emergencial de uma consultoria para a finalização do PBA conceitual, tendo sido finalizado em abril para a TI Combios e Aldeia Três Palmiras. Iniciado também o processo de contratação pretendida de nova consultoria para detalhamento executivo e execução de programas do PBAi. Após esse período os desvios começaram a ser corrigidos.
PG04	POVOS TRADICIONAIS	1,7	0,6	1,1	-67%	<b>Postergação:</b> (R\$ 34,0 MM) ampliação do tempo de negociação em função de divergências sobre o escopo e orçamento do Plano de Trabalho da execução do PBA pelos comunitários. <b>Plano de Ação:</b> Aceleração do processo de negociação e dos entendimentos sobre o processo de transição (Ex. contratação de consultoria para transição)
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	1,8	0,1	1,7	-94%	<b>Postergação:</b> (R\$9,0 MM) (R\$ 1,8 MM ) Plano Mariana - Prestação de contas não realizada pelo município, devido a liberação judicial da verba ter ocorrido somente em mar/22 (prestação de contas quadrimestral, portanto prevista para jul/22). (R\$5,8 MM )Planos Estaduais - Plano estadual de MG não será executado porque o estado declinou da negociação por entender que está sendo negociado no âmbito da repactuação. (R\$1,2MM) Planos Demais Municípios - Atraso na prestação de contas de Santana do Paraíso; Atraso na prestação de contas das entidades de S. J. Goiabai e Sooretama devido à entidade aprovada em edital ter declinado do projeto, sendo necessário abrir processo concorrential para contratação de nova entidade; entidades de Aracruz não utilizaram o valor repassado integral (previsão de medir valor correto na próxima prestação de contas). <b>Plano de Ação:</b> Plano Mariana e Planos Demais Municípios: Reprogramado no Draft 19. Planos Estaduais: remanejado para contingência no Draft 19. Planos Demais Municípios: acompanhamento presencial em Santana do Paraíso; contratação de entidades via processo concorrential previsto para iniciar atividades em junho/22; acompanhamento das atividades e prestação de contas de entidades em Aracruz.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	8,9	20,5	11,6	132%	<b>Antecipação:</b> R\$ 12,0 MM Assessorias Técnicas - Em 27/04/2022 (Samarco) houve liberação/resgate do montante de R\$ 12.036.355,88 do saldo bloqueado na ACP Mariana. Valor destinado ao pagamento de Cárta para custeio da assessoria técnica em 2022. <b>Antecipação:</b> R\$ 1,2 MM Canais - Ampliação da capacidade de atendimento do 0800 em atendimento a deliberação. Plano de Ação: revisão da redistribuição do pilar junto ao Draft 19] Solicitação de reclassificação dos gastos dos CIAs vinculando os contratos de prestação de serviço nos corretos DRs. <b>Postergação:</b> (R\$ 2,1 MM) Diálogo - Execução a menor decorrente da reprogramação necessária do programa destacando principalmente a realização dos fóruns de prestação de contas e implantação da plataforma interativa. Plano de Ação: Revisão das entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária e adequação no orçamento Draft 19. <b>Economia:</b> (R\$ 0,8 MM) Comunicação - Em razão da pandemia, os materiais impressos estavam sendo distribuídos apenas em versão digital, Contratos sob demandas não executados. Plano de Ação: Retorno da distribuição do material impresso e de atividades presenciais gradativamente, revisão orçamentária no draft 19/Jornal da comunidade.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,8	0,6	0,3	-32%	<b>Postergação:</b> <b>(R\$ 1,0 M):</b> Custos com manutenções estruturais nas fazenda; contratos de hospital veterinário sob demanda. Sem ocorrência de aquisições no primeiro quadrimestre de 2022. <b>Plano de Ação:</b> 1. Manutenções estruturais - Em andamento realização de contratação e mobilização de contratos suportes para execução das manutenções; 2. Compra de animais - Aguarda validação da estratégia de compra junto à Diretoria.
PG08	REASSENTAMENTO	165,8	103,0	62,9	-38%	<b>Postergação:</b> (R\$ 122MM) Novas Moradias   Contêntores - Chuva acima do previsto e pacotes em contratação (R\$ 27 MM) Condicionantes (OMAR, SAA Furquim, Ecoporto, em fases de negociação) (R\$ 26MM) Infra remanescente Bento e condicionantes Paracatu, em fase de contratação (Previsão Março/2022). (R\$ 25MM) Gesteira, aguardando definição judicial (R\$ 23MM) Contingência não utilizada (R\$ 20MM) Diversos - AECOM não realizado e reajuste de contratos lançados nos pacotes dos serviços. (R\$ 34MM) Demais pacotes - Equip Públicos (-16MM), Benefiteiros (-15MM), e outros (-3MM). <b>Economia:</b> (R\$ 36MM) Menor Custo Covid que o previsto no período e parte dos custos alocados nas linhas dos serviços. <b>Plano de Ação:</b> Novas Moradias   Contêntores - Traçar plano de recuperação junto às contratadas; Custo Covid - A curva será ajustada no Draft 19, de acordo com os protocolos sanitários; Infra Bento e Condicionantes Paracatu - Definição estratégica da contratação e início das obras em junho/2022.
PG09	UHE CANDONGA	69,2	44,3	24,9	-36%	<b>Postergação:</b> (R\$ 65,8MM) Serviços em fase de contratação / mobilização na recuperação da UHE devido a mudanças na metodologia de execução, com condicionantes e custos de apoio. Serviços de reforço do Barramento e infraestrutura das pilhas contratados e em fase de mobilização. Para o mês de maio estava orçado o valor de BRL 25MM de contingências que foi distribuído durante o ano. <b>Plano de Ação:</b> Mobilização de contratadas em andamento. Projeção de aumento da performance de execução a partir do mês de julho.
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	11,7	8,1	3,6	-31%	<b>Postergação:</b> (23,4MM) Recons. Estr. Rurais - Baixa performance do fornecedor aliado ao atraso no processo de contratação. Que foi cancelado, dando lugar a uma nova solução por pecúnia. Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações sofreram pelo excesso de chuvas e várias paralisações municipais nos primeiros meses do ano. Obras das Pontes e Campos de futebol foram prejudicadas pelo atraso nas negociações comerciais. Custos com Gerenciamento acompanham os projetos, 40% abaixo do previsto. <b>Plano de Ação:</b> Foram utilizados contratos guarda-chuva em andamento, para execução de serviços emergenciais. Novas contratações foram planejadas de forma a mitigar as perdas. Além das ações junto às contratadas visando o ganho de performance. Solução por pecúnia em andamento junto ao jurídico para o escopo de Estrut. Rurais Complexas.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	1,1	0,5	0,6	-55%	<b>Postergação:</b> Desvio referente a postergação do curso de especialização da URMG para 2023 (interface com o PG33). <b>Plano de ação:</b> Realocar a verba disponível em 2022 da especialização para as ações de transição vinculadas ao reassentamento de Bento Rodrigues, conforme diretrizes da FR, garantindo assim, o engajamento da comunidade escolar. Setembro/2022
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	0,7	0,6	0,1	-13%	<b>Postegação:</b> 95% mudança de solução decorrente da não formalização da parceria com o Instituto Pedra e 5% em relação a contratos de obras sob demanda. <b>Plano de Ação:</b> Lançamento do Edital Doce - Modalidade 3, estabelecimento de um contrato de manutenção predial para os imóveis e capelas e estabelecimento de acordo com a Arquidiocese.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,2	0,2	0,1	36%	<b>Antecipação:</b> Execução +, início das ações de promoção dos polos turísticos; e do projeto de fomento ao empreendedorismo inicialmente previstas para o segundo semestre de 2022. <b>Plano de Ação:</b> Manter a antecipação ações de promoção e fomento ao empreendedorismo.
PG14	SAÚDE	0,8	0,1	0,7	-86%	<b>Postergação:</b> (R\$ 4,0 MM) Plano Mariana: (R\$ 3,1 MM) prestação de contas será realizada pelo município em julho, devido à liberação da verba da conta judicial em março. Repasse será realizado mediante prestação de contas, conforme ACP. Plano Barra Longa: (R\$ 0,2 MM) Os valores orçados para a suplementação de mão de obra foram realizados de acordo com os valores do Contexto. Os valores praticados pelo município são menores que os orçados inicialmente. ARSI: (R\$ 0,7 MM) Estudos postergados no cronograma para set/22, aguardando decisão judicial. <b>Plano de Ação:</b> Reprogramar Draft 19.

PG	Programas	Mensal				Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%	
<b>Postergação (principais desvios negativos):</b> (R\$3,5MM) Caract. Soc. e Monitoramento Pesq: Mudança na estratégia e baixa performance do parceiro durante período Covid. Plano de Ação: Ajuste Draft 19. (R\$ 1,0 M) Cultivando para Pescar: Atraso nas medições anteriores devido as inconsistências nas documentações apresentadas. Plano de Ação: Regularizar pendências junto aos parceiros (06/22). (R\$ 1,0 M) Edital 1: Não execução devido ao Edital ter sido suspenso pelo CIF através da deliberação 542/21. Plano de Ação: 1- Uma nova proposta foi apresentada para Câmara Técnica (09/05). 2- Recurso realocado no Draft 19 para 1º semestre/2023. 3- Encaminhar proposta Técnica para CT-Água, a pedido do CT-Economia e Inovação. (R\$ 0,9 M) Plano de Recuperação Pesca: Decisão Liminar que suspendeu edital Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura em 09/08/21.						
PG16	PESCA	6,4	3,8	2,6	-41%	<b>Postergação:</b> (R\$ 29,85 MM) Gestão do PGL0. GDS não tem gestão do contrato das infraestruturas. Devido à baixa performance dos contratos de estruturas rurais complexas (RGL) e rede elétrica de média e baixa tensão (Engelg); os contratos foram desmobilizados. Sendo que esta demanda está em fase de estudo e validação para implantação através de pecúnia. <b>Plano de Ação:</b> Realização de projetos elétricos pela Equipe da Engenharia da Renova e instalação direto pela CEMIG; Aprovação da possibilidade de definitividade através da pecúnia junto a 12ª vara. (R\$ 1,61 MM) Redução no fornecimento de silagem no território 2 (Médio e Baixo Doce); suspensão por decisão do Juízo da 12ª Vara; Não adesão dos assentados do Assentamento Seziño (lote 4) à ATEs. <b>Plano de Ação:</b> Reprogramação dos desembolsos (revisados no DRAFT 19). (R\$ 12,18 MM) Atraso nas atividades de reparação dos danos e horas de assistência técnica (ATER) a jusante e montante por baixa performance do fornecedor; Reprogramação das atividades de unidades demonstrativas do EPAMIG; Baixa performance do Renova Rebanho; Medição dos serviços de gerenciamento abaixo do previsto; Desvio de medição. <b>Plano de Ação:</b> Execução do Plano de Aceleração da Retomada; Execução das atividades conforme reprogramação. (R\$ 2,27 MM) Atraso na contratação dos serviços de saneamento rural (MINIETES) devido alto valor de mercado e poucas empresas interessadas na execução do deste escopo. <b>Plano de Ação:</b> Empresa em processo de mobilização, com reprogramação dos desembolsos (revisados no DRAFT 19). (R\$ 2,2 MM) Reprogramação da Execução: ATER no Território 2; Baixa performance das instituições contratadas; público alvo abaixo do previsto nos editais, por baixa adesão e assistências de produtores do Programa. <b>Plano de Ação:</b> Reprogramação dos desembolsos (revisados no DRAFT 19). (R\$ 2,41 MM) Encerramento no fornecimento de silagem no Alto Doce devido a finalização da reparação; Unidades demonstrativas: desistência por parte da WRI; Economia após conclusão de implantação de hortas e pomares; Revisão de escopo e levantamento de demanda de Distribuição de recursos hídricos; Baixa aderência aos custos de logística e materiais previstos para o curso da EMATER por otimização dos recursos ao realizar junto com a ATER coleta. <b>Plano de Ação:</b> Reversão estratégia das atividades de Unidades Demonstrativas; Reprogramação dos desembolsos (revisados no DRAFT 19). (R\$ 0,93 M) Rateio de serviços administrativos de escritório (despesas diversas), de comunicação; Licenciamento ambiental. <b>Plano de Ação:</b> N/A (contratos sob demanda); +R\$ 0,58 M Avanço nas entregas de monitoramento da qualidade do leite; Avanço das entregas do restauro florestal de APP do Programa. <b>Plano de Ação:</b> N/A.
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	18,4	5,1	13,2	-72%	<b>Postergação (principal desvio):</b> (R\$ 0,7 M) Assessoria Técnica Foz (Linhares/ES) - Contrato Instituto Euvaldo Lodi: Atraso na execução do Contrato IEL, devido à dificuldade de adesão pelos atingidos ao Projeto, o que foi contornado com a apresentação dos resultados, porém o impacto permaneceu com a mudança de formato do projeto, de presencial para online, impactou positivamente no orçamento do contrato, por redução de custos com infraestrutura para os eventos. <b>Plano de Ação:</b> Divulgar os resultados das ações ofertadas aos negócios da primeira fase, atreladas a consultoria do IEL (Insumos e Equipamentos / Design Gráfico) visando a adesão de novos negócios Ação concluída.
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	1,0	0,7	0,3	-33%	<b>Postergação:</b> Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) impactado pelo andamento tímido dos atendimentos do PIM Convencional e Novel, em razão do avanço do sistema de indenização SPA.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	31,8	6,2	25,7	-81%	<b>Postergação:</b> (R\$ 2,4,10 MM) - Gestão da Gerência de Infra (PG10). UST não tem gestão sob as atividades do Barramento de Linhares; Redução das atividades medidas (atendimento); engenharia menor demanda do que planejado. Provavelmente tenha uma economia no final do ano. <b>Plano de Ação:</b> Readequação orçamentária no draft 19. Pois depende de ações no âmbito das ações judiciais. (R\$ 9,92 MM) Postergado por questões Judiciais: Atraso na deliberação externa do risco a saúde humana e Risco ecológico; Ausência de resposta de aprovação pela CT-GRSA e homologação pela 12ª Vara (ACP- Exco 2) sobre os documentos de metodologias e técnicas aplicados a análise de risco, o que não permite a execução da etapa 1b); Pendente a emissão da licença ambiental pelo órgão e ACP Excos; Os custos de ARSH e RE são considerados como contingência no Draft 19. <b>Plano de Ação:</b> Reprogramação a partir das decisões judiciais sobre os temas projetados no orçamento e cronograma. (R\$ 0,81 M) Impacto medição e registro contábil da parceria junto a UFV; Atraso no envio da medição das contratadas. <b>Plano de Ação:</b> Elaborar junto ao parceiro/prestador de serviço, um plano de ação para prestação de contas e desembolsos/medição conforme cronograma previsto na celebração da parceria/contrato. (R\$ 6,77 M) Atividades sob demanda. Até o momento as demandas foram abaixo do previsto. É uma característica dos contratos de manejo para o atendimento de demandas e cumprimento de prazos judiciais. <b>Plano de Ação:</b> Readequação orçamentária no DRAFT 19; Diligenciar os Contratos e /ou contratações de forma a trazer mais aderência física e financeira. (R\$ 0,12 M) Houve atraso na campanha de monitoramento devido ao intenso período chuvoso. <b>Plano de Ação:</b> Readequação orçamentária no DRAFT 19; Elaboração de plano de ação para execução das atividades neste período de seca.
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	1,7	0,1	1,6	-95%	<b>Postergação:</b> (R\$ 8,5MM) Obra do Dique 04 postergada para 2023.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,9	2,4	0,5	-18%	<b>Postergação:</b> (R\$ 0,31M) Desembolso previsto de Regularização dos Tributários (a contratar) não realizado pois está pendente retorno dos órgãos. <b>Plano de Ação:</b> Reprogramação a partir do retorno dos órgãos ambientais em relação do licenciamento protocolado em out/21. (R\$ 1,33 M) Desembolso Manutenção de Cercamento (Século XXI) menor que o previsto devido às chuvas (jan/22) e performance abaixo do esperado desde do início do contrato. <b>Plano de Ação:</b> Cronograma replanejado, junto a contratada visando a recuperação do atraso na execução, bem como, aplicação das ferramentas contratuais de notificação (R\$ 0,06 M) Desembolso previsto para o Gerenciamento do programa (Progen, MCA e EBI) menor que o previsto nos contratos da Progen e EBI. <b>Plano de Ação:</b> Cronograma replanejado no próximo Draft de acordo com o novo contrato. (R\$ 0,49 M) Desembolso Restauro Florestal (CONSORCIO ERG STCP) menor que o previsto devido às chuvas (jan/22), contrato encerrado com saldo. Previsão de contratação com Pedido de Usuário e Pequenas Compras (PÓS CANDONGA) não realizado. <b>Plano de Ação:</b> Cronograma replanejado para a criação dos Pedidos de Usuário em função de alteração do procedimento de suprimentos e estratégia do programa. (R\$ 0,31 M) Desembolso fornecimento de postes de eucalipto para execução e manutenção de Cerca (SM ANGELO) via Pedido de usuário não realizado devido ao pedido ter sido cancelado, fornecedor rescindiu o contrato. <b>Plano de Ação:</b> Cronograma replanejado com a retirada deste pedido e inclusão de um novo fornecedor (ANTONIO GARAVINI E CIA LTDA) no novo draft. (R\$ 0,24 M) Desembolso Conv. Recup. ecológica área ambiental 1 (SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES) menor que o previsto. Nova contratação prevista (aditivo) não realizado desembolso. <b>Plano de Ação:</b> Cronograma replanejado e Plano de ação de recuperação do atraso na Execução. (R\$ 0,19 M) Desembolso previsto PSA Áreas impactadas (Mariana/Barra Longa/Ponte Nova/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce) não realizado. <b>Plano de Ação:</b> Cronograma replanejado em alinhamento com a nova estruturação do PG25. Alteração da data anual de pagamento.
PG28	BIODIVERSIDADE	35,7	1,2	34,4	-97%	<b>Postergação:</b> (R\$11,10MM): Atividades da Ambipar (Monitoramento Anexo 1) iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta, que impediu o início do plano de transição. Alterações de estratégia de execução do PMBA - não implantação do plano de transição, que previa dois novos ACTs (desembolsos das primeiras parcelas). (R\$2,31 MM): Reprogramação da execução - AVALIAÇÃO INTEGRADA DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS; DESENVOLVIMENTO SOFTWARE BIODIVERSIDADE, PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA BIODIVERSIDADE (R\$0,69 MM): Reprogramação da execução - GRUPO DE ESPECIALISTAS, OUTROS (Gerenciamento, Comunicação, Conscientização) (R\$0,58 MM): Atraso na elaboração e execução do Plano de Ação (CI.164 Item c)
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	3,9	0,5	3,3	-86%	<b>Plano de Ação:</b> Novo Aditivo ao ACT FEST/UFES para promover a continuidade do PMBA. Laia Medeiros - 15/08/2022 Sem previsão de necessidade para contratos sob demanda, com saldo remanejado para uso em outros projetos do programa.
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	9,2	4,1	-31%	<b>Postergação:</b> Atraso na execução das campanhas, realização das análises laboratoriais e consequentemente a entrega dos relatórios da campanha, gerando reprogramação do cronograma de pagamento. Houve também replanejamento da contratação de um monitoramento único (Fauna e Flora) de Biodiversidade previsto no draft18, gerando alteração no cronograma de mobilização; Atraso nas contratações da Parceria para implementação do Banco de Dados, do Portal, do Livro e Execução do PAN; <b>Plano de Ação:</b> Gestão junto as contratadas para cumprimentos dos prazos e entrega dos produtos; O ajuste referente a nova estratégia contratual de execução do Programa de Monitoramento foi atualizado no DRAFT 19.
<b>Postergação: (2,5,2MM)</b> Adutora-GV - Atraso na contratação do Pacote 02 da Adutora, devido à questões comerciais e de mercado. A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o planejado até o presente momento. Infra-GV - Atraso no início da contratação do novo Contrato Guarda-Chuva / MG, no qual estão previstas 2 obras da APRO 153/2021. Engenharia - atividades de sondagem/topografia/batimetria: N/A. Engenharia - Atividades de sondagem/topografia/batimetria: N/A. Infra RD - Atividades aguardando deliberações externas   baixa performance do fornecedor   Baixa aderência das empresas no processo de contratação. <b>Plano de Ação:</b> Adutora-GV : Pacote 02 com serviços em andamento, atuando na recuperação. Infra-GV: Reuniões semanais com a área de Suprimentos da FR visando agilidade no processo de Contratação (Previsão de conclusão da contratação 08/07/22). Engenharia - atividades de sondagem/topografia/batimetria: N/A. Engenharia - Atividades de sondagem/topografia/batimetria: N/A. Infra RD: Suprimentos realizando uma nova rodada de negociação com os fornecedores, setores atuando constantemente em reuniões para conseguir deliberações externas.						

		Mensal				
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	-	-	-	0%	NA
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	4,3	3,4	-0,8	-19%	<b>Reclassificação:</b> +R\$0,58 MM: Transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cheias do PG34 para PG38, após aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 (a previsão era dez/21). <b>Postergação:</b> (R\$1,5MM): Serviços sob demanda ainda não iniciados aguardando definição estratégica. <b>Plano de Ação:</b> Alinhamento com os programas Bio e Manejo para definir estratégia de utilização dos serviços sob demanda.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCS	0,8	0,1	-0,7	-93%	<b>Reparatório (cláusula 181)</b> <b>Postergação:</b> Readequação do cronograma de entregas que ocasionou o atraso no pagamento do fornecedor. <b>Plano de Ação:</b> Readequar o cronograma com revisão da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	25,3	25,3	0,0	0%	<b>Postergação:</b> (R\$ 5,6 MM): Erro de previsão do mês de alocação (Microsoft, Concur, Success Factors e Webgis); (R\$ 3,3 MM): atraso da entrada de NF Auditoria (EY) e aluguel de veículos; (R\$ 2,5 MM): contratos sob demanda temporários não utilizados; (R\$ 1,5 MM): outros serviços postergados em diversas áreas; R\$ 1,3 MM: Painel Rio Doce; <b>Economia:</b> (R\$ 0,8 MM) Despesa de Viagem
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-	0%	N/A
PG99	CONTINGÊNCIA	11,8	-	-11,8	-100%	N/A
<b>Total Reparatórios</b>		<b>1.107,4</b>	<b>366,1</b>	<b>-741,3</b>	<b>-67%</b>	
<b>Total Programas</b>		<b>1.147,4</b>	<b>389,6</b>	<b>-757,8</b>	<b>-66%</b>	
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	16,27	13,60	-2,67	-16%	<b>Postergação:</b> (R\$ 16,0 MM): Serviços Contratados; Serviços de Comunicação (R\$ 7,4 MM), Consultoria jurídica e perícia (R\$ 3,1 MM), Compliance (R\$ 1,4 MM), Operação e manutenção de sistemas TI (R\$ 1,0 MM) e outros contratos sob demanda (R\$ 3,1 MM). (R\$ 1,5 MM): Despesas com Pessoal: (R\$ 0,7 MM) Treinamentos e workshops; (R\$ 0,8 MM) Horas Extras está com variação pois está orçada em Gestão de Pessoas e é realizada nos centro de custos correspondentes. (R\$ 0,4 MM): Despesas com Seguro e outros. <b>Economia:</b> (R\$ 0,6 MM): Despesas de Viagens e outras economias com Pessoal no administrativo; (R\$ 4,0 MM): Ativo Fixo, antecipação da compra de computadores para o final de 2021.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	1,9	0,4	-1,6	-81%	<b>Postergação (pendente de prestação de contas):</b> (R\$ 6,1 MM) Câmaras Técnicas; (R\$ 1,6 MM) Custeio Atingidos Reuniões; (R\$ 0,5 M) CIF; (R\$ 0,1 M) Auditoria Gerenciadoras.
<b>Total Despesas Administrativas</b>		<b>18,2</b>	<b>14,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-23%</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>1.165,6</b>	<b>403,6</b>	<b>-762,0</b>	<b>-65%</b>	

\*Valores em milhões de reais.
