



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Agosto/2022

Sumário

Apresentação	<u>5</u>
Sumário Executivo	<u>6</u>
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	<u>12</u>
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	<u>20</u>
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	<u>27</u>
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	<u>35</u>
PG005 Programa de Proteção Social	<u>43</u>
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	<u>52</u>
PG007 Programa de Assistência aos Animais	<u>95</u>
PG008 Reconstrução de Vilas	<u>105</u>
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	<u>121</u>
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	<u>144</u>
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	<u>153</u>
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	<u>164</u>

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<u>170</u>
PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	<u>178</u>
PG015 Promoção da Inovação	<u>187</u>
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	<u>194</u>
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	<u>201</u>
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	<u>212</u>
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	<u>220</u>
PG020 Estímulo à Contratação Local	<u>227</u>
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	<u>236</u>
PG023 Manejo de Rejeitos	<u>242</u>
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	<u>251</u>
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	<u>258</u>
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	<u>265</u>
PG028 Conservação da Biodiversidade	<u>272</u>
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	<u>279</u>
PG030 Fauna e Flora terrestre	<u>285</u>
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	<u>291</u>
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	<u>304</u>

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	<u>312</u>
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	<u>318</u>
PG035 Programa de Informação para a População	<u>325</u>
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	<u>331</u>
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	<u>339</u>
PG039 Unidades de Conservação	<u>349</u>
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	<u>357</u>
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	<u>364</u>
Glossário	<u>371</u>
Gestão Econômica*	<u>377</u>

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações realizadas pelos programas em agosto de 2022, distribuídas nos três grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em agosto foi realizada a primeira etapa do Seminário de Revisão Bi-anual do PMQQS em BH (PG038, pág. 339).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas ações do manejo de rejeitos, que em agosto ocorreu a reunião gerencial realizada em 09/08 para tratar do estudo hidrossedimentológico e geomorfológico (PG023, pág. 242). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 121) a qual, até o mês de agosto, bombeou cerca de 959 mil m³ de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 95), a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 432 animais nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem, geraram até agora 1.804 prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No Alto Rio Doce houve a conclusão da instalação de sistema de tratamento de esgoto doméstico, nas propriedades atendidas e elegíveis no município de Ponte Nova (PG017, pág. 201). No Médio Rio Doce foi realizada colheita do projeto feijão de Rio Casca, em parceria com Economia e Inovação, Diálogo da Calha e PG17.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 — respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág. 258) e de Nascentes (pág. 265), em agosto houve a visita do conselho curador, comitê sócio-ambiental e diretoria nas atividades de campo do PG 26 e PG 27 em Colatina/ES_PG's 26 e 27, confecção dos Kits didáticos de apoio a capacitação de coletores da Rede de sementes e Mudanças_PG's 26 e 27, mobilização de coletores de sementes nas comunidades quilombolas.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 35.318 cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.559 pessoas, desde o início do programa até agosto/2022.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do programa (PG002, pág. 20). No mês de agosto, em relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 770 indenizações, o que representa 99,5% do total das 787 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág. 236), atualmente existem 16.024 pessoas assistidas, com um total de 7.162 pagamentos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos Indígenas (PG003, pág. 27) e de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004, pág. 35). No âmbito do programa 03, o pagamento do auxílio subsistência financeira foi realizado a 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, além disso, receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração. Em relação ao programa 04, houve a retomada do contrato da empresa PACATU (execução dos Programas 01, 02 e 10 do Plano Básico Ambiental Quilombola), atendendo solicitação da Comissão Quilombola de Degredo.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 43) e de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG014, pág. 178) operam com grande sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a conclusão das atividades e atendimentos às famílias vulneráveis atingidas, conforme planos de trabalho acordados com os municípios de Santana do Paraíso e Bom Jesus do Galho, conclusão de mais duas turmas de capacitação para os operadores

de proteção social dos municípios atingidos com o tema "Vigilância Socioassistencial", com foco na qualidade de atendimento às famílias atingidas e respectivo monitoramento das informações. Ainda em agosto, houve a assinatura do termo de cooperação técnica e financeira para execução do plano de reparação em proteção social com o município de Aimorés, dentre outras ações.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011, pág. 153), de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012, pág. 164), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033, pág. 312) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034, pág. 318).

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população (PG006, pág. 52; PG035, pág. 325 e PG036, pág. 331), seja pelo site, integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031, pág. 291), em agosto de 2022 foram repassados R\$ 2.140.228,08 para ações dos municípios de Bugre, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Naque, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, Timóteo e consórcio Condoeste.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 144), em agosto ocorreu Conclusão de 01 propriedade (D016) no projeto de proteção de taludes das estruturas complexas, conclusão das obras do Bueiro Curvinas e Bueno em Barra Longa.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 105) prevê três reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de agosto:

Bento Rodrigues — em agosto, ocorreu a finalização de obra dos Ids 71-UH1, 71-UH2, além da entrega das obras dos Ids 93 C, 185, 65, 96, 41, 30 e 110.

Paracatu de Baixo — em agosto, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Gesteira — em agosto, não houve fatos relevantes a serem reportados.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida (origem). Em agosto houve a entrega de obras no âmbito do Familiar e das Reconstruções.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializado
Deliberação	127	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	141	1	Judicializado
Deliberação	141	2	Concluído Internamente
Deliberação	141	3	Concluído Internamente
Deliberação	141	5	Concluído Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	234	3	Concluído Internamente
Deliberação	251	1	Concluído Internamente
Deliberação	277	único	Judicializado
Deliberação	346	2	Concluído Internamente
Deliberação	58	2	Judicializado
Deliberação	58	3	Judicializado
Deliberação	71	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	93	2	Concluído Internamente
Deliberação	93	3	Concluído Internamente
Deliberação	93	4	Concluído Internamente
Deliberação	93	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 175.755 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.318 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.559 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Percentual(%)

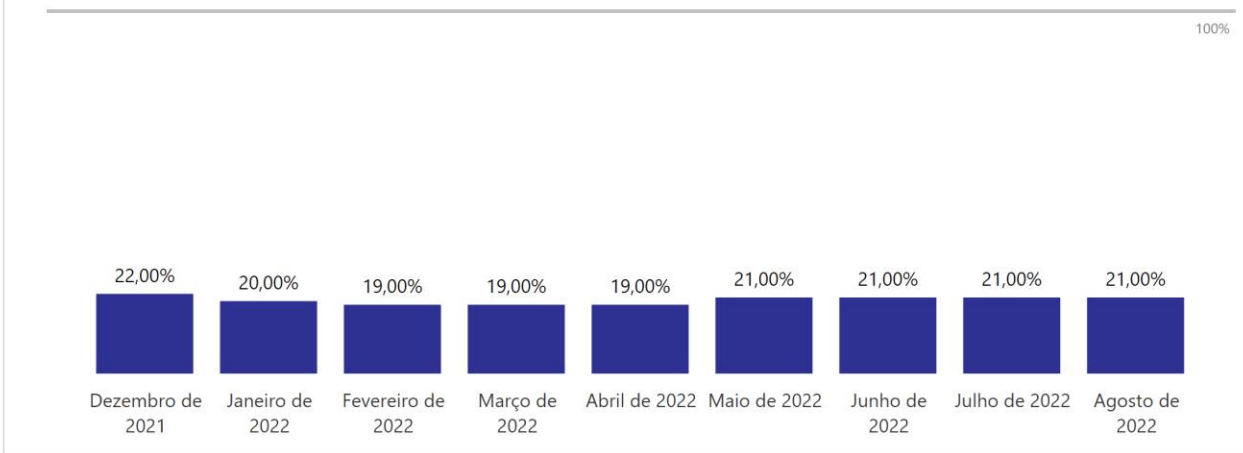


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

O indicador de atendimento não registrou evolução em função de ajustes internos na etapa de consistência dos dados coletados na pesquisa socioeconômica

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Percentual(%)

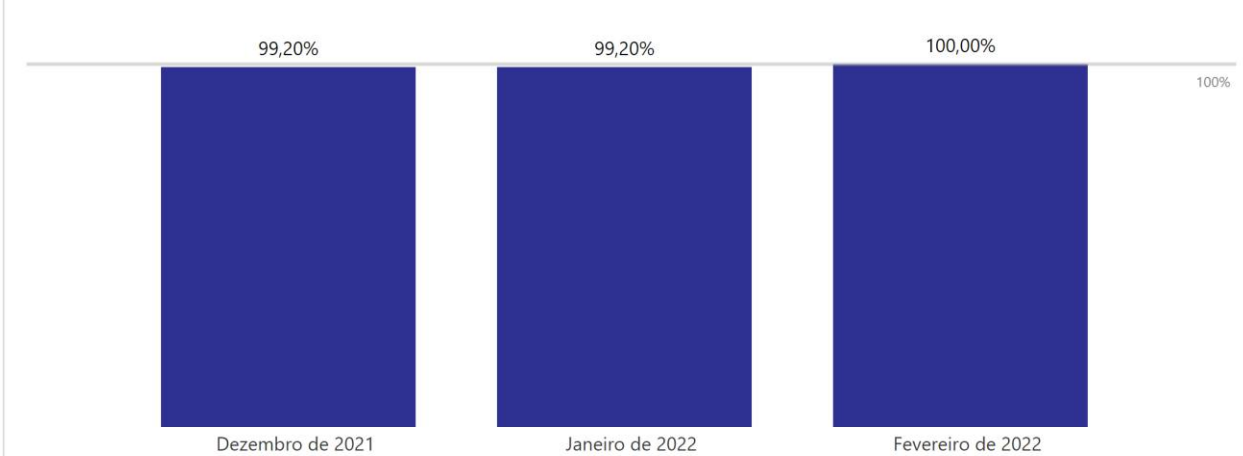


Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

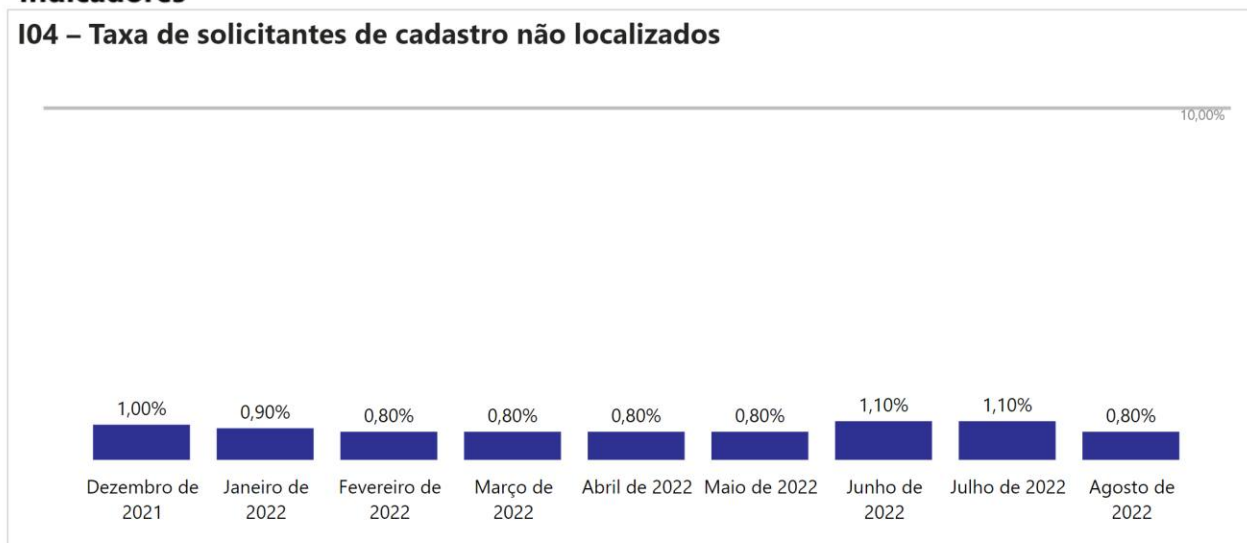


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

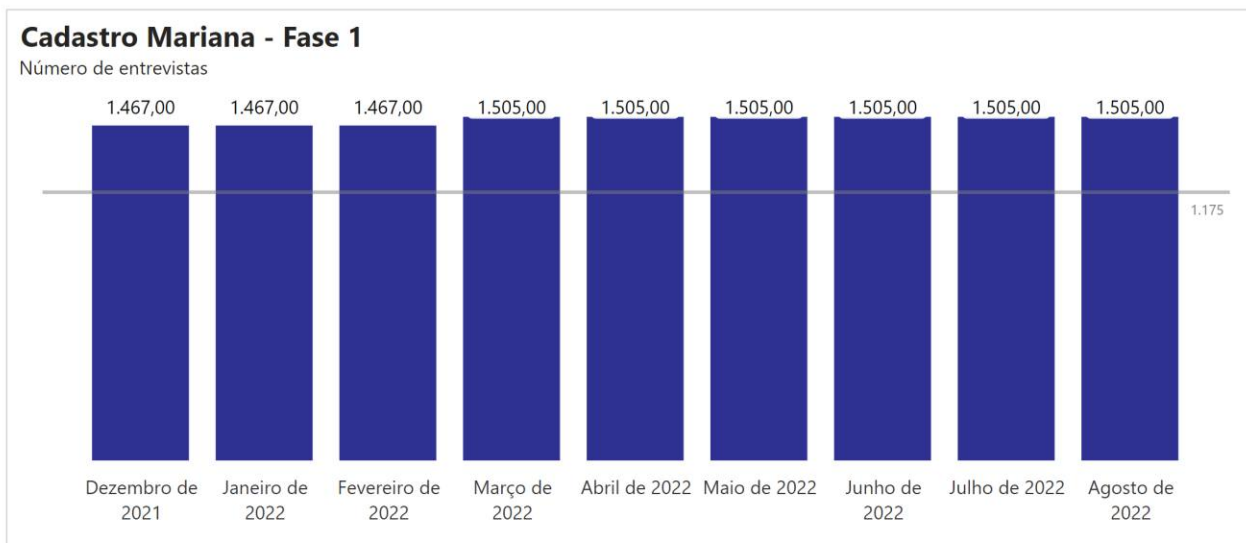


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

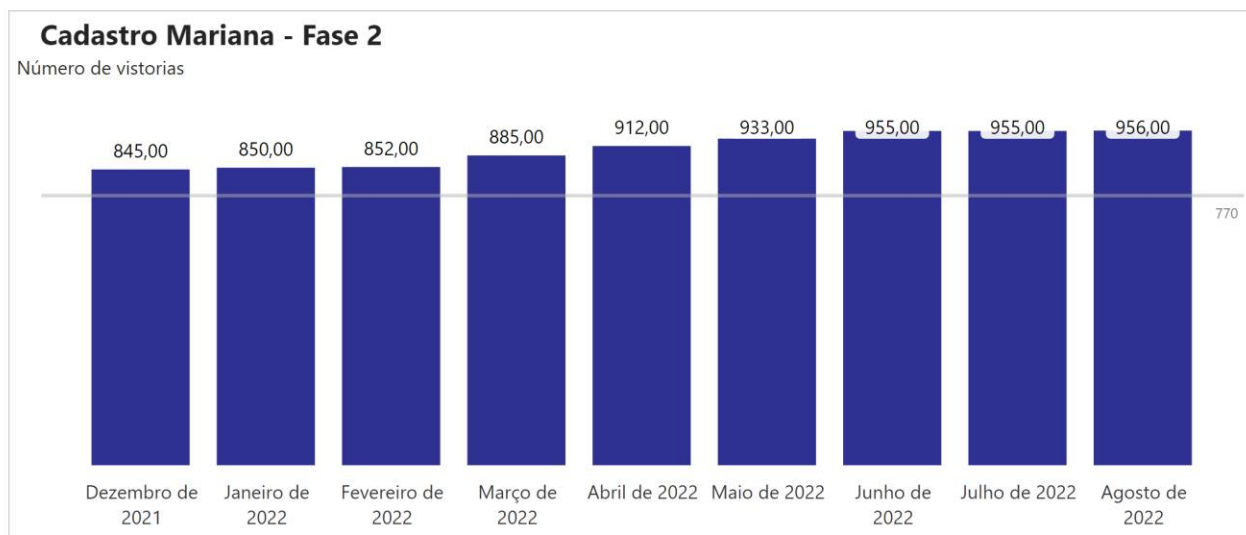


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializado
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializado
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializado
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializado
Deliberação	118	2	Judicializado
Deliberação	119	10	Concluído Internamente
Deliberação	119	2	Concluído Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializado
Deliberação	119	5-b	Judicializado
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializado
Deliberação	181	7	Judicializado
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluído Internamente
Deliberação	182	3	Judicializado
Deliberação	211	2	Judicializado
Deliberação	236	único	Concluído Internamente
Deliberação	469	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179 pessoas, sendo que 270.372 aceitaram propostas. Destas, 264.997 propostas já foram pagas (98,0% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R\$ 304,17 Mi** .
- **Para Danos Gerais**, 10.704 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.654 já foram pagos (99,5% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R\$ 1.763,77 Mi** .
- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 770 indenizações, o que representa 98% do total das 787 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 69.863 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 12ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 770 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 97,8% do total das 787 propostas aceitas. Foram 3 indenizações pagas no mês.

Indicadores

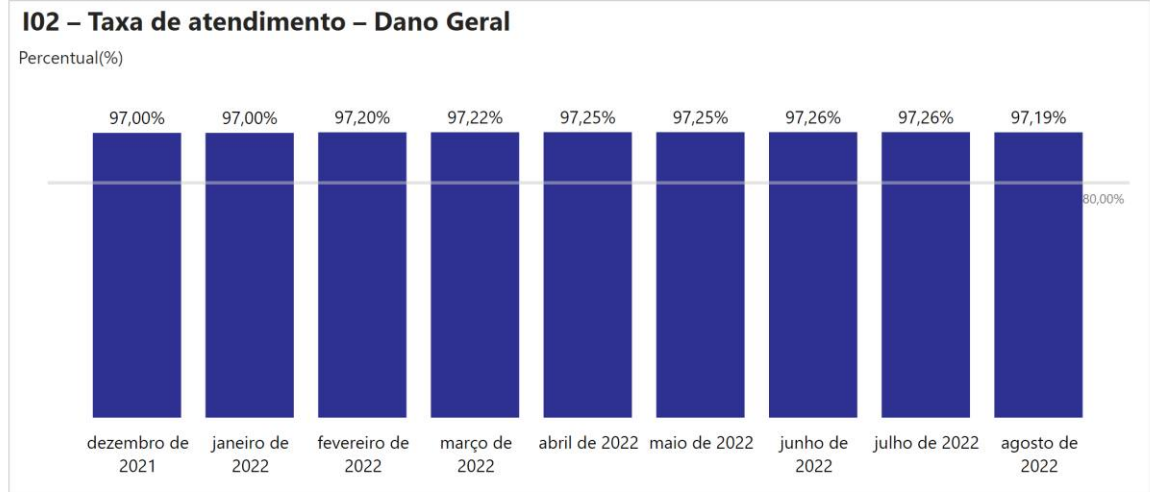


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

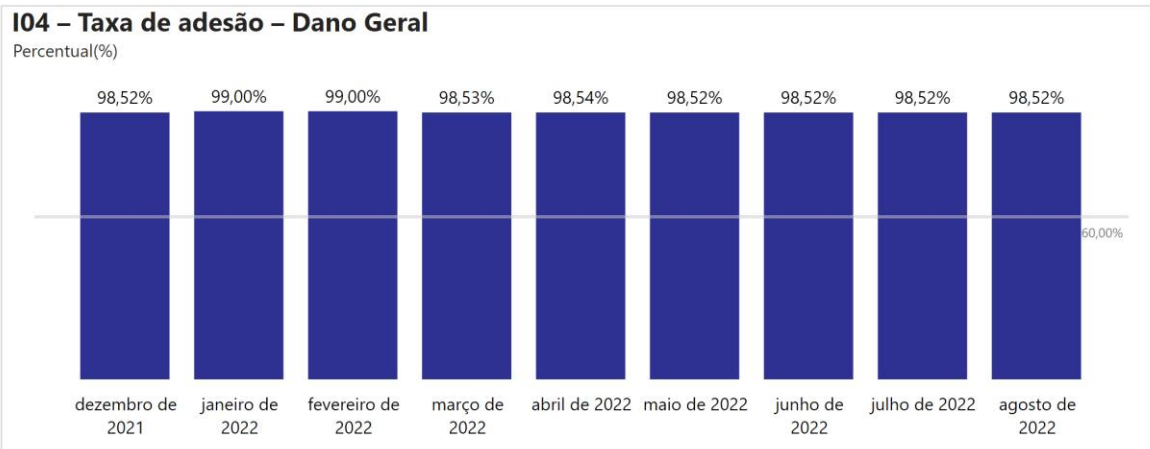


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

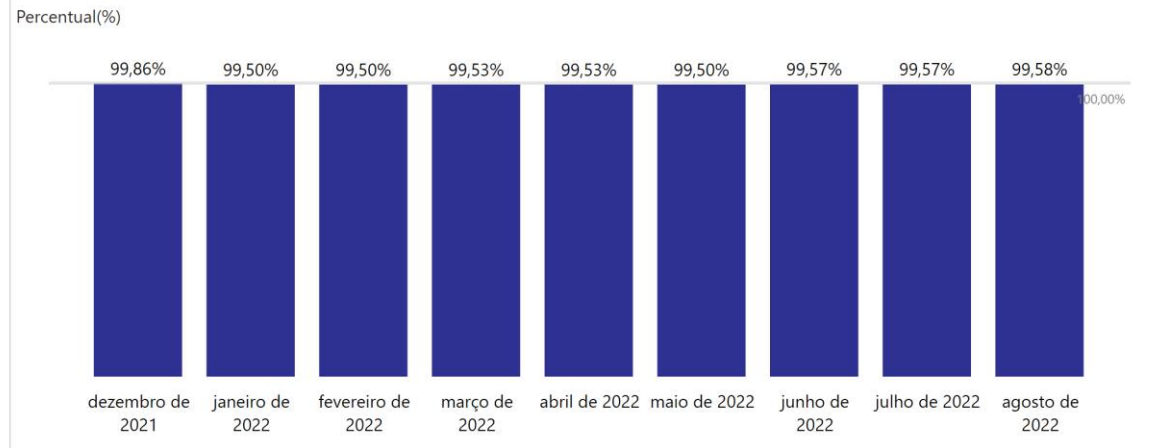


Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	43	§1º	A vencer - em andame...
Cláusula	43	Inc I	A vencer - em andame...
Cláusula	43	Inc II	A vencer - em andame...
Cláusula	43	Inc III	Concluída no prazo
Cláusula	43	Inc IV	A vencer - não iniciado
Cláusula	43	Inc V	A vencer - não iniciado
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída no prazo
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída no prazo
Cláusula	44	Inc II	A vencer - em andame...
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída no prazo
Cláusula	44	Inc IV	A vencer - em andame...
Cláusula	44	Inc V	A vencer - não iniciado
Deliberação	169	1	Concluído Internamente
Deliberação	206	1	Em Andamento
Deliberação	227	1	Concluído Internamente
Deliberação	227	2	Concluído Internamente
Deliberação	299	único	Concluído Internamente
Deliberação	335	2	Concluído Internamente
Deliberação	335	3	Concluído Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	1.1	Em Andamento
Deliberação	445	2.1	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluído Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- outubro de 2022 ● Aprovação da deliberação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
- outubro de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas à Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT)
- outubro de 2022 ● Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ao Comitê Interfederativo (CIF)

Grandes números do programa

- 600 **pessoas abastecidas com água mineral** Povos Indígenas de Resplendor (total de 93 Mil litros);
- 142 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4.353 m³);
- 65 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.561 m³).

Fatos relevantes do mês

Tupiniquim-Guarani

Em agosto foi realizado o protocolo do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) conceitual à FUNAI e o início da execução do PBAI com o Programa de Retomada Econômica. A Fundação Renova repassou, através de transferência eletrônica, um total de R\$8.387.037,50 as 06 associações indígenas (AITG; ATUGUAA; ATCV; AITUPAIRA; ATUPIAPABRA; AITAA), registradas sob os números de CNPJ (02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; 31.585.246/0001-04; 15.829.241/0001-15; 09.569.165/0001-53; 19.266.784/0001-22 Respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1.293 famílias indígenas das terras indígenas de Caieiras Velhas II e Tupiniquim de Aracruz. As 1.293 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 677 famílias da AITG, 56 famílias da ATGUAA, 19 famílias da ATCV, 201 famílias de Irajá; 278 famílias de ATUPIAPABRA; 62 famílias de AITAA. O total de R\$ R\$ 8.387.037,50, compreende o pagamento R\$ 6.486,49 para cada uma das 1.293 famílias referente a 1ª parcela do Programa de Retomada Econômica.

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 36.560 litros distribuídos nos dias 21 e 28 de Julho, 05, 11 e 18 de Agosto de 2022 (total de 1828 galões de 20 litros).

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 26 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R\$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias

Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/07/2022 até 20/08/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/07/2022 até 20/08/2022

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/07/2022 até 20/08/2022

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/07/2022 até 20/08/2022

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo






Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluído Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluído Internamente
Cláusula	46	caput	Concluído Internamente
Cláusula	50	caput	Em Andamento
Deliberação	154	1	Concluído Internamente
Deliberação	161	1	Concluído Internamente
Deliberação	281	1	Concluído Internamente
Deliberação	298	1	Concluído Internamente
Deliberação	329	1	Concluído Internamente
Deliberação	430	1	Concluído Internamente
Deliberação	494	1	Concluído Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluído Internamente
Deliberação	155	2	Concluído Internamente
Deliberação	298	2	Concluído Internamente
Deliberação	430	2	Concluído Internamente
Deliberação	494	2	Concluído Internamente
Deliberação	281	3	Concluído Internamente
Deliberação	423	3	Concluído Internamente
Deliberação	281	4	Concluído Internamente
Deliberação	423	4	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluído Internamente
Deliberação	355	1	Em Andamento
Deliberação	300	1	Judicializado
Deliberação	300	2	Judicializado
Deliberação	333	2	Judicializado
Deliberação	493	2	Judicializado
Deliberação	493	3	Judicializado
Deliberação	501	3	Judicializado

Deliberação	161	2	Concluído Internamente
Deliberação	161	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	1	Concluído Internamente
Deliberação	202	2a	Concluído Internamente
Deliberação	202	2b	Concluído Internamente
Deliberação	202	2c	Concluído Internamente
Deliberação	202	3	Concluído Internamente
Deliberação	202	4	Concluído Internamente
Deliberação	202	5	Concluído Internamente
Deliberação	203	1	Concluído Internamente
Deliberação	501	1	Judicializado

Entregas do ano de 2022

- janeiro de 2022  Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo
- novembro de 2022  Submissão da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à diretoria da Fundação Renova (Degredo)
- dezembro de 2022  Deliberação da aprovação do documento de definição do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais à CT-IPCT
- dezembro de 2022  Envio da versão final da revisão do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais ao CIF

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Retomada do contrato da empresa PACATU (execução dos Programas 01, 02 e 10 do Plano Básico Ambiental Quilombola), atendendo solicitação da Comissão Quilombola de Degredo.

Fiscadores

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	180	1	Concluído Internamente
Deliberação	192	2	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	1	Concluído Internamente
Deliberação	307	2a	Concluído Internamente
Deliberação	330	único	Concluído Internamente
Deliberação	332	único	Concluído Internamente
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	533	4	Judicializado

Entregas do ano de 2022

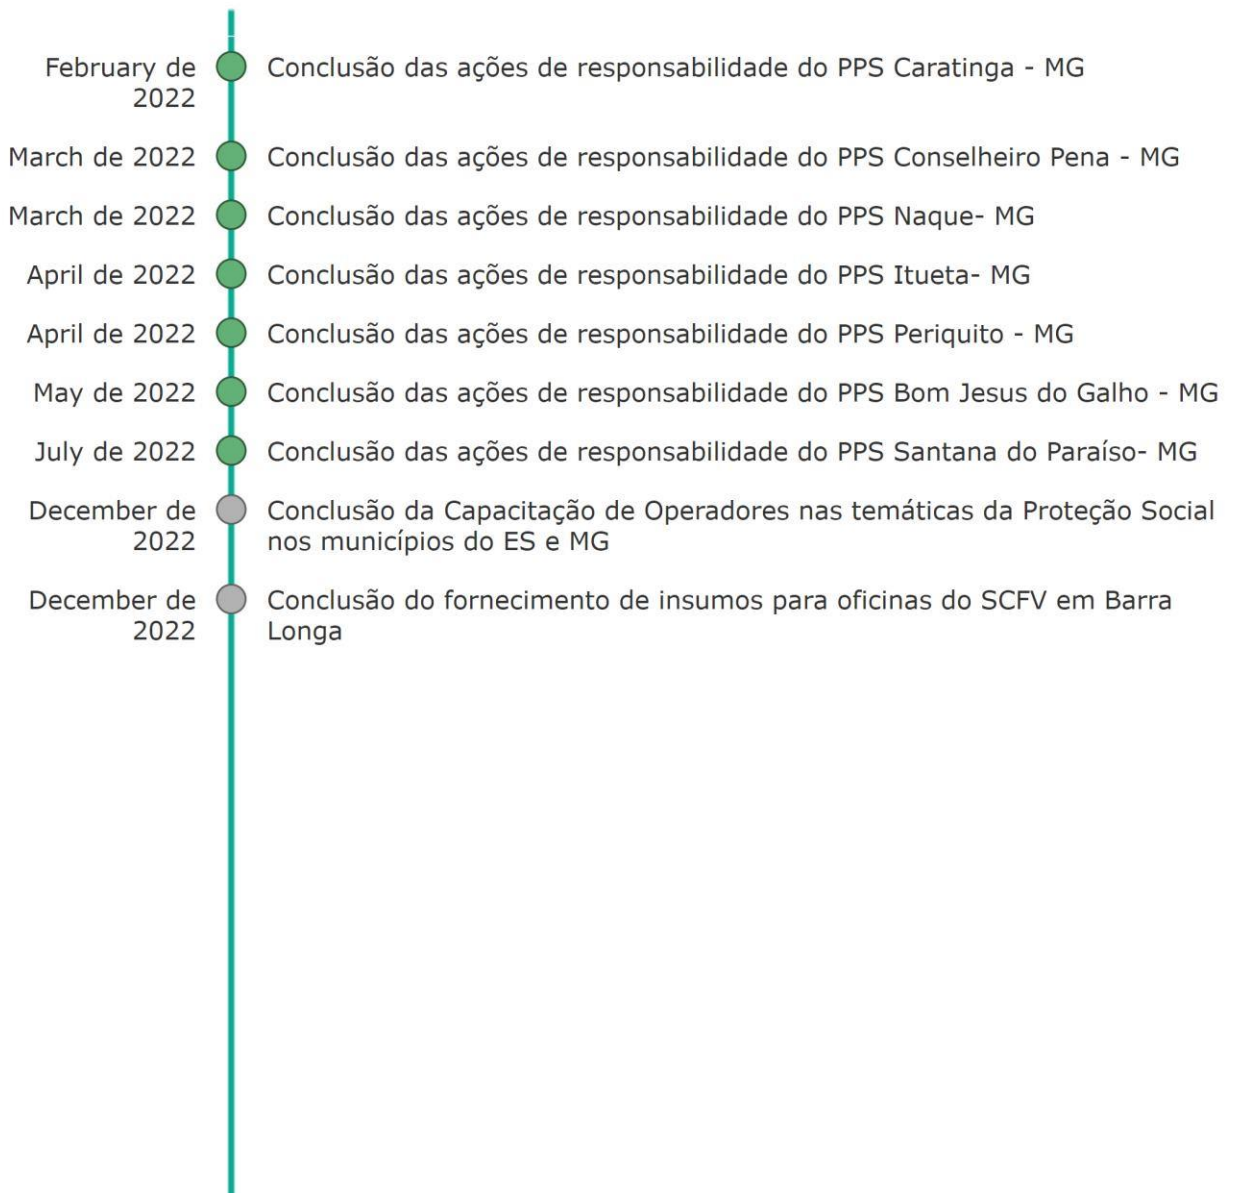

● Concluído
 ● Planejado
 ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de **89 profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- **Repasso financeiro de RS 12.70M**, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;
- Disponibilização de **16 veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;
- **23370 famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Reuniões de acompanhamento dos planos municipais e estadual, com participação de atingidos, representantes dos municípios/estado e representantes da Fundação Renova, no município de estado do Rio Doce e Espírito Santo.

Repasse de recursos para municípios e entidades, conforme previsto nos planos de reparação pactuados, para desenvolvimento de atividades com as famílias vulneráveis atingidas, com vistas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Criação do COMAPPS (Comitê de Acompanhamento das Ações do Programa de Proteção Social) nos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Marilândia.

Conclusão de mais duas turmas de capacitação para os operadores de proteção social dos municípios atingidos com o tema "Vigilância Socioassistencial", com foco na qualidade de atendimento às famílias atingidas e respectivo monitoramento das informações.

Conclusão das atividades e atendimentos às famílias vulneráveis atingidas, conforme planos de trabalho acordados com os municípios de Santana do Paraíso e Bom Jesus do Galho.

Assinatura do termo de cooperação técnica e financeira para execução do plano de reparação em proteção social com o município de Aimorés.

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

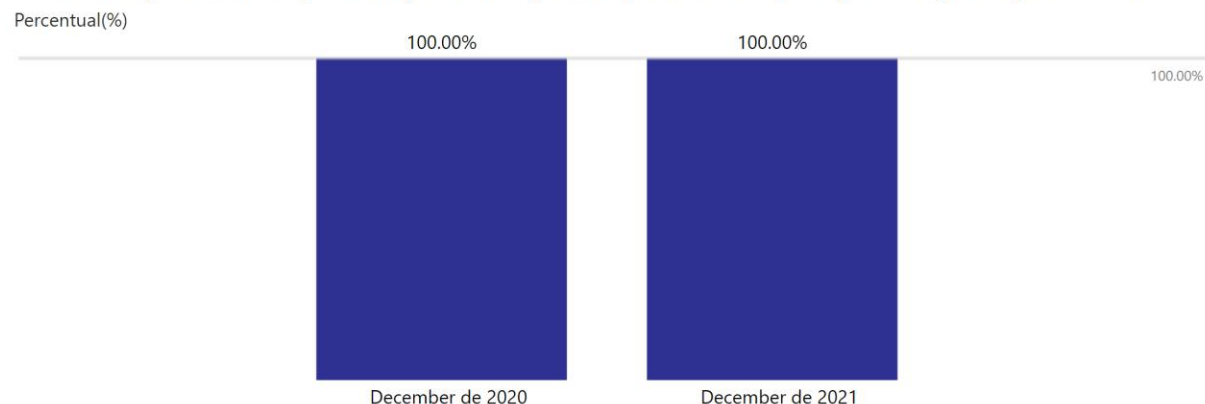


Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

Memória de Cálculo do Programa: 37/37 (36 municípios e 1 estado)

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

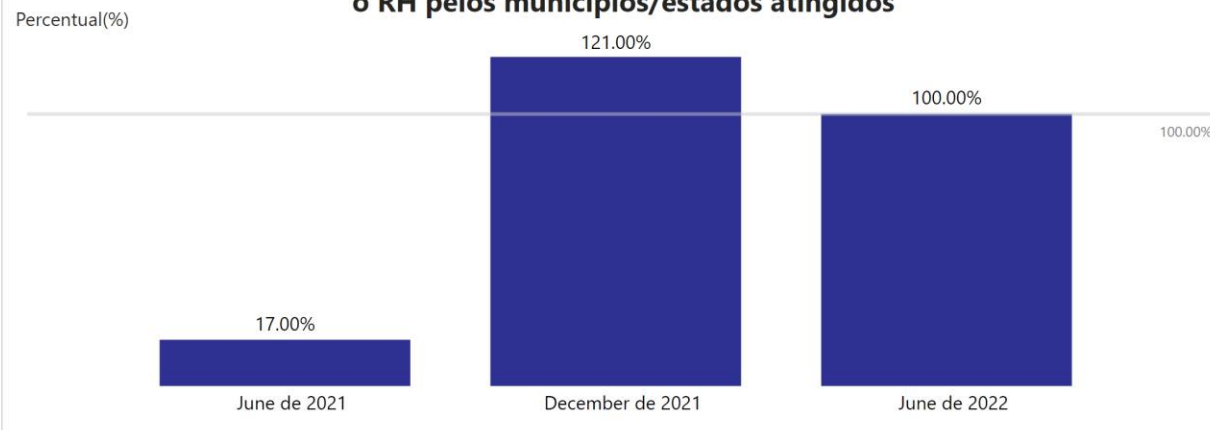


Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)

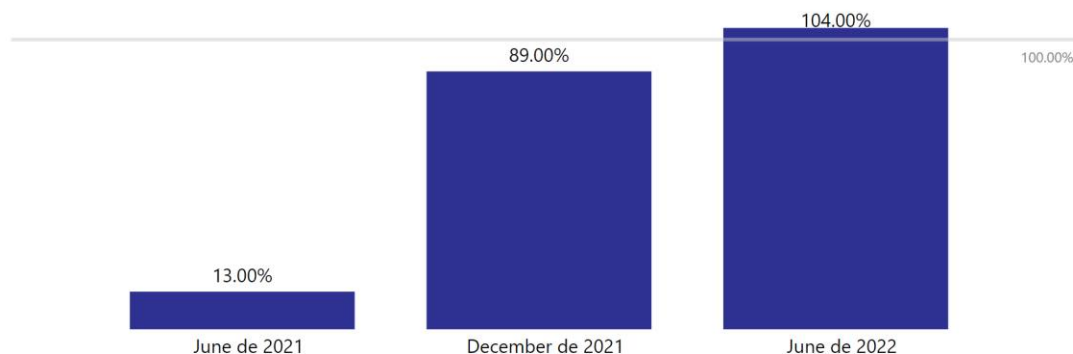


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Percentual(%)

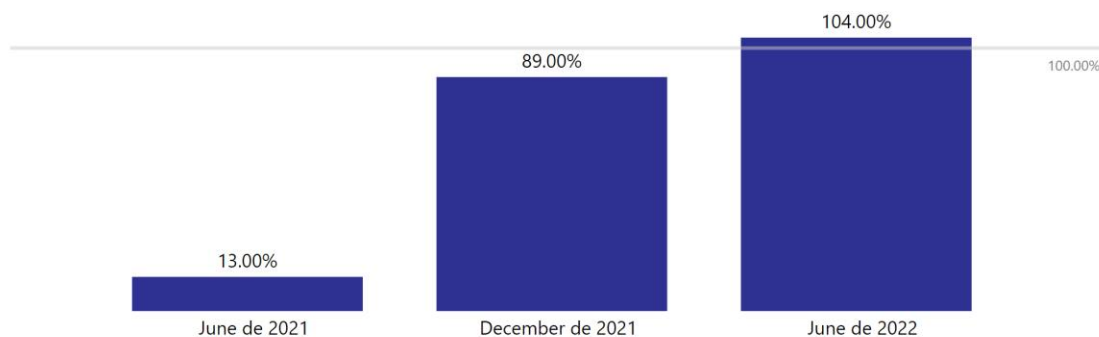


Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Vagas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

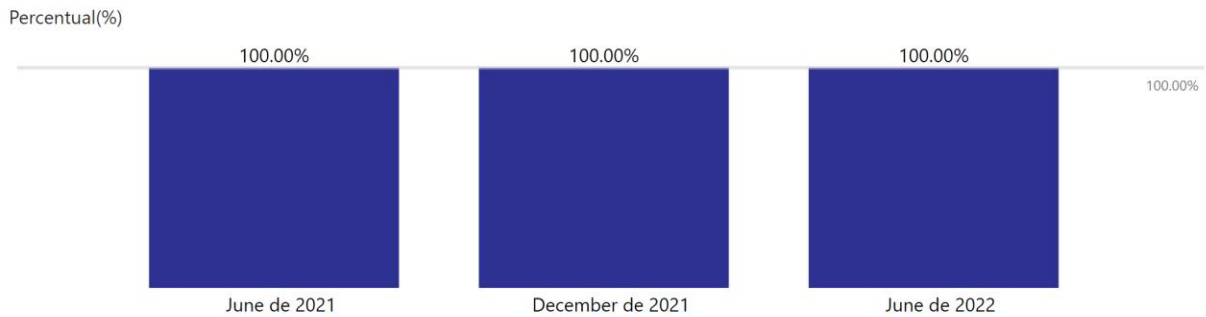


Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

Memória de Cálculo Programa: 417 famílias anuentes atendidas / 417 famílias anuentes

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	140	1	Concluído Internamente
Deliberação	228	2	Concluído Internamente
Deliberação	230	1	Concluído Internamente
Deliberação	506	2	Concluído Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	506	3	Concluído Internamente
Deliberação	506	4	Concluído Internamente
Deliberação	506	5	Concluído Internamente
Deliberação	506	6	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022		Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas , Ativos Locais e suas Redes em 2022.
dezembro de 2022		Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	julho de 2022	agosto de 2022	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	10	24	1.106
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	23	21	3.872
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	129.591

Fatos relevantes do mês

O programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG16) foi temática central de agendas de diálogo coletivo: no território do Médio Rio Doce, para apresentação e esclarecimentos acerca do escopo de atuação do PG, junto a representantes da Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (ASPIPEC), em Periquito (MG). E também no território do Espírito Santo, para levantamento de informações referentes às atividades aquícolas e pesqueiras em conjunto com a Associação dos Psicultores do Guaxe (APIGUA) em Linhares (ES), e com a Associação dos Cultivadores de Alga da Orla, em Aracruz (ES).

No território do Alto Rio Doce foi realizado encontro com a Comissão de Atingidos de Barra Longa (MG) e representantes da comunidade de Gesteira, para apresentação dos processos e critérios de baixa e destinação das peças da Reserva Técnica. Na ocasião foram apresentadas as peças pertencentes à Capela de Nossa Senhora da Conceição de Gesteira, com baixa autorizada pela Arquidiocese, para definição da destinação junto à comunidade.

Na Calha do Rio Doce, foi realizada a Mostra de Projetos – Projetar: inspirando pessoas, conectando redes. O evento teve como propósito possibilitar a troca de experiências e vivências entre diversos proponentes a editais do território. Na oportunidade foram realizadas apresentações culturais de grupos e participantes de projetos apoiados pela Fundação Renova.

Em Mariana, foi dada continuidade às visitas presenciais e grupos de trabalho do Reassentamentos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues para fiscalização, acompanhamento do status e avanço das obras com a participação das Comissões de Atingidos. Em Ponte do Gama foi realizada visita ao primeiro marco de obras dos bens coletivos junto aos moradores da comunidade, onde foi apresentado o cronograma das obras do Campo de Futebol, da Arena de Cavalgada e da Quadra Poliesportiva que estão em construção. Ainda em Mariana, foi realizada agenda coletiva mediada pela Prefeitura Municipal para prestar esclarecimentos sobre Cadastro e Indenizações (Eixo 7) junto à comunidade de Cachoeira do Brumado.

Destaque para a realização de 8 oficinas do Projeto Doce Vivo para apresentação das ações de monitoramento qualiquantitativo da Bacia do Rio Doce, junto a estudantes da rede pública das comunidades de: Jurumirim (Rio Casca/MG), Ipaba (MG) e Baixa Verde (Dionísio/MG) no território da Calha do Rio Doce; e em Resplendor (MG) e Quatituba (Itueta/MG) no território do Médio Rio Doce, onde também foi realizada agenda coletiva com moradores e lideranças de Pedra Corrida (Periquito/MG) para apresentação das ações de monitoramento do Projeto.

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Percentual(%)



Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios

Percentual(%)




Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

Indicadores

I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)




Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Percentual(%)



Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos



Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social

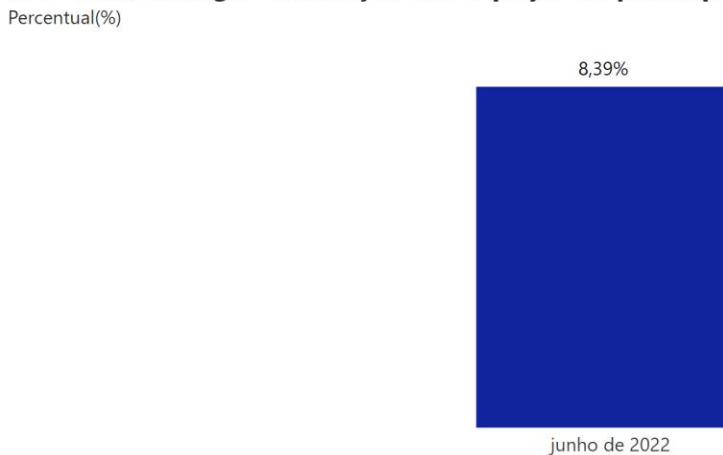


Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social

Percentual(%)



Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)



Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

Indicadores

I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

Percentual(%)

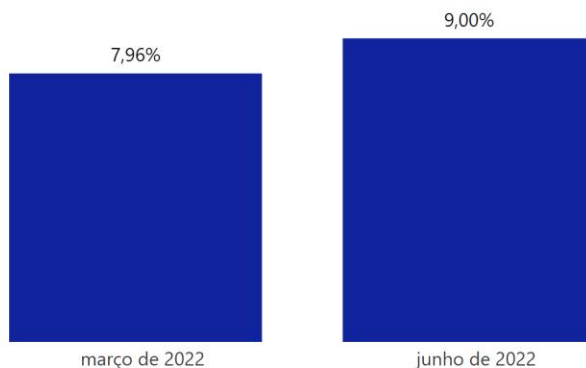


Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios

Percentual(%)




Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
15.182,00	185,14

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2022	177	172,67
fevereiro de 2022	131	
março de 2022	210	207,33
abril de 2022	206	
maio de 2022	187	
junho de 2022	229	211,50
julho de 2022	214	
agosto de 2022	209	
		-

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

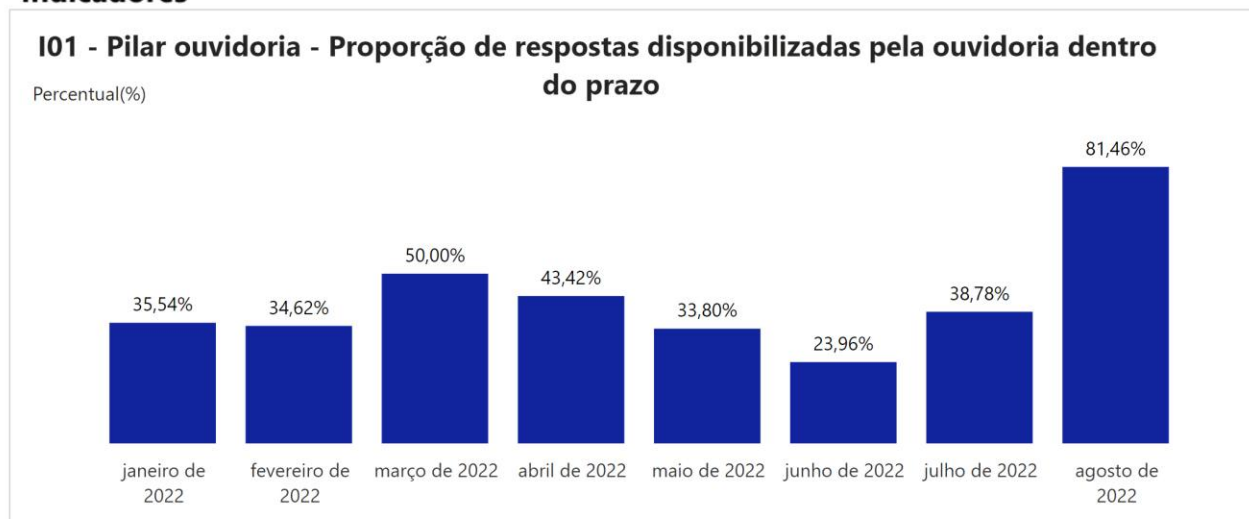


Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal

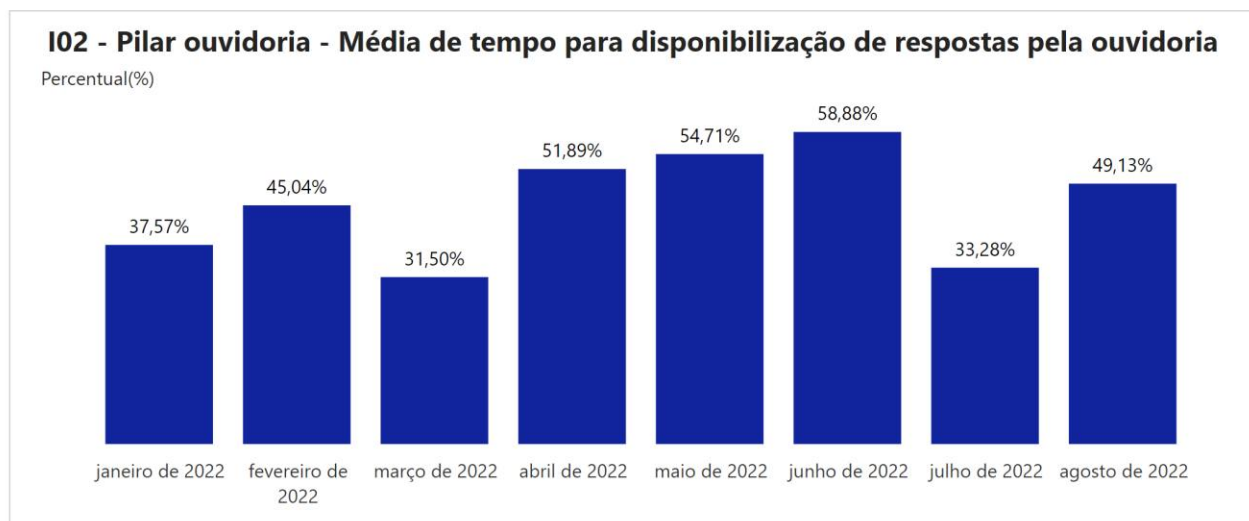


Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria

Percentual(%)




Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	julho de 2022	agosto de 2022
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	306.662	311.225
Canais: Número total de manifestações	1.164.508	1.190.551
Canais: Número de manifestações respondidas	1.098.578	1.125.814
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	154.949	156.897
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	66.662	69.674
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.218	14.471
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	868.580	888.069
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	28	11
Canais: Número de manifestações em tratamento	65.930	64.737
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	60.099	61.440

Pesquisa de Opinião 0800

Q2: O quanto você está satisfeito?




Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

Pesquisa de Opinião 0800

Q1: Você obteve a informação de que precisava neste atendimento?




Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente





Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs


Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal


Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?



Legenda ● MUITO SATISFEITO ● SATISFEITO ● INDIFERENTE ● INSATISFEITO ● MUITO INSATISFEITO

Gráfico 16: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● PÉSSIMO ● RUIM

Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

1º ENCONTRO DIREITOS HUMANOS NA PRÁTICA

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Encontro para repasse de informações e esclarecimento de dúvidas - Portal do Requerente (Naque)

Encontro para repasse de informações sobre novas solicitações de AFE (narrativa e procedimento de registro)

Levantamento de Histórico de manifestações direcionadas aos Programas: PG01, PG02, PG05, PG06, PG14 e Ouvidoria

Treinamento Segurança da informação, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais;

Indicadores

I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)

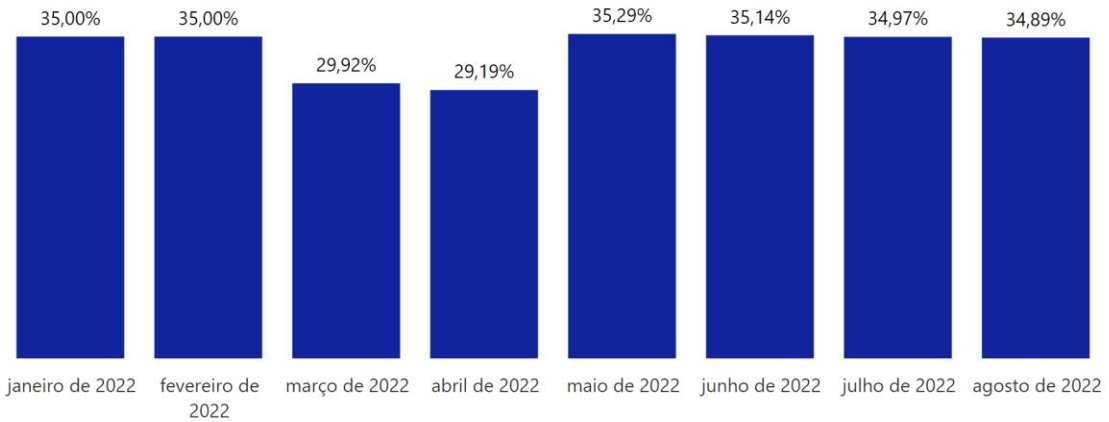


Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)




Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado

Percentual(%)

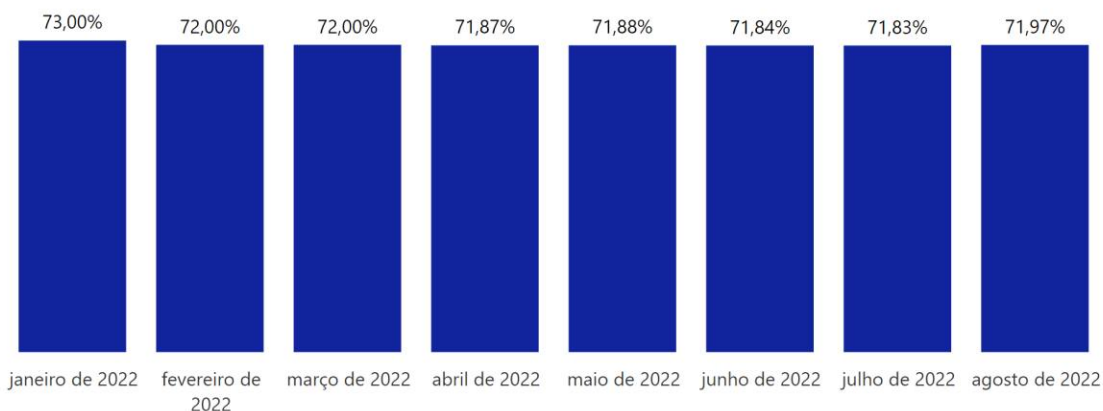


Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias

Percentual(%)



Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores

I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações

Percentual(%)

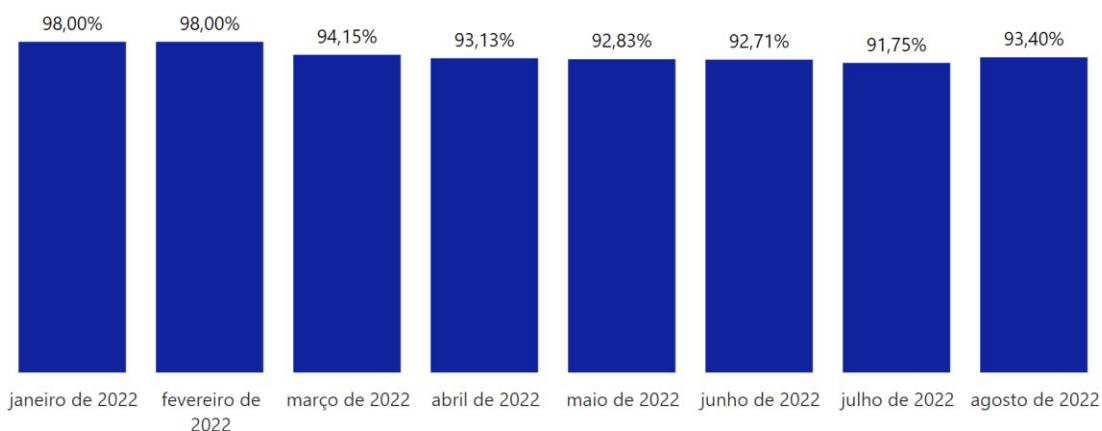


Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco

Percentual(%)




Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias

Percentual(%)

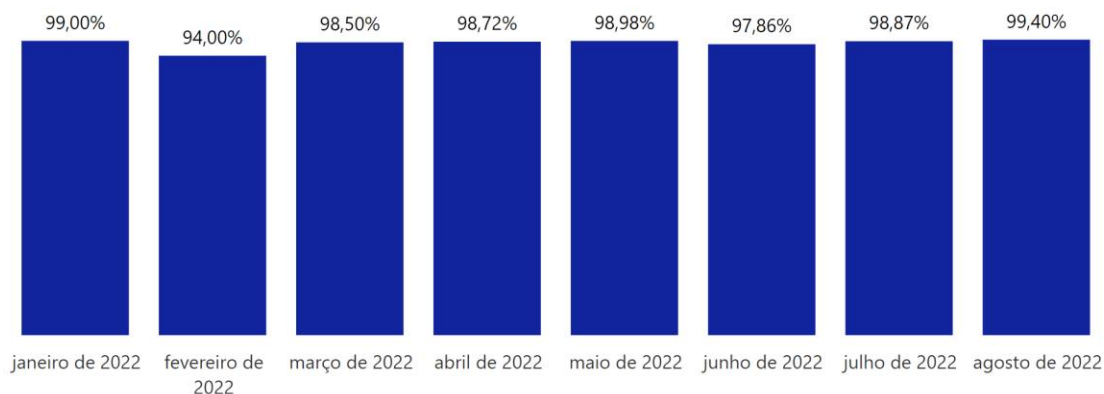


Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)

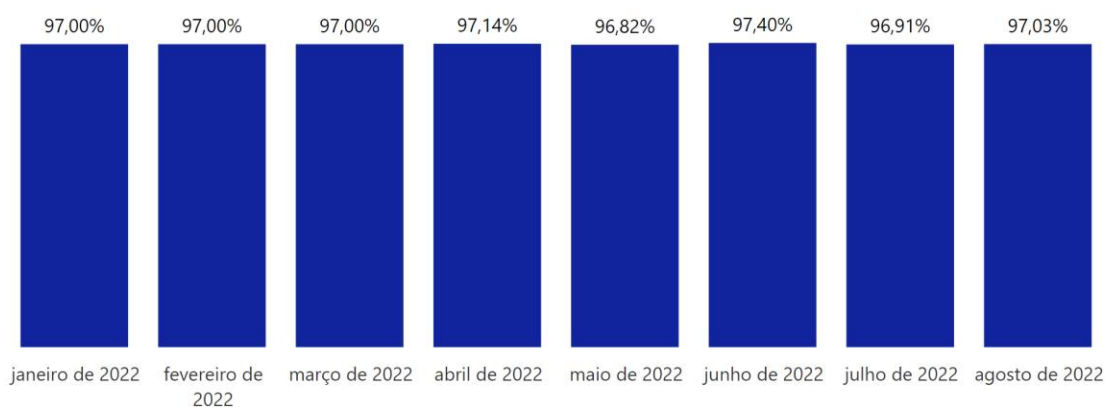


Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)




Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2022

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado no ano
▲ Áudios produzidos	0	0	0	1	0	0	1
Carros de som produzidos	4	1	3	0	2	0	10
Cartazes produzidos	0	0	4	0	3	0	7
Cartilhas produzidos	0	0	1	1	2	0	4
E-mails de Marketing produzidos	0	1	5	2	0	2	10
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	3	2	3	0	12
Jornais da Comunidade produzidos	5	0	20	0	16	0	41
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	15	33	10	33	0	91
Mídias Sociais produzidas	15	3	6	2	1	5	32
Newsletter produzidos	3	3	2	2	4	5	19
Outros itens produzidos	2	1	18	6	14	3	44
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	0	2
Pílulas de whatsapp produzidos	39	21	40	36	26	26	188
Rádios produzidos	18	20	41	40	48	39	206
Vídeos produzidos	1	0	1	1	15	2	20

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2022


DADO	jul	ago	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	6	6
Carros de som produzidos	7	0	7
Cartazes produzidos	1	1	2
Cartilhas produzidos	0	0	0
E-mails de Marketing produzidos	0	2	2
Informes do Reassentamento produzidos	2	3	5
Jornais da Comunidade produzidos	27	30	57
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	0	0
Mídias Sociais produzidas	1	6	7
Newsletter produzidos	11	3	14
Outros itens produzidos	48	11	59
Panfletos produzidos	1	1	2
Pílulas de whatsapp produzidos	34	33	67
Rádios produzidos	32	28	60
Vídeos produzidos	6	7	13

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território


Canais: ● Áudio ● Cartaz ● E-mail Marketing ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pilula ● Rádio ● Vídeo

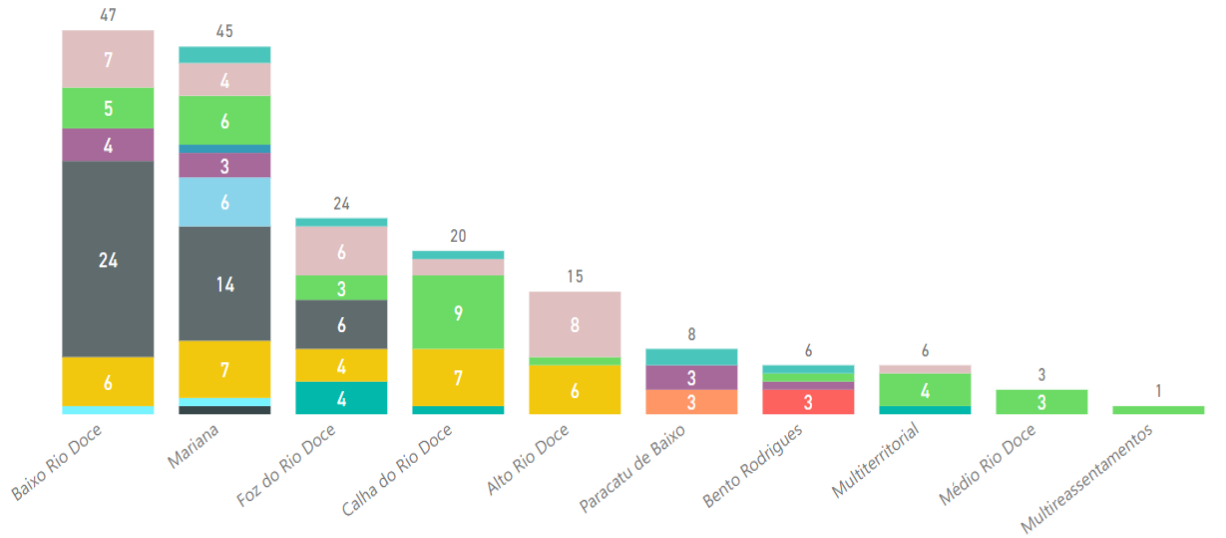

Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna do território de Mariana.

Principais Temas Veiculados

Canais: ● Áudio ● Cartaz ● E-mail Marketing ● Informe do Reassentamento ● Jornal da Comunidade ● Matéria – Jornal Mural CIA ● Mídia Social ● Newsletter ● Outros ● Panfleto ● Pilula ● Rádio ● Vídeo



Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre a finalização do piloto do projeto Quintais Saudáveis.

Produção de programa de rádio sobre os canais oficiais de relacionamento da Fundação Renova.

Baixo Rio Doce

Produção de caça palavras para a 2ª edição do Repara Cidadão, jornal comunitário do Baixo. As palavras são relacionadas com a reparação e que as pessoas leram ao longo do boletim.

Produção de flyer informando que o CIA de Colatina reabriu, porém em um novo endereço. O material traz dicas de como chegar ao novo local.

Produção de matéria para a 2ª edição do Repara Cidadão, jornal comunitário do Baixo, sobre ações da reparação para além do pagamento de indenizações.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Aimorés sobre o novo portal da transparência.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Resplendor sobre o novo portal da transparência.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Baixa Verde, comunidade de Dionísio, para o CIA Móvel no dia 31/08.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Calha do Rio Doce

Produção de matéria para a 2ª edição do Vozes do Território, boletim da Calha, sobre ações da reparação para além do pagamento de indenizações.

Produção de matéria para a 2ª edição do Vozes do Território, boletim da Calha, sobre o grupo de comunicação que ajudou a definir as pautas da edição.

Produção de pílula de whatsapp anunciando a mostra de projetos Projetar: inspirando pessoas, conectando redes, realizada em Ipatinga, no dia 20/08.

Produção de pílula de whatsapp convidando as pessoas para se inscreverem na mostra de projetos Projetar: inspirando pessoas, conectando redes, realizada em Ipatinga, no dia 20/08.

Produção de pílula de whatsapp convidando observadores para a mostra de projetos Projetar: inspirando pessoas, conectando redes, realizada em Ipatinga, no dia 20/08. O material também foi usado como e-mail marketing.

Produção de pílula de WhatsApp convidando produtores de Córrego Preto, Leonel e Rochedo, comunidades de Rio Casca, para evento que finaliza a terceira safra do Projeto Feijão.

Produção de pílula de whatsapp informando que foi prorrogado o prazo para inscrição na mostra de projetos Projetar: inspirando pessoas, conectando redes, realizada em Ipatinga, no dia 20/08.

Produção de vídeo destacando três projetos desenvolvidos por lideranças comunitárias do território Calha para ser exibido na mostra de projetos Projetar: incentivando pessoas, conectando redes e postado nas redes sociais.

Documentários registram as tradicionais Folias de Reis em comunidades de Mariana e Barra Longa

Foz do Rio Doce

Produção de matéria, para a 24ª edição do Jornal Voz da Foz, sobre o que o atingido ser o processo de reparação.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de áudio (Momento da Reparação) com informações sobre o cadastro que a Fundação Renova está realizando com os atingidos.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Aimorés sobre o processo de novos cadastros que está acontecendo na cidade, informando que a empresa Sineria é a responsável pelo cadastramento.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Baixo Guandu sobre o processo de novos cadastros que está acontecendo na cidade, informando que a empresa Sineria é a responsável pelo cadastramento.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre o cadastro aos moradores de Belo Oriente.

Produção de pílula de WhatsApp com informações gerais sobre cadastro dos atingidos.

Produção de pílula de WhatsApp informando que a Fundação Renova está realizando o cadastro de atingidos em Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente.

Produção de pílula de WhatsApp informando que a Fundação Renova está realizando o cadastro de atingidos.

Produção de programa de rádio sobre o cadastramento feito pela equipe Synergia.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção e divulgação de matéria sobre pagamento do AFE para pescadores e agricultores de subsistência indenizados pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção e divulgação de matéria sobre a revisão da lista de pescadores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Produção de programa de rádio sobre o Auxílio Financeiro Emergencial para pescadores e agricultores de subsistência.

Produção de pílula de WhatsApp com esclarecimentos sobre a lista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Produção de matéria para o programa de rádio sobre os canais oficiais de informação da Fundação Renova.

Produção de matéria para o programa de rádio sobre o pagamento de AFE a pescadores e agricultores de subsistência.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Resplendor sobre como ficou o pagamento do AFE para pescadores e agricultores de subsistência no SIS.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Resplendor sobre a análise do cadastro de pescadores a partir da lista emitida pelo MAPA.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Colatina sobre como ficou o pagamento do AFE para pescadores e agricultores de subsistência no SIS.

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de matéria para a 2ª edição do Vozes do Território, boletim da Calha, sobre o cadastro de atingidos.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção e divulgação de matéria sobre a entrega de duas caminhonetes à Prefeitura de Linhares para apoio às ações de assistência social junto aos atingidos.

Produção de programa de rádio sobre o funcionamento do programa de proteção social e quem pode participar

Produção de programa de rádio sobre a assinatura dos termos de Cooperação Técnica e Financeira nos municípios de Rio Casca e Pingo-D'Água.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Colatina sobre as oficinas realizadas pelo programa de Proteção Social.

Produção de áudio, para compartilhamento via whatsapp, sobre as ações do Programa de Proteção Social que estão sendo desenvolvidas com comunidades do litoral de Aracruz.

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp com informações aos moradores de Naque sobre o Portal do Requerente, nova plataforma para acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Colatina sobre a análise do cadastro de pescadores a partir da lista emitida pelo MAPA.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Baixo Guandu sobre a análise do cadastro de pescadores a partir da lista emitida pelo MAPA.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Aimorés sobre a análise do cadastro de pescadores a partir da lista emitida pelo MAPA.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, sobre e entrega de dois veículos para apoio às ações da Secretaria de Ação Social do município de Linhares.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção de convite para evento - Cinema - com objetivo de engajar as famílias de Bento para a vida na nova comunidade.

Produção de informativo mensal nos formato newsletter com informações sobre o avanço das obras e processos sociais do reassentamento de Bento Rodrigues.

Produção de informativo mensal nos formato tablóide/impresso com informações sobre o avanço das obras e processos sociais do reassentamento de Bento Rodrigues.

Produção de informativo mensal nos formato vídeo com informações sobre o avanço das obras e processos sociais do reassentamento de Bento Rodrigues.

Produção de pílula para informar sobre os encontros com grupos de vizinhos no Bento, chamados de Reencontre no Bento - com o objetivo de engajar as famílias de Bento para a vida na nova comunidade.

Produção de vídeo mensal com imagens que demonstram avanços das obras e processos sociais do reassentamento de Bento Rodrigues.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção de pílula de WhatsApp em atendimento a condicionante dos reassentamentos, sobre Dia de Controle da Poluição Industrial, celebrado em 14 de agosto.

Produção e instalação de outdoor para divulgação de meios de acompanhamento das obras do reassentamento de Paracatu de Baixo - status com os avanços do reassentamento - para famílias atingidas e sociedade.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Produção da 48ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da 49ª edição do informativo quinzenal com mapas, fotos e cronograma previsto para os próximos 30 dias nas obras do reassentamento de Paracatu de Baixo.

Produção da versão em vídeo do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo, com as chamadas para os principais assuntos.

Produção de informativo mensal para as famílias do reassentamento de Paracatu de Baixo, com conteúdo e fotos sobre os avanços das obras, status sobre projetos protocolados na prefeitura, alvarás emitidos, número de atendimentos às famílias, entre outros.

Produção de vídeo de um minuto sobre o reassentamento de Paracatu de Baixo com os principais avanços das obras.

Produção e instalação de mesa (Totem) com mapa de localização dos bens de uso coletivo e tenda no reassentamento de Paracatu de Baixo, como ponto de apoio às famílias atingidas e visitantes.

Produção e instalação de outdoor para divulgação de meios de acompanhamento das obras do reassentamento de Paracatu de Baixo - tour virtual - para a sociedade.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Reassentamento Familiar

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre entregas do reassentamento familiar

Suporte ao PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre o acordo de cooperação com a Samarco com relação à Candonga.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre obras e alteração de acesso em Ponte do Gama

Criação de pílula sobre obras e alteração no trânsito na ponte em Santa Rita Durão

Divulgação de matéria da 21ª edição do Voz da Comunidade sobre obras em Ponte do Gama

Divulgação na rádio sobre andamento das obras em Ponte do Gama

Produção de matéria para o boletim Terra da Gente sobre o andamento das obras no Parque de Exposições de Barra Longa.

Produção de programa de rádio sobre as reformas e reconstruções de pontes em Barra Longa.

Suporte ao PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre acompanhamento dos responsáveis dos jovens aos pontos de embarque

Divulgação nas mídias sociais da Renova sobre o Partiu Férias, iniciativa que propõe atividades de manutenção dos vínculos dos estudantes das escolas atingidas durante as férias

Produção de programa de rádio sobre o projeto Partiu Férias, realizado com as crianças de Barra Longa.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre atividades durante o período de férias

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre atividades desenvolvidas na Casa dos Saberes

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre vídeos da Folias de Reis

Divulgação nas redes sociais sobre as mostras das Folias de Reis de Mariana

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre nova data para divulgação dos resultados do Edital Doce

Produção de áudio (Momento da Reparação) com informações sobre o status do Arranjo Produtivo Local (APL) de Marliéria.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Aimorés sobre o resultado da 2ª edição do Edital Doce.

Produção de pílula sobre a extensão do prazo para entrar com recursos nos casos de projetos não aprovados e, também, alteração da data para a divulgação do resultado final.

Produção de pílula, divulgando o prazo para os proponentes entrarem com recursos em relação à divulgação parcial do resultado do Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Divulgação de matéria da 21ª edição do Voz da Comunidade sobre o Meninas Futebol Clube de Paracatu

Postagem do vídeo 2 sobre turismo de aventura em Mariana.

Produção de matéria para a 2ª edição do Repara Cidadão, jornal comunitário do Baixo, sobre a segunda edição do Edital Doce, destacando que na próxima edição divulgaremos os projetos aprovados em cada cidade.

Produção de matéria para a 2ª edição do Vozes do Território, boletim da Calha, o resultado do Edital Doce.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Baixo Guandu sobre o resultado da 2ª edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Colatina sobre o resultado da 2ª edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o jornal mural do CIA de Resplendor sobre o resultado da 2ª edição do Edital Doce.

Produção de matéria, para a 24ª edição do Jornal Voz da Foz. sobre a volta, após dois anos, devido à pandemia, da tradicional Festa do Caboclo Bernardo, em Regência.

Produção de programa de rádio, Momento da Reparação, informando sobre o adiamento da divulgação dos projetos pré-selecionados no 2º Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Divulgação do 3º vídeo sobre turismo foco gastronomia e atrativos turísticos em mídias sociais de ciclistas, viajantes e empreendedores em Mariana.

Produção e divulgação de matéria sobre a atualização das datas das etapas da segunda edição do Edital Doce.

Suporte ao PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Produção de matéria para a 2ª edição do Repara Cidadão, jornal comunitário do Baixo, sobre as ações do programa de saúde na região.

Suporte ao PG015 Promoção à Inovação

Criação de lâmina para JM do CIA de Mariana sobre cursos para impulsionar os negócios em Mariana

Divulgação nas redes sociais sobre as inscrições para o Mariana Labs com foco em desenvolvimento local

Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Divulgação de matéria da 21ª edição do Voz da Comunidade sobre participação da Minha Casa Artes e Sabores do Impulso Rio Doce

Divulgação na rádio sobre os aportes sociais realizados em Mariana por empresas com contratos acima de 3 milhões

Produção de matéria, para a 24ª edição do Jornal Voz da Foz, sobre a aprovação da criação dos bancos comunitários em Regência e em Povoação.

Produção de matéria, para o programa de rádio Momento da Reparação, sobre a indústria de beneficiamento de pimenta do reino instalada no assentamento Zumbi dos Palmares, em São Mateus.

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de pílula, divulgando a abertura de inscrições para cursos oferecidos pelo Senai Linhares em parceria com a Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Ação de empreendedorismo e serviços de cidadania são ofertados para a população em Baixo Guandu

Cursos do Senai em parceria com a Fundação Renova têm inscrições gratuitas

Cursos do Senai em parceria com a Fundação Renova têm inscrições gratuitas em Linhares e Baixo Guandu

Encontro de negócios encerra 2ª edição do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Colatina

Mostra de Projetos é promovida pela Fundação Renova em Ipatinga

Projeto de apoio aos produtores de cacau será lançado no Festival do Chocolate e do Cacau

Rio Casca e Pingo-D'água recebem R\$ 800 mil para apoio a famílias vulneráveis

Segundo Edital de Restauração Florestal Manhuaçu

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Ação de empreendedorismo e serviços de cidadania são ofertados para a população em Baixo Guandu

Cursos do Senai em parceria com a Fundação Renova têm inscrições gratuitas

Cursos do Senai em parceria com a Fundação Renova têm inscrições gratuitas em Linhares e Baixo Guandu

Encontro de negócios encerra 2ª edição do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores em Colatina

Mostra de Projetos é promovida pela Fundação Renova em Ipatinga

Projeto de apoio aos produtores de cacau será lançado no Festival do Chocolate e do Cacau

Rio Casca e Pingo-D'água recebem R\$ 800 mil para apoio a famílias vulneráveis

Segundo Edital de Restauração Florestal Manhauçu

Indicadores

I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território

Pontos



Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território

Percentual(%)



Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	caput	Em Andamento
Cláusula	74	a	Concluído Internamente
Cláusula	74	b	Concluído Internamente
Cláusula	74	c	Em Andamento
Cláusula	74	d	Em Andamento
Cláusula	74	e	Concluído Internamente
Cláusula	74	f	Em Andamento
Cláusula	74	g	Em Andamento
Deliberação	226	2	Em Andamento
Deliberação	328	1	Em Andamento
Deliberação	328	2	Concluído Internamente
Deliberação	328	3	Em Andamento
Deliberação	563	4	Planejado

Entregas do ano de 2022

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

Grandes números do programa

- 1273 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 160 adoções, 448 devoluções, 190 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 432 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 333 bovinos, 52 equinos, 26 caninos, 18 suínos, 3 cães e 3 muaras sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1804 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Visita de monitoramento técnico semestral da CT-OS.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Percentual(%)

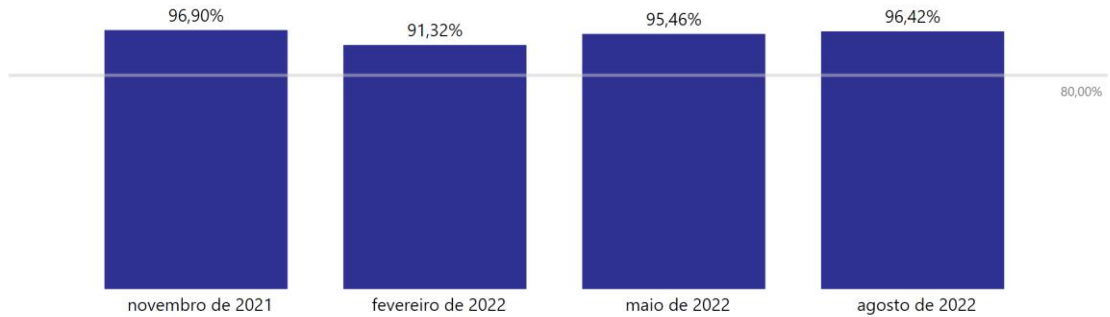


Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de inverno (agosto de 2022).

O reporte de resultados deste indicador para a estação de primavera/22 está previsto para o relatório de dezembro de 2022 (ref. novembro/22).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

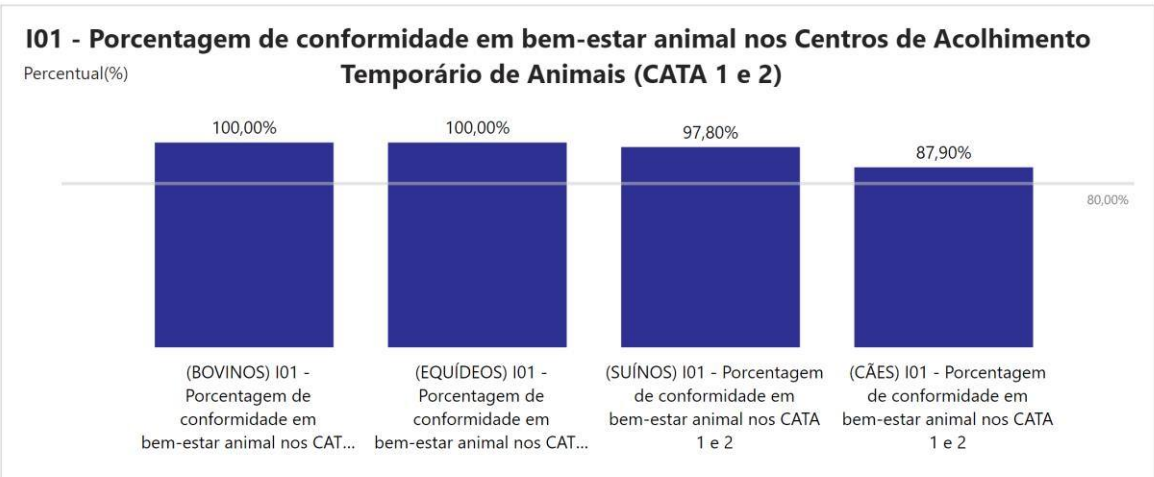


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados




Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de julho e agosto de 2022 não houve ocorrência de novas adoções, mantendo-se o valor aferido para o este indicador no último bimestre. A próxima verificação deste está prevista para o mês de novembro de 2022 (referência ao bimestre set./out. de 2022).

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Percentual(%)



Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de julho e agosto de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de novembro de 2022 (referência ao bimestre set./out. de 2022). A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros de animais sob guarda da Fundação Renova provenientes de nascimentos e/ou recolhimentos, conforme previsto no indicador.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Percentual(%)

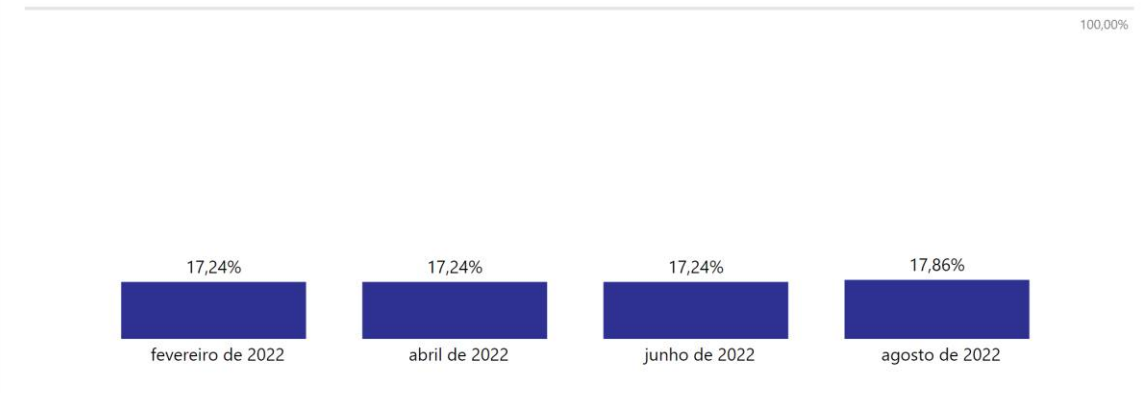


Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de julho e agosto de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de novembro de 2022 (referência ao bimestre set./out. de 2022). A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função do registro de restituição de um animal para família que ainda se encontra em fase de reparação do direito à moradia.

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.


Projeto Reconstrução de Vilas

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluído Internamente
Deliberação	96	2	Concluído Internamente
Deliberação	96	4	Concluído Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas acumuladas até o ano de 2022

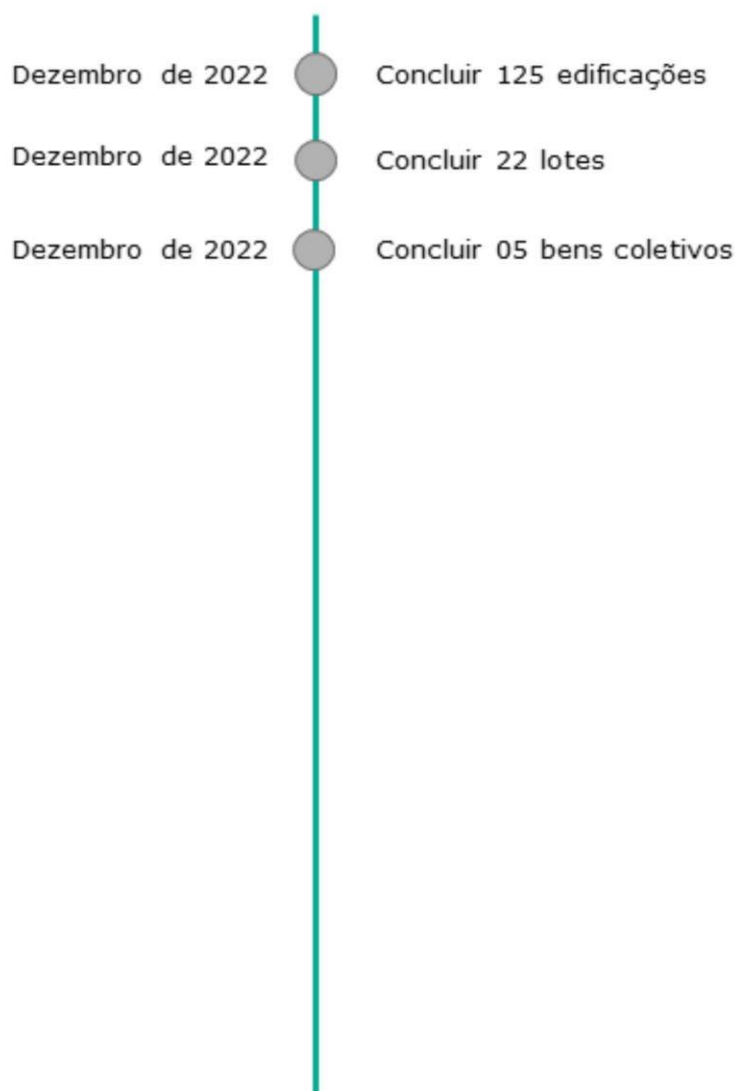

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- 197 famílias atendidas (Com Novos Núcleos).

Obras:

- 92 Construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos) com obra iniciada;
- 62 **Edificações** (Casas, comércios e mistos) concluídas;
- 6 Construções de **bens coletivos** com obras iniciadas;
- 4 Construção de **bens coletivos** concluídos;
- 8 Contratos assinados para construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos;)
- 19 estruturações de **lotes vagos** com obras iniciadas;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 184 edificações (Casas, comércios e mistos), 25 lotes vagos e 17 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 182 edificações (Casas, comércios e mistos), 25 lotes vagos e 17 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 178 edificações (Casas, comércios e mistos), 23 lotes e 16 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 23 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 174 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 14 bens coletivos.


Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

- Finalização de obra do IDs abaixo:
 - 71-UH1
 - 71-UH2
- Finalização de obra do ID 96
- Finalização de obra do ID 93C
- Finalização de obra do ID 65
- Finalização de obra do ID 41
- Finalização de obra do ID 30
- Finalização de obra do ID 185
- Finalização de obra do ID 110

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas acumuladas até o ano de 2022



Dezembro de 2022	●	Concluir 37 edificações
Dezembro de 2022	●	Concluir 04 bens coletivos
Dezembro de 2022	●	Concluir 02 lotes

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- 79 famílias atendidas (Com novos núcleos);

Obras:

- 56 Edificações (Casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 6 Bens coletivos com obras iniciadas;
- 2 Lotes com obras iniciadas;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 68 edificações (Casas, comércios e mistos), 4 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 69 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 64 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes e 12 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 7 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 64 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 12 bens coletivos.

Nota¹: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2022

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 37 **famílias;**
- 29 famílias com acordo homologados;
- 24 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **com aquisição de imóvel;**
- 4 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **sem aquisição de imóvel;**

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas acumuladas até o ano de 2022



● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Obras:

- 10 construções de casas novas com obra iniciada;
- 1 reformas com obra iniciada;
- 1 estruturações de lotes vagos com obra iniciada;
- 1 reconstruções com obra iniciada;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para construções de 80 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 10 lotes vagos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para construções de 81 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos) e 9 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 75 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 9 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 72 construções de edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), para 8 lotes vagos.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- 110 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 92 edificações adquiridas para famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à moradia (com Novos Núcleos);
 - 49 construção de casas novas;
 - 33 edificações para reformar;
 - 10 lotes vagos (executar obra de adequação);
- Atendimento a 13 famílias na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 16 edificações;
- Reconstruções entregues para 14 **edificações**;

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Familiar

- Finalização de obra do IDs 130, 134 e 194.

Reconstrução

- Finalização de obra do ID 578.

Indicadores de acompanhamento



Gráfico 1: Total de atendimentos em moradias temporárias (compensação financeira, aluguel e hotel) - Frequência Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Referência: AGO/22

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído Internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído Internamente

Entregas do Ano de 2022

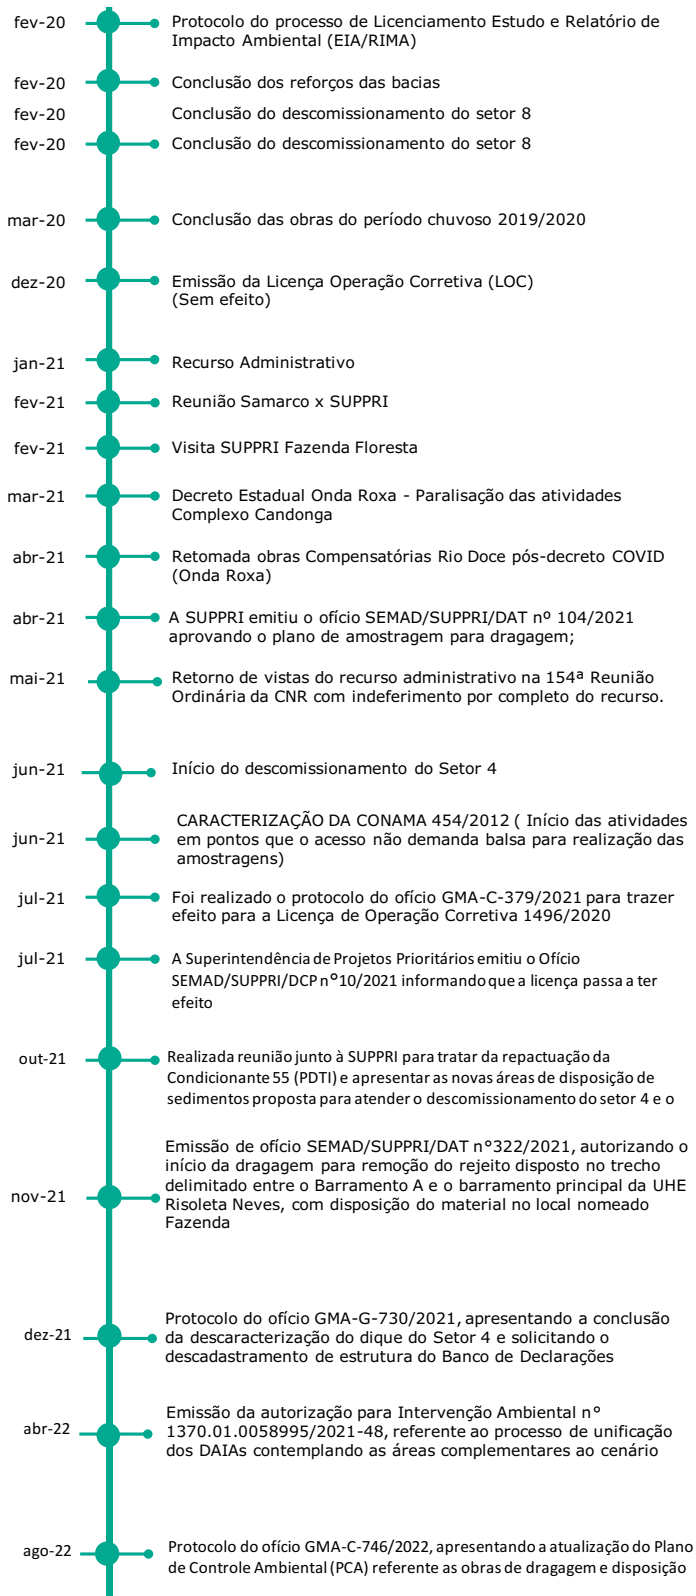

Grandes números do programa

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 21/08/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **258.090 m³**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **10.164m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3 e BMD4.

Fatos relevantes do mês

- ✓ **Remoção de sedimentos – proximidades do barramento principal da UHE (na região dos 400M)**
- Infraestrutura Sistema Drenagem – Drenagem interna setor 11



Figura 1 – Dreno DP1 (Setor 11) - Concluído

- Infraestrutura escavação bacia 4



Figura 2 – Foto aérea Escavação bacia 4

- Remoção de Sedimentos



Figura 3 – Ciclo de Atividades de descarga nas baias localizadas no Ponto de Apoio



Figura 4 - Remoção de sedimentos dos conjuntos escavadeiras/balsa e do conjunto guindaste/ balsa

✓ Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

• Áreas de Desaguamento Primário e Secundário



Figura 5 - Foto aérea das áreas de desaguamento primário e secundário do Setor 11



Figura 6 - Foto aérea das áreas de desaguamento primário do reservatório da UHE

- Áreas de Desaguamento Primário e Secundário



Figura 7 - Foto aérea das áreas de desaguamento localizadas no setor 1

- Disposição final de Sedimentos



Figura 8 - Compactação de sedimentos O.E Dique Principal



Figura 9 - Disposição de Sedimentos Bacia 2

✓ Recuperação dos pontos de margens

✓ Dentre os 79 pontos identificados como necessitados de algum tipo de recuperação, têm-se a seguinte situação:

Pontos já executados em recuperação/ revisão	Obras Entregues	Obras em Andamento	Obras a Iniciar
• 31	• 29	• 13	• 4

▪ Destaque: Ponto 23

✓ Status atual:

- Finalizadas as etapas de perfuração, forma e armação, concretagem e protensão da 4ª Fase.

✓ Próximos passos:

- Escavação e início da perfuração para 5ª Fase da cortina;

✓ 4ª etapa concluída



Figura 10 –Foto aérea 4ª etapa concluída

Ponto 154

- ✓ Status atual:
 - Execução de drenagem superficial

- ✓ Próximos passos:
 - Bioengenharia



Figura 11 - Drenagem concluída

➤ UHE Candonga

- Reforço Barramento Principal UHE



Figura 12 – Foto aérea blocos MD e ME

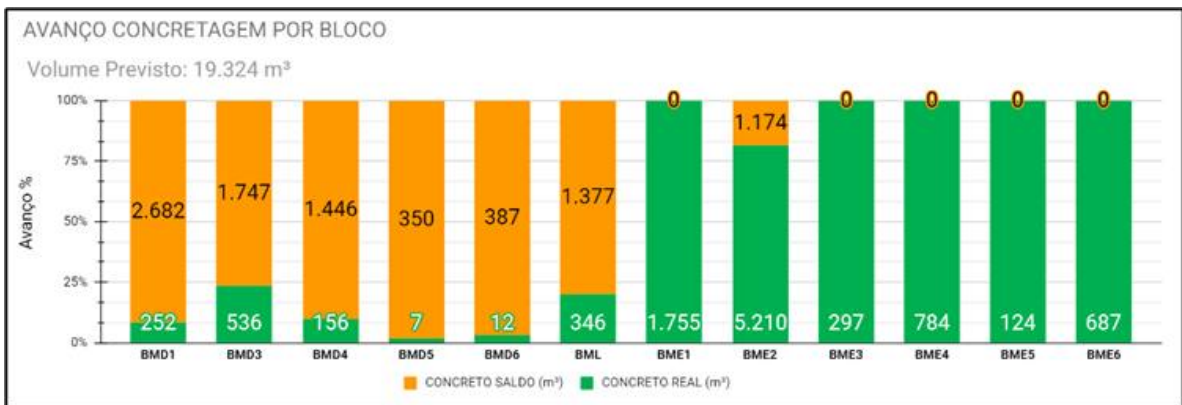


Figura 13 – Avanço concretagem por bloco (Vol. Real. Acum.: 10.164m³)

- Atividades de Limpeza e Reabilitação das UGs
 - Limpeza Canal de Sucção



Figura 14 - Conclusão da Limpeza do Circuito Hidráulico da UHE RN (Limpeza túneis Esquerdo e Direito – UG1, UG2 e UG3)

- Limpeza à Jusante e à Montante da Casa de Força

Atividade Jusante	Avanço
Mergulho para Limpeza das ranhuras (Jusante)	36,0%
Dragagem do acesso aos tuneis saída d água (Jusante)	18,7%
Mergulho para Limpeza dos tuneis saída d água (Jusante)	32,0%
Dragagem do canal de fuga (Jusante)	0,0%
Geral	33,3%

Tabela 1 - Avanço Atividades à Jusante



Figura 15 - Dragagem na faixa dos 10 metros da comporta de jusante

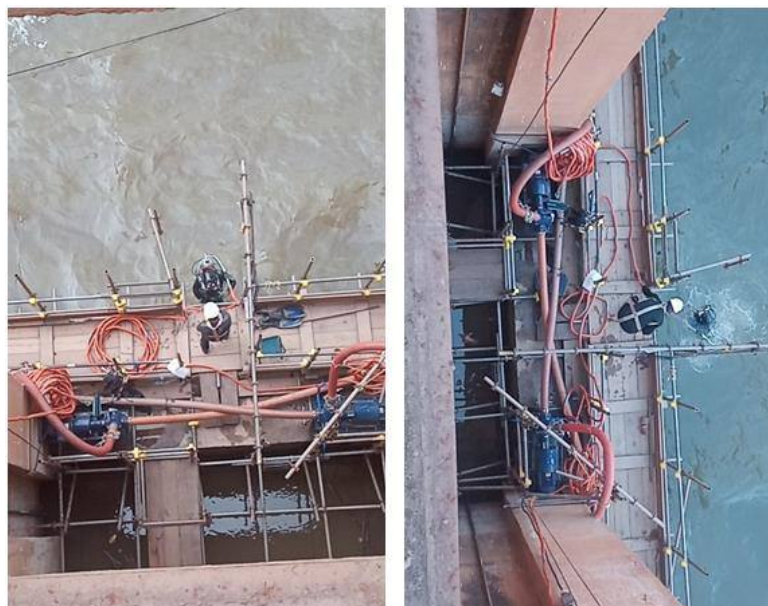


Figura 16 - Mergulho para limpeza de sedimentos e detritos dos túneis de saída d'água Comporta UG1 e ranhuras da UG3

Atividade Montante	Avanço
Mergulho para limpeza da tomada d'água (Montante)	0,0%
Retirada das grades da tomada d'água (Montante)	0,0%
Geral	0,0%

Tabela 2 - Avanço Atividades à Montante

▪ Reabilitação das UG's

Atividades	Status	Avanço Físico
Escopo Inicial	😊	64,34%
Canteiro	😊	0,00%
Engenharia e Suprimentos	😊	100,00%
Materiais de Fornecimento	😊	100,00%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	😊	100,00%
Comporta vagão Tomada d'água	😊	48,67%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D'água	😊	24,33%
UG1- Atividades na Casa de Força	😊	95,00%
UG2- Atividades na Casa de Força	😊	94,00%
UG3- Atividades na Casa de Força	😊	76,00%
Transformador Elevador	😊	58,33%
Vertedouro	😊	55,00%
Comissionamento sem água	😞	0,00%
Comissionamento com água	😞	0,00%
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	😞	0,00%
Serviços Adicionais	😊	94,42%
Projeto Consolidado	😊	71,16%

Reabilitação das UG's
Avanço Físico 16/08/22

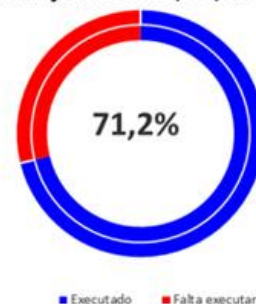


Figura 17 – Avanço Físico Reabilitação das UG's

✓ Status atual:

- Montagem das máquinas UG1 e UG2 (nos poços das máquinas);
- Instalação das talas das comportas da tomada d'água;
- Recuperação metalúrgica da caixa espiral da UG3.

➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

Destques:

- As tratativas para a anomalia da ombreira esquerda do Barramento C foram finalizadas. Permanece em andamento o lançamento de enrocamento à jusante da estrutura.
- Os sensores SAT instalados nos Barramentos Metálicos permaneceram com suas leituras em níveis normais de operação. Foi observada uma variação semelhante nos Barramentos A e B no eixo Z, de pequena magnitude. Foi solicitado à desenvolvedora uma checagem em conjunto das referidas leituras.
- Os marcos superficiais do Barramento Metálico C apresentaram estabilização com o avanço das tratativas da anomalia observada na ombreira esquerda.
- O monitoramento dos níveis d'água e piezômetros segue apresentando redução dos valores medidos.
- Um marco da ADME OD permanece com tendência de recalque. O monitoramento diário dos marcos segue em andamento. Para um melhor entendimento dos deslocamentos na estrutura, foram instalados dois novos prismas na seção do referido marco. Os crack meters (antes chamados de extensômetros) da estrutura não apresentaram variação significativa no período.
- Os marcos superficiais e crack meters da ombreira direita do contrapilamento permaneceram sem deslocamentos significativos no período.

- Os marcos superficiais da Bacia 8 permanecem sem tendência de deslocamento. Os instrumentos do entorno da bacia seguem apresentando redução dos níveis.
- Para monitoramento dos deslocamentos na Bacia 2, serão instalados sete marcos superficiais.
- O monitoramento da tenda da Samarco foi retomado e não foi observada tendência de deslocamento. Não foram identificadas novas anomalias no local.
- Os marcos superficiais da Pedreira Corsini seguiram apresentando leve redução nos deslocamentos para sul no período. Não houve variação visual nos escorregamentos no período. A área segue isolada.
- As obras de escavação no campo de futebol de Santana do Deserto permanecem em andamento. No dia 17 de agosto ocorreu a ruptura local de um dos bancos, em decorrência da saturação elevada do talude no local. Foi instalado um filtro invertido e será implantada uma nova linha de DHPs para direcionamento da drenagem.

Recomendações:

- Finalizar a recomposição das cotas de sedimento a jusante do Barramento C durante o período seco.
- Realizar testes nos sensores verticais instalados nos barramentos, de forma semelhante ao realizado nos sensores horizontais.
- Finalizar as campanhas de investigação geológico-geotécnicas da ADME OD e do talude da OD do contrapilhamento, que irão subsidiar as análises de estabilidade.
- Finalizar o plano de monitoramento do talude de Santana do Deserto e implantar a instrumentação proposta.
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha (julho/22), o qual não coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados e visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 1.
- Saída: Ponto seco, haja vista que não houve bombeamento ou vertimento deste efluente para o rio Doce.

✓ **Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)**

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.
- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Manganês (Montante e Jusante).
- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges:
 - Sem desvios no período nos pontos de Montante e Jusante.
- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
 - Sem desvios no período nos pontos de Montante e Jusante.
- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo:
 - Desvios de Manganês: Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Estamos propondo na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.

✓ Monitoramento Atmosférico

- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 18 - Localização nascentes Pilha 1 e Pilha 2



Figura 19 - Nascentes 1 e 2

✓ Conclusões / considerações finais

- A Nascente 1 apresentou desvios de Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal;
- A Nascente 2 apresentou desvios de Ferro e Manganês no período no monitoramento de controle semanal;

Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Atividade em andamento.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco e Pontal. Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce e Porto Plácido). Da mesma maneira não foram identificados desvios de vibração nas comunidades monitoradas (Pedra do Escalvado, Gerônimo, Porto Plácido, Santana do Deserto e Viana), assim como também não foram encontrados desvios nos 38 pontos de monitoramento dentro da ADA.

INDICADORES

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

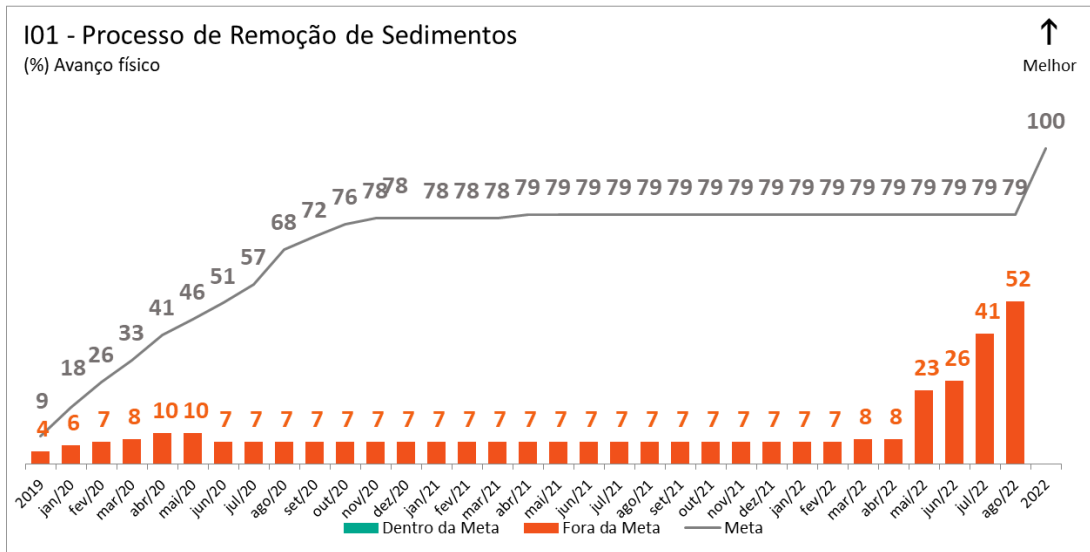


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de dragagem. Gráfico Acumulado.

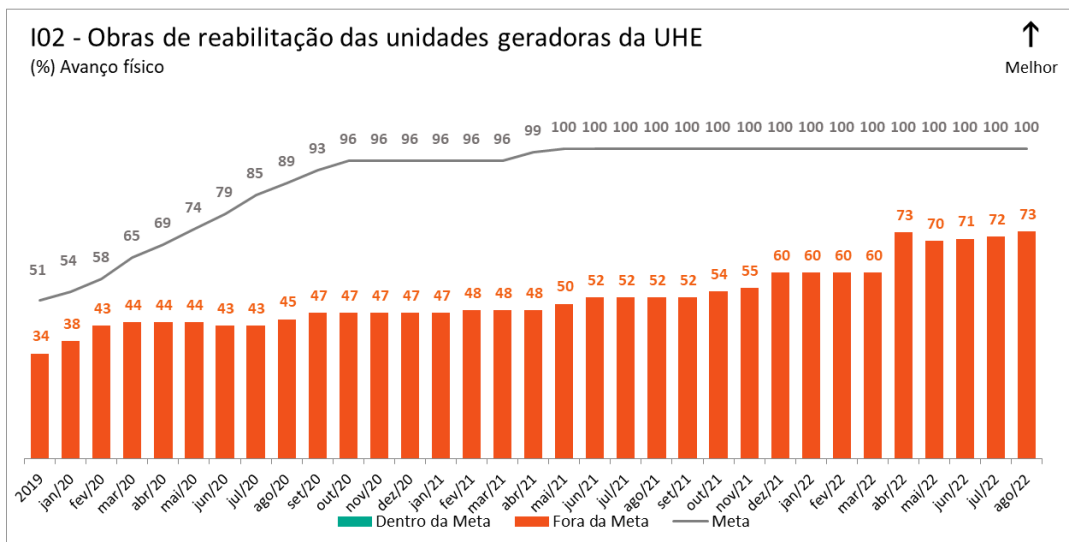


Gráfico 2 - Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

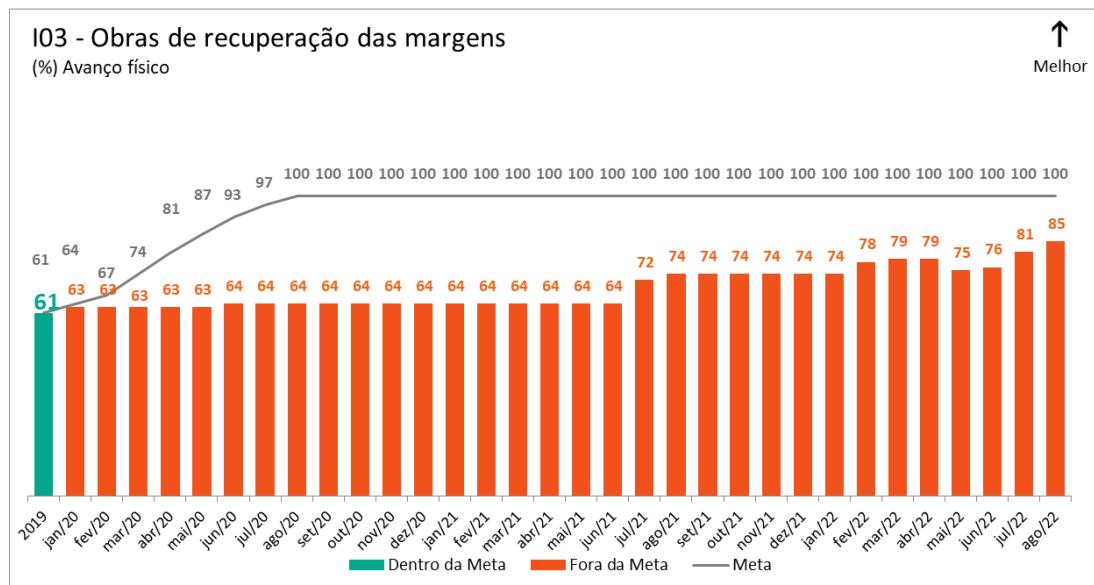


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

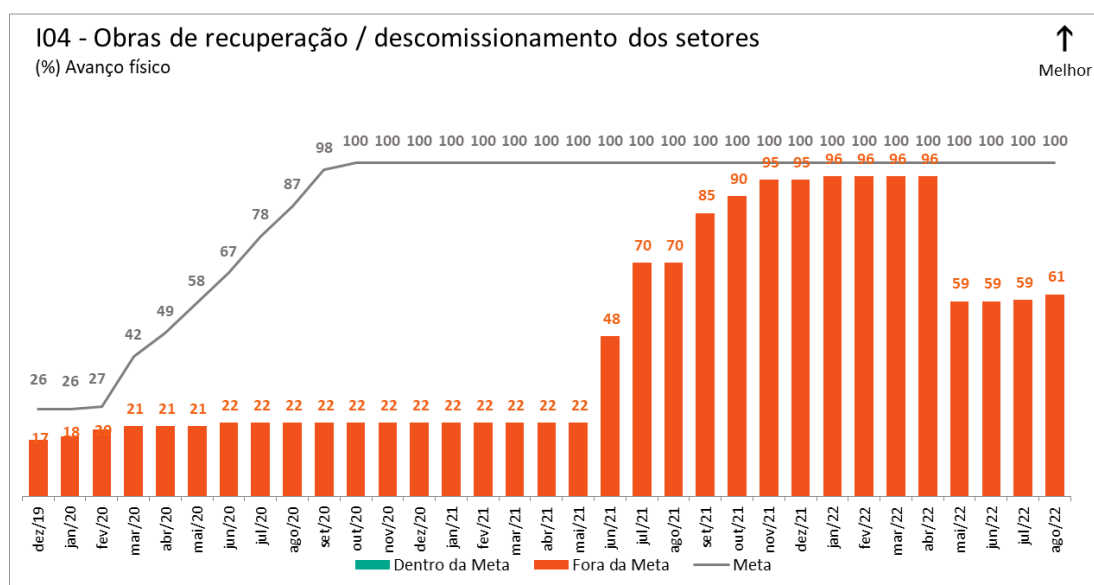


Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota:: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autoriza prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Concluída
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Concluída
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	190	1	Concluído Internamente
Deliberação	190	2	Judicializado
Deliberação	191	1	Concluído Internamente
Deliberação	207	1	Judicializado
Deliberação	207	2	Judicializado
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluído Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Bueno)
- setembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Curvina)
- setembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Passarela Campinas Barreto)
- dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Juca Ponciano)
- dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Tiara)
- dezembro de 2022 ● Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte Borba)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.778 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 980 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 1.975 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 213 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Moradias e Comércio:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27 :

Fatos relevantes do mês

Visita da comunidade ao complexo dos Bens Públicos de Ponte do Gama para acompanhamento das obras;

Interdição das obras da ponte e passarela de Santa Rita pela arqueologia em 15/08/2022;

Início das atividades do novo contrato de obras civis nas manutenções de edificações "moradias temporárias";

Conclusão de 01 propriedade (D016) no projeto de proteção de taludes das estruturas complexas;

Conclusão das obras do Bueiro Curvinas e Bueno em Barra Longa.

Conclusão da mobilização da nova contratada de manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas;

Bens Públicos Ponte do Gama - Conclusão do tratamento de faixas do campo

Indicadores

I01 – Obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)

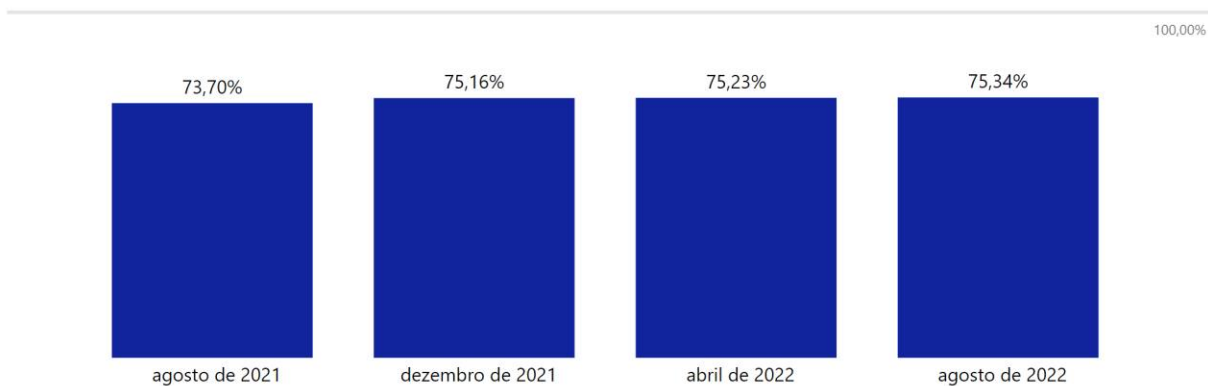


Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I02 – Obras entregues – Temporal

Percentual(%)

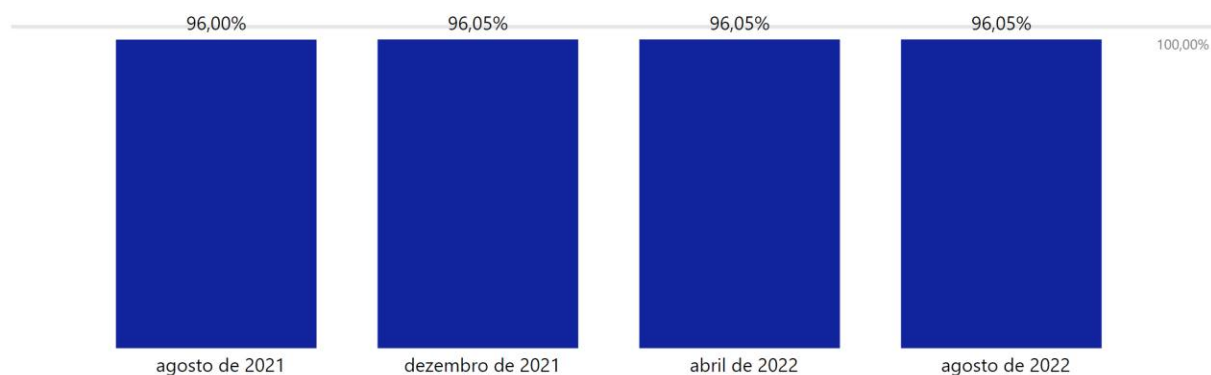


Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total

Percentual(%)

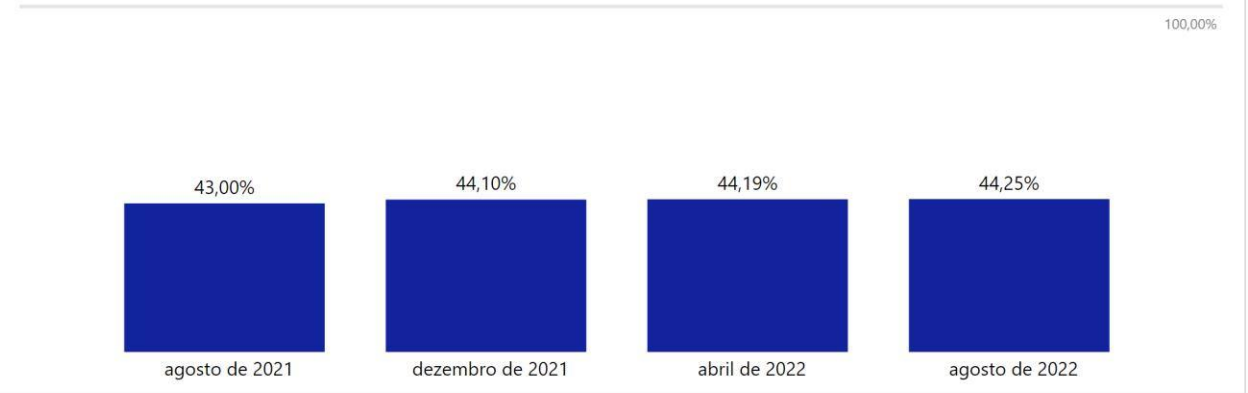


Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal

Percentual(%)

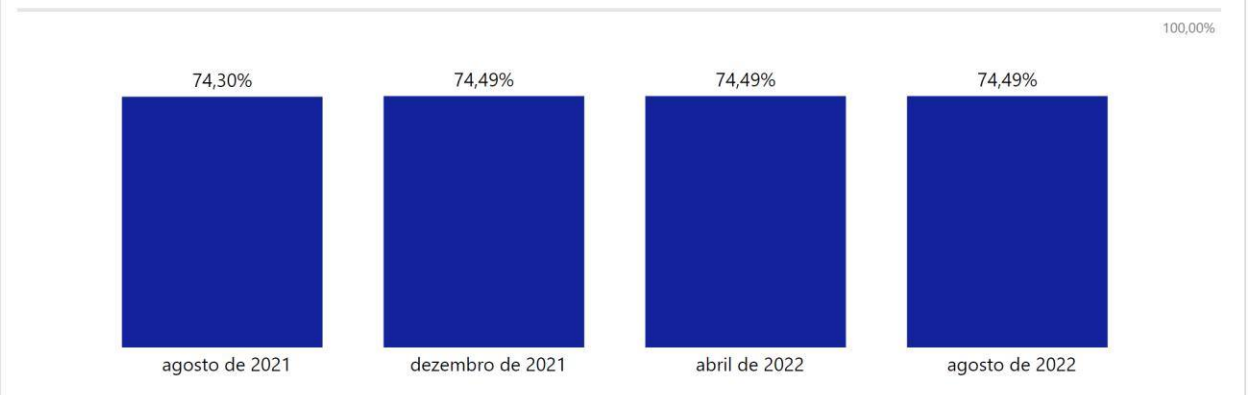


Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	caput	Em Andamento
Cláusula	91	caput	Em Andamento
Cláusula	92	caput	Planejado
Cláusula	93	caput	Em Andamento
Deliberação	183	2	Concluído Internamente
Deliberação	183	3	Concluído Internamente
Deliberação	238	1	Concluído Internamente
Deliberação	390	3	Concluído Internamente
Deliberação	508	2	Em Andamento
Deliberação	587	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

abril de 2022		Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
outubro de 2022		Equipagem da Escola Definitiva de Bento Rodrigues no Reassentamento Coletivo
dezembro de 2022		Conclusão da formação de pedagogos da rede municipal de Mariana
dezembro de 2022		Finalização do projeto de apoio pedagógico para rede publica municipal de Mariana
dezembro de 2022		Finalização da manutenção predial e ar condicionado- Escola Temporária Bento Rodrigues
dezembro de 2022		Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
dezembro de 2022		Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
dezembro de 2022		Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2022)
dezembro de 2022		Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2022)
dezembro de 2022		Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Bento Rodrigues

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Percentual(%)

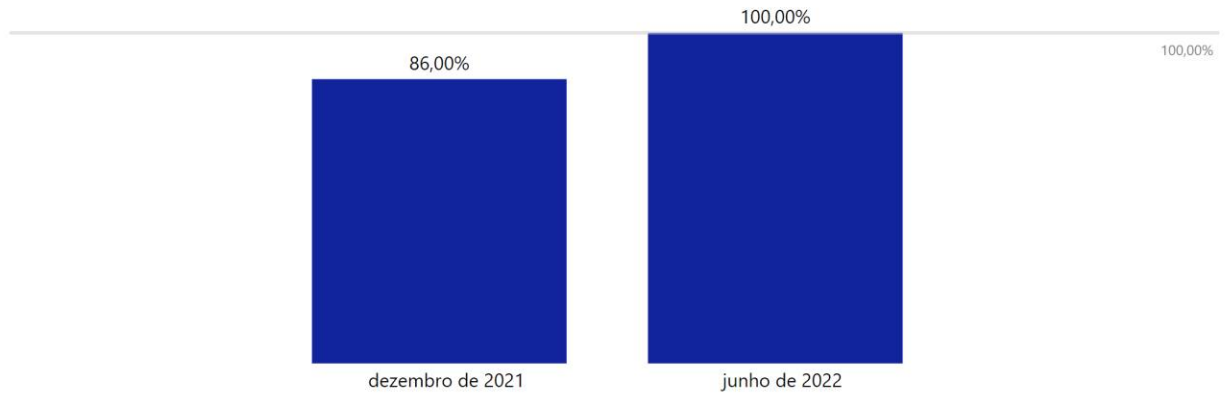


Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Percentual(%)

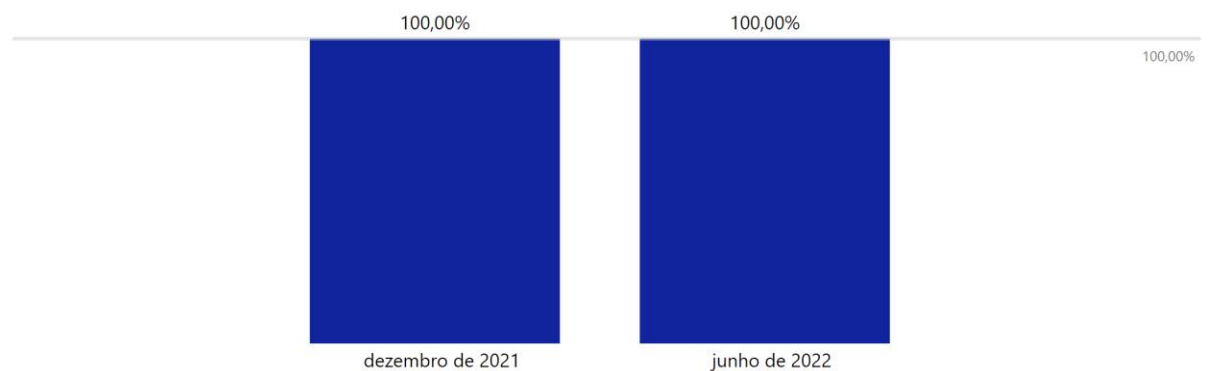


Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Percentual(%)

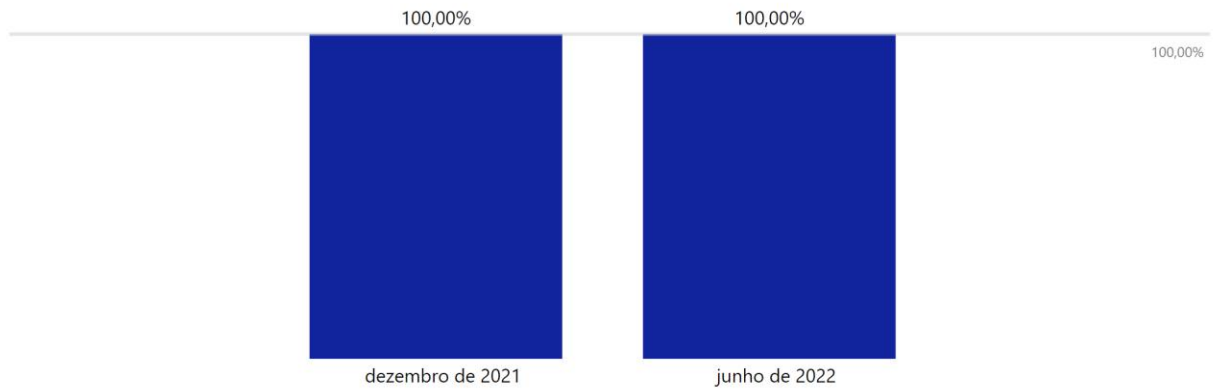


Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Pontos




Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas – Frequência semestral

Indicadores

I07 - Atendimento ao público alvo

Percentual(%)



Gráfico 7: I07 – Atendimento ao público alvo – Frequência semestral

Indicador se encontra em revisão. Ofício FR.2022.0142-01 enviado dia 01/08/22 solicitando ao GT11 a revisão da fórmula de cálculo ou a suspensão do indicador I07.

I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana

Percentual(%)




Gráfico 8: I09 – Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana – Frequência Anual

Medição do Indicador I09 postergada para dezembro de 2022.

Solicitado pela SME a reprogramação da última formação com os pedagogos, prevista para jul/22. Em andamento tratativas com a SME para definição da nova data e ementa do curso.

Indicadores

I11 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico

Percentual(%)



Gráfico 9: I11 – Percentual de implantação do Apoio Pedagógico – Frequência Anual

Medição do Indicador I11 postergada para dezembro de 2022.

Solicitado pela SME a reprogramação da última formação com os pedagogos, prevista para jul/22. Em andamento tratativas com a SME para definição da nova data e ementa do curso.

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Percentual(%)




Gráfico 10: I12 – Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico – Frequência Anual

Indicadores

I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Percentual(%)




Gráfico 11: I13 – Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional – Frequência Anual

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	caput	Em Andamento
Cláusula	96	caput	Em Andamento
Cláusula	97	caput	Em Andamento
Cláusula	98	a	Em Andamento
Cláusula	98	b	Em Andamento
Cláusula	98	c	Em Andamento
Cláusula	98	d	Em Andamento
Cláusula	99	caput	Em Andamento
Deliberação	349	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	2	Concluído Internamente
Deliberação	547	3	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
- outubro de 2022 ● Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
- dezembro de 2022 ● Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica
- dezembro de 2022 ● Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
- dezembro de 2022 ● Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingidas
- dezembro de 2022 ● Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades¹

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Restauro de 07 peças na Reserva Técnica, somando 68 peças restauradas neste ano (metal anual de 87 peças).

Início do projeto Abrindo Espaços, em parceria com a Unesco, que busca potencializar o espaço escolar para as comunidades, ampliando as alternativas culturais e a qualidade de vida local, com a realização de oficinas nas diversas linguagens culturais e artísticas, de esporte e lazer, educação patrimonial e agroecologia, presentes no plano de Reparação das Referências Culturais do Programa 12. A ação avança no Plano de Reparação do PG12, no cumprimento das cláusulas 97, 98D e 99 e nos indicadores I04 (Percentual de bens culturais reparados), I08 (Índice de ações de educação patrimonial implementadas) e I09 (Índice de ações de socialização para as comunidades deslocadas).

* Programa Abrindo Espaços em Barra Longa (escolas estaduais "Claudionor Lopes" e "Pe. José Epifanio"), em Rio Doce (E. E. Maria Amélia) e Santa Cruz/Nova Soberbo (E. M. José Gomes de Souza).

Início da parceria entre Fundação Renova, UNESCO e Secretaria de Educação de Mariana para contribuir com a formação continuada de 12 formadores e cerca de 40 monitores para atuarem como multiplicadores nas áreas de Música, Teatro e Dança, Esporte e Lazer, Artesanato, Educação Patrimonial e Ambiental do Programa Tempo Integral da Rede Pública Municipal. A ação avança no Plano de Reparação do PG12, no cumprimento das cláusulas 97, 98D e 99 e nos indicadores I04 (Percentual de bens culturais reparados), I08 (Índice de ações de educação patrimonial implementadas) e I09 (Índice de ações de socialização para as comunidades deslocadas).

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

O detalhamento dos indicadores, com a ficha daqueles consensuados, está em processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída – Judicializada
Cláusula	102	Caput	Concluída – Judicializada
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída – Judicializada
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1a	Concluído Internamente
Deliberação	239	1b	Concluído Internamente
Deliberação	239	1c	Concluído Internamente
Deliberação	239	3	Concluído Internamente
Deliberação	239	4	Concluído Internamente
Deliberação	239	5	Concluído Internamente
Deliberação	287	3	Concluído Internamente
Deliberação	287	4	Concluído Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	377	4	Concluído Internamente
Deliberação	377	5	Concluído Internamente
Deliberação	454	2	Concluído Internamente
Deliberação	454	3	Concluído Internamente
Deliberação	462	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022



setembro de 2022	●	Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
outubro de 2022	●	Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
outubro de 2022	●	Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
novembro de 2022	●	Realização do Torneio de Pesca Esportiva no Espírito Santo
dezembro de 2022	●	Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas
dezembro de 2022	●	Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
dezembro de 2022	●	Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
dezembro de 2022	●	Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Eixo de Turismo: Entrega do site e redes sociais do Polo da Foz. A ação faz parte do plano de promoção, foi definida como ação estruturante pelo APL e avança no cumprimento das cláusulas 104A e 104C, e do indicador I06 (Percentual de implementação do plano de promoção do destino).

Eixo de Turismo: Capacitação em Hospedagem Domiciliar (Cama e Café) para início das atividades de hospedagem domiciliar em Marliéria, realizada de 22 a 26/08, por meio do APL da região de Marliéria. O curso contou com 13 participantes e teve avaliação muito positiva. O objetivo é capacitar pessoas para iniciarem uma nova atividade econômica nessa área e também promover o desenvolvimento turístico da região, que apresenta uma lacuna absoluta em hospedagem. Após a capacitação serão disponibilizados mais de 50 leitos para hospedagem na cidade e arredores. Além da capacitação, os participantes receberam kits de enxoval e consultoria de design/arquitetura para pequenos ajustes nas suas instalações. A ação faz parte do projeto de desenvolvimento turístico e avança no cumprimento das cláusulas 104A e 104C, bem como no indicador I05 (Percentual de implementação do plano de empreendedorismo).

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Percentual(%)




Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Percentual(%)




Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

As metas de execução são anuais.

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Percentual(%)

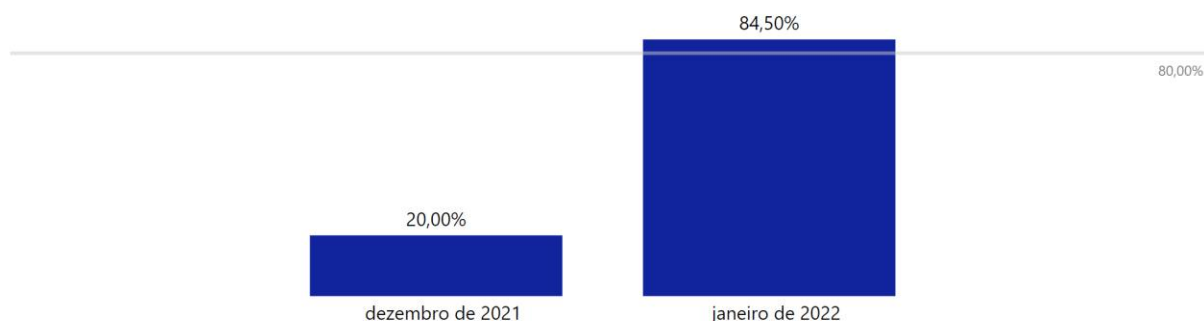


Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Percentual(%)



Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	106	caput	Planejado
Cláusula	107	caput	Judicializado
Cláusula	108	caput	Em Andamento
Cláusula	111	caput	Judicializado
Deliberação	106	3	Concluído Internamente
Deliberação	189	2	Concluído Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluído Internamente
Deliberação	219	4	Concluído Internamente
Deliberação	220	2	Concluído Internamente
Deliberação	220	3	Concluído Internamente
Deliberação	252	2	Concluído Internamente
Deliberação	264	4	Concluído Internamente
Deliberação	266	2	Concluído Internamente
Deliberação	416	3	Judicializado
Deliberação	416	4	Judicializado
Deliberação	434	1	Judicializado
Deliberação	435	1	Judicializado
Deliberação	436	1	Judicializado
Deliberação	452	2	Judicializado
Deliberação	487	7	Judicializado
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializado
Deliberação	504	2	Judicializado
Deliberação	504	3	Judicializado
Deliberação	504	4	Judicializado

Deliberação	130	4	Concluído Internamente
Deliberação	189	1	Concluído Internamente
Deliberação	386	3	Concluído Internamente
Deliberação	73	1	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

- março de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
- junho de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
- julho de 2022 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
- setembro de 2022 ● Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 7º Repasse financeiro para contratação de RH e Conclusão dos repasses financeiros de RH para o município de Barra Longa
- setembro de 2022 ● Finalização das Área temáticas de capacitação dos profissionais do SUS
- outubro de 2022 ● Acompanhamento do plano de Mariana – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa*

- 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (34 **profissionais**) e Barra Longa/MG (14 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Atualmente, por meio de ACP homologada pela 12ª Vara, são disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

Neste relatório semestral, referente ao período de outubro/21 a abril/22, a Secretaria de Saúde reportou que os profissionais médicos e enfermeiros realizaram 4.709 consultas (média de 784 por mês) e 1059 procedimentos clínicos como aferição de glicemia, pressão arterial, administração de insulina, medicação, retirada de pontos e curativos, coleta de amostras para testes COVID-19, entre outros (média de 176 procedimentos por mês) no Centro Assistencial de Saúde (CAS) 24h.

Os profissionais contratados também podem apoiar as ações desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), que oferece serviços de promoção, prevenção e tratamento da saúde física e mental das comunidades tanto da área urbana quanto rural do Município.

No relatório supracitado, a Secretaria de Saúde relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibiliza 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoia o município com o valor de R\$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, disponibilizou 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Fatos relevantes do mês

Finalização da capacitação “Direcionamento e Interpretação de Testes de Laboratório para avaliação de intoxicação por metais” para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	caput	Em Andamento
Cláusula	114	a	Em Andamento
Cláusula	114	b	Em Andamento
Deliberação	100	1	Concluído Internamente
Deliberação	126	2	Concluído Internamente
Deliberação	126	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	31	a	Concluído Internamente
Deliberação	338	4	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022



fevereiro de 2022	●	Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das pesquisas mineiras da Chamada 09/2018
junho de 2022	●	Finalização do Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs
novembro de 2022	●	Finalização do Empreendedorismo Universitário Campus Tech - Mariana
dezembro de 2022	●	Finalização do Projeto de Capacitação de Gestores Públicos para Inovação (Emprende Rio Doce)
dezembro de 2022	●	Celebração dos Convênios dos projetos selecionados da Chamada Agroecologia ES
dezembro de 2022	●	Finalização do Projeto Rio Doce Digital - Mariana

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realização em 24/08/2022 de evento para início da Rodada Complementar do Hub de Aceleração Mariana Labs, voltado para os desafios e demandas da cidade de Mariana

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Número

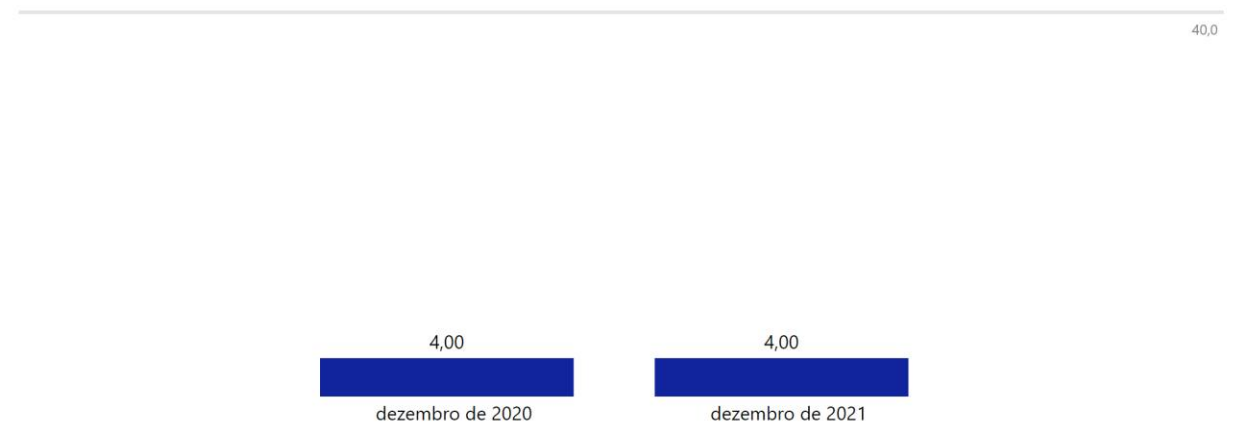


Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Número

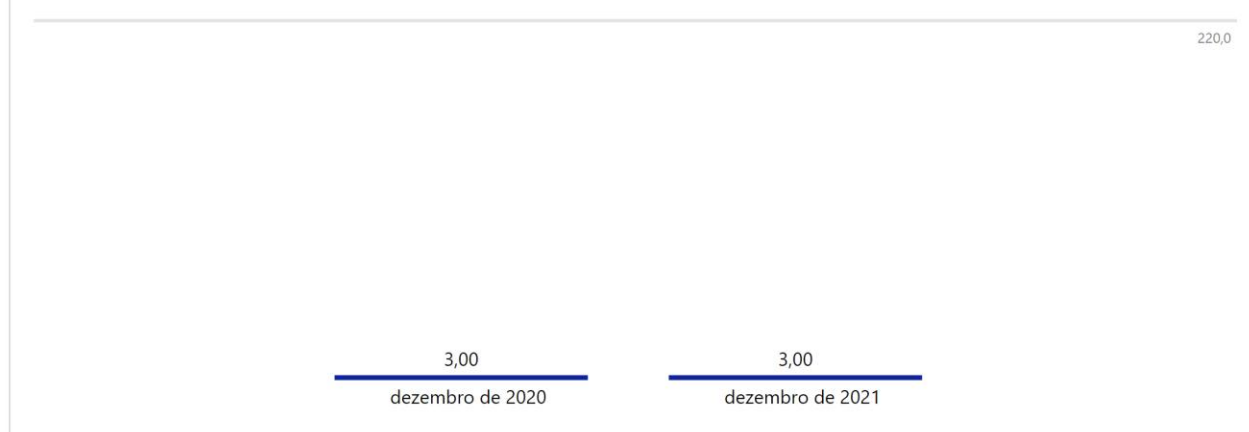


Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Percentual(%)




Gráfico 3:I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor atualizado e auditado passa a ser de 13,77%. Este valor será reportado até novo período de medição do indicador.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade


Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	caput	Em Andamento
Cláusula	117	caput	Em Andamento
Cláusula	118	caput	Planejado
Cláusula	119	caput	Planejado
Cláusula	122	caput	Judicializado
Cláusula	123	caput	Em Andamento
Deliberação	121	2	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	480	4	Concluído Internamente
Deliberação	480	5	Concluído Internamente
Deliberação	542	1	Concluído Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	542	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

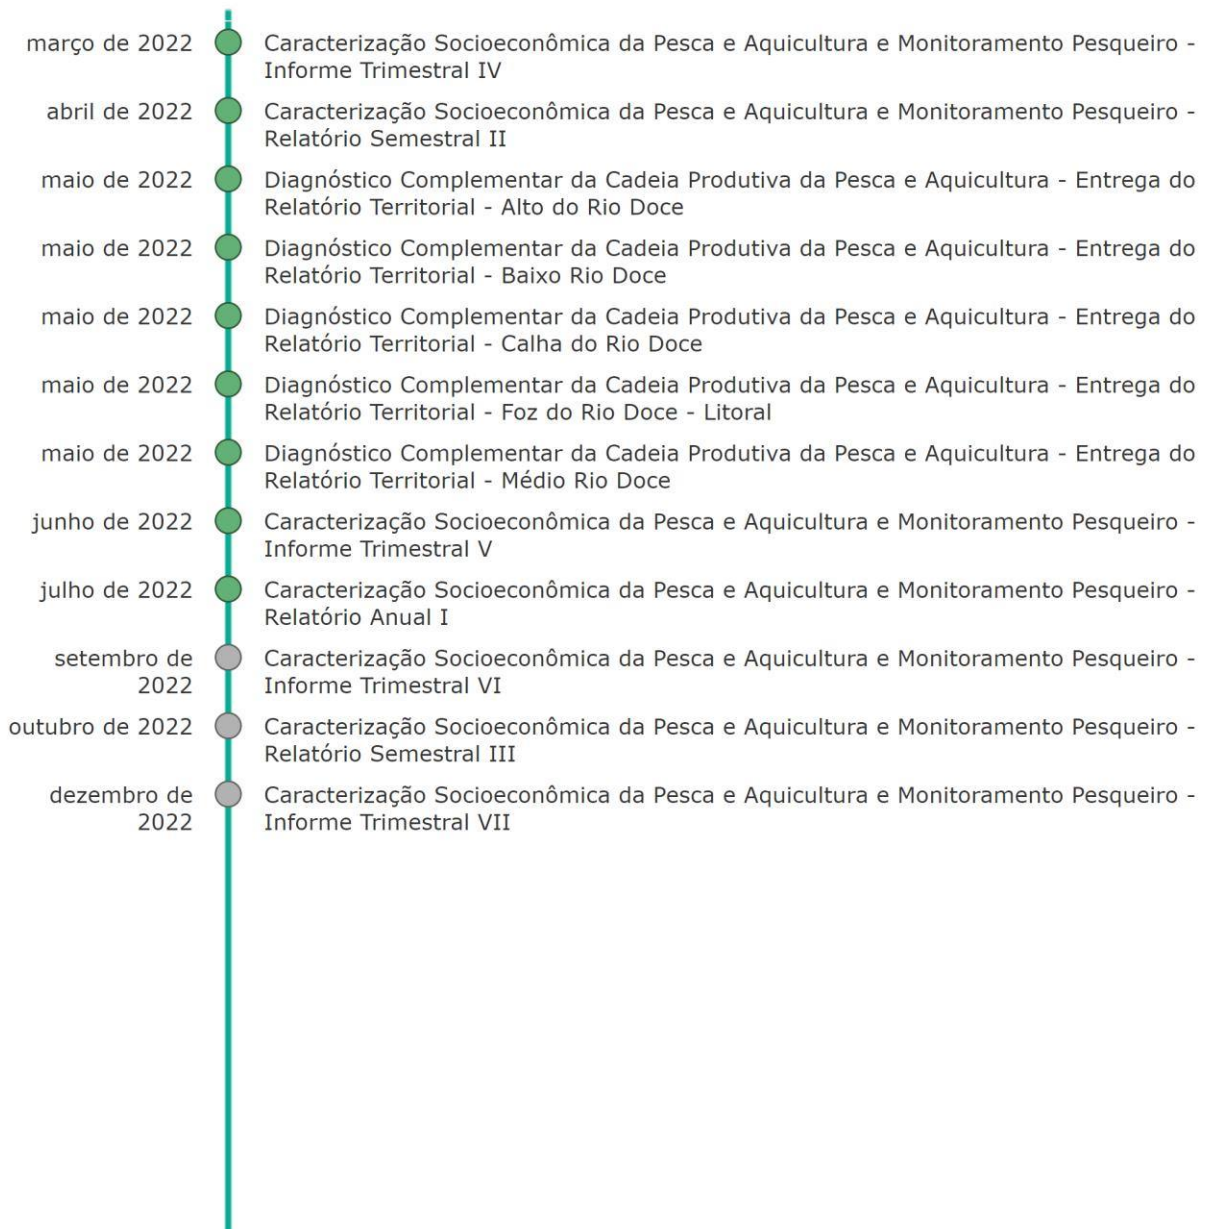

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação Junto aos Órgãos Públicos e Comunidades:
 - 3 Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientes nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
 - 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro:
 - 10,9 Mil formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, de forma remota com pescadores e aquicultores;
 - 5 informes trimestrais, 2 semestrais e 1 anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
 - 4 comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo 162 pessoas beneficiadas;
 - 7 capacitações realizadas, 3 temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
 - 2 visitas técnicas em 1 tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
 - 187 Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

- Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:
 - 197 beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
 - 3 municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
 - 4 associações beneficiadas:
 - 30 ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77 ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38 APIGUA (Guaxe)
 - 52 APAP (Povoação);
 - 2 associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
 - 40 capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (ASPERDOCE e ASPIPEC);
 - 4 Planos de negócio entregues.
- Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado:
 - 3090 Entrevistas realizadas, de forma remota, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais.
 - 42 Books municipais com informações da cadeia produtiva e comercialização do pescado nas comunidades;
 - 5 Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializado
Cláusula	125	b	Judicializado
Cláusula	125	c	Judicializado
Cláusula	125	d	Judicializado
Cláusula	125	e	Em Andamento
Cláusula	125	f	Em Andamento
Cláusula	125	g	Judicializado
Cláusula	125	h	Judicializado
Cláusula	125	i	Em Andamento
Cláusula	125	j	Judicializado
Deliberação	145	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	263	2	Concluído Internamente
Deliberação	263	3	Concluído Internamente
Deliberação	341	1	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
- dezembro de 2022 ● Término dos contratos de aluguel de pastagem

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.962,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 18.244,3 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140 propriedades;
- 461 barraginhas realizadas;
- 903 infraestruturas rurais simples e complexas concluídas;
- 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.564 hectares de reestruturação produtiva executados.

- Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 7.038 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 13.925 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);
- 58.074 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 2.134 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 6.369 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 220 toneladas no mês.

Parcerias

- 49 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER - MG;
- 28 capacitações técnicas **online** realizadas pela EMATER - MG
- 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
ALTO DOCE: Quantidade de toneladas de silagem entregues para produtores impactados no mês		0 As entregas de silagem do Alto Rio Doce já encerram.

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Realizada colheita do projeto feijão de Rio Casca, em parceria com Economia e Inovação, Diálogo da Calha e PG17.

Alto Rio Doce

Conclusão da instalação de sistema de tratamento de esgoto doméstico, nas propriedades atendidas e elegíveis no município de Ponte Nova.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)

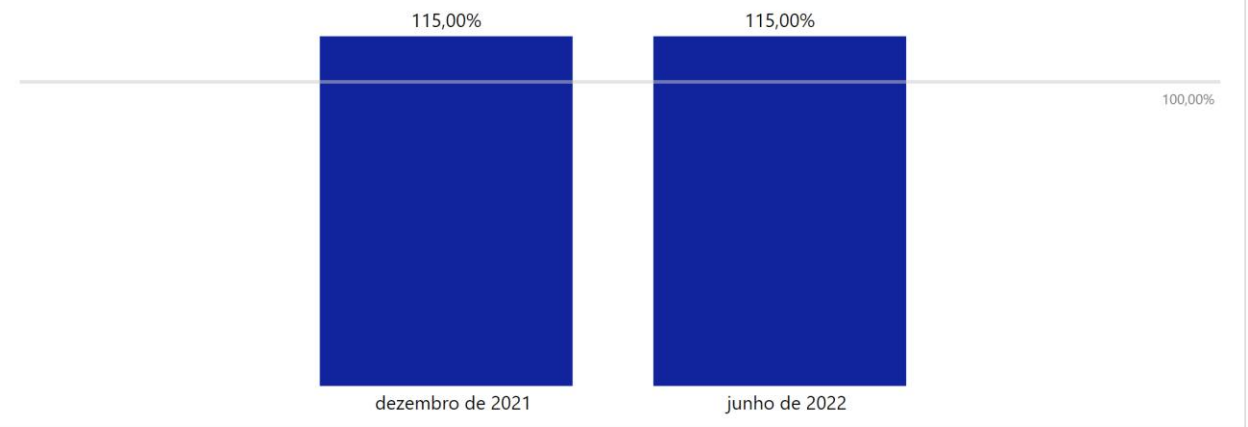


Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)



Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	I03 – número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / Número de famílias atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATER	Horas	dezembro/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	caput	Em Andamento
Cláusula	130	a	Em Andamento
Cláusula	130	b	Em Andamento
Cláusula	130	c	Concluído Internamente
Cláusula	130	d	Em Andamento
Cláusula	130	e	Em Andamento
Cláusula	130	f	Em Andamento
Deliberação	109	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	163	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	463	3	Em Andamento
Deliberação	503	2	Concluído Internamente
Deliberação	503	3	Reprogramado
Deliberação	589	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2022

- maio de 2022 ● Entrega das Colméias - Cadeia da Meliponicultura
- agosto de 2022 ● Inauguração da sede do Banco Comunitário em Baixa Verde / Dionisio
- outubro de 2022 ● Repasse Inicial de Recursos para o BDMG - Fundo Diversifica Mariana
- outubro de 2022 ● Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (deliberado)
- novembro de 2022 ● Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R\$ 76,90 milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em **Minas Gerais**, R\$ 59 milhões foram **desembolsados** para 1699 contratos e 1266 empresas.
- No **Espírito Santo**, R\$ 18 milhões foram **desembolsados** para 519 contratos e 486 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R\$ 55 milhões** em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R\$ 7 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Ref. Julho/2022

Fatos relevantes do mês

Retomada das obras da Casa do Empreendedor

Prorrogação das condições do Fundo Desenvolve Rio Doce - Retomada até dez/22

Inauguração do Banco Comunitário de Baixa Verde

Implementação da Cadeia Produtiva da Fruticultura em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce – MG

- Autorização do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para celebração de contrato de cessão de uso para construção da Unidade de Beneficiamento de Frutas e Mini Processados

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Percentual(%)

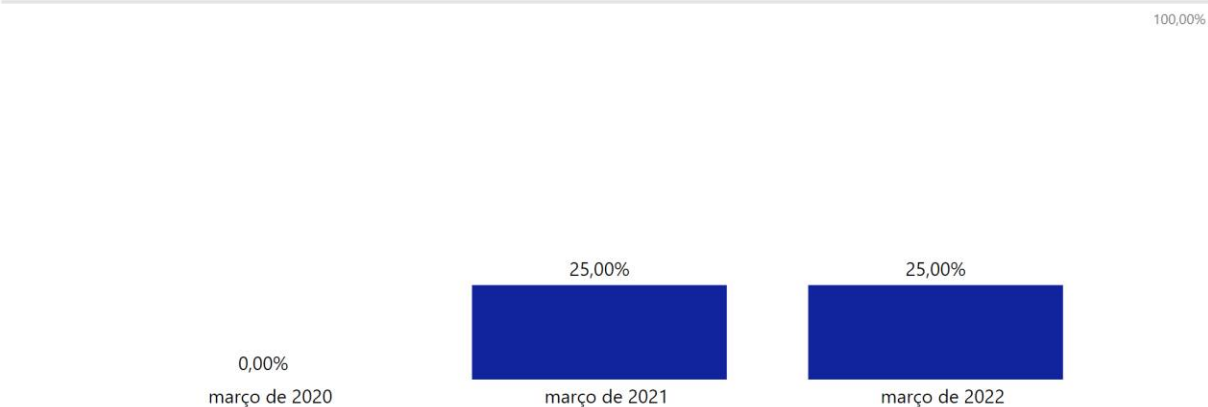


Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Contratos

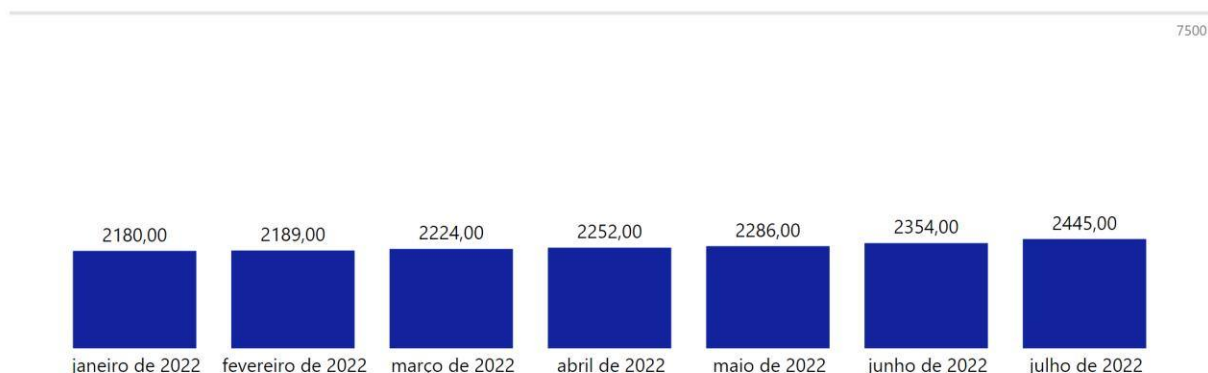


Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Percentual(%)

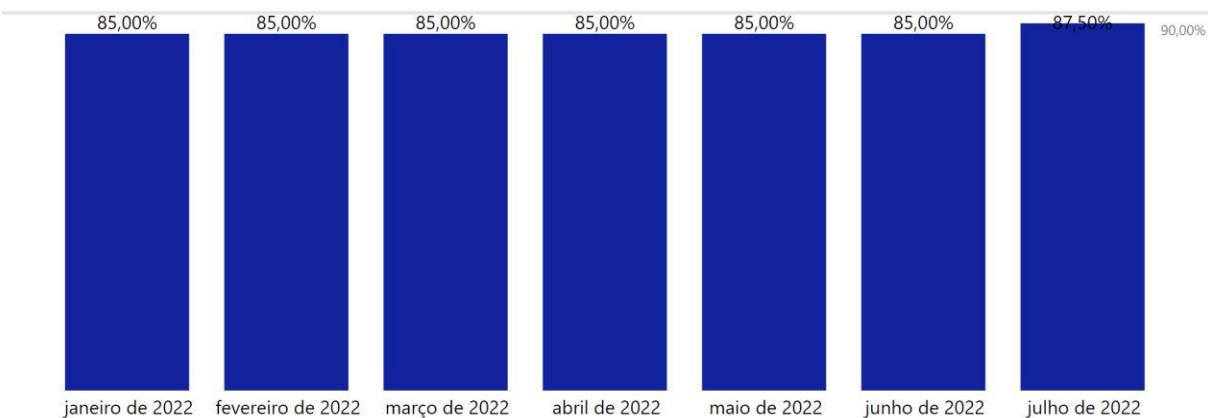


Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda

Atendimentos

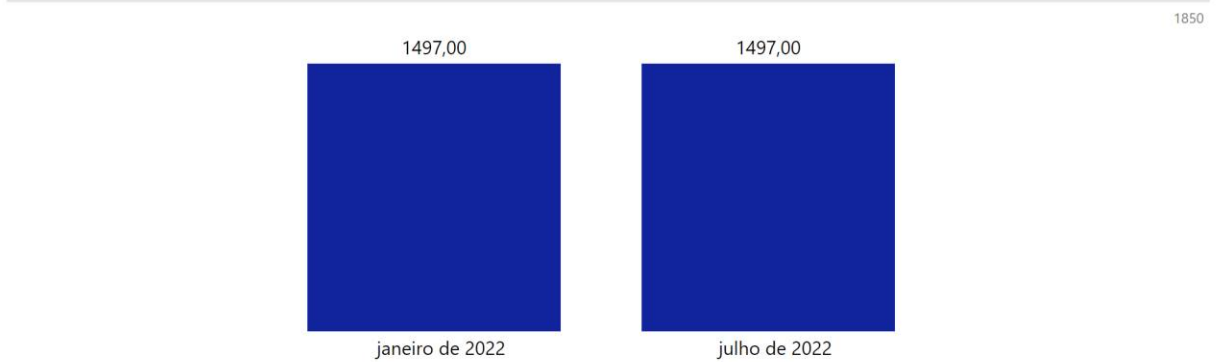


Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Atendimentos

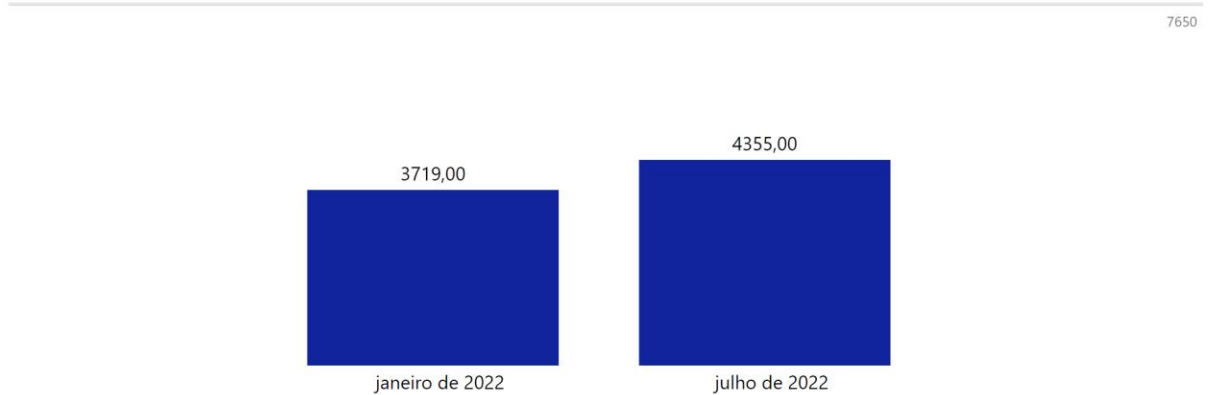


Gráfico 6: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	A vencer - em andamento
Cláusula	133	Caput	A vencer - em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	342	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

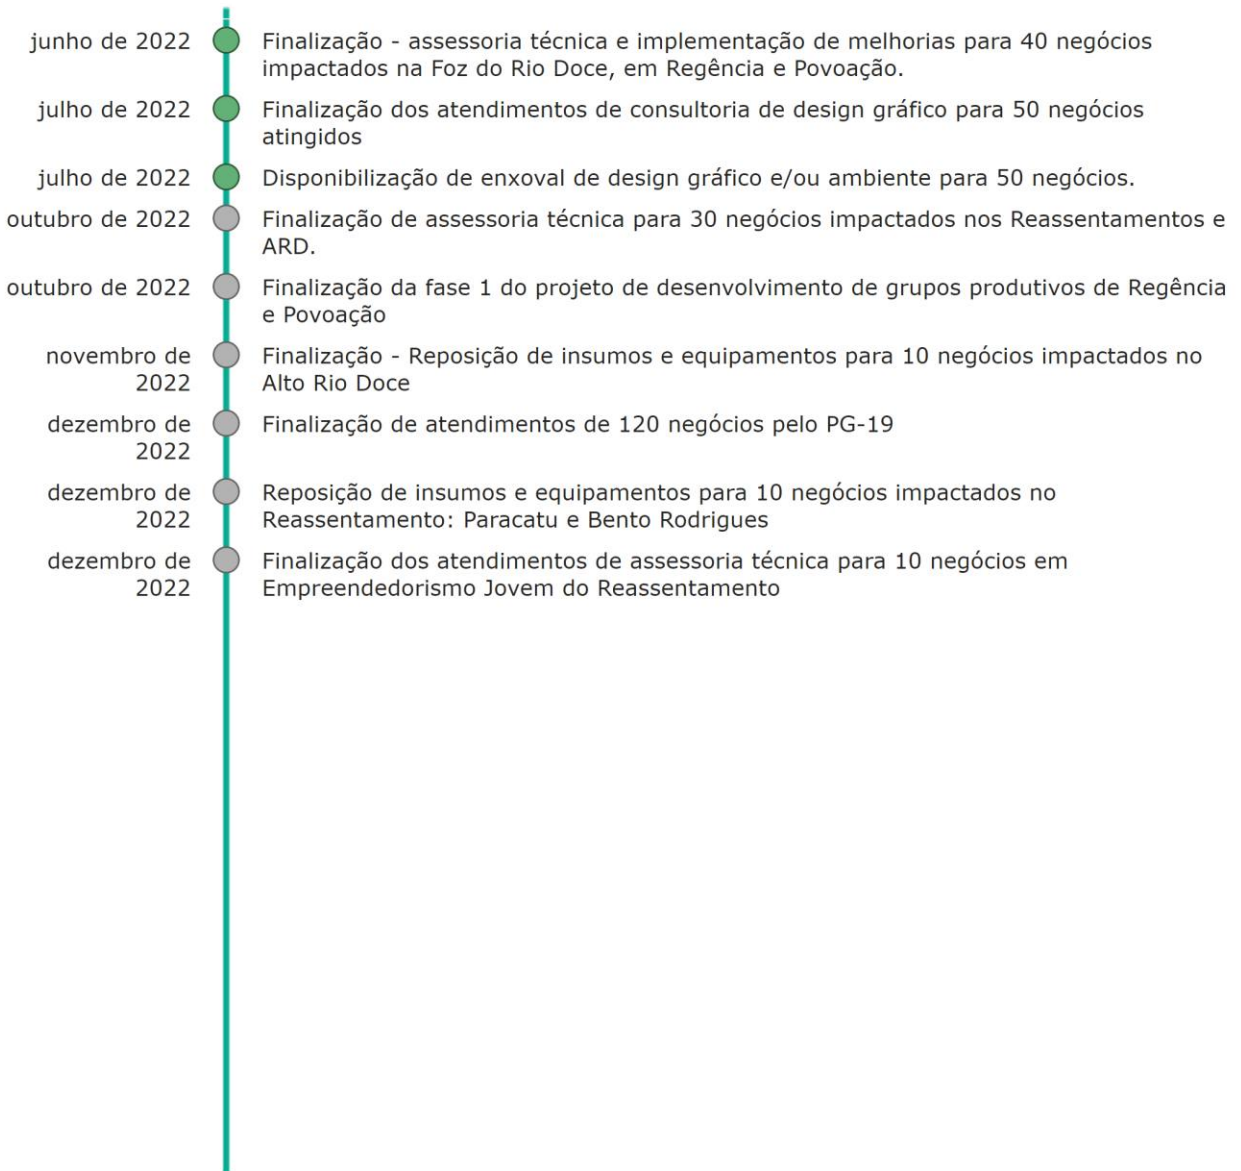

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

933 atendimentos realizados a 459 micro e pequenos negócios, por meio de 687 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 223 reposições de insumos e equipamentos e 6 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do mês

Instalação de pontos de atendimento do projeto Rio Doce Doce Mar em Regência e Povoação.

Entrega de Insumos e Equipamentos para 17 negócios em Agosto de 22.

Encerramento de atendimento a 12 negócios em Foz.

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Percentual(%)

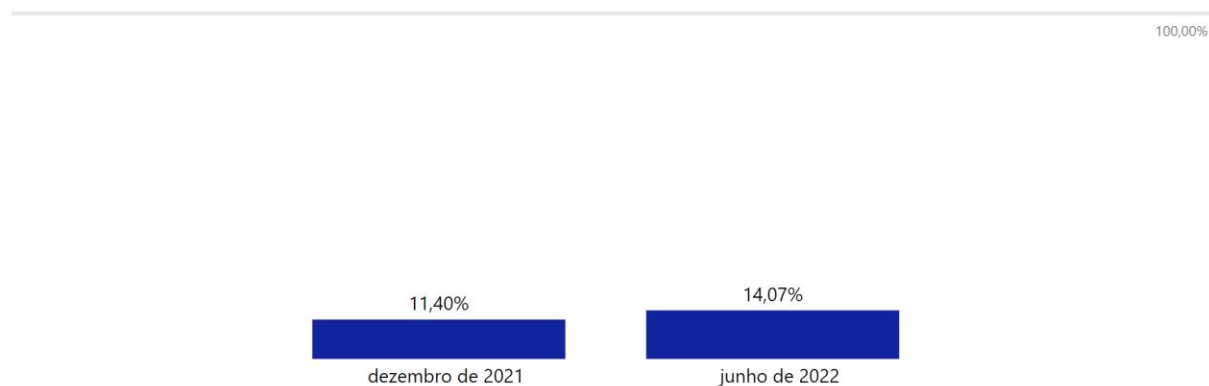


Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Percentual(%)

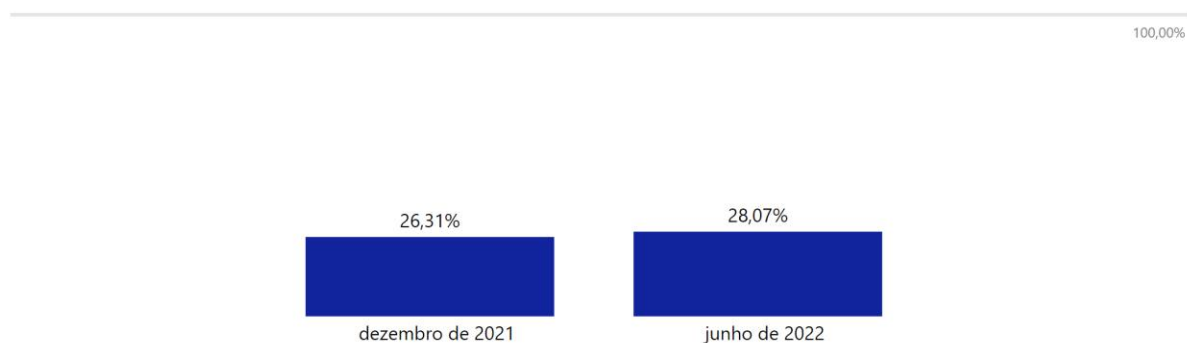


Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	caput	Em Andamento
Cláusula	135	a	Em Andamento
Cláusula	135	b	Em Andamento
Cláusula	136	caput	Em Andamento
Deliberação	146	1	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	352	5	Concluído Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- julho de 2022 Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF- Planejamento 2022)
- julho de 2022 Conclusão das capacitações de preparação para o Mercado de Trabalho (Recoloca Rio Doce)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 246 **turmas, abertas** 7.201 **vagas**, 6.459 **pessoas matriculadas**, 4.227 **concluintes**, 342 **reprovadas** e 1.455 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.335 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.208 **reprovadas** e 2.617 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$** 2.662.460 de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

RECOLOCA: Foram realizados dezoito eventos no mês de agosto com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana e Resplendor. Onde foram ofertadas 464 vagas e 464 participantes.

SENAI: No mês de agosto iniciamos oito turmas de capacitação profissional duas em Mariana (assistente administrativo e Instalador de Sistema Fotovoltaico), quatro em Ipatinga (Montador de Andaime e Soldador, Instalador Predial de Baixa Tensão) e uma em Regência (Montador de Andaime) no total foram ofertadas 195 vagas e tivemos 150 alunos matriculados.

Monitoramento de Contratações Locais:

Realizada a contratação de 522 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 248 contratações locais e 274 contratações não locais. Dessas 522 contratações, 251 profissionais são de Minas Gerais, 16 do Espírito Santo e 255 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 733 currículos e prospectadas 446 vagas de emprego no mês. No acumulado, 6.734 currículos estão cadastrados e 5.451 vagas já foram captadas.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

1. Realização dos 4 eventos de lançamento do projeto +Gestão. Foram realizados 2 eventos presenciais (Ipatinga e Linhares) e 2 eventos online. Total de inscritos 162 e 81 participantes.
2. Conclusão dos diagnósticos iniciais em 200 empresas nos municípios de atuação do projeto, sendo eles: Mariana, Ipatinga, Governador Valadares, Resplendor, em Minas Gerais e Baixo Guandu, Marilândia, Colatina e Linhares, no Espírito Santo.
3. Realização do Encontro de Negócios em Colatina em 09/08/2022. O evento teve como objetivo criar oportunidades e gerar negócios contribuindo para o desenvolvimento das Empresas Capixabas localizadas nos municípios de Colatina e Linhares. Houve participação do Governo do Estado, na pessoa do Alessandro Gris Drumond, Gerente de Projetos Institucionais, apresentando os projetos do Governo, particularmente o projeto Compre do ES. A Rodada de Negócios foi realizada pela Fundação Renova em parceria com a Findes por meio do IEL (Instituto Euvaldo Lodi) e o Programa +Negócios. O evento contou com a presença de 5 empresas compradoras e 12 empresas vendedoras, totalizando 60 reuniões.

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Percentual(%)

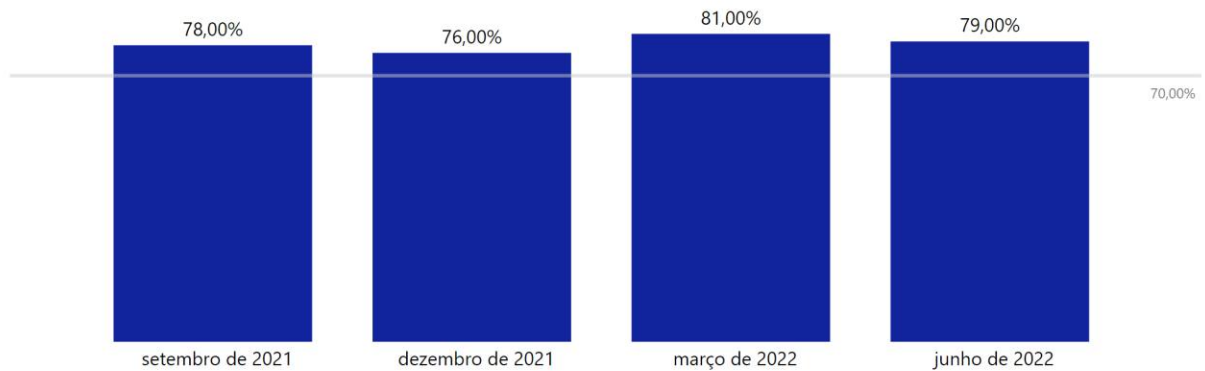


Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Percentual(%)

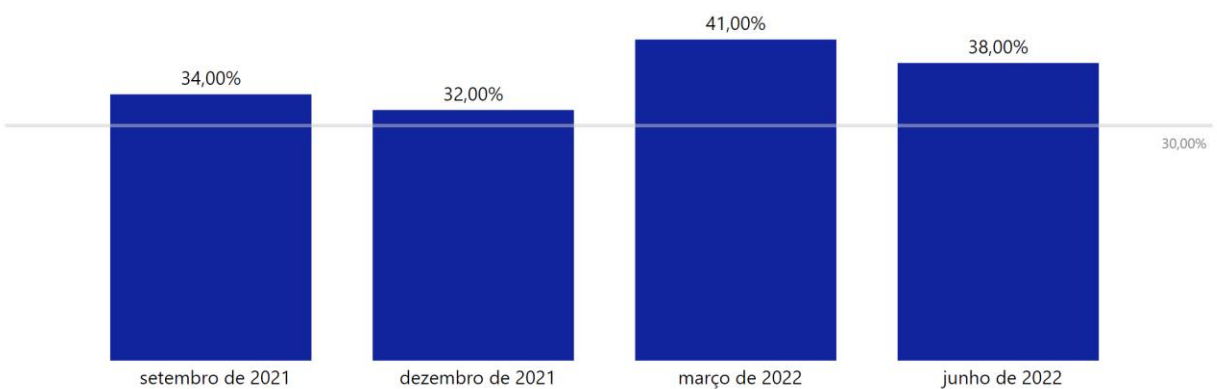


Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

*Os indicadores I01 e I02 são reportados com delay de um mês.

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios

Percentual(%)

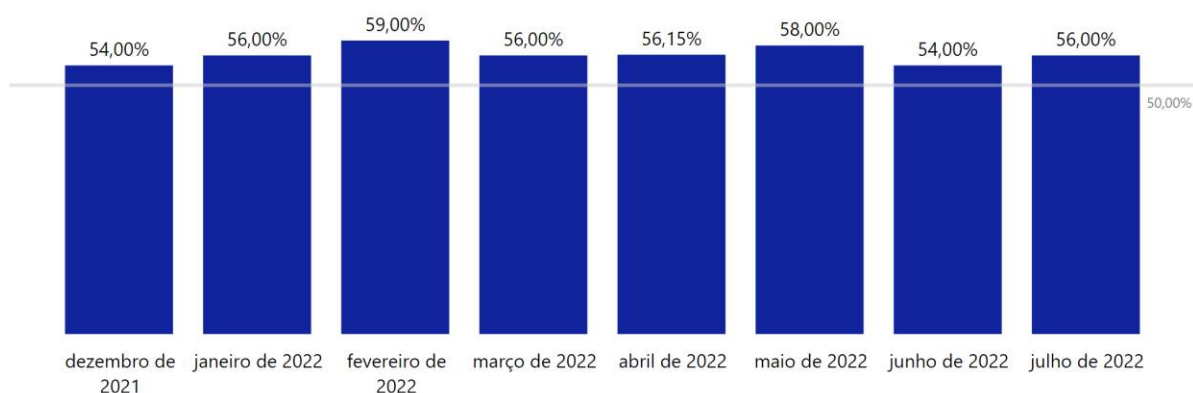


Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal

*Os indicadores I03 e I04 são reportados com delay de um mês.

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Quantidade

4.000

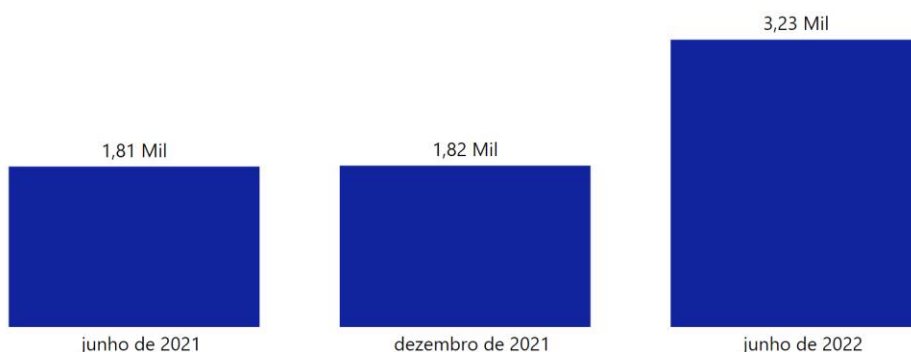


Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadualna área de atuação da Renova

Percentual(%)

50,00%

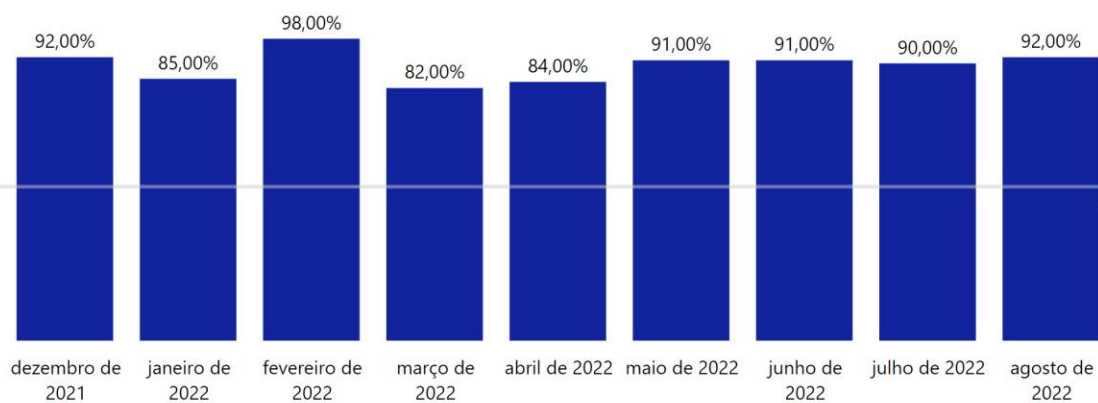


Gráfico 6: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadualna área de atuação da Renova - Frequência Mensal

Indicadores

Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Quantidade

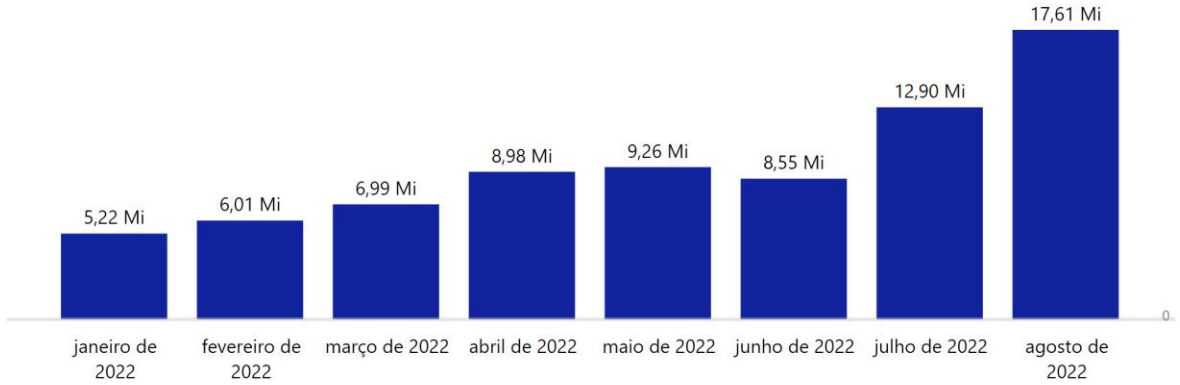


Gráfico 7: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	caput	Judicializado
Deliberação	111	6	Concluído Internamente
Deliberação	141	4	Concluído Internamente
Deliberação	167	1	Concluído Internamente
Deliberação	167	2	Concluído Internamente
Deliberação	167	3	Judicializado
Deliberação	210	único	Concluído Internamente
Deliberação	234	4	Concluído Internamente
Deliberação	234	5	Concluído Internamente
Deliberação	292	2	Concluído Internamente
Deliberação	307	2b	Concluído Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializado
Deliberação	422	2	Concluído Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializado
Deliberação	48	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 7.162 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 16.024 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram **pagos R\$** 1.929,0 Mi .

Fatos relevantes do mês

Inclusão de 2 auxílios

Exclusão de 176 auxílios

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Percentual(%)

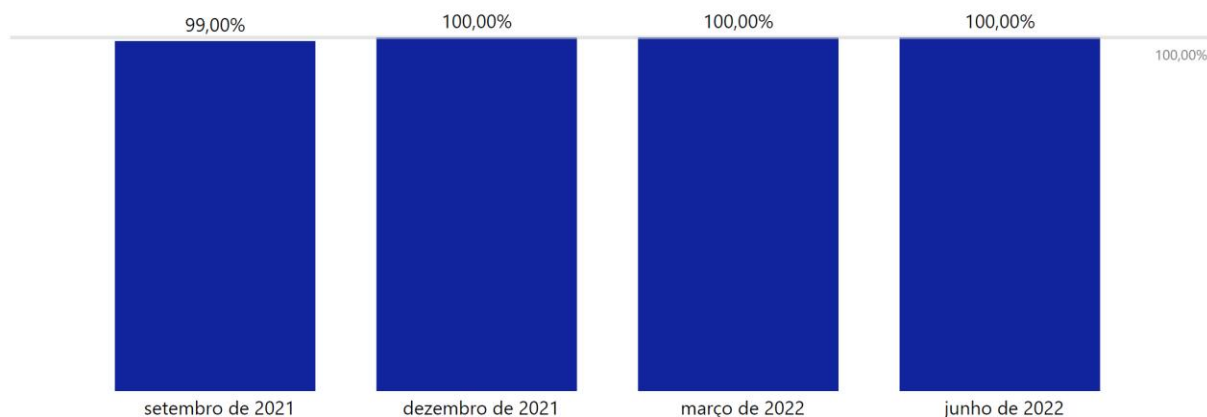


Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações



Cláusula	150	caput	Concluído Internamente
Cláusula	151	caput	Judicializado
Cláusula	180	§único	Judicializado
Cláusula	180	caput	Em Andamento
Deliberação	142	2	Concluído Internamente
Deliberação	164	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	1	Concluído Internamente
Deliberação	165	2	Concluído Internamente
Deliberação	173	3	Concluído Internamente
Deliberação	180	2	Concluído Internamente
Deliberação	194	2	Em Andamento
Deliberação	222	1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluído Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	245	1	Em Andamento
Deliberação	245	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	245	1.4	Em Andamento
Deliberação	246	2	Concluído Internamente
Deliberação	246	3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1	Em Andamento
Deliberação	261	1.18	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluído Internamente

Deliberação	261	1.1	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.10	Em Andamento
Deliberação	261	1.11	Em Andamento
Deliberação	261	1.12	Em Andamento
Deliberação	261	1.13	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.15	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.16	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluído Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializado
Deliberação	261	1.9	Em Andamento
Deliberação	273	1	Em Andamento
Deliberação	273	1.4	Em Andamento
Deliberação	273	1.5	Em Andamento
Deliberação	273	1.6	Em Andamento
Deliberação	273	1.7	Em Andamento
Deliberação	323	1	Em Andamento
Deliberação	324	2	Concluído Internamente
Deliberação	345	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	1	Concluído Internamente
Deliberação	358	2	Concluído Internamente
Deliberação	358	3	Judicializado
Deliberação	362	2	Reprogramado
Deliberação	363	1	Concluído Internamente
Deliberação	364	1	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente

Deliberação	273	1.1	Em Andamento
Deliberação	273	1.2	Concluído Internamente
Deliberação	273	1.3	Em Andamento
Deliberação	284	1	Concluído Internamente
Deliberação	284	2	Concluído Internamente
Deliberação	285	3	Concluído Internamente
Deliberação	285	4	Concluído Internamente
Deliberação	285	5	Concluído Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	304	2	Judicializado
Deliberação	384	1	Concluído Internamente
Deliberação	431	2	Concluído Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	453	3	Concluído Internamente
Deliberação	488	2	Judicializado
Deliberação	488	4	Judicializado
Deliberação	497	1	Concluído Internamente
Deliberação	497	2	Concluído Internamente
Deliberação	497	3	Concluído Internamente
Deliberação	516	2	Concluído Internamente
Deliberação	516	3	Concluído Internamente
Deliberação	544	2	Concluído Internamente
Deliberação	544	3	Concluído Internamente
Deliberação	590	2	Concluído Internamente
Deliberação	592	2	Concluído Internamente
Deliberação	592	5	Em Andamento
Deliberação	86	1-c	Concluído Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	86	e	Concluído Internamente

Deliberação	86	1-a	Concluído Internamente
Deliberação	86	f	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- maio de 2022  Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica do Baixo Doce
- novembro de 2022  Conclusão dos Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias (Monitoramento da Vegetação e Monitoramento de Processos Erosivos) - 4º Ano hidrológico

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Reunião gerencial realizada em 09/08 para tratar do estudo hidrossedimentológico e geomorfológico.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1







Eixo Terra e Água

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrado
Cláusula	159	§único	Em Andamento
Cláusula	159	Caput (recuperação)	Em Andamento
Cláusula	160	Caput	Concluído Internamente
Deliberação	186	2	Concluído Internamente
Deliberação	223	3	Concluído Internamente
Deliberação	249	3	Concluído Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 1	Concluído Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- março de 2022  Conclusão do convênio UFV-SIF - Prof. Venâncio (Acompanhamento técnico, definição de indicadores, metas e monitoramento das ações de restauração florestal da Área Ambiental 1)
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2022
- dezembro de 2022  Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2022

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

Término da campanha de campo da 1ª fase do monitoramento ecológico.

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

15,00%

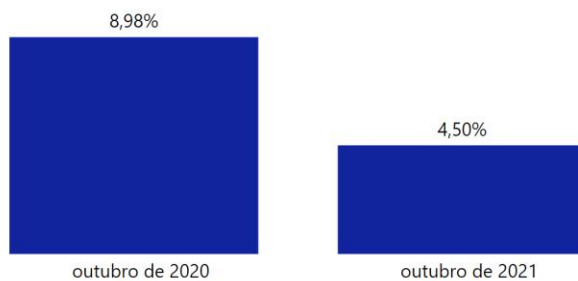


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianaual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	$(\text{Área total com cobertura vegetal herbácea - arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) \times 100$	%
I02	Índice de Solo Exposto	$(\text{Área total com solo exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) \times 100$	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	$(0,011 \times \text{banda } 2 \times \text{NDVI2}) + (-0,008 \times \text{Banda } 3 \times \text{NDVI2})$	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	$(\text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle}) \times 100$	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$(\text{Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) \times 100$	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) - Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras - Cenários B e C	$(\text{Área total com espécie invasora} / \text{Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) \times 100$	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializado
Deliberação	108	2	Concluído Internamente
Deliberação	108	3	Concluído Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	133	2	Concluído Internamente
Deliberação	134	2	Concluído Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	143	3	Concluído Internamente
Deliberação	143	5	Concluído Internamente
Deliberação	143	6	Concluído Internamente
Deliberação	144	1	Concluído Internamente
Deliberação	196	4	Concluído Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	88	3	Concluído Internamente
Deliberação	89	3	Concluído Internamente
Deliberação	90	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24
fevereiro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
fevereiro de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 22/23
maio de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 23/24
junho de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
junho de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24
junho de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23
junho de 2022	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
julho de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
julho de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23
outubro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
outubro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 24/25
novembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
novembro de 2022	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
dezembro de 2022	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 23/24

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 5.078,7 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 242 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 27,8 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R\$ 523 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 20.405 hectares validados.

Fatos relevantes do mês

Apresentação dos programas 26 e 27 como ferramenta de aceleração do PRA (Programa de regularização ambiental) em MG. Palestra realizada em Ubá - MG no evento "PRA Produzir Sustentável" organizado pelo IEF_PG's 26 e 27;

Confecção dos Kits didáticos de apoio a capacitação de coletores da Rede de sementes e Mudanças_PG's 26 e 27;

Foram submetidas propostas de 3 simpósios e 1 oficina para a SOBRE2022_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores assentamento São Domingos_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade barra de Santo Antônio_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade Córrego Mestre_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade quilombola Santa Bárbara_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade quilombola Sesmarias_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores de sementes na comunidade quilombola Maitacas em Sabinópolis_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores distrito de Quilombo_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores sementes comunidade quilombola de Bom Jardim_PG's 26 e 27;

Publicação do edital Manhauçu (Lotes 25 a 28)_PG 26;

Reunião com a Cenibra para troca de tecnologias e possibilidade de parceria de mútua cooperação_PG's 26 e 27;

Reunião de Handover e Kickoff do edital da bacia do Guandu_PG 26;

Visita do conselho curador, comitê sócio-ambiental e diretoria nas atividades de campo do PG 26 e PG 27 em Colatina/ES_PG's 26 e 27;

Fatos relevantes do mês

Visita ao viveiro C4_PG's 26 e 27;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo


Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializado
Deliberação	135	3	Concluído Internamente
Deliberação	135	4	Concluído Internamente
Deliberação	135	5	Concluído Internamente
Deliberação	490	1	Concluído Internamente
Deliberação	490	2	Concluído Internamente
Deliberação	87	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
janeiro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 21/22
junho de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Assentamentos MG e TI Krenak - 19/21
julho de 2022		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
julho de 2022		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 22/23
agosto de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
setembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 22/23
setembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
setembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhauçu - 22/23
setembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhauçu - 23/24
setembro de 2022		Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 22/23
setembro de 2022		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
outubro de 2022		Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22
outubro de 2022		Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 19/21
dezembro de 2022		Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Lagoa Nova (Rio Bananal) - 21/22

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23
- dezembro de 2022 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1475 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 529 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 4075 **nascentes** inscritas no edital;
- R\$ 184413 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 2490 Nascentes Validadas

Fatos relevantes do mês

Apresentação dos programas 26 e 27 como ferramenta de aceleração do PRA (Programa de regularização ambiental) em MG. Palestra realizada em Ubá - MG no evento "PRA Produzir Sustentável" organizado pelo IEF_PG's 26 e 27;

Confecção dos Kits didáticos de apoio a capacitação de coletores da Rede de sementes e Mudas_PG's 26 e 27;

Foram submetidas propostas de 3 simpósios e 1 oficina para a SOBRE2022_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores assentamento São Domingos_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade barra de Santo Antônio_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade Córrego Mestre_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade quilombola Santa Bárbara_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores comunidade quilombola Sesmarias_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores de sementes na comunidade quilombola Maitacas em Sabinópolis_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores distrito de Quilombo_PG's 26 e 27;

Mobilização de coletores sementes comunidade quilombola de Bom Jardim_PG's 26 e 27;

Reunião com a Cenibra para troca de tecnologias e possibilidade de parceria de mútua cooperação_PG's 26 e 27;

Visita ao viveiro C4_PG's 26 e 27;

Visita do conselho curador, comitê sócio-ambiental e diretoria nas atividades de campo do PG 26 e PG 27 em Colatina/ES_PG's 26 e 27;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – Nascentes recuperadas	I00 - Nascente Recuperada	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrado
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrado
Cláusula	164	b	Encerrado
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluído Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Planejado
Cláusula	165	Inc I	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluído Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em Andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializado
Cláusula	166	§1º	Em Andamento
Cláusula	166	§2º	Planejado
Deliberação	102	2	Concluído Internamente
Deliberação	112	2	Concluído Internamente
Deliberação	113	2	Concluído Internamente
Deliberação	148	3	Concluído Internamente
Deliberação	148	4	Concluído Internamente
Deliberação	159	2	Concluído Internamente
Deliberação	159	3	Judicializado
Deliberação	212	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	279	2	Concluído Internamente
Deliberação	279	3	Concluído Internamente
Deliberação	282	1	Concluído Internamente
Deliberação	282	2	Concluído Internamente
Deliberação	336	1	Concluído Internamente

Deliberação	337	1	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluído Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	392	1	Concluído Internamente
Deliberação	447	1	Judicializado
Deliberação	450	2	Judicializado
Deliberação	450	5	Concluído Internamente
Deliberação	461	3	Concluído Internamente
Deliberação	578	2	Concluído Internamente
Deliberação	579	1	Planejado
Deliberação	74	1	Concluído Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	●	Protocolo dos relatórios finais das linhas temáticas I a VI
janeiro de 2022	●	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2022	●	Conclusão do Ciclo 3 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
março de 2022	●	Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática
abril de 2022	●	Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática - Versão revisada
julho de 2022	●	Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI
agosto de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto I - SIF/UFV
agosto de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto IV - SIF/UFV
agosto de 2022	●	Realização da Oficina I de Elaboração do PA Integrado
setembro de 2022	●	Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
setembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto II - SIF/UFV
outubro de 2022	●	Protocolo do Relatório subprojeto III-B - SIF/UFV
novembro de 2022	●	Protocolo do Relatório Semestral do Ciclo 5 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas na CT-Bio
dezembro de 2022	●	Realização da Oficina II de Elaboração do PA Integrado

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Em 19 de agosto de 2022 foi protocolado o Ofício FR.2022.1206 referente à apresentação do relatório e dados brutos dos Subprojetos I (Índice de integridade biótica da bacia do Rio Doce após o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro de Fundão) e IV (Variações da dieta de peixes da bacia do Rio Doce). Esses Subprojetos compõem o “Estudo da Ictiofauna da bacia do Rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco”, em atendimento à Deliberação CIF nº 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.

Em 18 e 19 de agosto de 2022 foi realizada a Oficina presencial do Plano de Ação Integrado da Biodiversidade Aquática.

Em 12 de agosto de 2022 foi encaminhado o Livro do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Cláusula 164 alínea c) para avaliação da CTBio, em atendimento à solicitação realizada na 64ª Reunião Ordinária da CTBio, de 06 de julho de 2022.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Percentual(%)

100,00%

34,63%

junho de 2022

Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	caput	Em Andamento
Cláusula	167	§1º	Concluído Internamente
Cláusula	167	§2º	Planejado
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	478	1	Concluído Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluído Internamente
Deliberação	554	1	Planejado

Entregas do ano de 2022

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores de resultados do programa foram aprovados em dezembro de 2021 pela Deliberação CIF 553, porém por solicitação do IBAMA, as ações deste programa estão paralisadas devido a indefinição sobre as áreas a serem construídos os CETRAS, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Desta forma, não será possível a medição dos indicadores até a retomada das ações ainda sem previsão.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água





Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrado
Cláusula	168	§2º	Em Andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrado
Deliberação	132	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	449	3	Concluído Internamente
Deliberação	517	3	Concluído Internamente
Deliberação	91	2	Concluído Internamente
Deliberação	91	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- abril de 2022  Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento
- setembro de 2022  Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.
- setembro de 2022  Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna
- outubro de 2022  Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de flora

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;
- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre**.

Fatos relevantes do mês

Em 20/08/22 foi concluída primeira campanha do Projeto de Conservação e Manejo de espécies ameaçadas de extinção (UFV/CCSS)

Em 02/08/22 ocorreu o encerramento do 2º ciclo de reuniões de monitoria do PABT

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Percentual(%)

100,00%

1,03%

junho de 2021

1,65%

dezembro de 2021

Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	caput	A vencer - em andame...
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrado
Cláusula	170	Inc I	Encerrado
Cláusula	170	Inc II	Encerrado
Cláusula	170	Inc III	Encerrado
Cláusula	170	Inc IV	Encerrado
Cláusula	170	Inc V	Encerrado
Deliberação	122	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	224	5	Concluído Internamente
Deliberação	259	2	Concluído Internamente
Deliberação	259	3	Em Andamento
Deliberação	295	1	Concluído Internamente
Deliberação	295	2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.1	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluído Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Alpercata ALPESPJ01 -Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova
abril de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Itueta ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba
maio de 2022	●	Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
agosto de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Iapu IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Mariéira MREESCT01-Aquisição de terreno para implantação da ETE do distrito de Cava Grande
setembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Naque NAQESPJ02-Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município
outubro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Ipatinga IPAESOB03-Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Galiléia GALEST01-Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Aimorés AIMRSPJ01-Elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem - UTC
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Timóteo TIMRSPM03-Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge
novembro de 2022	●	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB03-Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dezembro de 2022 ● Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIOESCT01- Desapropriação/aquisição de área para instalação da ETE no Distrito de Conceição de Minas de Dionísio
- dezembro de 2022 ● Conclusão do repasse do Pleito de Dionísio DIORSAB01-Aquisição de caminhão basculante, esteira de triagem, prensa hidráulica, balança e empilhadeira manual hidráulica
- dezembro de 2022 ● Conclusão do repasse do Pleito de Barra Longa BALRSPJ01-Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC)

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2022 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2023 e por isso não aparecem mais na *time line*.

AIMESCT02, CONESOB01, PERRSOB02, TUMESPJ01, DIOESOB03, PIARSAB01, SAPRSPM01, BUGESPJ02, GALESPJ01, RASESPJ02, AIMESPJ03, NAQESPM01, BALEST01 e CVPRSAB01.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês **agosto de 2022** , **foram repassados R\$ 2.140.228,08** para ações dos municípios*;
- No mês **agosto de 2022** foram ofertadas **0 oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês **agosto de 2022** a equipe técnica realizou **136 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	2.140.228,08	Repasse para ações nos municípios de Bugre, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Naque, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, Timóteo e consórcio Condoeste.

Fatos relevantes do mês

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R\$ 588.242,66 referente a execução das obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos de Colatina;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R\$ 63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Colatina;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R\$ 550.000,00 referente a aquisição de bens para a destinação de resíduos sólidos;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$ 515.000,00 referente a aquisição de bens para a destinação de resíduos sólidos;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$ 45.670,75 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$ 84.390,10 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R\$ 5.500,00 referente a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$ 170.176,46 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$ 49.215,68 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$ 43.500,00 referente a Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Timóteo, no valor de R\$ 25.480,00 referente a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada;

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Percentual(%)

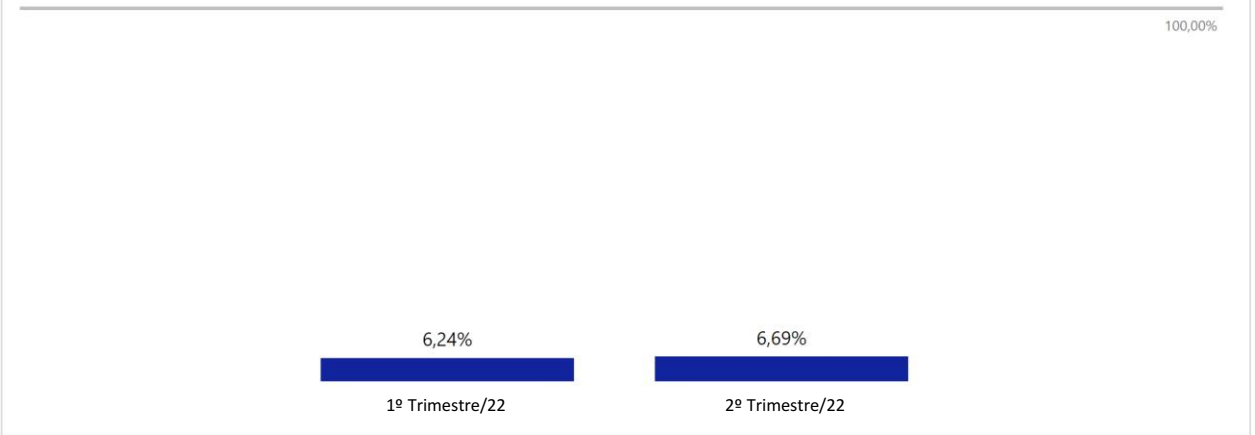


Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Percentual(%)

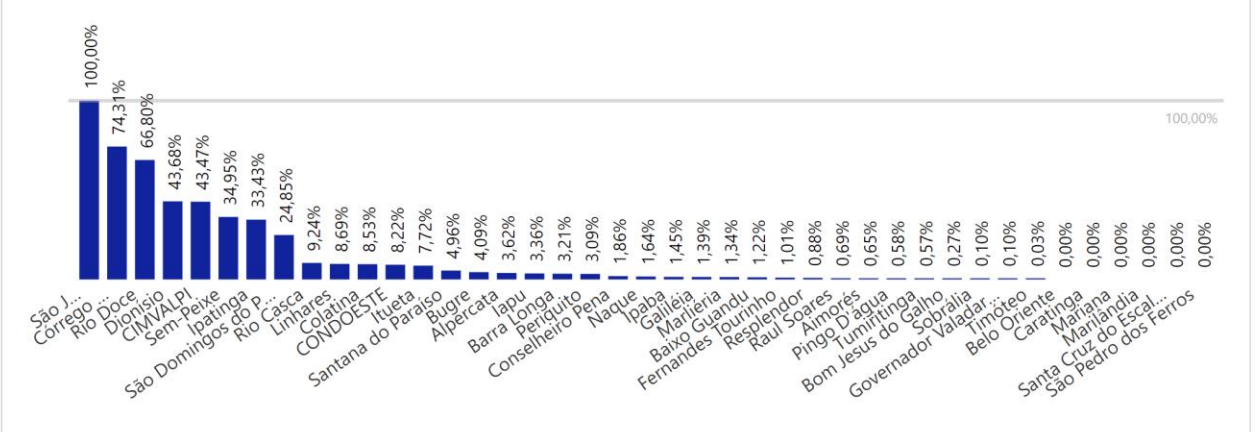


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

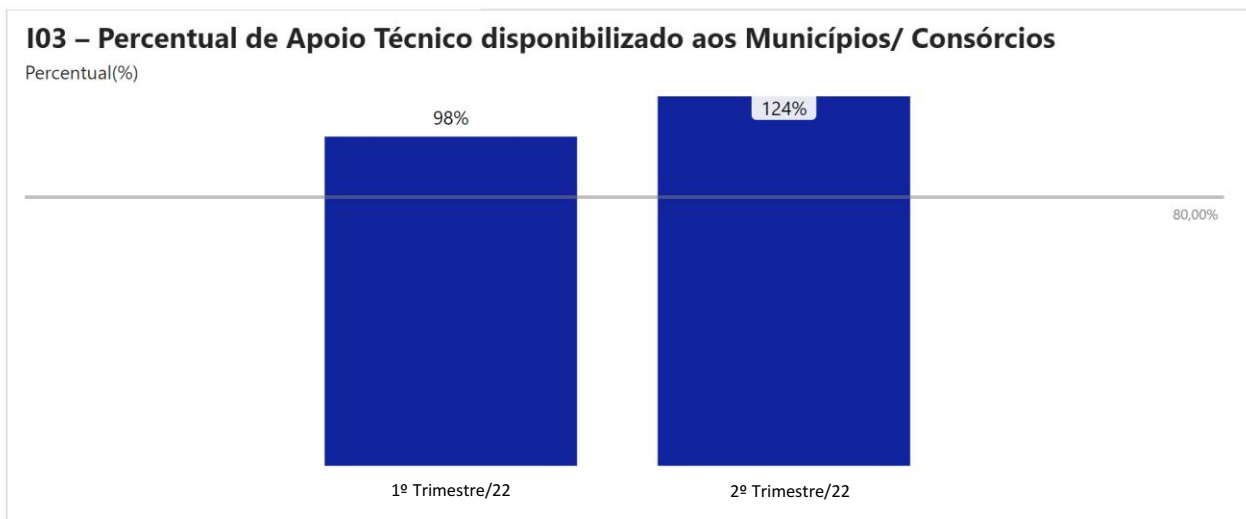


Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

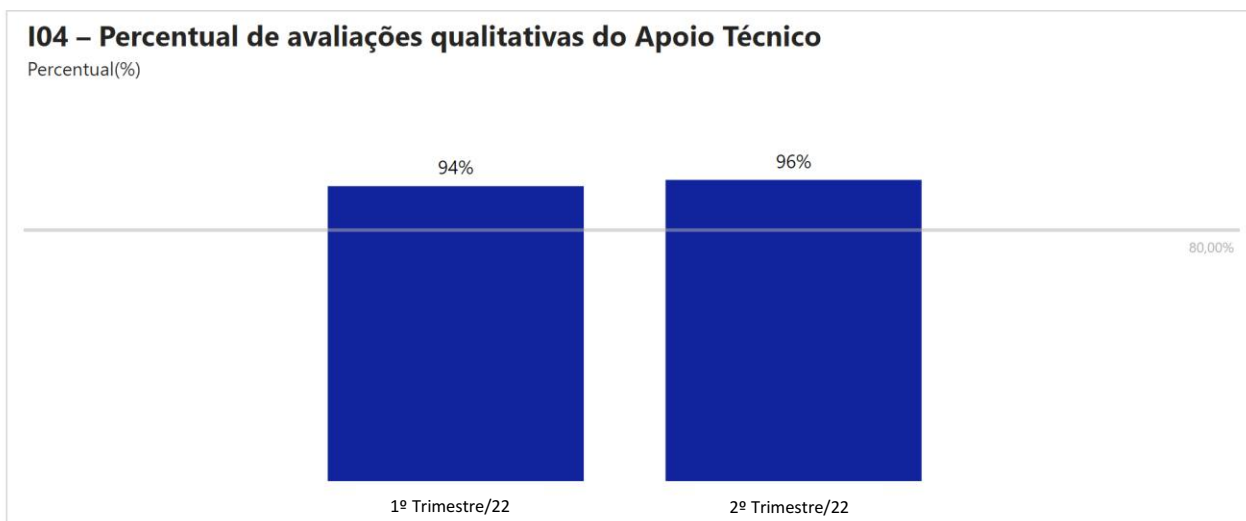


Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

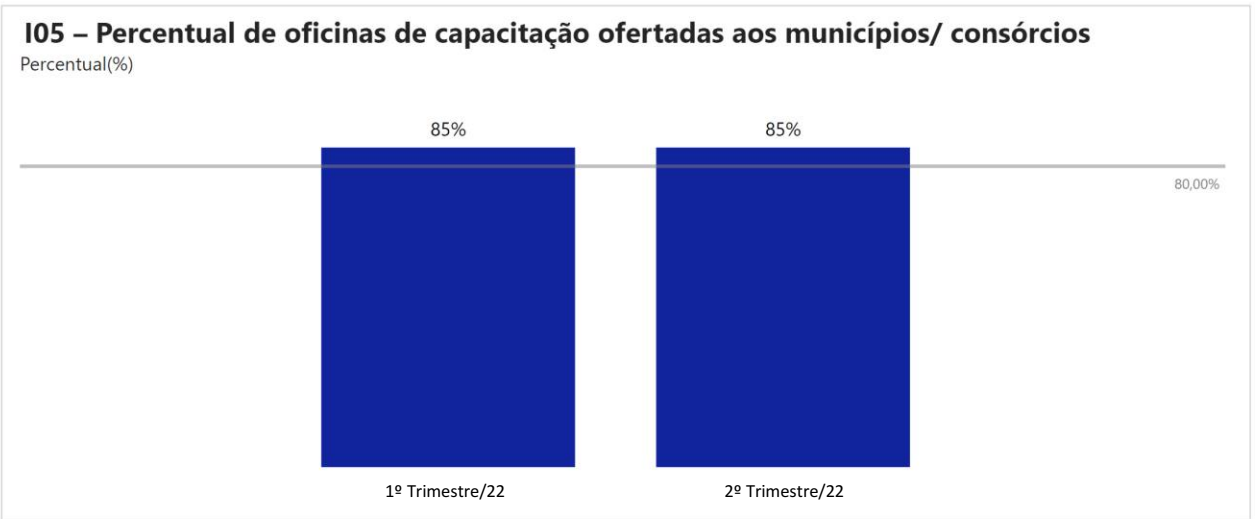


Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

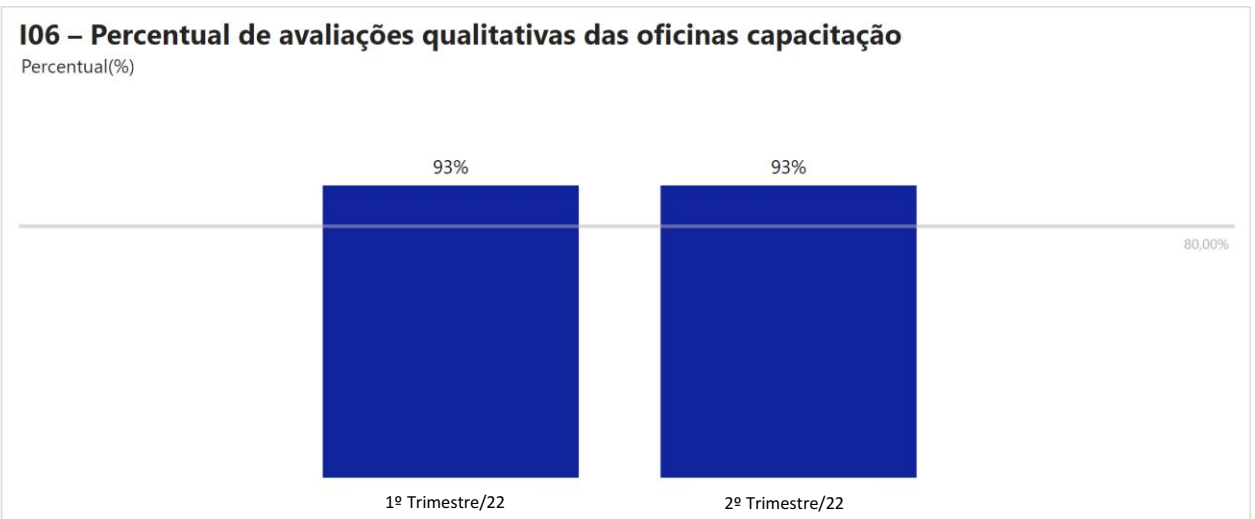


Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)

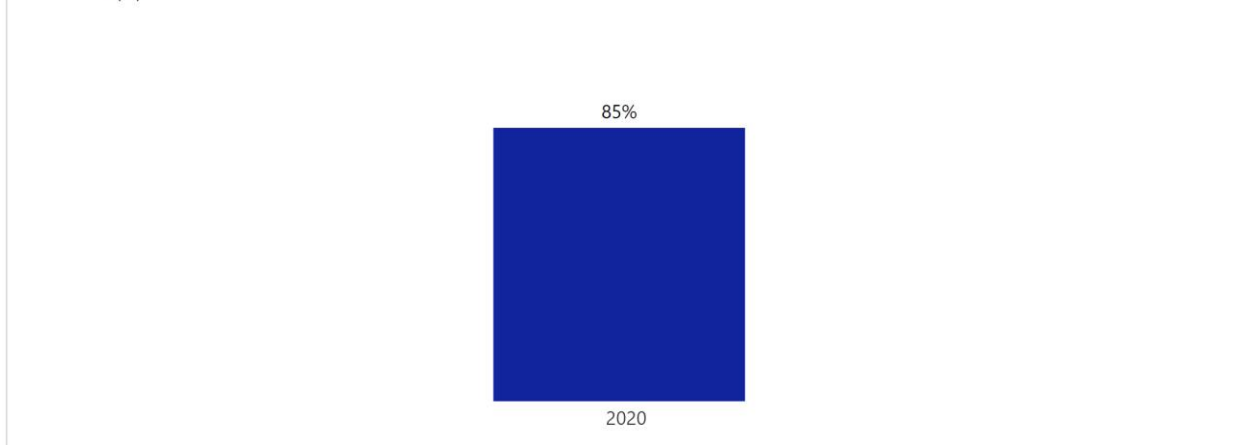


Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)

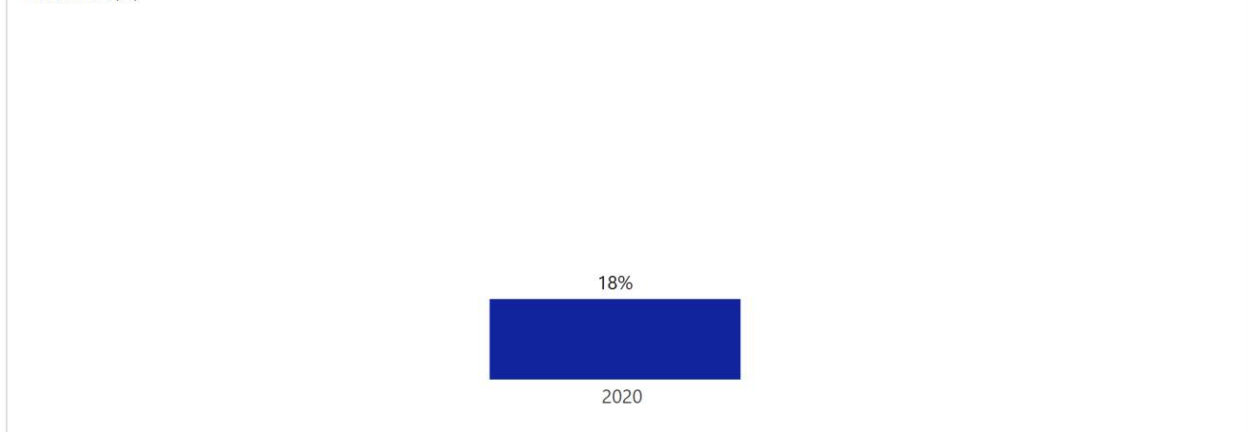


Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS;
- **I07**-No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I08**-No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)



Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)

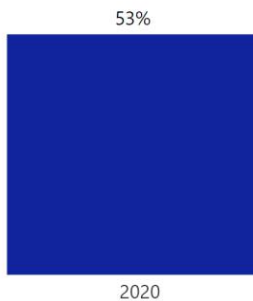


Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

Notas:

- Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS;
- **I09**-No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
- **I10**-No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

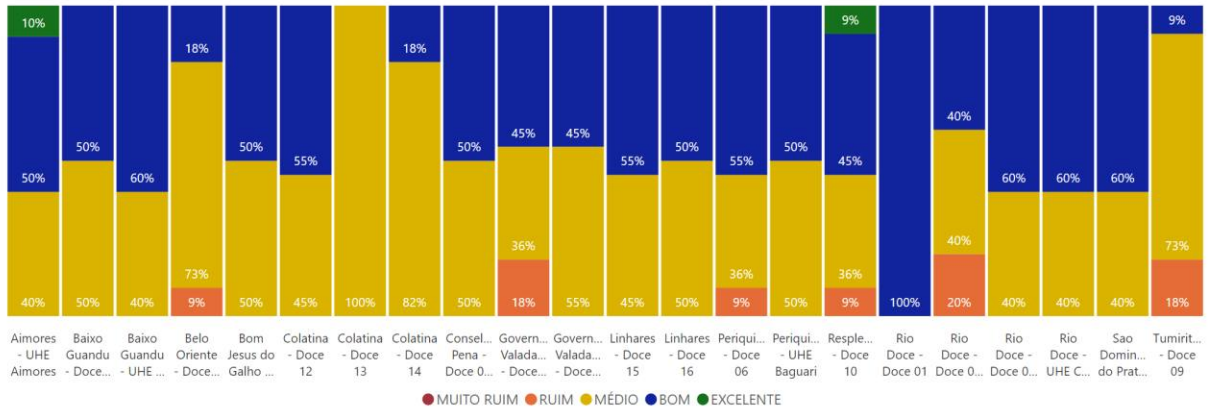


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

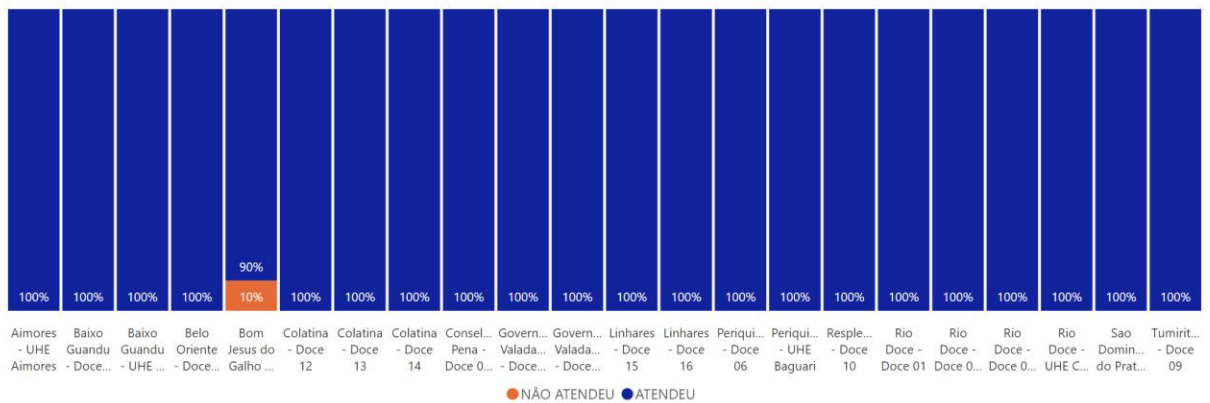


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

Percentual(%)

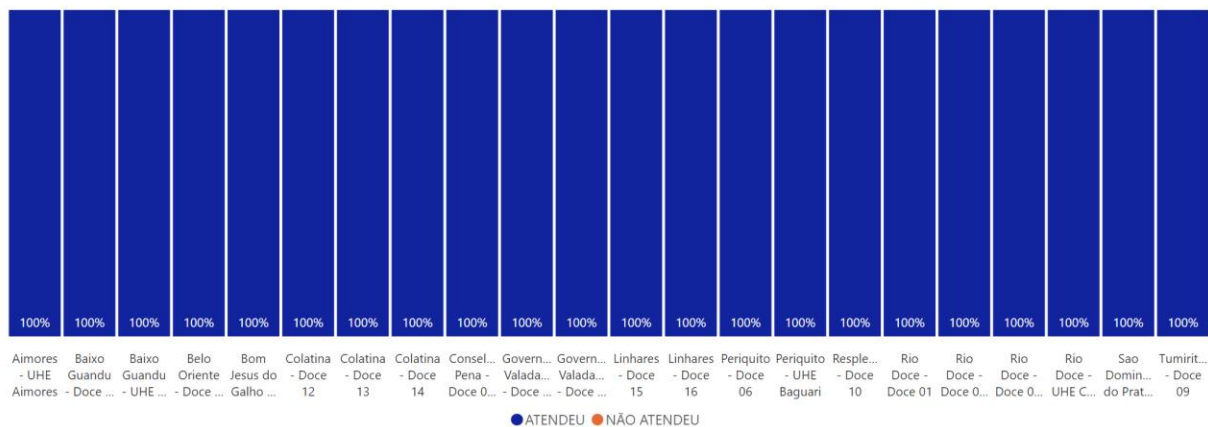


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	caput (obra)	Judicializado
Cláusula	171	caput (projeto)	Judicializado
Deliberação	10	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	123	2	Concluído Internamente
Deliberação	123	3	Judicializado
Deliberação	124	2	Concluído Internamente
Deliberação	124	4	Concluído Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializado
Deliberação	185	2	Concluído Internamente
Deliberação	185	3	Concluído Internamente
Deliberação	185	4	Judicializado
Deliberação	185	5	Judicializado
Deliberação	185	6	Judicializado
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializado
Deliberação	258	4	Concluído Internamente
Deliberação	258	5	Concluído Internamente
Deliberação	308	2	Judicializado
Deliberação	315	1	Concluído Internamente
Deliberação	325	1	Judicializado
Deliberação	33	1	Concluído Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	379	1	Concluído Internamente
Deliberação	379	2	Concluído Internamente
Deliberação	379	3	Concluído Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializado

Deliberação	443	a	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	98	1	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Conclusão da Engenharia Conceitual / Básica - Captação principal - Ponte do Gama
- dezembro de 2022 ● Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede
- dezembro de 2022 ● Conclusão das Obras - Captação Alternativa - Tumiritinga Sede

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do Programa

- 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Fatos relevantes do mês

Nos dias 16 a 19 de agosto de 2022, a equipe de perícia deu/dará continuidade às visitas técnicas periciais junto aos beneficiários cadastrados no programa de abastecimento de água da Fundação Renova para o Território VII, que corresponde à Comunidade Quilombola do Degredo (Linhares/ES) (ID 1260919781).

Nos dias 04 e 05 de agosto de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG, para avaliação e acompanhamento das atividades de execução de obra realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3, Obras, Comissionamento e Monitoramento.

No dia 17 de agosto de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Senhora da Penha, município de Fernandes Tourinho/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

No dia 16 de agosto de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Ipaba do Paraíso, município de Santana do Paraíso/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

No dia 09 de agosto de 2022, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Ipaba do Paraíso, município de Santana do Paraíso/MG e da localidade Senhora da Penha, município de Fernandes Tourinho/MG.

No dia 03 de agosto de 2022 a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

No dia 12 de agosto a Prefeitura de Tumiritinga assinou os Termos de Compromisso das localidades de São Tomé do Rio Doce e da sede de Tumiritinga.

Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R\$ 43.500,00 referente a Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

* As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

* Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Indicadores

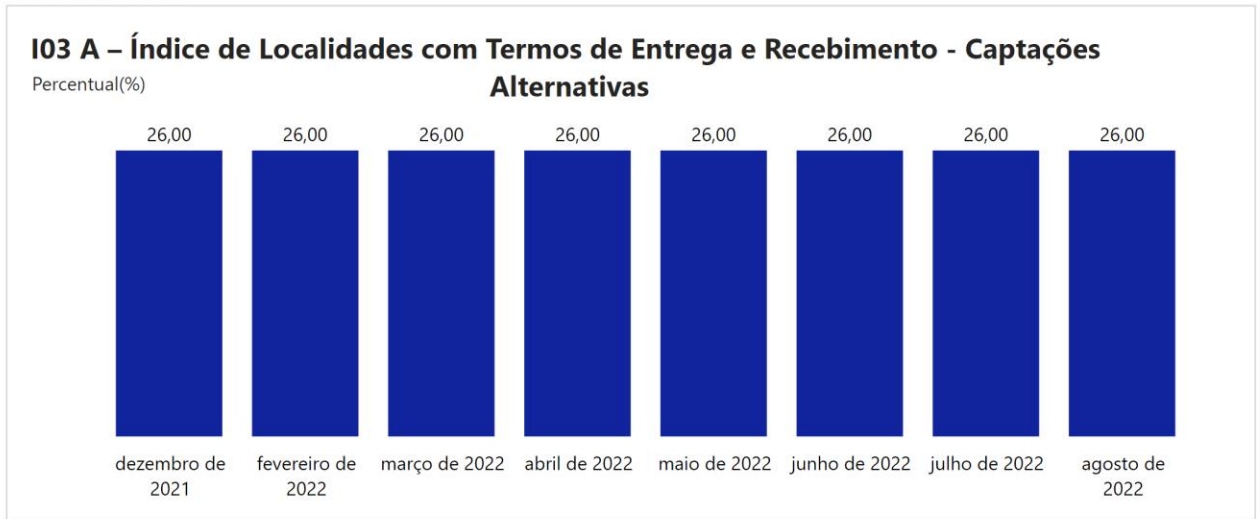


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

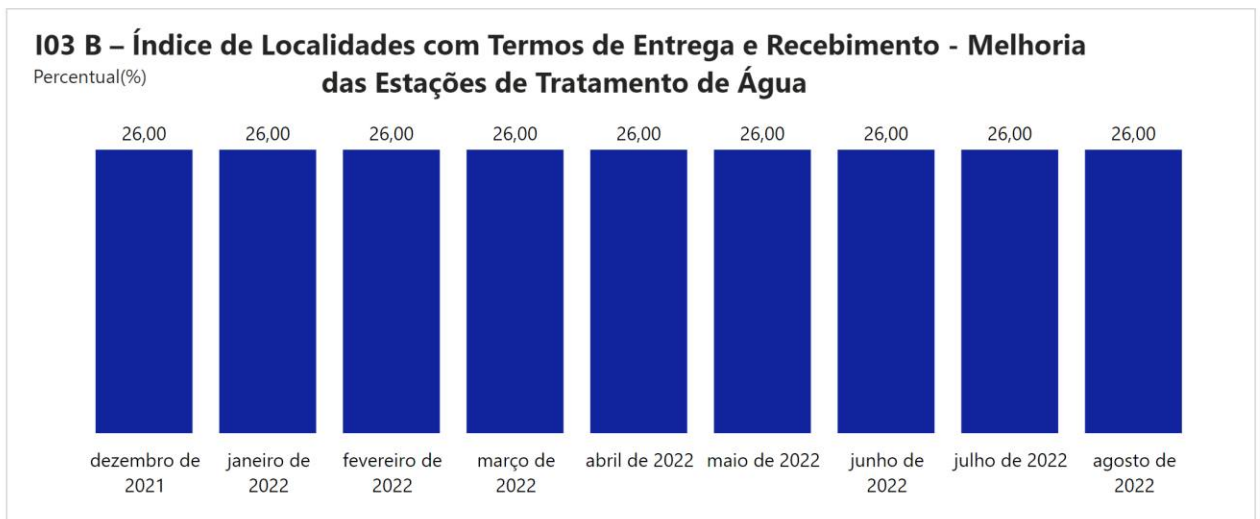


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Percentual(%)

100,00%




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Percentual(%)

100,00%




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades


Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em Andamento
Deliberação	136	1	Concluído Internamente
Deliberação	240	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	1	Concluído Internamente
Deliberação	288	2	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluído Internamente
Deliberação	549	2	Planejado

Entregas do ano de 2022



janeiro de 2022	●	Conclusão da Formação em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária (Nível Formadores) – MG
julho de 2022	●	Finalização do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
dezembro de 2022	●	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 2) de Assentados da Reforma Agrária - ES
dezembro de 2022	●	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 3) de Assentados da Reforma Agrária - MG

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

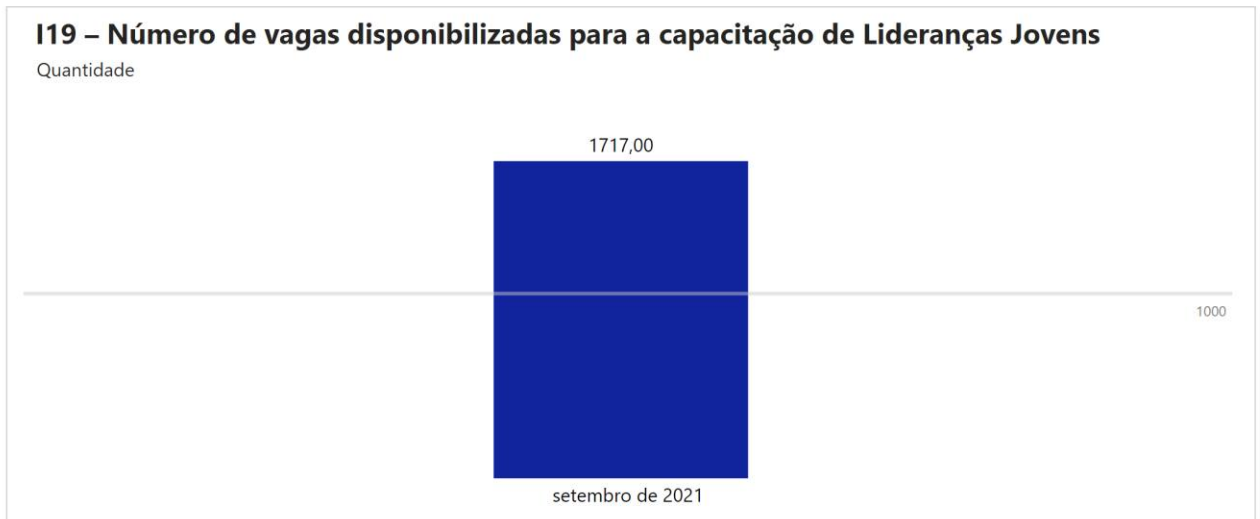


Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades






Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Concluída no prazo
Cláusula	173	§2º	Concluída no prazo
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída no prazo
Cláusula	173	Caput (ação 2)	A vencer - em andame...
Deliberação	128	2	Concluído Internamente
Deliberação	303	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	2	Concluído Internamente
Deliberação	357	3	Concluído Internamente
Deliberação	439	2	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

março de 2022	 Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração
setembro de 2022	 Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
dezembro de 2022	 Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos (CGR) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	 Conclusão da Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	 Realização do Censo Populacional das áreas de risco a partir do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Realizado a oficina de Primeiro Socorros - Lei Lucas, nas escolas do Projeto Escola Segura.

Realizado a oficina de mídias sociais do Projeto Comunidade Conectada - nível básico, nos NUPDEC's de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Realizado a oficina de Ciclo da gestão de riscos e desastres, nas escolas do Projeto Escola Segura.

Conclusão da Etapa de Propostas de Ações Não Estruturais, dos Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) dos municípios de Barra Longa e Rio Doce.

Conclusão da Etapa de Intervenções Estruturais, dos Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) dos municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Conclusão da Etapa de Elaboração do Programa Municipal de Gestão de Risco, dos Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) dos municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

Indicadores

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Percentual(%)

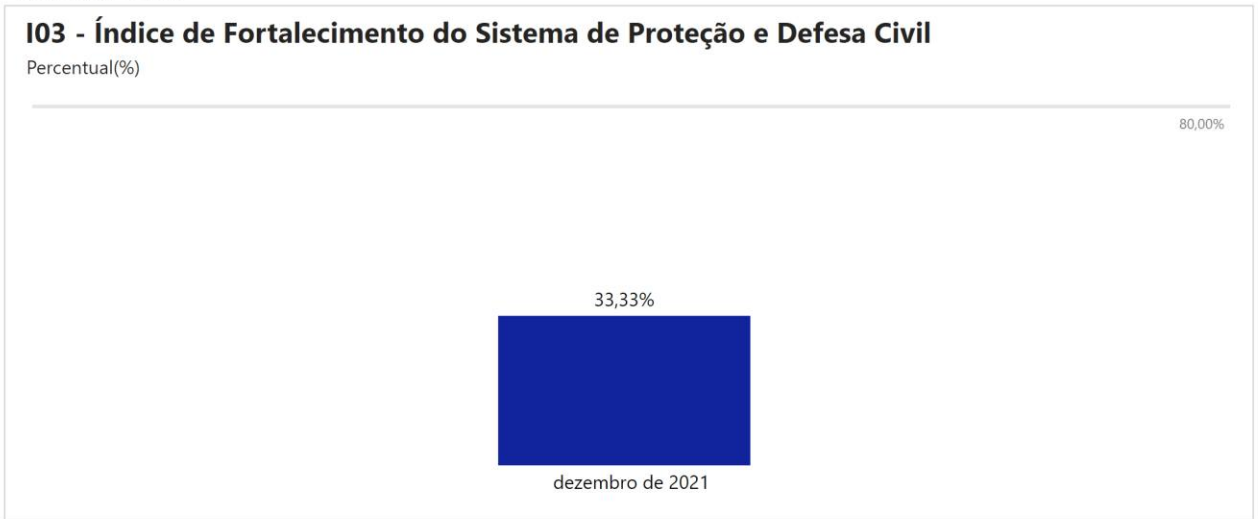


Gráfico 1: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis

Percentual(%)




Gráfico 2: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25
I02	Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Dezembro/22

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Salvaguardar e dar acesso às informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos, incluindo:

- (i) estudos técnicos e ações de reparação e compensação; aos moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos, por meio de espaços físicos e itinerantes, que constituem o Centro de Informação Técnica; e
- (ii) processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos, sobre o modo de vida e memória.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluído Internamente
Deliberação	229	4	Concluído Internamente
Deliberação	229	5	Concluído Internamente
Deliberação	306	2	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluído Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluído Internamente
Deliberação	376	2	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluído Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluído Internamente
Deliberação	500	I	Concluído Internamente
Deliberação	500	II	Concluído Internamente
Deliberação	500	III	Concluído Internamente
Deliberação	500	IV	Concluído Internamente
Deliberação	500	V	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

abril de 2022

- Elaboração do e-book com os artigos/trabalhos apresentados nos processos de itinerância e descentralização 2021

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	julho de 2022	agosto de 2022	Acumulado 2022	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	215	700	3410	3593
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	0	0	0	10

Fatos relevantes do mês

Nos dias 09 e 10 de julho a equipe técnica do PG35 participou de reuniões de Diálogo Coletivo em Povoação/ES e Linhares/ES, respectivamente, para apresentação do CIT e da plataforma interativa visando promover os objetivos do CIT, demonstrar como o site funciona, as formas de participação da comunidade, bem como, para informar e convidá-los para participação e construção coletiva do acervo de Narrativas Territoriais.

Produção do folder sobre o conteúdo da Plataforma Interativa do CIT – Centro de Informação Técnica como parte das ações de divulgação, publicização e consolidação do acervo.

A equipe técnica do PG35 dividiu-se para participar, simultaneamente, de dois eventos presenciais, no dia 20 de julho, a saber: “Mostra de Projetos”, realizadas na Unileste, em Ipatinga/MG e “Ação de Empreendedorismo e Cidadania” em Baixo Guandu/ES”. A participação nos eventos teve como objetivo aproximar o CIT do público atingido e, também, fazer o mapeamento de potenciais colaboradores, materiais, conteúdos, depoimentos etc.

O Programa 35 recebeu, em 25 de agosto de 2002, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares, o ofício OF/SMCELT/GAB-845/2022 formalizando a aprovação do projeto básico apresentado para implantação do CIT na Praça Getúlio Vargas.

Em 23 de agosto de 2022, o PG35 recebeu do ICMBio, email de “De Acordo” para com o início das atividades do projeto que envolve a digitalização do acervo fotográfico disponível no Centro Ecológico de Regência, parte do escopo das ações do 2º Ciclo de Oficinas Trilhas de Memórias.

O Programa PG35 deu início à divulgação da “Chamada Aberta” para o 2º Ciclo de Webinários do Conhecimento em Pauta convidando estudiosos e pesquisadores a se inscreverem, até 09 de setembro, para apresentarem suas pesquisas e estudos realizados sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus impactos, cumprindo seu objetivo de difundir a produção técnico-científica sobre a temática, em curso.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades





Objetivo

- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluído Internamente
Deliberação	530	1	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022		Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022
dezembro de 2022		Conclusão da atualização e manutenção dos mecanismos relacionados à acessibilidade do site, seguindo como critério recomendações do guia WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) e/ou padrão E-MAG em 2022

 Concluído
  Planejado
  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	julho de 2022	agosto de 2022	Acumulado 2022	Acumulado (2016 - 2022)
Acesso ao Site (mês)	468.126	325.905	2.392.848	9.538.830
Documentos no site (mês)	10	4	68	531
Notícias Publicadas (mês)	15	20	109	996
Vídeos (mês)	11	13	96	678

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores




Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal




Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal




Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Alcance Orgânico Facebook

Unidade




Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal

I06 – Visualizações no Youtube

Unidade




Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo









Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	107	4	Concluído Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluído Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluído Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluído Internamente
Deliberação	265	2	Concluído Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluído Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluído Internamente
Deliberação	313	2	Concluído Internamente
Deliberação	378	5	Concluído Internamente
Deliberação	378	6	Concluído Internamente
Deliberação	381	1	Concluído Internamente
Deliberação	409	2	Concluído Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluído Internamente
Deliberação	455	1	Concluído Internamente
Deliberação	458	2	Concluído Internamente
Deliberação	458	3	Concluído Internamente
Deliberação	511	2	Concluído Internamente
Deliberação	511	3	Concluído Internamente
Deliberação	512	1	Concluído Internamente
Deliberação	512	2	Concluído Internamente
Deliberação	512	3	Concluído Internamente

Deliberação	513	1	Concluído Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	572	3	Concluído Internamente
Deliberação	572	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	3	Concluído Internamente
Deliberação	76	4	Concluído Internamente
Deliberação	76	5	Concluído Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluído Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

Entregas do ano de 2022

jun/22		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/22 a Mar/22
mar/22		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/21 a Dez/21
ago/22		Finalização do Plano de Capacitação Presencial PMQQS
abr/22		Protocolo do 5º Boletim PMQACH (Campanha 37, 38, 39 e 40)
mar/22		Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
jul/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/22
jun/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/22
mai/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/22
jun/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/22
jul/22		Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2022)
abr/22		Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2021)
set/22		Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce
set/22		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/22 a Jun/22
dez/22		Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/22 a Set/22
set/22		Protocolo do 6º Boletim PMQACH (Campanha 41, 42, 43 e 44)
nov/22		Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2021 à Junho 2022
dez/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/22
nov/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/22
out/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/22
set/22		Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/22
out/22		Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2022 está aprovado um orçamento de **R\$ 36.917.467** para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 181 pontos, sendo 35 com tratamento e 146 sem tratamento em 26 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Realizados treinamento do Plano de Capacitação do PMQQS de Descarga Líquida e Sólida com a participação das equipes da Fundação Renova, Terceirizadas e GTA-PMMQS

Realizada a primeira etapa do Seminário de Revisão Bi-anual do PMQQS em BH

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)

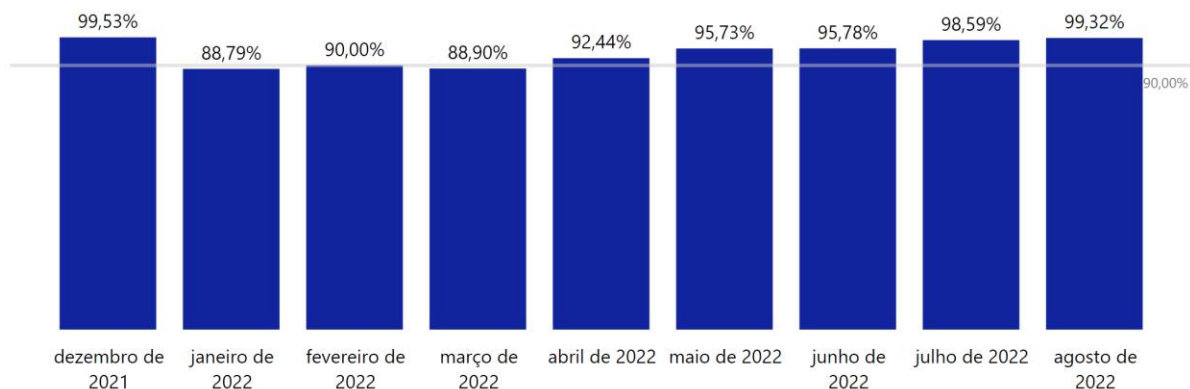


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Percentual(%)

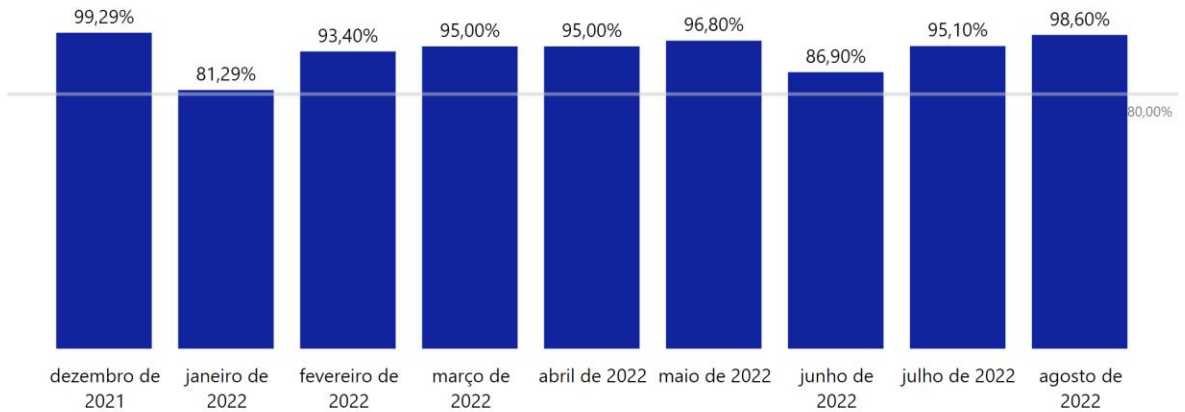


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Percentual(%)

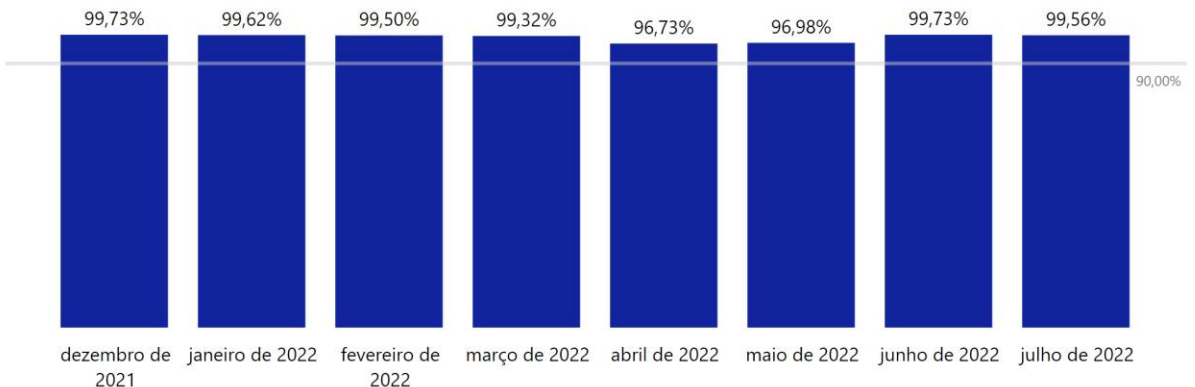


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores

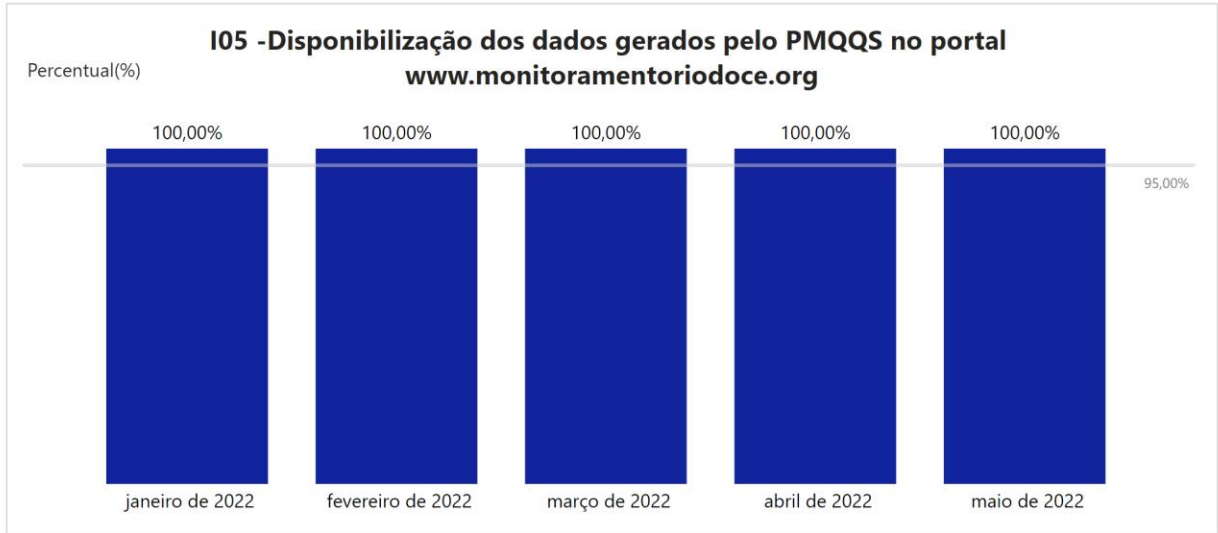


Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

O resultado do I05 de junho/2022 os dados do monitoramento convencional do mês ainda não foram disponibilizados no Portal devido a uma falha na interface entre DataLake e GIS/Portal que está sendo tratada pela equipe de TI.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água















Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em Andamento
Cláusula	182	Caput	Em Andamento
Deliberação	114	2	Concluído Internamente
Deliberação	138	2	Concluído Internamente
Deliberação	218	3	Concluído Internamente
Deliberação	218	4	Concluído Internamente
Deliberação	221	1	Concluído Internamente
Deliberação	283	3	Concluído Internamente
Deliberação	318	3	Concluído Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	472	3	Em Andamento
Deliberação	472	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	5	Concluído Internamente
Deliberação	535	6	Planejado
Deliberação	584	2	Reprogramado
Deliberação	596	1	Planejado
Deliberação	596	2	Em Andamento

Entregas do ano de 2022





jan/22		Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD
fev/22		Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
mar/22		Protocolo do Relatório Final AIA PERD
abr/22		Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
abr/22		Finalização da contratação edital da equipe técnica e administrativa do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz
mai/22		Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
mai/22		Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
jul/22		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
set/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 2
set/22		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
set/22		Protocolo Plano de ação de reparação PERD
set/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 2
out/22		Protocolar Plano de ação de reparação Rebio Comboios
out/22		Realizar Reunião Devolutiva REVIS Santa Cruz
out/22		Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS
out/22		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
nov/22		Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
nov/22		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 6
nov/22		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
dez/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
dez/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 6
dez/22		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Entregas do ano de 2022

- dez/22  Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
- dez/22  Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
- dez/22  Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do ofício FR.2022.1168 referente à apresentação do produto final impresso do projeto "Caracterização qualitativa e quantitativa e mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo nas unidades de conservação Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz e zona de entorno".

Protocolo do ofício FR.2022.1167 referente à reapresentação do produto final digital do projeto "Caracterização qualitativa e quantitativa e mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo nas unidades de conservação Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz e zona de entorno".

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

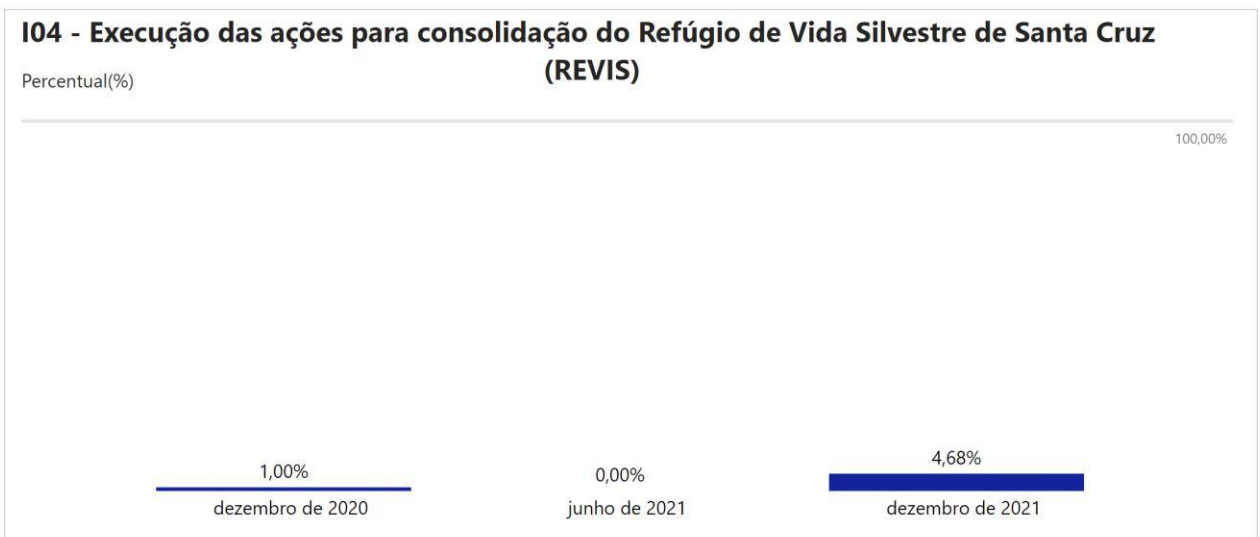


Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Nota: O resultado do indicador I04 está em fase de consolidação e revisão dos critérios de medição.

Indicadores

I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Percentual(%)

100,00%

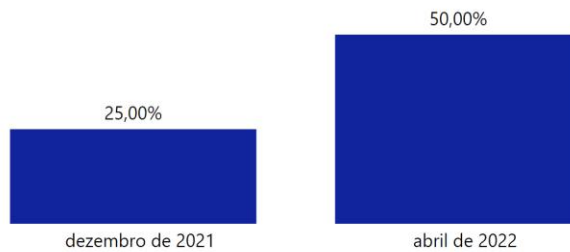


Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Semestral

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	caput	Em Andamento
Deliberação	28	n/a	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

julho de 2022 ● Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

576 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 57 (9,9%) imóveis declinaram e 475 (82,5%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 344 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Contratação da empresa para elaboração do PRA via SEI para Minas Gerais.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
102	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
103	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	caput	Concluído Internamente
Cláusula	142	caput	Concluído Internamente
Cláusula	143	§único	Em Andamento
Deliberação	171	2	Concluído Internamente
Deliberação	180	3	Concluído Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	208	6	Concluído Internamente
Deliberação	208	8	Concluído Internamente
Deliberação	254	2	Concluído Internamente
Deliberação	291	2	Concluído Internamente
Deliberação	428	1	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluído Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em Andamento
Deliberação	69	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluído Internamente
Deliberação	85	3	Concluído Internamente

Entregas do ano de 2022

- setembro de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído
- setembro de 2022 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - MG - Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 545,2 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)

Percentual(%)

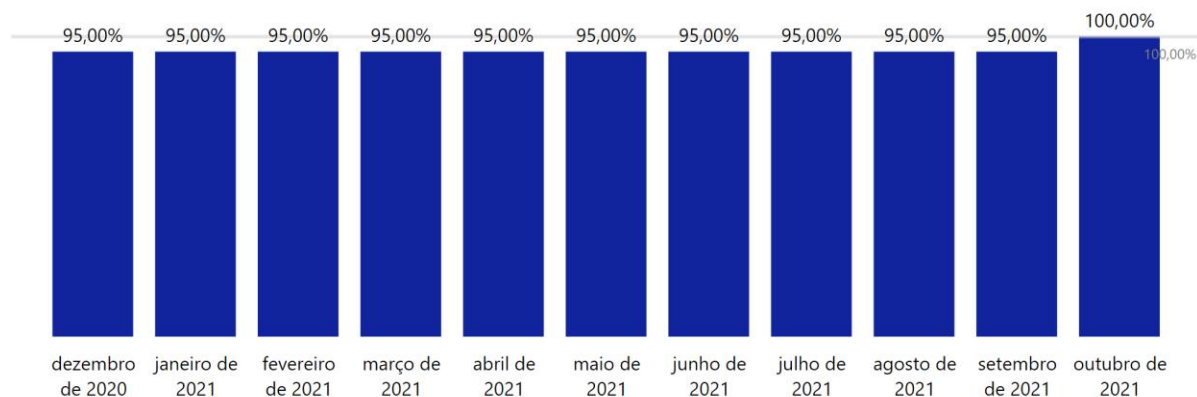


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Percentual(%)

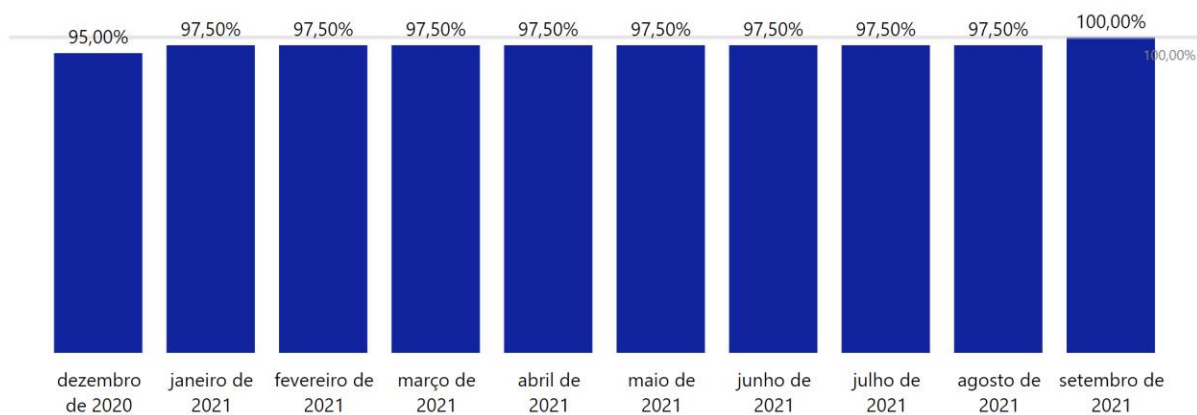


Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Percentual(%)

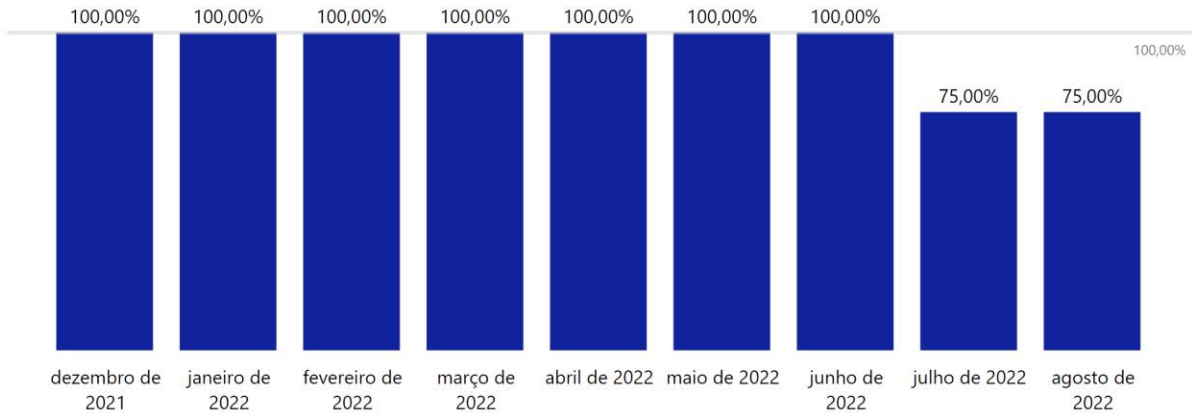


Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

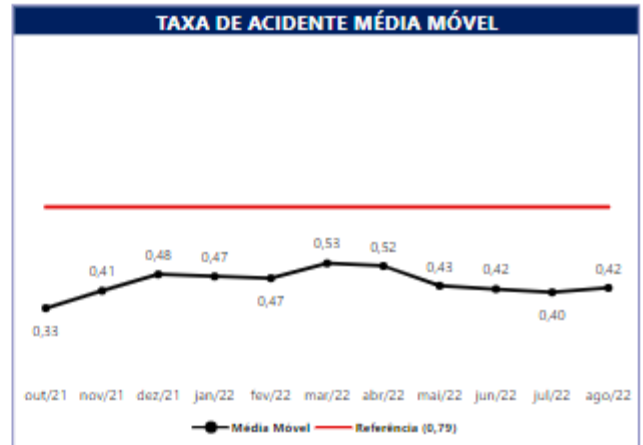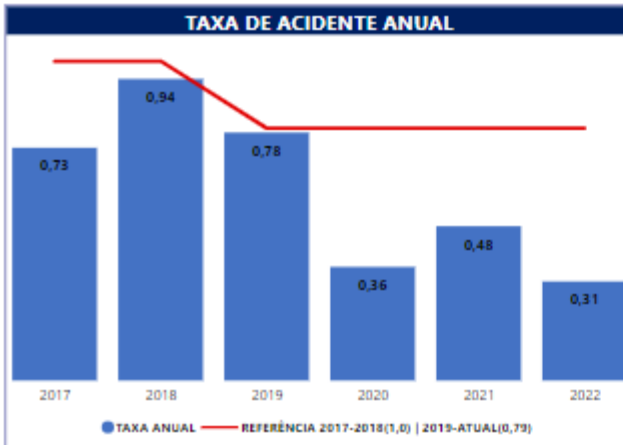

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,4	5,0	-11,4	-69,4%	6,8	5,0	-1,8	-25,8%
PG15	INOVAÇÃO	8,1	1,6	-6,5	-80,4%	5,3	1,6	-3,8	-70,3%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	21,3	2,8	-18,5	-86,8%	18,3	2,8	-15,5	-84,6%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	6,7	2,9	-3,8	-56,2%	4,5	2,9	-1,6	-34,8%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	88,2	39,6	-48,5	-55,0%	66,7	39,6	-27,0	-40,6%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	25,0	7,2	-17,8	-71,4%	14,5	7,2	-7,4	-50,7%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	37,7	2,9	-34,8	-92,3%	3,9	2,9	-1,0	-25,0%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	56,3	14,4	-42,0	-74,5%	26,3	14,4	-12,0	-45,4%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	75,6	29,4	-46,2	-61,1%	50,5	29,4	-21,1	-41,8%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22,6	7,3	-15,3	-67,8%	10,4	7,3	-3,1	-30,1%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	8,6	1,9	-6,7	-77,7%	5,0	1,9	-3,1	-61,8%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	5,1	0,6	-4,5	-88,5%	2,6	0,6	-2,0	-76,9%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	3,3	1,2	-2,2	-64,8%	1,9	1,2	-0,7	-38,1%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	16,0	7,9	-8,2	-50,9%	11,3	7,9	-3,4	-30,4%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	5,7	0,5	-5,2	-91,6%	2,5	0,5	-2,1	-81,0%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	67,6	1,4	-66,1	-97,9%	55,6	1,4	-54,1	-97,4%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		464,4	126,6	-337,7	-72,7%	286,2	126,6	-159,6	-55,8%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	23,6	15,9	-7,7	-32,8%	18,1	15,9	-2,2	-12,4%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	5151,9	2188,0	-2963,9	-57,5%	5062,3	2188,0	-2874,3	-56,8%
PG03	POVOS INDÍGENAS	305,0	30,0	-275,0	-90,2%	107,1	30,0	-77,1	-72,0%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	39,1	5,6	-33,6	-85,7%	38,4	5,6	-32,9	-85,5%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	21,8	2,6	-19,2	-87,9%	15,4	2,6	-12,8	-82,8%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	95,8	61,8	-34,0	-35,5%	56,4	61,8	5,5	9,7%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	10,2	4,6	-5,6	-54,9%	6,0	4,6	-1,4	-23,7%
PG08	REASSENTAMENTO	1787,9	642,9	-1145,1	-64,0%	1058,0	642,9	-415,1	-39,2%
PG09	UHE CANDONGA	590,0	214,9	-375,1	-63,6%	355,2	214,9	-140,3	-39,5%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	117,0	40,8	-76,2	-65,1%	73,0	40,8	-32,2	-44,1%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	7,4	4,1	-3,3	-44,3%	4,2	4,1	-0,1	-3,1%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	20,4	4,4	-16,0	-78,5%	11,5	4,4	-7,1	-61,8%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	3,6	1,6	-2,0	-55,3%	1,2	1,6	0,4	35,1%
PG14	SAÚDE	18,9	1,4	-17,5	-92,4%	8,0	1,4	-6,5	-82,1%
PG16	PESCA	46,7	13,6	-33,1	-70,8%	23,8	13,6	-10,2	-42,7%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	151,1	35,1	-116,0	-76,8%	106,4	35,1	-71,3	-67,0%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	10,9	4,4	-6,5	-59,8%	5,9	4,4	-1,5	-25,8%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	251,8	235,8	-15,9	-6,3%	242,4	235,8	-6,6	-2,7%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	226,2	67,0	-159,2	-70,4%	137,1	67,0	-70,1	-51,1%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	21,6	1,4	-20,2	-93,3%	13,0	1,4	-11,6	-88,9%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	32,1	13,7	-18,3	-57,1%	18,7	13,7	-5,0	-26,6%
PG28	BIODIVERSIDADE	101,8	77,4	-24,4	-24,0%	56,8	77,4	20,6	36,3%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	49,1	13,7	-35,5	-72,2%	22,4	13,7	-8,8	-39,1%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	140,0	58,4	-81,6	-58,3%	89,3	58,4	-30,9	-34,6%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	36,9	22,0	-14,9	-40,5%	21,8	22,0	0,2	1,0%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,3	1,5	-5,8	-80,0%	5,8	1,5	-4,3	-74,8%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	300,9	172,3	-128,6	-42,7%	181,4	172,3	-9,1	-5,0%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	200,7	0,0	-200,7	-100,0%	108,3	0,0	-108,3	-100,0%
Total Reparatórios		9769,9	3935,0	-5834,9	-59,7%	7847,9	3935,0	-3913,0	-49,9%
Total Programas		10234,2	4061,6	-6172,7	-60,3%	8134,1	4061,6	-4072,5	-50,1%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	199,2	81,5	-117,7	-59,1%	110,4	81,5	-28,9	-26,2%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	23,5	4,1	-19,4	-82,6%	13,8	4,1	-9,7	-70,2%
Total Despesas Administrativas		222,7	85,6	-137,2	-61,6%	124,2	85,6	-38,6	-31,1%
Total Geral		10457,0	4147,1	-6309,8	-60,3%	8258,3	4147,1	-4111,2	-49,8%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,11	0,77	-0,33	-0,30	<p>Postergação: Prestação de contas de terceiros: A primeira Edição do Edital Doce formalizou 201 parcerias. O desvio negativo acumulado anual no edital é de 3MM (sem baixa contabil), no entanto não considera o desembolso acumulado de 1MM entregue aos proponentes e está projetado no orçamento.</p> <p>Plano de Ação: Apoiar os proponentes que já finalizaram as atividades a realizar a prestação de contas e encerramento do projeto com a Fundação. Aprimorar a curva do avanço físico e financeiro do projeto.</p>	
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,49	0,79	0,30	0,61	<p>Postergação:</p> <p>(R\$ 8,0 MM) Distrito Industrial: Atraso decorrente da demora na aprovação no CIF de nova deliberação de atualização de valores (correção monetária). Plano de Ação: Assinar Termo de Compromisso: Prazo 15/08/22; Assinar contrato de repasse: Prazo 26/08/22; Efetuar repasse do recurso. Prazo: 31/08/2022.</p> <p>(R\$ 5,0 MM) Fundo Diversifica Mariana: Não foi realizado o repasse para o BDMG por entender a necessidade de revisitar a solução proposta. Plano de Ação: Aprovar APRO Prazo: 15/08/2022; Obter aprovação CC. Prazo: 15/09/2022; Efetuar repasse do recurso. Prazo: 28/10/2022.</p> <p>(R\$ 1,7 M) Casa do Empreendedor: Obra havia sido paralisada por decisão judicial em 2021. Em andamento as tratativas para retomada da obra pela Infra. Plano de Ação: Aprovar APRO da retomada. Prazo: 15/08/2022; Retomar obras. Prazo: 05/09/2022.</p> <p>(R\$ 0,3 M) Projeto Agroecológico MG: Em função de ajustes, houve atraso na prestação de contas da 2ª parcela e liberação da 3ª parcela. Plano de Ação: Revisar plano de trabalho. Prazo: 02/12/22.</p> <p>(R\$ 0,3 M) Banco Comunitário: Atraso no início do projeto. Plano de Ação: Alterar execução do projeto, adotando paralelismo entre os bancos Prazo: Concluído.</p> <p>(R\$ 0,3 M) Cadeia do Cacau: Atraso no início do projeto em função do atendimento de demandas de compliance. Plano de Ação: Revisar plano de trabalho projetando execução com novo cenário Prazo: 30/09/22</p>	
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,51	0,75	0,24	0,47	<p>Postergação (principais desvios):</p> <p>(R\$ 0,7 M) Qualificação Profissional: Em decorrência da pandemia o início das atividades foram postergados para janeiro/22, além do baixa adesão as primeiras turmas ofertadas para os cursos de construção civil (Mariana), impactando diretamente na execução físico-financeira. Plano de Ação: As atividades já foram retomadas e em conjunto com o SENAI planejamos a execução de 67 turmas para o ano de 2022; com previsão de eliminar o desvio até outubro/22, quando o valor acumulado das medições chegará a R\$ 956.989,55.</p> <p>(R\$ 0,6 M) Recoloca Rio Doce: Valor da medição pode variar de acordo com a quantidade de atendimentos realizados. Plano de Ação: Realizado um remanejamento de R\$ 714 mil da atividade "Recolocação" para a atividade "Capacitação", para atender o incremento de 30 novas turmas de capacitação a serem executadas até agosto/22.</p> <p>(R\$ 0,4 M) Estudo mapeamento mão de obra: Aguardando deliberação do CIF. Plano de Ação: Com a deliberação emitida pela CT-EI em julho/22, já iniciaremos a execução do contrato em agosto/22.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG15	INOVAÇÃO	0,46	0,40	-0,06	-0,13	<p>Postergação: (-R\$ 2,5 MM) Chamada 09/2018: Atraso na prestação de contas dos projetos vinculados a FAPEMIG para baixas de adiantamento da 1ª parcela dos projetos (resta 3 de 12). / Atraso na aquisição/entrega de insumos para execução das pesquisas por parte das entidades parceiras/Baixa execução Financeira da 1ª parcela das Pesquisas.</p> <p>Plano de Ação: 1) Apoiar os pesquisadores no envio das documentações no sistema FIORI - Concluído. 2) Validar prestação de contas enviadas pelos pesquisadores através do sistema FIORI - Concluído. 3) Dar baixa nas prestações de contas - Concluído. 4) Analisar os projetos com execução abaixo de 80% e elaboração de plano de ação com os pesquisadores de forma a adequar o plano de trabalho - Concluído. 5) Liberar 2ª parcela dos convênios balizada pela execução da 1ª parcela - Prazo: 26/08/2022. 6) Adequar planos de trabalhos das pesquisas de forma a minimizar os impactos ao projeto - Prazo: 30/08/2022. 7) Realizar de aditivo de prazo aos convênios - Prazo: 15/10/2022</p> <p>(R\$0,04MM) Edital FAPEMIG Agroecologia: Baixa do adiantamento executada no mês de Jun/22 Plano de Ação: N/A</p> <p>(-R\$ 0,7 MM) Empreende Rio Doce: A) Atraso na contratação da rodada I de 3 subprojetos - "Capacitação de Gestores Públicos". B) Atrasos decorrentes da demora na aprovação no CTEI/ CIF Plano de Ação: A1) Adequar o cronograma com fornecedor para finalização do projeto em dez/22 - Concluído B1) Solicitar apoio à Governança para realização de uma nova reunião com a coordenação do GT Desenvolve (CTEI) para análise do projeto como prioridade conforme solicitado por ofício - Concluído B2) Solicitar apoio à Governança para envio do sumário do projeto "Empreende Rio Doce" para auxiliar a análise do projeto pela CTEI - Concluído B3) Aditar contratos do Rio Doce Digital e Campus Tech para realização das novas rodadas. Prazo: 30/09/2022</p> <p>(R\$0,07MM) Hub de Inovação: Saldo Remanescente da Rodada I - Mariana: Plano de Ação: Realizar nova Rodada para fornecimento de Bolsas complementares ao Hub rodada I em Mariana (Projeto Mariana Labs) - Prazo: 20/12/2022</p> <p>(-R\$0,11MM) NOVOS PROJETOS PARA FORMAÇÃO EDUCACIONAIS (NOVAS RODADAS HUB DE INOVAÇÃO): A) Atraso no início das novas Rodadas do Hub de Inovação em GV, Linhares e Ipatinga. B) Atrasos decorrentes da demora na aprovação no CTEI/ CIF Plano de Ação: A) Aditar contrato de aceleração de negócios para realização das novas Rodadas - Prazo: 15/10/2022 B1) Solicitar apoio à Governança para realização de uma nova reunião com a coordenação do GT Desenvolve (CTEI) para análise do projeto como prioridade conforme solicitado por ofício - Concluído</p> <p>(-R\$ 0,2 MM) Monitoramento e Controle: Atraso decorrente da demora na aprovação no CTEI/ CIF. Plano de Ação: 1) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de priorização na análise dos projetos que apresentam impacto no planejamento do Programa - Concluído 2) Conduzir processo de contratação em paralelo ao aguardo da deliberação do projeto - Cancelado 3) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de cancelamento do projeto - Prazo: 30/08/2022</p> <p>(-R\$0,10MM) Tecnologias Inovadoras para Reparação: Atraso no início do projeto/Aguardando deliberação do CTEI/CIF. Plano de Ação: A1) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de priorização na análise dos projetos que apresentam impacto no planejamento do Programa - Concluído A2) Conduzir processo de contratação em paralelo ao aguardo da deliberação do projeto - Prazo: 30/10/2022</p> <p>(-R\$0,02MM) Edital de Tecnologias Sociais: Atrasos decorrentes da demora na aprovação no CTEI/ CIF Plano de Ação: A1) Oficializar ao CTEI/CIF pedido de priorização na análise dos projetos que apresentam impacto no planejamento do Programa - Concluído A2) Conduzir processo de contratação em paralelo ao aguardo da deliberação do projeto - Concluído</p> <p>(-R\$ 0,2 MM) Serviço Desenvolvimento Escala TRL: Atrasos no processo de contratação. Plano de Ação: 1) Conduzir processo de contratação - Prazo: 30/09/2022 2) Aumentar equipe técnica para garantir agilidade e eficiência do processo de contratação - Concluído 3) Adequar o cronograma com fornecedor - Prazo 30/09/2022</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS	12,56	8,64	-3,91	-0,31	<p>INTERNOS</p> <p>Execução (-) - (R\$27,9MM) - Realizado abaixo do planejado devido ao atraso ocorrido no processo de contratação de fornecedores para execução das atividades de mobilização e engajamento de produtores rurais no Baixo e Médio Rio Doce. O início das atividades (mobilização) estava previsto para novembro de 2021, mas ocorreu de janeiro até março de 2022.</p> <p>Diante disso, as atividades de validação das áreas das propriedades rurais, elaboração dos projetos para estaqueamento e instalação de Cercamento foram comprometidas.</p> <p>Baixa performance dos fornecedores contratados devido à curva de maturidade, já que a mobilização ocorreu há alguns meses, e consequentemente, as atividades de preparo de solo para plantio e manutenção das áreas foram prejudicadas.</p> <p>Contramedida - Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais).</p> <p>Contratação dos 5 lotes exclusivos para execução de cercamento.</p> <p>Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas.</p> <p>Execução (+) - (R\$3,86MM) - Priorização do processo de mobilização e engajamento de produtores rurais, validação de áreas, elaboração de projetos, estaqueamento e Cercamento.</p> <p>Contramedida - Acompanhamento do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro, caso seja necessário.</p> <p>Mudança de Solução - (R\$-2,49MM) - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o CEPAM</p> <p>Contramedida - Revisão do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro.</p> <p>Processos Internos - (R\$-0,5MM) - Exclusão da atividade de combate a incêndio.</p> <p>Contramedida - Revisão do DR dentro do draft orçamentário, excluindo a atividade, realocando o recurso para a implantação florestal.</p>	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	1,16	1,40	0,24	0,21	<p>INTERNOS</p> <p>Execução (-) - (R\$-9,14MM) - Realizado abaixo do planejado devido ao atraso ocorrido no processo de contratação de fornecedores para execução das atividades de mobilização e engajamento de produtores rurais no Médio Rio Doce. O início das atividades (mobilização) estava previsto para novembro de 2021, mas ocorreu de janeiro até março de 2022.</p> <p>Diante disso, as atividades de validação das áreas das propriedades rurais, elaboração dos projetos para estaqueamento e instalação de Cercamento foram comprometidas .</p> <p>Baixa performance dos fornecedores contratados devido à curva de maturidade, já que a mobilização ocorreu há alguns meses, e consequentemente, as atividades de preparo de solo para plantio e manutenção das áreas foram prejudicadas</p> <p>Contramedida - Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas.</p> <p>Execução (+) - (R\$2,20MM) - Ampliação das atividades de cercamento, gerando aumento de insumos.</p> <p>Contramedida - Acompanhamento do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro, caso seja necessário.</p> <p>Mudança de Solução - (R\$-0,17MM) - Redução no escopo do contrato com Instituto Terra, gerando um estorno do recurso aportado.</p> <p>Contramedida - Revisão da curva de desembolso financeiro para correção deste estorno gerado na DR.</p> <p>Prestação de contas de terceiros - (R\$-0,26MM) - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o CEPAM</p> <p>Contramedida - Revisão do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro.</p>	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	1,81	0,33	-1,48	-0,82	<p>Postergação: Medições referentes aos projetos executivos do CETRAS MG e maior valor medido no gerenciamento do CETRAS MG é referente a atividade de orçamentação;</p> <p>Plano de Ação: Realizar gestão de mudança para ajustes das atividades e valores alocados</p>	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	3,04	1,38	-1,66	-0,55	<p>Postergação (12,0MM): Os municípios não apresentaram as medições conforme previsto em cronograma/orçamento, e consequentemente, o repasse do recurso não foi realizado. A linha de base do cronograma/orçamento foi atualizada, portanto a linha de base considerada como referência é pouco aderente à realidade atual.</p> <p>Plano de Ação: Realizar reuniões periódicas com os municípios para alinhamento dos processos, entendimento dos atrasos, orientações e repactuação das entregas definidas em cronograma.</p>	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	8,33	6,09	-2,24	-0,27	<p>Postergação: (21,1MM) Adutora-GV - Atraso na contratação do Pacote 02 da Adutora, devido à questões comerciais e de mercado. A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejamento até o presente momento.</p> <p>Plano de Ação: Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Junho/22 era -45%, tendo variado para -42% no acumulado até Julho/22, se aproximando do planejado).</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,08	1,18	0,10	0,09	<p>Posteção: Os desvios verificados no último (R\$ 3MM) mês referem-se ao atraso no pagamento de bolsas para cursistas, professores e tutores pela UFMG/UFOP (R\$ 1,9MM representando 61% do total do desvio) atrasando o envio da prestação de contas pelo parceiro; ao atraso na formalização da parceria com o IFES, cuja prestação de contas deve ocorrer somente em agosto/22 (R\$ 0,09MM ou 2% do total do desvio), a divergência de período de prestação de contas pelo CEFORMA, considerando-se o draft 18 e o que foi realizado, já observando a alteração do cronograma de desembolso por meio de formalização de aditivo (R\$ 0,5MM ou 18% do total do desvio) e a não contratação do projeto de fortalecimento de redes (R\$0,3MM ou 10% do total do desvio)</p> <p>Plano de ação: monitoramento da execução dos contratos para que não ocorram atrasos nas medições; finalização do processo de contratação do projeto de fortalecimento de redes.</p>	
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,95	0,26	-0,69	-0,72	<p>Reclassificação: (-R\$0,58 MM): Transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cheias do PG34 para PG38, após aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 (previsão era dez/21).</p> <p>Posteção: (-R\$1,32MM): Reprogramação de atividades devido à dificuldade de agendas com os envolvidos do poder público e comunidades, mudança cenários de risco devido ao período chuvoso de 2021/2022 gerou posteção da entrega dos Planos Municipais de Redução de Risco - PMRR e posteção pela engenharia da elaboração de projetos SPCI para as escolas. (-R\$0,50MM): Perícia prevista para os acordos de repasse recursos para a defesa civil ainda não homologada/designada.</p> <p>Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a homologação dos acordos e indicação de perícia / Supervisionar semanalmente as atividades dos Projetos NUPDEC, CGR, Escola Segura e PMRR / Monitorar semanalmente a entrega dos projetos de SPCI pela Engenharia</p>	
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,61	0,12	-0,49	-0,81	<p>Posteção: (R\$ 2,0 MM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - CIT Mariana - Fase de formalização da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento em uma nova localidade em andamento. - CIT GV - Fase de formalização da parceria com a Prefeitura Municipal de Governador Valadares para instalação do equipamento em andamento. - CIT Linhares - Aguardando assinatura do termo de parceria pelo ICMBio <p>Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todas as três localidades.</p> <p>Plano de Ação: Devido aos atrasos no programa decorrentes da não formalização da parceria com os entes e prefeituras municipais, os orçamentos foram reprogramados no Draft 19.</p>	
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,32	0,17	-0,15	-0,47	<p>Economia: (R\$ 0,3 MM): Processo concorrential do fee mensal negociado abaixo do orçamento previsto.</p> <p>Posteção: (R\$ 0,4 MM): Consultoria de acessibilidade site, postegada para 2024 onde realizaremos um processo concorrential.</p> <p>Plano de ação: Considerando que houve impacto no escopo foi realizado um aditivo para garantir o atendimento do processo. As divergências serão ponto de atenção nos próximos processos concorrentiais.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,81	0,13	-0,68	-0,84	<p>Compensatório (cláusula 182)</p> <p>Postergação: Atraso no recebimento dos termos de referência, impossibilitaram as contratações previstas no período e, conseqüentemente, geraram a postergação de atividades/medições do RVS.</p> <p>Plano de Ação: Promover reunião presencial em conjunto com a gestão da UC para apoiar/avançar na elaboração dos TRs e Envolver RI para achar solução com relação ao atraso na emissão do termo de referência pela gestão da UC.</p>	
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,63	0,14	-0,49	-0,78	<p>INTERNOS</p> <p>Execução (-) - (-R\$0,16MM) - Baixa performance das instituições de ATER na elaboração do CAR; Apropriação indevida desta atividade em outro DR.</p> <p>Contramedida - Executar o PAR (Plano de Aceleração da Retomada).</p> <p>Execução (-) - (-R\$0,09MM) - Medição dos serviços de gerenciamento abaixo do previsto.</p> <p>Contramedida- Reprogramação dos desembolsos .</p> <p>Reprogramação da Execução - (R\$-0,42MM) - Atraso na celebração de parceria junto ao IDAF/ES. Atraso de envio de material pelo parceiro do IEF/MG para atividades de comunicação (material didático).</p> <p>Contramedida - Executar o Plano de Trabalho revisado.</p> <p>EXTERNO</p> <p>Execução (-) - (-R\$1,34MM) - Atraso na contratação dos serviços de elaboração dos PRAs, devido indisponibilidade do parceiro IEF/MG nas tratativas do plano de trabalho (alteração de equipe, greve, indefinição de escopo).</p> <p>Contramedida - Contratar a empresa de elaboração dos Projetos.</p>	
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	1,27	0,03	-1,24	-0,98	<p>Postergação: (R\$25,2 MM) Fortalecimento SUS: Acordo piloto em negociação com o município de Rio Doce. Caso bem sucedido, pode se desdobrar para outros municípios.</p> <p>(R\$12,9 MM) SAA Degredo: repasse previsto em set/22, no escopo da cooperação firmada para prefeitura executar a obra; demais ações previstas já incorporadas neste acordo e o valor restante foi retornado ao saldo do compensatório.</p> <p>(R\$5 MM) repasse obras emergenciais chuvas: aguardando Estados solicitarem aprovação CIF.</p> <p>(R\$5,1 MM) perícia AECOM Agenda Integrada: pagamento suspensa desde out-21 pela 12ª vara, em função de discussão judicial sobre honorários .</p> <p>(R\$2,4 MM) ações socioeconomia Covid-19: aguardando decisão da 12ª vara.</p> <p>(R\$0,5MM) perícia orçada para repasse Base Integrada, que foi previsto em dez-21 e em negociação com o Governo de MG.</p> <p>(R\$6,3MM) reclassificação para o PG08 do realizado referente a execução das obras no Aterro Mariana. A execução deste escopo não mais será realizada no PG43.</p> <p>+ R\$3,1 MM reclassificação origem PG08 dos valores realizados dos acordos firmados com 6 famílias – Moradias Gesteira.</p> <p>+ R\$0,2MM outros desvios pulverizados em várias linhas.</p> <p>Plano de Ação: Acompanhar as negociações dos acordos e as decisões judiciais.</p>	
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia:</p> <p>Antecipação:</p> <p>Postergação:</p> <p>Plano de Ação:</p>	
Total Compensatórios		35,13	22,58	-12,55	-0,36		

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
PG01	CADASTRO	1,69	2,23	0,54	0,32	Postergação (R\$ 2,2MM) - Extensão do prazo para solicitações de Contestação e Reenquadramento no fluxo Novel. Valor será remanejado para atendimento das demandas da Judicialização da Retomada do Cadastro. Plano de Ação: Atendimento a demandas da Judicialização da Retomada do Cadastro.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	198,95	94,48	-104,48	-0,53	O valor realizado a menor que o orçado até julho foi R\$ 2.874 milhões. O desvio expressivo é explicado, principalmente, pelo ritmo das homologações das indenizações do Novel nos primeiros meses do ano. Apesar do retorno gradual das homologações a partir de março o valor realizado continua bem abaixo do previsto.
PG03	POVOS INDÍGENAS	24,10	6,19	-17,90	-0,74	Postergação: (R\$ 1,7 MM) Fornecimento água - O contrato 4800020507 foi medido parcialmente (no período de 21/03 a 20/04) visto a inexistência de saldo contratual e consequente necessidade regularização. Um novo contrato pretendido entrou em vigência em 21/04 e com possibilidade de medição a partir de 20/06. Postergação: (R\$ 3,9 MM) Manutenção vias - Contrato sob demanda. Houve um atraso no processo de contratação pretendido do novo contrato, que iniciou em jun/22. Está sendo realizado um ADT para ajustar a linha de mobilização para manutenção. Postergação: (R\$ 0,5 MM) Melhoria acessos - As atividades do P30 foram paralisadas devido a pandemia e o contrato com a empresa encerrado para evitar novos pleitos. Postergação: (R\$ 66,3 MM), alteração de cronograma do SAA Comboios e Tupiniquim, PBA execução Comboios e Tupiniquim-Guarani, PBA Fundo Monetário Coletivo Comboios e Tupiniquim-Guarani, PBA Fundo Retomada Econômica Comboios e Tupiniquim-Guarani: As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Para as ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI ponto 4), foi feita a contratação emergencial de uma consultoria para a finalização do PBA conceitual, tendo sido finalizado em abril para a TI Comboios e Aldeia Três Palmeiras. Iniciado também o processo de contratação pretendida de nova consultoria para detalhamento executivo e execução de programas do PBAI. As atividades no momento encontram-se paralisadas em Comboios e em processo de retomada em TG devido a diversos fatores externos, incluindo decisão judicial de retorno do AFE Subsistência. Devido as divergências políticas internas entre a Comissão de Caciques e a aldeia de Caieras Velhas, os desvios não serão totalmente recuperados durante o ano.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,11	1,75	1,64	14,99	Postergação: (R\$ 34,5 MM) ampliação do tempo de negociação em função de divergências sobre o escopo e orçamento do Plano de Trabalho da execução do PBA pelos comunitários. Plano de Ação: Negociação concluída. Acordo Degredo peticionado em 22/06/2022. Aguardando homologação judicial para efetivar repasse.
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	2,67	0,57	-2,10	-0,79	Postergação: (R\$12,8 MM) (R\$ 2,4 MM) Plano Mariana -Atraso na liberação judicial da verba para o município (ocorreu em mar/22) e na primeira prestação de contas devida pelo município (prevista para jul/22). (R\$5,7 MM) Planos Estaduais - Plano estadual de MG não será executado porque o estado declinou da negociação por entender que está sendo negociado no âmbito da repactuação. (R\$4,7 MM) Planos Demais Municípios -Atraso na pactuação e consequentemente na prestação de contas dos municípios não aderentes; atraso em prestação de contas de planos municipais em execução; não utilização de valor repassado integral (necessário negociar remanejamento de valores com os municípios); não realização de capacitação presencial, por estarem ocorrendo online (valor com logística não gasto). Plano de Ação: Plano Mariana: Operacionalizar internamente a baixa contábil dos repasses já realizados. Planos Estaduais: remanejar para contingência no Draft 19. (concluído) Planos Demais Municípios: reprogramar no Draft 19 (concluído); realizar reuniões presenciais para prestação de contas nos municípios e entidades; pactuar plano com parte dos municípios não aderentes; concluir conciliação judicial com parte dos municípios não aderentes.
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	11,71	6,99	-4,72	-0,40	Antecipação: +R\$ 12,3 MM - Assessorias técnicas: Em 27/04/2022 (Samarco) houve liberação/resgate do montante de R\$ 12.036.355,88 do saldo bloqueado na ACP Mariana. Valor destinado ao pagamento de Cáritas para custeio da assessoria técnica em 2022. Postergação: (R\$ 3,3 MM) -Canais de Relacionamento: Ampliação da capacidade de atendimento do 0800 em atendimento a decisão judicial. Plano de Ação: revisão da redistribuição do pilar junto ao Draft 19 Solicitação de reclassificação dos gastos dos CIAs vinculando os contratos de prestação de serviço nos corretos DRs. Postergação: (R\$ 3,7 MM) - Diálogo: Execução a menor decorrente da reprogramação necessária do programa destacando principalmente a realização dos fóruns de prestação de contas, implantação da plataforma interativa e serviços especializados de diálogo social. Plano de Ação: Revisão das entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária e adequação no orçamento Draft 19. Economia: (R\$ 1,2 MM) - Comunicação: Os materiais impressos estavam sendo distribuídos apenas em versão digital, Contratos sob demandas não executados. Plano de Ação: Retorno da distribuição do material impresso e de atividades presenciais gradativamente, revisão orçamentária realizada no draft 19/Jornal da comunidade/Eventos, campanha de territorios sendo realizada no 2° semestre.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,82	0,63	-0,19	-0,23	Postergação: (R\$ 1,0 M) Principais causas: Custos com manutenções estruturais nas fazenda; contratos de hospital veterinário sob demanda. Sem ocorrência de aquisições no primeiro quadrimestre de 2022. Plano de Ação: 1. Manutenções estruturais - Em andamento realização de contratação e mobilização de contratos suportes para execução das manutenções; 2. Compra de animais - Aguarda validação da estratégia de compra junto à Diretoria.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG08	REASSENTAME NTO	174,18	131,06	-43,12	-0,25	<p>Postergação:</p> <p>(R\$ 141 MM) Novas Moradias Contenções: Chuva acima do previsto e outros pacotes em contratação; (R\$ 44 MM) Contingência orçada e não utilizada; (R\$ 41 MM) Condicionantes (Camar, SAA Furquim, Ecoporto, que estão em fases de negociação) (R\$ 40 MM) Gesteira, aguardando definição judicial; (R\$ 37 MM) Infra remanescente de Bento, em fase de contratação (Início das obras Julho/2022); (R\$ 33 MM) Diversos: Acesso Camargos, Pedras, Alerta de Raio - Não realizado; (R\$ 40 MM) Demais pacotes - Equip Públicos (-24MM), Benfeitorias (-17MM), e outros (-1MM)</p> <p>Economia: (R\$ 39MM) Menor Custos Covid que o previsto no período e parte dos custos alocados nas linhas dos serviços.</p> <p>Plano de Ação: Novas Moradias Contenções - Traçar plano de recuperação junto às contratadas; Custo Covid - A curva será ajustada no Draft19, de acordo com os protocolos sanitários; Infra Bento e Condicionantes Paracatu – Definição estratégica da contratação e início das obras em junho/2022.</p>
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	13,07	13,50	0,44	0,03	<p>Postergação: (32,2MM)</p> <p>Recons. Estr. Rurais – Baixa performance do fornecedor, contratação cancelada, nova solução por pecúnia. Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações excesso de chuvas e paralisações. Obras das Pontes e Campos de futebol atraso nas negociações comerciais e dificuldades junto ao Fundiário. Custos com Gerenciamento acompanham os projetos, 44% abaixo do previsto.</p> <p>Plano de Ação: Estrut. Rurais Complexas:utilizados contratos guarda-chuva, solução por pecúnia em andamento junto ao jurídico. Novas contratações iniciando e em elevação de performance visando minimizar os atrasos de cronograma, escopo de: Manutenção de Vias e Edificações, Pontes e Campo Ponte do Gama. Negociação do Campo de Pedras em fase de finalização.</p>
PG09	UHE CANDONGA	67,07	42,60	-24,47	-0,36	<p>Postergação: (R\$ 140,3MM) - Produtividade do serviço de Dragagem abaixo do volume planejado. Menor desembolso nos serviços de Reforço do Barramento e Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento devido ao atraso da execução em relação ao cronograma inicial. Menor execução das Condicionantes devido a definição de escopo. Recuperação da UHE abaixo do previsto, devido as mudanças na metodologia de execução, serviços ainda estão em mobilização</p> <p>Plano de Ação: Aceleração da execução do projeto no último quadrimestre do ano.</p>
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,77	0,74	-0,02	-0,03	<p>Postergação: Desvio referente a postergação do curso de especialização da UFMG para 2023 (interface com o PG33). Aderência financeira do PG é satisfatória.</p> <p>Plano de ação: Realocar a verba disponível em 2022 da especialização para as ações de transição vinculadas ao reassentamento de Bento Rodrigues, conforme diretrizes da FR, garantindo assim, o engajamento da comunidade escolar. Setembro/2022</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	3,49	0,63	-2,86	-0,82	Postergação: 84% mudança de solução decorrente da não formalização da parceria com o Instituto Pedra e 16% em relação a contratos de obras sob demanda e desvio de medição mensal. Plano de Ação: Lançar Edital Doce - Modalidade 3; Contratar empresa de manutenção predial para os imóveis e capelas com planejamento das ações, intervenções e medições para os meses seguintes; Obter aprovação da APRO para autorização de negociação com a Arquidiocese para repasse; Iniciar o processo de contratação de empresa para restauro da Capela de Mercês, cobertura permanente de S Bento e imóveis de Barra Longa.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,28	0,37	0,09	0,33	Antecipação: Execução + início das ações de promoção dos polos turísticos, e do projeto de fomento ao empreendedorismo inicialmente previstas para o segundo semestre de 2022. Plano de Ação: N/A. Será mantida a antecipação das ações de promoção e fomento ao empreendedorismo.
PG14	SAÚDE	0,94	0,50	-0,45	-0,47	Postergação: (R\$ 5,4 MM) Plano Mariana: (R\$ 3,3 MM) O município não executou a prestação de contas dos três repasses realizados. ARSH: (R\$ 2,1 MM) Estudos postergados no cronograma para abr/23, aguardando decisão judicial. Economia: (R\$ 1,1 MM) Plano Barra Longa: (R\$ 0,3 MM) Os valores orçados para a suplementação de mão de obra foram realizados de acordo com os valores da Contexto, pois os valores praticados pelo município são menores que os orçados inicialmente. Plano Mariana: (R\$ 0,8 MM) Os valores planejados para a empresa terceirizada Contexto não foram gastos, pois houve desmobilização destes profissionais desde janeiro/22. O contrato está encerrado.
PG16	PESCA	3,13	0,25	-2,88	-0,92	Postergação (principais desvios): (R\$ 3,9 MM) Caracterização Soc. e Monitoramento Pesq: Baixa performance financeira considerando período da pandemia e mudanças na estratégia de execução considerando aditivo. Plano de Ação: Realizar aditivo. Prazo: 10/08. (R\$ 2,5 MM) ATER ES e MG: Mudança na estratégia de contratação. Novo processo em andamento e demora no processo de definição e escolha do parceiro. Plano de Ação: Revisar APRO e encaminhar para CC. Prazo: 15/07. (R\$ 1,5 M) Edital I: Suspensão pelo CIF pela Deliberação 542/21. Plano de Ação: Encaminhar NT para manifestação da CT-SHQA. (R\$ 1,5 M) Plano de Recuperação Pesca: Decisão Liminar que suspendeu edital em 09/08/21. Plano de Ação: Recurso realocado no Draft 19 para 1º sem/2023; Realizar audiência de conciliação; Monitorar junto ao jurídico sobre a audiência de conciliação. (R\$ 0,8 M) Projeto Cultivando o Pescar: Atraso nas medições anteriores devido as inconsistências nas documentações apresentadas. Plano de Ação: Regularizar pendências junto aos parceiros. Prazo: 20/07.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	0,82	0,78	-0,04	-0,05	<p>Postergação: (R\$ 0,6 MM) Assessoria Técnica Foz: Contrato Instituto Euvaldo Lodi: Execução abaixo do previsto, devido a mudança de formato do projeto, de presencial para online, impactou positivamente no orçamento do contrato, por redução de custos com infraestrutura para os eventos. Plano de Ação: Utilizar saldo remanescente do contrato do IEL em nova contratação para Planejamento de Negócios. Prazo: Concluído.</p> <p>(R\$ 0,5 MM) Marketing Territorial, Capacitação e Desenvolvimento de Grupos Produtivos: Atraso no processo de contratação, devido à aprovação de apenas uma proposta técnica. Plano de Ação: Acompanhar a finalização do processo de compras em busca de novas propostas técnicas/comerciais. Prazo:30/09/22 (Pendente apenas Marketplace)Marketplace</p> <p>(R\$ 0,5 MM) Marketplace:Mudança de estratégia para inicialização do processo de contratação. Plano de Ação: Acompanhar a finalização do processo de compras e buscando um contrato com menor tempo de execução. Prazo: 30/09/22</p> <p>(R\$ 0,22 MM) Reposição de Insumos e Equipamentos a Foz e Reforma e Adequação de Foz: Indefinição da lista de insumos e equipamentos pelo atingido, e ausência de necessidade de reforma e/ou adequação de infraestrutura. Plano de Ação: Implementar prazos para que os atingidos definam a lista de insumos e equipamentos. Prazo: 20/08/22</p> <p>Antecipação: (R\$ 0,35 MM) Ganho de Competitividade: Oportunidade identificada pelo Programa, com a antecipação das entregas de Foz.</p>
PG21	AFE - AUXILIO FINANCEIRO	31,84	183,24	151,40	4,75	<p>Postergação: Ocorreu um aumento significativo no valor executado devido ao reestabelecimento dos AFEs de subsistência, em cumprimento da decisão do TRF1.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado		Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%			
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	14,48	6,87	-7,61	-0,53			<p>INTERNO</p> <p>Execução (-) - (-R\$14,66MM) - Atraso nas atividades de reparação dos danos e horas de assistência técnica (ATER) a jusante por baixa performance do fornecedor. Baixa performance da contratada de reestruturação produtiva no ARD. Medição dos serviços de gerenciamento abaixo do previsto. Com a paralisação das infra, impacto no fornecimento de máquinas e equipamentos.</p> <p>Contrameditada - Continuidade na execução do PAR (Plano de Aceleração da Retomada). Fomentar a execução via PU pelos produtores na reestruturação produtiva ARD.</p> <p>Processos Internos - (-R\$3,10MM) - Processos internos: Atraso no processo de contratação de fornecedor das tecnologias mini-ete devido alto valor de mercado e pouca oferta. Empresa já mobilizada e atividades iniciadas em 04/07/2022.</p> <p>Contrameditada - Cumprir o cronograma operacional de forma a garantir os custos previstos no draft 19..</p> <p>Reprogramação da Execução - (-R\$2,54MM) - ATER no Território 2: Baixa performance das instituições contratadas na elaboração dos projetos da Retomada Agropecuária; público alvo abaixo do previsto nos editais, por baixa adesão e desistências de produtores do Programa. Planejamento reprogramado para os anos posteriores.</p> <p>Contrameditada - Continuidade na execução do PAR (Plano de Aceleração da Retomada).</p> <p>Mudança de Solução - (-R\$2,50MM) - Encerramento no fornecimento de silagem no Alto Doce devido a finalização da reparação. Revisão de escopo e levantamento de demanda de Distribuição de recursos hídricos. Unidades demonstrativas: desistência por parte da WRI. Conclusão das atividades de implantação de hortas e pomares. Realização de eventos online em substituição aos presenciais devido a pandemia.</p> <p>Contrameditada - Definir estratégia para as Unidades Demonstrativas e alinhar com a CTEI.</p> <p>Contratos sob demanda - (-R\$1,27MM) - Rateio de serviços administrativos de escritório (despesas diversas), de comunicação. Licenciamento ambiental. Recursos pandemia não utilizados.</p> <p>Contrameditada - Não se Aplica.</p> <p>Execução (+) - (R\$0,75MM) - Ambiência e Fornecimento de insumos: antecipação de entregas.</p> <p>Contrameditada - Não se Aplica</p> <p>INTERNO/OUTRAS ÁREAS:</p> <p>Ações da Infra (-) - (-R\$ 46,07MM) - Ações da Infra - Mudança de estratégia de atuação, visando pecúnia. Custo alocado na contingência no draft 19.</p> <p>Contrameditada - Não se Aplica.</p> <p>EXTERNO:</p> <p>Prestação de contas de terceiros - (-R\$0,06MM) -Parceria Fundagres: Foi feito um aditivo com repactuação de desembolso, por isso não recupera em 2022. No mês houve atraso na prestação de contas, que está sendo emitida nf.</p> <p>Contrameditada: Finalizado. Foi realizado aditivo para ajuste dos desembolsos.</p> <p>EXTERNO/JUDICIAL:</p> <p>Decisões Externas - (-R\$1,88MM) - Redução no fornecimento de silagem no território 2 (Médio e Baixo Doce); suspensão por decisão do Juízo da 12ª Vara; Não adesão dos assentados do Assentamento Sezínio (lote 4) à ATEs.</p> <p>Contrameditada - Não se aplica.</p>
PG23	MANEJO DE REJEITOS	21,99	8,03	-13,97	-0,64			<p>INTERNO:</p> <p>Contratos sob demanda - (-R\$ 6,86MM) - Atividades sob demanda: Demandas abaixo do previsto. A execução dos serviços de controle de qualidade do ar está sujeito a sazonalidade. Além disso, devido a diminuição das obras do Parque de Exposições houve equipamentos previstos que não foram mobilizados.</p> <p>Contrameditada - Orçamento readequado no draft 19. Diligenciar os contratos e/ou contratações promovendo readequações visando maior aderência física e financeira.</p> <p>Processos Internos - (-R\$ 0,29MM) - Execução (-) e COVID19: custos provisionados nos contratos e que não foram mais executados. Houve impacto na execução do serviço do monitoramento aereo devido as intensas chuvas entre janeiro e março. Há tendência de normalização do desembolso pois as atividades também foram normalizadas.</p> <p>Contrameditada - Ajustar o critério de medição do serviço de monitoramento aereo.</p> <p>Reprogramação da Execução - (-R\$ 2,09MM) - Reprogramação da execução: (SRK) Atraso na medição devido a take-off que ocorreu em junho. Relatórios entregues e não validados e replanejamento de prazos de entregas. (Golder) Atraso na mobilização devido a apresentação de documentações. (Rhama) Redefinição de estratégias devido a decisões da 12ª vara (ACP - Eixos), que resultou em redução de escopo e desembolso. (Aplysia) Reprogramação da entrega de relatórios.</p> <p>Contrameditada - Acompanhar e cumprir os prazos para emissão inicial de relatórios, revisões e emissão da versão final para protocolo. Notificar a empresa por atraso na entrega de documentos obrigatórios para mobilização.</p> <p>INTERNO/OUTRAS ÁREAS:</p> <p>Prestação de contas de terceiros - (-R\$ 3,85MM) - Contratos de rateio (EBJ e MCA).</p> <p>Contrameditada - Notificar a empresa para apresentação das despesas dentro do período de medição.</p> <p>EXTERNO:</p> <p>BARRAMENTO (-R\$34,2MM) - Gestão da Gerência de Infra (PG10). Postergação: Redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor demanda do que planejado. Provavelmente tenha uma economia no final do ano. Plano de ação: Readequação orçamentária no draft 19. Pois depende de ações no âmbito das ações judiciais.</p> <p>Ação Judicializada/Prazo Judicial - (-R\$14,55MM) - Postergado por questões Judiciais: Os desvios são em função da ausência de resposta de aprovação pela CT-GRSA e à documentação protocolada em atendimento à Del. CIF 524, e homologação pela 12a Vara (ACP- Eixo 2) sobre os documentos de metodologias e técnicas aplicados a análise de risco, o que não permite a execução da etapa 1b. Tal atraso culmina em impedimento jurídico no contexto da ACP / Eixo 2 para execução das atividades de coleta de dados primários (Etapa 1B) e análises de risco (Etapa 2). Não se concretizou a previsão de retorno por parte da CT-GRSA no dia 12/07, conforme decisão proferida 09/06. A nova previsão (inferida) para o retorno é o dia 28/04/2023.</p> <p>Contrameditada - Foi realizado reprogramação dos custos no draft 19, direcionando todas as ações relacionadas aos riscos à saúde para a contingência. Cronograma está em fase de atualização junto à Gerência Socioambiental, de forma a refletir o draft 19, pois não há previsão da 12ª vara homologar para dar início as atividades.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	1,72	0,41	-1,31	-0,76	Postergação: (R\$ 11,6MM) Obra do Dique 04 postergada para 2023.	
PG28	BIODIVERSIDADE	3,11	40,06	36,96	11,90	<p>Postergação: (R\$7,78MM): Atividades da Ambipar (Monitoramento Anexo I) iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta, que impediu o início do plano de transição. Alterações de estratégia de execução do PMBA - não implantação do plano de transição, que previa dois novos ACTs (desembolsos das primeiras parcelas).</p> <p>(R\$0,69 MM): Reprogramação da execução - Avaliação integrada de impactos socioambientais, desenvolvimento software biodiversidade, plano de ação integrado da biodiversidade.</p> <p>(R\$4,08 MM): Implantação do Portal da Biodiversidade e lacunas de perguntas deixadas pelo Edital FAPEMIG em MG.</p> <p>(R\$3,77 MM): Grupo de Especialistas, estratégias de comunicação e banco de dados da Bio.</p> <p>Plano de Ação: Concluir novo Aditivo ao ACT FEST/UFES para promover a continuidade do PMBA. Laila Medeiros - 15/08/2022</p> <p>Readequar o cronograma com revisão da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento. Laila Medeiros - 15/08/2022</p>	
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	1,95	2,19	0,24	0,13	<p>Postergação: Atraso na contratação do aditivo de Flora (Elo) não havendo execução do início da campanha seca prevista para junho;</p> <p>Replanejamento da contratação de um monitoramento único (Fauna e Flora) de Biodiversidade previsto no draft18, gerando alteração no cronograma de mobilização;</p> <p>Atraso na entrega das análises laboratoriais e na execução das campanhas que encerraram em 29/04 gerando impacto no prazo de entrega dos relatórios.</p> <p>Atraso nas contratações da Parceria para implementação do Banco de Dados, do Portal, do livro, Periódicos, Callithrix e Execução do PAN;</p> <p>Plano de Ação: Atuar junto as contratadas para cumprimentos dos prazos e entrega dos produtos;</p> <p>O ajuste referente a nova estratégia contratual de execução do Programa de Monitoramento foi atualizado no DRAFT 19.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,42	1,91	-0,51	-0,21	<p>INTERNOS:</p> <p>Execução (-) - (R\$-1,94MM) - Desembolso Manutenção de Cercamento (Século XXI) menor que o previsto devido às chuvas (jan/22) e performance abaixo do esperado desde do início do contrato.</p> <p>Contramedida - Readequar o modo de trabalho visando atender as metas do Programa, com foco na execução do cercamento, bem como aplicar as ferramentas contratuais visando o aumento da produção.</p> <p>Contratos sob demanda - (R\$-1,05MM) - Desembolso previsto para o Gerenciamento do programa (Progen, MCA e EBJ) menor do que o previsto no contrato da Progen.</p> <p>Contramedida - Replanejar cronograma no próximo Draft de acordo com o novo contrato.</p> <p>Reprogramação da Execução - (-R\$0,42MM) - Desembolso Conv. Recup. ecológica área ambiental 1 (SOCIEDADE DE INVESTIGACOES) menor que o previsto (-0,06MM). Nova contratação prevista (aditivo) não realizado desembolso (-0,37M).</p> <p>Contramedida - Replanejar cronograma e implementar Plano de ação de recuperação do atraso na Execução.</p> <p>Reprogramação da Execução - (-R\$0,38MM) - Desembolso fornecimento de postes de eucalipto para execução e manutenção de Cerca (SM ANGELO) via Pedido de usuário não realizado devido ao pedido ter sido cancelado, fornecedor rescindiu o contrato.</p> <p>Contramedida - Reprogramar cronograma com a retirada deste pedido e inclusão de um novo fornecedor (ANTONIO GARAVINI E CIA LTDA) no novo draft.</p> <p>Reprogramação da Execução - (-R\$0,34MM) - Previsão de contratação de Pedido de Usuário e Pequenas Compras (PÓS CANDONGA) não realizado, necessidade de alteração do cronograma em função de alteração do procedimento de suprimentos (-)0,34MM.</p> <p>Contramedida - Replanejar cronograma próximo Draft com a criação dos Pedidos de Usuário em função de alteração do procedimento de suprimentos e estratégia do programa.</p> <p>Contratos sob demanda - (-R\$ 0,12MM) - Previsão Vigilância e Segurança Privada MG (Anjos da Guarda (aditivo) - Vig. Eventual) não realizado no mês. Valor é rateado entre os programas.</p> <p>Contramedida - Replanejar cronograma no próximo Draft de acordo com as novas estratégias.</p> <p>INTERNO/OUTRAS ÁREAS:</p> <p>Processos Internos - (-R\$ 0,30MM) - Desembolso previsto Monitoramento Ecológico - 2021 a 2022 (AMBIPAR Control) teve a contratação atrasada e desembolso menor que o previsto.</p> <p>Contramedida - Reprogramar cronograma visando a recuperação do atraso na Execução.</p> <p>EXTERNO/ÓRGÃO GOVERNAMENTAL:</p> <p>Decisões Externas - (R\$-0,42MM) - Desembolso previsto de Regularização dos Tributários (à contratar) não realizado pois está pendente retorno dos órgãos.</p> <p>Contramedida - Analisar junto a Gerencia de Licenciamento quanto ao desembolso dessa verba.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,98	9,04	-4,94	-0,35	<p>Postergação: (30,9MM) Adutora-GV - Atraso na contratação do Pacote 02 da Adutora, devido à questões comerciais e de mercado. A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento. Infra-GV - Atraso no início da contratação do novo Contrato Guarda-Chuva / MG, no qual estão previstas 2 obras da APRO 153/2021.</p> <p>Engenharia - atividades de sondagem/topografia/batimetria: aguardando decisão judicial</p> <p>Infra RD - Atividades aguardando deliberações externas baixa performance do fornecedor Baixa aderência das empresas no processo de contratação.</p> <p>Plano de Ação: Adutora-GV : Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (desvio acumulado até Junho/22 era -45%, tendo variado para -35% no acumulado até Julho/22, se aproximando do planejado). Infra-GV: Reuniões semanais com a área de Suprimentos da FR visando agilidade no processo de Contratação (Previsão de conclusão da contratação 01/08/22).</p> <p>Engenharia: atividade sondagem/toografia/batimetria : N/A.</p> <p>Infra RD: Suprimentos realizando uma nova rodada de negociação com os fornecedores, setores atuando constantemente em reuniões para conseguir deliberações externas.</p>
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	NA
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	2,93	3,94	1,00	0,34	<p>Postergação: (-R\$0,8 MM): Produtos sob demanda referente ao contrato da Rhama das Estações Automáticas foram orçados mas ainda não foram executados.</p>
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	1,26	0,00	-1,26	-1,00	<p>Reparatório (cláusula 181) 2.9MM</p> <p>Postergação: Readequação do cronograma de entregas que ocasionou o atraso no pagamento do fornecedor.</p> <p>Plano de Ação: Readequar o cronograma com revisão da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento</p> <p>Plano de Ação: Readequar o cronograma com revisão da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento</p>

PG	Mensal				Anual Acumulado		Justificativas da variação anual acumulada
	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	24,31	28,65	4,33	0,18	Postergação: (R\$ 5,9 MM): Erro de previsão do mês de alocação, ajustado no Draft19 (Microsoft, Concur, Success Factors e Webgis); (R\$ 3,0 MM): atraso da entrada de NF Auditoria (EY) e aluguel de veículos; (R\$ 3,3 MM): contratos sob demanda temporários não utilizados (Periodical e Prestar); R\$ 1,8 MM : Despesas Finalísticas executando a maior R\$ 1,6 MM, sendo R\$ 11,8 MM em Despesas com pessoal; (R\$ 9,4MM) em Serviços Contratados e (R\$0,8 MM) em Despesas de Viagem. Execução maior também no contrato Accenture devido não redução no número de consultores conforme previsto no Draft R\$ 0,2 MM. R\$ 1,3 MM : Contrato em Dólar - Painel Rio Doce acima do previsto.	
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A.	
Total Reparatórios		640,04	587,60	-52,43	-0,08		
Total Programas		675,17	610,18	-64,98	-0,10		

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	16,06	12,47	-3,59	-0,22	Postergação: (R\$ 22,8 MM): Serviços Contratados: Serviços de Comunicação (R\$ 10,6 MM), Consultoria jurídica e perícia (R\$ 5,6 MM), Compliance (R\$ 1,5 MM), Serviços TI (R\$ 2,2 MM) e outros contratos sob demanda (R\$ 2,9 MM). (R\$ 1,1 MM): Despesas com Pessoal: (R\$ 0,9 MM) Treinamentos e workshops. Horas Extras está com variação pois está orçada em Gestão de Pessoas e é realizada nos CCs correspondentes. (R\$ 0,5 MM): Despesas com Seguro e outros. Economia: (R\$ 0,4 MM): Despesas de Viagens e outras economias com Pessoal no administrativo; (R\$ 4,1 MM): Ativo Fixo, antecipação da compra de computadores para o final de 2021.
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	1,94	2,24	0,30	0,15	Postergação (prestação de contas pendentes): (R\$ 7,0 MM) Câmaras Técnicas; (R\$ 2,0 M) Custeio Atingidos Reuniões; (R\$ 0,5 M) CIF; (R\$ 0,1 M) Auditoria Gerenciadoras.
Total Despesas Administrativas		18,00	14,71	-3,29	-0,18	
Total Geral		693,17	624,89	-68,28	-0,10	

***Valores em milhões de reais.**
