



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Julho/2023

Sumário

Apresentação	5
PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados	6
PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados	14
PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	21
PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	28
PG005 Programa de Proteção Social	35
PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	45
PG007 Programa de Assistência aos Animais	86
PG008 Reconstrução de Vilas	96
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	113
PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga	126
PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce	135
PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística	145
PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	151

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada	160
PG015 Promoção da Inovação	167
PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	173
PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias	181
PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica	193
PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	202
PG020 Estímulo à Contratação Local	209
PG021 Auxílio Financeiro Emergencial	218
PG023 Manejo de Rejeitos	224
PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1	233
PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas	240
PG027 Programa de Recuperação de Nascentes	246
PG028 Conservação da Biodiversidade	255
PG029 Recuperação da Fauna Silvestre	262
PG030 Fauna e Flora terrestre	268
PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos	274
PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	286

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)	294
PG034 Preparação para Emergências Ambientais	300
PG035 Programa de Informação para a População	308
PG036 Comunicação Nacional e Internacional	316
PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce	324
PG039 Unidades de Conservação	334
PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA	341
PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	348
Glossário	355
Dados de Segurança	361
Gestão Econômica	362

Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS – SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	19	Caput	Judicializada
Cláusula	20	Caput	Judicializada
Cláusula	22	Caput	Em andamento
Cláusula	25	Caput	Em andamento
Cláusula	26	Caput	Em andamento
Cláusula	28	Caput	Em andamento
Deliberação	127	1.2 e 2	Judicializada
Deliberação	127	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	141	1	Judicializada
Deliberação	141	2	Concluída Internamente
Deliberação	141	3	Concluída Internamente
Deliberação	141	5	Concluída Internamente
Deliberação	19	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	234	3	Concluída Internamente
Deliberação	251	1	Concluída Internamente
Deliberação	277	único	Judicializada
Deliberação	346	2	Concluída Internamente
Deliberação	58	2	Judicializada
Deliberação	58	3	Judicializada
Deliberação	71	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	93	2	Concluída Internamente
Deliberação	93	3	Concluída Internamente
Deliberação	93	4	Concluída Internamente
Deliberação	93	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

Em cumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Federal, as manifestações de solicitação de cadastro registradas entre 2017 e 2021 deverão ser atendidas conforme cronograma específico. Desta forma, é previsto concluir em 2024 o cadastramento das solicitações de cadastro de 2020 à 2021.

Grandes números do programa

- 177.013,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317,00 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30.821,00 famílias e 99.552,00 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do mês

Atendimento a 9.732 solicitantes no mês de Julho/23.

Indicadores

I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes

Meta Global:100%
Percentual %

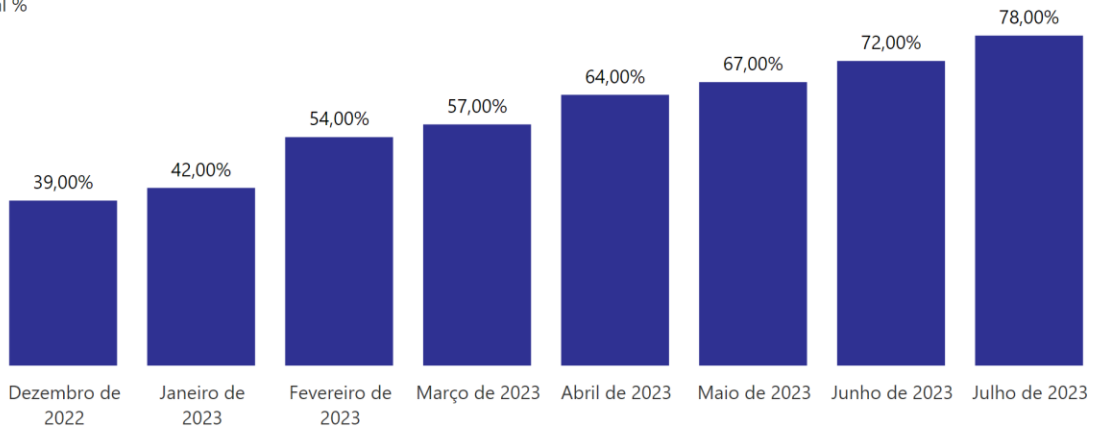


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial

Meta Global:100%
Percentual %

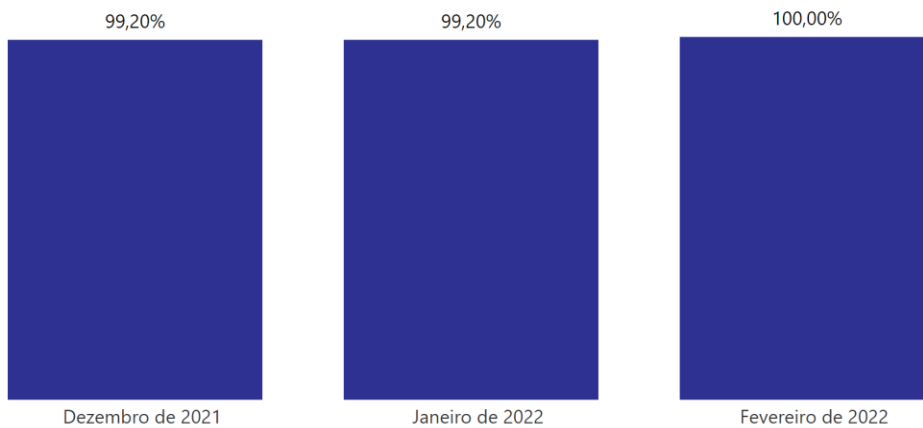


Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados

Meta Global:100%

Percentual %

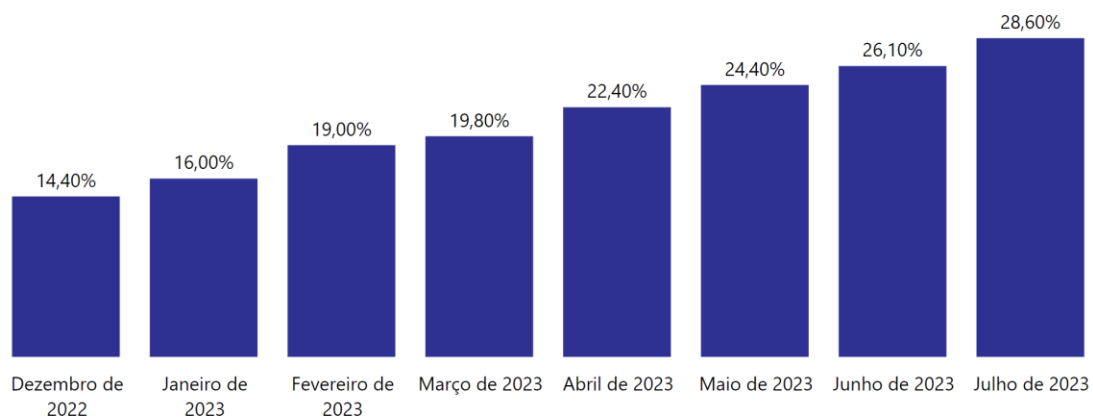


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

Cadastro Mariana - Fase 1

Meta Global: 1.175

Número de entrevistas



Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

Cadastro Mariana - Fase 2

Meta Global: 770

Número de vistorias

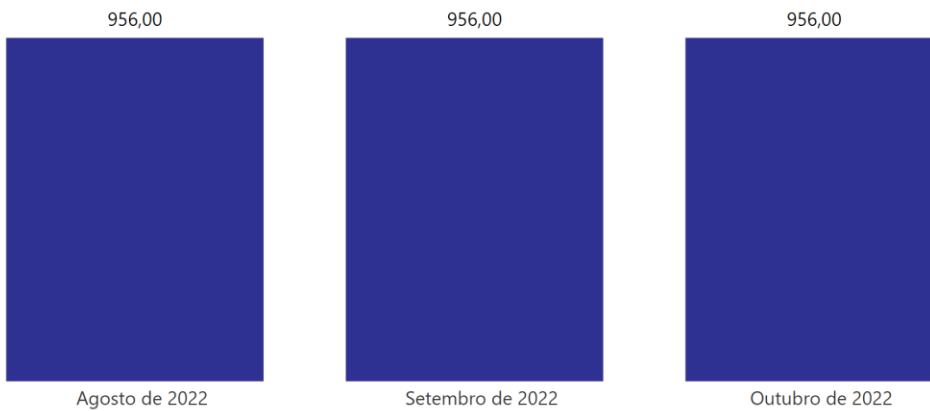


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**

Até o momento foram atendidas 320.179,00 pessoas, sendo que 270.372,00 aceitaram propostas. Destas, 264.988,00 propostas já foram pagas (98,01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam R\$ 305.469.284,27 .

- **Para Dano Gerais**

10.867,00 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.816,00 já foram pagos (99,53% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam R\$ 1.964.106.546,17 .

- **Para a campanha de Mariana**

Até o momento foi realizado o pagamento de 828,00 indenizações, o que representa 98,22% do total das 843,00 propostas aceitas.

Fatos relevantes do mês

Até o momento, 95.767 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 828 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,22% do total das 843 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.

Indicadores

I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral

Percentual(%)

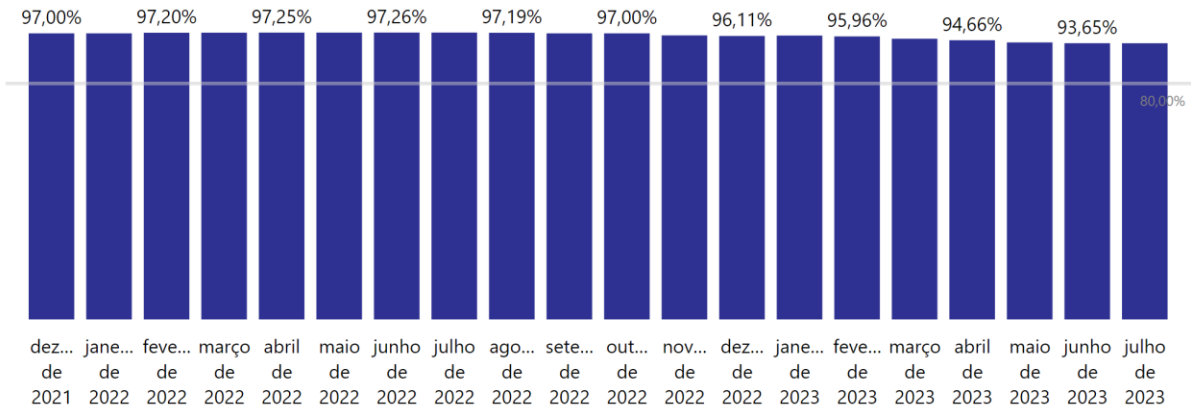


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

I04 – Taxa de adesão – Dano Geral

Percentual(%)

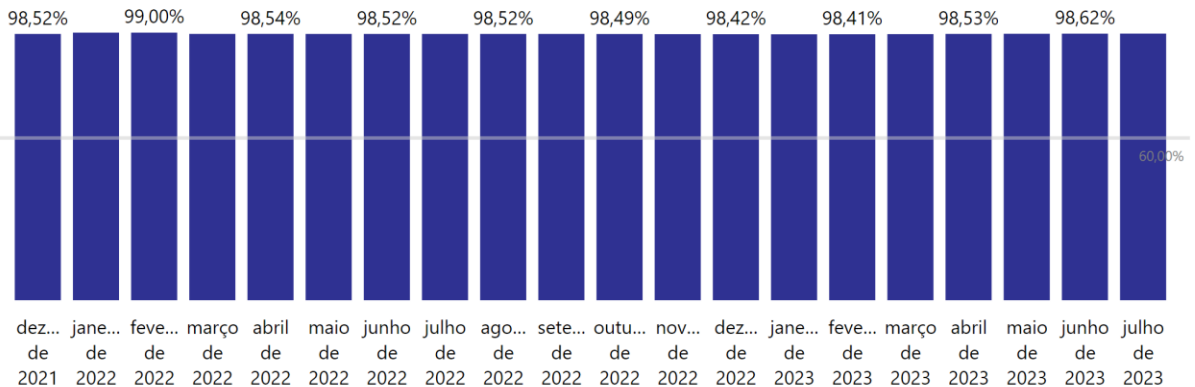


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral

Percentual(%)

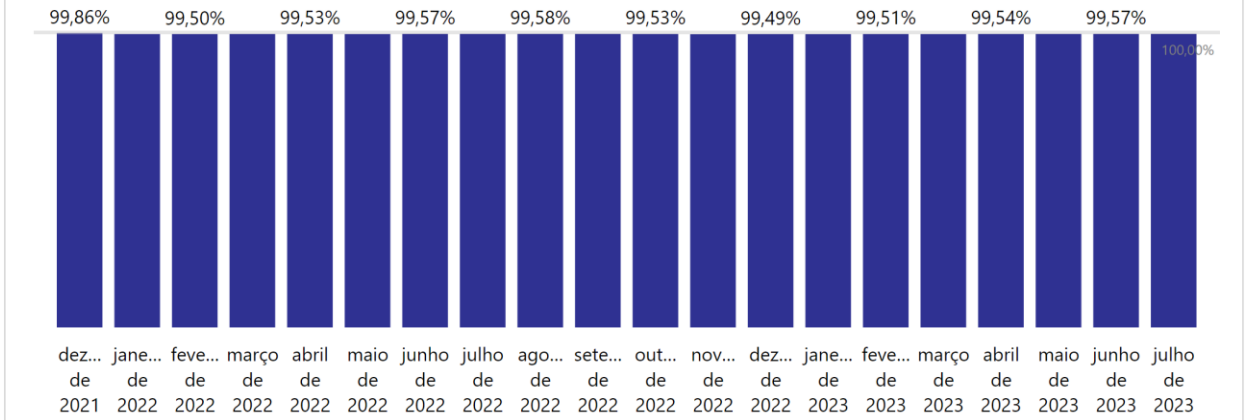


Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	38	Caput(ação 1)	Judicializada
Cláusula	38	Caput(ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-a (ação 2)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 1)	Judicializada
Deliberação	111	3-b (ação 2)	Judicializada
Deliberação	118	2	Judicializada
Deliberação	119	10	Concluída Internamente
Deliberação	119	2	Concluída Internamente
Deliberação	119	5-a	Judicializada
Deliberação	119	5-b	Judicializada
Deliberação	181	5	Em Andamento
Deliberação	181	6	Judicializada
Deliberação	181	7	Judicializada
Deliberação	181	8	Em Andamento
Deliberação	182	1	Concluída Internamente
Deliberação	182	3	Judicializada
Deliberação	211	2	Judicializada
Deliberação	236	único	Concluída Internamente
Deliberação	469	2	Concluída Internamente

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos ...

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	39	Caput	Em andamento
Cláusula	43	§1º	Em andamento
Cláusula	43	Inc I	Em andamento
Cláusula	43	Inc II	Em andamento
Cláusula	43	Inc III	Concluída Internamente
Cláusula	43	Inc IV	Em andamento
Cláusula	43	Inc V	Em andamento
Cláusula	44	Inc I (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc I (ação 2)	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc II	Em andamento
Cláusula	44	Inc III e §3º	Concluída Internamente
Cláusula	44	Inc IV	Em andamento
Cláusula	44	Inc V	Em andamento
Deliberação	201	2	Concluída Internamente
Deliberação	206	1	Em andamento
Deliberação	227	2	Concluída Internamente
Deliberação	299	único	Concluída Internamente
Deliberação	335	2	Concluída Internamente
Deliberação	335	3	Concluída Internamente
Deliberação	360	1 e 1.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	1.1	Em andamento
Deliberação	445	2.1	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.3	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.4	Concluída Internamente
Deliberação	445	2.5	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias da Aldeia - Boapy Pindó
- maio de 2023 ● Finalizar o Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias de Comboios
- setembro de 2023 ● Concluir as Ações Transitórias - Aldeia Boapy Pindó
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Aldeia - Boapy Pindó
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Comboios
- dezembro de 2023 ● Concluir as Ações Emergenciais - Tupiniquim Guarani

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 600 pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 90.000 litros).
- 142 pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor;
- 174 pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor (total de 5063 m³).
- 65 pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor (total de 1297 m³).

Comboios

Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 42520 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de junho, 06, 13, 20 de julho de 2023 (total de 2126 galões de 20 litros).

A Fundação Renova pagou no mês corrente através de transferência bancária à Associações Indígenas Tupiniquim de Comboios o total de R\$ 4.956.959,69, referente ao auxílio de subsistência emergencial. Esse valor compreende ao pagamento de 2,5 salários mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associações.

Resplendor

A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R\$ 2.150.280,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 45 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 16 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 20 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 22 famílias da Associação Indígena KRENAK, 13 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 15 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 17 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 33 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R\$ 2.150.280,00, compreende o pagamento mensal de 9 salários mínimos no valor de R\$ 1.320,00 para cada uma das 181 famílias.

Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias.

Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias.

Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG0004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	46	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§2º	Concluída Internamente
Cláusula	46	§3º	Concluída Internamente
Cláusula	46	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	50	Caput	Em andamento
Deliberação	280	1	Concluída Internamente
Deliberação	281	1	Concluída Internamente
Deliberação	298	1	Concluída Internamente
Deliberação	329	1	Concluída Internamente
Deliberação	430	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	356	1; 1.1 e 1.2	Concluída Internamente
Deliberação	256	2	Concluída Internamente
Deliberação	298	2	Concluída Internamente
Deliberação	430	2	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	256	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	3	Concluída Internamente
Deliberação	423	3	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente
Deliberação	423	4	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	280	4 (ação 2)	Concluída Internamente
Deliberação	355	1	Em andamento
Deliberação	300	1	Judicializada
Deliberação	300	2	Judicializada
Deliberação	333	2	Judicializada
Deliberação	493	2	Judicializada
Deliberação	493	3	Judicializada
Deliberação	501	3	Judicializada

Deliberação	154	1	Concluída Internamente
Deliberação	155	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	1	Concluída Internamente
Deliberação	161	2	Concluída Internamente
Deliberação	161	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	1	Concluída Internamente
Deliberação	202	2c	Concluída Internamente
Deliberação	202	3	Concluída Internamente
Deliberação	202	4	Concluída Internamente
Deliberação	202	5	Concluída Internamente
Deliberação	256	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- outubro de 2023 ● Concluir Projetos de Culltura
- dezembro de 2023 ● Protocolo do documento de definição do programa junto ao CIF

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

1. Abastecimento de água para comunidade quilombola de Degredo

Abastecimento de água mineral para 183 famílias da comunidade quilombola de Degredo.

2. PBAQ

6 projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor, com a participação da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissão Quilombola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

Realização de Capacitação de Lideranças Quilombolas para a Comunidade de Degredo, em 20.07.2023

Realização da reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 19.07.23

Início das atividades da Consultoria Expressão Socioambiental, responsável pela execução dos programas de Capacitação de Lideranças Quilombolas e Diálogo, Participação e Controle Social, do PBAQ

Início das atividades da Consultoria ERG Engenharia, responsável pela execução dos programas de Educação Ambiental e Práticas Pedagógicas de Educação Popular, do PBAQ

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	54	Caput	Em andamento
Deliberação	180	1	Concluída Internamente
Deliberação	192	2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	278	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	307	1	Concluída Internamente
Deliberação	307	2a	Concluída Internamente
Deliberação	330	único	Concluída Internamente
Deliberação	332	único	Concluída Internamente
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	533	4	Judicializada

Entregas do ano de 2023


fevereiro de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Rio Doce - MG
março de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Aimorés - MG
março de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS no território do Médio Rio Doce.
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Fernandes Tourinho - MG
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS no território da Calha do Rio Doce
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Pingo D'água- MG
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Rio Casca- MG
abril de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS São José do Goiabal - MG
maio de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Aracruz - ES
maio de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Baixo Guandu - ES
junho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Tumiritinga - MG
julho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS no território do Alto Rio Doce
julho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Santa Cruz do Escalvado - MG
julho de 2023	●	Conclusão das ações da nova estratégia de responsabilidade do PPS no território Médio do Rio Doce
julho de 2023	●	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS - Governador Valadares - MG

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2023

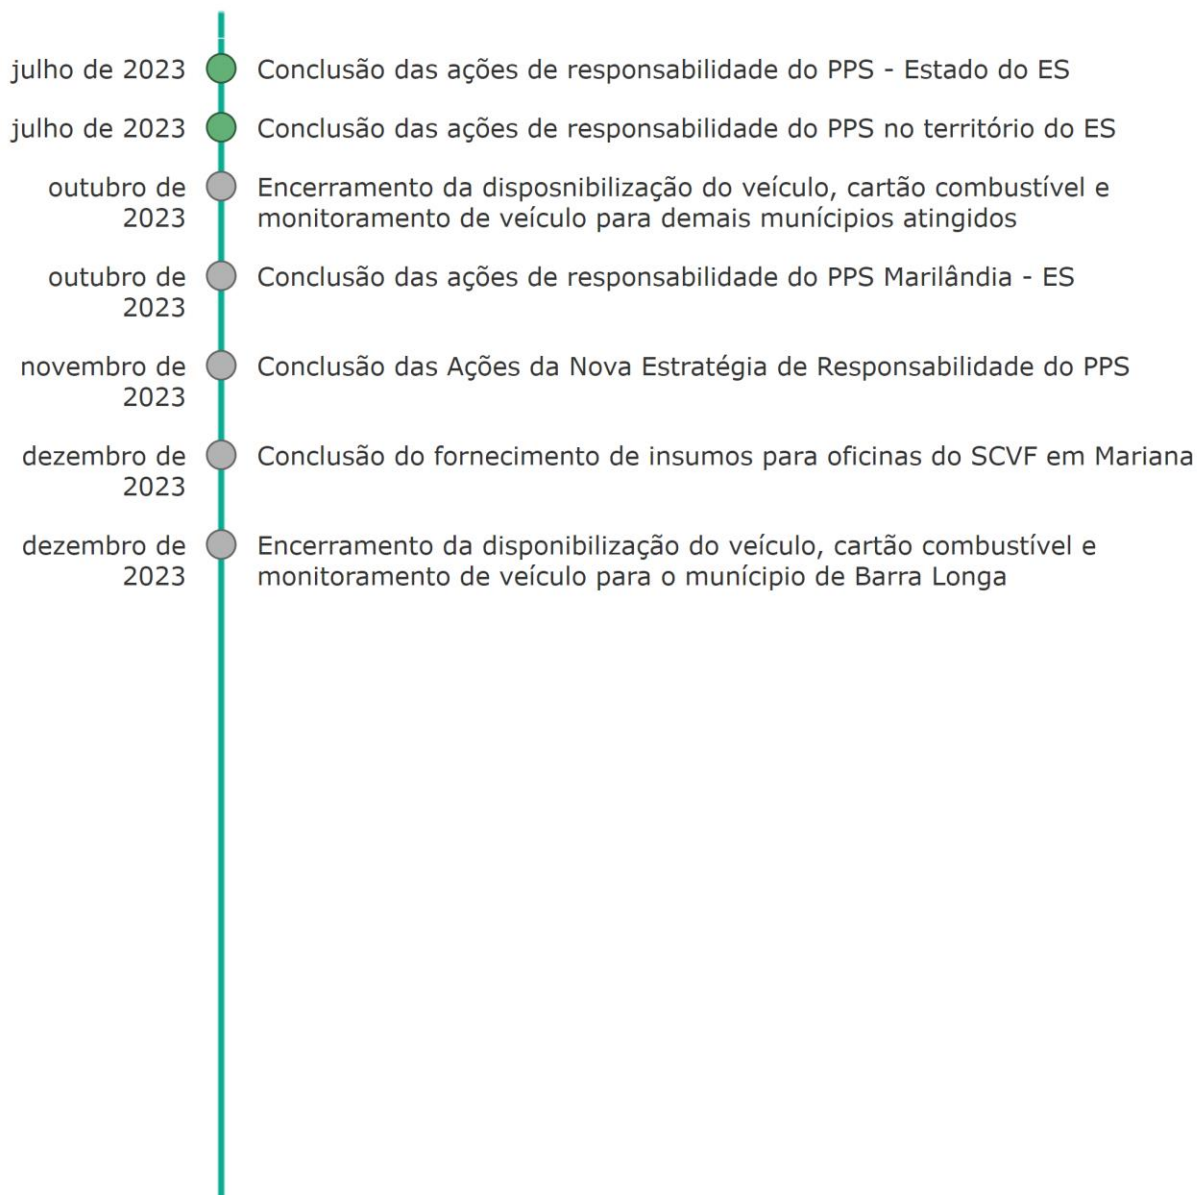

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 123.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santo, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos atingidos pelo rompimento, priorizando as famílias com deslocamento físico;
- Repasse financeiro de R\$ 26,607,715.82 , além, da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos no demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias antigidas;
- Disponibilização de 18.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantido acesso às famílias e comunidades atingidas;
- 23,370.00 famílias cadastradas pela Fundação a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova,

Fatos relevantes do mês

Reunião de COMAPPS nos municípios de Bugre, Fernandes Tourinho e Ipaba

Realização de Baixa Contábil da SETADES/ES, encerrando processo burocrático do acompanhamento .

Realização da 1ª Capacitação 2023 Mariana

Inauguração do Centro de Convivência Rio Doce, em São Lourenço distrito de Bugre

Encerramento da capacitação em Trabalho Social com Famílias, ofertada aos municípios: Bugre – MG, Galiléia – MG, Allpercata – MG, Iapu – MG, Marliéria MG, São José do Goiabal – MG, Sem - peixe – MG, Sobrália – MG, Tumiritinga – MG, Colatina – ES, Marilandia – ES, Sooretama – ES, Ipatinga-MG, São Pedro dos Ferros – MG.

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira de Galiléia

Acompanhamento das ações do Plano de Reparação do município de Sooretama com visita à oficina do SESI e reunião com a Secretaria Municipal de Assistência Social

Indicadores

I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual

I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores

I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

- (i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
- (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
- (iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
- (iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	59	Caput	Em andamento
Cláusula	63	§único	Em andamento
Cláusula	63	Caput	Em andamento
Cláusula	68	Caput	Encerrada
Cláusula	71	Caput	Em andamento
Cláusula	72	Caput	Em andamento
Deliberação	105	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	105	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	140	1	Concluída Internamente
Deliberação	228	2	Concluída Internamente
Deliberação	230	1	Concluída Internamente
Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	506	3	Concluída Internamente
Deliberação	506	4	Concluída Internamente
Deliberação	506	5	Concluída Internamente
Deliberação	506	6	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2023.
dezembro de 2023		Acompanhamento do Controle Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executados pela Fundação Renova em 2023.
dezembro de 2023		Articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2023.
dezembro de 2023		Atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.
dezembro de 2023		Divulgação da ouvidoria nos canais institucionais em 2023.
dezembro de 2023		Encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Execução da Análise de Contexto em 2023: Compreensão, Reconhecimento e Aproximação.
dezembro de 2023		Garantir em 2023 a periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento da Reparação nas Rádios do trecho; boletins mensais e murais dos CIA's.
dezembro de 2023		Identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2023.
dezembro de 2023		Manutenção do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2023.
dezembro de 2023		Monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2023.
dezembro de 2023		Prover a Participação Social nos Programas, Projetos e Ações de Reparação e Compensação executadas pela Fundação Renova em 2023.
outubro de 2023		Publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2023.
dezembro de 2023		Registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2023.

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	jun/2023	jul/2023	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	15	15	1.307
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	27	13	4.053
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-	-	139.608

Fatos relevantes do mês

Em Mariana, foram realizados fóruns de prestação de contas. Grupos de trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos da reparação. Fiscalização de Obras do Reassentamento Coletivo de Paracatu de Baixo para discussão de assuntos da reparação. Grupo de trabalho de Paracatu de Baixo para discussão acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade e demais assuntos de reparação. Fiscalização de Obras do Reassentamento Coletivo de Paracatu de Baixo para discussão de assuntos da reparação. Reunião com lideranças de Ponte do Gama para esclarecimentos sobre o funcionamento e manutenção dos bens coletivos: Campo de Futebol, Quadra Poliesportiva e Arena de Cavalgada. Foi realizado também Café com Prosa – Reunião com a comunidade de Mariana sede para esclarecimento de dúvidas e apresentação das ações realizadas pela Fundação Renova no território.

No Alto Rio Doce, foram realizadas Roda de Conversa para apresentação das ações do Plano de Reparação de Referências Culturais e com Grupo de Comunicação para construção da próxima Edição do Jornal Terra da Gente.

No Baixo Rio Doce, em Colatina (ES) foram realizadas reuniões de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Colatina e encontro para apresentação do TAC Governança para lideranças de Colatina Sede. reunião coletiva com pescadores profissionais da ACOBAMA de Aimorés para apresentação das ações do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras em Aimorés (MG). Reunião com moradores de Baixo Guandu (ES) para apresentação das ações do Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce e reunião de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores na mesma cidade. Em Marilândia (ES) reunião de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Marilândia.

No Médio Rio Doce, foi realizada reunião coletiva com produtores rurais de Conselheiro Pena (MG) atendidos pela Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para promoção da transparência e alinhamentos sobre as ações em curso.

No território Calha do Rio Doce, Fórum de Prestação de Contas junto a lideranças e moradores de São Cândido foi realizado em Caratinga (MG) para apresentação das ações desenvolvidas pela Fundação Renova no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos e divulgação e esclarecimento de dúvidas sobre o Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

No Espírito Santo, destacam-se agendas em Linhares: reunião com Associação de Comerciantes e Empreendedores de Povoação para esclarecimentos finais sobre a feira comunitária de Povoação; Reunião com Associação de Piscicultores do Guaxe APIGUA para início das atividades de apoio técnico e grupos produtivos; Reunião de apresentação do projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Povoação; Reunião de apresentação do Projeto Pescando Oportunidades para pescadores profissionais de Regência; Reunião de apresentação do TAC Governança para lideranças da Sede de Linhares e para as comunidades de Povoação e Regência; Apresentação do TAC Governança para lideranças da comunidade Barra do Riacho em Aracruz; e Reunião com o projeto Pescando Oportunidades para profissionais de Barra do Riacho.

Indicadores




Gráfico 1: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral




Gráfico 2: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios

Pontos

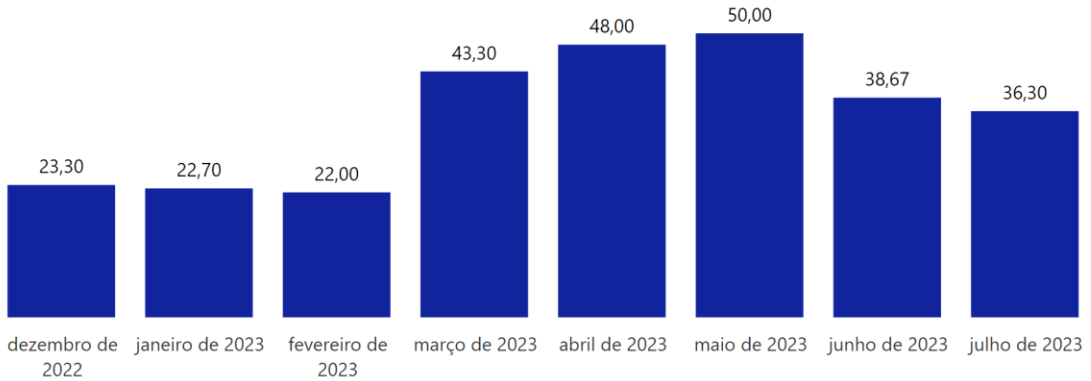


Gráfico 3: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Pontos

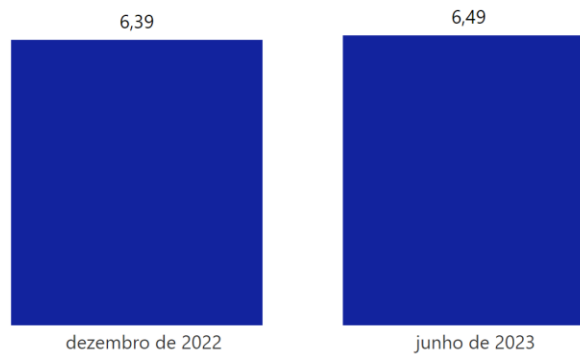


Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores

I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos

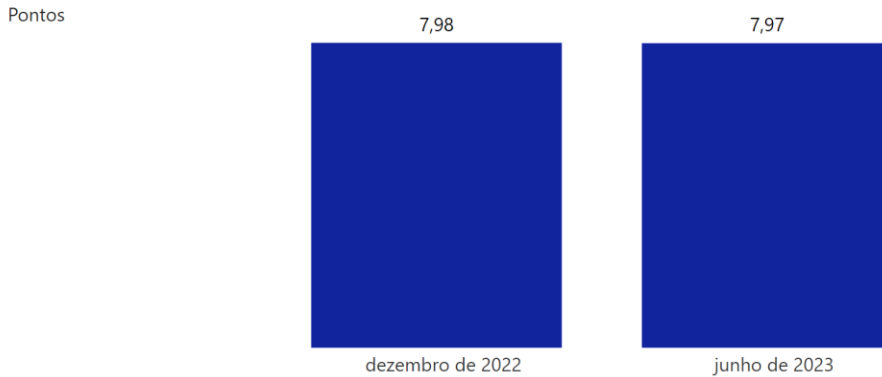


Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social




Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova

Percentual(%)




Gráfico 7: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos

Percentual(%)



Gráfico 8: I08 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Anual

Indicadores




Gráfico 9: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência Trimestral

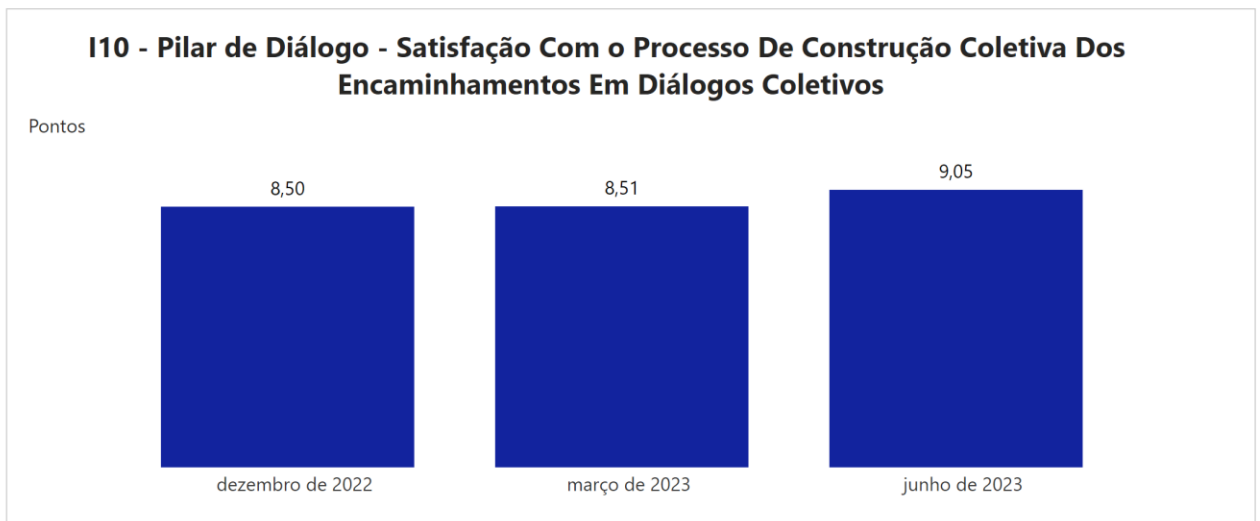


Gráfico 10: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
17.492,00	188,09

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2023	138	206,67
fevereiro de 2023	249	
março de 2023	233	232,67
abril de 2023	230	
maio de 2023	204	247,00
junho de 2023	264	
julho de 2023	247	-

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes neste mês.

Indicadores

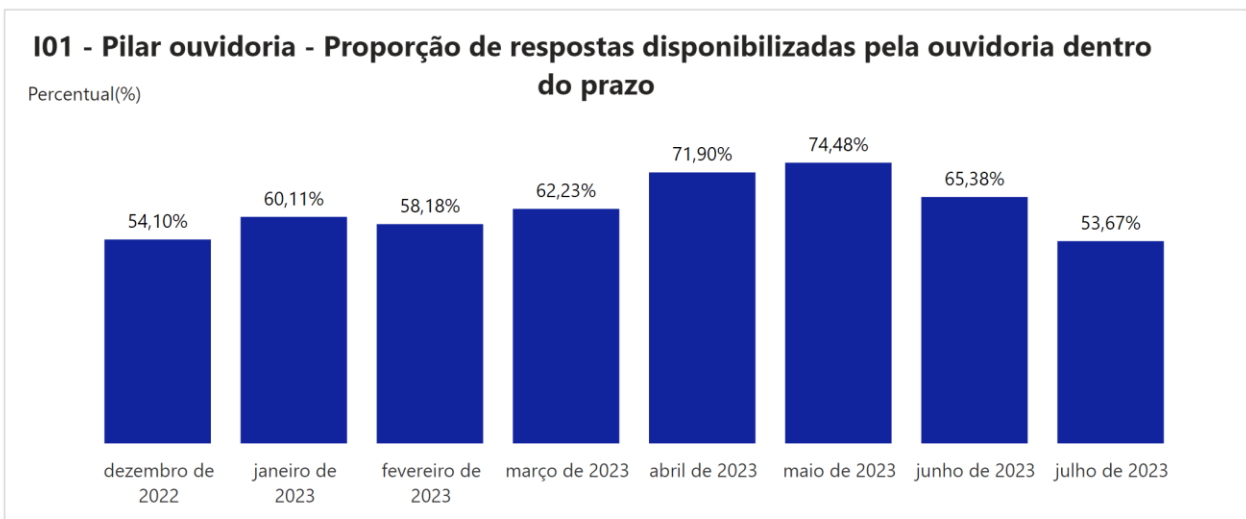


Gráfico 11: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência mensal

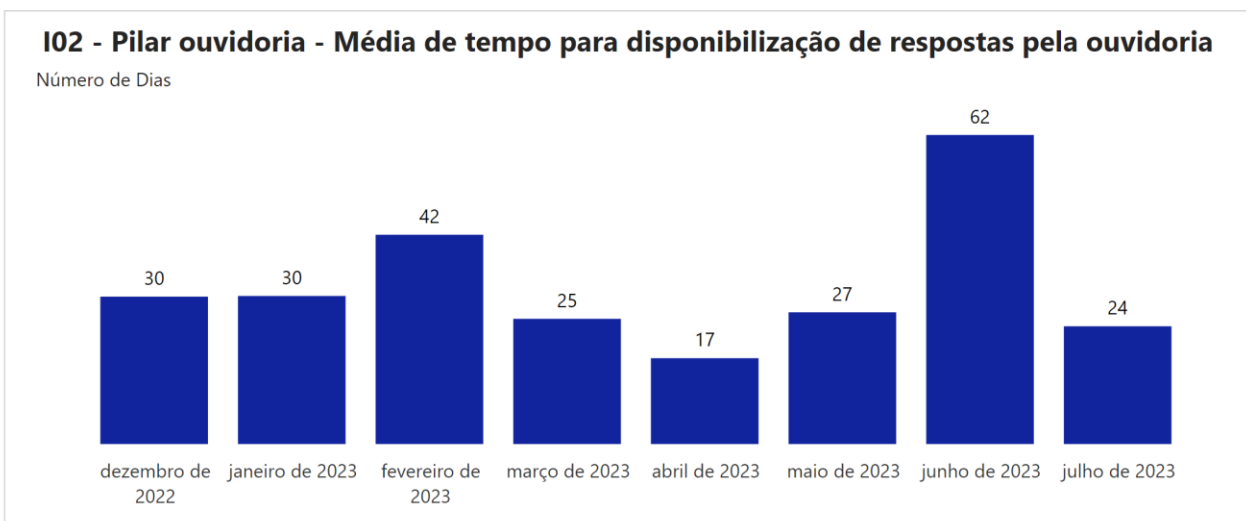


Gráfico 12: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 13: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	jun/2023	jul/2023
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	342.509	344.568
Canais: Número total de manifestações	1.484.882	1.519.585
Canais: Número de manifestações respondidas	1.431.541	1.466.470
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	204.193	211.484
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	116.258	120.593
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	15.329	15.370
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	1.074.637	1.096.256
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	16	18
Canais: Número de manifestações em tratamento	53.341	53.115
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	74.465	75.882

Pesquisa de Opinião 0800




Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

Pesquisa de Opinião 0800

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Sim




Gráfico 15: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

Q3: Como você avalia o atendimento que acabou de receber? Q1 = Parcialmente




Gráfico 16: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs


Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje?



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● PÉSSIMO ● REGULAR ● RUIM

Gráfico 17: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal


Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou?



Legenda ● MUITO SATISFEITO ● SATISFEITO ● INSATISFEITO ● MUITO INSATISFEITO ● INDIFERENTE

Gráfico 18: Em relação às informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal


Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento?



Legenda ● SIM ● EM PARTES ● NÃO

Gráfico 19: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

Avalie o Conforto e qualidade do espaço



Legenda ● ÓTIMO ● BOM ● REGULAR ● RUIM ● PÉSSIMO

Gráfico 20: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do mês

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Ao longo do mês de julho, destaque para a realização de 28 CIAs Móveis: Em Califórnia/Sem Peixe e Povoação/Linhares no dia 04/07. No Assentamento 1º de Junho/Tumiritinga e Patrimônio da Lagoa/Sooretama em 05/07. Em São Tomé do Rio Doce/Tumiritinga e Areal/Linhares em 06/07. Na comunidade de Rosário/Baixo Guandu e Ilha do Rio Doce/Caratinga em 11/07. Em Mascarenhas/Baixo Guandu, Vila Krenak/Resplendor e Residencial Porto Seguro/Caratinga em 12/07. Em Barbados/Colatina e Vila Krenak/Resplendor em 13/07. Na comunidade de Aviso/Linhares em 17/07. Em São Lourenço/Bugre e Povoação/Linhares em 18/07. Em Santo Antônio do Rio Doce/Aimorés e Humaitá/Linhares em 19/07. Em Itueta e Regência/Linhares em 20/07. Em Canivete/Linhares em 24/07. Em São José/Linhares e Baguari/Governador Valadares em 25/07. Em Alpercata e Barra Mansa/Rio Casca em 26/07. Em Barra do Riacho/Aracruz, Mãos Dadas/Conselheiro Pena e Jurumirim/Rio Casca em 27/07.

Indicadores

I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes

Percentual(%)

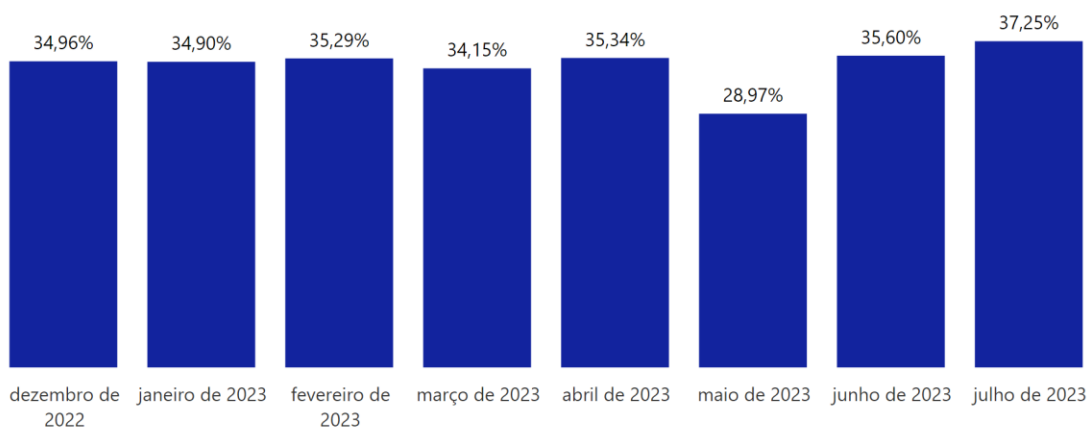


Gráfico 21:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas

Percentual(%)

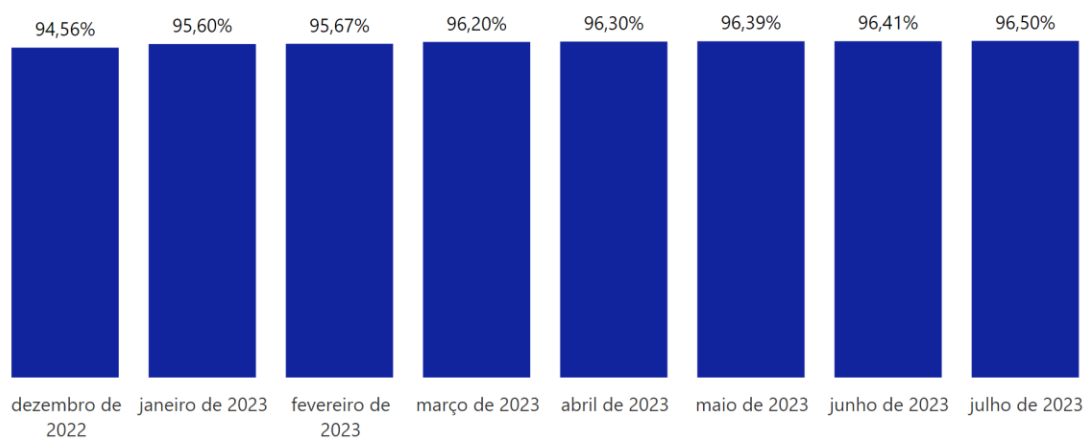


Gráfico 22: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores

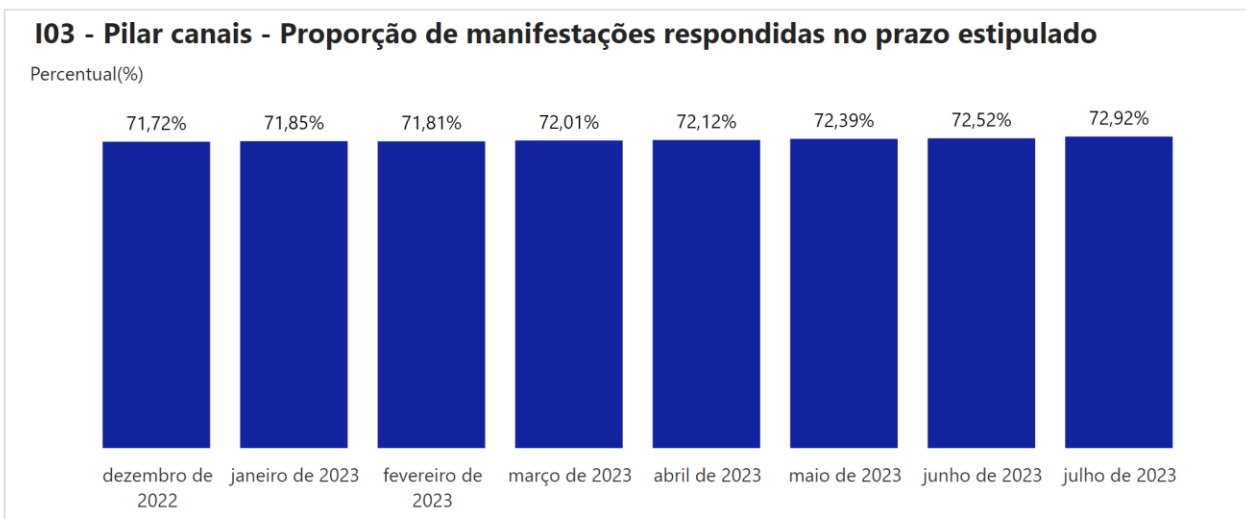


Gráfico 23: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal




Gráfico 24: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores

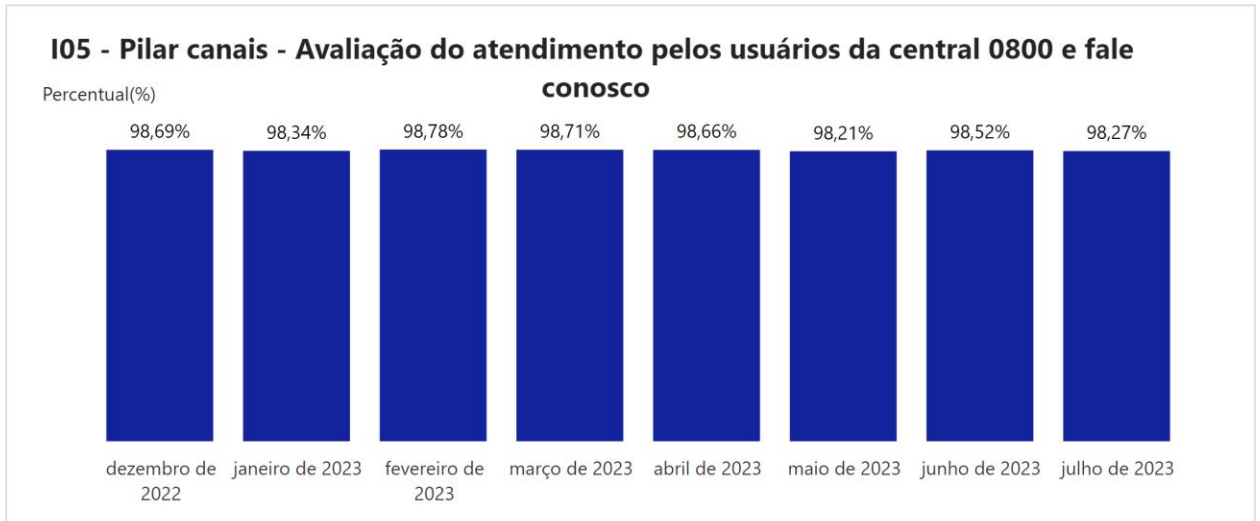


Gráfico 25: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal




Gráfico 26: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias

Percentual(%)

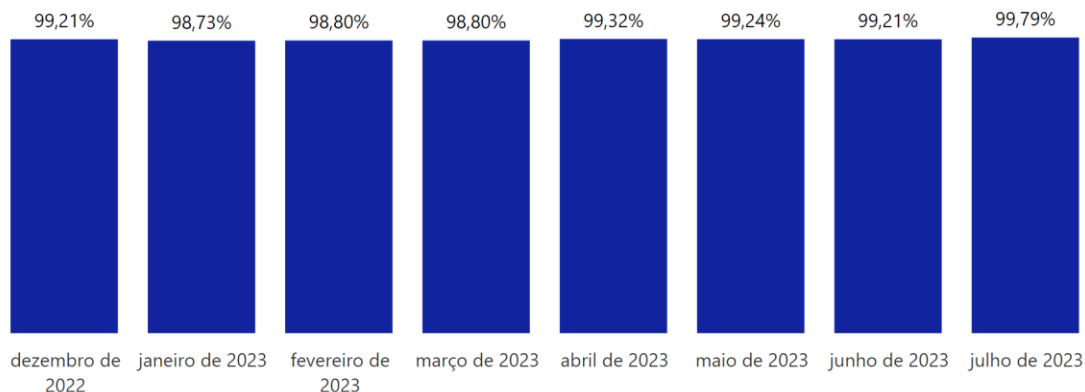


Gráfico 27: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco

Percentual(%)

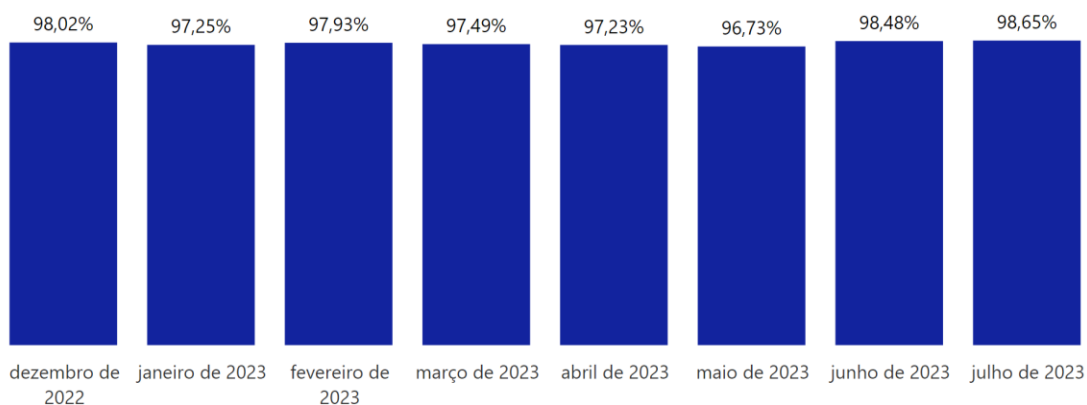


Gráfico 28: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias

Percentual(%)

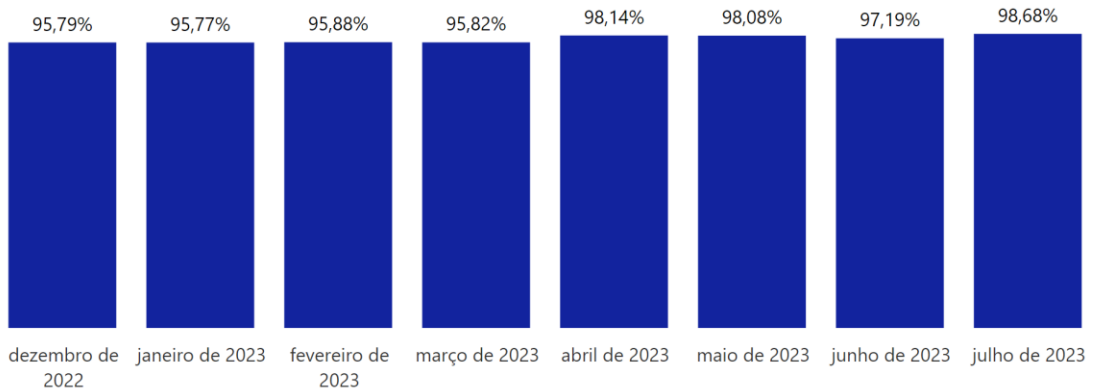


Gráfico 29: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2023

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado no ano
Áudios produzidos	1	0	1	0	0	3	5
Carros de som produzidos	0	0	1	0	0	1	2
Cartazes produzidos	0	0	0	0	0	1	1
Cartilhas produzidos	1	0	0	0	0	0	1
E-mails de Marketing produzidos	0	0	0	0	0	1	1
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	2	0	1	2	9
Jornais da Comunidade produzidos	31	25	23	19	19	21	138
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	44	12	56	9	42	34	197
Mídias Sociais produzidas	0	0	1	0	0	0	1
Newsletter produzidos	3	1	1	1	5	1	12
Outros itens produzidos	2	3	1	0	1	3	10
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	1	3
Pílulas de whatsapp produzidos	32	17	22	9	27	20	127
Rádios produzidos	32	15	35	21	18	17	138
Vídeos produzidos	8	6	5	5	10	8	42

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

2º Semestre de 2023

DADO	jul	Acumulado no ano
Áudios produzidos	2	2
Carros de som produzidos	1	1
Cartazes produzidos	0	0
Cartilhas produzidos	0	0
E-mails de Marketing produzidos	0	0
Informes do Reassentamento produzidos	3	3
Jornais da Comunidade produzidos	17	17
matérias - Jornal Mural CIA - produzidos	58	58
Mídias Sociais produzidas	0	0
Newsletter produzidos	2	2
Outros itens produzidos	1	1
Panfletos produzidos	0	0
Pílulas de whatsapp produzidos	16	16
Rádios produzidos	25	25
Vídeos produzidos	6	6

Fatos relevantes do mês

Territórios

Alto Rio Doce

Produção de conteúdo para o jornal mural de Barra Longa sobre o Portal da Transparência.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado sobre o encerramento do Circuito da Água.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre os canais de comunicação que existem no território do Alto Rio Doce.

Produção de matéria para a edição 34 do boletim Terra da Gente sobre o Vimver realizado na cidade de Governador Valadares para conhecimento das ações da reparação.

Produção de matéria para a edição 34 do boletim Terra da Gente sobre os programas de rádio que são veiculados nas emissoras do território do Alto.

Baixo Rio Doce

Produção de conteúdo para o jornal mural de Aimorés sobre a vivência do grupo de comunicação no VimVer Mariana

Produção de spot para carro de som convidando a comunidade de Baixo Guandu para reunião comunitária sobre o monitoramento da qualidade da água na cidade.

Produção de vídeo com o resumo das matérias da 13ª edição do boletim do Baixo, Repara Cidadão.

Fatos relevantes do mês

Territórios

Baixo Rio Doce

Produção de conteúdo para o jornal mural de Aimorés sobre o passeio de Chalana no rio Doce em Resplendor.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Baixo Guandu sobre a vivência do grupo de comunicação no VimVer Mariana.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Baixo Guandu sobre o novo horário de funcionamento do CIA da cidade.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Colatina sobre a vivência do grupo de comunicação no VimVer Mariana.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Colatina sobre o novo horário de funcionamento do CIA da cidade.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Resplendor sobre a vivência do grupo de comunicação no VimVer Mariana.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação informando que os CIAs do ES mudaram o horário de atendimento e reforçando os horários e endereços dos quatro CIAs do território.

Produção de matéria para a 13ª edição do boletim do Baixo, Repara Cidadão, sobre a chalana que faz passeios no rio Doce em Resplendor. A matéria é da editoria Pratas da Casa.

Produção de matéria para a 13ª edição do boletim do Baixo, Repara Cidadão, sobre o VimVer, onde o grupo de comunicação do território conheceu as diversas ações da reparação que acontecem em Mariana.

Calha do Rio Doce

Produção de pílula de WhatsApp convidando moradores de Baixa Verde, comunidade de Dionísio, para Oficina de Sensibilização para Projetos, no dia 06/07.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp com informações importantes sobre o Cadastro Integrado realizado pela empresa Synergia.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre o Cadastro Integrado e o atendimento da empresa Synergia.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre o Cadastro Integrado e o atendimento da empresa Synergia.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre o Cadastro Integrado e o atendimento da empresa Synergia.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre o Cadastro Integrado e o atendimento da empresa Synergia.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre o Cadastro Integrado e o atendimento da empresa Synergia.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Resplendor sobre como funciona o cadastro e sobre a empresa Synergia que está realizando o cadastramento nos territórios.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Colatina sobre como funciona o cadastro e sobre a empresa Synergia que está realizando o cadastramento nos territórios.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Baixo Guandu sobre como funciona o cadastro e sobre a empresa Synergia que está realizando o cadastramento nos territórios.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Aimorés sobre como funciona o cadastro e sobre a empresa Synergia que está realizando o cadastramento nos territórios.

Suporte à Economia e Inovação

Publicação de matéria na 13ª edição do boletim Vozes do Território sobre os eventos de Ação de Empreendedorismo e Cidadania em Rio Casca, Santana do Paraíso e Timóteo.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre a disponibilidade de curso profissionalizante de Risco e Corte para moradores de Colatina.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Resplendor sobre vagas de emprego disponíveis na plataforma Recoloca Rio Doce para atuação em Resplendor.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de conteúdo para o jornal mural de Aimorés sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Aimorés sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Baixo Guandu sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Baixo Guandu sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Colatina sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Colatina sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Resplendor sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Resplendor sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre o pagamento de correção monetária no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre o pagamento de danos morais múltiplos no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel).

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre a suspensão do Novel Infraestrutura a partir de 31/07, conforme decisão judicial.

Produção de pílula de WhatsApp informando que a Fundação Renova iniciou, no dia 17/07, o pagamento retroativo de correção monetária para quem recebeu indenização pelo Novel antes de setembro de 2022.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo final para adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) em Aimorés termina no dia 28/07.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo final para adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) em Bugre termina no dia 31/07.

Produção de pílula de WhatsApp informando que o prazo final para adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) em Senhora da Penha, distrito de Fernandes Tourinho, termina no dia 10/08.

Produção de pílula de WhatsApp informando que, conforme decisão judicial, o prazo de pagamento de indenizações do Sistema Indenizatório Simplificado foi alterado de 10 para 15 dias após a homologação dos acordos.

Suporte ao PG006 Pilar de Ouvidoria

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre o atendimento da Ouvidoria via WhatsApp.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre o atendimento da Ouvidoria via WhatsApp.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre o atendimento da Ouvidoria via WhatsApp.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre o atendimento da Ouvidoria via WhatsApp.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre o atendimento da Ouvidoria via WhatsApp.

Publicação de matéria na 12ª edição do boletim Vozes do Território sobre o novo atendimento da Ouvidoria via WhatsApp.

Publicação de matéria na 13ª edição do boletim Vozes do Território sobre o novo atendimento da Ouvidoria via WhatsApp.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o projeto executado pelo instituto Elos de Resistência em Baixo Guandu. As ações fazem parte do programa de Proteção Social.

Produção de matéria para a 13ª edição do boletim do Baixo, Repara Cidadão, sobre as diversas atividades ofertadas para moradores de Baixo Guandu por meio do programa de Proteção Social.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues

Produção da 53a edição do Informe de Bento - versão impressa tablóide.

Produção da 53a edição do Informe de Bento - versão newsletter.

Produção da 53a edição do Informe de Bento - versão vídeo.

Produção de pílula para divulgar o início do funcionamento da UBS de Bento Rodrigues para os moradores do novo distrito.

Produção do vídeo de 1 min de Bento Rodrigues com os principais avanços do processo de reassentamento.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu

Elaboração de pílula com reforço no convite e da rota de transporte das famílias para a Festa Julina de Paracatu, realizada no dia 23 de julho (domingo).

Elaboração de pílula de WhatsApp com o convite para a Festa Julina de Paracatu, realizada no dia 23 de julho (domingo).

Produção do vídeo em 1 minuto com os principais avanços das obras e ações realizadas no mês, com as famílias de Paracatu.

Produção e distribuição da edição 53 do Informe de Paracatu, informativo mensal orientado às famílias do reassentamento Coletivo.

Produção e distribuição do vídeo sobre a edição número 53 do Informe de Paracatu, informativo mensal direcionado para as famílias do reassentamento coletivo.

Produção e divulgação de matéria de rádio sobre a abertura e funcionamento do comércio provisório de Paracatu. O material foi divulgado nas rádios de Mariana e região.

Produção e envelopamento da fachada do comércio provisório de Paracatu. A escolha do layout foi realizada em conjunto do Sr. Romeu Geraldo de Oliveira, responsável pelo estabelecimento.

Produção e envio de newsletter para as famílias de Paracatu com informações sobre as rotas e os horários do transporte coletivo.

Produção e envio de podcast para as famílias de Paracatu com informações sobre a mercearia provisória - Parte 1.

Produção e envio de podcast para as famílias de Paracatu com informações sobre a mercearia provisória - Parte 2.

Suporte ao PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística

Produção de conteúdo para o jornal mural de Barra Longa sobre a realização do Encontro Intermunicipal de Patrimônio.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado sobre a realização do Encontro Intermunicipal de Patrimônio.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o início do Encontro Intermunicipal de Patrimônio em parceria com a Unesco.

Produção de pílula de WhatsApp convidando os moradores de Merengo, distrito de Santa Cruz do Escalvado, para a roda de conversa sobre o Plano de Reparação das Referências Culturais.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação explicando o projeto de Fortalecimento de Organizações Locais (FOL) e convidando para as inscrições.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação reforçando que estão abertas as inscrições para o Edital Doce.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o projeto de Fortalecimento de Organizações Locais (FOL).

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o torneio de pesca que acontecerá em Linhares. Pescadores de todo país podem participar.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para programa da rádio (Momento da Reparação) com um balanço dos projetos apoiados pelo Edital Doce nos municípios do Médio e lembrete para o encerramento das inscrições para a terceira edição.

Produção de nota no programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de pílula de WhatsApp informando que as inscrições para a terceira edição do Edital Doce foram prorrogadas até o dia 21/07.

Produção de pílula de WhatsApp informando que as inscrições para a terceira edição do Edital Doce seguem abertas até o dia 14/07.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o projeto Cumbuca, apoiado pelo Edital Doce, desenvolvido nos municípios de Ipaba e Caratinga.

Publicação de matéria na 13ª edição do boletim Vozes do Território sobre o projeto Olhares - Memorial Rio Doce, apoiado pelo Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação explicando o projeto de Fortalecimento de Organizações Locais (FOL) e convidando para as inscrições.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação reforçando que estão abertas as inscrições para o Edital Doce.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o projeto de Fortalecimento de Organizações Locais (FOL).

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação sobre o torneio de pesca que acontecerá em Linhares. Pescadores de todo país podem participar.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Cachoeira Escura (Belo Oriente) sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Governador Valadares sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Naque sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Pedra Corrida (Periquito) sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de matéria para o Jornal Mural do CIA de Tumiritinga sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de matéria para programa de rádio (Momento da Reparação) com um balanço dos projetos apoiados pelo Edital Doce nos municípios do Médio e lembrete para o encerramento das inscrições para a terceira edição.

Produção de nota no programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o prazo final para inscrições na terceira edição do Edital Doce.

Produção de pílula de WhatsApp informando que as inscrições para a terceira edição do Edital Doce foram prorrogadas até o dia 21/07.

Produção de pílula de WhatsApp informando que as inscrições para a terceira edição do Edital Doce seguem abertas até o dia 14/07.

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre as inscrições do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais (FOL).

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o projeto Cumbuca, apoiado pelo Edital Doce, desenvolvido nos municípios de Ipaba e Caratinga.

Publicação de matéria na 13ª edição do boletim Vozes do Território sobre o projeto Olhares - Memorial Rio Doce, apoiado pelo Edital Doce.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Produção de conteúdo para o jornal mural de Barra Longa sobre a brucelose bovina.

Produção de conteúdo para o jornal mural de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado sobre a brucelose bovina.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação com explicações sobre a prevenção da raiva, doença comum entre os animais.

Produção de conteúdo para o programa de rádio Momento da Reparação divulgando a capacitação sobre qualidade do leite e criação de bezerras em Barra Longa.

Publicação de matéria na 12ª edição do boletim Voz do Rio Doce sobre informações sobre os cuidados para evitar a febre aftosa.

Fatos relevantes do mês

Suporte aos Programas

Suporte ao PG020 Estímulo à Contratação Local

Produção de programa de rádio (Momento da Reparação) sobre o Recoloca Rio Doce e vagas disponíveis na região do Médio.

Indicadores

I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território

Pontos



Gráfico 30: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território

Percentual(%)



Gráfico 31: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território

Pontos



Gráfico 32: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território

Pontos



Gráfico 33: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	73	Caput	Em andamento
Cláusula	74	a	Encerrada
Cláusula	74	b	Encerrada
Cláusula	74	c	Em andamento
Cláusula	74	d	Em andamento
Cláusula	74	e	Encerrada
Cláusula	74	f	Em andamento
Cláusula	74	g	Em andamento
Deliberação	226	2	Em andamento
Deliberação	328	1	Em andamento
Deliberação	328	2	Concluída Internamente
Deliberação	328	3	Em andamento
Deliberação	563	4	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- 26/12/2023 ● Deliberação 328, item 1: Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais. Item 1) A Fundação Renova proceda a coleta e análise de amostras dos animais produtivos recolhidos na CATA-2, para verificação de substâncias
- 29/12/2023 ● Deliberação 563, item 3: A Câmara Técnica deverá reunir-se com a Fundação Renova para discutir e definir o escopo do projeto de diagnóstico

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 1,399 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 162 adoções, 499 devoluções, 203 óbitos, 13 extravios, 31 registros de dados insuficientes de destinação e 491 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;
- Atualmente existem 380 bovinos, 68 equinos, 21 caninos, 18 Suínos, 4 muas sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;
- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1,916 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 1:I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de outono (maio de 2023).

O cronograma 2023 de reporte de resultados deste indicador tem como base o período intermediário de cada estação climática (verão, outono, inverno e primavera), e deverá seguir a seguinte previsão de atualização em relatório:

- Outono de 2023: Relatório de junho de 2023 (ref. maio/23);
- Inverno de 2023: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);
- Primavera de 2023: Relatório de dezembro de 2023 (ref. novembro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

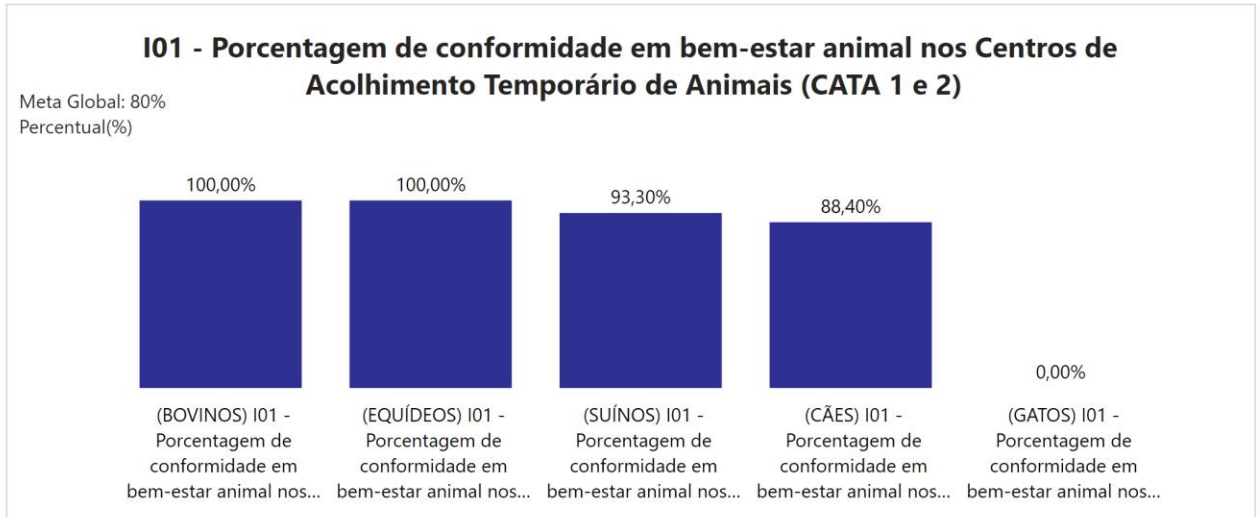


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os desvios apresentados em relação à meta não são significativos do ponto de vista de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas prioritariamente em formato preventivo.

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤ 29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de maio e junho de 2023, não houve ocorrência relacionadas ao indicador de processos adotivos finalizados.

Indicadores

I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de maio e junho de 2023, além das ocorrências relacionadas ao fluxo de rotina de entradas e saídas de animais (nascimentos, recolhimentos, restituições não definitivas, óbitos, extravios e/ou outras ocorrências), ocorreram 17 restituições definitivas de animais de grande porte para famílias que tiveram concluído a reparação do direito à moradia, implicando em atualização do indicador para 15,97%.

Indicadores

I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de maio e junho de 2023, houve ocorrência de restituição definitiva de 2 cães (Prontuários CATA1_050 e CATA1_266), e que estão em processo de acompanhamento pós-restituição conforme previsto na Definição do Programa, e somente comporão os resultados deste indicador após a conclusão desta etapa de monitoramento.

O cronograma 2023 de reporte de resultados para os indicadores I02, I03 e I04 deverá seguir a previsão de atualização em relatório conforme descrito a abaixo:

Bimestre março/abril: Relatório de maio de 2023 (ref. abril/23);

Bimestre maio/junho: Relatório de julho de 2023 (ref. junho/23);

Bimestre julho/agosto: Relatório de setembro de 2023 (ref. agosto/23);

Bimestre setembro/outubro: Relatório de novembro de 2023 (ref. outubro/23).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

Projeto Reconstrução de Vilas

Status Cláusulas e Deliberações

Cláusula	76	Caput	Judicializada
Deliberação	257	1	Concluída Internamente
Deliberação	96	2	Concluída Internamente
Deliberação	96	4	Concluída Internamente

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas do ano de 2023

Esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo dos dados serão reportados.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

185 famílias atendidas (com novos núcleos);

196 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);

18 atendimentos para bens de uso coletivo;

199 atendimentos para casas com novos núcleos;

34 atendimentos para lotes vagos;

2 bens coletivos interrompidos;

10 construções de edificações (casa, comércio e misto) interrompidas com novos núcleos;

4 estruturações de lotes vagos interrompidas.

Pecúnia:

22 termos de aceite - Pecúnia – assinados.

Obras:

30 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas com novos núcleos;

134 edificações (casa, comércio e misto) concluídas com novos núcleos (com TERP);

5 construções de bens coletivos com obras iniciadas;

7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

2 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;

18 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);

125 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;

3 habite se emitido para bens coletivos.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do mês

Finalização de Obra do IDNN123A.

Finalização de Obra do IDCC137A1.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Obras:

0 estruturação de lote vago com obra com assinatura do TRR;

0 bens coletivos com assinatura do TRR;

29 edificações (casa, comércio emisto) com assinatura do TRR.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas do ano de 2023

Esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo dos dados serão reportados.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

69 famílias atendidas (com novos núcleos);

72 atendimentos com termos de opção ao reassentamento assinados (TOR);

14 atendimentos para bens de uso coletivo;

61 atendimentos para Edificações (Casa, Comércio e Misto) com novos núcleos;

3 atendimentos para lotes vagos;

0 bens coletivos interrompidos;

5 construções edificações (casa, comércio e misto) interrompidas com novos núcleos;

1 estruturações de lotes vagos interrompidos;

0 Sítios interrompidos com novos núcleos;

16 Atendimentos para sítios com novos núcleos.

Pecúnia:

10 termos de aceite - Pecúnia – assinados;

Obras:

3 construções de edificações (casa, comércio e misto) com obras iniciadas com novos núcleos;

50 edificações (casa, comércio e misto) concluídas com novos núcleos (com TERP);

6 construções de bens coletivos com obras iniciadas;

7 construções de bens coletivos concluídas (com TERP);

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 2 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 41 habite se para edificações (casas, comércios e mistos) obtidos;
- 1 Sítios com obra iniciada com novos núcleos;
- 7 Sítios com Obras Concluídas com novos núcleos (Com TERP);
- 4 habite se emitidos para bens coletivos.
- 0 sítios com obras concluídas com assinatura do TRR;
- 0 estruturação de lote vago com assinatura do TRR;
- 0 bens coletivos com assinatura do TRR;
- 3 edificações (casa, comércio e misto) com assinatura do TRR.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do mês

Não houve Fatos Relevantes neste mês.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas do ano de 2023

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto de reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

37 famílias atendidas;

31 atendimentos com acordos homologados;

24 edificações adquiridas;

7 pagamentos de acordos (sem aquisição de imóvel);

0 edificações em aquisição;

5 Número de casas com acordo homologados;

15 Número de bens coletivos com acordo homologados.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do mês

Não houve Fatos Relevantes neste mês.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas do ano de 2023

Esse mês não será reportada a timeline referente ao programa, pois as datas estão em atualização. No próximo ciclo dos dados serão reportados.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Social:

- 103 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 3 construções casa nova e reforma interrompidas;
- 2 estruturações de lotes vagos interrompidas;
- 95 imóveis adquiridos;
- 13 famílias atendidas na modalidade reconstrução.

Pecúnia:

- 138 termos de aceite - Pecúnia – assinados (Pecúnia Geral e Pecúnia Novos Núcleos).

Obras:

- 0 reconstruções de edificações com obras iniciadas;
- 0 reconstruções de edificações com obras interrompidas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 15 reconstruções de edificações com obras concluídas com repasse de verba (autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma);
- 16 atendimentos na modalidade reconstrução;
- 13 edificações (casa nova e reforma) com obras iniciadas;
- 32 edificações (casa nova e reforma) com obras concluídas com novos núcleos (com TERP);
- 0 estruturações de lotes vagos com obras iniciadas;
- 3 estruturações de lotes vagos com obras concluídas (com TERP);
- 26 habite se para edificações (casa nova e reforma) obtidos;
- 3 estruturação de lote vago com obra com assinatura do TRR;
- 26 edificações casa nova e reforma com assinatura do TRR.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do projeto

Repasse de verba:

38 Reconstrução: Repasse de Verba (Autogestão, APRO30 e Repasse para Reforma) .

Moradia Temporaria:

252 atendimentos temporários disponibilizados (compensação financeira, aluguel e hotel) .

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do mês

Não houve Fatos Relevantes neste mês.

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água

Objetivo


Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente



Timeline de Entregas do Programa

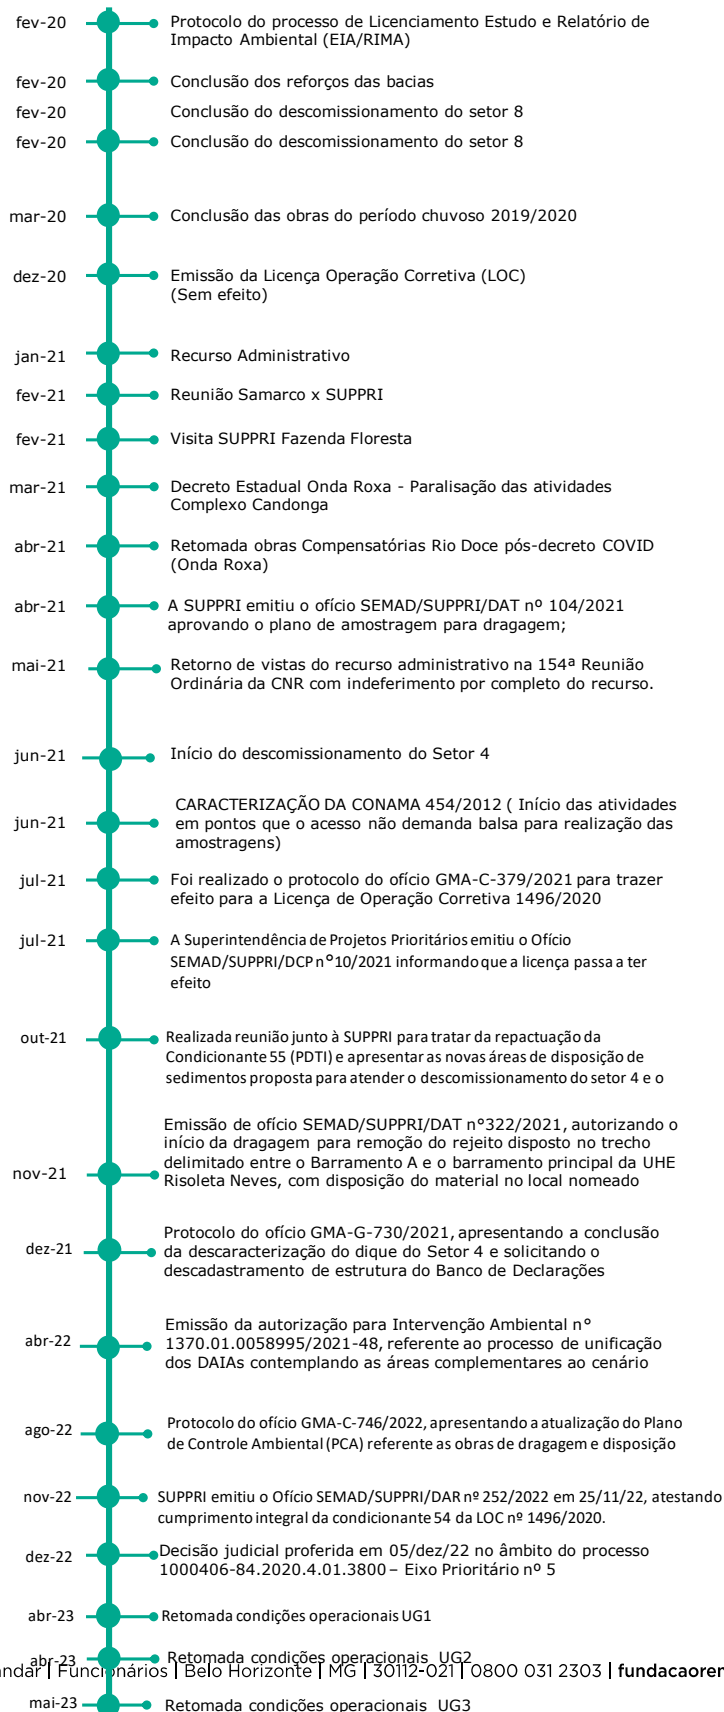

Progressos do Mês

Grandes números

- **1ª fase** – período emergencial 959 mil m³ de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.
- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

Até a data de 25/12/2022:

- O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m³**.
- Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

FATOS RELEVANTES DO MÊS

- **Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)**
- Descaracterização das estruturas de disposição temporária

ASS4:

Vol. Previsto	Vol. Executado	Saldo
34.077 m ³	30.611,6 m ³	3.465,4 m ³
100%	89,83%	10,17%

Tabela 1 – Evolução descaracterização ASS4



Figura 1 – Em andamento descaracterização das estruturas ASS4

ADME-2:

Vol. Previsto	Vol. Executado	Saldo
70.442 m ³	60.090,2 m ³	10.331,8 m ³
100%	85,33%	14,67%

Tabela 2 – Evolução descaracterização ADME-2



Figura 2 - Em andamento descaracterização das estruturas ADME-2

• Disposição de sedimentos na Bacia 1 (Status:23/07)

Vol. Previsto	Vol. Executado	Saldo
56.928 m ³	42.848 m ³	14.080 m ³
100%	75,27%	24,73%

Tabela 3 – Evolução Disposição na Bacia 1



- Disposição de sedimentos em bacias (Status:25/06)

Previsto total	56.928,00 m ³
Realizado	37.790,70 m ³
Saldo	19.137,30 m ³

Tabela 3 – Evolução Disposição em bacias



Figura 4 - Disposição de sedimentos bacia 1

- Empilhamento de sedimentos (Status: 25/06)

Previsto total	70.356,00 m ³
Realizado	62.525,62m ³
Saldo	7.830,38m³

Tabela 4 – Evolução Disposição em pilhas



Figura 5 - Contrapilhamento O.E Dique Principal

- Sistema de drenagem estruturas setor 11



➤ **MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS**

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

✓ **Destaques:**

- Os levantamentos batimétricos dos barramentos metálicos permaneceram sem evolução.
- O monitoramento dos piezômetros e medidores de nível d'água do Setor 11 não apresentou variações significativas no período.
- Não houve pontos de destaque no monitoramento dos deslocamentos.
- As obras de estabilização da Pedreira Corsini estão em andamento. Parte da instrumentação foi descomissionada devido à retirada do aterro.
- Não foram observadas novas anomalias geotécnicas nas estruturas de Candonga no período.

➤ **MONITORAMENTO AMBIENTAL**

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não adere completamente ao mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 2**

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ **Monitoramento de Efluentes – Bacia 1**

- Entrada: Ponto seco haja vista que não houve bombeamento da bacia 2 para a bacia 1.
- Saída: Ponto seco haja vista que não houve bombeamento da bacia 1 para o Rio Doce.

Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)

Conforme mencionado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).
- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.
- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
 - Desvios de Manganês e Ferro Dissolvido no ponto de montante e Turbidez no ponto de jusante. O manganês e o ferro se configuram como background da região.
 - Síntese conclusiva – Córrego dos Borges
 - Sem desvios para o período.
 - Síntese conclusiva – Rio de Peixe
 - Sem desvios para o período.
 - Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo
 - Desvios de manganês e ferro dissolvido. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.
- ✓ **Monitoramento Atmosférico**
- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente.

✓ **Monitoramento Subterrâneo**



Figura 6 - Locação Nascente 2



Figura 7 - Nascente 2

Conclusões / considerações finais

- A Nascente 2 apresentou desvios Ferro e Manganês no período no monitoramento.

Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ **Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento**

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04); dois poços de monitoramento na Fazenda Floresta (FLOR-PM-PROP-04 e LOR-PM-PROP-05) e um poço na pedreira Corsini (CORS-PM-PROP-01). Em fevereiro foram iniciadas as atividades de desenvolvimento dos poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. Em abril/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento dos poços FER-PM-PROP-01 e FER-PM-PROP-02. Em maio/23 houve a conclusão das atividades de desenvolvimento do FER-PM-PROP-03, e em junho FER-PM-PROP-04 e CORS-PM-PROP-01. O poço FLOR-PM-PROP-07 foi perfurado, instalado e desenvolvido e o poço FLOR-PM-PROP-06 perfurado, instalado e está em fase de desenvolvido.

✓ **Monitoramento de Ruídos e Vibração**

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondó, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado). Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

Indicadores

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

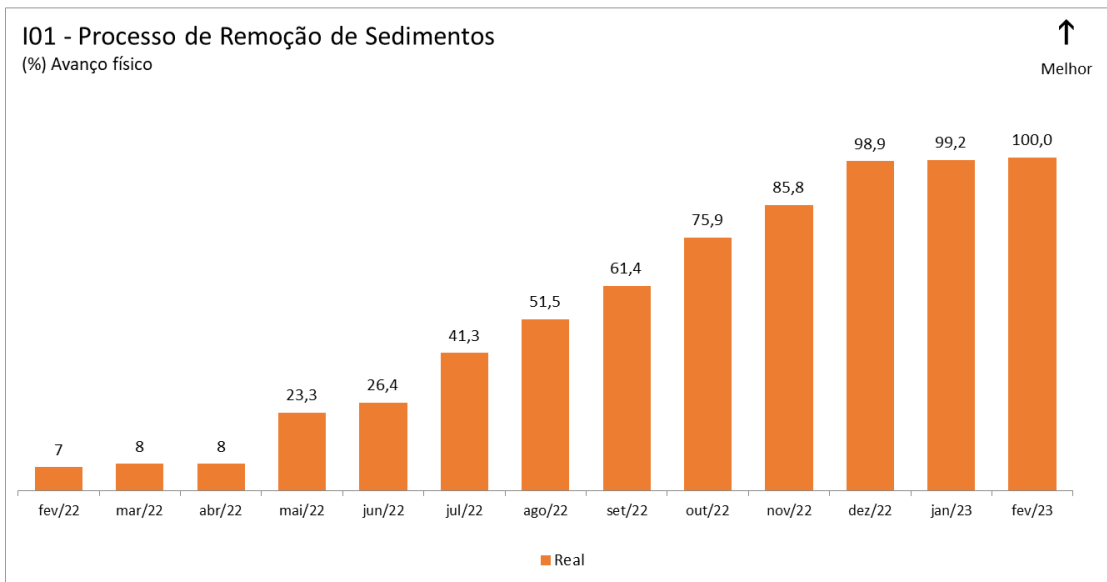


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.

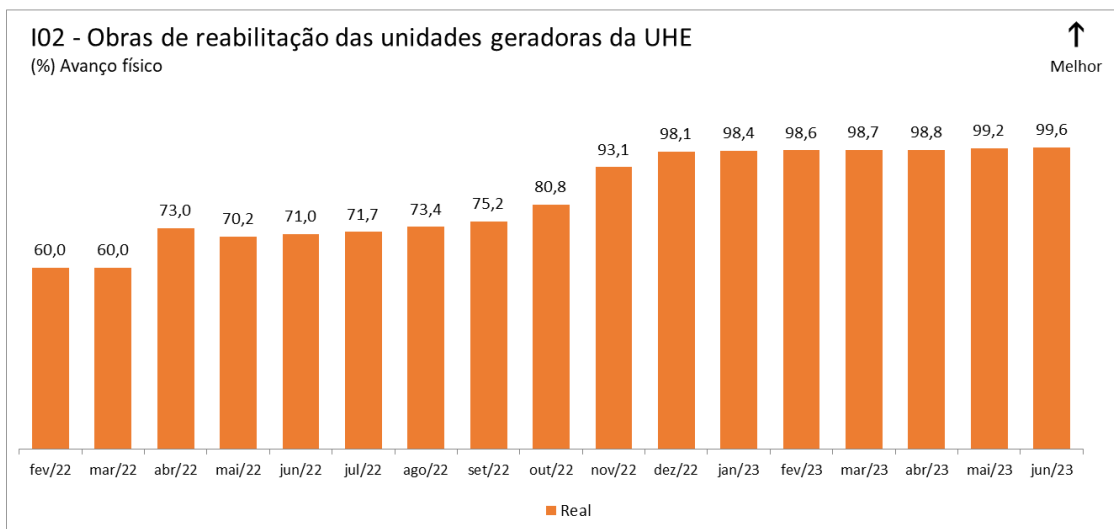


Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

Indicadores

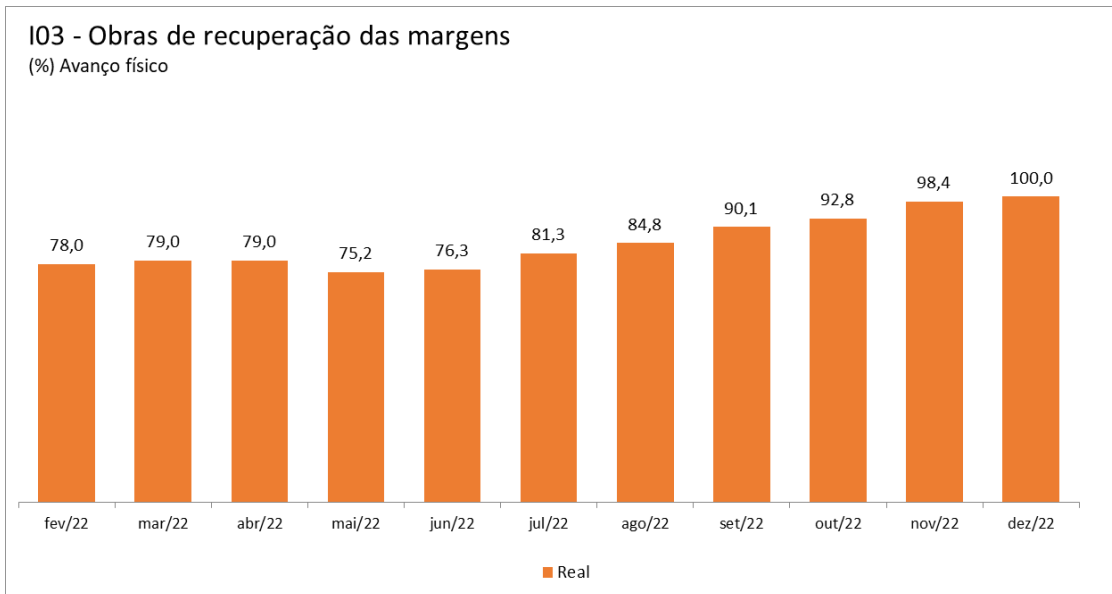


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

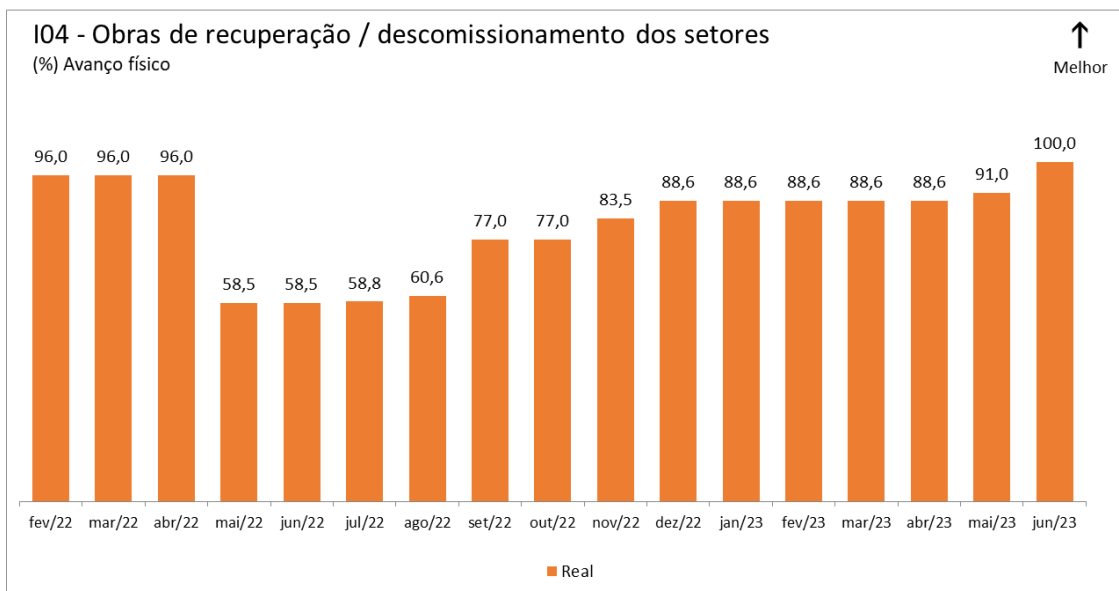


Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autorizou prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo







Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	82	§2º	Judicializada
Cláusula	82	§3º	Judicializada
Cláusula	82	Caput	Judicializada
Cláusula	84	a	Em andamento
Cláusula	84	b	Em andamento
Cláusula	84	c	Em andamento
Cláusula	84	d	Em andamento
Cláusula	84	e	Em andamento
Cláusula	84	f	Em andamento
Cláusula	84	g	Em andamento
Cláusula	84	h	Em andamento
Cláusula	84	i	Em andamento
Cláusula	84	j	Em andamento
Cláusula	84	k	Em andamento
Cláusula	84	l	Em andamento
Cláusula	84	m	Judicializada
Cláusula	84	n	Em andamento
Cláusula	84	o	Em andamento
Cláusula	84	p	Em andamento
Cláusula	84	q	Em andamento
Cláusula	84	r	Em andamento
Cláusula	84	s	Em andamento
Cláusula	87	Caput	Em andamento
Cláusula	88	Caput	Judicializada

Deliberação	127	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	127	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	190	1	Concluída Internamente
Deliberação	190	2	Judicializada
Deliberação	191	1	Concluída Internamente
Deliberação	207	1	Judicializada
Deliberação	207	2	Judicializada
Deliberação	217	2	Em andamento
Deliberação	217	3	Em andamento
Deliberação	217	4	Concluída Internamente
Deliberação	23	2	Em andamento
Deliberação	24	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Ponte e Passarela Santa Rita)
- março de 2023  Reconstrução de Pontes - Entrega da Obra (Nova Ponte Bento Rodrigues)
- maio de 2023  Reconstrução de Estruturas de Apoio - Entrega da Obra (Curral)
- julho de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes (Barra Longa)
- julho de 2023  PF0153 - Conclusão da Reconstrução de Pontes em Mariana e Barra Longa
- julho de 2023  Reconstrução de Campos de Futebol - Entrega da Obra (Campo de Futebol Ponte do Gama)

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes Números do Programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.900,00 obras concluídas (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 1.091,00 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamento que totalizam: 2.631 Km de manutenções realizadas, 142,20 Km de acessos recuperados e 222 Km de cercamentos de propriedades rurais executadas;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Termos de entrega para Morádias e Comércio:

Morádias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do mês

Assinatura do termo de entrega dos Bens Públicos de Ponte do Gama;

Entrega de mobiliário, projetos impressos e manual dos Bens Públicos de Ponte do Gama;

Início da mobilização das obras de execução de Bueiro em Barretos, Drenagens RCC / ADME na Fazenda Vista Alegre, Drenagem Ponte do Gama e Gabião em Acaiaca;

Manutenção em 81,10 km de vias não pavimentada.

Indicadores

I1 – % Obras concluídas de impacto direto

Meta Global: 100%
Percentual(%)

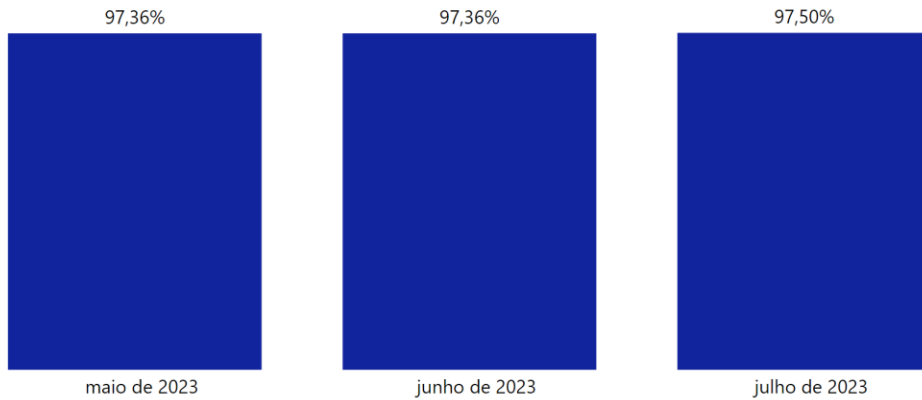


Gráfico 1: I1 – % Obras concluídas de impacto direto - Frequência Mensal

I2 – % Obras concluídas de impacto indireto

Meta Global: 100%
Percentual(%)

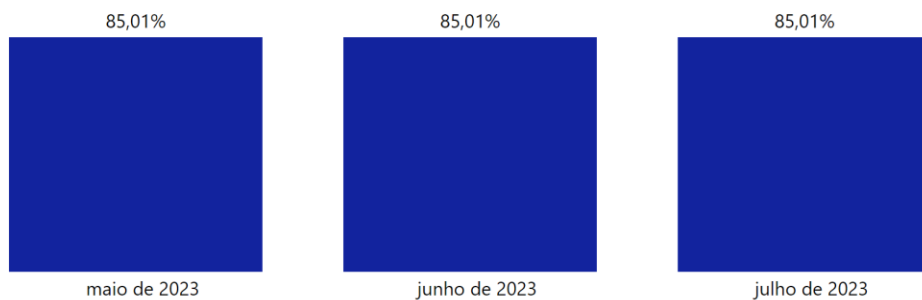


Gráfico 2: I2 – % Obras concluídas de impacto indireto - Frequência Mensal

Indicadores

I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)

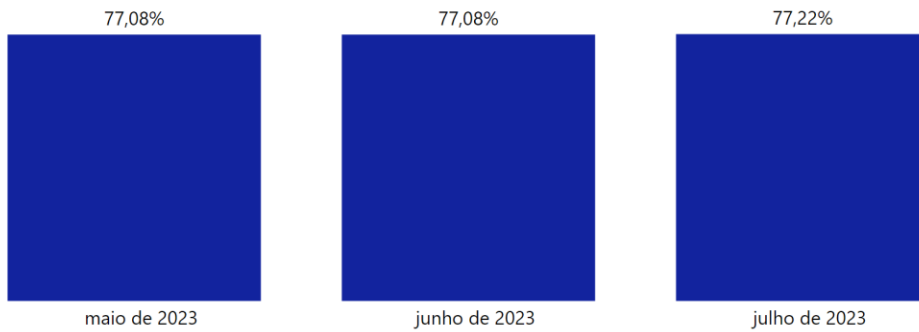


Gráfico 3: I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - Frequência Mensal

I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - Frequência Mensal

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	89	Caput	Em andamento
Cláusula	91	Caput	Em andamento
Cláusula	92	Caput	Em andamento
Cláusula	93	Caput	Em andamento
Deliberação	183	2	Concluída Internamente
Deliberação	183	3	Concluída Internamente
Deliberação	238	1	Concluída Internamente
Deliberação	390	3	Concluída Internamente
Deliberação	508	2	Em andamento
Deliberação	587	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
- dezembro de 2023 ● Conclusão do ciclo 3 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
- dezembro de 2023 ● Conclusão do Transporte Escolar para os alunos da Escola Temporária de Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2023)
- dezembro de 2023 ● Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte,cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2023)
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção predial - Escola Temporária Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Finalização da operação da Escola Temporária de Paracatu de Baixo/MG
- dezembro de 2023 ● Finalização da reposição de materiais e equipamentos - Escola Temporária Paracatu de Baixo
- dezembro de 2023 ● Fornecimento do Transporte Escolar para os alunos da Escola de Bento Rodrigues em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Entre os dias 17 e 28 de julho, foi realizado o Curso de Férias para as crianças de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e Barra Longa, esta iniciativa feita em conjunto com o PG12, onde foram ofertadas diariamente oficinas de artesanato, artes, jogos, culinária e brincadeiras para 120 crianças que estavam do período de férias.

No dia 31 de julho, ocorreu a transição da escola temporária para a escola definitiva do Reassentamento Coletivo de Bento Rodrigues. Neste evento foram beneficiados pela ação em torno de 170 pessoas entre alunos, professores e outros profissionais. O início do funcionamento da escola definitiva de Bento Rodrigues encerra a obrigação legal do PG11 de manter um imóvel temporária para a manutenção da adequada rotina escolar da comunidade envolvida. A escola temporária de Bento Rodrigues durante oito anos foi de fundamental importância, uma vez que garantiu um espaço de convivência, sociabilidade e encontro, bem como minimizou as dificuldades de adaptação das crianças na sede de Mariana. Além disso, o PG11 foi responsável por um Plano de Transição bem-sucedido que visou promover a apropriação dos alunos, professores e comunidade escolar, de forma gradativa, ao novo espaço escolar no Reassentamento.

Indicadores

I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa

Meta Global: 100%
Percentual(%)

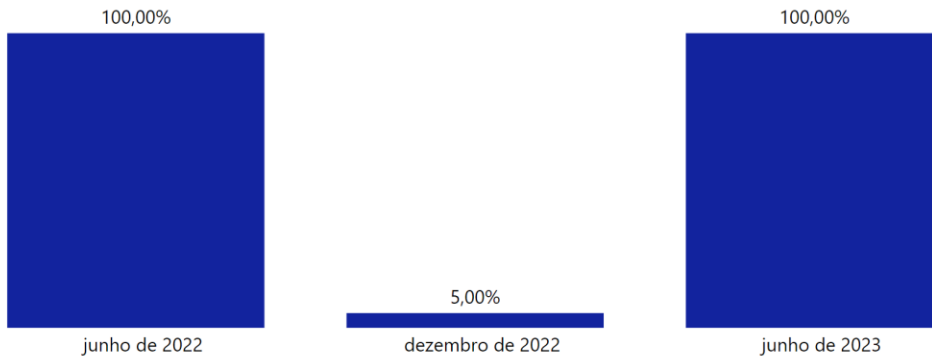


Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias

Meta Global: 100%
Percentual(%)

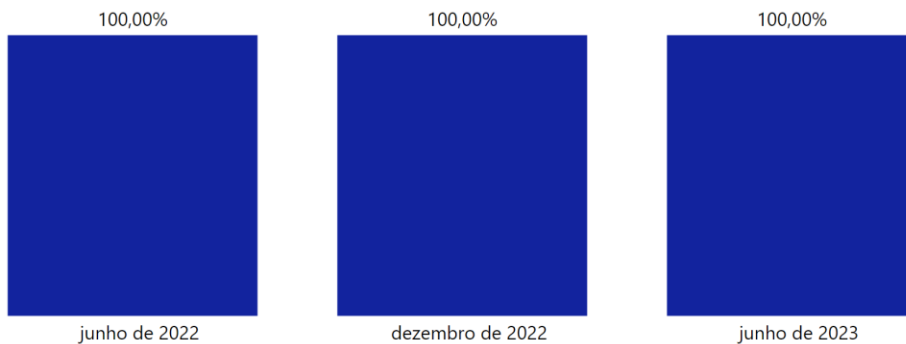


Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

Indicadores

I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas

Meta Global: 75

Pontos

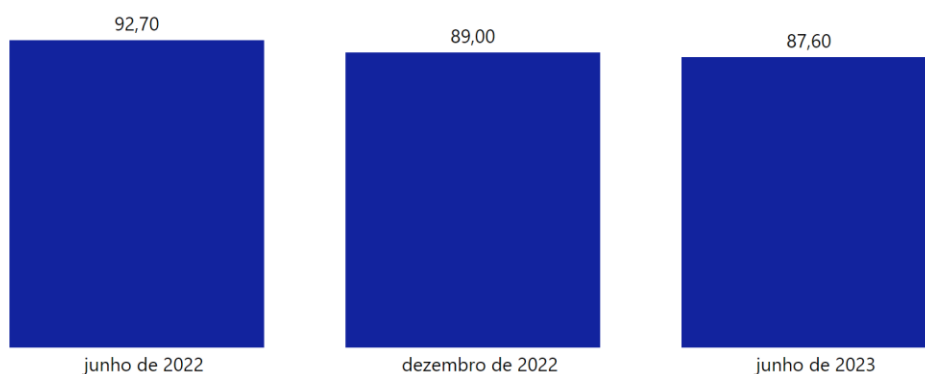


Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

Indicadores

I07 - Atendimento ao público alvo

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

Indicador I07 nunca medido por ser redundante com o I05, retirado da definição do PG conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023.

I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

Indicador concluído conforme aprovação do CIF, deliberação 674/2023.

Indicadores

I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional

Meta Global: 100%

Percentual(%)




Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	95	Caput	Em andamento
Cláusula	96	Caput	Em andamento
Cláusula	97	Caput	Em andamento
Cláusula	98	a	Em andamento
Cláusula	98	b	Em andamento
Cláusula	98	c	Em andamento
Cláusula	98	d	Em andamento
Cláusula	99	Caput	Em andamento
Deliberação	349	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	2	Concluída Internamente
Deliberação	547	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão das atividades do Calendário 2023 das ações do Projeto Escola Aberta (Ações de Educação Patrimonial, Formação Artística, Esporte e Lazer)
- dezembro de 2023 ● Apoio aos projetos do Edital Doce- Modalidade 3 para 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão da implementação de Centros de Memória nas comunidades
- dezembro de 2023 ● Realização da Exposição Virtual

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Realização do “Encontros de Patrimônio | Ativando Conexões: Patrimônio Cultural e Territórios Educativos” em Santa Cruz do Escalvado (MG) e Rio Doce (MG).

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF nº 547, de 22 de outubro de 2021).

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo






Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.




Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	102	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	103	Caput	Em andamento
Cláusula	104	a	Em andamento
Cláusula	104	b	Concluída Internamente
Cláusula	104	c	Em andamento
Cláusula	104	d	Em andamento
Cláusula	104	e	Em andamento
Cláusula	104	f	Em andamento
Cláusula	104	g	Em andamento
Deliberação	239	1c	Concluída Internamente
Deliberação	239	5	Concluída Internamente
Deliberação	287	3	Concluída Internamente
Deliberação	287	4	Concluída Internamente
Deliberação	321	2	Em andamento
Deliberação	321	3	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	377	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	5	Concluída Internamente
Deliberação	454	2	Concluída Internamente
Deliberação	454	3	Concluída Internamente
Deliberação	462	3	Concluída Internamente
Deliberação	652	2	Em andamento
Deliberação	652	3	Em andamento
Deliberação	652	4	Em andamento
Deliberação	652	5	Em andamento
Deliberação	653	1	Em andamento

Deliberação	239	1a	Concluída Internamente
Deliberação	239	1b	Concluída Internamente
Deliberação	239	3	Concluída Internamente
Deliberação	239	4	Concluída Internamente
Deliberação	377	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	653	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- June de 2023  Lançamento do Edital Doce 3ª Edição
- December de 2023  Conclusão do projeto de Incentivo à Leitura
- December de 2023  Conclusão das missões e formações para o ano de 2023
- December de 2023  Realização da 2ª edição do Torneio de Pesca Esportiva em MG e ES
- December de 2023  Realizar etapa de capacitação da 2ª edição em MG e ES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Trata-se de uma ação do Projeto Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora – MG e ES, que busca realizar ações de recuperação da Pesca Esportiva, na bacia do Rio Doce, atrelado ao turismo de pesca na região do Rio Doce como forma de recuperação de imagem, geração de renda, atividades econômicas alternativas, desenvolvimento local e valorização do patrimônio imaterial em Atendimento às Cláusulas 103 h), 104 f) e 104 g) do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Indicadores

I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual

I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual

Indicadores

I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

Indicadores

I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.*

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).


A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações



Cláusula	106	Caput	Em andamento
Cláusula	107	Caput	Judicializada
Cláusula	108	Caput	Em andamento
Cláusula	111	Caput	Judicializada
Deliberação	386	3	Concluída Internamente
Deliberação	416	3	Judicializada
Deliberação	416	4	Judicializada
Deliberação	435	1	Judicializada
Deliberação	436	1	Judicializada
Deliberação	452	2	Judicializada
Deliberação	487	7	Judicializada
Deliberação	492	1a, 1b,1c	Judicializada
Deliberação	504	2	Judicializada
Deliberação	504	3	Judicializada
Deliberação	504	4	Judicializada
Deliberação	598	1	Judicializada
Deliberação	599	1	Judicializada
Deliberação	611	3	Em andamento
Deliberação	611	4	Concluída Internamente
Deliberação	620	2	Judicializada
Deliberação	621	1	Judicializada
Deliberação	622	1	Judicializada
Deliberação	624	1	Judicializada
Deliberação	73	1	Em andamento

Deliberação	106	3	Concluída Internamente
Deliberação	130	4	Concluída Internamente
Deliberação	189	1	Concluída Internamente
Deliberação	189	2	Concluída Internamente
Deliberação	197	1 e 2	Concluída Internamente
Deliberação	219	4	Concluída Internamente
Deliberação	220	2	Concluída Internamente
Deliberação	220	3	Concluída Internamente
Deliberação	252	2	Concluída Internamente
Deliberação	264	4	Concluída Internamente
Deliberação	266	2	Concluída Internamente
Deliberação	434	1	Judicializada
Deliberação	650	1, 2	Judicializada

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023  Acompanhamento do plano de Mariana – 5º Repasse financeiro para contratação de RH

*Postergação dos repasses de abril, julho e outubro de 2023 para o ano de 2024 devido a ausência de prestação de contas pelo município de Mariana. A prestação de contas está prevista no acordo judicial.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa *

- 34 profissionais (entre médicos, enfermeiros , assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram no município de Mariana/MG .

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Fatos relevantes do mês

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

- Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.
- CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.
- UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Indicadores

O escopo do programa encontra-se judicializado.

PG015 Promoção da Inovação

Eixo pessoas e Comunidades

Objetivos

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	113	Caput	Em andamento
Cláusula	114	a	Em andamento
Cláusula	114	b	Em andamento
Deliberação	100	1	Concluída Internamente
Deliberação	126	2	Concluída Internamente
Deliberação	126	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	31	a	Concluída Internamente
Deliberação	338	4	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- outubro de 2023 ● Finalização da Aplicação da Metodologia e Validação - TRL
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação GV
- dezembro de 2023 ● Encerramento da Execução - Hub de Inovação Linhares

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Indicadores

I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa

Meta Global: 40
Número



Gráfico 1: I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas

Meta Global: 220
Número




Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Recálculo do indicador I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas. DE: de 99 bolsas fornecidas - PARA: 97 bolsas. Retifica-se o valor reportado pela Fundação Renova no Relatório Mensal de Atividades nos meses anteriores

Indicadores

I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas

Meta Global: 30%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas - Frequência Bianaual

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo pessoas e Comunidades


Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	116	Caput	Em andamento
Cláusula	117	Caput	Em andamento
Cláusula	118	Caput	Em andamento
Cláusula	119	Caput	Em andamento
Cláusula	122	Caput	Judicializada
Cláusula	123	Caput	Em andamento
Deliberação	121	2	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	480	4	Concluída Internamente
Deliberação	480	5	Concluída Internamente
Deliberação	542	1	Concluída Internamente
Deliberação	542	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	542	2	Concluída Internamente
Deliberação	654	3	Em andamento
Deliberação	655	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023



março de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VIII
maio de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Annual II
junho de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IX
setembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral X
outubro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral IV
dezembro de 2023	●	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral XI

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

▪ Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades

- **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
- **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.

▪ Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro

- **16,97 Mil** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
- **9** informes trimestrais, **3** semestrais e **2** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

▪ Projeto Cultivando para Pescar:

- **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
- **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
- **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
- **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

▪ Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

- o **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
- o **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
- o **4** associações beneficiadas:
 - 30** ASPERDOCE (Rio Doce)
 - 77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
 - 38** APIGUA (Guaxe)
 - 52** APAP (Povoação);
- o **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
- o **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
- o **4** Planos de negócio entregues.

▪ Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado

- o **3090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
- o **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
- o **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Grandes números do programa

▪ Projetos da Foz

o **96** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

▪ Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

o **1º** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **2** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

o **69** Total número de pescadores profissionais qualificados acumulado.

o Capacitação de **316** pescadores beneficiados pelo curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva sendo:

Localidade	Número de turmas capacitadas	Total de participantes capacitados
Colônia de Pescadores Z-12 – Baixo Guandu – ES	2	30
Comunidade Cachoeira Escura – Belo Oriente – MG	1	16
Comunidade do Guaxe – Linhares – ES	1	10
Comunidade Regência – Linhares – ES	1	12
Distrito de Pedra Corrida – Periquito – MG	2	17
Município de Aimorés – MG	6	69
Município de Aracruz - ES	1	12
Município de Bom Jesus do Galho - MG	1	12
Município de Conselheiro Pena – MG	1	15
Município de Governador Valadares – MG	2	29
Município de Ipatinga - MG	1	11
Município de Itueta – MG	1	38
Município de Plautino Soares - MG	1	16
Município de Povoação - ES	1	14
Município de Resplendor – MG	1	12
Município de Timóteo - MG	1	13
Município de Tumiritinga – MG	1	14
Total número de pescadores profissionais		69

Fatos relevantes do mês

Entrega dos Sistemas de Aquaponia de Areal e Povoação do Projeto Cultivando para Pescar.

Início das oficinas de sensibilização e assessoria aos grupos produtivos.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água




Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	125	a	Judicializada
Cláusula	125	b	Judicializada
Cláusula	125	c	Judicializada
Cláusula	125	d	Judicializada
Cláusula	125	e	Em andamento
Cláusula	125	f	Em andamento
Cláusula	125	g	Judicializada
Cláusula	125	h	Judicializada
Cláusula	125	i	Em andamento
Cláusula	125	j	Judicializada
Deliberação	145	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	263	2	Concluída Internamente
Deliberação	263	3	Concluída Internamente
Deliberação	341	1	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	354	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Conclusão das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Lotes 3 - Tumiritinga (1º Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I e Águas da Prata II), Periquito (Liberdade)
- junho de 2023  Término dos contratos de aluguel de pastagem
- dezembro de 2023  Conclusão da implantação das atividades de Reestruturação Produtivas nas propriedades de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

Alto Rio Doce

- 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 197 devolutivas foram realizadas. Até o presente momento, 163 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;
- 52.887,1 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 0,0 toneladas no mês;
- 26.030,3 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 139,0 propriedades;
- 461,0 barraginhas realizadas;
- 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;
- 238,0 nascentes cercadas e 58,0 nascentes com plantio florestal realizado;
- 2.887,3 hectares de reestruturação produtiva executados.
- Elaborados e implantados os projetados de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

- 8.492 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 15.440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 - Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/ MG (Liberdade);
- 79.317,3 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 1.938,9 toneladas no mês;

Baixo Rio Doce

- 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (A) no Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 - Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);
- 8.786,2 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactado, sendo 222,5 toneladas no mês;

Parcerias

- 59 capacitação técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG;
- 30 capacitação técnicas online realizadas pela EMATER - MG;
- 21,0 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16,0 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com o World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e 5,0 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do mês

Médio Rio Doce

Conclusão das operações de reparação de 33 propriedades a Jusante da Candonga.

Barra Longa

Inauguração do parque de exposições de Barra Longa com atividades de ATER coletiva.

Indicadores

I01 – Taxa de reposição de alimentação animal

Percentual(%)

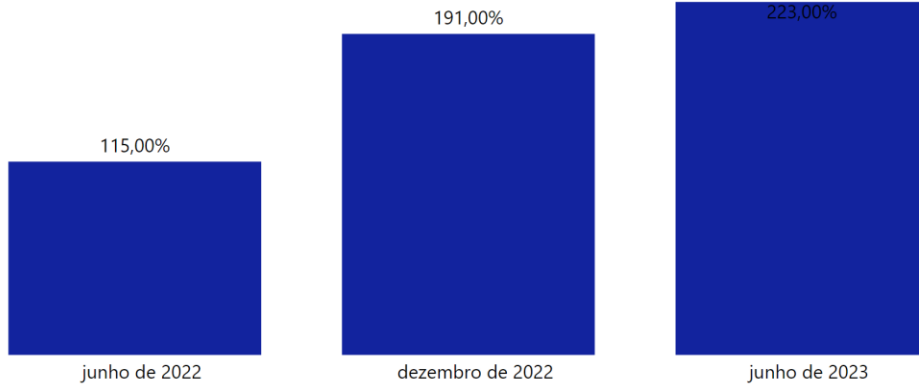


Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas

Meta Global: 100%

Percentual(%)

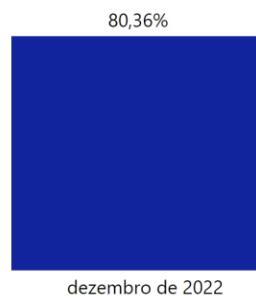


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Percentual(%)

1,00%
abril de 2022

Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área

Meta Global: 100%

Percentual(%)

0,42%
dezembro de 2022

Gráfico 4: I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área - Frequência Anual

Indicadores

I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados - Frequência Anual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo pessoas e Comunidades


Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	129	Caput	Em andamento
Cláusula	130	a	Em andamento
Cláusula	130	b	Em andamento
Cláusula	130	c	Concluída Internamente
Cláusula	130	d	Em andamento
Cláusula	130	e	Em andamento
Cláusula	130	f	Em andamento
Deliberação	109	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	163	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	2	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente
Deliberação	589	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023



fevereiro de 2023	●	Entrega da Casa do Empreendedor para a Prefeitura de Mariana
abril de 2023	●	Inauguração do Banco Comunitário em Povoação- Linhares ES
maio de 2023	●	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Cachoeira Escura - Belo Oriente MG
junho de 2023	●	Inauguração do Banco Comunitário em Regência - Linhares ES
julho de 2023	●	Conclusão do Projeto da Cadeia da Meliponicultura
agosto de 2023	●	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Itueta MG
outubro de 2023	●	Conclusão do projeto agroecológico em assentamentos na bacia do Rio Doce - ES
dezembro de 2023	●	Conclusão do Projeto da Cadeia do cacau ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- R\$ 103,60 milhões emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.
- Em Minas Gerais, R\$ 80,71 milhões foram desembolsados para 1.995,00 contratos e 1.454,00 empresas.
- Em Espírito Santo, R\$ 22,89 milhões foram desembolsados para 586,00 contratos e 535,00 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- R\$ 55,00 milhões em linhas de crédito

Fundo Compete Rio Doce

- Em Minas Gerais, R\$ 7,20 milhões foram desembolsados para 225,00 contratos e 127,00 empresas.

Fatos relevantes do mês

Microcrédito - Bancos Comunitários: foi concedido até Julho/2023, R\$ 483.060,00 em crédito, por meio de 127 operações.

Fundo Diversifica Mariana: liberação de 25 MM da linha financiamento para 124 empresas de Mariana.

Indicadores

I01 – Promoção de ações de desenvolvimento

Meta Global: 100%
Percentual(%)

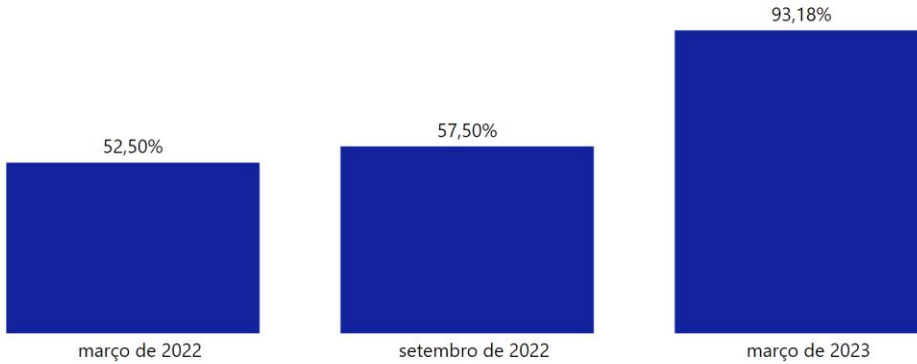


Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito

Meta Global: 7500
Contratos

7500




Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios

Meta Global: 90%
Percentual(%)

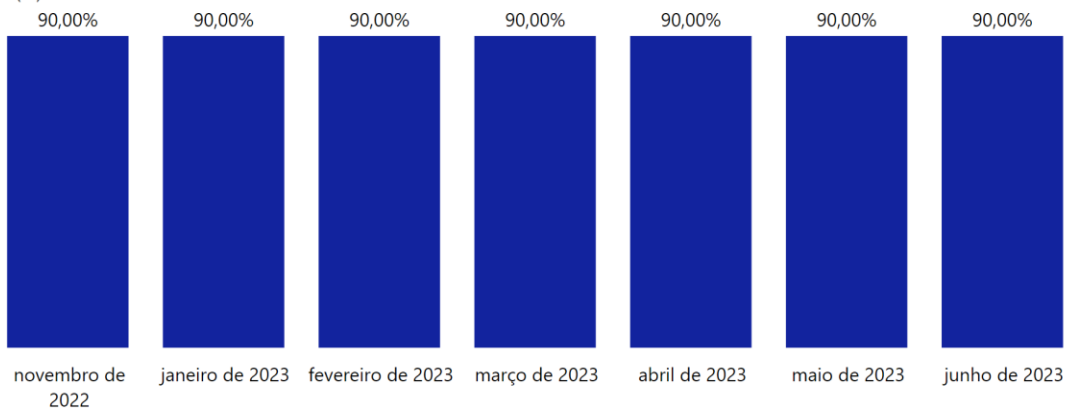


Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

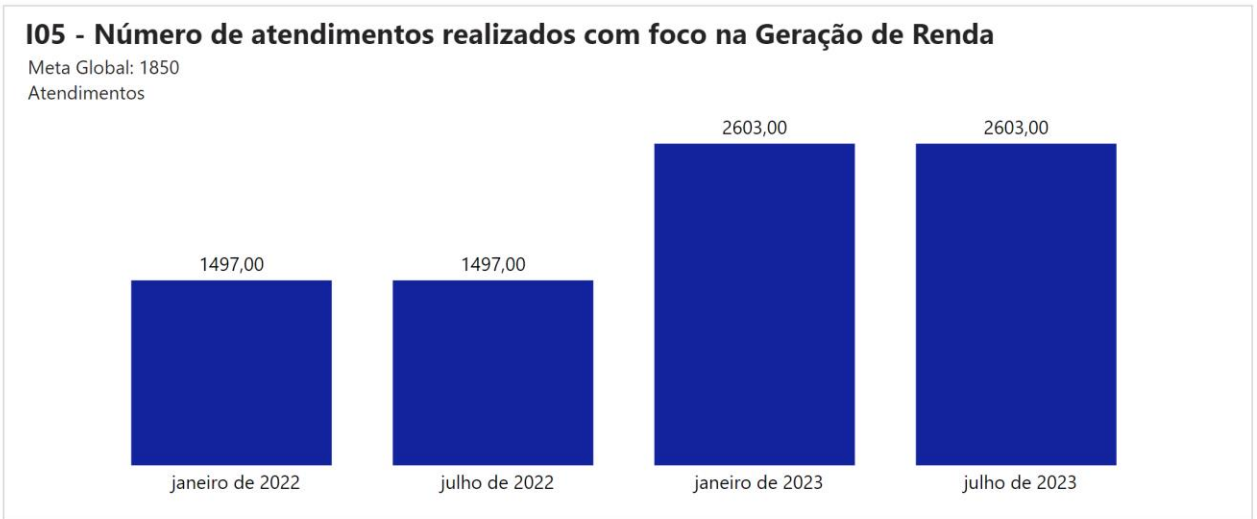


Gráfico 5: I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

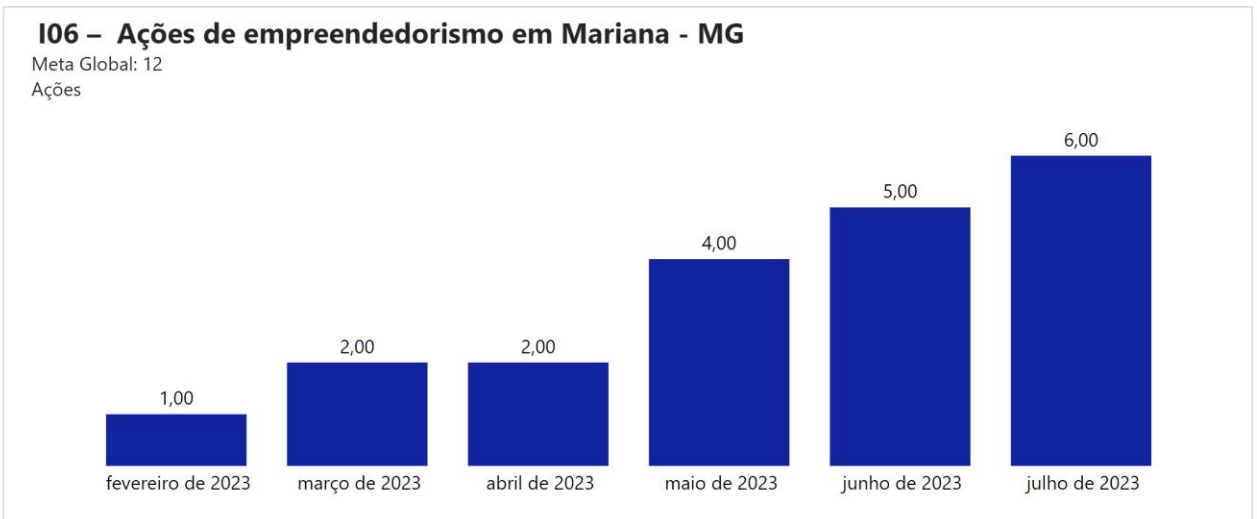


Gráfico 6: I06 - Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Frequência Mensal

Indicadores

I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18

Meta Global: 7650

Atendimentos

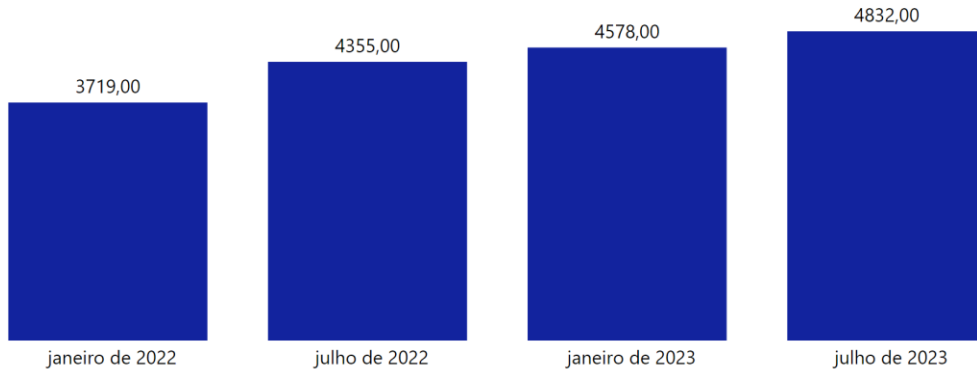


Gráfico 7: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidade






Objetivo




Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	132	Caput	Em andamento
Cláusula	133	Caput	Em andamento
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	342	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- maio de 2023  Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos
- junho de 2023  Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce
- agosto de 2023  Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios.
- agosto de 2023  Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios atingidos
- setembro de 2023  Lançamento da coleção de produtos do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação/ES

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

1379 atendimentos realizados a 507 micro e pequenos negócios, por meio de 941 ações de assessoramento e planejamento de negócios, 17 locações de espaços comerciais, 401 reposições de insumos e equipamentos e 20 reformas e/ou adequação de infraestrutura.

Fatos relevantes do mês

58 cessações de atendimentos (acumulado janeiro/23 a julho/23).

Indicadores

I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidade


Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	134	Caput	Em andamento
Cláusula	135	a	Em andamento
Cláusula	135	b	Em andamento
Cláusula	136	Caput	Em andamento
Deliberação	146	1	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	352	5	Concluída Internamente
Deliberação	84	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- 
- junho de 2023 ● Finalização do 1º Mapeamento do Perfil Profissional de Mariana
 - junho de 2023 ● Finalização do 2º Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores
 - setembro de 2023 ● Conclusão do Recoloca Rio Doce (marco CIF- Planejamento 2023)
 - novembro de 2023 ● Conclusão das turmas do Projeto +Gestão MG e ES 2023
 - dezembro de 2023 ● Finalização da Qualificação Profissional 2023
 - dezembro de 2023 ● Finalização do Eixo-Projeto Qualificação Profissional

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 338 **turmas, abertas** 9.908 **vagas**, 8.974 **pessoas matriculadas**, 6.312 **concluintes**, 652 **reprovadas** e 1.697 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.
- **R\$** 3.824.580 de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:

Conclusão de 03 das turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI MG, com 44 concluintes nos cursos de Eletricista Industrial, Serralheria de Materiais Ferrosos e Confeitaria. Início de 05 turmas de qualificação profissional em parceria com o SENAI MG e ES, 136 com pessoas matriculadas nos cursos de Risco e Corte, Elétrica Predial, Mecânica e Manutenção Industrial, Gestão de Resíduos Sólidos, Operador de supermercado, com ênfase em operação de caixa."

Monitoramento de Contratações Locais:

Fomento e monitoramento da contratação de 168 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 114 contratações locais e 54 contratações não locais. Dessas 168 contratações, 124 profissionais são de Minas Gerais, 11 do Espírito Santo e 33 dos demais estados.

Dessas 168 contratações, 124 profissionais são de Minas Gerais, 11 do Espírito Santo e 33 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 321 currículos e prospectadas 305 vagas de emprego.

Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:

Realização de 225 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão. Sendo 129 em Minas Gerais e 96 no Espírito Santo.

Indicadores

I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)

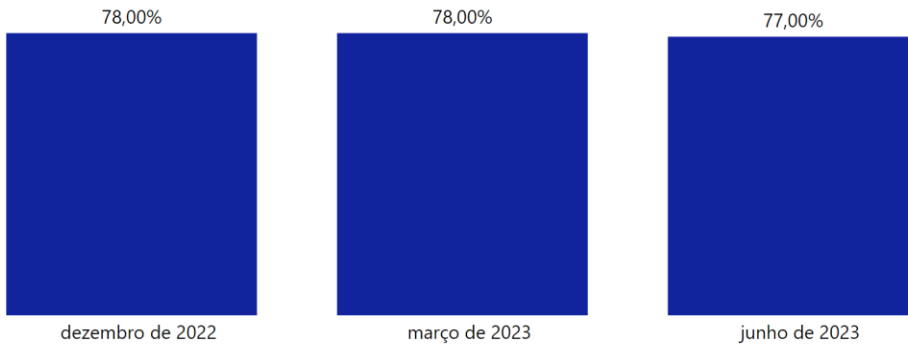


Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios

Meta Global: 30%
Percentual(%)

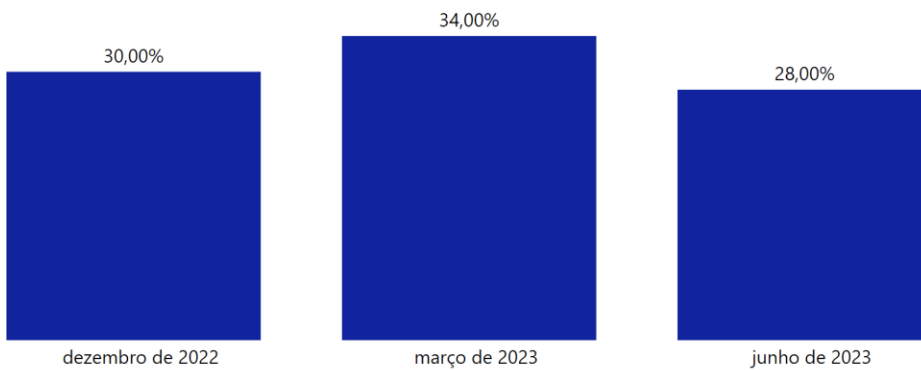


Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES

Meta Global: 70%
Percentual(%)




Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores

I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional

Meta Global: 4000
Quantidade

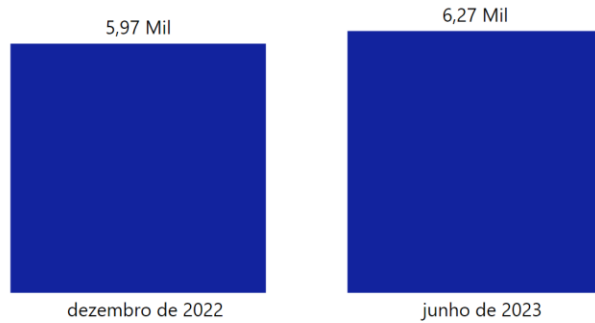


Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

I06 –Número de Empresas Capacitadas

Meta Global: 400
Quantidade




Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores

IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova

Meta Global: 50%
Percentual(%)




Gráfico 7: IC - Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estado na área de atuação da Renova - Frequência Mensal

Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES

Meta Global: 0
Quantidade

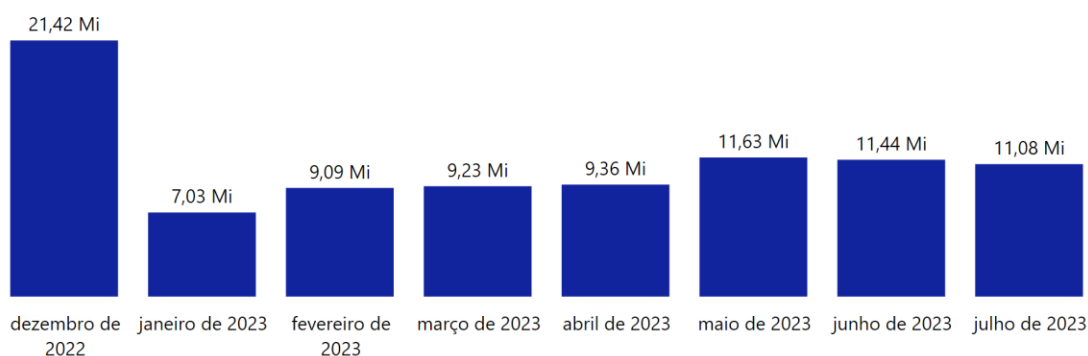


Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	137	Caput	Judicializada
Deliberação	111	6	Concluída Internamente
Deliberação	210	único	Concluída Internamente
Deliberação	307	2b	Concluída Internamente
Deliberação	35	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	420	3-a	Judicializada
Deliberação	422	2	Concluída Internamente
Deliberação	457	1 e 2	Judicializada
Deliberação	48	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	485	1 e 2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2023 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.232 titulares que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 31.784 pessoas assistidas pelo Programa;
- Até o momento foram pagos R\$ 2.514.392.539.

Fatos relevantes do mês

Exclusão de 20 auxílios

Inclusão de 0 auxílio.

Indicadores

I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial

Meta Global: 99%
Percentual(%)

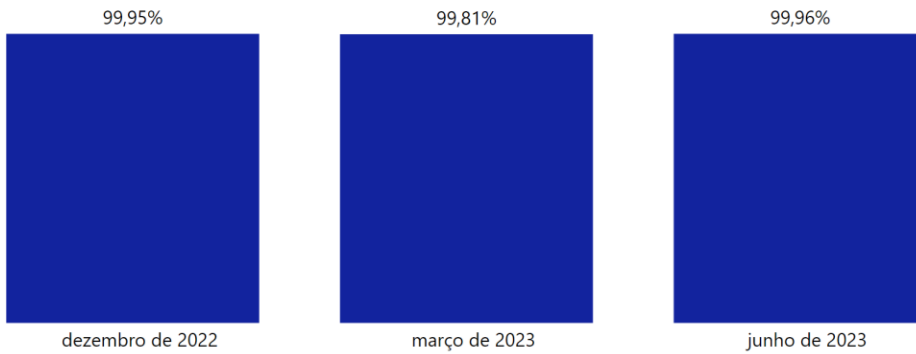


Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 2: I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações






Cláusula	150	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	151	Caput	Judicializada
Cláusula	180	§único	Judicializada
Cláusula	180	Caput	Em andamento
Deliberação	142	2	Concluída Internamente
Deliberação	164	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	165	2	Concluída Internamente
Deliberação	173	3	Concluída Internamente
Deliberação	180	2	Concluída Internamente
Deliberação	194	2	Em andamento
Deliberação	222	1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.6	Concluída Internamente
Deliberação	222	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	245	1	Em andamento
Deliberação	245	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	245	1.4	Em andamento
Deliberação	246	2	Concluída Internamente
Deliberação	246	3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.13	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.14	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.15	Reprogramada

Deliberação	261	1	Em andamento
Deliberação	261	1.1	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.10	Em andamento
Deliberação	261	1.11	Em andamento
Deliberação	261	1.12	Em andamento
Deliberação	261	1.16	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.17	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.18	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.19	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.5	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.7	Concluída Internamente
Deliberação	261	1.8	Judicializada
Deliberação	261	1.9	Em andamento
Deliberação	273	1	Em andamento
Deliberação	273	1.1	Em andamento
Deliberação	273	1.2	Concluída Internamente
Deliberação	273	1.3	Em andamento
Deliberação	273	1.6	Em andamento
Deliberação	323	1	Em andamento
Deliberação	324	2	Concluída Internamente
Deliberação	345	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	1	Concluída Internamente
Deliberação	358	2	Concluída Internamente
Deliberação	358	3	Judicializada
Deliberação	362	2	Reprogramada
Deliberação	363	1	Concluída Internamente
Deliberação	364	1	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente

Deliberação	273	1.4	Em andamento
Deliberação	273	1.5	Em andamento
Deliberação	273	1.7	Em andamento
Deliberação	284	1	Concluída Internamente
Deliberação	284	2	Concluída Internamente
Deliberação	285	3	Concluída Internamente
Deliberação	285	4	Concluída Internamente
Deliberação	285	5	Concluída Internamente
Deliberação	3	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	304	2	Judicializada
Deliberação	384	1	Concluída Internamente
Deliberação	431	2	Concluída Internamente
Deliberação	45	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	453	3	Concluída Internamente
Deliberação	488	2	Judicializada
Deliberação	488	4	Judicializada
Deliberação	497	1	Concluída Internamente
Deliberação	497	2	Concluída Internamente
Deliberação	497	3	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	544	2	Concluída Internamente
Deliberação	544	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	5	Em andamento
Deliberação	618	5	Em andamento
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento

Deliberação	630	3	Concluída Internamente
Deliberação	630	4	Em andamento
Deliberação	632	1	Em andamento
Deliberação	633	1	Concluída Internamente
Deliberação	633	2	Concluída Internamente
Deliberação	634	2	Em andamento
Deliberação	86	1-a	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c	Concluída Internamente
Deliberação	86	1-c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	86	e	Concluída Internamente
Deliberação	86	f	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023


- junho de 2023  Protocolo da revisão do relatório do 1º e 2º ano de resultados da região Deltaica na CT-GRSA
- junho de 2023  Protocolo do Relatório AS-IS Barra Longa na CT-GRSA
- julho de 2023  Conclusão do Monitoramento de solos, sedimentos e águas superficiais da Cachoeira Camargos em atendimento à Nota Técnica CT-GRSA nº 16/2021
- julho de 2023  Conclusão do Monitoramento Ambiental 2022-2023 - 5º Ano Hidrológico
- agosto de 2023  Protocolo da Atualização do Estudo da Mancha de Inundação - T13 a T16

Em atendimento a Deliberação CIF n.o 618 de 10/11/22, que determinou a revisão do Estudo da Mancha de Inundação no prazo de 5 meses

Em atendimento ao encaminhamento 62.1 da 62ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em 19/09/22 para a substituição do Plano de Manejo de Rejeitos da área urbana, solicitado na Nota Técnica CT-GRSA nº 14/2019

Em cumprimento a Deliberação CIF nº 632/2022 de 08/12/22 que solicitou a revisão do "Relatório Técnico Consolidado de 02 Anos de Monitoramento da Região Deltaica

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

- 1) Realizado protocolo do Relatório trimestral de Monitoramento da Qualidade do Ar referente ao 2º Trimestre, no SEI (ofício FR.2023.1730), em 14/07/2023.
- 2) Realizado protocolo do Relatório de Investigação Confirmatória do Sítio Caatinga, no SEI (ofício FR.2023.1849), em 28/07/2023, em atenção ao Memorando FEAM/GERAQ nº 94/2023
- 3) Realizado protocolo do Relatório de Monitoramento Final da Cachoeira Camargos, no SEI (ofício FR.2023.1612), em 05/07/2023, em resposta da Fundação Renova ao item 5 da Deliberação CIF nº 592.
- 4) Realizado protocolo da revisão do plano de monitoramento integrado no SEI (ofício FR.2023.1439), em 28/07/2023 da resposta da Fundação Renova da resposta da Fundação Renova ao Ofício FEAM/CT-GRSA nº. 35/2023.
- 5) Conclusão do monitoramento ambiental 2022-2023 5.o ano Hidrológico.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Recuperação Ambiental Área 1

Eixo Terra e Água

Objetivo

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	158	Caput	Encerrada
Cláusula	159	§único	Em andamento
Cláusula	159	Caput	Em andamento
Cláusula	160	Caput	Concluída Internamente
Deliberação	186	2	Concluída Internamente
Deliberação	223	3	Concluída Internamente
Deliberação	249	3	Concluída Internamente
Deliberação	26	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	613	2.1	Em andamento
Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	619	1	Em andamento
Deliberação	619	2	Em andamento
Deliberação	66	Ação 1	Concluída Internamente
Deliberação	66	Ação 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2023
- dezembro de 2023 ● Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 hectares de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 afluentes recuperados;
- 542 hectares de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do mês

As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

Indicadores

I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C

Percentual(%)

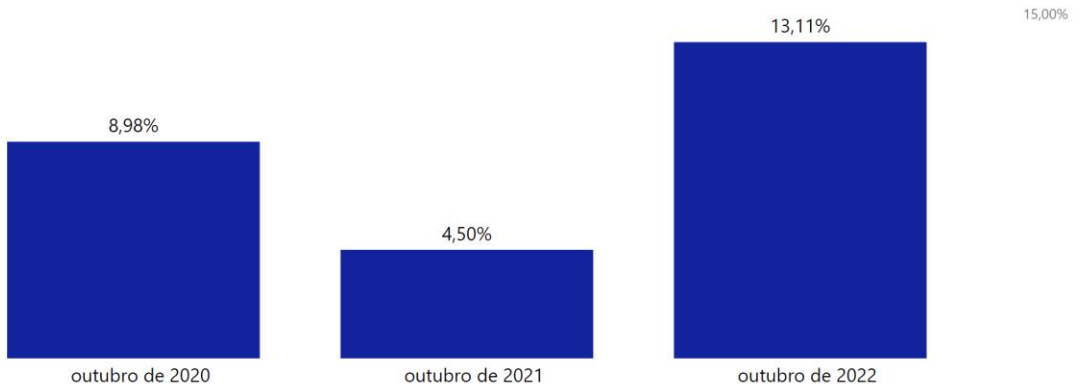


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianaual

No processo de auditoria externa conduzido pela EY verificou-se que o numerador do indicador referente ao ano de 2022 estava indicando a célula errada . Foi recalculado e o indicador permaneceu na meta.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	$I01 - (\text{Área total com cobertura vegetal herbácea-arbustiva} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I02 – Índice de solo exposto	$I02 - (\text{Área total com Solo Exposto} / \text{Área total passível de revegetação emergencial/inicial}) * 100$	%	novembro/2015
I03 – Biomassa Total da Vegetação	$I03 - (0,011 * \text{banda } 2 * \text{NDV12}) + (-0,008 * \text{banda } 3 * \text{NDV12})$	t/ha	março/2017
I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	$I04 - (\text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia} / \text{Perda de solo [t/ha] nas parcelas de monitoramento controle}) * 100$	%	março/2017
I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	$I05 - (\text{diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção} / \text{diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência}) * 100$	%	janeiro/2020
I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	$I06 - \text{Número de indivíduos} / \text{área amostral}$	Nº indivíduos/ha	janeiro/2020
I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	$I07 - (\text{Área total com espécie invasora} / \text{total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)}) * 100$	%	janeiro/2020

PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	161	Caput	Judicializada
Deliberação	108	2	Concluída Internamente
Deliberação	108	3	Concluída Internamente
Deliberação	11	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	133	2	Concluída Internamente
Deliberação	134	2	Concluída Internamente
Deliberação	14	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	143	3	Concluída Internamente
Deliberação	143	5	Concluída Internamente
Deliberação	143	6	Concluída Internamente
Deliberação	144	1	Concluída Internamente
Deliberação	196	4	Concluída Internamente
Deliberação	270	4	Em Andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	44	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	62	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	65	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	88	3	Concluída Internamente
Deliberação	89	3	Concluída Internamente
Deliberação	90	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fevereiro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
março de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24
março de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
maio de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 23/24
agosto de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Guandu - 24/25
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 49.356,40 **hectares** inscritos no edital;
- 39.647 hectares validados.
- 21.355,0 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 1.736.758 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 1.212 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);

Fatos relevantes do mês

Vistorias dias 6 e 7 de julho em Guanhães com CT-Flor, atingidos, Ibama, IEF e Emater.

Visita ao herbário do Parque Estadual do Rio Doce, instituição que receberá parte do material botânico coletado no Inventário Florestal da Bacia (06/07/23).

Aplicação do Diagnóstico da Rede, junto aos coletores (as) de sementes dos Assentamentos Manoel Ferreira (Grupo Maracanã) e Ulisses Oliveira (Grupo Maricatas) – Jampruca/MG, e do Assentamento Iraguiar - Santa Maria do Suaçuí/MG.

Visita técnica ao viveiro CM – Ipanema/MG, e ao viveiro do Abel- Manhuaçu/MG.

Treinamento de colheita e manejo de sementes no Assentamento Egídio Brunetto – Campanário/MG.

Alinhamento sobre curso Senar de viveirista florestal - Pataxós - Governador Valadares/MG.

Apresentação da Rede Rio Doce de Sementes e Mudanças na CTFLOR – Brasília/DF.

Início das atividades de campo do Inventário Florestal - Etapa de Anuência.

Visita Técnica ao Viveiro Mudanças Martins - Governador Valadares/MG, ao Viveiro Terra Viva - Afonso Cláudio/ES e ao Viveiro do IFES Campus Santa Teresa/ES.

Aplicação do Diagnóstico da Rede junto aos coletores da Aldeia Pataxó Geru Tucunã – Açucena/MG e da Aldeia Sede – Carmésia/MG.

Reciclagem/Treinamento junto aos coletores de Sementes da Aldeia Pataxó Sede – Carmésia/MG.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.

Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	163	Caput (ação 1)	Judicializada
Deliberação	135	3	Concluída Internamente
Deliberação	135	4	Concluída Internamente
Deliberação	135	5	Concluída Internamente
Deliberação	490	1	Concluída Internamente
Deliberação	490	2	Concluída Internamente
Deliberação	87	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023


- janeiro de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
- fevereiro de 2023 ● Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 23/24
- fevereiro de 2023 ● Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 23/24
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
- maio de 2023 ● Lançamento do Edital de mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
- maio de 2023 ● Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 20/21
- junho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 23/24
- julho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 24/25
- julho de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
- agosto de 2023 ● Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Piranga - 19/20
- agosto de 2023 ● Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 23/24

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Entregas do ano de 2023



agosto de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20
agosto de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Caratinga - 24/25
setembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 22/23
outubro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Piracicaba - 24/25
outubro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Santo Antônio - 24/25
novembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pontões e Lagoas - 23/24
dezembro de 2023	●	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
dezembro de 2023	●	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Suaçuí - 24/25
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Manhuaçu - 24/25
dezembro de 2023	●	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Piranga - 19/20

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- 5.796 **nascentes** inscritas no edital;
- 2.985 nascentes validadas;
- 1.912 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- R\$ 537.708,71 pagos de PSA aos produtores rurais;
- 809 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes.

Fatos relevantes do mês

Alinhamento sobre curso Senar de viveirista florestal - Pataxós - Governador Valadares/MG

Aplicação do Diagnóstico da Rede junto aos coletor@s da Aldeia Pataxó Geru Tucunã - Açucena/MG e da Aldeia Sede - Carmésia/MG

Aplicação do Diagnóstico da Rede, junto aos coletores (as) de sementes dos Assentamentos Manoel Ferreira (Grupo Maracanã) e Ulisses Oliveira (Grupo Maricatas) - Jampruca/MG, e do Assentamento Iraguiar - Santa Maria do Suaçuí/MG

Apresentação da Rede Rio Doce de Sementes e Mudanças na CTFLORE - Brasília/DF

Início das atividades de campo do Inventário Florestal - Etapa de Anuência

Reciclagem/Treinamento junto aos coletor@s de Sementes da Aldeia Pataxó Sede - Carmésia/MG

Treinamento de colheita e manejo de sementes no Assentamento Egídio Brunetto - Campanário/MG

Visita ao herbário do Parque Estadual do Rio Doce, instituição que receberá parte do material botânico coletado no Inventário Florestal da Bacia (06/07/23)

Visita técnica ao viveiro CM - Ipanema/MG, e ao viveiro do Abel- Manhuaçu/MG

Visita Técnica ao Viveiro Mudanças Martins - Governador Valadares/MG, ao Viveiro Terra Viva - Afonso Cláudio/ES e ao Viveiro do IFES Campus Santa Teresa/ES

Vistorias dias 6 e 7 de julho em Guanhães com CT-Flor, atingidos, Ibama, IEF e Emater

Indicadores

I00 – Nascentes recuperadas

Meta Global: 5000
Unidade: ha



Gráfico 1: I00 – Nascentes recuperadas - Frequência Anual

-O Programa levará para a Câmara Técnica a revisão da Ficha do Indicador de Definição I00 – Nascentes Recuperadas.

I01 - Riqueza de espécies

Meta Global: > 40
Percentual(%)




Gráfico 2: I01 - Riqueza de espécies - Frequência Anual

Indicadores

I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha




Gráfico 3: I02A – Densidade de regenerantes (Plantio Total) - Frequência Anual

I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração)

Meta Global: > 2000
Unidade: N° indivíduos/ha



Gráfico 4: I02B – Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) - Frequência Anual

Indicadores

I03 - Cobertura do dossel

Meta Global: => 80
Percentual(%)

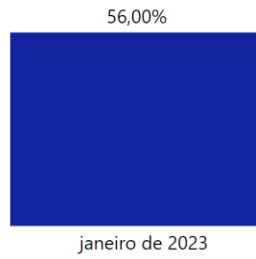


Gráfico 3: I03 - Cobertura do dossel - Frequência Anual

PG028 Conservação da Biodiversidade

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	a (ação 1)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 2)	Encerrada
Cláusula	164	a (ação 3)	Encerrada
Cláusula	164	b	Encerrada
Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	164	c (ação 2)	Em andamento
Cláusula	165	Inc I - a-b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - a	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc II - b	Concluída Internamente
Cláusula	165	Inc III - ES	Em andamento
Cláusula	165	Inc III - MG	Judicializada
Cláusula	166	§1º	Em andamento
Cláusula	166	§2º	Em andamento
Deliberação	102	2	Concluída Internamente
Deliberação	112	2	Concluída Internamente
Deliberação	113	2	Concluída Internamente
Deliberação	148	3	Concluída Internamente
Deliberação	148	4	Concluída Internamente
Deliberação	159	2	Concluída Internamente
Deliberação	159	3	Judicializada
Deliberação	212	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	279	2	Concluída Internamente
Deliberação	279	3	Concluída Internamente
Deliberação	282	1	Concluída Internamente
Deliberação	282	2	Concluída Internamente
Deliberação	336	1	Concluída Internamente

Deliberação	337	1	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.3	Concluída Internamente
Deliberação	347	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	385	3.3	Concluída Internamente
Deliberação	392	1	Concluída Internamente
Deliberação	447	1	Judicializada
Deliberação	450	2	Judicializada
Deliberação	450	5	Concluída Internamente
Deliberação	461	3	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente
Deliberação	607	2	Em andamento
Deliberação	607	3	Concluída Internamente
Deliberação	631	2	Concluída Internamente
Deliberação	74	1	Concluída Internamente
Deliberação	79	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- janeiro de 2023 ● Conclusão da publicação do livro do plano de ação para conservação da biodiversidade aquática
- janeiro de 2023 ● Protocolo do Relatório subprojeto III-A - SIF/UFV
- fevereiro de 2023 ● Protocolo do Relatório Semestral do Monitoramento dos Anexos 1 a 8 - TR4 - Ciclo 4
- março de 2023 ● Conclusão do monitoramento complementar da Biodiversidade Aquática do rio Doce em MG - SIF/UFV
- abril de 2023 ● Conclusão do Ciclo 2 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais (Cl. 165)
- junho de 2023 ● Conclusão do Ciclo 4 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
- junho de 2023 ● Monitoria do Plano de Ação - Biodiversidade Aquática - PA - Ano 1 concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 05 de julho de 2023 foi encaminhado o ofício FR.2023.1628 e anexo referente à apresentação do Plano de Trabalho para inclusão e avaliação do Metilmercúrio no PMBA, em atendimento à Deliberação CIF nº 666/2023.

Nos dias 04 e 05 de julho foi realizado o 3º Workshop (2º virtual) sobre Análise Integrada da Biodiversidade Aquática Dulcícola do Rio Doce.

Indicadores

I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)

Meta Global: 100%
Percentual(%)

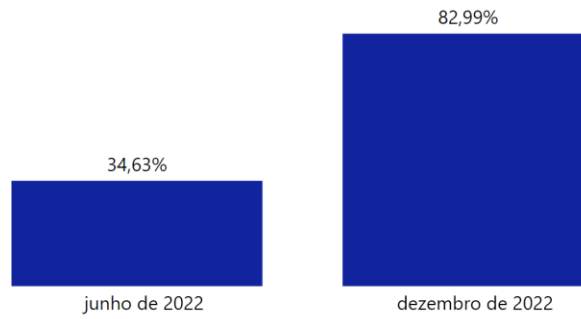


Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

- Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
- Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	167	Caput	Em andamento
Cláusula	167	§1º	Concluída Internamente
Cláusula	167	§2º	Em andamento
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	478	1	Concluída Internamente
Deliberação	484	1, 2 e 3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

junho de 2023

● Conclusão do Projeto Executivo do CETRAS ES

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES

Meta Global: 100%
Percentual(%)

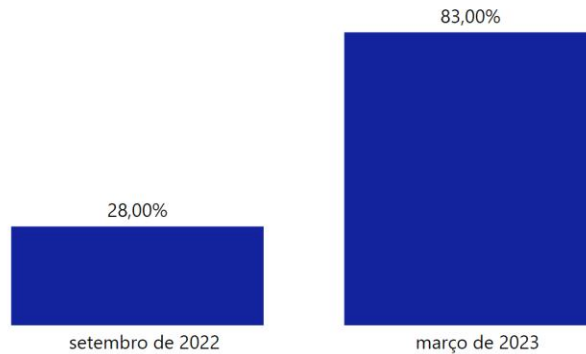


Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 83%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES

Meta Global: 90%
Percentual(%)



Gráfico 1: I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações pertinentes - CETRAS ES - Frequência Semestral

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água


Objetivo

- Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
- Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
- Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	168	§1º	Encerrada
Cláusula	168	§2º	Em andamento
Cláusula	168	Caput	Encerrada
Deliberação	132	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	419	2	Concluída Internamente
Deliberação	449	3	Concluída Internamente
Deliberação	517	3	Concluída Internamente
Deliberação	91	2	Concluída Internamente
Deliberação	91	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023



janeiro de 2023	●	Protocolo do relatório semestral 1 do Projeto "Conservação e Manejo de espécies da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" em parceria com a UFRV/CCSS
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Fauna
abril de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Seca 2022 Flora
junho de 2023	●	Conclusão da Publicação "Cidadão Cientista na Bacia do Rio Doce"
agosto de 2023	●	Protocolo na CTBio/CIF do relatório anual de monitoria do PABT
setembro de 2023	●	Protocolo do relatório na CTBio/CIF - Campanha Chuvosa 2022/2023
novembro de 2023	●	Lançamento do primeiro livro de ações para conservação da biodiversidade na Bacia do Rio Doce (Ação 39 do PABT)

Os relatórios semestrais do Projeto "Conservação e Manejo de espécies da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce" serão apresentados como anexo dos relatórios anuais de monitoria.

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 grupos faunísticos, além da flora terrestre, monitorados na área de estudo;
- 49 ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I01 – Execução do Plano de Ação

Meta Global: 100%

Percentual(%)

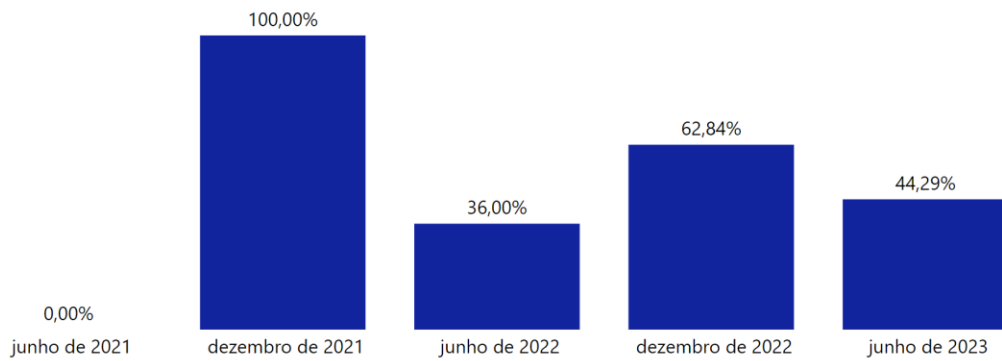


Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa é contribuir para “acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada”; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
- Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
- Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
- Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	169	Caput	Em andamento
Cláusula	170	4ª Diretriz	Encerrada
Cláusula	170	Inc I	Encerrada
Cláusula	170	Inc II	Encerrada
Cláusula	170	Inc III	Encerrada
Cláusula	170	Inc IV	Encerrada
Cláusula	170	Inc V	Encerrada
Deliberação	122	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	224	5	Concluída Internamente
Deliberação	259	2	Concluída Internamente
Deliberação	259	3	Em andamento
Deliberação	295	1	Concluída Internamente
Deliberação	295	2	Concluída Internamente
Deliberação	635	2	Em andamento
Deliberação	75	4-4.1	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.2	Concluída Internamente
Deliberação	75	4-4.3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

agosto de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito BALRSPJ01
agosto de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito SAPRSPM01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIOESCT01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TIMRSPM03
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito CONESOB01
setembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito DIORSAB01
outubro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito TUMESPJ01
dezembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito RIDESOB02
dezembro de 2023	●	Conclusão do repasse do Pleito NAQESPM01

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2023 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2024 e por isso não aparecem mais na *time line*.

BALESCT01 - Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede municipal; **BUGESPJ02** - Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre; **RASESPJ02** - Revisão e elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para a Sede do município; **AIMESPJ03** - Elaboração de projeto, incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos esgotos sanitários gerados somente na sede; **DIOESOB03** - Implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde; **AIMESCT02**-Aquisição de terreno para implantação de SES; **IPAESOB03**-Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal; **PERRSOB02**-Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem; **MREESCT01**-Aquisição de terreno.

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

- No mês julho 2023 foram repassados R\$ 8.359.599,35 para ações dos municípios*;
- No mês julho 2023 foram ofertadas 0 oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2;
- No mês julho 2023 a equipe técnica realizou 78 visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	8.359.599,35	*Repases para ações dos municípios de Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Colatina, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Raul Soares, Rio Casca, São Domingos do Prata, Sobrália e Condoeste;

Observação: No mês de 06/23 foi reportado o valor de R\$3.764.417, para o Grande Número de valor repassado, mas o valor correto é de R\$3.791.502,54 (conforme mostra o e-mail "RES RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO2023.msg" em anexo).

Fatos relevantes do mês

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Sobrália, no valor de R\$ 7.273,22, referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programa de coleta seletiva;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R\$1.121.290,23, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R\$506.403,09, referente a execução de obras da segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da sede do município;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Raul Soares, no valor de R\$1.054.000,00, referente a aquisição de dois caminhões basculantes para auxiliar na implantação da coleta seletiva do município de Raul Soares/MG;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R\$50,00, referente a obra de ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede municipal;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R\$714.637,85, referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R\$137.872,28, referente a obra de implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R\$39.638,47 referente a obra de execução de ampliação do laboratório da ETE Santos Dumont e aquisição de equipamentos/insumos e serviços de calibração dos equipamentos e de treinamento de pessoal e R\$98.471,53 referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R\$ 7.273,22, referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Fernandes Tourinho, no valor de R\$ 4.094,54, referente a elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R\$760.225,95, referente a obra de complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R\$138.263,19 referente a obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Bom Jesus do Galho, no valor de R\$19.119,26 referente a elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Belo Oriente, no valor de R\$1.625.530,32 referente a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário – SES no distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura);

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Barra Longa, no valor de R\$100.390,19 referente a adequação de projeto de engenharia do SES da sede municipal;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R\$7.273,22 referente a elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva;

Em julho de 2023, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R\$126.104,86 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR Colatina, e o valor de R\$1.891.687,93 referente à implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, incluindo a retirada da linha de transmissão de energia elétrica situada no terreno da CTR Colatina.

Observação: O "Fato Relevante" abaixo não foi reportado no relatório CIF 06/23 devido ao não apontamento do banco referente a esse repasse (conforme mostra o e-mail "RES RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO2023.msg" em anexo) sendo incluído nesse mês: "Em junho de 2023, foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R\$27.085,95 referente a elaboração de estudo de concepção, viabilidade técnica, econômica, ambiental, projetos básicos e executivos para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência."

Indicadores de Resultados

I01 – Percentual do valor repassado total

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio

Meta Global: 100%
Percentual(%)

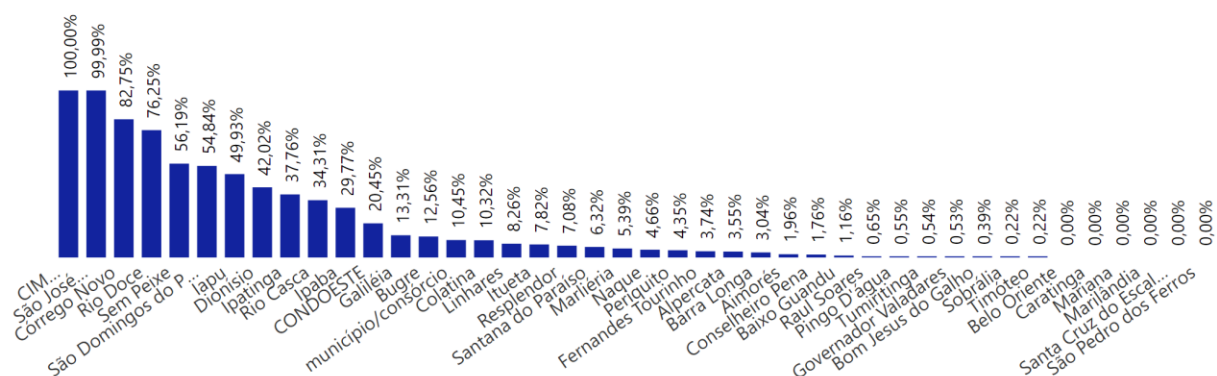


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi o fechado em dezembro de 2022. Esse valor será a base para as informações referentes ao I02 no ano de 2023.

Indicadores de Resultados

I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios

Meta Global: 80%
Percentual(%)

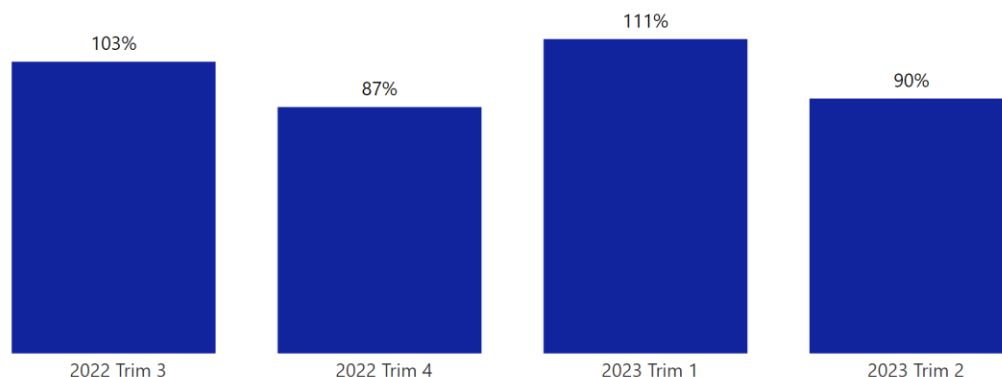


Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico

Meta Global: 80%
Percentual(%)




Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados




Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral




Gráfico 6: I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I07- Percentual de Coleta de Esgoto

Percentual(%)

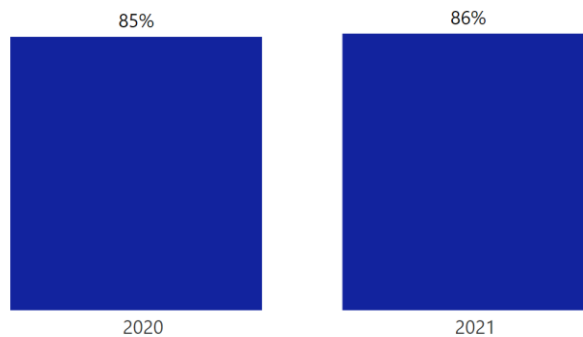


Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I07 no SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto

Percentual(%)



Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;

I08 no SNIS havia dados disponíveis de 28 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva

Percentual(%)

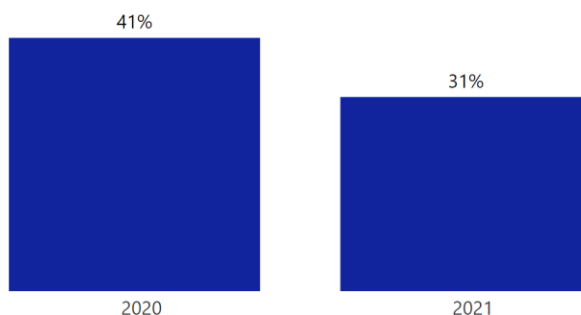


Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I09 no SNIS havia dados disponíveis de 35 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados

Percentual(%)

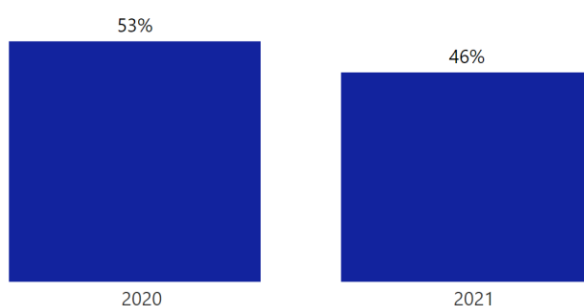


Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

Data base 2021. Os dados referentes ao ano de 2022 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS.

I10 no SNIS havia dados disponíveis de 13 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)

Percentual(%)

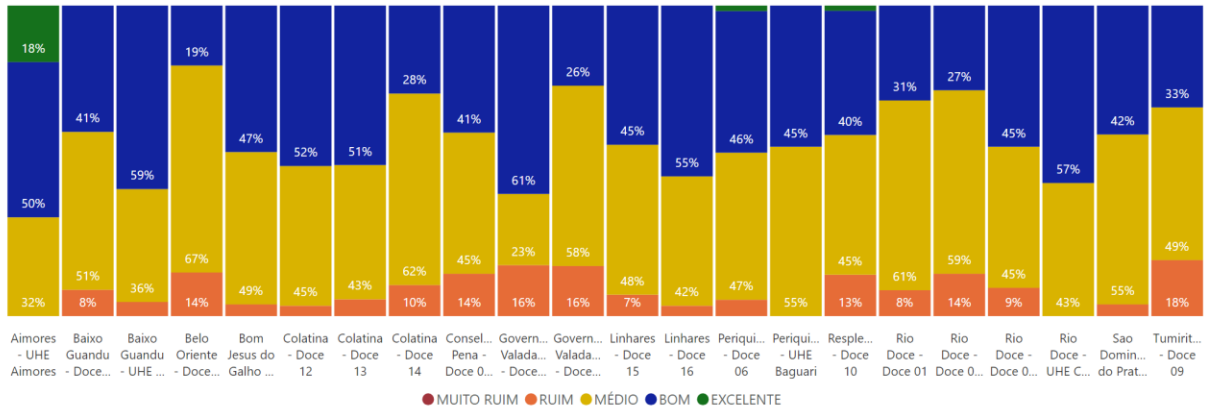


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

Os valores desse indicador são os que constam na planilha de evidência.
Favor desconsiderar o valor digitado no campo de "Valor da Medição".

I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

Percentual(%)

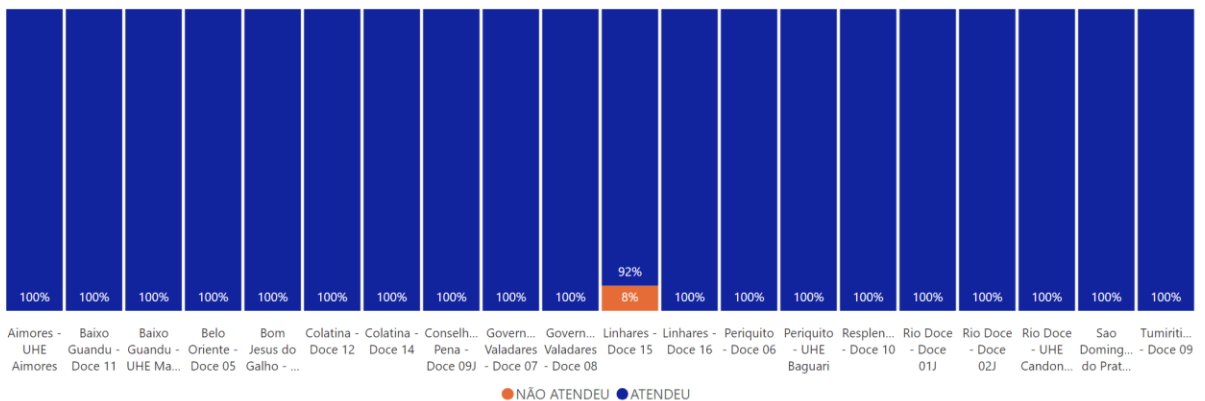


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

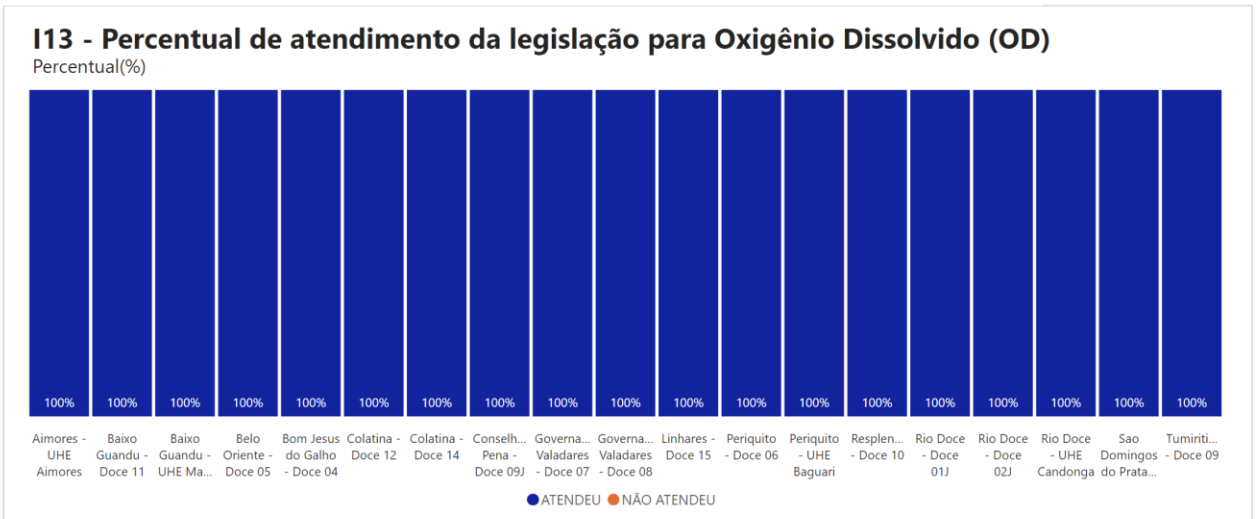


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	171	Caput (obra)	Judicializada
Cláusula	171	Caput (projeto)	Judicializada
Deliberação	10	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	123	2	Concluída Internamente
Deliberação	123	3	Judicializada
Deliberação	124	2	Concluída Internamente
Deliberação	124	4	Concluída Internamente
Deliberação	16	n/a	Judicializada
Deliberação	185	2	Concluída Internamente
Deliberação	185	3	Concluída Internamente
Deliberação	185	4	Judicializada
Deliberação	185	5	Judicializada
Deliberação	185	6	Judicializada
Deliberação	2	1	Em Andamento
Deliberação	258	2	Judicializada
Deliberação	258	4	Concluída Internamente
Deliberação	258	5	Concluída Internamente
Deliberação	308	2	Judicializada
Deliberação	315	1	Concluída Internamente
Deliberação	325	1	Judicializada
Deliberação	33	1	Concluída Internamente
Deliberação	33	i e ii	Em Andamento
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	379	1	Concluída Internamente
Deliberação	379	2	Concluída Internamente
Deliberação	379	3	Concluída Internamente
Deliberação	4	n/a	Judicializada

Deliberação	443	a	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	98	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Conclusão das Obras - Adutora Rio Corrente - Governador Valadares - Sede
julho de 2023	●	Conclusão das Obras
julho de 2023	●	Conclusão das Obras

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- 21 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;
- 19 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	21	<p>Em julho de 2023 as obras dos Sistemas de Tratamento de Água das seguintes localidades foram concluídas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ponte do Gama (Distrito de Mariana);- São Tomé do Rio Doce (Distrito de Tumiritinga);- Boninsegna (Distrito de Marilândia). <p>Os Termos de Entrega destas obras serão submetidos as prefeituras e as operadoras locais. Esses Sistemas passarão por comissionamento e pelo período de operação assistida, essas etapas em conjunto tem uma duração estimada de 4 meses.</p>
Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	<p>No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pré-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado do sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa terá um prazo de duração de 05 (cinco) meses a contar dessa data de formalização.</p>

Fatos relevantes do mês

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2023 a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento do andamento das obras em execução pela Fundação Renova e subcontratados, correlatas à Etapa 1.3, nas seguintes localidades do Item 1:

- o Sede do município de Linhares/ES;
- o Boninsegna, município de Marilândia/ES;
- o Sede do município de Colatina/ES;
- o Sede do município de Baixo Guandu/ES;
- o Sede do município de Resplendor/MG;
- o São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG;
- o Sede do município de Governador Valadares/MG;
- o Gesteira, município de Barra Longa/MG.

Em 12/07/2023 foi submetido ao SAAE de GV, para análise e assinatura, os termos de compromisso das ETAs da Sede de Governador Valadares;

Em 11/07/2023 foi assinado o termo de entrega definitivo da obra de Pedra Corrida pela prefeitura de Periquito. Aguardando assinatura da COPASA.

Em 07 de julho de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do andamento das obras das localidades do Item 1 visitadas nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2023.

Em 03 de julho de 2023, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia o status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial (ID 151060877).

Indicadores

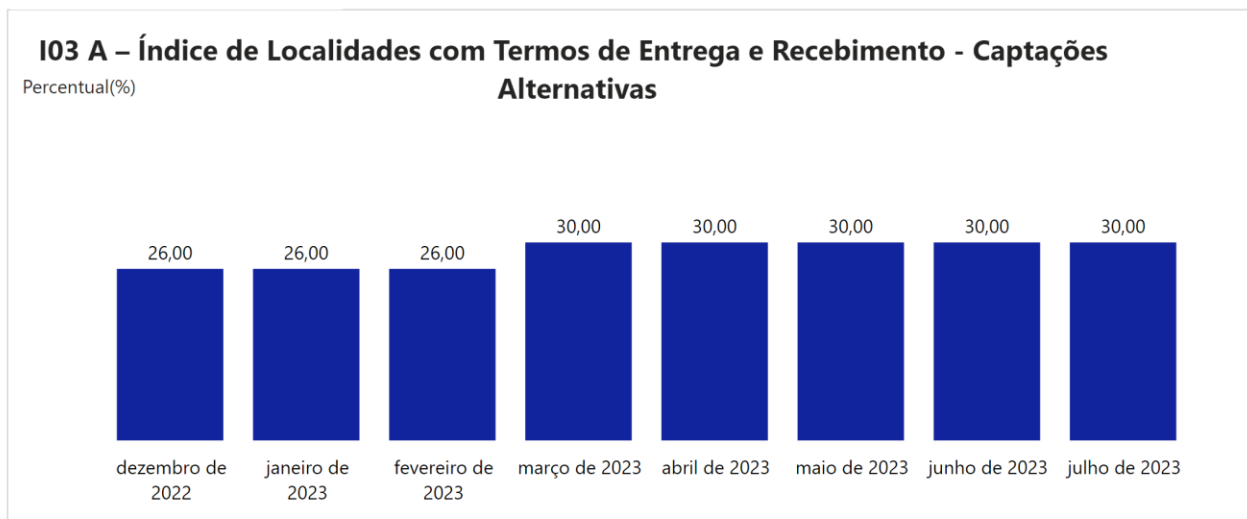


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

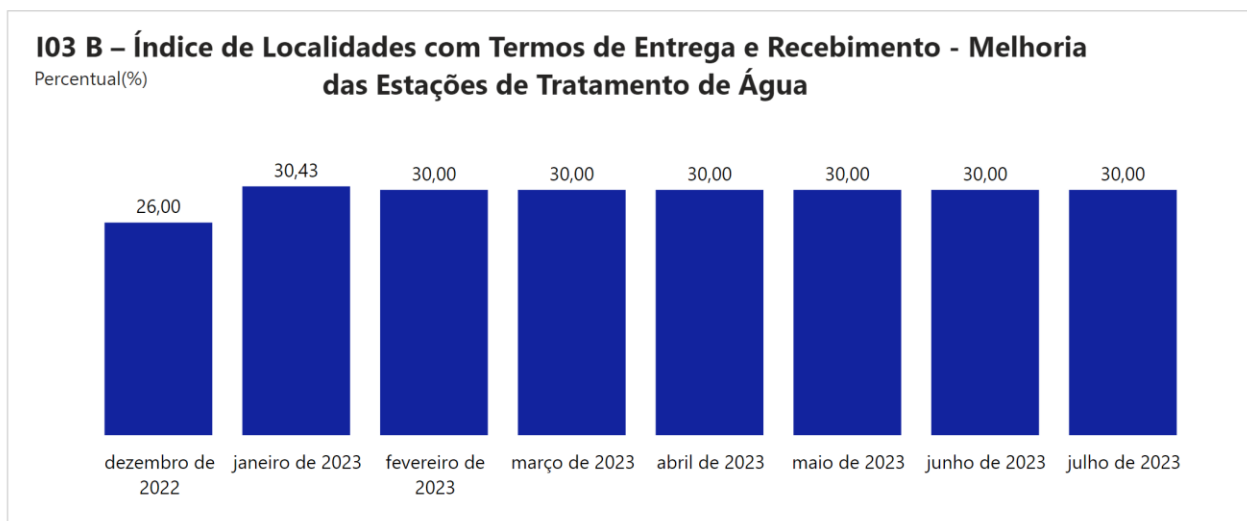


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação Ambiental

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	172	Caput	Em andamento
Deliberação	136	1	Concluída Internamente
Deliberação	240	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	1	Concluída Internamente
Deliberação	288	2	Em andamento
Deliberação	343	1.4	Concluída Internamente
Deliberação	549	2	Em andamento

Entregas do ano de 2023



 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

No dia 13 de julho ocorreu a aula inaugural da segunda turma do curso de aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores - MG (Escola do Rio Doce) com vagas para 3.000 profissionais das redes públicas de ensino. O curso terá de duração de 6 meses em regime de alternância: os profissionais experimentam os conhecimentos teóricos ministrados em práticas pedagógicas em sala de aula com os alunos. Ao final da etapa teórica, será ofertado fomento para implementação e disseminação dos Projetos Pedagógicos Experimentais elaborados ao longo do curso.

No encontro de recepção dos cursistas foi apresentada a estrutura do curso, a concepção pedagógica norteadora, as ementas das disciplinas, e as atividades a serem desenvolvidas. O evento aconteceu de modo online e transmitido pelo Youtube no canal da Faculdade de Educação da UFMG e foi um momento de apresentação e interação onde os cursistas puderam entender os objetivos e metodologia do curso de aperfeiçoamento, bem como, sanar dúvidas e questionamentos.

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

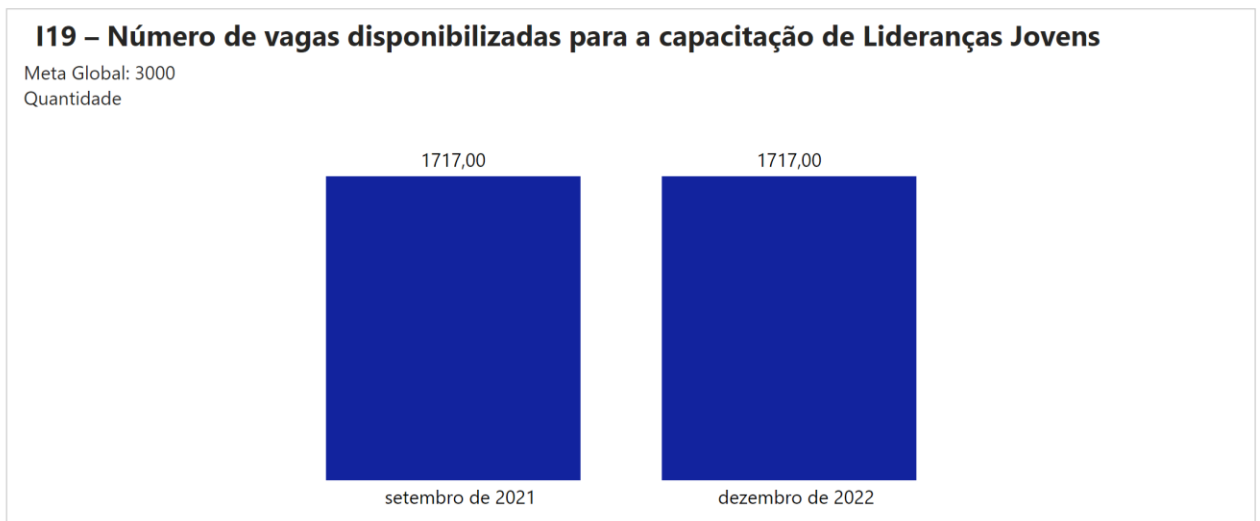


Gráfico 2: I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Frequência Anual

PG034 Programa de Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada
Cláusula	173	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	173	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	128	2	Concluída Internamente
Deliberação	303	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	2	Concluída Internamente
Deliberação	357	3	Concluída Internamente
Deliberação	439	2	Concluída Internamente
Deliberação	623	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

- dezembro de 2023 ● Conclusão da disponibilização de recursos para agentes das Defesas Cíveis para participar de cursos de curta duração em 2023
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de curta duração
- dezembro de 2023 ● Conclusão dos cursos de Graduação Tecnólogo em Segurança Pública e Tecnólogo em Gestão Pública

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Não houve progressos neste mês

Indicadores

I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil

Meta Global: 80%
Percentual(%)



Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Indicadores

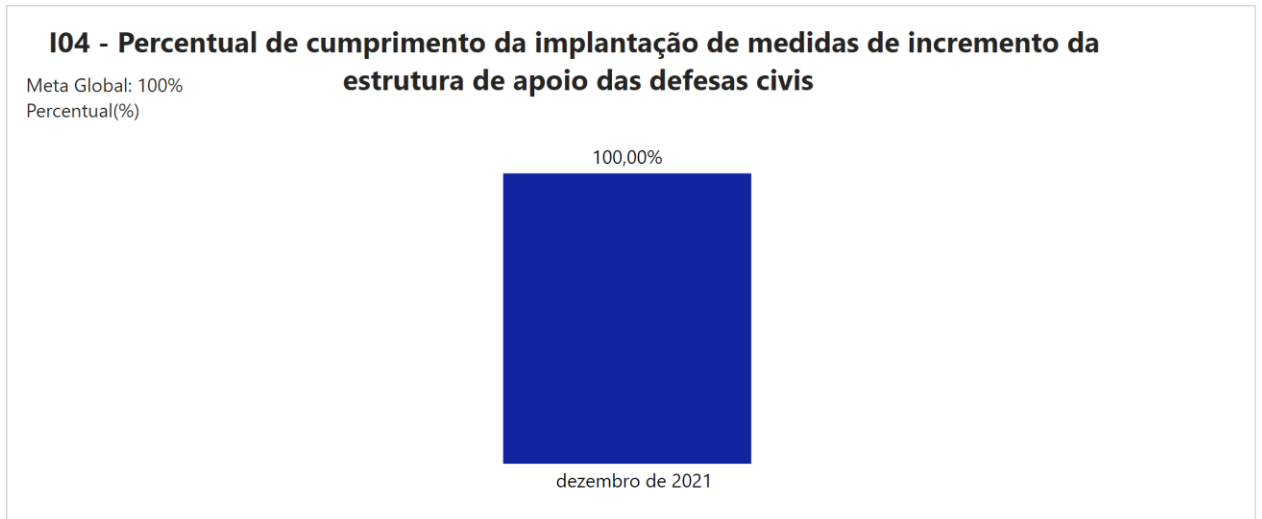


Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis - Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	$I01 = \frac{\text{Total de indivíduos formados}}{\text{Total de indivíduos inscritos}}$	%	abril/2025

PG035 Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	174	§1º	Em andamento
Cláusula	174	Caput	Em andamento
Cláusula	65	Caput	Em andamento
Deliberação	229	3	Concluída Internamente
Deliberação	229	4	Concluída Internamente
Deliberação	229	5	Concluída Internamente
Deliberação	306	2	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.1	Concluída Internamente
Deliberação	306	4.2	Concluída Internamente
Deliberação	376	2	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- a	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- b	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- c	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- d	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- e	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- f	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- g	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- h	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- i	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- j	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- k	Concluída Internamente
Deliberação	437	1- l	Concluída Internamente
Deliberação	500	I	Concluída Internamente
Deliberação	500	II	Concluída Internamente
Deliberação	500	III	Concluída Internamente
Deliberação	500	IV	Concluída Internamente
Deliberação	500	V	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

março de 2023	●	Realização das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
maio de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
junho de 2023	●	Publicação do ebook do segundo ciclo dos Webinários Conhecimento em Pauta
junho de 2023	●	Publicação dos materiais das oficinas do segundo ciclo de Trilhas de Memória
agosto de 2023	●	Publicação dos resultados da pesquisa com usuários da Plataforma Interativa
novembro de 2023	●	Realização da mostra de resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
novembro de 2023	●	Publicação de relatório de avaliação de eficiência da Plataforma Interativa
dezembro de 2023	●	Publicação dos resultados das oficinas do terceiro ciclo de Trilhas de Memória
dezembro de 2023	●	Realização da manutenção da Plataforma Interativa em 2023

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	jun/2023	jul/2023	Acumulado 2023	Acumulado Total
Quantidade de acessos à plataforma interativa	18653	25677	138042	172314
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	0	0	4	19

Fatos relevantes do mês

O PG35 esteve presente na comunidade de Areal, em Linhares (ES), no dia 06/07/2023, acompanhando atividade do CIA Móvel. O Objetivo da ação foi apresentar o CIT para os usuários do CIA Móvel através da Plataforma Interativa e realizar a entrega de materiais de divulgação, estimulando a população a conhecer o acervo e as possibilidades de colaboração. Na ocasião também foi possível mapear oportunidades de ações futuras na comunidade.

No dia 12/07/2023 o PG35 esteve em Santa Rita Durão onde realizou encontro com um stakeholder-chave do PG35, Sr. Tutim, residente da comunidade, e com o pároco local, com o objetivo de dar prosseguimento ao desenvolvimento do Projeto Sineiros. Foram apresentados desdobramentos para realização de uma oficina com os alunos da escola com o objetivo de promover a valorização e perpetuação da prática de sineiro, bem imaterial do Estado de Minas Gerais, bem como identificar formas de apoio da igreja local no desenvolvimento da ação.

O PG35 realizou, no dia 17/07/2023, uma visita à comunidade de Pedra Corrida (Periquito) com o objetivo de apresentar o CIT e sua plataforma interativa, bem como fazer a distribuição de materiais de divulgação para stakeholders da comunidade.

No dia 18/07/2023 o PG35 participou, a convite do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06) da Fundação Renova, de um encontro com empreendedores e agentes culturais de Mariana. Na ocasião, houve a apresentação dos objetivos do CIT e foram distribuídos materiais de divulgação aos participantes.

No dia 21/07/2023 a equipe do PG35 realizou mobilização na comunidade de Cachoeira Escura (Belo Oriente) para realização das oficinas do 3º Ciclo do Trilhas de Memórias, prevista para ocorrer no dia 15/08. A mobilização foi feita diretamente com lideranças locais com o intuito de multiplicarem o convite à comunidade.

No dia 26/07/2023 o programa esteve presente no município de Alpercata também com objetivo de realizar a mobilização para realização das oficinas do 3º Ciclo do Trilhas de Memórias, prevista para ocorrer no dia 26/08, em Governador Valadares. O convite foi direcionado a lideranças locais com o objetivo de multiplicarem o convite aos membros da comunidade. Na ocasião o PG35 afixou cartazes convidando para a oficina em estabelecimentos locais.

Indicadores

1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa

Número Absoluto




Gráfico 1: 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa - Frequência Trimestral

A medição do Indicador I01 Do Programa de Informação à População (PG35) teve início em janeiro de 2023 e não em julho/2022. O Programa emitirá uma errata do documento de Definição reportando a data correta do início das medições se e a enviará para o sistema CIF.

2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa

Número Absoluto



Gráfico 2: 2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - Frequência Trimestral

O Programa não recebeu resposta dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador. Sendo assim, não foi possível fazer o reporte dos valores, desde janeiro de 2023, data do início das medições, até o presente momento.

Indicadores

3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa

Número Absoluto



Gráfico 3: 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - Frequência Trimestral

O Programa não recebeu resposta dos questionários disponibilizados na plataforma interativa para avaliação desse indicador. Sendo assim, não foi possível fazer o reporte dos valores, desde janeiro de 2023, data do início das medições, até o presente momento.

As medições dos Indicadores "I04 - Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no CIT" e "I05 - Avaliação de satisfação com as unidades do CIT" não foram iniciadas porque os CITs ainda não foram implantados e não há como fazer a medição desses indicadores.

6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância

Porcentagem %



Gráfico 4: 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

Indicadores

7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância

Número absoluto




Gráfico 5:7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - Frequência Trimestral

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidade




Objetivo




- Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
- Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
- Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	175	Caput (ação 1)	Concluída Internamente
Cláusula	175	Caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2023.
dezembro de 2023		Atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2023
dezembro de 2023		Atualização mensal das entregas e fatos relevantes dentro das páginas dos programas, reportadas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo), hospedados no site, em português e inglês em 2023.

 Concluído  Planejado  Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	jun/2023	jul/2023	Acumulado 2023	Acumulado (2016 - 2023)
Acesso ao Site (mês)	164.081	185.616	105.679	11.068.238
Documentos no site (mês)	4	13	79	649
Notícias Publicadas (mês)	10	10	57	1.092
Vídeos (mês)	7	3	86	828

Fatos relevantes do mês

Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

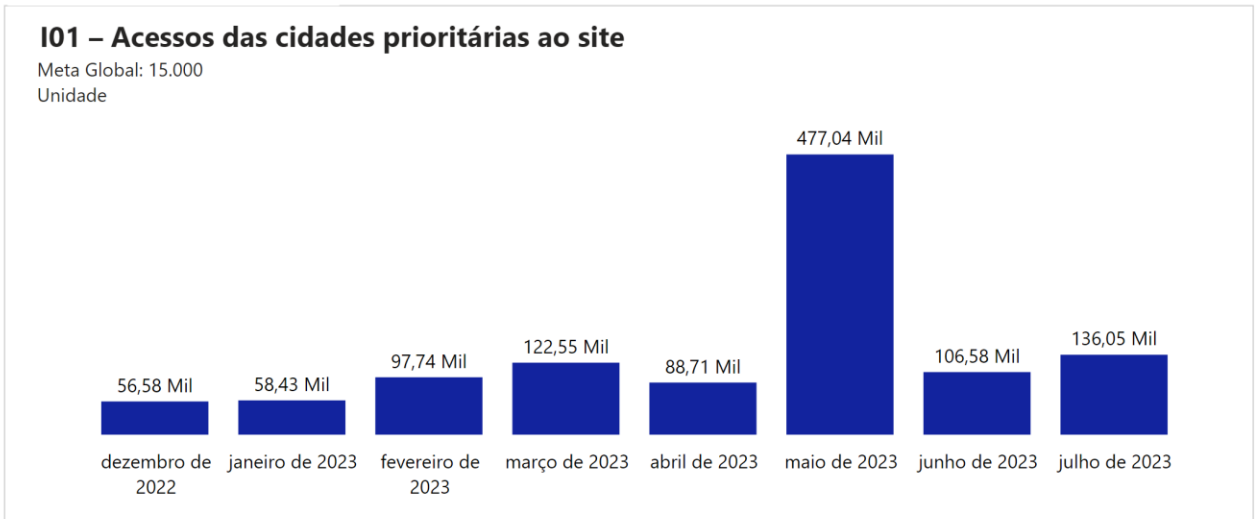


Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

*A Fundação Renova retifica aqui o valor reportado para este indicador I01 em novembro de 2021. Conforme identificado via processo de auditoria, o valor reportado equivocadamente foi de 203.108 mil acessos, quando o correto deveria ter sido de 199.350 mil acessos. O erro em questão ocorreu devido a falha no somatório dos valores das localidades classificadas pelo Google Analytics como “not set”, que são localidades sem endereços de IP mapeados.

**Sobre número de acessos das cidades prioritárias ao site - errata: O número informado no documento CIF-JUNHO/2023 estava incorreto e acima está apresentado o valor corrigido.

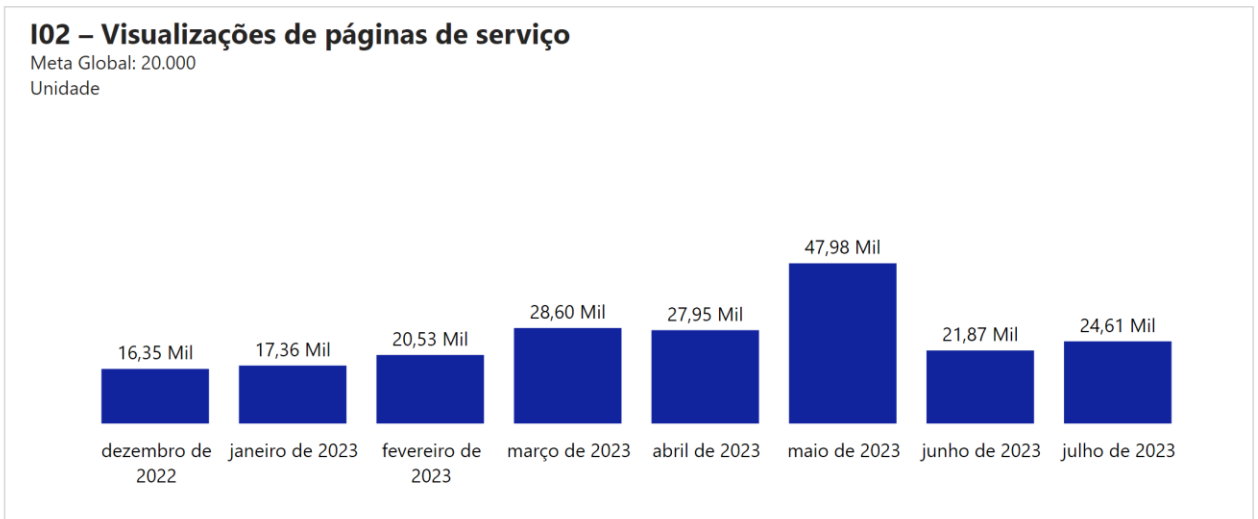


Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

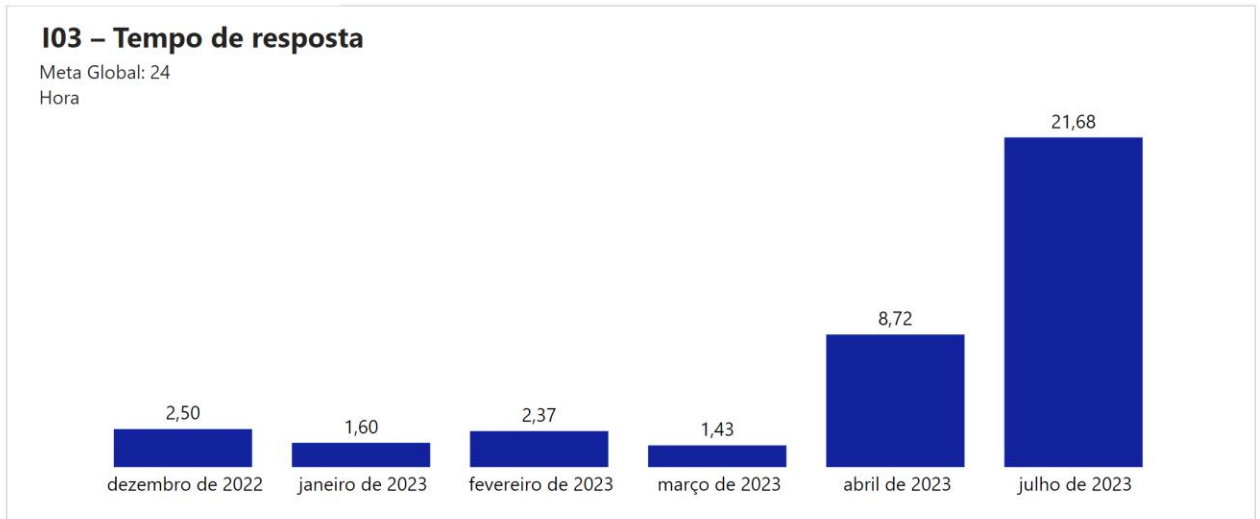


Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

Nos meses de maio e junho de 2023 esse indicador não foi reportado. Isso ocorreu por conta de uma dificuldade burocrática que o PG 36 encontrou para ceder acesso da conta do software que gere o tratamento das interações ao novo fornecedor contratado pela Fundação Renova. Esse problema foi corrigido no dia 02/07/2023. A partir desse momento foi organizada uma força tarefa para responder o passivo de interações não tratadas desde maio/2023.




Gráfico 4: I04 – Alcance total no LinkedIn - Frequência Mensal

Indicadores




Gráfico 5: I05 – Alcance Total no Facebook - Frequência Mensal

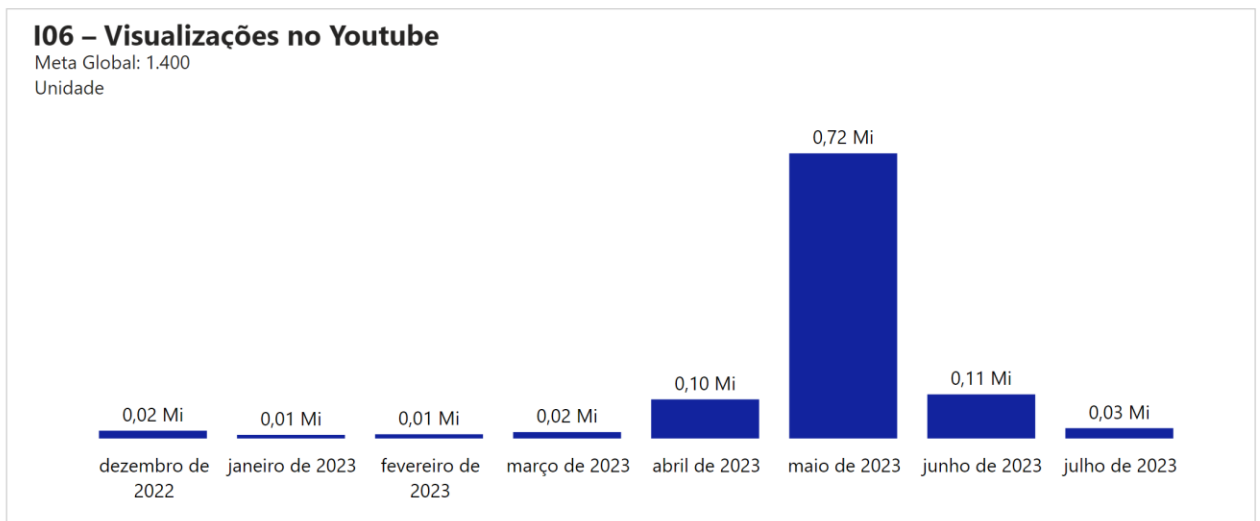


Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	177	§1º	Encerrada
Cláusula	177	Caput	Em andamento
Cláusula	178	Caput	Em andamento
Deliberação	107	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	107	4	Concluída Internamente
Deliberação	129	1	Em andamento
Deliberação	198	1	Em andamento
Deliberação	198	2	Concluída Internamente
Deliberação	198	3	Em andamento
Deliberação	247	1	Concluída Internamente
Deliberação	247	2	Em andamento
Deliberação	265	1	Concluída Internamente
Deliberação	265	2	Concluída Internamente
Deliberação	301	único	Em andamento
Deliberação	310	3.1	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	313	2	Concluída Internamente
Deliberação	378	5	Concluída Internamente
Deliberação	378	6	Concluída Internamente
Deliberação	381	1	Concluída Internamente
Deliberação	409	2	Concluída Internamente
Deliberação	432	1, 2,3	Concluída Internamente
Deliberação	455	1	Concluída Internamente
Deliberação	458	2	Concluída Internamente
Deliberação	458	3	Concluída Internamente
Deliberação	511	2	Concluída Internamente
Deliberação	511	3	Concluída Internamente
Deliberação	512	1	Concluída Internamente
Deliberação	512	2	Concluída Internamente
Deliberação	512	3	Concluída Internamente

Deliberação	513	1	Concluída Internamente
Deliberação	53	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	625	2	Concluída Internamente
Deliberação	638	1	Concluída Internamente
Deliberação	76	3	Concluída Internamente
Deliberação	76	4	Concluída Internamente
Deliberação	76	5	Concluída Internamente
Deliberação	95	1	Em andamento
Deliberação	99	2	Concluída Internamente
Deliberação	99	3	Em andamento

Entregas do ano de 2023

janeiro de 2023	●	Protocolo do 7º Boletim PMQACH (Campanha 45, 46, 47 e 48)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/22
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jul/Ago/Set 2022)
janeiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Out/22
fevereiro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Nov/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Dez/22
março de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2022)
março de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/22 a Dez/22
maio de 2023	●	Protocolo do 8º Boletim PMQACH (Campanha 49, 50, 51 e 52)
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/23
maio de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/23
junho de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/23 a Mar/23
julho de 2023	●	Implementação da segunda revisão bianual das diretrizes do monitoramento de rios e mar (PMQQS)
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/23
julho de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2023)
julho de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/23
agosto de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/23
setembro de 2023	●	Protocolo do 9º Boletim PMQACH (Campanha 53, 54, 55 e 56)
setembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/23
outubro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/23 a Jun/23
outubro de 2023	●	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
outubro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/23
novembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/23
dezembro de 2023	●	Conclusão da Segunda Revisão Bianual (PMQACH)
dezembro de 2023	●	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2022 à Julho 2023
dezembro de 2023	●	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/23 a Set/23
dezembro de 2023	●	Publicação - Boletim das Águas-Rios Set/23

● Concluído

● Planejado

● Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de R\$ 31.517.144 para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,8 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentorioce.org;
- 696 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 80 pontos de monitoramento distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 estações automáticas formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 100 parâmetros físicos, químicos e biológicos são analisados na água e 53 nos sedimentos

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 77 pontos, sendo 31 com tratamento e 46 sem tratamento em 23 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do mês

Protocolo do Ofício FR.2023.1575 referentes aos Boletins contendo os resultados do monitoramento da qualidade da água para consumo humano.

Indicadores

I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais

Meta Global: 90%
Percentual(%)

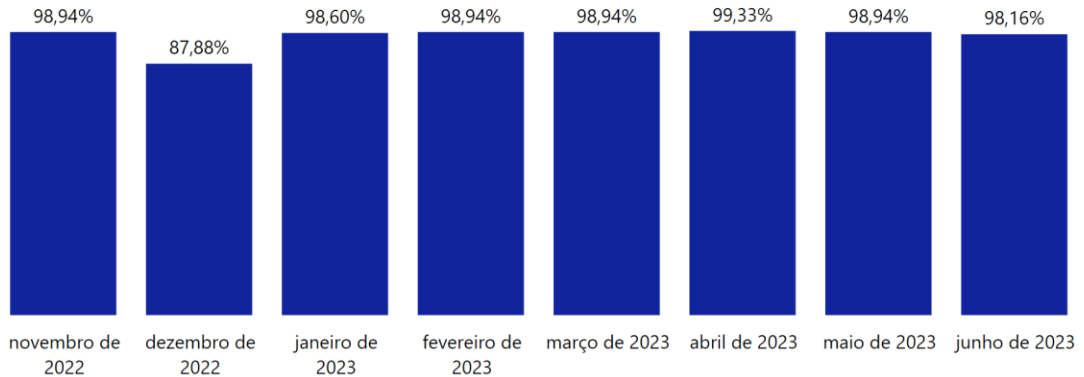


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 90%
Percentual(%)

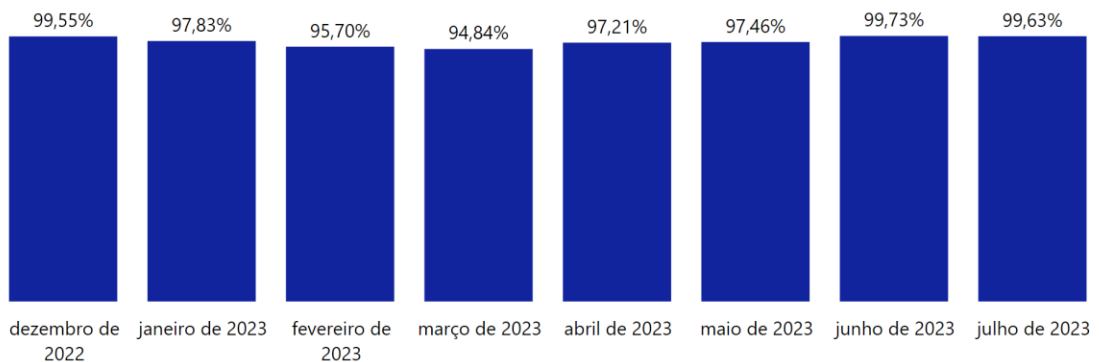


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas

Meta Global: 80%

Percentual(%)

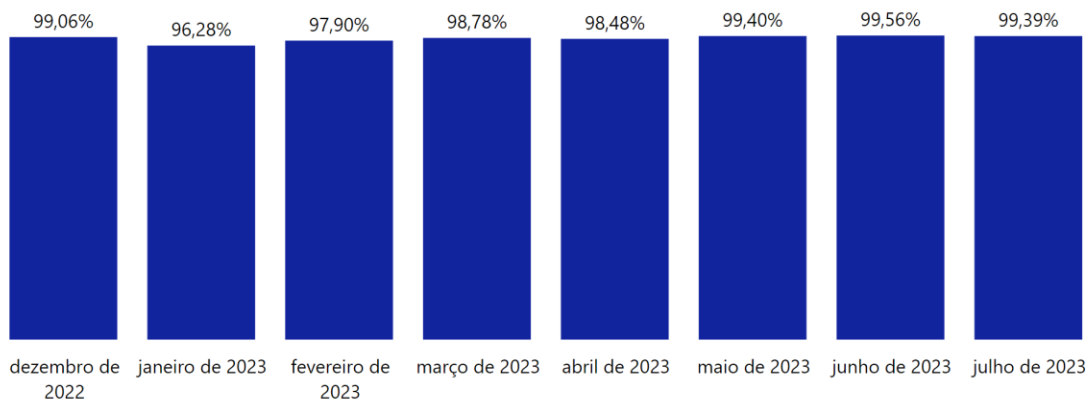


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação

Meta Global: 90%

Percentual(%)

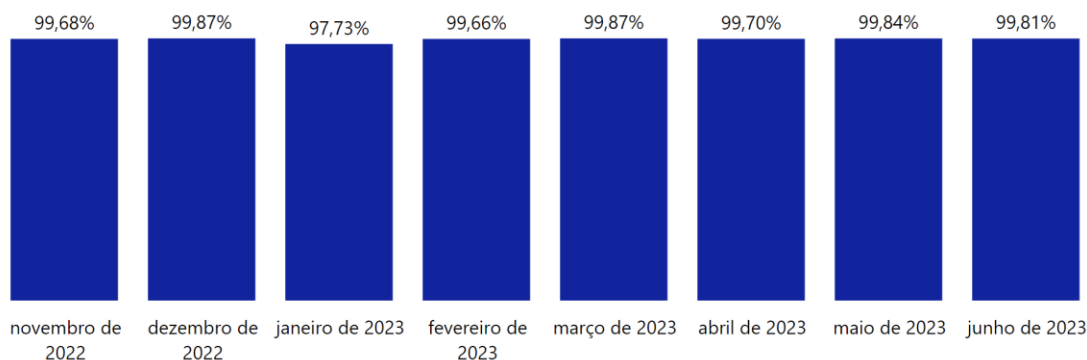


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores

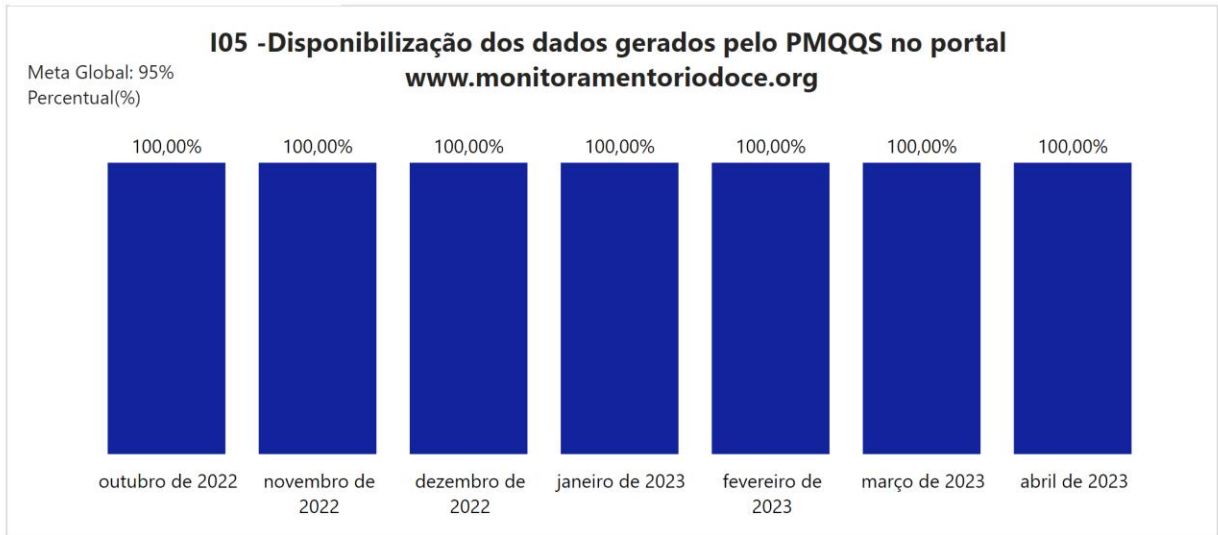


Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org - Frequência Mensal

Os dados do monitoramento convencional do mês ainda não foram disponibilizados no Portal, devido a uma falha na interface entre o DataLake e GIS/Portal que está sendo tratada pela equipe de TI.

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

















Objetivo

- Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
- Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
- Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
- Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.


Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	181	Caput	Em andamento
Cláusula	182	Caput	Em andamento
Deliberação	114	2	Concluída Internamente
Deliberação	138	2	Concluída Internamente
Deliberação	218	3	Concluída Internamente
Deliberação	218	4	Concluída Internamente
Deliberação	221	1	Concluída Internamente
Deliberação	283	3	Concluída Internamente
Deliberação	318	3	Concluída Internamente
Deliberação	36	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	472	3	Em andamento
Deliberação	472	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	5	Concluída Internamente
Deliberação	535	6	Em andamento
Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

fev/23		Protocolo do Relatório Final AIA REVIS Santa Cruz
jul/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 2
jul/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo 5
jul/23		Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 1 - FBDS
jul/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
ago/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo 5
ago/23		Protocolo do Relatório Final AIA Grupo 1
ago/23		Protocolo do Relatório Preliminar de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
set/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 5
set/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo 6
set/23		Plano de Manejo REVIS elaborado - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
set/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Bahia
set/23		Realização da Reunião Devolutiva Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
out/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Bahia
out/23		Protocolo do Relatório Final de Avaliação de Impactos Grupo Costeiras 1 e 2 OUTRAS UCS
dez/23		Entrega dos estudos de AIA nas UCs - Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 14/2020 (FBDS)

 Concluído

 Planejado

 Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números

Fatos relevantes do mês

Em 24/07/2023, foi realizada a Reunião Devolutiva Grupo 1.

Indicadores

I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

Medições dos meses de Maio e Junho de 2022 alteradas, para correção do cálculo, de acordo com o documento de definição em vigor.

I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Meta Global: 100%
Percentual(%)



Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores

I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

Meta Global: 100%
Percentual(%)




Gráfico 3: I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

PG040 CAR e PRAs

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	183	Caput	Em andamento
Deliberação	28	n/a	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) do território Baixo Rio Doce
- fevereiro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Alto Rio Doce
- agosto de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) no território Médio Rio Doce
- outubro de 2023 ● Conclusão do Fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

608 imóveis rurais elegíveis ao Formato do CAR. Deste total 79 (13%) imóveis declinaram e 529 (87%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados. Dos aderidos, 515 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do mês

Realização da 4ª oficina do Marco Legal do PRA no Espírito Santo.

Finalização da implantação do piloto do PRA na propriedade 2 de MG.

Finalização da implantação do piloto do PRA na propriedade 1 de ES.

Entrega das vídeo aulas e manual sobre a análise do CAR para o IEF.

Indicadores

I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova

Meta Global: 100%
Percentual(%)

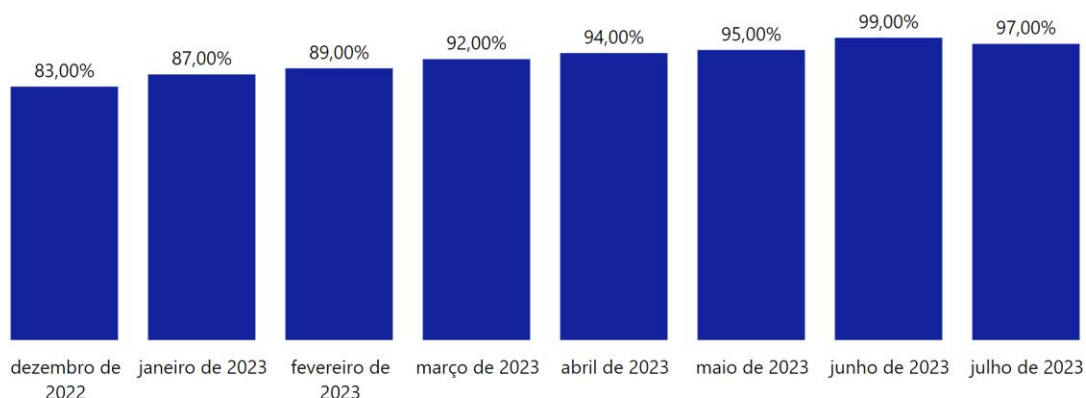


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)

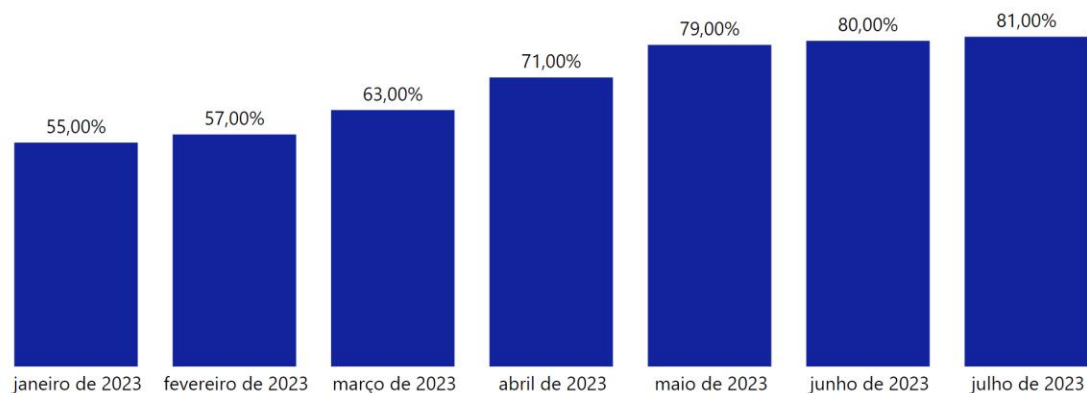


Gráfico 2: I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa

Meta Global: 100%
Percentual(%)

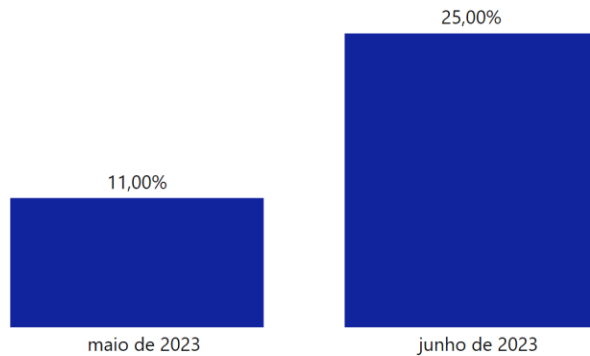


Gráfico 3: I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa - Frequência Mensal

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	143	§único	Em andamento
Deliberação	171	2	Concluída Internamente
Deliberação	180	3	Concluída Internamente
Deliberação	20	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	208	6	Concluída Internamente
Deliberação	208	8	Concluída Internamente
Deliberação	254	2	Concluída Internamente
Deliberação	291	2	Concluída Internamente
Deliberação	428	1	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	49	caput (ação 2)	Em andamento
Deliberação	69	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	78	n/a	Concluída Internamente
Deliberação	85	3	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2023

novembro de 2023 ● Demais pagamentos referentes a Deliberação 428 - Cláusula 143 - ES - Concluído

● Concluído ● Planejado ● Reprogramado

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes**;
- Os ressarcimentos somam **R\$ 53,97 milhões** pagos para às **Prefeituras** e **R\$ 29,95 milhões** pagos aos **Orgãos Compromitentes**.
- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R\$ 654,7 Mil**, referente a 2 **órgãos comprometentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do mês

Não houve Fatos Relevantes no Período

Indicadores

I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)

Meta Global: 100%
Percentual(%)

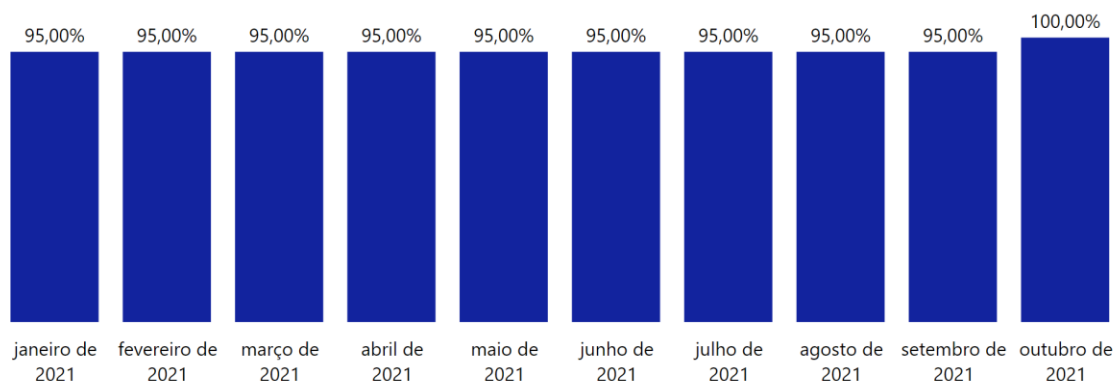


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

I02 – % de ressarcimento às prefeituras

Meta Global: 100%
Percentual(%)

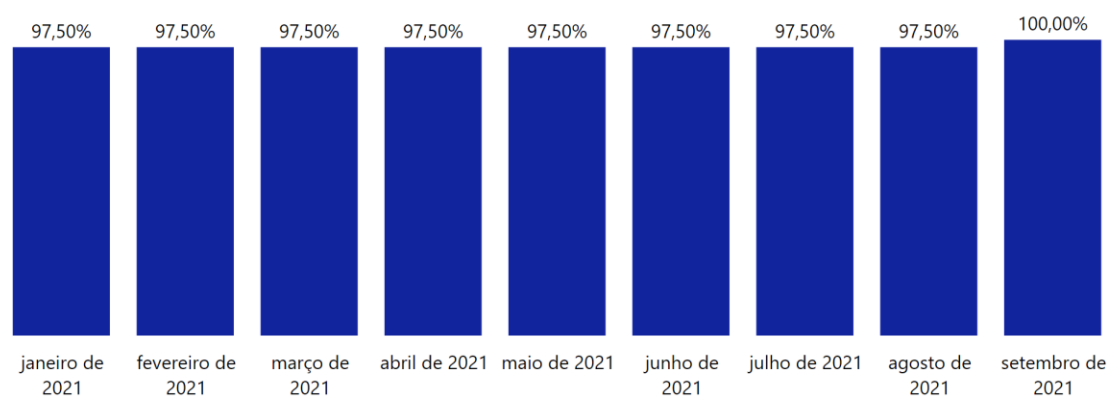


Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)

Meta Global: 100%
Percentual(%)

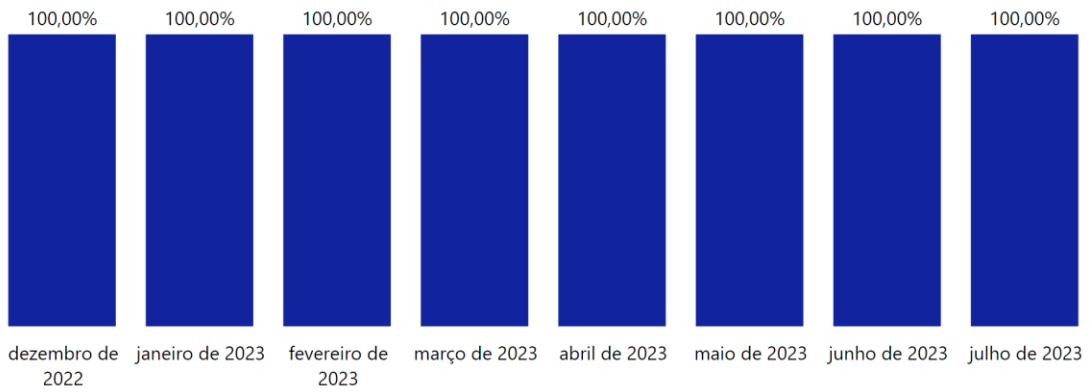


Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

- I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:
- a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;
 - b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;
 - c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;
 - d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;
 - e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;
 - f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossustentância das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;
 - g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;
 - h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. **INDIRETAMENTE IMPACTADOS:** as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na **ÁREA DE ABRANGÊNCIA** e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. **ÁREA AMBIENTAL 1:** as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. **ÁREA AMBIENTAL 2:** os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobralia, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. **PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. **PROJETOS SOCIOECONÔMICOS:** são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. **PROJETOS:** são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. **PODER PÚBLICO:** órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. **ÓRGÃOS AMBIENTAIS:** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. **ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS:** Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. **PROGRAMAS REPARATÓRIOS:** compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.



XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

- a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;
- b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

- c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;
- d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;
- e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;
- f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;
- g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

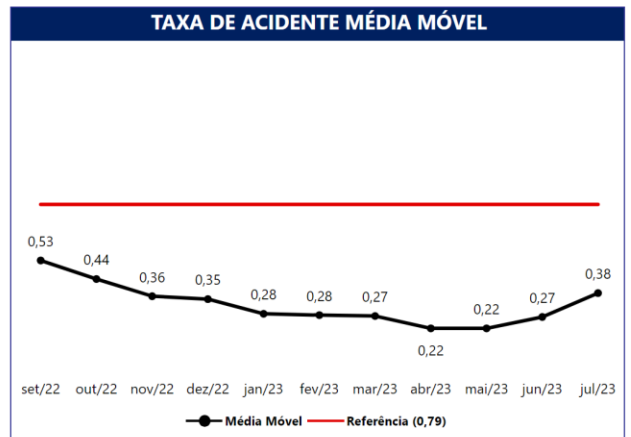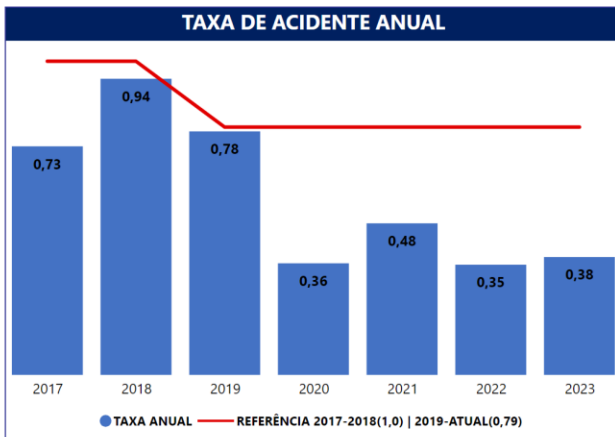

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

PG	Programas	Anual Total				Anual Acumulado			
		Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	16,0	6,2	-9,7	-61,0%	7,4	6,2	-1,2	-16,3%
PG15	INOVAÇÃO	5,4	3,2	-2,3	-41,6%	2,8	3,2	0,4	15,1%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	4,0	22,8	18,7	464,3%	2,6	22,8	20,1	770,0%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	4,1	3,1	-1,0	-25,1%	2,5	3,1	0,6	22,8%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	232,9	96,0	-136,9	-58,8%	103,9	96,0	-7,9	-7,6%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	40,0	27,5	-12,5	-31,2%	18,5	27,5	9,0	48,9%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	4,1	4,0	-0,2	-4,2%	3,4	4,0	0,5	15,3%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	58,7	22,6	-36,1	-61,5%	36,8	22,6	-14,2	-38,6%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	13,4	30,5	17,1	127,9%	12,5	30,5	17,9	142,8%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25,2	4,8	-20,4	-81,0%	14,8	4,8	-10,0	-67,7%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	4,4	2,3	-2,1	-47,6%	1,3	2,3	1,0	72,4%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	12,9	0,2	-12,8	-98,8%	7,7	0,2	-7,6	-98,0%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,7	1,1	-1,6	-58,6%	1,4	1,1	-0,3	-23,0%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	58,1	46,2	-11,9	-20,4%	45,8	46,2	0,5	1,0%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	4,1	2,1	-2,1	-50,4%	3,8	2,1	-1,7	-45,8%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	123,2	15,7	-107,5	-87,3%	97,6	15,7	-81,9	-83,9%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		609,3	288,1	-321,2	-52,7%	363,0	288,1	-74,9	-20,6%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	85,7	46,9	-38,8	-45,3%	44,4	46,9	2,4	5,5%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	3228,7	1253,1	-1975,6	-61,2%	2391,9	1253,1	-1138,7	-47,6%
PG03	POVOS INDÍGENAS	227,3	67,7	-159,7	-70,2%	123,0	67,7	-55,4	-45,0%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	3,2	6,6	3,4	106,3%	1,1	6,6	5,5	489,7%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	27,3	14,5	-12,8	-47,0%	15,4	14,5	-1,0	-6,2%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	75,5	39,8	-35,7	-47,3%	45,1	39,8	-5,3	-11,7%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	14,0	5,0	-9,0	-64,4%	10,5	5,0	-5,5	-52,5%
PG08	REASSENTAMENTO	1642,6	834,9	-807,7	-49,2%	1091,0	834,9	-256,1	-23,5%
PG09	UHE CANDONGA	262,9	158,2	-104,7	-39,8%	178,8	158,2	-20,7	-11,6%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	118,9	57,7	-61,2	-51,5%	82,0	57,7	-24,2	-29,6%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	10,1	5,3	-4,7	-47,1%	5,4	5,3	-0,1	-1,2%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	16,6	6,0	-10,6	-64,1%	7,6	6,0	-1,7	-22,0%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	6,6	3,0	-3,6	-53,9%	3,2	3,0	-0,1	-4,5%
PG14	SAÚDE	6,6	2,5	-4,2	-62,8%	5,0	2,5	-2,5	-50,7%
PG16	PESCA	20,1	8,2	-11,9	-59,2%	12,6	8,2	-4,4	-34,7%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	88,2	54,3	-33,9	-38,4%	43,8	54,3	10,6	24,1%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	13,7	5,5	-8,1	-59,6%	7,2	5,5	-1,7	-23,5%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	445,8	235,3	-210,5	-47,2%	244,4	235,3	-9,1	-3,7%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	146,2	78,4	-67,7	-46,3%	76,0	78,4	2,4	3,2%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,0	-0,3	-0,3		0,0	-0,3	-0,3	
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	29,4	20,1	-9,2	-31,5%	17,6	20,1	2,5	14,2%
PG28	BIODIVERSIDADE	169,2	51,5	-117,7	-69,6%	108,8	51,5	-57,3	-52,7%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	33,7	14,5	-19,2	-57,1%	22,4	14,5	-7,9	-35,4%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	172,2	79,4	-92,8	-53,9%	98,4	79,4	-19,0	-19,3%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	31,5	17,7	-13,9	-44,0%	18,3	17,7	-0,6	-3,5%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	7,5	1,6	-5,9	-78,7%	2,3	1,6	-0,7	-30,6%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	311,1	184,6	-126,6	-40,7%	180,2	184,6	4,4	2,4%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG99	CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Reparatórios		7194,6	3251,8	-3942,8	-54,8%	4836,3	3251,8	-1584,5	-32,8%
Total Programas		7803,8	3539,9	-4263,9	-54,6%	5199,3	3539,9	-1659,4	-31,9%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	172,1	97,2	-75,0	-43,6%	97,1	97,2	0,1	0,1%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	141,1	18,3	-122,8	-87,0%	116,0	18,3	-97,7	-84,2%
Total Despesas Administrativas		313,3	115,5	-197,8	-63,1%	213,1	115,5	-97,6	-45,8%
Total Geral		8117,1	3655,4	-4461,7	-55,0%	5412,4	3655,4	-1757,1	-32,5%

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,32	1,11	-0,22	-0,16	Fatores Internos: 1MM - Incentivo à leitura: aceleração das entregas da etapa de modernização realizada em 2022. Plano de ação: N/A. Realidade financeira reorganizada no draft21. 0,2 MM - 3ª edição do Edital Doce: postergação da publicação do Edital Doce em virtude das discussões com a CT para realização da estratégia do eixo de Promoção dos Destinos Turísticos Plano de ação: Estruturar junto ao fornecedor a aceleração das análises dos projetos durante o processo de seleção.	
PG15	INOVAÇÃO	0,39	0,65	0,26	0,68	Fatores Internos: (Aceleração) R\$ 0,2 MM UD Tumiritinga: Anteciação de atividades. Plano de Ação: N/A. R\$ 0,2 MM Hub de Inovação: Antecipação de atividades. Plano de Ação: N/A.	
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	0,50	20,14	19,64	39,20	Fator Interno: R\$ 20,0 MM Fundo Diversifica Mariana: Antecipação de recursos para Modalidade Financiamento, por conta de demanda acima da esperada. Plano de Ação: N/A.	
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,48	0,58	0,10	0,20	Fator externo: R\$ 0,4 MM Estudos e Mapeamento: Valor referente a execução do estudo de prospecção de potenciais fornecedores estava previsto para 2024. Com sua aprovação pelo CIF, programa iniciou a execução e ajustou no Draft21. Atraso no início da execução do Estudo de Mapeamento de Mão de Obra devido parecer CTEI e Deliberação CIF, dessa forma ocorreram gastos não previstos para o ano de 2023. Plano de Ação: Ajustar Draft 21 (concluído). Fator interno: R\$ 0,1 MM Empresa Especializada RH: Contrato CPHO. Impacto reajuste contratual acima do previsto. Plano de Ação: N/A.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	14,34	16,85	2,51	0,18	<p>Fatores Internos (-R\$ 8,50 MM) Valores previstos para 2023 que foram medidos em dezembro/2022. (-R\$ 6,11 MM) Contratos relacionados ao Edital da Bacia do Manhuaçu com início da vigência 6 meses após o previsto. Bacia do Suaçuí em processo de contratação, atualmente com desvio de 6 meses em relação ao previsto. +R\$ 6,71 MM Aumento no fornecimento de insumos para os processos de cercamento.</p> <p>Plano de Ação: - Planejamento foi revisado no Draft 21. Bacia do Manhuaçu - replanejar atividades junto as contratadas com vistas à recuperação da curva e performance. Bacia do Suaçuí - acompanhar processo de contratação com suprimentos e governança. - N/A - Desvio financeiro em função da disponibilização dos insumos que não refletem avanço físico, que só será refletido a partir da implantação do cercamento.</p>	
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	2,12	5,35	3,23	1,52	<p>Fatores Internos +R\$ 7,46 MM Alocação de recursos do PG26 em DR do PG27. +R\$ 1,58 MM Aumento no fornecimento de insumos para os processos de cercamento.</p> <p>Plano de ação: - Remanejar valores de DRs do PG 26 para o PG 27. - N/A - Desvio financeiro em função da disponibilização dos insumos que não refletem avanço físico, que só será refletido a partir da implantação do cercamento.</p>	
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	0,34	0,17	-0,17	-0,50	<p>Fatores Externos (-R\$ 0,12 MM) ENGENHARIA CETAS ES - Alguns estudos complementares aguardam alinhamento com o IBAMA. Ação: Acompanhar junto à Engenharia a retomada dos estudos complementares - Prazo: 30/11.</p> <p>Fatores Internos (+R\$ 0,65 MM) GERENCIAMENTO CETAS ES - Contrato medido sob demanda. Ação: Monitorar as atividades junto à Engenharia para acompanhamento das demandas, conforme plano de trabalho apresentado - Prazo: 30/11</p>	
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	5,25	3,85	-1,40	-0,27	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos: (R\$ 14,2MM) Os municípios não apresentam as medições em conformidade com o previsto em cronograma, devido a problemas com licitação, documentação de terreno, licenciamento, aditivos contratuais ou por indefinições de ações pela administração municipal.</p>	
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	0,34	1,10	0,75	2,21	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: R\$ 17,9MM Adutora - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022. Fatores Externos:</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,56	1,84	1,28	2,29	<p>Fatores Interno (R\$ 7 MM) - IFES: referente a postergação de repasse definitivo; (R\$ 1,64 MM) - UFMG/UFOP: demora na conclusão do take off que ocasionou atraso no pagamento de bolsa da 2ª turma do aperfeiçoamento; (R\$ 1,4 MM) - Lideranças Jovens ciclos 2 e 3: reprogramação da execução para adequar à aceleração;</p> <p>Plano de Ação: Apresentar ao CIF manifestação conjunta do IFES, governo do Estado do ES e Fundação Renova, favorável ao repasse definitivo, para aprovação da estratégia e quitação das obrigações referentes ao projeto. Para os demais projetos, o valor será absolvido nos próximos meses.</p>
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,05	0,46	0,41	8,18	<p>Fatores Internos: ESCOLA SEGURA / NUPDEC / APOIO A DEFESA CIVIL R\$ 0,73 MM Medição de dez/22 lançada em jan/23. Necessidade de mais HH para conclusão do contrato gerando aditivo de prazo até abril/23. Suplementação do orçamento e nova contratação para atendimento da deliberação 623 (postergação de 18 meses NUPDEC e Escola Segura) a partir de jun/23. Plano de ação: Monitorar junto ao fornecedor as próximas medições.</p> <p>AVCB ESCOLA SEGURA R\$ 0,22MM (SPCI) do Escola Segura - verbas não previstas para acompanhamento e cadastramento das escolas no INFOSCIP e valores de gerenciamento não previstos no orçamento.</p> <p>Plano de ação: Inserir no próximo ciclo orçamentário os custos com o serviço para atendimento aos municípios, monitorar a aprovação deste orçamento e as medições futuras.</p> <p>CENSO ÁREAS DE RISCO 0,2MM PU para pagamento de pontos extras do mapeamento de áreas de risco identificados durante a execução. Plano de ação: Contrato encerrado e variação inserida no draft 2021.</p>
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,96	0,03	-0,93	-0,97	<p>Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias. Postergação: (-R\$ 12,8 MM)</p> <p>- CIT Mariana – A Prefeitura de Mariana retirou a indicação do Terminal turístico e indicou a Arena esportiva do município como nova localidade para instalação do CIT. Em fase de avaliação está sendo elaborado estudo do projeto construtivo da nova indicação e re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento. Em paralelo será realizada a instalação temporária em espaço provisório até o término da formalização da parceria PMM. - CIT GV – O Projeto executivo finalizado, porém PMGV solicitou atualização do termo de parceria, aguardando nova assinatura do documento para contratação de empresa para execução das obras de instalação do equipamento e aguardando da aprovação da Apro. - CIT Linhares - Termo de Parceria aguardando assinatura pelo ICMBio. Processo concorrencial de contratação da empresa responsável pelas obras realizado.</p> <p>Plano de Ação: O Programa ampliou os pontos de acesso para plataforma digital de 3 para 13 unidades em todo o território visando mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar a ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da parceria com os entes, os orçamentos sofrem uma execução abaixo do planejado sendo replanejado na próxima janela de oportunidade.</p>
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,20	0,33	0,13	0,63	<p>Economia: (R\$ 0,3 MM) - Variação ocorreu devido ao processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento. Fatores Internos: N/A Fatores Externos: N/A</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Variação	%	
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	2,63	0,09	-2,53	-0,97	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>Fatores Externos</p> <p>R\$ 6,09 MM</p> <p>Causa: Repasse PERD Ano III - Pagamento de valor a maior devido a reajuste pelo índice IPCA.</p> <p>Plano de Ação: N/A</p> <p>(R\$ 5,64 MM)</p> <p>Causa: Postergação de gastos dos projetos de consolidação do RVS</p> <p>Plano de Ação: Priorizar a contratação dos serviços e equipamentos em que tivemos termo de referência recebido.</p>
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,22	0,28	0,05	0,24	<p>Mudança de Solução</p> <p>(R\$ 0,74) - ELABORAÇÃO DO PRA</p> <p>(R\$ 0,43) - IMPLANTAÇÃO DO PRA - RESTAURO FLORESTAL</p> <p>Falta de engajamento dos produtores impactando nas atividades da empresa contratada para elaboração dos PRADAs; e Atraso nas atividades de implantação dos PRA Pilotos pelos produtores.</p> <p>Plano de ação: N/A</p> <p>Reprogramação da execução</p> <p>(R\$ 0,062) - CADASTRO DAS PROPRIEDADES RURAIS - CAR</p> <p>(R\$ 0,58) - CONSULTORIA AMBIENTAL PG40</p> <p>(R\$ 0,093) - COMUNICAÇÃO PG40</p> <p>Atividades replanejadas no cronograma aprovado em março/2023.</p> <p>Plano de ação: Desembolsos revistos no Draft21.</p>
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	51,30	0,06	-51,25	-1,00	<p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 0,17 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>+R\$ 15,0 MM: Por definição externa, realizado o repasse de 100% do orçamento para operação do aterro sanitário Mariana.</p> <p>+ R\$ 0,49 MM: Decisão judicial: continuidade do fornecimento de água por 36 meses (R\$35,0 MM): Agenda Integrada Novas Áreas – depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação em programa.</p> <p>(R\$ 16,9 MM): Base Integrada Segurança Pública Mariana: Repasse/Acordo em negociação. CIF solicitou alterações.</p> <p>(R\$ 15,0 MM): Apoio SUS: Ação ainda não aprovada pelo CIF.</p> <p>(R\$ 10,0 MM): Por definição externa, o repasse planejado para obra do SAA Degredo não será realizado. Em negociação com as partes tratativa definitiva para essa ação.</p> <p>(R\$ 7,0 MM): Agenda Integrada Ensino Ponte Nova – acordo não firmado</p> <p>(R\$ 3,0 MM): Agenda Integrada Ensino São Pedro dos Ferros – acordo não firmado</p> <p>(R\$ 7,0 MM): Agenda Integrada Ensino Ouro Preto – depósito judicial já realizado (recuperável). Aguardando decisão judicial para alocação em programa.</p> <p>(R\$ 3,4 MM): Perícia Agenda Integrada suspensa.</p>
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Compensatórios		81,01	52,87	-28,14	-0,35	Fatores Externos

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$: 6,0 MM
PG01	CADASTRO	7,80	19,03	11,23	1,44	Fatores Externos Antecipação: reprogramação da execução. Pagamento dos pleitos 1, 2 e regularização do contrato 414 com a Synergia. Plano de Ação: Valores ajustados no Draft21.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	219,30	580,21	360,91	1,65	Fatores Externos Antecipação: +R\$ 240,31 +R\$ 169,44 - Novel: liberação de acordos e pagto dos retroativos. +R\$ 70,87 - Novel Ação Judicial: Maior volume de acordos. Postergação: (- R\$ 1.379,04) (- R\$ 549,31) – Aba Recursal: pendência na entrega de Laudo Perito. (- R\$396,23) – Novel Mariana, BL e DA: baixa qualificação casos novos. (- R\$ 155,50) – Definitividade Lucro Cessante: projeto está on hold devido as decisões recentes do judiciário. (- R\$ 150,20) – Demais indeniz.: processos do DG laudos abaixo do prev. (- R\$ 115,18) – Infra e Serviços: despesa menor que o previsto. (- R\$ 12,62) – Mariana ACP: redução do ticket médio.

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Variação	%		
PG03	POVOS INDÍGENAS	16,62	9,97	-6,64	-0,40	<p>Economia:</p> <p>(R\$ 1,7 MM) Alimentação animal Resplendor. Valor desembolso do contrato foram estimados a maior. Foram planejados dois reajustes no contrato, mas ocorreu uma única vez durante o período da previsão. Plano de Ação: Remanejado o valor para a contingência na Draft 21.</p> <p>(R\$ 6,4 MM) Auxílio Subsistência Emergencial TG, Comboios e Krenak. O valor estimado foi considerando um salário-mínimo maior do que o praticado no mês de julho/23, o que justifica o desembolso abaixo do previsto. Em TG e Comboios ainda ocorre que o quantitativo de titulares e dependentes já está considerando 10% de inclusão de famílias referente ao acordo vigente e o valor da cesta básica foi estimado a maior. Plano de Ação: Desembolso adequado no orçamento no Draft 21.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 2,8 MM) Fornecimento de Água Krenak. Para os contratos desse DR, o valor de desembolso foi estimado a maior que o praticado atualmente, principalmente referente aos caminhões pipa. Plano de Ação: Seguir com o monitoramento dos contratos e a curva de desembolso já ajustada no Draft 21.</p> <p>(R\$ 4,1 MM) Gerenciamentos, Estudos e outros. Contratos sob demanda. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 5,8 MM) Outras despesas Krenak e acessos prioritários. Os contratos dessa atividade não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, consequentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal e orçamento adequado no Draft21 considerando a sazonalidade.</p> <p>(R\$ 23,6 MM) Retomada Econômica TG e Comboios: O aditamento do acordo será definido após a audiência de conciliação que foi adiada para setembro/23, uma vez que as próximas parcelas estão vinculadas à assinatura e homologação do termo de execução do PBAI. Plano de ação: Acompanhar a audiência de conciliação, em setembro/23.</p> <p>(R\$ 7,4 MM) Detalhamento, Execução do PBA e SAA Comboios e TG. As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p> <p>(R\$ 3,6 MM) SAA Krenak. Ação replanejada pela coordenação, tendo em vista o cenário na TI Krenak. Plano de Ação: Orçamento adequado no Draft 21.</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,11	1,22	1,11	9,64	<p>Fatores Externos</p> <p>R\$ 5,6 MM - Pagamentos da assessoria técnica ASPERQD e perita Kearney executados em atendimento à decisão judicial, não previstos no Draft20. E, pagamento realizado ao perito judicial, conforme decisão judicial referente aos honorários para mediação de audiências com povos originários do ES. Plano de Ação: Despesas incluídas no Draft21.</p> <p>R\$ 0,6 MM - PBAQ: atividades dos programas do PBAQ de gestão e monitoramento; finalização dos livros de medicina tradicional e referências culturais. Oficinas de revisão do Programa que atrasaram porque a CT-IPCT e respectivo GT solicitaram postergação do prazo, devido às mudanças dos representantes do governo federal. Plano de Ação: Desembolso ajustado no Draft21 e acompanhar o cronograma das oficinas.</p> <p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 0,7 MM) - Gerenciamento do Programa: despesas por demanda. Diálogo especializado: recurso será utilizado para contratação de produtora de eventos que fará a logística das atividades coletivas nas comunidades. Plano de ação: Desembolso ajustado no Draft21.</p>
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	5,10	1,96	-3,14	-0,62	<p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 1,0 MM) - Planos Municipais e Estadual em Proteção Social: Antecipação de repasses financeiros e baixas contábeis para o plano de demais municípios e plano estadual que estavam previstas no orçamento para os meses de julho, setembro e dezembro; Plano de Barra Longa com todas as baixas realizadas, mas foram previstos no Draft20 valores que não serão mais executados, e já corrigido no Draft21; valor previsto no Plano de Mariana, para desembolso e baixa contábil conforme Draft20 não foi realizado, de acordo com a orientação do jurídico da FR, uma vez que o município não estava realizando o gasto conforme o valor depositado. O cronograma foi ajustado no Draft21.</p> <p>Plano de ação: acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas dos Planos Municipais e as ações desenvolvidas.</p>
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	6,13	6,69	0,56	0,09	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 2,0 MM) - Canais de Relacionamento: Execução a menor nos itens de manutenção dos das CIAS, principalmente contratos geridos por outras áreas como ADM, TI, Segurança.</p> <p>Plano de ação: Acompanhamento das execuções dos gastos com as áreas de suporte e adequações no próximo ciclo orçamentário.</p> <p>(R\$ 1,6 MM) - Participação e Diálogo: Execução a menor no contrato da a empresa responsável pela execução das ações de Diálogo Social. Reprogramação das ações relativas a plataforma interativa. Postergação das ações relativas aos FPC.</p> <p>Plano de ação: Acompanhar a curva orçamentária do programa visando maior aderência das ações em implementação, além das estratégias de execução dos foruns e plataforma. Ações propostas para o próximo ciclo ainda no aguardo da aprovação.</p> <p>(R\$ 2,3 MM) - Assessorias Técnicas: Devolução de valor levantado em relação ao lançamento de maio/22 referente ao saldo bloqueado na ACP Mariana. Este valor será regularizado em 2024, pois foi realizado em 2023 e fica histórico da entrada no orçamento.</p> <p>Plano de Ação: Valores serão ajustado em 2024, pois no ano de 2023 ficará histórico da entrada.</p> <p>(2,3MM) - Rosa Fortini: Pendente resolução interna das prestações contas para efetuar lançamento e dar baixa no sistema.</p> <p>Plano de Ação: Tratar as pendências das prestações de contas para prosseguir com os lançamentos.</p> <p>Fatores Externos</p> <p>(R\$ 0,5 MM) - Decisão Judicial: Assessorias técnicas: Pagamento de acordo judicial conforme previsto em pedido de compra. Orçamento estava contemplado para 2022 e será atualizado no próximo draft.</p> <p>Plano de ação: Valores serão ajustados no Draft21.</p>
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,73	0,72	-0,01	-0,01	<p>1. Desvio Principal (85%) - Valores para aquisição de animais de grande porte</p> <p>1.1. Fatores internos:</p> <p>Redimensionamento (redução) e postergação de valores destinados à aquisição de animais em função de alteração da estratégia de priorização para apresentação de propostas aos atingidos proprietários de animais: i. Casos que estão em fase de encerramento atendimento de reassentamento via pecúnia global; ii. Casos com expectativa de mudanças para 2023; iii. Casos de apresentação de pecúnia para autogestão de benfeitorias não reprodutivas associadas à aquisição de animais; e iv. Casos com possibilidade de antecipação de encerramento de atendimento do Programa 07.</p> <p>1.2. Fatores Externos:</p> <p>Postergação de custos para aquisição de animais em função de: i. Propostas apresentadas sem retorno de aceite ou não; ii. Tempo de homologação junto à CEJUSC das propostas aceitas.</p> <p>2. Outros desvios (15%)</p> <p>2.1. Fatores internos: i. Submissão de nota do contrato 4900000394 (ERG Engenharia Ltda.) posterior ao período de medição (31/07/2023). Atividade realizada somente em 02/08/2023; ii. Recursos para atividades sob demanda.</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG08	REASSENTAME NTO	155,51	95,13	-60,38	-0,39	<p>Economia (R\$0,0)</p> <p>Fatores Internos (- R\$ 256,1)</p> <p>(- R\$ 46,0) Assist. Impactados - Atraso Valores do PERPE não realizados</p> <p>(- R\$ 37,1) Novas moradias Familiar. Atrasos das Obras F1, F2, F3;</p> <p>(- R\$ 32,9) Novas moradias Demais custos Pag. Pecúnia abaixo do previsto</p> <p>(- R\$ 25,7) Atraso contratação (Camar, SAA Furquim, Ecoponto);</p> <p>(- R\$ 24,5) Contenções Familiar. Custos lançados em novas moradias</p> <p>(- R\$ 24,9) Infra Sítiantes. Reprogramação das atividades.</p> <p>(- R\$ 22,8) Equipamentos públicos Bento. Interrupção de Id's;</p> <p>(- R\$ 19,0) Novas moradias Bento. Alteração estratégia contratação novos Ids</p> <p>(- R\$ 18,3) Contenções Bento. Frentes em mobilização</p> <p>(- R\$ 16,3) Iluminação pública Paracatu: atraso na entrega de medições;</p> <p>(- R\$ 15,5) Construção Trevo Baixa performance da empresa</p> <p>(- R\$ 10,5) Diversos Demais Custos reajustes e pleitos com valor menor.</p> <p>(- R\$ 13,1) Diversos Paracatu não realizado acesso Pedras.</p> <p>R\$ 98,4 Pagamento do acordo Judicial de Gesteira</p> <p>(- R\$ 43,9) Outras atividades reprogramadas.</p> <p>Fatores Externos (R\$0,0)</p>
PG09	UHE CANDONGA	21,43	24,79	3,36	0,16	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 20,7 MM)</p> <p>Desembolso menor que o previsto nos serviços de Auditoria e Consultoria, Custos Fundiários, Dragagem, Drenagem, Gerenciamento e S&S, Infra Estrutura de Pilhas e Empilhamento e Obras Cívicas.</p> <p>Fatores Externos</p>
PG10	INFRAESTRUTU RA IMPACTADA	13,81	9,72	-4,08	-0,30	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 33,3MM)</p> <p>(R\$ 1,8MM): Pontes já finalizadas antes do previsto.</p> <p>R\$ 0,62MM: Escopos sob demanda (Man. Edificações e Vias)</p> <p>Ações: Valores ajustados no Draft21. Escopos sob demanda em andamento.</p> <p>(R\$ 32,5MM): Pacote Novas Obras - Postergação por mudança de solução para nova contratação.</p> <p>Ações: Pacote de novas contratações em fase de conclusão.</p> <p>R\$ 3,9MM: Campo em Ponte do Gama - Postergação por ineficiência da contratada.</p> <p>Ações: Obra finalizada, empresa em desmobilização.</p> <p>(R\$ 3,6MM): Talude Camargos - Paralisada espeleologia.</p> <p>Ações: Custo transferido para o risco no Draft21 (sem previsibilidade).</p> <p>R\$ 0,04MM: Diversos</p> <p>Fatores Externos: R\$ 9,1MM</p> <p>R\$ 9,1MM: Pagamento honorário do perito conforme decisão judicial.</p>
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,85	1,29	0,44	0,51	<p>Fatores Internos</p> <p>(R\$ 0,1 MM) - Psicopedagógico Institucional:efere-se ao atraso no processo de contratação concorrencial do novo fornecedor para o apoio Psicopedagógico. O processo foi teve atraso na contratação, previsto para fev/22 e finalizado em abr/22, começando as atividades somente em jun/22.</p> <p>Plano de ação: Continuar realizando as ações conforme planejamento</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	2,08	1,25	-0,82	-0,40	<p>Justificativas da variação anual acumulada</p> <p>Fatores Internos (R\$ 1,2 MM) - Eixo imaterial: execução inferior ao previsto das ações da Casa dos Saberes, reprogramação de Plano de Reparação e UNESCO devido à comunidade atraso na aprovação do aditivo do contrato da UNESCO e atraso em prestações de contas do edital doce. Plano de Ação: As ações da casa dos saberes foram ajustadas no contrato para aumento do prazo de execução e refletida no draft 21, além disso, estão sendo antecipadas ações do plano de reparação. Reprogramação da execução do contrato da UNESCO.</p> <p>(R\$ 0,5 MM) - Eixo material: reprogramação das medições dos contratos de infraestrutura e dos contratos utilizados sob demanda. Plano de Ação: As ações de gerenciamento são medidas pela INFRA e serão realizadas até o final de 2023, sendo antecipado ações referentes à capela de Mercês.</p>
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,65	0,92	-0,73	-0,44	<p>Fatores Externos 0,15 MM - Turismo: paralisação das ações de empreendedorismo turístico e promoção dos destinos nos municípios polos em virtude da paralisação das atividades por meio da Deliberação 652 do CIF. Plano de ação: Estruturar nova estratégia de execução do eixo em colaboração com a Câmara Técnica</p>
PG14	SAÚDE	1,60	0,08	-1,52	-0,95	<p>Fatores Externos: (R\$ 3,0 MM) O município de Mariana não efetuou prestação de contas judicialmente do terceiro, quarto e quinto repasses. Por este motivo, não foi realizado o repasse financeiro para suplementação de RH em cumprimento ao acordo judicial. +R\$ 0,6 MM Realização de repasse para complementação do valor disponibilizado em setembro/2022 para suplementação de RH em Barra Longa e aluguel de carros e cartão combustível. Na elaboração do Draft 20, não foi contemplada a possível dilação de prazo do acordo judicial de Barra Longa. (R\$ 0,1 MM) Não realização dos estudos de ARSH, judicializado. Decisões Judiciais determinaram ao CIF a execução dos estudos, que propôs a execução pela FIOCRUZ (Deliberação CIF 548). Plano Ação: Revisão das estimativas e do fluxo econômico no Draft21</p>
PG16	PESCA	1,43	0,54	-0,89	-0,62	<p>Fatores Externos: (R\$ 2,2 M) Projetos da Foz Rampa de Subida de Barco e Edificação de Povoação: Aguardando licença ambiental para iniciar as obras. Plano de ação: Articulação junto à Prefeitura Municipal de Linhares para obtenção da licença ambiental. Prazo: Edificação 11/23 e Rampa 12/23.</p> <p>Fatores Internos: (R\$ 0,8 M) Cultivando para o Pescar: Baixa performance do fornecedor e atraso no processo de aditivo em Suprimentos. Plano de Ação: Acompanhar conclusão do projeto até 11/23. (R\$ 0,8 M) Caracterização e Monitoramento: Postergação da execução das atividades. Plano de Ação: Ajustado Draft21 (concluído). (R\$ 0,6 M) Fomento da Atividade Econômica: Mudança de Solução. Plano de Ação: Ajustado Draft21 (concluído).</p>

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada	
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	4,23	6,28	2,05	0,48	<p>Ações da Infra (R\$ 1,27 MM) - Atividades de infraestruturas em definição de estratégia de execução após a decisão judicial positiva à alternativa de pecúnia. Plano de ação: Definição dos desembolsos a partir da definição da estratégia.</p> <p>Execução (+) (R\$ 11,07 MM) - Avanço nas atividades de Reparação dos danos a jusante; restauro Florestal (PG25) e atividades de adequação hídricas do PASEA. Plano de ação: Realizar análise do cronograma operacional de forma a ajustar os desembolsos no próximo ciclo de atualização do Mapa Orçamentário (Draft2).</p> <p>Mudança de Solução (R\$ 1,45 MM) - GERENCIAMENTO PG17 - Abertura de duas novas ordens de serviço no contrato da Progen para reforço da equipe (PAR 2) - Aumento de escopo. Plano de ação: Desembolsos revistos no Draft21.</p> <p>Prestação de contas de terceiros (R\$ 2,09 MM) -Continuidade do fornecimento de silagem por decisão judicial (Materialização de Risco Calculado no Draft20). Plano de ação: N/A. Desembolsos revistos no Draft21.</p> <p>Economia (R\$ 2,73 MM) - Saving. Custos com Saneamento Rural e Unidades Demonstrativas executados abaixo do previsto; e encerramento das atividades de Melhoria Genética. Plano de ação: Realizar revisão do orçamento no próximo ciclo de atualização do Mapa Orçamentário (Draft22).</p> <p>Processos Internos (R\$ 0,89 MM) - Apropriação indevida de diagrama de rede em alguns contratos; aditivos realizados e reajuste anual. Plano de ação: Desembolsos revistos no Draft21; Verificar possibilidade de reclassificação contábil dos itens apropriados nos DRs de Assistência Técnica (ATER) montante/jusante.</p> <p>Contratos sob demanda (R\$ 0,904 MM) Contratos sob demanda. Plano de ação: Realizar análise das demandas e ajustar desembolsos no próximo ciclo de atualização do Mapa Orçamentário (Draft22).</p>	
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	2,58	0,93	-1,66	-0,64	<p>Fatores Internos: R\$ 0,4 MM Reposição de Equipamentos e Insumos - Foz e Alto Rio Doce: Aceleração das entregas em atendimento aos negócios impactados. Plano de Ação: N/A. (R\$ 1,5 MM) Projeto Cores da Felicidade: Atraso no início do Projeto. Desistência do PG13. Atraso no processo em Suprimentos por conta do fornecedor. Plano de Ação: Novo processo de contratação pretendida somente com o valor disponível no Draft 21. (R\$ 0,6 MM) Reassentamento: Reprogramação das atividades. Plano de Ação: Acompanhar revisão do cronograma e ajustar Draft 22.</p>	
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	37,52	33,15	-4,37	-0,12	<p>Fatores Externos Postergação: (- R\$ 9,11) – AFE: retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial, aumento de ticket médio e aumento de dependentes.</p>	
PG23	MANEJO DE REJEITOS	12,54	11,94	-0,60	-0,05	<p>MANEJO DE REJEITOS Fatores Internos: R\$ 0,84 MM: AÇÕES DE INFRA. (R\$ 1,42 MM) PERÍCIA SEGURANÇA ALIMENTAR EIXO6; (R\$ 1,71 MM) AUDITORIA PG23 (R\$ 0,36 MM) LICENCIAMENTO AMBIENTAL PG23. (R\$ 0,153 MM) EVENTOS E COMUNICAÇÃO PG23, (R\$ 0,077 MM) MANUTENÇÃO DE ACESSOS MANEJO DE REJEITOS Plano de Ação: Corrigir a curva no DRAFT21</p> <p>Fatores Externos PG23 (R\$ 0,30 MM): ARSH e ARE; (R\$ 0,14 MM): MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA; (R\$ 2,91): RENATURALIZAÇÃO Plano de Ação: ARSH e ARE - acompanhar junto ao jurídico e refletir cenários/estratégias no DRAFT21; MANUTENÇÃO DA BIOENGENHARIA: Criar frentes de trabalho adicionais visando o cumprimento do cronograma; RENATURALIZAÇÃO: Buscar junto a CT-GRSA a validação das áreas de expansão;</p> <p>BARRAMENTO: Fatores Externos R\$ 8,6 MM: Pagamento Perícia Eixo 4 Plano de Ação: Ajustado Draft21</p>	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado	Justificativas da variação anual acumulada
		Orçamento	Realizado	Varição	%		
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia	Fatores Internos: (R\$ 0,3MM) Reclassificação de valores realizados em 2022, consultoria do descomissionamento do Dique S4. Fatores Externos: Projeto encerrado no CIF conforme deliberação nº 555.
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,62	3,30	0,68	0,26	Fatores Internos (R\$ 1,9MM) - Desembolso Manutenção Cercamento Restauro (Século XXI e Antônio Garavini) maiores que o previsto Plano de ação: NA (Revisado no Draft21) (R\$0,6MM) - Desembolso Gerenciamento maior que o previsto. Plano de ação: NA (Revisado no Draft21)	
PG28	BIODIVERSIDADE	41,99	1,29	-40,71	-0,97	Economia	Fatores Internos R\$: (46,33) MM Causa: Replanejamento de pagamentos após conclusão dos aditivos ACT-FEST. (36,56) MM Plano de Ação: Promover a fusão dos cronogramas de desembolsos dos aditivos do ATC-FEST na previsão orçamentária, Draft 21. R\$: (8,39) MM Causa: Avanço financeiro dos projetos de pesquisa da Chamada 10 FAPEMIG inferior ao previsto no plano de trabalho, o que é refletido na prestação de contas ano I (inferior ao previsto), e prestação de contas ano II (pendente). Plano de Ação: Identificar junto a FAPEMIG quais pendências ainda encontram-se em aberto junto aos projetos, e cobrar das linhas temáticas a regularização das prestações de contas do ano II. R\$: (2,62) MM Causa: Outros - Valores que serão compensados ao longo do projeto ou readequados no Draft 21. Plano de Ação: N/A
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	4,49	1,79	-2,70	-0,60	Fatores Externos Economia - R\$3,4MM Não execução de análises potenciais no monitoramento (menor coleta de amostras). Menor demanda de peer review (contrato "sob demanda"). (-R\$ 2,4MM). Contratação de menor valor que previsto para Ações 9 e 15 do PABT (Impacto de invasões Biológicas) - R\$ 1,0MM Fatores Internos: -R\$ 3,4MM Replanejamento da contratação para Ações 24 e 25 (Instituto Ipê) - R\$ 1,5MM). Atraso por parte da RNP na conclusão da contratação (R\$ 1,4MM) e atraso por necessidade de Take off contrato da UFV (R\$0,5MM). Ação: Não haverá recuperação em relação ao Draft 20 e o ajuste de cronograma está previsto no Draft 21.	

PG	Programas	Mensal				Anual Acumulado
		Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14,26	9,69	-4,57	-0,32	<p>Economia: Infra RD: (R\$5,7MM) - Abastecimento de água por caminhão pipa: A implantação de medidas alternativas de fornecimento de água, somadas a redução de consumo, em função das baixas temperaturas, promoveu a execução a menor do que o projetado para o contrato. O realizado mensal foi maior do que o orçado devido a problemas internos de processamento da medição, gerando acúmulo da medição atual com parte da anterior. Porém, não houve impacto no realizado anual, devido às reduções nos consumos das localidades.</p> <p>*Fatores Internos: ADUTORA GV R\$ 16,2MM - Dilação do prazo de execução com postergação de atividades que deveriam ter sido executadas em 2022. Rede Elétrica Adutora GV Com postergação da conclusão da obra, os custos previstos com energia elétrica durante período de operação assistida não se concretizaram.</p> <p>Reparação de vias: (R\$7,9MM) - As obras de reparação definitiva de vias ainda não foram realizadas. Medidas paliativas foram adotadas nas localidades até que os processos internos de desenvolvimento de projetos e contratação estejam concluídos. Isto posto, o desembolso projetado para o período não está sendo executado.</p> <p>(R\$15,0MM) Gerenciamento + Licenciamento + C.G.C + Planejamento Integrado Engenharia: variação +R\$174.889,00 processos internos. Medição no DR/Faturamento-alternância</p> <p>Fatores Externos: Infra LI: (R\$ 6,6MM) Furtos de equipamentos no local impactaram os diligenciamentos de Suprimentos e Contratação, atrasando o processo concorrencial e processos judicializados.</p>
PG37	GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>
PG38	MONITORAMENTO DE ÁGUA	2,66	2,23	-0,43	-0,16	Contratos sob demanda executando abaixo do previsto no Draft20.
PG39	CONSOLIDAÇÃO DE UCS	1,36	0,53	-0,83	-0,61	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos R\$ 0,13MM R\$ 0,02 MM Causa: Serviço sob demanda (Painel de especialista, Doce Vivo e Custos adicional COVID 19) Plano de Ação: N/A R\$ 0,11 MM Causa: Ações emergenciais Rebio Comboio (Elaboração de projetos de engenharia) Plano de Ação: N/A</p> <p>Fatores Externos (R\$ 0,83MM) R\$ 0,06 MM Causa: Parceria Unesco - Contabilização de prestação de contas não previstas no Draft 20. Falha no atendimento ao cronograma de prestação de contas por parte da parceira. Plano de Ação: Ajustar a contabilização da prestação de contas entre os programas atendidos por esta parceria. R\$ 0,11 MM Causa: Atraso de envio de prestação de contas pelo parceiro FBDS Plano de Ação: Cobrar a prestação de contas ao parceiro e garantir o atendimento do cronograma de entrega dos produtos planejados. (R\$1 MM) Causa: Atraso no início da execução das ações dos PAs a partir da aprovação do documento pela CTBio Plano de Ação: Iniciar as estratégias de contratação independente da aprovação dos planos de ação pela CTBio</p>

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	26,28	30,28	4,00	0,15	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p> <p>(+R\$6,6 MM) Despesas Finalísticas, sendo (+R\$9,73MM) em Despesas com pessoal; (-R\$3,61MM) com Serviços Contratados e (+R\$0,58MM) em Despesas de Viagem e (-R\$0,02MM) em Despesas Diversas e Materiais.</p> <p>(+R\$ 3,0 MM) Serviços de TI, Contrato 4800095620 Brasoftware - Aditivo não finalizado a tempo para faturamento dentro de 2022 a variação permanecerá até a revisão do próximo Draft.</p> <p>(-R\$ 4,6 MM) Contratos Gestão de Portfólio do Plano de Recuperação (PMO) sob demanda - Accenture, G4f e Progesys.</p> <p>(-R\$ 0,6 MM) Outros como; Contratação de MDO (serviços sob demanda, fornecedor PRESTAR) e serviços relacionados a veículos.</p> <p>Fatores Externos</p>
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Economia</p> <p>Fatores Internos</p>
Total Reparatórios		604,69	854,92	250,23	0,41	
Total Programas		685,70	907,79	222,09	0,32	

***Valores em milhões de reais.**

PG	Mensal					Anual Acumulado
	Programas	Orçamento	Realizado	Varição	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATI VAS	13,40	16,14	2,74	0,20	<p>Economia: (- R\$ 2,68)</p> <p>(- R\$ 0,70) serviços de impressão</p> <p>(- R\$ 0,16) correios e malotes, devido menor volume de informes de rendimentos remetidos via postagem física</p> <p>(- R\$ 0,29) serviços de consultoria Gestão de Riscos, havia previsão de utilização de 4 recursos da KPMG, mas otimizamos as atividades e estamos utilizando 3 recursos.</p> <p>(- R\$ 0,48) serviços não realizados no escritório de Belo Horizonte devido a desmobilização de espaços.</p> <p>(- R\$ 0,72) consultoria para TAC GOV, que passaram a ser alocados em Custeio Governança.</p> <p>(- R\$ 0,33) revisão contratação de consultorias TI</p> <p>Fatores Internos: (+ R\$ 2,77)</p> <p>(+ R\$ 7,75): Despesas com pessoal - pagamento de horas extras relativas ao 2º semestre/2022 e 1º semestre/2023, que ficaram acima do orçamento e encargos incidentes; variação acima do orçado para férias e adiantamento 13º salário e encargos incidentes; posições não desmobilizadas conforme planejado no Draft 20.</p> <p>(+ R\$ 1,03): Despesas Diversas e Materiais - +R\$ 0,69 MM seguro de TI planejado para dez/22 e realizado em jan/23 e +R\$ 0,23 MM de gastos com acordos acima do previsto e +R\$ 0,13 MM de gastos com eventos institucionais acima do previsto.</p> <p>(- R\$ 6,4): Serviços Contratados - é principalmente devido a postergação de consultoria jurídica e estudos (contratos sob demanda; serviços de auditoria e compliance (atividades reprogramadas), consultorias para Gestão de Pessoas e Diretoria Institucional, serviços postergados em TI.</p> <p>(+R\$ 0,30): Materiais: +R\$ 0,26 MM referente a cestas de alimentos para os colaboradores</p> <p>(+ R\$0,08): Despesas de viagem</p>
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	16,57	1,39	-15,19	-0,92	<p>Economia:</p> <p>(R\$ 4,1 MM) Câmaras Técnicas, Custeio Atingidos Reuniões, CIF e Gerenciadora CIF: Abaixo do previsto no Draft 20, com reduzido número de reuniões e atividades do sistema CIF no início do ano.</p> <p>Fatores Internos:</p> <p>(R\$ 10,7 MM) Custeio Atingidos Novo Escopo: Realizado repasse de R\$ 8,0 MM (previsto R\$ 18,7 MM).</p> <p>(R\$ 2,5 MM) Gerenciadora Atingidos: Processo de contratação em análise. A curva de desembolso tem início em janeiro/23 até agosto/23.</p> <p>Fatores Externos:</p> <p>(R\$ 80,4 MM) Assessorias Técnicas: Antecipação dos custos com Assessorias Técnicas Independentes em 2022 quando foi realizado o repasse no valor de R\$ 62,8 MM segundo decisão judicial. O valor pago corresponde aos 6 (seis) primeiros meses de trabalho das ATIs autorizadas para dar início aos planos de trabalho.</p>
Total Despesas Administrativas		29,98	17,53	-12,45	-0,42	
Total Geral		715,67	925,32	209,64	0,29	

***Valores em milhões de reais.**
