FUNDAÇÃO renova

Masterplan Mai/19

Data de Corte: 31/05/2019

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações
1	**MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA**	**05-11-2015**	**19-03-2036**	**05-11-2015**	**19-03-2036**	
2	**EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade**	**01-01-2016**	**19-03-2036**	**01-01-2016**	**19-03-2036**	
3	**Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados**	**01-08-2016**	**01-02-2021**	**01-08-2016**	**01-02-2021**	
4	Fase do Programa: 01 - Definição	08-02-2017	30-08-2019	08-02-2017	30-08-2019	
5	Fase do Programa: 02 - Execução	01-08-2016	30-12-2020	01-08-2016	30-12-2020	
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31-12-2020	01-02-2021	31-12-2020	01-02-2021	
7	**Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)**	**02-03-2016**	**31-03-2021**	**02-03-2016**	**31-03-2021**	
8	Fase do Programa: 01 - Definição	31-01-2017	16-07-2019	31-01-2017	28-06-2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF, planejada para acontecer inicialmente na reunião de 31/05/2019.
9	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	15-01-2021	02-03-2016	15-01-2021	
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-01-2021	31-03-2021	18-01-2021	31-03-2021	
11	**Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**	**04-03-2016**	**30-12-2030**	**04-03-2016**	**30-12-2030**	
12	Fase do Programa: 01 - Definição	04-03-2016	07-09-2020	04-03-2016	07-09-2020	
13	Fase do Programa: 02 - Execução	04-03-2016	30-12-2030	04-03-2016	30-12-2030	
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28-11-2030	30-12-2030	28-11-2030	30-12-2030	
15	**Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais**	**04-03-2016**	**30-12-2030**	**01-07-2016**	**24-04-2023**	
16	Fase do Programa: 01 - Definição	04-03-2016	28-09-2020	04-03-2016	28-09-2020	
17	Fase do Programa: 02 - Execução	04-03-2016	30-12-2030	04-03-2016	30-12-2030	
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	25-11-2030	30-12-2030	25-11-2030	30-12-2030	
19	**Programa: PG005 - Proteção Social**	**04-04-2016**	**29-09-2023**	**04-04-2016**	**29-09-2023**	
20	Fase do Programa: 01 - Definição	04-04-2016	01-07-2019	04-04-2016	01-07-2019	
21	Fase do Programa: 02 - Execução	04-04-2016	28-09-2023	04-04-2016	28-09-2023	
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29-08-2023	29-09-2023	29-08-2023	29-09-2023	
23	**Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**	**02-03-2016**	**19-03-2036**	**02-03-2016**	**19-03-2036**	
24	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	26-04-2019	02-03-2016	26-04-2019	
25	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	19-03-2036	02-03-2016	19-03-2036	
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19-02-2036	19-03-2036	19-02-2036	19-03-2036	
27	**Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar**	**01-01-2016**	**29-12-2023**	**01-01-2016**	**29-12-2023**	
28	Fase do Programa: 01 - Definição	16-05-2017	06-08-2018	16-05-2017	06-08-2018	
29	Fase do Programa: 02 - Execução	01-01-2016	15-08-2023	01-01-2016	15-08-2023	
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	16-08-2023	29-12-2023	16-08-2023	29-12-2023	
31	**Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística**	**02-03-2016**	**13-12-2022**	**02-03-2016**	**13-12-2022**	
32	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-2017	29-06-2018	01-04-2017	29-06-2018	
33	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	29-11-2022	02-03-2016	29-11-2022	
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11-11-2022	13-12-2022	11-11-2022	13-12-2022	
35	**Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada**	**02-03-2016**	**21-03-2029**	**02-03-2016**	**21-03-2029**	
36	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	14-06-2019	02-03-2016	01-07-2019	
37	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	20-03-2029	02-03-2016	20-03-2029	
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	19-02-2029	21-03-2029	19-02-2029	21-03-2029	
39	**Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas**	**25-10-2016**	**31-10-2030**	**02-11-2016**	**31-10-2030**	
40	Fase do Programa: 01 - Definição	02-11-2016	30-08-2019	02-11-2016	30-08-2019	
41	Fase do Programa: 02 - Execução	25-10-2016	08-04-2030	30-01-2017	08-04-2030	
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	09-04-2030	31-10-2030	09-04-2030	31-10-2030	
43	**Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**	**01-07-2016**	**30-12-2026**	**01-07-2016**	**30-12-2026**	
44	Fase do Programa: 01 - Definição	01-07-2016	17-07-2019	01-07-2016	17-07-2019	
45	Fase do Programa: 02 - Execução	01-07-2016	30-12-2026	01-07-2016	30-12-2026	
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	30-11-2026	30-12-2026	30-11-2026	30-12-2026	
47	**Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria**	**02-01-2017**	**31-10-2030**	**02-01-2017**	**31-10-2030**	
48	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-2017	09-08-2019	02-01-2017	09-08-2019	
49	Fase do Programa: 02 - Execução	21-02-2017	01-10-2030	21-02-2017	01-10-2030	
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-10-2030	31-10-2030	02-10-2030	31-10-2030	
51	**Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**	**01-11-2016**	**30-12-2022**	**01-11-2016**	**30-12-2022**	
52	Fase do Programa: 01 - Definição	02-01-2017	30-10-2019	02-01-2017	30-10-2019	
53	Fase do Programa: 02 - Execução	01-11-2016	30-12-2022	01-11-2016	30-12-2022	
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29-11-2022	30-12-2022	29-11-2022	30-12-2022	
55	**Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório**	**13-06-2016**	**31-12-2030**	**13-06-2016**	**31-12-2030**	
56	Fase do Programa: 01 - Definição	13-06-2016	27-09-2019	13-06-2016	27-09-2019	
57	Fase do Programa: 02 - Execução	13-06-2016	02-12-2030	13-06-2016	02-12-2030	
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-12-2030	31-12-2030	03-12-2030	31-12-2030	
59	**Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial**	**08-12-2016**	**31-03-2021**	**08-12-2016**	**31-03-2021**	
60	Fase do Programa: 01 - Definição	01-11-2017	02-09-2019	01-11-2017	13-08-2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF, planejada para
61	Fase do Programa: 02 - Execução	08-12-2016	20-01-2021	08-12-2016	20-01-2021	
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	21-01-2021	31-03-2021	21-01-2021	31-03-2021	
63	**Programa: PG033 - Educação Ambiental**	**24-04-2017**	**21-06-2028**	**24-04-2017**	**21-06-2028**	
64	Fase do Programa: 01 - Definição	27-09-2017	25-10-2018	27-09-2017	25-10-2018	
65	Fase do Programa: 02 - Execução	24-04-2017	19-05-2028	24-04-2017	19-05-2028	
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	22-05-2028	21-06-2028	22-05-2028	21-06-2028	
67	**Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais**	**02-03-2016**	**01-06-2022**	**02-03-2016**	**01-06-2022**	
68	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	21-01-2020	02-03-2016	21-01-2020	
69	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	29-04-2022	02-03-2016	29-04-2022	
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-05-2022	01-06-2022	02-05-2022	01-06-2022	
71	**Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1**	**02-03-2016**	**16-04-2031**	**02-03-2016**	**16-04-2031**	
72	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	31-03-2020	30-12-2016	28-05-2019	Alteração do escopo do CIT de Regência que está em discussão com a engenharia e a câmara técnica (esse prazo pode ser alterado após definição do escopo).
73	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	14-03-2031	02-03-2016	14-03-2031	
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	17-03-2031	16-04-2031	17-03-2031	16-04-2031	
75	**Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional**	**01-06-2016**	**31-07-2026**	**01-06-2016**	**31-07-2026**	
76	Fase do Programa: 01 - Definição	30-12-2016	14-08-2019	30-12-2016	21-05-2019	Prevista a aprovação da NT 10/2018/CTCPDCS/CIF apenas na reunião de ago/19 (documento protocolado na CT e aguardando aprovação)
77	Fase do Programa: 02 - Execução	01-06-2016	01-07-2026	01-06-2016	01-07-2026	
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	02-07-2026	31-07-2026	02-07-2026	31-07-2026	

Data de Impressão: 14-06-2019

Masterplan Mai/19

Data de Corte: 31/05/2019

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	Observações
79	**Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos**	**10-01-2017**	**17-01-2020**	**10-01-2017**	**20-11-2019**	**Inserção de um novo escopo no Programa: pagamento da Prefeitura de Mariana referente aos gastos com escola integral**
80	Fase do Programa: 01 - Definição	10-01-2017	09-09-2019	10-01-2017	04-09-2019	
81	Fase do Programa: 02 - Execução	10-01-2017	11-12-2019	10-01-2017	08-10-2019	
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	13-12-2019	17-01-2020	18-10-2019	20-11-2019	
83	**EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água**	**05-11-2015**	**19-03-2036**	**05-11-2015**	**19-03-2036**	
84	**Programa: PG007 - Assistência aos Animais**	**05-11-2015**	**19-08-2021**	**05-11-2015**	**19-08-2021**	
85	Fase do Programa: 01 - Definição	05-11-2015	30-10-2018	05-11-2015	30-10-2018	
86	Fase do Programa: 02 - Execução	18-12-2015	19-08-2021	18-12-2015	19-08-2021	
87	Fase do Programa: 03 - Encerramento	14-07-2021	19-08-2021	14-07-2021	19-08-2021	
88	**Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias**	**08-08-2018**	**27-02-2023**	**05-11-2018**	**27-02-2023**	
89	Fase do Programa: 01 - Definição	05-11-2018	30-08-2019	05-11-2018	30-08-2019	
90	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-2018	27-01-2023	08-08-2018	27-01-2023	
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-01-2023	27-02-2023	23-01-2023	27-02-2023	
92	**Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão**	**04-01-2016**	**18-04-2024**	**04-01-2016**	**18-04-2024**	
93	Fase do Programa: 01 - Definição	01-04-2017	18-02-2021	01-04-2017	18-02-2021	
94	Fase do Programa: 02 - Execução	04-01-2016	18-04-2024	04-01-2016	18-04-2024	
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-2024	18-04-2024	18-03-2024	18-04-2024	
96	**Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos**	**01-12-2015**	**31-03-2026**	**01-12-2015**	**31-03-2026**	
97	Fase do Programa: 01 - Definição	03-12-2018	31-07-2019	03-12-2018	31-07-2019	
98	Fase do Programa: 02 - Execução	01-12-2015	27-02-2026	01-12-2015	27-02-2026	
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	23-02-2026	31-03-2026	23-02-2026	31-03-2026	
100	**Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)**	**25-10-2016**	**17-10-2034**	**25-10-2016**	**17-10-2034**	
101	Fase do Programa: 01 - Definição	31-10-2016	31-07-2019	31-10-2016	31-07-2019	
102	Fase do Programa: 02 - Execução	25-10-2016	14-09-2034	25-10-2016	14-09-2034	
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	08-09-2034	17-10-2034	08-09-2034	17-10-2034	
104	**Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes**	**02-03-2016**	**19-03-2036**	**02-03-2016**	**19-03-2036**	
105	Fase do Programa: 01 - Definição	02-03-2016	31-07-2019	02-03-2016	31-07-2019	
106	Fase do Programa: 02 - Execução	02-03-2016	19-03-2036	02-03-2016	19-03-2036	
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	12-02-2036	19-03-2036	12-02-2036	19-03-2036	
108	**Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha**	**29-06-2016**	**31-05-2032**	**29-06-2016**	**31-05-2032**	
109	Fase do Programa: 01 - Definição	27-06-2017	28-06-2019	27-06-2017	31-05-2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF, planejada para acontecer inicialmente na reunião de 31/05/2019. Como o tópico não fez parte da pauta desta reunião, a aprovação foi reprogramada
110	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-2016	31-05-2032	29-06-2016	31-05-2032	
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	28-04-2032	31-05-2032	28-04-2032	31-05-2032	
112	**Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre**	**29-06-2016**	**20-04-2026**	**29-06-2016**	**20-04-2026**	
113	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	31-05-2019	29-06-2016	31-05-2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF, planejada para acontecer inicialmente na reunião de 31/05/2019. Como o tópico não fez parte da pauta desta reunião, a aprovação foi reprogramada
114	Fase do Programa: 02 - Execução	27-03-2018	20-04-2026	27-03-2018	20-04-2026	
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	18-03-2026	20-04-2026	18-03-2026	20-04-2026	
116	**Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre**	**29-06-2016**	**11-07-2030**	**08-08-2016**	**11-07-2030**	
117	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	28-06-2019	29-06-2016	31-05-2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF, planejada para acontecer inicialmente na reunião de 31/05/2019. Como o tópico não fez parte da pauta desta reunião, a aprovação foi reprogramada
118	Fase do Programa: 02 - Execução	08-08-2016	11-07-2030	08-08-2016	11-07-2030	
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	11-06-2030	11-07-2030	11-06-2030	11-07-2030	
120	**Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce**	**01-03-2016**	**03-01-2029**	**01-03-2016**	**03-01-2029**	
121	Fase do Programa: 01 - Definição	01-05-2017	05-06-2018	01-05-2017	05-06-2018	
122	Fase do Programa: 02 - Execução	01-03-2016	01-12-2028	01-03-2016	01-12-2028	
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	29-11-2028	03-01-2029	29-11-2028	03-01-2029	
124	**Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação**	**29-06-2016**	**29-06-2026**	**29-06-2016**	**29-06-2026**	
125	Fase do Programa: 01 - Definição	29-06-2016	28-06-2019	29-06-2016	31-05-2019	A reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF, planejada para acontecer inicialmente na reunião de 31/05/2019. Como o tópico não fez parte da pauta desta reunião, a aprovação foi reprogramada
126	Fase do Programa: 02 - Execução	29-06-2016	29-06-2026	29-06-2016	29-06-2026	
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	27-05-2026	29-06-2026	27-05-2026	29-06-2026	
128	**Programa: PG040 - CAR e PRAS**	**23-07-2018**	**31-01-2023**	**29-03-2019**	**31-01-2023**	
129	Fase do Programa: 01 - Definição	29-03-2019	23-04-2019	29-03-2019	23-04-2019	
130	Fase do Programa: 02 - Execução	23-07-2018	30-12-2022	23-07-2018	30-12-2022	
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	26-12-2022	31-01-2023	26-12-2022	31-01-2023	
132	**EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura**	**06-11-2015**	**04-12-2023**	**06-11-2015**	**04-12-2023**	
133	**Programa: PG10 - Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas**	**06-11-2015**	**09-11-2020**	**06-11-2015**	**31-03-2020**	
134	Fase do Programa: 01 - Definição	06-11-2015	16-08-2019	06-11-2015	06-12-2019	
135	Fase do Programa: 02 - Execução	06-11-2015	07-10-2020	06-11-2015	28-02-2020	
136	Fase do Programa: 03 - Encerramento	06-10-2020	09-11-2020	03-09-2018	31-03-2020	
137	**Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos**	**01-02-2017**	**05-03-2020**	**01-02-2017**	**28-02-2020**	**Atraso do solo mole da ensecaderia, assim como as chuvas acima do previsto / esperado no período.**
138	Fase do Programa: 01 - Definição	01-02-2017	30-11-2018	01-02-2017	30-11-2018	
139	Fase do Programa: 02 - Execução	01-02-2017	05-03-2020	01-02-2017	29-12-2019	
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	03-02-2020	05-03-2020	02-09-2019	28-02-2020	
141	**Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos**	**28-12-2016**	**04-12-2023**	**28-12-2016**	**04-12-2023**	
142	Fase do Programa: 01 - Definição	20-03-2017	23-09-2019	20-03-2017	23-09-2019	
143	Fase do Programa: 02 - Execução	28-12-2016	30-10-2023	28-12-2016	30-10-2023	
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	31-10-2023	04-12-2023	31-10-2023	04-12-2023	
145	**Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimendo de Água**	**09-11-2015**	**05-09-2022**	**23-03-2016**	**21-03-2022**	**O atraso se deu na elaboração do projeto conceitual, devido à indefinição da solução a ser adotada para o arranjo geral do acesso e monovia da captação flutuante. A solução adotada está em análise pelo SAAE do município.**
146	Fase do Programa: 01 - Definição	23-03-2016	01-07-2019	23-03-2016	01-07-2019	
147	Fase do Programa: 02 - Execução	09-11-2015	05-09-2022	23-03-2016	21-03-2022	
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento	05-08-2022	05-09-2022	19-02-2022	21-03-2022	

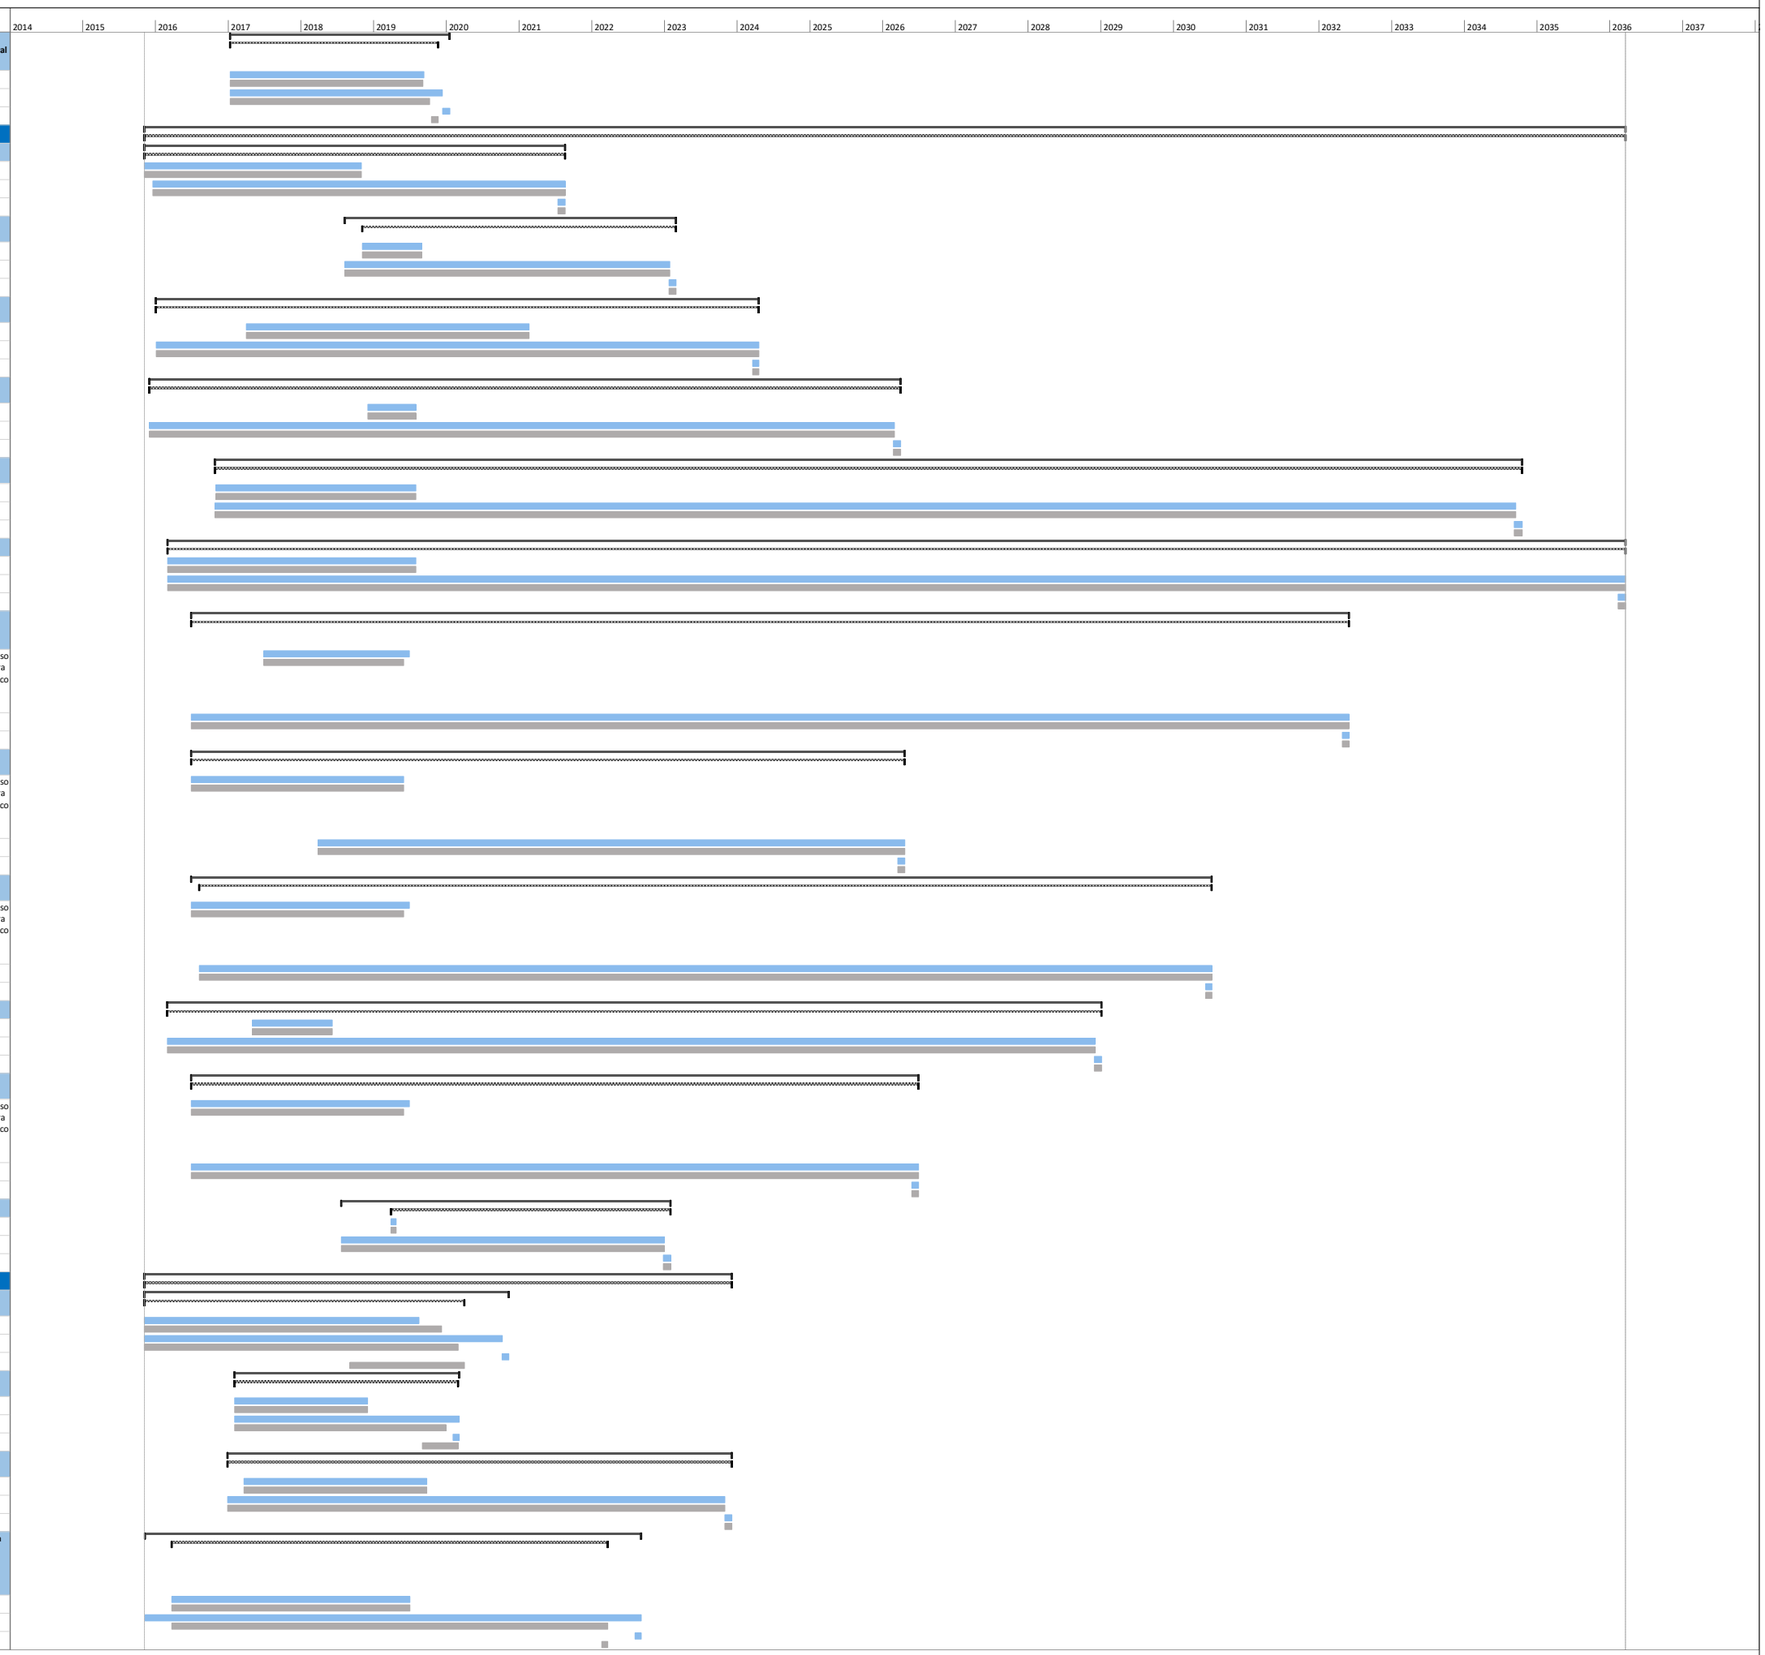

Data de Impressão: 14-06-2019
